Indique con una (x) según sea el caso:	Funcionario		Contratista	X	Fecha:

Consecutivo SIIF N°: 7926 Marzo – 06. 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		FECHA		
Ana María Jaimes López	**C.C.**	1.098.689.586	18	03	26

Dependencia	Área de Patrimonio
N° de consecutivo SIIF	7926 Marzo – 06. 2026
Objeto de la salida	Realizar el acompañamiento desde el equipo estructural para ejecutar la intervención estructural del hipogeo SA1 ubicado en el alto de San Andrés del Parque Arqueológico de Tierradentro.
Agenda desarrollada	**Miércoles 11 de marzo:** desplazamiento aéreo Pereira-Bogotá-Popayán y terrestre hasta el Parque Arqueológico Tierradentro. Organización de materiales para iniciar labores al siguiente día, encaminado a las siguientes actividades: estabilización de estratos con mortero de inyección y limpieza mecánica de sales. **Jueves 12 de marzo:** Traslado al alto de San Andrés del equipo estructural (4 restauradores), organización de materiales, se hace una revisión general del hipogeo, se toman algunas fotos pendientes en el glosario de deterioros como desprendimiento de enlucido, craqueladura de capa pictórica y microorganismos (hongos de cuerpo fructífero). Preparación de mortero de inyección con agua desmineralizada y ácido piroleñoso al 6% (receta original usa solo agua). Se hizo una revisión con luz UV de la superficie para corroborar zonas con crecimiento biológico por hongos y zonas con sales, se define que los hongos presentes en SA1 no se identifican por luz UV (no fluorescen) sino que se diferencian porque su crecimiento es de manera proyectada (crecen hacia el frente) mientras que las sales se mantienen planas sobre la superficie. Se realizan pruebas de limpieza de sales con etanol al 70%, con buenos resultados en cuanto a la eliminación de sales y estabilidad de los estratos pictóricos. Inicialmente, se propone el uso de hisopo, pero deja residuo en la superficie así que se opta por usar junto con el etanol: cepillo de cerdas suaves en zonas con alta rugosidad y estratos estables, esponja de melamina para aquellas zonas estables con textura lisa e hisopo para zonas más delicadas. Limpieza de sales en N1, PL2, C1. **Viernes 13 de marzo:** continuación de limpieza de sales en N1, C2 a C8, N2A y B, P1. Limpieza de capa de barro en PL2. Preparación de mortero de inyección con arenas de 75 micras. Inyección de mortero en N1, PL2, C1, P1. Trabajo realizado por 4 restauradores. **Sábado 14 de marzo:** 6 restauradores, artista plástico y 2 cuidadores del PAT. Revisión de columna P2, con apoyo de dos miembros del equipo del parque. Se realizó la liberación de los fragmentos, eliminado los lazos y yumbolón que les sostenía, previa construcción de formaletas que permitieron mantener en el sitio los 3 fragmentos. Una vez asegurados, se liberó el primer fragmento con ayuda de tela quirúrgica y se dispuso sobre yumbolón en el suelo, y de esta manera se liberaron paulatinamente los

demás fragmentos para poder inyectar con mortero de estabilización las fisuras en la zona. Así mismo, se preparó mortero estructural para restituir el faltante de soporte de P2, previa humectación con agua alcohol y aplicación de puente de adherencia. Preparación del mortero de inyección para toda la jornada.

Domingo 15 de marzo: Preparación de mortero de inyección de dos tipos: fino con arenas tamizadas a 75 micras para inyectar, grueso con arenas tamizadas a 250 micras para aplicar sin sonda o con espátula. Preparación de mortero estructural. Readhesión de 2 fragmentos en P2 con puente de adherencia y mortero estructural, se dispone formaleta de madera para asegurar fraguado.

Lunes 16 de marzo: Continuación de procesos en nichos y cámara de eliminación de raíces, inyección de mortero grueso (ciclópeo), mortero de inyección fino y limpieza de sales. Tratamiento en PL1, C2, C3, N2, P1D. Evaluando el progreso de la intervención hasta el momento, se define que no es posible intervenir la bóveda debido a que los muros y pilastras demandaron más tiempo del contemplado en los procesos de limpieza de sales e inyección de morteros. También se aplicó mortero estructural para reforzar el faltante en columna P2.

Martes 17 de marzo: Continuación de procesos en nichos y cámara de eliminación de raíces, inyección de mortero grueso (ciclópeo), mortero de inyección fino y limpieza de sales. Tratamiento en PL1, C2, C3, N2, P1D. Desmontaje de formaletas en columna P2, se retiran las formaletas porque el mortero ya se encuentra estable y para evitar que la presencia de maderas pueda generar mayor proliferación de cuerpos fúngicos. Se realiza la aplicación de mortero estructural en zonas de unión entre fragmentos de la columna y posterior aplicación de mortero grueso de inyección. Fotos finales de la intervención. Organización de materiales. La jornada finalizó con la organización de materiales y aplicación por aspersión en el suelo del hipogeo de solución de ácido piroleñoso al 6 % en etanol (70%) para contrarrestar el crecimiento de cuerpos fúngicos.

Miércoles 18 de marzo: desplazamiento terrestre hasta el Parque Arqueológico Tierradentro y traslado aéreo Popayán-Bogotá-Bucaramanga.

CONSOLIDACIÓN DEL INFORME

Procesos realizados por la contratista durante la comisión en SA1



Tratamiento realizado

- Traslado de materiales



- Verificación de sales y cuerpos fúngicos con luz UV



- Limpieza mecánica de sales



- Eliminación de capa de barro





- Eliminación de raíces



- Inyección de mortero de 75 micras




- Aplicación de mortero de 250 micras con fragmentos de toba




-

Documentación in situ de tratamientos realizados

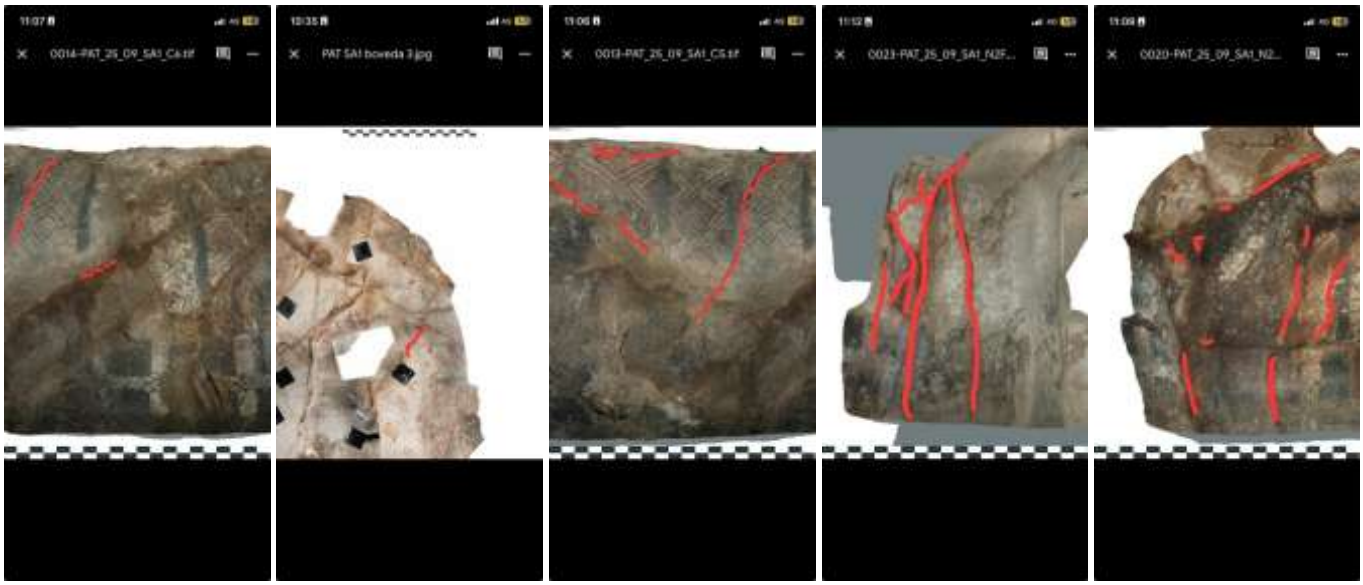

- Jueves 19 de marzo

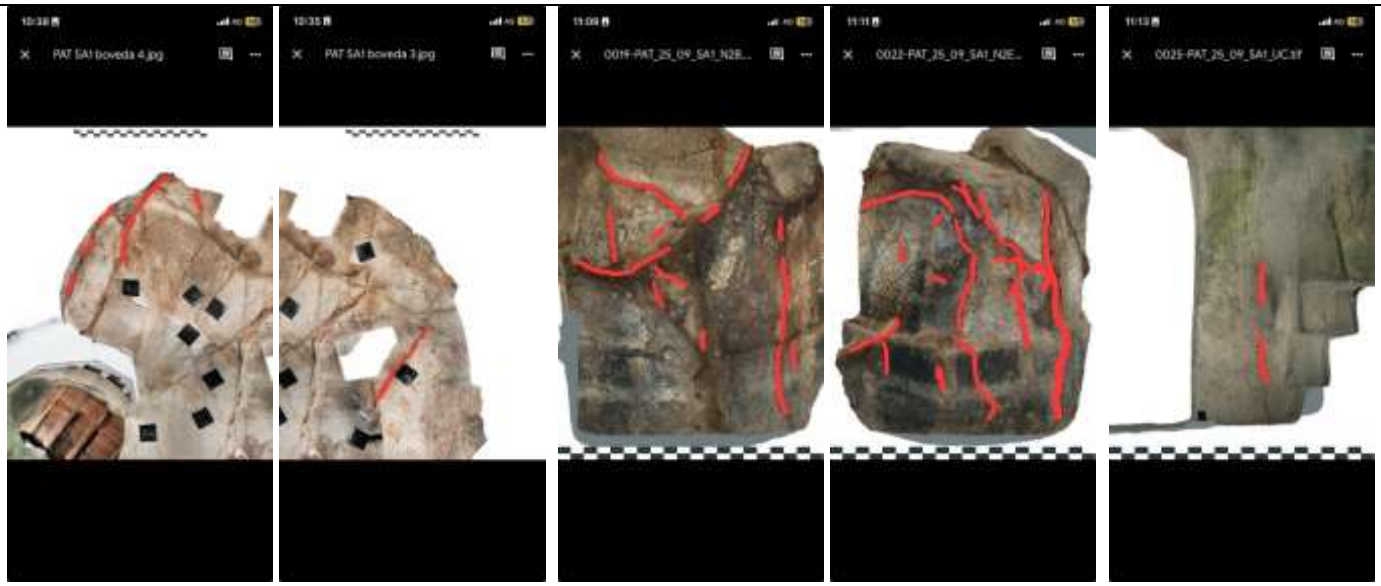

Procesos de tipo estructural realizados en columna P2












LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
Reporta Pasabordos	SI			
Adjuntar pasabordos				



JAIMES/ANA MARIA

Sala / Gate: 3 | Hora en sala / Time at gate: 05:35 | Grupo /Group: E | Asiento / Seat: 15K

VUELO/FLIGHT AV 9802
RESERVA/ BOOKING: AB7HP6
1345527709382O1

PEI PEREIRA MIE/WED, 11 MAR|06:35
BOG BOGOTA MIE/WED, 11 MAR|07:25 T1
TARIFA/FARE: Classic
Tu viaje incluye/Your trip includes
SI/YES
1X23kg
Servicio especial/ Service selection
avianca

JAIMES/ANA MARIA

Sala / Gate: | Hora en sala / Time at gate: 08:30 | Grupo /Group: C | Asiento / Seat: 6K

VUELO/FLIGHT AV 4893
RESERVA/ BOOKING: AB7HP6
1345527709382O2
AVIANCA FOR AVIANCA EXPRESS

BOG BOGOTA MIE/WED, 11 MAR|08:30 T1
PPN POPAYAN MIE/WED, 11 MAR|10:35
TARIFA/FARE: Classic
Tu viaje incluye/Your trip includes
SI/YES
Servicio especial/ Service selection
avianca

CS Escaneado con CamScanner



avianca
VUELO AV4892
POPAYAN PPN → BOGOTA BOG
HORA EN SALA 10:15 | GRUPO E | ASIENTO 16K | STATUS
PASAJERO Jaimes / Ana Maria | FECHA 18 Mar | EQUIPAJE DE MANO SI/YES

avianca
VUELO AV4830
BOGOTA BOG → BUCARAMANGA BGA
HORA EN SALA 16:15 | GRUPO C | ASIENTO 7A | STATUS
PASAJERO Jaimes / Ana Maria | FECHA 18 Mar | EQUIPAJE DE MANO SI/YES

LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL

Relaciones los gastos de transporte en el siguiente cuadro

N. de recibo	Detalle	Fecha	Valor
001	Transporte desde aeropuerto Popayán al Parque Arqueológico de Tierradentro	11/03/2026	$45.000
002	Transporte desde el Parque Arqueológico de Tierradentro a aeropuerto Popayán	18/03/2026	$45.000
		VALOR REPORTADO	$90.000
		VALOR ASIGNADO EN FORMATO	$90.000
		DIFERENCIA	0

Reintegra recursos	SI	NO	Indique el código de transacción		N/A
		X			

Anexar soportes de transportes





IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS

		
Firma	**Firma**	**Firma**
Ana María Jaimes López		Alejandro Amaya García
Nombre de quien legaliza*	**Nombre del apoyo a la Supervisión (Solo en los casos que aplique)**	**Nombre jefe inmediato/Supervisor**
