
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO CALAHORRA**	**$ 389.855.984,00**	**75 días**	**jue 1/01/26**	**mié 15/04/2**	
2		**1. PRELIMINAR**	**$ 4.576.942,50**	**15 días**	**jue 1/01/26**	**mié 21/01/2**	
3		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 4.576.942,50	15 días	jue 1/01/26	mié 21/01/2	
4		**2. CUBIERTAS**	**$ 241.943.121,20**	**56 días**	**jue 22/01/26**	**jue 9/04/26**	
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TIPO METALSUN-45° GALVANIZADO LISO CALIBRE: 0,45 ESTRUCTURA TUBERIA 40X40C16 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ANCLAJES A LA ESTRUCTURA EXISTENTE)	$ 231.289.330,00	56 días	jue 22/01/26	jue 9/04/26	3
6		CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 INCLUYE PINTURA; BASE 30CM, (ALTURA INSTALACION 8M)	$ 10.653.791,20	22 días	jue 22/01/26	vie 20/02/26	5CC
7		**3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**$ 12.687.605,00**	**12 días**	**mar 31/03/2**	**mié 15/04/2**	
8		REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	$ 12.687.605,00	12 días	mar 31/03/2	mié 15/04/2	12FF;18FF
9		**4. DOTACIONES DEPORTIVAS**	**$ 124.512.022,70**	**55 días**	**jue 29/01/26**	**mié 15/04/2**	
10		MALLA DE NYLON PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL INCLUYE TENSORES	$ 28.359.951,10	23 días	jue 29/01/26	lun 2/03/26	17
11		RECUBRIMIENTO SINTETICO EN PLEXIFLOOR, SIKAFLOR, REFUREIZER O SIMILAR. NO INCLUYE AFINADO DE LA SUPERFICIE, BASE SINTETICA, SELLADO, CAPA PROTECTORA CONTRA FACTORES AMBIENTALES, ACABADO FINAL. MARCACIÓN REGLAMENTARIA PARA EL JUEGO DE BALONCESTO, MICROFÚTB	$ 95.767.073,20	45 días	mié 11/02/26	mar 14/04/26	10FC-14 días
12		MALLA MICROFUTBOL Nylon Iperm.	$ 364.998,40	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/2	11
13		**5. PINTURAS**	**$ 4.933.907,00**	**60 días**	**jue 22/01/26**	**mié 15/04/2**	
14		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	$ 198.283,80	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	19
15		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	$ 104.338,00	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	14
16		VINILO 2 MANOS	$ 350.134,20	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26	15
17		PINTURA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	$ 2.044.120,00	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/2	6CC
18		LAVADA DE FACHADA	$ 1.028.421,00	4 días	vie 10/04/26	mié 15/04/2	5
19		REMATE LINEAL MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA	$ 1.208.610,00	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/2	3
20		**6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**$ 1.202.385,60**	**2 días**	**jue 29/01/26**	**vie 30/01/26**	
21		CONJUNTO DE VALVULA AHORRADOR TANQUE DUAL. INCLUYE ACCESORIO	$ 399.224,80	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26	19
22		GRIFERÍA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH-UP	$ 803.160,80	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26	21
23		FIN	$ 0,00	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26	22;8;16

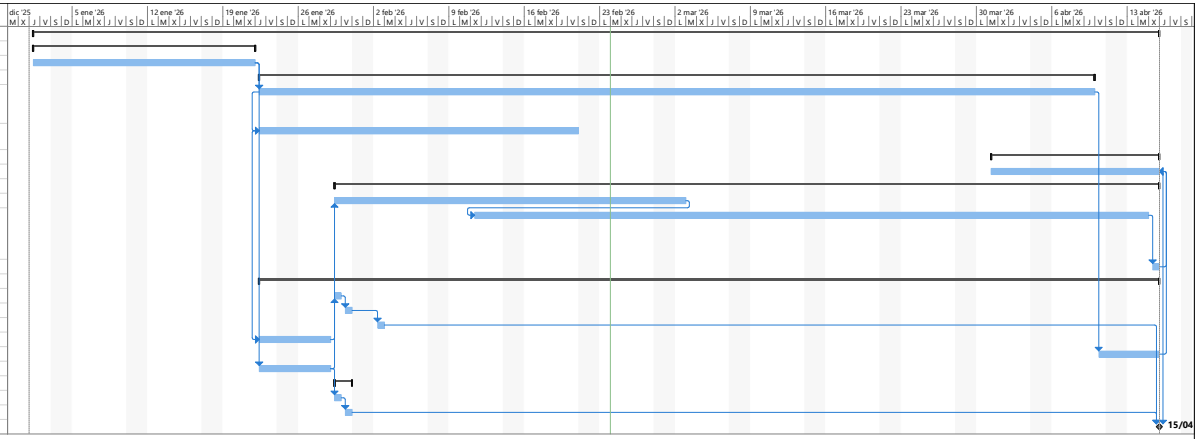

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
