CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: ANOLAIMA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

Anolaima:

1. Retroexcavadora Alquilada CAT 14459

Ubicación:

El Colegio – Vereda Retiro, Descanso, Islon, La María coordenadas 4°45'55.83"N 74°27'49.17"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Leonardo Guerra
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT 14459	Jesús Roa

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Anolaima

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
NIT. 899.999.426-3

CRONOGRAMA - INTERVENCION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

PERIODO	AÑO	2026			
	MES	FEBRERO		MARZO	
	SEMANA	3	4	5	6
SECTOR	Vereda Retiro, Descanso, Islon, La Maria				

Fuente: Alcaldía de Anolaima

Actualmente se cuenta con un 20% de avance con respecto al cronograma establecido

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

16/02/2026
Actividades: El día de hoy llega a el municipio de Anolaima una retroexcavadora alquilada, la cual realiza limpieza de canales y despeje de derrumbe, sin embargo, a medio día presenta una falla y queda inoperativa.
Sector: Vereda La María
Longitud: 0.02 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT 14459 ALQ: sin hr - sin hr : 3.5 Hrs
17/02/2026

Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada se encuentra inoperativa a la espera de repuestos.
Sector: Vereda La María
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT 14459 ALQ: sin hr - sin hr :
18/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realizo retiro de derrumbe, limpieza de canales y encause de aguas hacia la quebrada en la vereda Islon
Sector: Vereda Islon
Longitud: 0.02 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT 14459 ALQ: sin hr - sin hr : 7.5 Hrs
19/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realizo retiro de derrumbe y limpieza de material que había sido arrastrado frente a viviendas en la vereda Islon
Sector: Vereda Islon
Longitud: 0.03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT 14459 ALQ: sin hr - sin hr : 6 Hrs
20/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realizo conformación de vía, intervención y relleno de socavación presentada por las lluvias en la vía que comunica la vereda Islon, a su vez se dan por terminadas las actividades en este
Sector: Vereda Islon
Longitud: 0.5 km
Viajes:
Combustible:

Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT 14459 ALQ: sin hr - sin hr : 2.5 Hrs

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

No aplica

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AV+C2:G23ANCE DE OBRA ANOLAIMA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026	0,02	0,02		Inicio de actividades
17/02/2026	0	0,02		Falla mecánica
18/02/2026	0,02	0,04		
19/02/2026	0,03	0,07		
20/02/2026	0,5	0,57		Fin de actividades
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026				
25/02/2026				

26/02/2026				
27/02/2026				
28/02/2026				
TOTAL		**0,57**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026			8	Inicio de actividades
17/02/2026		8		Falla mecánica
18/02/2026			8	
19/02/2026			8	
20/02/2026			8	Fin de actividades
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026				
25/02/2026				

26/02/2026				
27/02/2026				
28/02/2026				
TOTAL	**0**	**8**	**32**	

8. MOVILIZACIONES




No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	ANOLAIMA						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					**SERIE**	**CAT 14459**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
16/02/2026			8:30	12:00	3,5		Falla de maquina
17/02/2026	Sin hr	Sin hr	0	0	0		Falla de maquina
18/02/2026			8:00	3:30	7,5		
19/02/2026			9:00	3:00	6		
20/02/2026			1:30	4:00	2,5		FIN DE ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES					**19,5**	**0**	
TOTAL MES					**19,5**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves Prieto**		**Nombre:**		**Leonardo Guerra**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de Anolaima permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de pasos críticos afectados por derrumbes, abarcando un total de 0,57 km intervenidos. Estas labores se desarrollaron en las veredas Retiro, Descanso, Islon y La María, durante un periodo operativo de 32 horas efectivas de trabajo, con 8 horas de inoperatividad debido a fallas mecánicas, lo que evidencia la capacidad de respuesta ante condiciones adversas. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la comunidad beneficiada.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Conformación de vía	Limpieza de derrumbe	Derrumbe en la vía
		
Derrumbe en la vía	Limpieza de derrumbe	Conformación de vía

Leonardo Guerra
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

13. Anexos

Registro fotográfico inicio y fin de la retroexcavadora alquilada

16/02/2026

Inicio 8:30:00 A.M.



Fin 12:00:00 P.M.



18/02/2026

Inicio 9:00:00 A.M.



Fin 3:00:00 P.M.



19/02/2026

Inicio 9:00:00 A.M.



Fin 3:00:00 P.M.

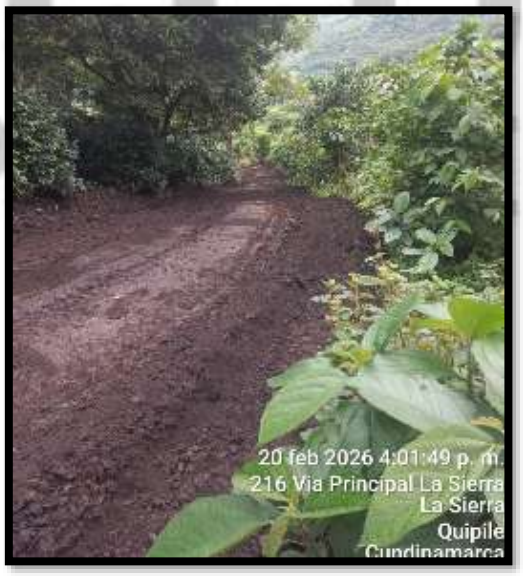


20/02/2026

Inicio 1:30:00 P.M.



Fin 4:00:00 P.M



CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: EL COLEGIO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

El Colegio:

1. Retroexcavadora Alquilada Jhon Deere 1T0310KXJDE247712
2. Volqueta Alquilada UPT265

Ubicación:

El Colegio – vereda Pítala, Misiones Bajo, Trujillo, Santa Martha, El Tigre, las Palmas, Entre Ríos coordenadas 4°34'16.29"N 74°25'13.11"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Damián Cespedes
OPERADOR RETROEXCAVADORA 1T0310KXJDE247712	Jhon Castañeda
OPERADOR MAQUINA Y SERIAL 2	Fabio Varela

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de El Colegio

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO
NIT. 890.680.162-0

CRONOGRAMA - INTERVENCION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

PERIODO	AÑO	2026							
	MES	FEBRERO				MARZO			
	SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8
SECTOR	Vereda Pítala, Misiones Bajo, Trujillo, Santa Martha, El Tigre, las Palmas, Entre Ríos, Honduras, Java								

Fuente: Alcaldía de El Colegio

Actualmente se cuenta con un 40% de avance con respecto al cronograma establecido

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

01/02/2026

Actividades: El día de hoy llega a el municipio de El Colegio una retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, donde atienden una emergencia presentada por deslizamiento de masa, allí retiran 3 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector el prado y vereda Pítala

Sector: Pítala

Longitud: 0.1 km

Viajes: 3
Combustible:
Clima: Nubado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora alq: 9789,2 – 9792
- Volqueta alq UPT265: 342185 - 342205

02/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, donde atienden una emergencia presentada por deslizamiento de masa, allí retiran 4 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector el prado y vereda Pítala
Sector: Pítala
Longitud: 0.1 km
Viajes: 4
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9792 – 9800.9
- Volqueta Alq UPT265: 342205 - 342252

03/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, donde atienden una emergencia presentada por deslizamiento de masa, allí retiran 3 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector misiones bajo
Sector: Misiones bajo - Trujillo
Longitud: 0,1 km
Viajes: 3
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9800.9 – 9808.6
- Volqueta Alq UPT265: 342252 - 324315

04/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, donde atienden una emergencia presentada por deslizamiento de masa, allí retiran 3 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector misiones
Sector: Misiones bajo - Trujillo
Longitud: 0,1 km
Viajes: 3

Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9808.6 – 9817.6
- Volqueta Alq UPT265: 342315 - 342376

05/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, donde atienden una emergencia presentada por deslizamiento de masa, allí retiran 4 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector vía el triunfo – los cocos
Sector: Los Cocos
Longitud: 0,1 km
Viajes: 4
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9817.6 – 9827.3
- Volqueta Alq UPT265: 342376- 342405

06/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, realizaron el retiro de un derrumbe ubicado en la via que conduce al Barrio Barranquilla con Tres Torres, allí se retiran 2 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector Barranquilla.
Sector: Barranquilla
Longitud: 0,1 km
Viajes: 2
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9827.3 – 9832.1
- Volqueta Alq UPT265: 342405 - 342405

07/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere alquilada y una volqueta alquilada, realizaron el retiro de un derrumbe ubicado en la vía que conduce a la vereda Santa Marta con el casco urbano, allí se retiran 3 viajes de material orgánico despejando la vía en el sector Santa Marta.
Sector: Santa Marta
Longitud: 0,1 km

Viajes: 3
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9832.1 – 9840.8
- Volqueta Alq UPT265: 3004 - 3009

08/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere, realizaron el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en la vereda Santa Marta, la volqueta alquilada sin actividades programadas por la logística de la alcaldía, y en horas de la tarde se presentan lluvias en el sector.
Sector: Santa Marta
Longitud: 0.1 km
Viajes:
Combustible:
Clima: 3 horas de lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9840.8 – 9849.5
- Volqueta Alq UPT265: 3009 - 3009

09/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere, realizaron el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en la vereda Santa Marta, la volqueta alquilada se encuentra realizando mantenimiento preventivo.
Sector: Santa Marta
Longitud.
Sector: Santa Marta
Longitud: 0.05 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Retro excavadora: Operativa
Volqueta UPT265: Inoperativa (mantenimiento)
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9849.5 – 9855.7
- Volqueta Alq UPT265: 3009 - 3009

10/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector los Cocos

que conduce hacia el triunfo, la volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de material.
Sector: Santa Marta
Longitud: 0.03 km
Viajes: 2
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9860.3 – 9865.5
- Volqueta Alq UPT265: 3016 - 3022

11/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego realizo conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 2 viajes de tierra y posteriormente realiza el transporte de 2 viajes de recebo.
Sector: Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 4
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9865.5 – 9873
- Volqueta Alq UPT265: 3024 – 3033

12/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 3 viajes de tierra y posteriormente realiza el transporte de 3 viajes de recebo
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 6
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9873 – 9878
- Volqueta Alq UPT265: 3033 – 3042

13/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 3 viajes de tierra y posteriormente realiza el transporte de 3 viajes de recebo
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 6
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9878 – 9883.3
- Volqueta Alq UPT265: 3053 – 3058

14/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 4 viajes de tierra.
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 4
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9883.3 – 9889.7
- Volqueta Alq UPT265: 19945 – 19950

15/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere presenta una falla mecánica por lo cual no se pueden realizar actividades, y la volqueta alquilada sin actividades programadas por la logística de la alcaldía.
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9889.7 – 9889.7

- Volqueta Alq UPT265: 19950 – 19950

16/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 3 viajes de tierra
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 3
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9893.1 – 9899.8
- Volqueta Alq UPT265: 459460 – 459500

17/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 6 viajes de tierra
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.06 km
Viajes: 6
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9899.8 – 9905.3
- Volqueta Alq UPT265: 459500 – 459554

18/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, luego se realizó conformación de vía en el mismo sector, la volqueta alquilada realiza el transporte de 6 viajes de tierra
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.06 km
Viajes: 6
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9905.3 – 9914.2
- Volqueta Alq UPT265: 459554 – 459572

19/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector las palmas, la volqueta alquilada realiza el retiro de 10 viajes de tierra en el mismo sector
Sector: El tigre - Las palmas
Longitud: 0.1 km
Viajes: 10
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9914.2 – 9923.6
- Volqueta Alq UPT265: 459572 – 459617

20/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector Entre Ríos, la volqueta alquilada realiza el retiro de 12 viajes de tierra en el mismo sector
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.15 km
Viajes: 12
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9923.6 – 9930.4
- Volqueta Alq UPT265: 459617 – 459677

21/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y direccionamiento de aguas en el sector Entre Ríos, la volqueta alquilada realiza el retiro de 8 viajes de tierra en el mismo sector
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.1 km
Viajes: 8
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9930.4 – 9937.6
- Volqueta Alq UPT265: 459677 – 459681

23/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y replante de vía en el sector Entre Ríos, la volqueta alquilada realiza el retiro de 5 viajes de tierra en el mismo sector, en horas de la tarde se realiza extracción de volqueta que queda enterrada por terreno saturado.
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.1 km
Viajes: 8
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9937.6 – 9942.8
- Volqueta Alq UPT265: 459681 – 459705

24/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y cargue de material a volqueta, en horas de la mañana presta apoyo para la extracción de volqueta que estaba enterrada por terreno saturado
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.05 km
Viajes: 3
Combustible:
Clima: 2 Hrs Lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9942.8 – 9948.8
- Volqueta Alq UPT265: 459705 – 459707

25/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y cargue de material a volqueta, en horas de la tarde llueve intermitente en la zona de trabajo.
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.15 km
Viajes: 10
Combustible:
Clima: 3 Hrs Lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9948.8 – 9955.9
- Volqueta Alq UPT265: 459707 – 459732

26/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas y cargue de material a volqueta, en horas de la tarde llueve intermitente en la zona de trabajo.
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.15 km
Viajes: 8
Combustible:
Clima: 3 Hrs Lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9955.9 – 9961
- Volqueta Alq UPT265: 459707 – 459757

27/02/2026
Actividades El día de hoy la retroexcavadora Jhon Deere realiza el retiro de un derrumbe, limpieza de cunetas, y conformación de vía y cargue de material a la volqueta en la vereda Entre Ríos.
Sector: Entre Ríos
Longitud: 0.15 km
Viajes: 12
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9961 – 9969.1
- Volqueta Alq UPT265: 459757 – 459782

28/02/2026
Actividades El día de hoy en la madrugada se presentan lluvias intermitentes en la zona, lo que genera terreno saturado y por tal motivo la volqueta presento dificultades de acceso y no se pudieron realizar actividades en la vereda Entre Ríos.
Sector: Entre Ríos
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 3 hrs Lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Retroexcavadora Alq: 9969.1 – 9969.1
- Volqueta Alq UPT265: 459782 – 459782

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	Tierra	3	
2/02/2026	Tierra	4	
3/02/2026	Tierra	3	
4/02/2026	Tierra	3	
5/02/2026	Tierra	4	
6/02/2026	Tierra	2	
7/02/2026	Tierra	3	
8/02/2026	Tierra	0	
9/02/2026	Tierra	0	
10/02/2026	Tierra	2	
11/02/2026	Recebo - Tierra	4	
12/02/2026	Recebo - Tierra	6	
13/02/2026	Recebo - Tierra	6	
14/02/2026	Tierra	4	
15/02/2026		0	Sin actividades
16/02/2026	Tierra	3	
17/02/2026	Tierra	2	
18/02/2026	Tierra	3	
19/02/2026	Tierra	10	
20/02/2026	Tierra	12	
21/02/2026	Tierra	8	
22/02/2026		0	Domingo
23/02/2026	Tierra	5	
24/02/2026	Tierra	3	
25/02/2026	Tierra	10	
26/02/2026	Tierra	12	
27/02/2026	Tierra	12	
28/02/2026		0	Terreno saturado
TOTAL		**124**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA EL COLEGIO				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (KM)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	0,1	0,1		
2/02/2026	0,1	0,2		
3/02/2026	0,1	0,3		
4/02/2026	0,1	0,4		
5/02/2026	0,1	0,5		
6/02/2026	0,1	0,6		
7/02/2026	0,1	0,7		
8/02/2026	0,1	0,8		
9/02/2026	0,05	0,85		
10/02/2026	0,03	0,88		
11/02/2026	0,1	0,98		
12/02/2026	0,1	1,08		
13/02/2026	0,1	1,18		
14/02/2026	0,1	1,28		
15/02/2026	0	1,28		Sin Actividades
16/02/2026	0,1	1,38		
17/02/2026	0,06	1,44		
18/02/2026	0,06	1,5		
19/02/2026	0,1	1,6		
20/02/2026	0,15	1,75		
21/02/2026	0,1	1,85		
22/02/2026	0	1,85		Domingo
23/02/2026	0,1	1,95		
24/02/2026	0,05	2		
25/02/2026	0,15	2,15		
26/02/2026	0,15	2,3		
27/02/2026	0,15	2,45		
28/02/2026	0	2,45		Terreno saturado
TOTAL		**2,45**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026			8	Traslado
2/02/2026			8	Soleado
3/02/2026			8	Soleado
4/02/2026			8	Soleado
5/02/2026			8	Soleado
6/02/2026			8	Soleado
7/02/2026			8	Soleado
8/02/2026	3		5	Lluvioso
9/02/2026			8	Soleado
10/02/2026			8	Soleado
11/02/2026			8	Soleado
12/02/2026			8	Soleado
13/02/2026			8	Soleado
14/02/2026			8	Soleado
15/02/2026		8	0	Sin Actividades
16/02/2026			8	Soleado
17/02/2026			8	Soleado
18/02/2026			8	Soleado
19/02/2026			8	Soleado
20/02/2026			8	Soleado
21/02/2026			8	Soleado
22/02/2026			0	Domingo
23/02/2026			8	Soleado
24/02/2026	2		6	Lluvioso
25/02/2026	3		5	Lluvioso
26/02/2026	3		5	Lluvioso
27/02/2026			8	Soleado
28/02/2026	3		5	Lluvioso
TOTAL	**14**	**8**	**194**	













8. MOVILIZACIONES












No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes


















10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	EL COLEGIO						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	1T0310KXJDE247712
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁRCO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/02/2026			9789,2	9792	2,8	2,2	Sin actividades
2/02/2026			9792	9800,9	8,9		
3/02/2026			9800,9	9808,6	7,7		
4/02/2026			9808,6	9817,6	9		
5/02/2026			9817,6	9827,3	9,7		
6/02/2026			9827,3	9832,1	4,8		
7/02/2026			9832,1	9840,8	8,7		



8/02/2026			9840,8	9849,5	8,7		
9/02/2026			9849,5	9855,7	6,2		
10/02/2026			9860,3	9865,5	5,2		
11/02/2026			9865,5	9873	7,5		
12/02/2026			9873	9878	5		
13/02/2026			9878	9883,3	5,3		
14/02/2026			9883,3	9889,7	6,4		
15/02/2026			9889,7	9889,7	0		Falla mecanica
16/02/2026			9893,1	9899,8	6,7		
17/02/2026			9899,8	9905,3	5,5		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

18/02/2026			9905,3	9914,2	8,9		
19/02/2026			9914,2	9923,6	9,4		
20/02/2026			9923,6	9930,4	6,8		
21/02/2026			9930,4	9937,6	7,2		
22/02/2026			9937,6	9937,6	0		Domingo
23/02/2026			9937,6	9942,8	5,2		
24/02/2026			9942,8	9948,8	6		
25/02/2026			9948,8	9955,9	7,1		
26/02/2026			9955,9	9961	5,1		
27/02/2026			9961	9969,1	8,1		
28/02/2026			9969,1	9969,1	0	5	Terreno saturado
SUBTOTAL MES					**171,9**	**7,2**	
TOTAL MES					**179,1**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves Prieto**		**Nombre:**		**Damian Cespedes**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025


	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA							
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	FEBRERO							
MUNICIPIO:	EL COLEGIO							
MAQUINA:	VOLQUETA						SERIE	UPT265
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS/ KM	DIAS TRABAJADOS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/02/2026			342185	342205	20	1		
2/02/2026			342205	342252	47	1		
3/02/2026			342252	342315	63	1		
4/02/2026			342315	342376	61	1		
5/02/2026			342376	342405	29	1		
6/02/2026			342405	342421	16	1		
7/02/2026			3004	3009	5	1		Cambio volqueta
8/02/2026			3009	3009	0		1	Sin actividades - Lluvias
9/02/2026			3009	3009	0	0		Mantenimiento
10/02/2026			3016	3022	6	1		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11/02/2026			3024	3033	9	1		
12/02/2026			3033	3042	9	1		
13/02/2026			3053	3058	5	1		
14/02/2026			19945	19950	5	1		Cambio volqueta
15/02/2026			19950	19950	0		1	Sin Actividades
16/02/2026			459460	459500	40	1		
17/02/2026			459500	459554	54	1		
18/02/2026			459554	459572	18	1		
19/02/2026			459572	459617	45	1		
20/02/2026			459617	459677	60	1		
21/02/2026			459677	459681	4	1		
22/02/2026			459681	459681	0	0		Domingo

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

23/02/2026			459681	459705	1		
24/02/2026			459705	459707	1		
25/02/2026			459707	459732	1		
26/02/2026			459732	459757	1		
27/02/2026			459757	459782	1		
28/02/2026			459782	459782		1	Terreno saturado
SUBTOTAL MES					**23**	**3**	
TOTAL MES						**26**	
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves Prieto**		**Nombre:**		**Damian Cespedes**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo del Colegio de la provincia del Tequendama, permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de pasos críticos afectados por derrumbes, abarcando un total de 2.45 km intervenidos y la remoción de 124 viajes de material. Estas labores se desarrollaron durante un periodo operativo de 194 horas, con jornadas de 8 horas efectivas de trabajo y 14 horas condicionadas por lluvias, lo que evidencia el compromiso y la capacidad de respuesta ante condiciones adversas. Las acciones realizadas en las veredas Pítala, Misiones Bajo, Trujillo, Santa Martha, El Tigre, Las Palmas y Entre Ríos contribuyeron significativamente a restablecer la conectividad vial, mejorar las condiciones de tránsito y mitigar riesgos para la población. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la comunidad beneficiada.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Terreno saturado	Conformación de vía	Cargue de volqueta
		
Derrumbe en la vía	Limpieza de derrumbe	Limpieza de derrumbe

Damián Cespedes
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: QUIPILE

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE QUIPILE

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

Quipile:

1. Retroexcavadora Alquilada CAT0426FVEJ401856:

Ubicación:

Quipile – Vereda Líbano, Galilea, Santa Cruz, Oriente coordenadas 4°45'55.83"N 74°27'49.17"W

Imagen 1 ubicación de la maquina



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	José Luis Trujillo
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT 14459	Robinson Reyes

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Quipile

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUIPILE
NIT. 899.999.431-0

CRONOGRAMA - INTERVENCION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA

PERIODO	AÑO	2026		
	MES	FEBRERO	MARZO	
	SEMANA	4	5	6
SECTOR	Vereda Libano, Galilea, Santa Cruz, Oriente, Union Baja, La libertad, Arabia			

Fuente: Alcaldía de Quipile

Actualmente se cuenta con un 20% de avance con respecto al cronograma establecido

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

26/02/2026

Actividades: El día de hoy llega a el municipio de Quipile una retroexcavadora CAT0426FVEJ401856 alquilada, la cual realiza retiro de derrumbe que estaba afectando a viviendas de la comunidad, luego realizo el cargue de material en la volqueta del municipio.
Sector: Vereda Arabia
Longitud: 0.02 km
Viajes:
Combustible:

Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT0426FVEJ401856: 9485.4 – 9494.9
27/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora CAT0426FVEJ401856 alquilada realizo retiro de derrumbe. Limpieza de canales y conformación de vía en la vereda Arabia
Sector: Vereda Arabia
Longitud: 0.35 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT0426FVEJ401856: 9494.9 – 9504.6
28/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora CAT0426FVEJ401856 alquilada realizo retiro de derrumbe. Limpieza de canales y conformación de vía en la Vereda Unión Baja, Santa Cruz, La libertad
Sector: Vereda Unión Baja, Santa Cruz, La libertad
Longitud: 0.6 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora CAT0426FVEJ401856: 9504.6 – 9514.3

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

No aplica

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA QUIPILE				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026				
17/02/2026				
18/02/2026				
19/02/2026				
20/02/2026				
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026				
25/02/2026				
26/02/2026	0,02	0,02		Inicio de actividades
27/02/2026	0,35	0,37		
28/02/2026	0,6	0,97		
TOTAL		**0,97**	0	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026				
17/02/2026				
18/02/2026				
19/02/2026				
20/02/2026				
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026				
25/02/2026				
26/02/2026			8	Inicio de actividades
27/02/2026			8	
28/02/2026			8	
TOTAL	**0**	**0**	**24**	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	QUIPILE						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	CAT 14459
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
26/02/2026			9485,4	9494,9	9,5		
27/02/2026			9494,9	9504,6	9,7		
28/02/2026			9504,6	9514,3	9,7		
SUBTOTAL MES					28,9	0	
TOTAL MES					28,9		
Firma			Firma				
Nombre:	Carlos Ivan Chaves Prieto		Nombre:	Jose Luis Trujillo			
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de Quipile permitieron atender de manera oportuna las necesidades de mantenimiento vial, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, enfocada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de puntos críticos, alcanzando un avance total de 0,97 km intervenidos.

Estas labores se desarrollaron en las veredas Unión Baja, La Libertad y Arabia, durante un periodo operativo de 24 horas efectivas de trabajo, sin registro de afectaciones por lluvias, lo que permitió una ejecución continua y eficiente de las actividades.

En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la mejora de la conectividad vial y las condiciones de tránsito para la comunidad beneficiada.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Conformación de vía	Limpieza de canales	Derrumbe en la vía
		
Derrumbe en la vía	Limpieza de derrumbe	Conformación de vía

José Luis Trujillo
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: ANAPOIMA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE ANAPOIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

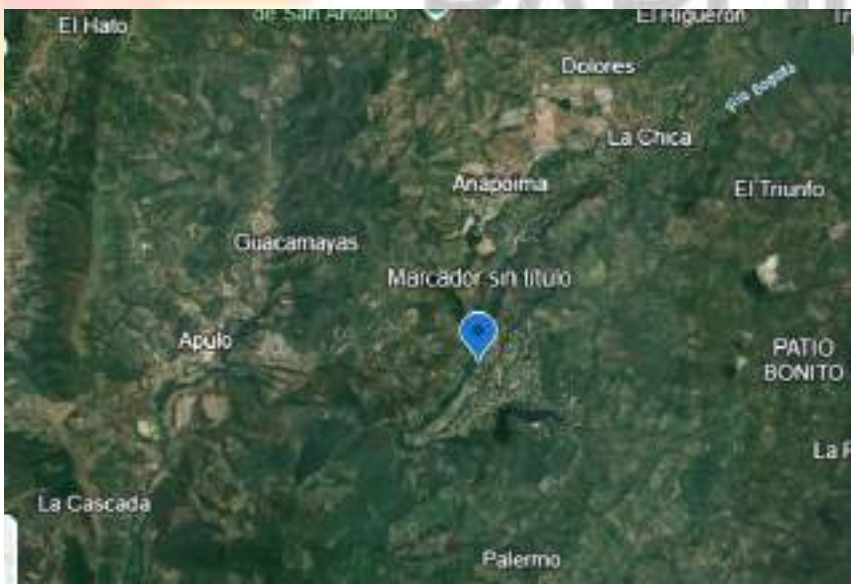
Anapoima:

1. VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 3003607
2. VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL 4300 SBA 4x2 ODT373
3. MOTONIVELADORA CAT CAT0120KPJAP07183

Ubicación:

Anapoima - Golconda sector ramal San Antonio, Puerto López, Samano, El rubí, Guacarí, Berlín, coordenadas 4°34'16.29"N 74°25'13.11"W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	José Luis Trujillo
OPERADOR VOLQUETA ODT 737	Víctor Beltrán
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 3003607	Brayan Sánchez
OPERADOR MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183	Jhon Moreno

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Anapoima

MUNICIPIO DE ANAPOIMA	CRONOGRAMA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA ICCU		
	MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETA		
Actividades / Semanas	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Conformacion en la vereda golconda sector ramal "San Antonio".			
Reparcheo con fresado y emulsión asfáltica en vía secundaria que conecta el sector Puerto López con la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "Sámano" de la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "El Rubí" de la vereda La Esmeralda.			
Conformación del ramal "Guacari" de la vereda Golconda.			
Conformación del ramal "Berlín" de la vereda Golconda.			

Fuente: Alcaldía de Anapoima

Actualmente se cuenta con un 5% de avance con respecto al cronograma establecido

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

24/02/2026

Actividades El día de hoy llega al municipio de Anapoima el Vibro compactador 3003607 y la volqueta ODT373, los cuales quedan disponibles sin actividades asignadas por la logística de la alcaldía.

Sector: Patio Bonito

Longitud:

Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Vibro compactador 3003607: 2696 - 2696
- Volqueta ODT373: 8558.1 – 8558.1

25/02/2026
Actividades El día de hoy llega al municipio de Anapoima la motoniveladora CAT 7183, el Vibro compactador 3003607 y la volqueta ODT373, disponibles sin actividades asignadas por la logística de la alcaldía.
Sector: Patio Bonito
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 2 hras lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

- Vibro compactador 3003607: 2696 - 2696
- Volqueta ODT373: 8558.1 – 8561.2
- Motoniveladora CAT 7183: 7187.5 – 7187.5

26/02/2026
Actividades El día de hoy la motoniveladora CAT 7183 realizo conformación nivelación y limpieza de cunetas, luego realizo conformación de vía con recebo, el Vibro compactador 3003607 realizo la compactación de 7 viajes de recebo en el sector de San Antonio y la volqueta ODT373 realizo el transporte de 7 viajes de recebo hacia la vía San Antonio.
Sector: Golconda - San Antonio
Longitud: 1.2 km
Viajes: 7
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Volqueta ODT373: Presenta fuga de ACPM en tanque de combustible, se requiere engrase de sprinderes y crucetas
Horas trabajadas inicio-fin

- Vibro compactador 3003607: 2696 - 2701
- Volqueta ODT373: 8558.1 – 8566.7
- Motoniveladora CAT 7183: 7187.5 – 7194.2

27/02/2026

Actividades El día de hoy la motoniveladora CAT 7183 realizo conformación nivelación y limpieza de cunetas, luego realizo conformación de vía con recebo, el Vibro compactador 3003607 realizo la compactación de 7 viajes de recebo en el sector de San Antonio y la volqueta ODT373 realizo el transporte de 9 viajes de recebo hacia la vía San Antonio.
Sector: Golconda - San Antonio
Longitud: 0.5 km
Viajes: 9
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Volqueta ODT373: Presenta fuga de ACPM en tanque de combustible, se requiere engrase de sprinderes y crucetas
Horas trabajadas inicio-fin

- Vibro compactador 3003607: 2701 - 2705
- Volqueta ODT373: 8566.7 – 8572.2
- Motoniveladora CAT 7183: 7194.2 – 7199.2

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026			
2/02/2026			
3/02/2026			
4/02/2026			
5/02/2026			
6/02/2026			
7/02/2026			
8/02/2026			
9/02/2026			
10/02/2026			
11/02/2026			
12/02/2026			
13/02/2026			
14/02/2026			
15/02/2026			
16/02/2026			
17/02/2026			
18/02/2026			
19/02/2026			
20/02/2026			
21/02/2026			
22/02/2026			
23/02/2026			
24/02/2026		0	Llegada equipos
25/02/2026		0	Sin actividades
26/02/2026	Recebo	7	
27/02/2026	Recebo	9	
28/02/2026	0		Sábado
TOTAL		**16**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA ANAPOIMA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026				
17/02/2026				
18/02/2026				
19/02/2026				
20/02/2026				
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026	0	0		Llegada equipos
25/02/2026	0	0		Sin actividades
26/02/2026	1,2	1,2		
27/02/2026	0,5	1,7		
28/02/2026	0	1,7		Sábado
TOTAL		**1,7**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026				
10/02/2026				
11/02/2026				
12/02/2026				
13/02/2026				
14/02/2026				
15/02/2026				
16/02/2026				
17/02/2026				
18/02/2026				
19/02/2026				
20/02/2026				
21/02/2026				
22/02/2026				
23/02/2026				
24/02/2026			8	Soleado
25/02/2026	2		6	Luvias intermitentes
26/02/2026			8	Soleado
27/02/2026			8	Soleado
28/02/2026			0	Sábado
TOTAL	**2**	**0**	**30**	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES ANAPOIMA					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
24/02/2026	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70	3003607	Brayan Sanchez	Venecia	Anapoima
24/02/2026	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL 4300 SBA 4x2	ODT373	Victor Beltran	Carmen de Capura	Anapoima
25/02/2026	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	CAT0120KPJAP07183	Jhon Moreno	Madrid	Anapoima

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Vibro compactador 3003607

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	FEBRERO											
MUNICIPIO:	ANAPOIMA						PROVINCIA:	TEQUENDAMA				
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70						SERIE	3003607				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/02/2026												
2/02/2026												
3/02/2026												
4/02/2026												
5/02/2026												
6/02/2026												
7/02/2026												
8/02/2026												
9/02/2026												
10/02/2026												
11/02/2026												
12/02/2026												
13/02/2026												
14/02/2026												
15/02/2026												
16/02/2026												
17/02/2026												
18/02/2026												
19/02/2026												
20/02/2026												
21/02/2026												
22/02/2026												
23/02/2026												
24/02/2026	2696	2696	0									
25/02/2026	2696	2696	0									
26/02/2026	2696	2701	5									
27/02/2026	2701	2705	4									
28/02/2026	2705	2705	0									
TOTAL MES			9,00	0,00		0,00		0,00		0,00		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

VOLQUETA ODT373

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	FEBRERO	
MUNICIPIO:	ANAPOIMA	PROVINCIA: TEQUENDAMA
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL 4300 SBA 4x2	SERIE ODT373

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/02/2026												
2/02/2026												
3/02/2026												
4/02/2026												
5/02/2026												
6/02/2026												
7/02/2026												
8/02/2026												
9/02/2026												
10/02/2026												
11/02/2026												
12/02/2026												
13/02/2026												
14/02/2026												
15/02/2026												
16/02/2026												
17/02/2026												
18/02/2026												
19/02/2026												
20/02/2026												
21/02/2026												
22/02/2026												
23/02/2026												
24/02/2026	8558,1	8558,1	0									
25/02/2026	8558,1	8566,7	8,6									
26/02/2026	8566,7	8566,7	0									
27/02/2026	8566,7	8572,2	5,5									
28/02/2026	8572,2	8572,2	0									
TOTAL MES			14,10	0,00		0,00		0,00		0,00		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

MOTONIVELADORA 7183

OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",**							
PERIODO:	**FEBRERO**							
MUNICIPIO:	**ANAPOIMA**			**PROVINCIA:**	**TEQUENDAMA**			
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CAT			**SERIE**	**CAT0120KPJAP07183**			
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HOROMETRO DE TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No, TIRILLA**	
1/02/2026								
2/02/2026								
3/02/2026								
4/02/2026								
5/02/2026								
6/02/2026								
7/02/2026								
8/02/2026								
9/02/2026								
10/02/2026								
11/02/2026								
12/02/2026								
13/02/2026								
14/02/2026								
15/02/2026								
16/02/2026								
17/02/2026								
18/02/2026								
19/02/2026								
20/02/2026								
21/02/2026								
22/02/2026								
23/02/2026								
24/02/2026								
25/02/2026	7185,7	7185,7	0					
26/02/2026	7185,7	7194,2	8,5					
27/02/2026	7194,2	7199,2	5					
28/02/2026	7199,2	7199,2	0					
TOTAL MES			**13,50**	**0,00**		**0,00**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de Anapoima permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de pasos críticos afectados, abarcando un avance total de 1.7 kilómetros intervenidos y la disposición de seis viajes de recebo. Estas labores se desarrollaron durante un periodo operativo de 30 horas efectivas de trabajo y 2 horas condicionadas por lluvias, evidenciando la capacidad de respuesta ante condiciones adversas. Las acciones realizadas en las veredas Golconda y San Antonio contribuyeron significativamente a restablecer la conectividad vial, mejorar las condiciones de tránsito y mitigar riesgos para la población. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la comunidad beneficiada.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Transporte de equipos	Terreno saturado	Cargue de volqueta
		
Descargue de recebo	Conformación de vía	Compactación de vía

José Luis Trujillo
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE

FRESADO QUIPILE

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE FRESADO QUIPILE

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama: Vía El Colegio – El Charquito

San Antonio del Tequendama:

1. Volqueta sencilla GZM757
2. Volqueta doble troque NGQ553

Ubicación:

Quipile – Vía "La Sierra": 4.5939 N, 74.3987 W

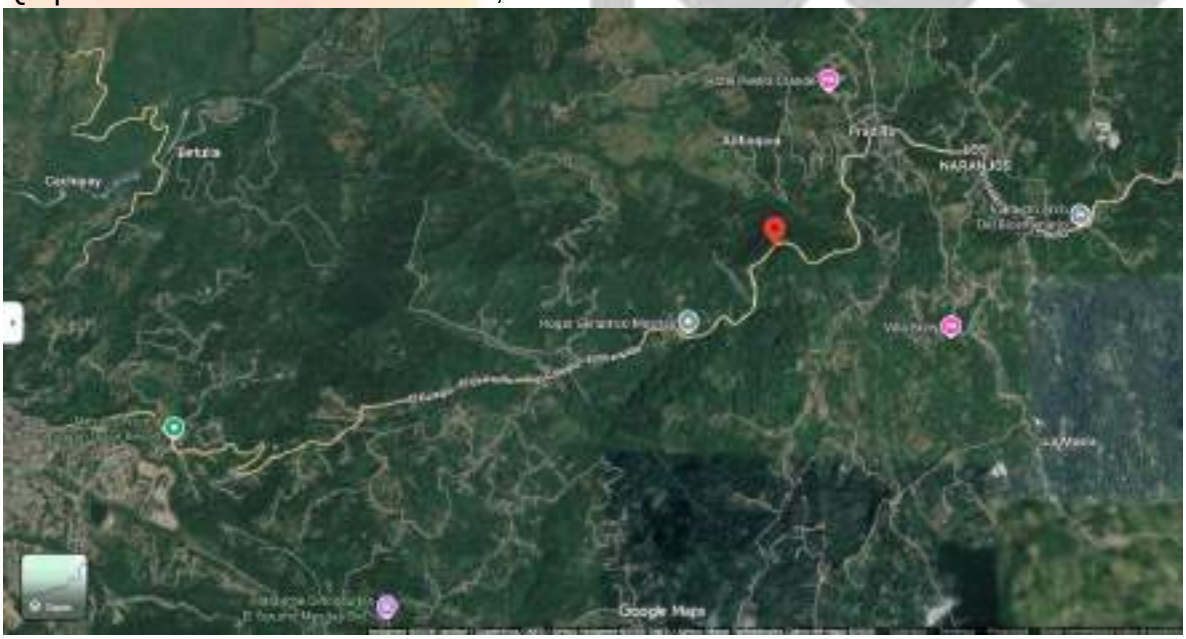
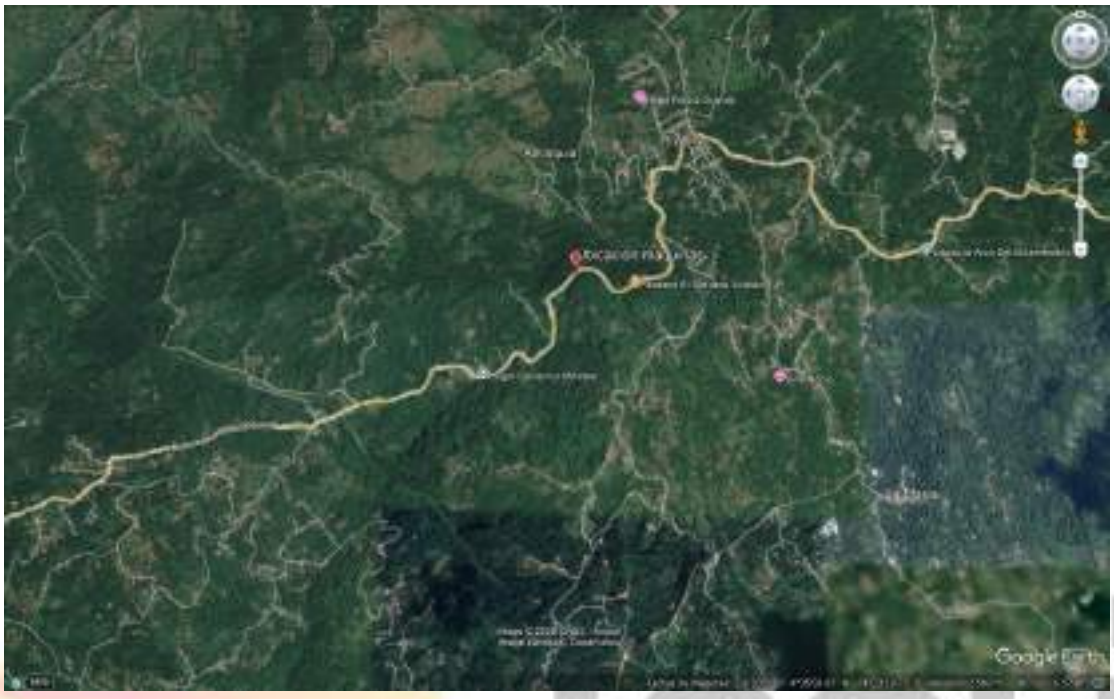


Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	CESAR PEREZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHAN HANNER HERNANDEZ
OPERADOR VOLQUETA NGQ553	JOSE ISIDRO RIOS
OPERADOR VOLQUETA GZM757	OMAR ESPINEL

3. PLAN DE TRABAJO

Transporte de material fresado hacia el municipio de Quipile para actividades de mejoramiento vial, según requerimientos inmediatos.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

23/02/2026

ACTIVIDADES:
Se realiza traslado de vehículos volqueta sencilla GZM757 y volqueta NGQ553, desde el municipio de Tabio hasta el municipio de El colegio. Se realiza cargue de

material de fresado proveniente de la maquina fresadora ubicada en el municipio de El Colegio y es trasladado al municipio de Quipile, vía la sierra.

SECTOR:
Vía “La Sierra” Cajitas

LONGITUD:
La actividad corresponde al cargue y traslado de fresado. 238Km recorridos volqueta GZM757, 230 km recorridos NGQ553 230.

COMBUSTIBLE:

Equipo	Volumen ACPM	Km de tanqueo
Volqueta GZM757	0	
Volqueta NGQ553	34.392	10131

CLIMA:
Soleado

ESTADO DE LA MAQUINARIA:
Maquinaría operativa.

HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):

- Volqueta GZM757: 50232 – 50470
- Volqueta NGQ553: 10036 – 10266

24/02/2026

ACTIVIDADES:
Se realiza cargue de material de fresado proveniente de la maquina fresadora, ubicada en el municipio de El Colegio y es trasladado al municipio de Quipile, al acopio de la alcaldía.

SECTOR:
Vía El Charquito – San Antonio del Tequendama – El Colegio

LONGITUD:
La actividad corresponde al cargue y traslado de fresado. 111 Km recorridos volqueta GZM757, y 108 km recorridos NGQ553.

COMBUSTIBLE:

Equipo	Volumen ACPM	Km de tanqueo
Volqueta GZM757	30.027	50485
Volqueta NGQ553	0	---

CLIMA:
Soleado

ESTADO DE LA MAQUINARIA:
Maquinaría operativa.

HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):

- Volqueta GZM757: 50470 - 50581
- Volqueta NGQ553: 10266 - 10374

25/02/2026

ACTIVIDADES:
No se programan actividades de fresado, se realiza el tanqueo de la volqueta NGQ553 y se deja a disponibilidad. Se realiza traslado de la volqueta GZM757 a otro frente de trabajo.

SECTOR:
Vía “La Sierra” Cajitas

LONGITUD:
8km recorrido volqueta NGQ553

COMBUSTIBLE:

Equipo	Volumen ACPM	Km de tanqueo
Volqueta NGQ553	52.22	10375

CLIMA:
Soleado

ESTADO DE LA MAQUINARIA:
Maquinaría operativa.

HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):

- Volqueta NGQ553: 10374 – 10388

26/02/2026

ACTIVIDADES:
No se programan actividades de fresado, se realiza el tanqueo de Urea a la volqueta NGQ553 y se deja a disponibilidad. Se realiza traslado de la volqueta NGQ553 a otro frente de trabajo.

SECTOR:
Vía “La Sierra” Cajitas

LONGITUD:
8km recorrido volqueta NGQ553

COMBUSTIBLE:

Equipo	Volumen ACPM	Km de tanqueo
Volqueta NGQ553	52.22	10375

Equipo	Volumen Urea	Km de tanqueo
Volqueta NGQ553	52.22	10375

CLIMA:
Soleado

ESTADO DE LA MAQUINARIA:
Maquinaría operativa.

HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):

- Volqueta NGQ553: 10374 – 10388

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---
2/02/2026	---	---	---
3/02/2026	---	---	---
4/02/2026	---	---	---
5/02/2026	---	---	---
6/02/2026	---	---	---
7/02/2026	---	---	---
8/02/2026	---	---	---
9/02/2026	---	---	---
10/02/2026	---	---	---
11/02/2026	---	---	---
12/02/2026	---	---	---
13/02/2026	---	---	---
14/02/2026	---	---	---
15/02/2026	---	---	---
16/02/2026	---	---	---
17/02/2026	---	---	---
18/02/2026	---	---	---
19/02/2026	---	---	---
20/02/2026	---	---	---
21/02/2026	---	---	---
22/02/2026	---	---	---
23/02/2026	**F**resado	**2**	Un viaje de fresado de la volqueta GZM757 y Un viaje de fresado de la volqueta NGQ553 hasta la vía la Sierra, municipio de Quipile
24/02/2026	**F**resado	**2**	Un viaje de fresado de la volqueta GZM757 y Un viaje de fresado de la volqueta NGQ553 hasta acopio Alcaldía Quipile
25/02/2026	---	---	Disponible
26/02/2026	---	---	---
27/02/2026	---	---	---
28/02/2026	---	---	---
TOTAL		**4**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA SAN ANOTNIO DEL TEQUENDAMA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---
6/02/2026	---	---	---	---
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	---	---	---	---
10/02/2026	---	---	---	---
11/02/2026	---	---	---	---
12/02/2026	---	---	---	---
13/02/2026	---	---	---	---
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	---	---	---	---
17/02/2026	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	---	---
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	---	---	---	---
24/02/2026	---	---	---	---
25/02/2026	---	---	---	---
26/02/2026	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL				

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---
6/02/2026	---	---	---	---
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	---	---	---	---
10/02/2026	---	---	---	---
11/02/2026	---	---	---	---
12/02/2026	---	---	---	---
13/02/2026	---	---	---	---
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	---	---	---	---
17/02/2026	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	---	---
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	---	---	8	Estado del clima
24/02/2026	---	---	8	Estado del clima
25/02/2026	---	---	8	Estado del clima
26/02/2026	---	---	8	Estado del clima
27/02/2026	---	---	8	Movilización a Nemocón
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL			**40**	

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
23/02/2026	Volqueta sencilla	GZM757	Omar Espinel	Tabio	San Antonio Del Tequendama
23/02/2026	Volqueta debletroque	NGQ553	José Isidro Ríos	Tabio	San Antonio Del Tequendama
25/02/2026	Volqueta sencilla	GZM757	Omar Espinel	Tabio	Venecia
26/02/2026	Volqueta dobletroque	NGQ553	José Isidro Ríos	San Antonio del Tequendama	Nemocón

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 control de horas maquinas Propias

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	1/02/2026 - 28/02/2026											
MUNICIPIO:	EL COLEGIO						PROVINCIA:	TEQUENDAMA				
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA						SERIE	GZM757				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETR INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/02/2026	---	---	---	---	---	---	---					
2/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
7/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
9/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23/02/2026	3755	3767	12	---	---	---	---	---	---	---	---	
24/02/2026	3767	3775	8	30,027	50485	---	YFP4-847592	---	---	---	---	
25/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Traslado otro frente
26/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL MES			20					---	---	---	---	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	1/02/2026 - 28/02/2026											
MUNICIPIO:	EL COLEGIO						PROVINCIA:	TEQUENDAMA				
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLETROQUE						SERIE	NGQ553				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETR INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/02/2026	---	---	---	---	---	---	---					
2/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
5/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
6/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
7/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
8/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
9/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23/02/2026	662	672	10	34,392	10131	---	104101	---	---	---	---	
24/02/2026	672	680	8	---	---	---	---	---	---	---	---	
25/02/2026	680	681	1	52,22	10375	4,7	YFP-848016	---	---	---	---	
26/02/2026	681	681	0	---	---	---	---	20	681	---	99957	Una pimpina de Urea
27/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Traslado a otro frente
28/02/2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL MES			**19**	**86,612**		4,7		**20**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- Se realizaron cuatro (04) viajes para el transporte de aproximadamente 35 m³ de material producto de fresado, desde el municipio de El Colegio hasta el municipio de Quipile.
- Durante la jornada se apoyaron las actividades de fresado mediante el cargue oportuno del material, lo cual permitió disminuir los tiempos inoperativos de la fresadora ocasionados por la espera de volquetas, optimizando el rendimiento de la actividad.
- Los días 23 y 24 de febrero fue necesaria la operación adicional de las volquetas de placas GZM757 y NGQ553, con el fin de completar el transporte total del material fresado conforme a la programación establecida.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Cargue de fresado: La volqueta de placas GZM 757 recibe el material fresado directamente desde la banda transportadora de la fresadora.	**Cargue de fresado:** La volqueta de placas NGQ 553 recibe el material fresado directamente desde la banda transportadora de la fresadora.
	
Descargue de fresado: La volqueta de placas GZM 757 descarga el material en el punto indicado.	**Descargue de fresado:** La volqueta de placas NGQ 553 descarga el material en el punto indicado.
	
Cargue de fresado: La volqueta de placas GZM 757 recibe el material fresado directamente desde la banda transportadora de la fresadora.	**Cargue de fresado:** La volqueta de placas NGQ 553 recibe el material fresado directamente desde la banda transportadora de la fresadora.

	
Descargue de fresado: La volqueta de placas GZM 757 descarga el material en el punto indicado.	**Descargue de fresado:** La volqueta de placas NGQ 553 descarga el material en el punto indicado.
	
Disponibilidad volqueta NGQ553	**Tanqueo 20 LITROS urea volqueta NGQ553**

JHAN HANNER HERNANDEZ
INSPECTOR ICCU

CÉSAR AUGUSTO PÉREZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

San Antonio:

1. Retroexcavadora Alquilada MC040952:

Ubicación:

Quipile – Vereda Zaragoza, Chicaque, Agustinas, Laguna grande, La María, Santivar, Caicedo, Ponchos coordenadas 4°37'24.96"N 74°20'56.97"W

Imagen 1 ubicación de la maquina



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Leonardo Guerra
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT 14459	Alejandro Barbosa

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de San Antonio



Fuente: Alcaldía de San Antonio

Actualmente se cuenta con un 30% de avance con respecto al cronograma establecido

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

05/02/2026
Actividades: El día de hoy llega a el municipio de San Antonio una retroexcavadora alquilada, la cual realizo limpieza de canales, excavación y relleno para encausar aguas colindantes al puente de Zaragoza.
Sector: Zaragoza
Longitud: 0.02 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22204.4 – 22208.8
06/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza despeje y conformación de vía en la vereda Chicaque.
Sector: Vereda Chicaque
Longitud: 0.03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22208.8 – 22216.6
09/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza despeje y encause de aguas que en temporada de lluvia se desborda y causa afectaciones a la vía que conduce Bellavista con Santandecito, sector alto de la palma.
Sector: Alto de la Palma
Longitud: 0.03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22227.2 – 22235.4
10/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada junto a la volqueta de la administración realiza despeje de derrumbe en sector puente la playa de Chicaque.
Sector: Puente la playa Chicaque

Longitud: 0.08 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22235.4 – 22242.2
11/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada junto a la volqueta de la administración realiza despeje de derrumbe en sector puente la playa de Chicaque.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud: 0.08 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22242.5 – 22250.8
12/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada no realiza actividades.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22250.8 – 22250.8
13/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada no realiza actividades.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22250.8 – 22250.8
14/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada no realiza actividades.

Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora 031060335 Alq: 22250.8 – 22250.8
16/02/2026
Actividades: El día de hoy llega una retroexcavadora alquilada, disponible sin actividades programadas por constantes lluvias en la zona de trabajo.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 4 hrs lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4942.7 – 4942.7
17/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada, realiza retiro de derrumbe y habitación de paso crítico, se retira material saturado de vía en el sector Chicaque.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud: 0,03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4942.7 – 4949
18/02/2026
Actividades: El día de hoy se presentan lluvias intermitentes en horas de la mañana, en la tarde la retroexcavadora alquilada, realiza retiro de material saturado de vía en el sector Chicaque
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud: 0,03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin

Retroexcavadora MC040952 Alq: 4949 – 4953

19/02/2026

Actividades: El día de hoy se presentan lluvias intermitentes en horas de la mañana, en la tarde la retroexcavadora alquilada, realiza retiro de material saturado de vía en el sector Chicaque.
Sector: Puente la playa Chicaque
Longitud: 0,03 km
Viajes:
Combustible:
Clima: 3 hrs lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4949 – 4953

20/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza excavación y conformación para filtro tipo francés en la vía de la vereda La Sausa, sector Laguna Grande.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud: 0,06 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4958.1 – 4965.4
23/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza extracción de la motoniveladora de la alcaldía, dado que había quedado enterrada por terreno saturado, luego realiza conformación de via en la vereda La Sausa, sector Laguna Grande.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud: 0,05 km
Viajes:
Combustible:
Clima: 3 Hras lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4965.4 – 4971.5
24/02/2026
Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza limpieza de canales, luego realiza conformación de vía en la vereda La Sausa, sector Laguna Grande.
Sector: La Sausa, Laguna Grande

Longitud: 0,1 km
Viajes:
Combustible:
Clima: 2 Hras lluvia
Estado de la maquinaria: Operativa
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4971.5 –

25/02/2026

Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza limpieza de canales, en horas de la tarde la maquina presenta falla mecánica en la vereda La Sausa, sector Laguna Grande.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud: 0,05 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: falla mecánica se corrige en horas de la tarde
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4980 – 4984.1

26/02/2026

Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada realiza limpieza de canales, conformación de vía y retiro de material sobrante en la vereda La Sausa, sector Laguna Grande.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud: 0,25 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: falla mecánica se corrige en horas de la tarde
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952 Alq: 4984.1 – 4993.2

27/02/2026

Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada no realizo actividades dado que el operador tenía una cita médica en Bogotá.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: falla mecánica se corrige en horas de la tarde
Horas trabajadas inicio-fin

Retroexcavadora MC040952 Alq: 4993.2 – 4993.2
28/02/2026

Actividades: El día de hoy la retroexcavadora alquilada estuvo disponible sin actividades asignadas por la logística de la alcaldía.
Sector: La Sausa, Laguna Grande
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria: falla mecánica se corrige en horas de la tarde
Horas trabajadas inicio-fin
Retroexcavadora MC040952
Alq: 4993.2 – 4993.2

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

No aplica

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA SAN ANTONIO				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026	0,02	0,02		
6/02/2026	0,03	0,05		
7/02/2026	0	0,05		Sabado
8/02/2026	0	0,05		Domingo
9/02/2026	0,03	0,08		
10/02/2026	0,08	0,16		
11/02/2026	0,08	0,24		
12/02/2026	0	0,24		No trabajo
13/02/2026	0	0,24		No trabajo
14/02/2026	0	0,24		Sabado
15/02/2026	0	0,24		Domingo
16/02/2026	0	0,24		Lluvias intermitentes
17/02/2026	0,03	0,27		
18/02/2026	0,03	0,3		
19/02/2026	0,03	0,33		
20/02/2026	0,06	0,39		
21/02/2026	0	0,39		Sabado
22/02/2026	0	0,39		Domingo
23/02/2026	0,05	0,44		
24/02/2026	0,1	0,54		
25/02/2026	0,05	0,59		
26/02/2026	0,25	0,84		
27/02/2026	0	0,84		
28/02/2026	0	0,84		Sabado
TOTAL		**0,84**	0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026			8	Llegada de maquina
6/02/2026			8	
7/02/2026			0	Sabado
8/02/2026			0	Domingo
9/02/2026			8	
10/02/2026			8	
11/02/2026			8	
12/02/2026		0		No se trabajo
13/02/2026		0		No se trabajo
14/02/2026			0	Sabado
15/02/2026			0	Domingo
16/02/2026	4		4	Lluvias intermitentes
17/02/2026			8	
18/02/2026			8	
19/02/2026	3		5	Lluvias intermitentes
20/02/2026			8	
21/02/2026			0	Sabado
22/02/2026			0	Domingo
23/02/2026	3		5	Lluvias intermitentes
24/02/2026	2		6	Lluvias intermitentes
25/02/2026			8	
26/02/2026			8	
27/02/2026		0		Cita medica
28/02/2026			0	Sabado
TOTAL	**12**	**0**	**100**	



8. MOVILIZACIONES









No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS










No se realizaron mantenimientos en este mes

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	SAN ANTONIO						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	MC040952
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁRCO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
5/02/2026			22204,2	22208,8	4,6	0,4	Sin actividades
6/02/2026			22208,8	22216,6	7,8		
7/02/2026			22216,6	22216,6	0		No trabajo
8/02/2026			22216,6	22216,6	0		Domingo
9/02/2026			22227,2	22235,4	8,2		
10/02/2026			22235,4	22242,2	6,8		

11/02/2026			22242,2	22250,8	8,6		RETIRO DE MAQUINA
12/02/2026					0		
13/02/2026					0		
14/02/2026					0		
15/02/2026					0		
16/02/2026			4942,7	4942,7	0	5	Llega otra maquina - LLuvias
17/02/2026			4942,7	4949	6,3		
18/02/2026			4949	4953	4	1	LLuvias
19/02/2026			4953	4958,1	5,1		
20/02/2026			4958,1	4965,4	7,3		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

21/02/2026			4965,4	4965,4	0	5	Sin Actividades
22/02/2026			4965,4	4965,4	0		Domingo
23/02/2026			4965,4	4971,5	6,1		
24/02/2026			4971,5	4980	8,5		
25/02/2026			4980	4984,1	4,1		Daño maquina
26/02/2026			4984,1	4993,2	9,1		
27/02/2026			4993,2	4993,2	0		Cita medica operador
28/02/2026			4993,2	4993,2	0		No trabajo
SUBTOTAL MES					**86,5**	**11,4**	
TOTAL MES					**97,9**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**Carlos Ivan Chaves Prieto**		**Nombre:**		**Leonardo Guerra**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de San Antonio permitieron atender de manera oportuna las necesidades de mantenimiento vial, garantizando la movilidad y seguridad de las comunidades rurales. La intervención, enfocada en el mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, logró la habilitación de puntos críticos, alcanzando un avance total de 0,84 km intervenidos.

Estas labores se desarrollaron en las veredas Zaragoza, Chicaque, Agustinas, Laguna Grande, La María, Santivar, Caicedo y Ponchos, durante un periodo operativo de 100 horas efectivas de trabajo, con 12 horas condicionadas por lluvias, lo que evidencia la capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas adversas.

En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la mejora de la conectividad vial y las condiciones de tránsito para la comunidad beneficiada.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Conformación de vía	Limpieza de canales	Derrumbe en la vía
		
Maquina enterrada	Filtro en roca	Conformación de vía

Leonardo Guerra
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: TEQUENDAMA
MUNICIPIO: TROCAL DEL TEQUENDAMA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA TEQUENDAMA
MUNICIPIO TRONCAL DEL TEQUENDAMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Tequendama:

Troncal del Tequendama:

1. Minicargador CAT0236DAR4D00853

Ubicación:

Troncal del Tequendama – coordenadas 4°35'25.70"N 74°21'18.70"W

Imagen 1 ubicación de la maquina



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR DE OBRA ICCU	José Luis Trujillo
OPERADOR Minicargador CAT0236DAR4D00853	Fredy López

3. PLAN DE TRABAJO

Cronograma no suministrado por la estación de bomberos Troncal Tequendama

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

09/02/2026
Actividades: El día de hoy llega a la troncal del Tequendama el minicargador CAT0853, el cual realiza el despeje de vía por derrumbe en el KM 20.
Sector: Km 20
Longitud. 0.01 km
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 440 – 447.9
10/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Sector: Estación de Bomberos
Longitud.
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 447.9 – 447.9
11/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, realiza acopio de material fresado en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Sector: Estación de Bomberos
Longitud.
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 447.9 – 448.3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

12/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Longitud.
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 448.3 – 450
13/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Longitud.
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 450 – 450.5
16/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, realizo el extendido de material fresado en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama
Longitud: 0.05 KM
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 450.5 – 453.5
17/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, realizo el extendido de material fresado en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama
Longitud: 0.05 KM
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 453.5 – 456.5
18/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 456.5 – 456.5
19/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, realiza limpieza de derrumbe en el km 17+100 de la Troncal del Tequendama.
Sector: KM 20 +100
Longitud: 0.03 km
Viajes:
Combustible: 13.232 Gl
Minicargador CAT0583: 456.9
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 456.5 – 459.5
20/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Sector:
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 459.5 – 459.5
23/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama por lluvias
Sector:

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 4 hrs lluvia
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 459.5 – 459.5
24/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama por lluvias intermitentes.
Sector:
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 4 hrs lluvia
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 459.5 – 460.2
25/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama por lluvias intermitentes.
Sector:
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: 3 hrs lluvia
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 460.2 – 460.2
26/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama por lluvias intermitentes.
Sector:
Longitud:
Viajes:
Combustible:

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

Clima: 3 hrs lluvia
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 460.2 – 460.2
27/02/2026
Actividades: El día de hoy el minicargador CAT0853, disponible sin actividades asignadas en la estación de Bomberos de la Troncal del Tequendama.
Sector:
Longitud:
Viajes:
Combustible:
Clima: Soleado
Estado de la maquinaria:
Minicargador CAT0853: Operativo
Horas trabajadas inicio-fin
Minicargador CAT0853: 460.2 – 460.2

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

No aplica.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA TRONCAL DEL TEQUENDAMA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026	0,01	0,01		Llegada maquinaria
10/02/2026	0	0,01		
11/02/2026	0	0,01		
12/02/2026	0	0,01		
13/02/2026	0	0,01		
14/02/2026	0	0,01		Sabado
15/02/2026	0	0,01		Domingo
16/02/2026	0,05	0,06		
17/02/2026	0,05	0,11		
18/02/2026	0	0,11		
19/02/2026	0,03	0,14		
20/02/2026	0	0,14		
21/02/2026	0	0,14		Sabado
22/02/2026	0	0,14		Domingo
23/02/2026	0	0,14		
24/02/2026	0	0,14		
25/02/2026	0	0,14		
26/02/2026	0	0,14		
27/02/2026	0	0,14		
28/02/2026	0	0,14		Domingo
TOTAL		**0,14**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026				
2/02/2026				
3/02/2026				
4/02/2026				
5/02/2026				
6/02/2026				
7/02/2026				
8/02/2026				
9/02/2026			8	Soleado
10/02/2026			8	Soleado
11/02/2026			8	Soleado
12/02/2026			8	Soleado
13/02/2026			8	Soleado
14/02/2026			0	Sabado
15/02/2026			0	Domingo
16/02/2026			8	Soleado
17/02/2026			8	Soleado
18/02/2026			8	Soleado
19/02/2026			8	Soleado
20/02/2026			8	Soleado
21/02/2026			0	Sabado
22/02/2026			0	Domingo
23/02/2026	4		4	Lluvias intermitentes
24/02/2026	4		4	Lluvias intermitentes
25/02/2026	3		5	Lluvias intermitentes
26/02/2026	3		5	Lluvias intermitentes
27/02/2026			8	Soleado
28/02/2026			0	Sabado
TOTAL	**14**	**0**	**106**	

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES TRONCAL DEL TEQUENDAMA					
FECHA	EQUIPO	SERIAL	OPERADOR	ORIGEN	DESTINO
5/02/2026	Minicargador CAT	CAT0236DAR4D00853	Fredy López	Junín	Troncal del Tequendama

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",							
PERIODO:				FEBRERO				
MUNICIPIO:	TRONCAL DEL TEQUENDAMA			PROVINCIA:	TEQUENDAMA			
MAQUINA:	MINICARGADOR CAT			SERIE	CAT0236DAR4D00853			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No, TIRILLA	
1/02/2026								
2/02/2026								
3/02/2026								
4/02/2026								
5/02/2026								
6/02/2026								
7/02/2026								
8/02/2026								
9/02/2026	440	447,9						
10/02/2026	447,9	447,9						
11/02/2026	447,9	448,3						
12/02/2026	448,3	450						
13/02/2026	450	450,5						
14/02/2026	450,5	450,5						
15/02/2026	450,5	450,5						
16/02/2026	450,5	453,5						
17/02/2026	453,5	456,5						
18/02/2026	456,5	456,5						
19/02/2026	456,5	459,5		13,232	457,0		144379	EDS BELLA VISTA
20/02/2026	459,5	459,5						
21/02/2026	459,5	459,5						
22/02/2026	459,5	459,5						
23/02/2026	459,5	459,5						
24/02/2026	459,5	460,2						
25/02/2026	460,2	460,2						
26/02/2026	460,2	460,2						
27/02/2026	460,2	460,2						
28/02/2026	460,2	460,2						
TOTAL MES			0,00	13,23		0,00		

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el frente de trabajo de la Troncal del Tequendama permitieron atender de manera oportuna las afectaciones generadas por la temporada de lluvias, garantizando la movilidad y seguridad en la zona intervenida. La intervención, centrada en el mantenimiento y rehabilitación, se desarrolló en algunos puntos críticos de la Troncal del Tequendama y en la estación de bomberos, logrando la habilitación de sectores afectados. Se intervino un total de 0.14 km, sin registro de viajes de material removido. Estas labores se ejecutaron durante un periodo operativo que incluyó 106 horas efectivas de trabajo y 14 horas condicionadas por lluvias, evidenciando la capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas adversas. En general, el balance de la intervención es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución y el impacto favorable en la funcionalidad de la vía y la atención de emergencias.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Derrumbe en via	Limpieza de derrumbe	Tanqueo de ACPM
		
Extendido de fresado	Extendido de fresado	Limpieza de derrumbe

José Luis Trujillo
INSPECTOR ICCU

Carlos Iván Chaves Prieto
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
