CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: SUBACHOQUE

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:

Subachoque:

1. Retroexcavadora CAT00416VH9P00610
2. Volqueta AEC192
3. Volqueta JJAA742
4. Volqueta OXD176

Ubicación:

Subachoque – coordenadas 4°55´44.40¨N – 74°10´20.87¨W

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	LEONARDO GUERRA
RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610	NOCOLAS RODRIGUEZ RESTREPO
VOLQUETA AEC192	RAMIRO FLORES
VOLQUETA JJAA742	CARLOS ALBERTO SOLER
VOLQUETA OXD176	MARCOS DAVID CASTRO

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Subachoque

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAQUINARIA AMARILLA MUNICIPIO DE SUBACHOQUE													
VEREDA	MES	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACOPIO MUNICIPAL, VIA SUBACHOQUE – VEREDA EL PANTANO	• Cargar volquetas con fresado y recebo B200 • Mescla material fresado y recebo B200 • Apoyo empresa aguas y aseo (Alcantarillado) • Limpieza cunetas vía Subachoque – vereda el pantano • Mantenimiento Vial Vereda el Paramo												
VIA SUBACHOQUE –VEREDA EL PARAMO	• Cargar volquetas con fresado y recebo B200 • Mescla material fresado y recebo B200 • Mantenimiento Vial Vereda el Paramo • Cargar piedra rajón												
VIA SUBACHOQUE –VEREDA EL VALLE	• Cargar volquetas con fresado y recebo B200 • Mescla material fresado y recebo B200												

Fuente: Alcaldía de Subachoque

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

En el transcurso del mes de febrero con base a la programación estipulada por el municipio se realizaron actividades de acopio de material granular, limpieza de desagües, cargue de material granular, limpieza y perfilado de cunetas.

De acuerdo al cronograma se logro una ejecución del 85%

FECHA	ACTIVIDADES
02/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 4 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 648.9 – 655.1
03/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 9 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

	RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 655.1 – 664.2
04/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material granular y se apoya en el sector la pradera con la localización de pozo de aguas residuales. **VIAJES:** 2 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE – LA PRADERA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 664.2 – 673.7
05/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 8 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE – LA PRADERA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA

	HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN): • RETROEXCAVADORA0610: 673.7 – 683.0
06/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza rocería y limpieza de cunetas en la vía. **VIAJES:** NA **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 683.0 – 691.7
07/02/2026	**07/02/2026** **ACTIVIDADES:** No se programaron actividades por parte de la alcaldia. **VIAJES:** NA **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

	• RETROEXCAVADORA0610: 691.7 – 691.7
08/02/2026	**DOMINGO**
09/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 5 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 691.7 – 701.1
10/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 6 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):**

	• RETROEXCAVADORA0610: 701.1 – 711.1
11/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. Se apoya con la extracción de postes. **VIAJES:** 1 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 711.1 – 720.7
12/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 6 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 720.7 – 730.4

13/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 5 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 730.4 – 739.5
14/02/2026	**ACTIVIDADES:** No se programaron actividades por parte de la alcaldia. **VIAJES:** NA **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 739.5 – 739.5
15/02/2026	**DOMINGO**

16/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. Limpieza de desagüé. **VIAJES:** 5 de material granular **SECTOR:** EL ROSAL – LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 739.5 – 751.5
17/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material granular y apoyo en rocería. **VIAJES:** 5 de material granular 2 de material sobrante **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 751.5 – 761.5

18/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. **VIAJES:** 4 de material granular **SECTOR:** SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 761.5 – 771.1
19/02/2026	**ACTIVIDADES:** Inicia actividades volqueta AEC192 y se realiza cargue de material granular. **VIAJES:** 2 de material granular **SECTOR:** PRADERA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 771.1 – 776.2

20/02/2026	**ACTIVIDADES:** Inician actividades volquetas JJAA742 y OXD176. Se realiza cargue de material sobrante. **VIAJES:** 4 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 776.2 – 784.5
21/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. En horas de la mañana se culminan actividades por daño en tubo del gas en el sector trabajado. **VIAJES:** 3 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA

	VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 784.5 – 788.3
22/02/2026	**DOMINGO**
23/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. Limpieza de box culvert. **VIAJES:** 11 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 788.3 – 800.1
24/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. Limpieza de box culvert. **VIAJES:** 9 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA - SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA

	CLIMA: SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 800.1 – 809.4
25/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. **VIAJES:** 12 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA - SUBACHOQUE. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 809.4 – 819.2
26/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. **VIAJES:** 13 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA - SUBACHOQUE.

	LONGITUD: 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 819.2 – 829.0
27/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. **VIAJES:** 12 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 829.0 – 839.1

28/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza cargue de material sobrante. **VIAJES:** 9 de material granular **SECTOR:** LA CUESTA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610: OPERATIVA VOLQUETA AEC192: OPERATIVA VOLQUETA JJAA742: OPERATIVA VOLQUETA OXD176: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA0610: 839.1 – 844.0

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	**----**	**----**	**----**
2/02/2026	**RECEBO**	**4**	**SOLEADO**
3/02/2026	**RECEBO**	**9**	**SOLEADO**
4/02/2026	**RECEBO**	**2**	**SOLEADO**
5/02/2026	**RECEBO**	**8**	**SOLEADO**
6/02/2026	**SOBRANTE**	**1**	**SOLEADO**
7/02/2026	**0**	**0**	**NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES POR LA ALCALDIA**
8/02/2026	**0**	**0**	**DOMINGO**
9/02/2026	**RECEBO**	**5**	**SOLEADO**
10/02/2026	**RECEBO**	**6**	**SOLEADO**
11/02/2026	**RECEBO**	**1**	**SOLEADO**
12/02/2026	**RECEBO**	**6**	**SOLEADO**
13/02/2026	**RECEBO**	**5**	**SOLEADO**
14/02/2026	**0**	**0**	**NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES POR LA ALCALDIA**
15/02/2026	**0**	**0**	**DOMINGO**
16/02/2026	**RECEBO**	**5**	**SOLEADO**
17/02/2026	**RECEBO**	**7**	**SOLEADO**
18/02/2026	**RECEBO**	**4**	**SOLEADO**
19/02/2026	**RECEBO**	**2**	**SOLEADO**
20/02/2026	**SOBRANTE**	**4**	**SOLEADO**
21/02/2026	**SOBRANTE**	**3**	**SOLEADO**
22/02/2026	**0**	**0**	**DOMINGO**
23/02/2026	**SOBRANTE**	**11**	**SOLEADO**
24/02/2026	**SOBRANTE**	**9**	**SOLEADO**
25/02/2026	**SOBRANTE**	**12**	**SOLEADO**
26/02/2026	**SOBRANTE**	**13**	**SOLEADO**
27/02/2026	**SOBRANTE**	**12**	**SOLEADO**
28/02/2026	**SOBRANTE**	**9**	**SOLEADO**
TOTAL		**138**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA MANTA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
2/02/2026	**1000**	**1000**	**0**	SOLEADO
3/02/2026	**1000**	**2000**	**0**	SOLEADO
4/02/2026	**1000**	**3000**	**0**	SOLEADO
5/02/2026	**1000**	**4000**	**0**	SOLEADO
6/02/2026	**1000**	**5000**	**0**	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	**1000**	**6000**	**0**	SOLEADO
10/02/2026	**1000**	**7000**	**0**	SOLEADO
11/02/2026	**1000**	**8000**	**0**	SOLEADO
12/02/2026	**1000**	**9000**	**0**	SOLEADO
13/02/2026	**1000**	**10000**	**0**	SOLEADO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	**1000**	**11000**	**0**	SOLEADO
17/02/2026	**1000**	**12000**	**0**	SOLEADO
18/02/2026	**1000**	**13000**	**0**	SOLEADO
19/02/2026	**1000**	**14000**	**0**	SOLEADO
20/02/2026	**1000**	**15000**	**0**	SOLEADO
21/02/2026	**1000**	**16000**	**0**	SOLEADO
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	**1000**	**17000**	**0**	SOLEADO
24/02/2026	**1000**	**18000**	**0**	SOLEADO
25/02/2026	**1000**	**19000**	**0**	SOLEADO
26/02/2026	**1000**	**20000**	**0**	SOLEADO
27/02/2026	**1000**	**21000**	**0**	SOLEADO
28/02/2026	**1000**	**22000**	**0**	SOLEADO
TOTAL		**22000**	**0**	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	-----	-----	-----	-----
2/02/2026	**0**	**0**	**6**	SOLEADO
3/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
4/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
5/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
6/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
10/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
11/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
12/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
13/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	**0**	**0**	**12**	SOLEADO
17/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
18/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
19/02/2026	**0**	**0**	**5**	SOLEADO
20/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
21/02/2026	**0**	**0**	**5**	SOLEADO
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	**0**	**0**	**12**	SOLEADO
24/02/2026	**0**	**0**	**9**	SOLEADO
25/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
26/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
27/02/2026	**0**	**0**	**10**	SOLEADO
28/02/2026	**0**	**0**	**5**	SOLEADO
TOTAL	**0**	**0**	**195**	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes. (MAQUINARIA ALQUILADA)















UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO:	FEBRERO				
MUNICIPIO:	SUBACHOQUE				
MAQUINA:	VOLQUETA			SERIE	OXD176
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO FINAL	VIAJES	DIAS	OBSERVACIÓN
19/02/2026	.....	.....	.....	.....	.....
20/02/2026			1	1	.....
21/02/2026			1	1	.....
22/02/2026	.....	.....	0	0	DOMINGO
23/02/2026			4	1	.....
24/02/2026			3	1	.....
25/02/2026			4	1	.....
26/02/2026			4	1	.....
27/02/2026			4	1	.....
28/02/2026			3	1	.....
SUBTOTAL MES			24	8	
TOTAL MES			32		
Firma					
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		JHON PIÑEROS		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO:	FEBRERO				
MUNICIPIO:	SUBACHOQUE				
MAQUINA:	VOLQUETA			SERIE	ACTIVO
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORIMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HORIMETRO FINAL	VIAJES	DIAS	OBSERVACIÓN
19/02/2026			2	1	----
20/02/2026			1	1	----
21/02/2026			1	1	----
22/02/2026	----	----	0	0	DOMINGO
23/02/2026			1	1	----
24/02/2026			1	1	----
25/02/2026			4	1	----
26/02/2026			1	1	----
27/02/2026			4	1	----
28/02/2026			3	1	----
SUBTOTAL MES			20	9	
TOTAL MES			20		
Firma					
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		JHON PINEROS		
	INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU		

ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA			ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".			
PERIODO:	FEBRERO			
MUNICIPIO:	GUACHETA			
MAQUINA:	VOLQUETA		SERIE	JAA742
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORIOMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HORIOMETRO FINAL	HRS/DIA	DIAS	OBSERVACIÓN
19/02/2026	----	----	----	----	----
20/02/2026			2	1	----
21/02/2026			1	1	----
22/02/2026	----	----	0	0	DOMINGO
23/02/2026			4	1	----
24/02/2026			3	1	----
25/02/2026			4	1	----
26/02/2026			4	1	----
27/02/2026			4	1	----
28/02/2026			3	1	----
SUBTOTAL MES			25	8	
TOTAL MES			33		
Firma					
Nombre	EMILIO STEVENS MORENO		JHON PIÑEROS		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2026			INSPECTOR ICCU		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**FEBRERO**						
MUNICIPIO:	**SUBACHOQUE**						
MAQUINA:	**RETROEXCAVADORA**					**SERIE**	**CAT00416VH9P00610**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
1/02/2026	------	------	------	------	------	------	------
2/02/2026			648.9	655.1	6,2	-------	-------
3/02/2026			655.1	664.2	9,1	-------	-------
4/02/2026			664.2	673.7	9,5	-------	-------
5/02/2026			673.7	683.0	9,3	-------	-------
6/02/2026			683.0	691.7	8,7	-------	-------
7/02/2026			691.7	691.7	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMA ACTIVIDADES
8/02/2026			691.7	691.7	0	-------	DOMINGO
9/02/2026			691.7	701.1	9,4	-------	-------
10/02/2026			701.1	711.1	10	-------	-------
11/02/2026			711.1	720.7	9,6	-------	-------
12/02/2026			720.7	730.4	9,7	-------	-------
13/02/2026			730.4	739.5	9,1	-------	-------
14/02/2026			739.5	739.5	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMA ACTIVIDADES
15/02/2026			739.5	739.5	0	-------	DOMINGO
16/02/2026			739.5	751.5	12	-------	-------
17/02/2026			751.5	761.5	10	-------	-------
18/02/2026			761.5	771.1	9,6	-------	-------
19/02/2026			771.1	776.2	5,1	-------	-------
20/02/2026			776.2	784.5	8,3	-------	-------
21/02/2026			784.5	788.3	3,8	1,2	-------
22/02/2026			788.3	788.3	0	-------	DOMINGO
23/02/2026			788.3	800.1	11,8	-------	-------
24/02/2026			800.1	809.4	9,3	-------	-------
25/02/2026			809.4	819.2	9,8	-------	-------
26/02/2026			819.2	829	9,8	-------	-------
27/02/2026			829	839.1	10,1	-------	-------
28/02/2026			839.1	844	4,9	0,1	-------
SUBTOTAL MES					**195,1**	**11,3**	
TOTAL MES					**206,4**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**Nombre:**		**JHON PIÑEROS**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas para el municipio de Subachoque, Provincia Sabana Occidente, cumpliendo con la atención de la red vial del departamento de Cundinamarca.

Con base en el cronograma establecido por la Alcaldía de Subachoque, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 85%, desarrollando actividades de acopio y cargue de material granular (recebo), limpieza y perfilado de cunetas, rocería, limpieza de box culvert y manejo de material sobrante. En total se realizaron 138 viajes de transporte de material y se intervino una longitud acumulada de 22 Km lineales de vía, lo que evidencia un avance significativo en el mejoramiento y mantenimiento de la red vial rural del municipio.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Limpieza de cunetas.	Cargue de material.	Acopio de material.
		
Cargue de material.	Acopio de material.	Limpieza de cunetas.
		
Acopio de material.	Cargue de material.	Cargue de material.

JHON PIÑEROS
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: BOJACA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE BOJACA

OBJETO: “ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:

Bojaca:

1. Retroexcavadora NKJ575SVPPKH36539
2. Volqueta ODT392

Ubicación:

Bojaca coordenadas 4°44´01¨N – 74°20´32¨O

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO BARBOSA
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHAN HANNER HERNANDEZ
OPERADOR RETROEXCAVADORA NKJ575SVPPKH36539	PEDRO ANTONIO BARON
OPERADOR VOLQUETA ODT392	FIDOLO ALEXANDER GUTIERREZ
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MC109478 PRIVADO	WILSON NOVOA

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Bojaca

				CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS VIALES RURALES 2026			
				FEBRERO			
N	KM	VIA		1	2	3	4
1		BARRO BLANCO	P				
			E				
			R				

Fuente: Alcaldía de Bojaca

CRONOGRAMA EJECUTADO

En lo corrido del mes de febrero se realizaron actividades de limpieza de cunetas, acopio de material de relleno, limpieza de ramas y disposición final, limpieza de desagües y de alcantarillas, conformación de la vía, cargue y traslado de material tipo recebo, compactación de subrasante y de material tipo recebo en la vía.

Las actividades se encuentran en un 80 % de ejecución de acuerdo al cronograma de ejecución

FECHA	ACTIVIDADES
06/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. Viajes: 5 de material granular **SECTOR:** MONDOÑEDO – BARRO BLANCO. **COMBUSTIBLE:**NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA

	HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN): • RETROEXCAVADORA6539: 829.6 – 834.8 • VOLQUETA ODT392: 6817 – 6823
07/02/2026	**SABADO**
08/02/2026	**DOMINGO**
09/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se cargue de material granular y extendido de material granular. Viajes: 1 de material granular **SECTOR:** BARRO BLANCO – DOBLE HUECO **COMBUSTIBLE:** Retroexcavadora: 25,624 Volqueta ODT392: 31,056 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 834.8 – 835.3 • VOLQUETA ODT392: 6823 – 6827
10/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza acopio y cargue de material granular. En horas de la mañana se activa el vibrocompactador9478 y se traslada al sector barro blanco Viajes: 10 de material granular **SECTOR:** BARRO BLANCO – DOBLE HUECO **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:**

	RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR9478: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 835.3 – 840.6 • VOLQUETA ODT392: 6827 – 6835 • VIBROCOMPACTADOR9478: 5847,8 – 5851,4
11/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Viajes: 15 de material granular **SECTOR:** BARRO BLANCO – DOBLE HUECO **LONGITUD:** 1.3 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR9478: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 840.6 – 848.6 • VOLQUETA ODT392: 6835 – 6843 • VIBROCOMPACTADOR9478: 5851,4 – 5857,5
12/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Acopio y cargue de material granular Viajes: 11 de material granular **SECTOR:** BARRO BLANCO – DOBLE HUECO **LONGITUD:** 1.2 Km **COMBUSTIBLE:** NA

	CLIMA: SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR9478: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 848.6 – 852.5 • VOLQUETA ODT392: 6843 – 6851 • VIBROCOMPACTADOR9478: 5857,5 – 5863,9
13/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se extiende material granular que obstaculizaba el paso en placa huella. Se retiran escombros y se da apertura en el lugar donde se guardan los equipos. Equipos quedan disponibles por fuertes lluvias las cuales impiden la realización de las actividades diarias. Viajes: 1 de material sobrante **SECTOR:** BOJACA **LONGITUD:** 50 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR9478: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 852.5 – 856.3 • VOLQUETA ODT392: 6851 – 6855 • VIBROCOMPACTADOR9478: 5863,9 – 5863,9
14/02/2026	**SABADO**
15/02/2026	**DOMINGO**
16/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se culminan actividades en el municipio.

	Retroexcavadora se traslada en horas de la mañana al municipio de Venecia. Volqueta ODT392 se traslada al municipio de ubala. Vibrocompactador se traslada al municipio de simijaca. **SECTOR:** BOJACA **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** RETROEXCAVADORA 6539: OPERATIVA VOLQUETA ODT392: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR9478: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • RETROEXCAVADORA6539: 856.3 – 856.3 • VOLQUETA ODT392: 6855 – 6862 • VIBROCOMPACTADOR9478: 5863,9 – 5867,6

4. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	0	---
2/02/2026	---	0	---
3/02/2026	---	0	---
4/02/2026	---	0	---
5/02/2026	---	0	---
6/02/2026	**Recebo**	5	SOLEADO
7/02/2026	---	0	SABADO
8/02/2026	---	0	DOMINGO
9/02/2026	**Recebo**	1	SOLEADO
10/02/2026	**Recebo**	10	SOLEADO
11/02/2026	**Recebo**	15	SOLEADO
12/02/2026	**Recebo**	11	SOLEADO
13/02/2026	**Material sobrante**	1	NUBLADO - LLUVIAS
14/02/2026	---	0	SABADO
15/02/2026	---	0	DOMINGO
16/02/2026	---	0	SOLEADO
17/02/2026	---	0	---
18/02/2026	---	0	---
19/02/2026	---	0	---
20/02/2026	---	0	---
21/02/2026	---	0	---
22/02/2026	---	0	---
23/02/2026	---	0	---
24/02/2026	---	0	---
25/02/2026	---	0	---
26/02/2026	---	0	---
27/02/2026	---	0	---
28/02/2026	---	0	---
TOTAL		**43**	

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

5. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA BOJACA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---
6/02/2026	0	0	0	Soleado
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	100	100	0	Soleado
10/02/2026	300	400	0	Soleado
11/02/2026	1300	1700	0	Soleado
12/02/2026	1200	2900	0	Soleado
13/02/2026	50	2950	0	Nublado - Lluvias
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	0	3050	0	Soleado
17/02/2026	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	---	---
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	---	---	---	---
24/02/2026	---	---	---	---
25/02/2026	---	---	---	---
26/02/2026	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL	**2950**			

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---
6/02/2026	0	0	8	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	0	0	8	SOLEADO
10/02/2026	0	0	8	SOLEADO
11/02/2026	0	0	8	SOLEADO
12/02/2026	0	0	8	SOLEADO
13/02/2026	0	0	3	NUBLADO - LLUVIAS
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	0	0	3	SOLEADO
17/02/2026	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	---	---
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	---	---	---	---
24/02/2026	---	---	---	---
25/02/2026	---	---	---	---
26/02/2026	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL			**46**	

7. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

8. MANTENIMIENTOS














No se realizaron mantenimientos en este mes

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	FEBRERO							
MUNICIPIO:	BOJACA			PROVINCIA:	SABANA OCCIDENTE			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CASE			SERIE	NKJ575SVPPKH38539			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
6/02/2026	829.6	834.8	5.2	---	---	---	---	NA
7/02/2026	834.8	834.8	0.0	---	---	---	---	SABADO
8/02/2026	834.8	834.8	0.0	---	---	---	---	DOMINGO
9/02/2026	834.8	835.3	0.5	26,624	834.8	---	No. 92208	NA
10/02/2026	835.3	840.6	5.3	---	---	---	---	NA
11/02/2026	840.6	846.8	6.2	---	---	---	---	NA
12/02/2026	846.8	852.5	5.7	---	---	---	---	NA
13/02/2026	852.5	856.3	3.8	26,620	852.5	1,50	No. 92788	NA
14/02/2026	856.3	856.3	0.0	---	---	---	---	SABADO
15/02/2026	856.3	856.3	0.0	---	---	---	---	DOMINGO
16/02/2026	856.3	856.3	0.0	---	---	---	---	SE TRASLADA AL MUNICIPIO DE VENECIA
17/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
21/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
22/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
23/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
24/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
25/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
26/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
28/02/2026	---	---	0.0	---	---	---	---	---
TOTAL MES			26,70	53,24		1,50		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAVIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	FEBRERO											
MUNICIPIO:	BOJACA						PROVINCIA:	SABANA OCCIDENTE				
MAQUINA:	VOLQUETA INTERNATIONAL						SERIE	DOT892				
CONTROL HORARIO				ACPM				LINEA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	LINEA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/02/2026	6817,0	6823,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
7/02/2026	6823,0	6823,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/02/2026	6823,0	6823,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/02/2026	6823,0	6827,0	4,0	31,066	6834	—	No. 92206	—	—	—	—	NA
10/02/2026	6827,0	6835,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
11/02/2026	6835,0	6843,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
12/02/2026	6843,0	6851,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
13/02/2026	6851,0	6855,0	4,0	31,066	6862	7,1	No. 92790	—	—	—	—	NA
14/02/2026	6855,0	6855,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/02/2026	6855,0	6855,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/02/2026	6855,0	6862,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SE TRASLADA EQUIPO AL MUNICIPIO DE UBALA
17/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL MES			45,00	62,11		1,11		0,00		0,00		

ICCU PARQUE	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	FEBRERO						
MUNICIPIO:	BOJACA						
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR					SERIE	NC109478
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
6/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
7/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
8/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
9/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
10/02/2026			5847.8	5851.4	3.6	1,4	INICIO DE ACTIVIDADES
11/02/2026			5851.4	5857.5	6.1		NA
12/02/2026			5857.5	5863.9	6.4		NA
13/02/2026			5863.9	5863.9	0	5	SIN ACTIVIDADES POR TERRENO SATURADO
14/02/2026			5863.9	5863.9	0	5	SIN ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ALCALDIA
15/02/2026			5863.9	5863.9	0		DOMINGO
16/02/2026			5863.9	5867.6	3.7	1,3	FINAL DE ACTIVIDADES
17/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
18/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
19/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
20/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
21/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
22/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
23/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
24/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
25/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
26/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
28/02/2026	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL MES					19,8	12,7	
TOTAL MES					32,5		
Firma			Firma				
Nombre:	EMILIO STEVENS MORENO		Nombre:		JHAN HANNER HERNANDEZ		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La maquinaria realiza actividades en el corredor vial Bojaca a las veredas Mondoñedo, Barro blanco y Doble hueco del municipio de Bojaca, donde se logra avanzar 2950 mts (2.95 Km) y se extienden 43 viajes de material granular (recebo) para la vía.
Con un retrocargador, una volqueta y un vibrocompactador alquilado los cuales trabajaron sin presentar novedades mecánicas.
No se presentaron lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento.
El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.
Ubicación: Bojaca coordenadas 4°44´01¨N – 74°20´32¨O



11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Retiro material sobrante.	Conformación de vía.	Compactación de vía.
		
Cargue de material granular.	Extendido de material granular.	Acopio de material granular.

Jhan Hanner Hernández
INSPECTOR ICCU

Emilio Stevens Moreno
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: MADRID

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE MADRID

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:

Madrid:

1. Motoniveladora Caterpillar CAT0120KPJAP07183

Ubicación:

Madrid coordenadas 4°46´12.27¨N – 74°14´38.81¨O

Imagen 1 ubicación de las maquinas



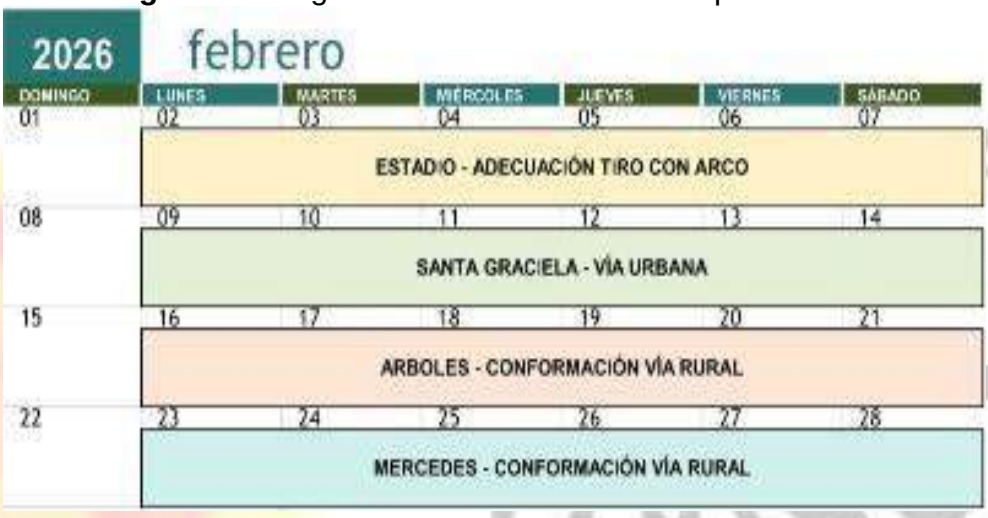
Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	Emilio Stevens Moreno
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Jhan Hanner Hernández
OPERADOR MAQUINA Y SERIAL 1	Jhon Moreno

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Madrid



Fuente: Alcaldía de Madrid

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Con el fin de ejecutar labores de mantenimiento y rehabilitación en diferentes puntos de la via Puente Piedra – Las Mercedes – San Marino – San Gabriel – El Corso – Madrid, la cual se desempeña como vía alterna para el desplazamiento vehicular en el municipio.

Se completa el 85% de las actividades programadas en el cronograma estipulado por el municipio.

FECHA	ACTIVIDADES
05/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. Viajes: 4 de material granular **SECTOR:** LAS MERCEDES. **LONGITUD:** 800 mts **COMBUSTIBLE:**NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7117.2 – 7124.4
06/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. Viajes: 2 de material granular **SECTOR:** SAN MARINO. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** 47,214 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7124.4 – 7130.8
07/02/2026	**SABADO**

08/02/2026	DOMINGO
09/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. En horas de la tarde equipo queda inoperativo por llanta pinchada, se interviene y queda operativo. Viajes: 2 de material granular **SECTOR:** SAN MARINO. **LONGITUD:** 800 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7130.8 – 7135.7
10/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. **SECTOR:** SAN GABRIEL. **LONGITUD:** 200 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7135.7 – 7140.4

11/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza escarificación para alistamiento de fresado. **SECTOR:** SAN GABRIEL. **LONGITUD:** 200 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7140.4 – 7147.6
12/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación para alistamiento de fresado. Viajes: 14 de material granular **SECTOR:** SAN GABRIEL. **LONGITUD:** 400 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7147.6 – 7153.9
13/02/2026	**ACTIVIDADES:** No se realizan actividades por fuertes lluvias en la mañana, saturando el terreno de trabajo.

	SECTOR: MADRID. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7153.9 – 7154.7
14/02/2026	**SABADO**
15/02/2026	**DOMINGO**
16/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. Viajes: 4 de material granular **SECTOR:** SAN GABRIEL. **LONGITUD:** 100 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** NUBLADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7154.7 – 7157.3
17/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de material. Viajes: 10 de material granular

	SECTOR: SAN GABRIEL. **LONGITUD:** 300 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** NUBLADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** MOTONIVELADORA 7183: 7157.3 – 7163.8
18/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de subrasante. Viajes: 6 de material granular **SECTOR:** EL CORSO. **LONGITUD:** 200 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** MOTONIVELADORA 7183: 7163.8 – 7167.0
19/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y cuneteo de subrasante. Viajes: 6 de material granular **SECTOR:** MADRID.

	LONGITUD: 800 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** MOTONIVELADORA 7183: 7167.0 – 7173.5
20/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza ampliación de vía, conformación y compactación de subrasante. Viajes: 4 de material granular **SECTOR:** MADRID – PUENTE PIEDRA. **LONGITUD:** 200 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7173.5 – 7179.5
21/02/2026	**SABADO**
22/02/2026	**DOMINGO**
23/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza mantenimiento preventivo, ajuste de tornillería, cambio de bronces y platinas del equipo. Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana, impidiendo la realización de actividades por terreno saturado.

	SECTOR: MADRID. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7179.5 – 7181.0
24/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Se culminan actividades en horas de la tarde por fuertes lluvias en la zona de trabajo. **SECTOR:** PUENTE PIEDRA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** 46,138 **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** MOTONIVELADORA 7183: 7181.0 – 7186.5
25/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se culminan actividades en el municipio. Equipo se traslada en horas de la mañana al municipio de Anapoima. **SECTOR:** MADRID. **LONGITUD:** NA

	COMBUSTIBLE: NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KPJAP07183: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA 7183: 7186.5 – 7186.5

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

5. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA MADRID				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	**800**	**800**	---	SOLEADO
6/02/2026	**1000**	**1800**	---	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	**800**	**2600**	---	SOLEADO
10/02/2026	**200**	**2800**	---	SOLEADO
11/02/2026	**200**	**3000**	---	SOLEADO
12/02/2026	**400**	**3400**	---	SOLEADO
13/02/2026	**0**	**3400**	---	LLUVIOSO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	**100**	**3500**	---	SOLEADO
17/02/2026	**300**	**3800**	---	NUBLADO
18/02/2026	**200**	**4000**	---	SOLEADO
19/02/2026	**800**	**4800**	---	NUBLADO
20/02/2026	**200**	**5000**	---	SOLEADO
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	**0**	**5000**	---	LLUVIOSO
24/02/2026	**1000**	**6000**	---	SOLEADO
25/02/2026	**0**	**6000**	---	SOLEADO
26/02/2026	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL		**6000**		

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	0	0	8	SOLEADO
6/02/2026	0	0	8	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	0	0	6	SOLEADO
10/02/2026	0	0	6	SOLEADO
11/02/2026	0	0	8	SOLEADO
12/02/2026	0	0	8	SOLEADO
13/02/2026	5	0	2	LLUVIOSO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	0	0	3	SOLEADO
17/02/2026	0	0	8	SOLEADO
18/02/2026	0	0	4	SOLEADO
19/02/2026	1	0	7	NUBLADO
20/02/2026	0	0	6	SOLEADO
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	4	0	0	LLUVIOSO
24/02/2026	2	0	6	LLUVIOSO
25/02/2026	0	0	0	SOLEADO
26/02/2026	---	---	---	---
27/02/2026	---	---	---	---
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL			80	

7. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

8. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
23/02/2026	MOTONIVELADORA	CAT0120KPJAP07183	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE BRONCES Y PLATINAS - AJUSTE DE TORNILLERIA

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	FEBRERO											
MUNICIPIO:	MADRID						PROVINCIA:	SABANA OCCIDENTE				
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR						SERIE	CAT0120HPJAP07163				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/02/2026	7117,2	7124,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
6/02/2026	7124,4	7130,8	6,4	47,214	7125,6	—	2151462	—	—	—	—	NA
7/02/2026	7130,8	7130,8	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/02/2026	7130,8	7130,8	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/02/2026	7130,8	7135,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
10/02/2026	7135,7	7140,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
11/02/2026	7140,4	7147,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
12/02/2026	7147,6	7153,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
13/02/2026	7153,9	7154,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
14/02/2026	7154,7	7154,7	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/02/2026	7154,7	7154,7	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/02/2026	7154,7	7157,3	2,6	46,138	7157,3	1,5	45357900	—	—	—	—	NA
17/02/2026	7157,3	7163,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
18/02/2026	7163,8	7167,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
19/02/2026	7167,0	7173,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
20/02/2026	7173,5	7179,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	NA
21/02/2026	7179,5	7179,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/02/2026	7179,5	7179,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/02/2026	7179,5	7181,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
24/02/2026	7181,0	7186,5	5,5	46,138	7186,5	1,6	45358631	—	—	—	—	NA
25/02/2026	7186,5	7186,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SE CULMINAN ACTIVIDADES
26/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28/02/2026	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL MES			69,30	139,49		3,04		0,00		0,00		

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero, se desarrolló con normalidad las actividades programadas. Se efectuaron intervenciones mecánicas para el mantenimiento preventivo del equipo, con el fin de garantizar un adecuado desempeño. La máquina ejecutó un total de 6,00 km lineales de mejoramiento vial, tanto en zonas veredales como en el casco urbano del municipio.
No se presentaron lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.
Ubicación: (*4°46'12.27"N - 74°14'38.81"O*) En el municipio de Madrid.



10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Conformación y perfilacion de cunetas.	Conformación en zona urbana.	Conformación y perfilacion de cunetas.
		
Conformación y perfilacion de cunetas.	Extendido de material granular.	Conformación de vía.

JHAN HANNER HERNANDEZ
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°1
PERIODO: FEBRERO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: FACATATIVA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE FACATATIVA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:

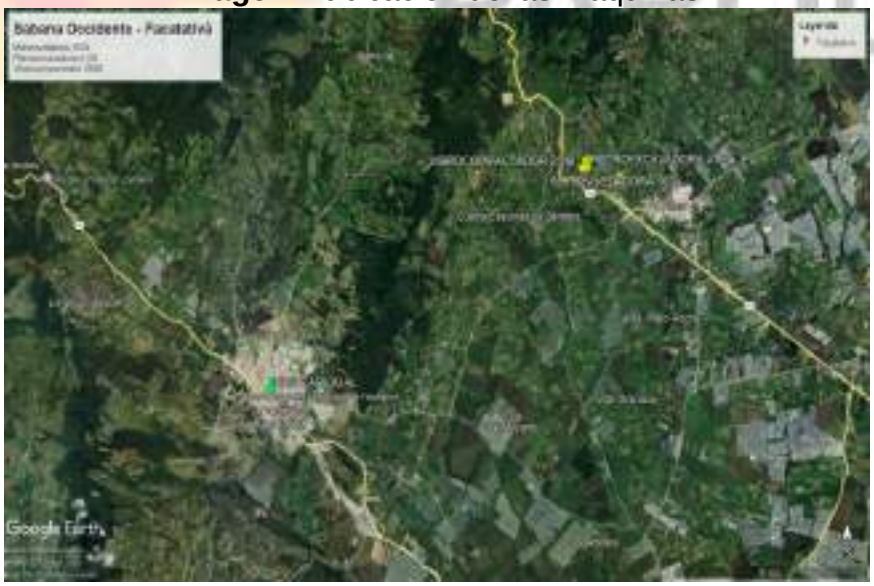
Facatativa:

1. Motoniveladora CAT0120KHSZN01634
2. Retroexcavadora JJGN58SREJC754103
3. Vibrocompactador 2742548

Ubicación:

Facatativa – coordenadas 4°51´29.76¨N – 74°17´8.05¨O

Imagen 1 ubicación de las maquinas



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	LEONARDO GUERRA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103	MANUEL ARVEY NIETO
OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR 2742548	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
OPERADOR DE MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634	HUGO ADRIAN ROMERO

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Facatativá

5	Mancilla	**Vereda**	6-feb-26	20-feb-26	2 semanas
6	Tierra Morada	**Paraiso**	23-feb-26	6-mar-26	2 semanas
7	Tierra Morada	**Altamira**	9-mar-26	20-mar-26	2 semanas
8	Tierramorada	**Vereda**	23-mar-26	3-abr-26	3 semanas
9	4 Esquinas	**Vereda**	6-mar-26	22-abr-26	2.5 semanas
10	Tierra Grata	**Plazoleta**	23-abr-26	1-may-26	2 semanas

Fuente: Alcaldía de Facatativá

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se desarrollan actividades de mantenimiento y rehabilitación en diferentes tramos de las veredas, Mancilla, Santa marta, 4 Esquinas y Paso ancho. Se establece un plan de trabajo con el objetivo de conformar, compactar y perfilar la superficie de subrasante. Dicho trabajo incorpora el apoyo de una motoniveladora, un vibrocompactador y una retroexcavadora. Se registra un avance del 75% de las actividades programadas.

FECHA	ACTIVIDADES
06/02/2026	**ACTIVIDADES:** En horas de la mañana se interviene inoperatividad por llanta pinchada en la retroexcavadora y motoniveladora.

	En horas de la tarde equipos quedan operativos, la alcaldía trabajo hasta las 2 PM por lo cual no se alcanzó a realizar el traslado al punto de trabajo por falta de escolta. **SECTOR:** FACATATIVA. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** Motoniveladora1634: 58,876 Vibrocompactador2548: 45,29 Retroexcavadora4103: 31,703 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2156.6 – 2157.9 • RETROEXCAVADORA4103: 6655.3 – 6659.4 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3267.5 – 3269.5
07/02/2026	**SABADO**
08/02/2026	**DOMINGO**
09/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Viajes: 19 de material granular **SECTOR:** MANCILLA. **LONGITUD:** 900 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA

	RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2157.9 – 2165.2 • RETROEXCAVADORA4103: 6659.4 – 6666.5 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3269.5 – 3277.8
10/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Viajes: 10 de material granular **SECTOR:** MANCILLA. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2165.2 – 2172.5 • RETROEXCAVADORA4103: 6666.5 – 6673.4 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3277.8 – 3285.4
11/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Limpieza de alcantarillas. Viajes: 14 de material granular **SECTOR:** MANCILLA.

	LONGITUD: 900 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2172.5 – 2180.1 • RETROEXCAVADORA4103: 6673.4 – 6680.4 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3285.4 – 3292.3
12/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Limpieza de alcantarillas. Viajes: 21 de material granular **SECTOR:** MANCILLA. **LONGITUD:** 800 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2180.1 – 2187.5 • RETROEXCAVADORA4103: 6680.4 – 6690.3 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3292.3 – 3298.6

13/02/2026	**ACTIVIDADES:** No se realizan actividades por fuertes lluvias en la mañana saturando el terreno de trabajo. **SECTOR:** MANCILLA. **LONGITUD:** NA **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2187.5 – 2187.5 • RETROEXCAVADORA4103: 6690.3 – 6690.3 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3298.6 – 3298.6
14/02/2026	**SABADO**
15/02/2026	**DOMINGO**
16/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Viajes: 10 de material granular **SECTOR:** MANCILLA. **LONGITUD:** 800 mts **COMBUSTIBLE:** Motoniveladora1634: 45,29 Retroexcavadora4103: 18,116 **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA

	RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2187.5 – 2195.3 • RETROEXCAVADORA4103: 6690.3 – 6698.7 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3298.6 – 3307.3
17/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Viajes: 11 de material granular **SECTOR:** Santa Marta. **LONGITUD:** 1 Km **COMBUSTIBLE:** Vibrocompactador2548: 45,29 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: OPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2195.3 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6698.7 – 6704.3 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3307.3 – 3314.7
18/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realiza conformación y compactación de subrasante. Perfilado de cunetas. Motoniveladora queda Inoperativa en horas de la mañana por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 4 de material granular

	SECTOR: Santa Marta. **LONGITUD:** 500 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6704.3 – 6708.6 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3314.7 – 3319.2
19/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó extendido y compactación de subrasante. Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 6 de material granular **SECTOR:** Santa Marta. **LONGITUD:** 500 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6708.6 – 6712.8

	• VIBROCOMPACTADOR2548: 3319.2 – 3324.1
20/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 4 de material granular **SECTOR:** Santa Marta. **LONGITUD:** 500 mts **COMBUSTIBLE:** Retroexcavadora4103: 22,68 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6712.8 – 6715.6 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3324.1 – 3327.5
21/02/2026	**SABADO**
22/02/2026	**DOMINGO**
23/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. (Re intervención de vía) Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 2 de material granular **SECTOR:** CUATRO ESQUINAS – PASO ANCHO. **LONGITUD:** 300 mts Re Intervenidos

	COMBUSTIBLE: NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6715.6 – 6721.1 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3327.5 – 3333.8
24/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. (Re intervención de vía) Se recupera alcantarilla. Se culminan actividades en horas de la tarde por fuertes lluvias en la zona de trabajo. Se revisa daño en la motoniveladora y se trasladan piezas en mal estado a Bogotá para solicitar el cambio. Viajes: 4 de material granular **SECTOR:** CUATRO ESQUINAS – PASO ANCHO. **LONGITUD:** 200 mts Re Intervenidos **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** LLUVIOSO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6721.1 – 6724.3

	• VIBROCOMPACTADOR2548: 3333.8 – 3337.8
25/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 2 de material granular **SECTOR:** CUATRO ESQUINAS – PASO ANCHO. **LONGITUD:** 500 mts Re Intervenidos **COMBUSTIBLE:** Vibrocompactador2548: 40,761 Retroexcavadora4103: 22,645 **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6724.3 – 6728.7 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3337.8 – 3343.4
26/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. Se trabaja en conjunto con maquinaria de la alcaldía. Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 6 de material granular **SECTOR:** CUATRO ESQUINAS – PASO ANCHO. **LONGITUD:** 1 Km

	COMBUSTIBLE: NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6728.7 – 6733.8 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3343.4 – 3348.8
27/02/2026	**ACTIVIDADES:** Se realizó conformación y compactación de subrasante. Ampliación de vía. Se extendió material granular. Motoniveladora continúa Inoperativa por daño en el sistema eléctrico. Viajes: 6 de material granular **SECTOR:** CUATRO ESQUINAS – PASO ANCHO. **LONGITUD:** 500 mts **COMBUSTIBLE:** NA **CLIMA:** SOLEADO **ESTADO DE LA MAQUINARIA:** MOTONIVELADORA CAT0120KHSZN01634: INOPERATIVA RETROEXCAVADORA JJGN58SREJC754103: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR 2742548: OPERATIVA **HORAS TRABAJADAS (INICIO – FIN):** • MOTONIVELADORA1634: 2203.0 – 2203.0 • RETROEXCAVADORA4103: 6733.8 – 6740.1 • VIBROCOMPACTADOR2548: 3348.8 – 3354.1

5. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA MANTA				
FECHA	**LONGITUD (M)**	**AVANCE (M)**	**REPETICIÓN (M)**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	---	---	---	---
2/02/2026	---	---	---	---
3/02/2026	---	---	---	---
4/02/2026	---	---	---	---
5/02/2026	---	---	---	---
6/02/2026	**0**	**0**	**0**	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	**900**	**900**	**0**	SOLEADO
10/02/2026	**1000**	**1900**	**0**	SOLEADO
11/02/2026	**900**	**2800**	**0**	SOLEADO
12/02/2026	**800**	**3600**	**0**	SOLEADO
13/02/2026	**0**	**3600**	**0**	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	**800**	**4400**	**0**	LLUVIOSO
17/02/2026	**1000**	**5400**	**0**	SOLEADO
18/02/2026	**500**	**5900**	**0**	SOLEADO
19/02/2026	**500**	**6400**	**0**	SOLEADO
20/02/2026	**500**	**6900**	**0**	SOLEADO
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	**0**	**6900**	**300**	LLUVIOSO
24/02/2026	**0**	**6900**	**200**	LLUVIOSO
25/02/2026	**500**	**7400**	**0**	SOLEADO
26/02/2026	**1000**	**8400**	**0**	SOLEADO
27/02/2026	**500**	**8900**	**0**	SOLEADO
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL		**8900**	**500**	

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
2/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
3/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
4/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
5/02/2026	**----**	**----**	**----**	**----**
6/02/2026	**0**	**5**	**0**	SOLEADO
7/02/2026	SABADO			
8/02/2026	DOMINGO			
9/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
10/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
11/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
12/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
13/02/2026	**5**	**0**	**0**	LLUVIOSO
14/02/2026	SABADO			
15/02/2026	DOMINGO			
16/02/2026	**2**	**0**	**6**	LLUVIOSO
17/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
18/02/2026	**0**	**0**	**7**	SOLEADO
19/02/2026	**0**	**0**	**7**	SOLEADO
20/02/2026	**0**	**0**	**7**	SOLEADO
21/02/2026	SABADO			
22/02/2026	DOMINGO			
23/02/2026	**3**	**0**	**4**	LLUVIOSO
24/02/2026	**4**	**0**	**3**	LLUVIOSO
25/02/2026	**0**	**0**	**7**	SOLEADO
26/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
27/02/2026	**0**	**0**	**8**	SOLEADO
28/02/2026	DOMINGO			
TOTAL	**14**	**5**	**97**	

7. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

8. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	FEBRERO												
MUNICIPIO:	FACATATIVA						PROVINCIA:	SABANA OCCIDENTE					
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR						SERIE	CAT0120HHSZN01624					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6/02/2026	2156,6	2157,9	1,3	58,876	2158	—	370467						NA
7/02/2026	2157,9	2157,9	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		SABADO
8/02/2026	2157,9	2157,9	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		DOMINGO
9/02/2026	2157,9	2165,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—		SOLEADO
10/02/2026	2165,2	2172,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—		SOLEADO
11/02/2026	2172,5	2180,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—		SOLEADO
12/02/2026	2180,1	2187,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—		SOLEADO
13/02/2026	2187,5	2187,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
14/02/2026	2187,5	2187,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		SABADO
15/02/2026	2187,5	2187,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		DOMINGO
16/02/2026	2187,5	2195,3	7,8	45,290	2187	1,6	375544	NA	—	—	—		NA
17/02/2026	2195,3	2203,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—		SOLEADO
18/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
19/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
20/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
21/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		SABADO
22/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		DOMINGO
23/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
24/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
25/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
26/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
27/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
28/02/2026	2203,0	2203,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—		EQUIPO INOPERATIVO
TOTAL MES			46,40	104,17		1,56		0,00		0,00			

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS								ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".								
PERIODO:	FEBRERO								
MUNICIPIO:	FACATATIVA			PROVINCIA:		SABANA OCCIDENTE			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CASE			SERIE		JJGN8ISREJC754103			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/02/2026	------	------	------	------	------	------	------	------	
2/02/2026	------	------	------	------	------	------	------	------	
3/02/2026	------	------	------	------	------	------	------	------	
4/02/2026	------	------	------	------	------	------	------	------	
5/02/2026	------	------	------	------	------	------	------	------	
6/02/2026	6655,3	6659,4	4,1	31,703	6659	------	370460	NA	
7/02/2026	6659,4	6659,4	0,0	------	------	------	------	SABADO	
8/02/2026	6659,4	6659,4	0,0	------	------	------	------	DOMINGO	
9/02/2026	6659,4	6666,5	7,1	------	------	------	------	SOLEADO	
10/02/2026	6666,5	6673,4	6,9	------	------	------	------	SOLEADO	
11/02/2026	6673,4	6680,4	7,0	------	------	------	------	SOLEADO	
12/02/2026	6680,4	6690,3	9,9	------	------	------	------	SOLEADO	
13/02/2026	6690,3	6690,3	0,0	------	------	------	------	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS	
14/02/2026	6690,3	6690,3	0,0	------	------	------	------	SABADO	
15/02/2026	6690,3	6690,3	0,0	------	------	------	------	DOMINGO	
16/02/2026	6690,3	6698,7	8,4	18,116	6690	0,58	375536	NA	
17/02/2026	6698,7	6704,3	5,6	------	------	------	------	SOLEADO	
18/02/2026	6704,3	6708,6	4,3	------	------	------	------	SOLEADO	
19/02/2026	6708,6	6712,8	4,2	------	------	------	------	SOLEADO	
20/02/2026	6712,8	6715,6	2,8	22,689	6713	0,99	377675	SOLEADO	
21/02/2026	6715,6	6715,6	0,0	------	------	------	------	SABADO	
22/02/2026	6715,6	6715,6	0,0	------	------	------	------	DOMINGO	
23/02/2026	6715,6	6721,1	5,5	------	------	------	------	LLUVIOSO	
24/02/2026	6721,1	6724,3	3,2	------	------	------	------	LLUVIOSO	
25/02/2026	6724,3	6728,7	4,4	22,645	6724	2,06	380188	NA	
26/02/2026	6728,7	6733,8	5,1	------	------	------	------	SOLEADO	
27/02/2026	6733,8	6740,1	6,3	------	------	------	------	SOLEADO	
28/02/2026	6740,1	6740,1	0,0	------	------	------	------	SABADO	
TOTAL MES			84,80	95,15		3,63			

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
PERIODO:	FEBRERO
MUNICIPIO:	FACATATIVA — PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN — SERIE 2740548

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/02/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/02/2026	3267,5	3269,5	2,0	45.290	3269	—	370461	—	—	—	—	NA
7/02/2026	3269,5	3269,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
8/02/2026	3269,5	3269,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
9/02/2026	3269,5	3277,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
10/02/2026	3277,8	3285,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
11/02/2026	3285,4	3292,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
12/02/2026	3292,3	3298,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
13/02/2026	3298,6	3298,6	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SIN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS
14/02/2026	3298,6	3298,6	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
15/02/2026	3298,6	3298,6	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
16/02/2026	3298,6	3307,3	8,7	45.290	3308	1,16	376078	—	—	—	—	NA
17/02/2026	3307,3	3314,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
18/02/2026	3314,7	3319,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
19/02/2026	3319,2	3324,1	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
20/02/2026	3324,1	3327,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
21/02/2026	3327,5	3327,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
22/02/2026	3327,5	3327,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	DOMINGO
23/02/2026	3327,5	3333,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	LLUVIOSO
24/02/2026	3333,8	3337,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	LLUVIOSO
25/02/2026	3337,8	3343,4	5,6	40.761	3338	1,36	380189	—	—	—	—	NA
26/02/2026	3343,4	3348,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
27/02/2026	3348,8	3354,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	SOLEADO
28/02/2026	3354,1	3354,1	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	SABADO
TOTAL MES			86,60	131,34		2,52		0,00		0,00		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de febrero de 2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento y rehabilitación vial en la Provincia Sabana Occidente, específicamente en el municipio de Facatativá, interviniendo las veredas Mancilla, Santa Marta, Cuatro Esquinas y Paso Ancho.

Se alcanzó un avance total de 8,9 km intervenidos y 0,5 km Re intervenidos, cumpliendo con el objetivo de conformación, compactación y mejoramiento de la subrasante, así como el perfilado de cunetas, limpieza y recuperación de alcantarillas. Estos trabajos contribuyen de manera significativa al mejoramiento de la transitabilidad y condiciones de seguridad de la red vial rural del municipio.

Es importante resaltar que durante el periodo se presentaron factores que afectaron parcialmente la ejecución normal de las actividades, tales como 14 horas de lluvia y 5 horas de inoperatividad, además de la falla eléctrica en la motoniveladora, la cual permaneció fuera de operación varios días mientras se gestionaba el cambio de piezas. Con el apoyo de maquinaria municipal, se logró mantener la continuidad de las labores, alcanzando un 75% de avance respecto a lo programado**.**

En conclusión, el balance del periodo es positivo, evidenciando compromiso operativo, y cumplimiento progresivo de las metas establecidas, garantizando el mejoramiento continuo de la vía rural en el municipio de Facatativá.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Compactación de vía.	Corto en el sistema eléctrico motoniveladora.	Conformación y perfilacion de cunetas.
		
Conformación de vía.	Extendido de material granular.	Conformación de vía.
		
Suministro acpm.	Retiro de material.	Extendido de material granular.

LEONARDO GUERRA
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVSNS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
