Informe de obra No 06 – marzo 30 de 2026

INTRODUCCION

El Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Sincelejo es una instalación que se creó en 2007 para organizar las funciones de los juzgados penales del Distrito Judicial de Sincelejo, según lo establecido en el acuerdo No. PSAA07-4326 de 2007, con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

En el contexto de mejorar y mantener la infraestructura de esta importante instalación judicial, se ha adjudicado al "CONSORCIO GESTIONAR SINCELEJO" el "Contrato No: SAMC 07 DE 2025". Este contrato tiene como objeto la ejecución de adecuaciones, reparaciones locativas, y mantenimientos preventivos y correctivos en la infraestructura del Complejo Judicial de Sincelejo, Sucre.

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, Colombia.



OBJETIVO GENERAL

Mejorar la infraestructura del Complejo Judicial de Sincelejo, Sucre, a través de la ejecución de adecuaciones, reparaciones locativas, y mantenimientos preventivos y correctivos, garantizando condiciones óptimas para el funcionamiento de los juzgados penales del Distrito Judicial de Sincelejo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Torre A y B - Corozal:

- Ejecutar trabajos de pintura vinilo tipo I en muros interiores (tres manos) en complejo judicial de Corozal, incluyendo preparación de superficies mediante raspado, resanes y sellado de juntas, para garantizar acabados uniformes y duraderos
- Ejecutar trabajos de pintura vinilo en cielo rasos en el Complejo Judicial de Corozal, incluyendo reparación de cintas en mal estado, resane de superficie mediante sellado garantizando acabados uniformes y duraderos.
- Desmantelar las baterías de baños (sanitarios, lavamanos, divisiones y demás accesorios) con el fin de darle una ambientación más moderna y funcional en la Torre AB.
- Realizar la demolición de enchapes y plantillas para modernizar las baterías de baños de uso de los funcionarios en la Torre AB.
- Realizar el desmantelamiento de tuberías hidrosanitarias de las baterías de baños de la Torre AB.
- Realizar el armado de muñecos de tuberías para la nueva red hidrosanitaria de las baterías de baño de la Torre AB.

FECHA DEL INFORME:	30/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO U ORDEN:	Contrato No: SAMC 07 DE 2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIONAR SINCELEJO		
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO Y COROZAL		
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (06) MESES	**PLAZO PRORROGA:**	UN (1) MES
VALOR DEL CONTRATO (A):	$1.394.175.454 MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO	**VALOR ADICIÓN (B):**	$ 394.714.254,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE

	SETENTA Y CINCO MIL CAUTROCIENTOS CICUENTA Y CUATRO PESOS		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE)
FECHA ACTA DE INICIO:	25/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	31 DE MAYO DE 2026		
Observaciones:			

ASPECTO FINANCIERO					
VALOR TOTAL CONTRATADO (A+B):	$ 2.091.263.181,00		**VALOR ANTICIPO:**	**$ 0**	
			V. PAGO ANTICIPADO:	$0	
VALOR TOTAL PAGADO:	$364.095.577,00		**VALOR AMORTIZADO:**		
VALOR A CANCELAR: (IVA Incluido)	**VALOR FACTURADO:**	$ 1.039.423.185,00	**NUEVO SALDO:**	$0	
	VALOR A AMORTIZAR:	$0			
	VALOR A PAGAR:	$1.039.423.185			

CRONOGRAMA DE OBRAS

AVANCE DE OBRA:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EJECUCION DE OBRA	Las actividades del cronograma que se han realizado desde el 03 de octubre de 2025 (fecha de comienzo de obra) 25 de septiembre de 2025 (acta de inicio) hasta la fecha de este informe que es 30 de marzo son las siguientes: **PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL** 4.07. PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 1.4 REPARACIÓN DE LÁMINAS ACRÍLICAS EN FACHADA, INCLUYENDO EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA. 4.08. PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL. 7.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS. 7.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS. 7.36 Suministro e instalación de marco en aluminio para luminaria de 60*60.

10.01 CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)

13.03 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL.

NP 6 PINTURA TIPO ESMALTE PARA SÓCALOS.

NP REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS

NP DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES

TORRE AYB.

10. ACABADOS. CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)

7.00 INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS

7.01 tubería PVC sch-40 1/2 x 3m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
7,17. Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.
7.26 Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.
7.27 Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta. 7.28 de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.
7.29 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.

1.00 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS

1.01. Desmonte de Sanitarios

1.02. Desmonte de lavamanos
1.03. Demolición de enchape de muros y piso.
1.04. Desmonte y retiro de tubería sanitaria de 4"
1.05. Desmonte y retiro de tubería sanitaria de 2"
1.08. Suministro e instalación y enchapes para muro de baños
1.09. Suministro e instalación y enchapes para piso baños
1.11. Suministro e instalación de sanitario ahorrador
1.12. Suministro e instalación de grifería para lavamanos
1.20. Punto sanitario para batería sanitaria de 4"
1.21. Punto sanitario para lavamanos y orinales de 2"
1.22. Punto sanitario de sifón de piso de 2"

NP 28 PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

NP 29 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO. COMPUESTA POR CABINAS ENTANBORADA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIMAGNETICO ACABADO 2B, COMPUESTOS POR ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN ACERO INOX CON CHAPETAS INFERIORES, BISAGRAS EN ACERO INOX, MANIJAS Y PASADORES

NP 30 BARRA EN ACERO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

NP 31. SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

N.P. 35,1,5,1 Columna de agua en tubería PVC-P RDE 21ø 2"
N.P. 35,1,9,1 Válvula de compuerta NRS ø ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

N.P. 35,1,9,2 Válvula de compuerta NRS ø ¾" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

N.P. 35,1,9,3 Válvula de compuerta NRS ø 1" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

	N.P. 35,1,9,4 Válvula de compuerta NRS ø 1 ¼" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,9,5 Válvula de compuerta NRS ø 1 ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,10,1 Suministro e instalación punto de agua fría ø ½" N.P. 35,2,1,1 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6” N.P. 35,2,3,1 Suministro e instalación de tubería PVC Liviana ø 2” N.P. 35,2,4,1 Suministro e instalación de bajante PVC-S ø 4” N.P. 35,2,7,1 Suministro e instalación punto ventilación ø 2”
ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DE OBRA	Las actividades del cronograma que se han realizado desde el 03 de octubre de 2025 (fecha de comienzo de obra) 25 de septiembre de 2025 (acta de inicio) hasta la fecha de este informe que es 30 de marzo son las siguientes: **PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO - TORRE GENTIUM.** NP SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT ENRROLLABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. **PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL** 4.07. PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA,

	ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 1.4 REPARACIÓN DE LÁMINAS ACRÍLICAS EN FACHADA, INCLUYENDO EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA. 4.08. PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL. 10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJAS DE PIEDRA PARA FACHADA COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. NP 1 DESMONTE Y SUMINISTRO DEL LOGO INSTITUCIONAL EN LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE LASER COLOR A ELECCION H: 20 CM Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE EN CONTRASTE SATINADO D: 30 CM NP 2 ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES 13.03 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL 10.01 CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad). NP 6 PINTURA TIPO ESMALTE PARA SOCALOS

7.36 Suministro e instalación de marco en aluminio para luminaria de 60*60.

7.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

7.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

NP REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS.

NP DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES.

PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO - TORRE AYB.

6.00 IMPERMEABILIZACION DE PLACA

6,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

7.00 INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS

7.01 TUBERIA PVC SCH-40 1/2 X 3M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

7,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO No. 3X12 (F+N+T). 3 LINEAS: NEUTRO, FASE Y POLO TIERRA.

7,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL.

	7,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO DE 18" INCRUSTAR. 7,07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS 7,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS 7,09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS 7,12 SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA BLANCO INTEGRAL DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA 7,13 SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA REGUALADA COLOR NARANJA DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA. 7,16 suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada. 7,19 Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable 2/0 AWG. 7,21 Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 1/0 AWG + 1 # 1/0 AWG + 1 # 2 AWG de Cu. 7.22 Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 1/0 AWG. 7,23 Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 2 AWG. 7,25 Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 6 AWG de Cu. 7,26 Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta. 7.27 Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta. 7,28 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta. 7,29 Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta. 7,3 Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 6 AWG + 1 # 6 AWG + 1 # 8 AWG de Cu.

	7,31 Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 8 AWG + 1 # 8 AWG + 1 # 8 AWG de Cu. 7,32 Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 20 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada. 7.33 Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada. 7,34 Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 20 cm * 5 cm. Incluye soporte y cable de equpotencialización 7,36 Suministro e instalación de marco en aluminio para luminaria de 60*60 7,38 Suministro e instalación de regata, resane y pintura. 7.41 Suministro e instalación de breaker monopolar de 1*20 A 7.42 Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*20 A 7.43 Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*30 A NP 11 Tuberia EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. NP 12 SALIDA DE LUCES EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG CON TOMA AEREA. INCLUYE PRENSA ESTOPA, TAPA DE CAJA, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. NP 13 Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador graduable 560 - 800 AMP Capacidad de Ruptura 70 KA, con ajustado cerca a 665 Amp, 1 analizador de red, 1 DPS, 17 breaker's (3 de 3x150 amp , 5 de 3x80 amp, 7 de 3x63 amp + 2 de rserva); todos trifásicos, barrajes de fases, neutro y tierra. NP 14 Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 150 Amp, 1 analizador de red, 8 breaker's trifásicos de 40 Amp y 2 breakers de reserva, barrajes de fases, neutro y tierra. NP 15 Suministro e instalación de cable alimentador de 3 x (5 # 350 kcmil) Fase Al Serie 8000 HHFR-LS + 1 x (5 #350 kcmil) Neutro Al S8000 HHFF-LS+ 2 x # 2/0 AWG Tierra Cu.

NP 16 Suministro e instalación de breaker industrial 560 - 800 Amp graduable con ajuste cerca a 665 A. Incluye conexión en el tablero principal y conexión en los barrajes de neutro y tierra.

NP 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION CON BRAKER DE 3 X150 , 1 BREAKER DE 3X80, TODOS TRIFASICOS, BARRAJE DE FASE NEUTRO Y TIERRA.

NP 18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RAWELT + LIQUID TIGHT DE 3/4" Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

NP 19 ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE TABLERO A MANEJADORAS X 3 LINEAS (2N°10+1N°12) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION

NP 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIOANDO DE MANEJADORAS A CONDESADIRAS EN 3# 12 (1 FASE+1 NEUTRO+1 TIERRA) + 2#14 (2SEÑALES) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

NP 21 Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 350 kcmil.

NP SUMINISTRO DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA DE 30 X 8. Incluye soporte.

NP EQUIPOTENCIALIZACION DE BANDEJA TIPO MALLA TODOS EN CABLE DESNUDO LIBRE DE HALOGENO #12.

NP SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PNCHABLE PARA CABLE #4.

NP REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS

NP DESMONTE DE LUMINARIAS

	NP Alimentador en cable libre de halogeno 3#10+1#12 NP Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 30 cm * 5 cm. Incluye soporte. NP SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBA TECH DE 3/4 PARA DESAGUE. NP DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTE. NP PERFORACIONES PARA BUITRONES DE 0,2 X 0,35 PISOS DEL 1 AL 6 TORRE AB SINCELEJO. NP SEÑALIZACION DE ACOMETIDAS. NP SEÑALIZACION DE CABLEADO. NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA DE SOBREPONER. NP DESMONTE DE CIELO RASO EN PVC. NP SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PONCHABLE PARA CABLE #6. NP SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PONCHABLE PARA CABLE #8. 5.05 Suministro e instalación de breaker industrial de 80 A. Incluye conexión en el tablero principal regulado existente y conexión en los barrajes de neutro y tierra. 5.07 Suministro e instalación de breaker industrial de 40 A. NP Suministro e instalación de breaker industrial de 60 A. NP Suministro e instalación de breaker industrial de 150 A. NP Tuberia EMT 1" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

NP INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA

8.00 INSTALACIONES REDES DE DATOS

8.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6ª

8.02 SALIDA DE DATOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (INCLUYE P/CORD CAT 6A DE 1MT)

8.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 X 5 CON TAPA TORNILLO BLANCA

8.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL TRIPLE 1 TOMA NORMAL, 1 TOMA REGULADO 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO

8.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL DOBLE 1 TOMA NORMAL 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO

8.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL SENCILLO 1 TOMA NORMAL TAPA TORNILLO BLANCO

8.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 3MT AZUL.

8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH, 48 PTO 10/100/100 4 SFP ADMINISTRABLE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

NP Suministro e instalación de Gabinete para rack de 28 a 30 Ru Certificado.

NP SUMINISTRO E INSTALACION DE Herraje Panel 48 ports CAT 6A y Nexxt NPM-DH2UB Horizontal Duct Cable Mgmt 19" 2U.

NP REGLETA MULTITOMAS PDU BASICA PARA MONTAJE HORIZONTAL EN RACK, 15A/120V, 8 TOMAS NEMA 5-15 TIERRA AISLADA.

9.00 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA

NP MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO BAÑOS.

NP MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO INCLUYE LIMPIEZA, RECORTE, CAMBIO DE CERRADURA, BISAGRAS E INSTALACION DE VINILO ESMERILADO, INCLUYE CAMBIO DE MARCO NUEVO (BODEGA DE ASEO).

NP PUERTA BATIENTE EN PERSIANA PRIMER PISO DE MEDIDAS 85CM X 240CM CUARTO ELECTRICO PISO 1.

10.00 ACABADOS

10.01 ACABADOS**.** CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad).

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL CON LAMINA DE 8MM BASE 9 PARA MURO DE CUARTO DE RACK POR 2 CARAS.

10,03 PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

13.03 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL.

NP 2 ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

NP 4 CORTINEROS EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos -baterías no conductor de electricidad).

NP DESMONTE VENTANERIA METALICA.

NP DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA.

NP DESMONTE DE DUCTOS PISO 2 Y ACARREO PARA DISPOCION FINAL.

NP MURO EN DRAYWALL CON LAMINA DE SUPERBOARD 8MM Y BASE 9 CON DOS CARAS.

1.00 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS

1,01 Desmonte de Sanitarios.
1,02 Desmonte de lavamanos.
1,03 Demolicion de enchape de muros y piso.
1,04 Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 4"
1,05 Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 2"
1,08 suministro e Instalación y enchape para muros de baños
1,09 suministro e Instalación y enchape piso baño
1.10 Suministro e instalación de lavamanos corrido
1,11 suministro e instalación de sanitario ahorrador
1,12 suministro e instalación de espejo
1,13 suministro e instalación de grifería para lavamanos
1,14 rejilla Piso
1,18 suministro e instalación de Dispensador de Jabón liquido acero inoxidable 1000 ml de 20x13cm
1,19 suministro e instalación de orinales.
1,2 Punto sanitario para bateria sanitaria de 4".
1,21 Punto sanitario para lavamanos y orinales de 2".
1,22 Punto sanitario de sifon de piso de 2".
NP 22 DEMOLICION PLANTILLA DE PISO.
NP 23 DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUCOBON.
NP 24 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 009.
NP 25 MACHONES DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.09 MX 0,20.

	NP 26 VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.09MX0.20 M. NP 27 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4. NP 28 PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO NP 29 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO. COMPUESTA POR CABINAS ENTANBORADA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIMAGNETICO ACABADO 2B, COMPUESTOS POR ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN ACERO INOX CON CHAPETAS INFERIORES, BISAGRAS EN ACERO INOX, MANIJAS Y PASADORES. NP 30 BARRA EN ACERO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. NP 31 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE. NP 32 Suministro e Instalación de tubería sanitaria de 4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. NP 33 Suministro e Instalación de tubería sanitaria de 2". Incluye todos los elementos para su correcta instalación. NP 34 Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2”. Incluye resane. NP 34.1 Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm. NP 34.2 Caja de inspección 60x60 NP 34.5 Reconstrucción placa de contrapiso 3000 psi NP 35.1.1.1 Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 1/2" NP 35.1.1.6 Desmonte y retiro de columna de agua en tubería pvc presión de 2". N.P. 35,1,2,1 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9 ø ½" N.P. 35,1,2,2 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 ø ¾" N.P. 35,1,2,3 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 13,5 ø 1" N.P. 35,1,2,4 Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 1 ¼" N.P. 35,1,5,1 Columna de agua en tubería PVC-P RDE 21ø 2" N.P. 35,1,9,1 Válvula de compuerta NRS ø ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

	N.P. 35,1,9,2Válvula de compuerta NRS ø ¾" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,9,3Válvula de compuerta NRS ø 1" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,9,4Válvula de compuerta NRS ø 1 ¼" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,9,5Válvula de compuerta NRS ø 1 ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. N.P. 35,1,10,1 Suministro e instalación punto de agua fría ø ½". N.P. 35,2,1,1 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6". N.P. 35,2,3,1Suministro e instalación de tubería PVC Liviana ø 2". N.P. 35,2,4,1Sumnistro e instalación de bajante PVC-S ø 4". N.P. 35,2,7,1Suministro e instalación punto ventilación ø 2". NP 35.2.9.1 Cúpula tragante en aluminio con sosco ø 6" x 4". NP 7 DESMONTE DE PUERTA METALICA. NP DEMOLICION DE MUROS EN SUPERBOARD. NP PUNTO DE DESAGUE EN TUBERIA 3/4" DE PRESION INCLUYE ACCESORIOS. NP UNION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" DE LA HORIZONTAL CON VERTICA. NP Suministro e Instalación de sifón metálico tipo botella. NP DESAGUE PUSH METALICO SIN REBOSE. NP CENEFA EN GRANITO LAVADO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION . 4,08 PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. NP RELLENO SOBRE PLACA (BAÑOS 2,4,5,6). NP TAPA REGISTRO PLASTICA PARA BEBEDEROS.

	NP DEMOLICIÓN DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE. NP RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS.
CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN ACTUAL DE OBRA	

ASPECTO LEGAL (GARANTÍAS)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGURO DEL ESTADO S. A			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:	75-44-101147748			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD C. E. No.	75-40-101055895			
AMPAROS	**PORCENTAJE (%)**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	10%	$284,700,000.00	29/08/2025	31/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10%	$284,700,000.00	29/08/2025	31/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10%	$284,700,000.00	29/08/2025	31/12/2025

INFORME TECNICO

PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO – TORRE GENTIUM

ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACKOUT ENRROLLABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realizó en el piso 7 (juzgado 5to de pequeñas causas y competencias multiples).





PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL

ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)



Esta actividad se realizó en los juzgados del tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes y cafetería.)

PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.






Esta actividad se realizó en el tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes, cafetería, lava traperos, bodega, pasillo.)
En el segundo piso (lava traperos, bodega, pasillo, juzgado promiscuo de familia, juzgado 1ro promiscuo municipal y juzgado 2do penal.)
En el primer piso (pasillo y escalera).

PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.



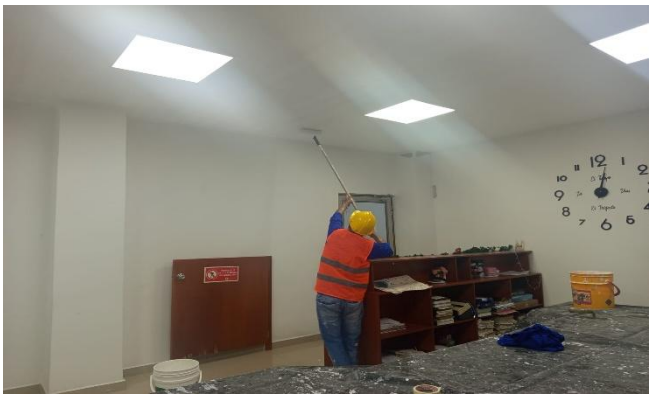

Esta actividad se realizó en el tercer piso (lava traperos, bodega, pasillo, baño de mujeres y baño de hombres.)
En el segundo piso (lava traperos, bodega, pasillo, baño de mujeres, baño de hombres, juzgado promiscuo de familia, juzgado 1ro promiscuo municipal y juzgado 2do penal.)
En el primer piso.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL.

Esta actividad se realizó en los juzgados del tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes, cafetería.)
En los juzgados del segundo piso (juzgado promiscuo de familia, juzgado 1ro promiscuo municipal, juzgado 2do penal y juzgado 1ro laboral.)





SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJAS DE PIEDRA PARA FACHADA COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

Esta actividad se realizó en la fachada del palacio de justicia de corozal.



DESMONTE Y SUMINISTRO DEL LOGO INSTITUCIONAL EN LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE LASER COLOR A ELECCION H: 20 CM Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE EN CONTRASTE SATINADO D: 30 CM

Esta actividad se realizó en la fachada del palacio de justicia de corozal.



SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

Esta actividad se realizó en los juzgados del tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes, cafetería.)



SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

Esta actividad se realizó en los juzgados del tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal.)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO PARA LUMINARIA DE 60*60.

Esta actividad se realizó en los juzgados del tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes, cafetería.)



ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Esta actividad se realizó en el tercer piso (Pasillo, juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal.)
En el segundo piso (pasillo, juzgado promiscuo de familia, juzgado 1ro promiscuo municipal y juzgado 2do penal.)
En el primer piso (pasillo y escalera).






DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL

Esta actividad se realizó en los juzgados de tercer piso (juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes y cafetería.)



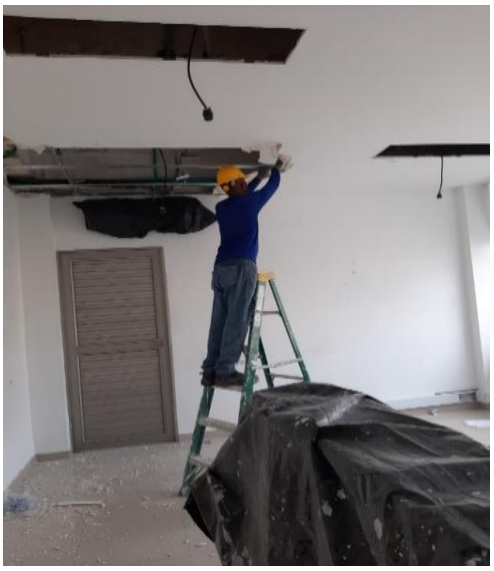

PINTURA TIPO ESMALTE PARA SÓCALOS

Esta actividad se realizó en el primer piso





DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES

Esta actividad se realizó en el tercer piso (Juzgado primero penal del circuito, juzgado primero civil del circuito, juzgado segundo promiscuo municipal, juzgado tercero promiscuo municipal, oficina de judicantes y cafetería).
En el segundo piso (juzgado promiscuo de familia, juzgado 1ro promiscuo municipal y juzgado 2do penal del circuito y juzgado 1ro laboral).





REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS

Esta actividad se realizó en el segundo piso (juzgado promiscuo de familia, juzgado 2do penal del circuito).





PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO - TORRE AB

IMPERMEABILIZACION DE PLACA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Actividad realizada en la cubierta de piso 6 de la torre A y B.



INSTALACIONES ELECTRICAS

TUBERIA PVC SCH-40 1/2 X 3M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realizó en piso 1 (baño de damas y caballeros), piso 2 (baño de damas, baño de caballeros y adecuación de archivo nuevo), piso 4 (baño de damas y caballeros), piso 5 (baño de damas y caballeros) y piso 6 (baño de damas y caballeros).





SALIDA DE LUCES EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG CON TOMA AEREA. INCLUYE PRENSA ESTOPA, TAPA DE CAJA, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realiza en los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, pasillo, adecuación de archivo nuevo, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el sexto piso (pasillo, cuarto de rack, juzgado 2do penal del circuito especializado, zona de tableros, adecuación de juzgado nuevo).
Esta actividad se realiza en los juzgados de quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en los juzgados de cuarto piso (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros).



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO No. 3X12 (F+N+T). 3 LINEAS: NEUTRO, FASE Y POLO TIERRA

Se realiza esta actividad en todos los juzgados de piso 2 (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, cuarto de rack, zona de tableros), en todos los juzgados de piso 5

(juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, zona de tableros), en los juzgados de piso 6 (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, zona de tableros, adecuación de juzgado nuevo, sala de audiencias #6) y en los baños de hombre y mujeres de piso 2,4,5 y 6 y en zona de pasillos. En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros)




SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL.

Se realiza esta actividad en todos los juzgados de piso 5 (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO DE 18" INCRUSTAR

Esta actividad se realiza en el segundo piso (pasillo, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, pasillo archivo nuevo).
Esta actividad se realiza en el piso 5 (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, zona de tableros).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros).
En piso 6 (zona de tableros).

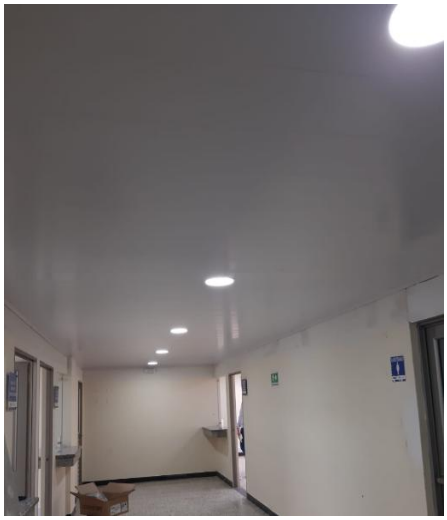

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

Esta actividad se realiza en el piso 5 (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el piso 6 (cuarto de rack, juzgado penal del circuito especializado, zona de tableros).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el segundo piso (pasillo archivo nuevo, adecuación de archivo nuevo, zona de tableros).



SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS

Esta actividad se realiza en los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el sexto piso (pasillo, juzgado 2do penal del circuito especializado, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en los juzgados de quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, pasillo, zona de tableros).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros, pasillo).



SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS.

Esta actividad se realiza en los baños de la torre A y B del palacio de justicia y en algunos juzgados del segundo piso (juzgado primero penal con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad).
Esta actividad se realiza en el quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).
En piso 6 (adecuación de juzgado nuevo).



SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA BLANCO INTEGRAL DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía,

juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el piso 6 (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, cuarto de rack, pasillo, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en el piso 5 (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, pasillo, zona de tableros).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, pasillo, zona de tableros).
En piso 1 (pasillo).



SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA REGUALADA COLOR NARANJA DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad).
Esta actividad se realiza en algunos juzgados del sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, cuarto de rack).
Esta actividad se realiza en algunos juzgados del quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, juzgado 6to civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal)




Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.

Esta actividad se realiza en todos los pisos, más específicamente en la zona de los tableros eléctricos y en torre c.




Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable 2/0 AWG.

Esta actividad se realizó en el segundo piso, en el cuarto de aseo.

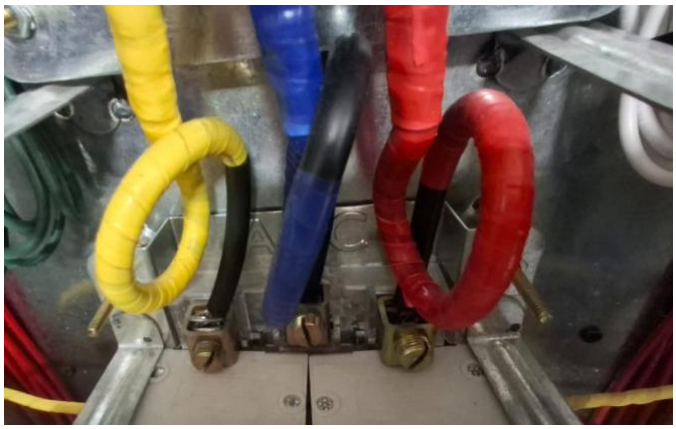


Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 1/0 AWG + 1 # 1/0 AWG + 1 # 2 AWG de Cu.

Esta actividad se realizó en piso 1 (zona de tableros).
En piso 2 (zona de tableros, acometida provisional).
En piso 3 (zona de tableros).
En gabinete de torre AB hasta gabinete de torre C y acometida provisional hasta gabinete regulado de torre C.

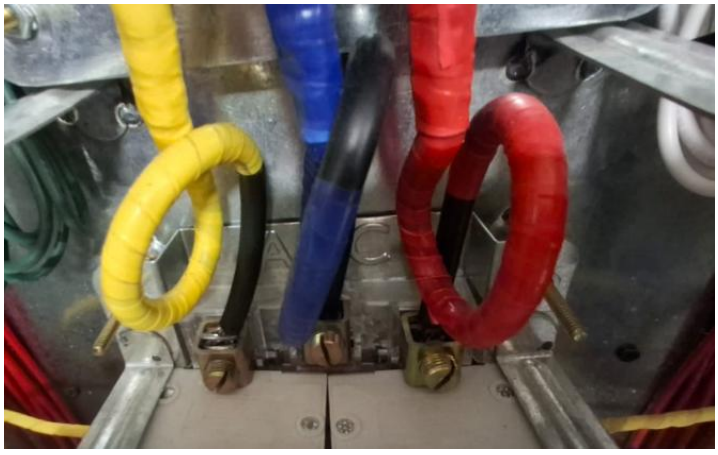


Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 1/0 AWG

Esta actividad se realizó en piso 2 (cuarto de aseo).

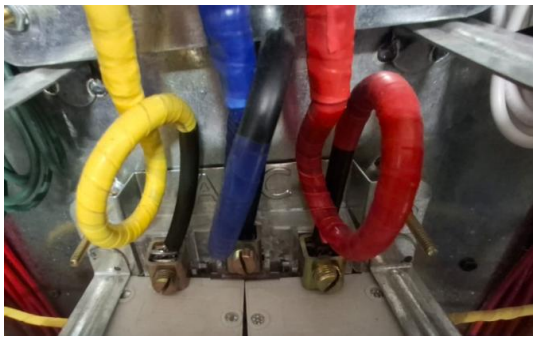

Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 2 AWG

Esta actividad se realizó en piso 2 (cuarto de aseo).

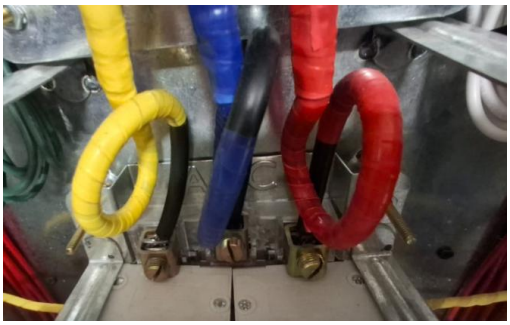

Suministro e instalación de breaker industrial de 150 A. Incluye conexión en el tablero principal regulado existente y conexión en los barrajes de neutro y tierra.

Esta actividad se realizó en el cuarto técnico que se encuentra en piso 1.



Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 6 AWG de Cu.

Esta actividad se realizó en zonas de tableros (pisos 3,4,5 y 6).



Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en piso 2 y buitrón nuevo de piso 3.



Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en los pisos 1,2,3,4,5 y 6.



Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en los pisos 1,2,4,5 y 6.



Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 6 AWG + 1 # 6 AWG + 1 # 8 AWG de Cu.

Esta actividad se realiza desde gabinete hasta zona de tableros de los pisos 2,4,5 y 6.



Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 8 AWG + 1 # 8 AWG + 1 # 8 AWG de Cu.

Esta actividad se realiza en zona de tableros de los pisos 1,2,3,4,5 y 6.



Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 20 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.

Esta actividad se realizó en el sótano de la torre c.



Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.

Esta actividad se realiza en piso 1 (cuarto técnico, cuarto eléctrico). En piso 2 (zona de tableros). En piso 3 (zona de tableros). En piso 4 (zona de tableros). En piso 5 (zona de tableros). En piso 6 (zona de tableros). Y torre C.



Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 20 cm * 5 cm. Incluye soporte y cable de equpotencialización

Esta actividad se realiza en el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, cuarto de aseo, cuarto rack y pasillo en el piso 2 de la torre A Y B.





Suministro e instalación de marco en aluminio para luminaria de 60*60



Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad).
Esta actividad se realiza en los juzgados del quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).

Suministro e instalación de regata, resane y pintura

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad).
Esta actividad se realiza en los juzgados del quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIOANDO DE MANEJADORAS A CONDESADIRAS EN 3# 12 (1 FASE+1 NEUTRO+1 TIERRA)+ 2#14 (2SEÑALES) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, cuarto de rack).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, cuarto de rack).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



Suministro e instalación de breaker monopolar de 1*20 A

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en piso 2,4,5 y 6



Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*20 A

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en piso 2,4,5 y 6



Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*30 A

Esta actividad se realiza en el buitrón nuevo en piso 2



Tubería EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, pasillo, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en algunos juzgados del sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, pasillo, zona de tableros).
Esta actividad se realiza en algunos juzgados del quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, juzgado 6to civil municipal, pasillo, zona de tableros).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, pasillo, zona de tableros).




Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador graduable 560 - 800 AMP Capacidad de Ruptura 70 KA, con ajustado cerca a 665 Amp, 1 analizador de red, 1 DPS, 17 breaker's (3 de 3x150 amp , 5 de 3x80 amp, 7 de 3x63 amp + 2 de rserva); todos trifásicos, barrajes de fases, neutro y tierra.

Esta actividad se realizó en el cuarto técnico del primer piso.



Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 150 Amp, 1 analizador de red, 8 breaker's trifásicos de 40 Amp y 2 breakers de reserva, barrajes de fases, neutro y tierra.

Esta actividad se realizó en el cuarto técnico del primer piso.

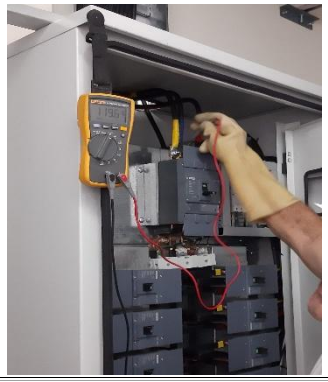


Suministro e instalación de cable alimentador de 3 x (5 # 350 kcmil) Fase Al Serie 8000 HHFR-LS + 1 x (5 #350 kcmil) Neutro Al S8000 HHFF-LS+ 2 x # 2/0 AWG Tierra Cu.

Esta actividad se realizó en los gabinetes de la torre A y B hasta los gabinetes de la torre C.



Suministro e instalación de breaker industrial 560 - 800 Amp graduable con ajuste cerca a 665 A. Incluye conexión en el tablero principal y conexión en los barrajes de neutro y tierra.

Esta actividad se realizó en cuarto técnico de piso 1

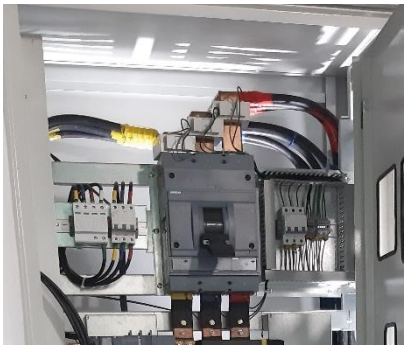


SUMINISTRO E INSTLACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION CON BRAKER DE 3 X150 , 1 BREAKER DE 3X80, TODOS TRIFASICOS, BARRAJE DE FASE NEUTRO Y TIERRA

Esta actividad se realizó en cuarto técnico de piso 1




SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RAWELT + LIQUID TIGHT DE 3/4" Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, cuarto de rack).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal.

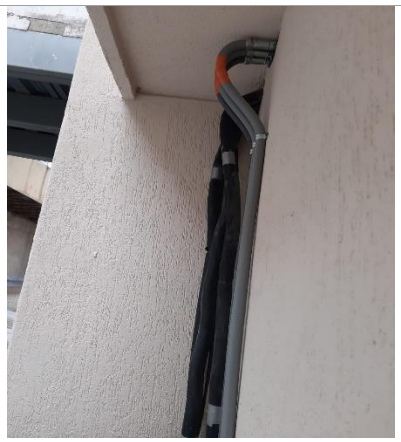


ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE TABLERO A MANEJADORAS X 3 LINEAS (2N°10+1N°12) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, cuarto rack).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, cuarto de rack).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal).
En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal.

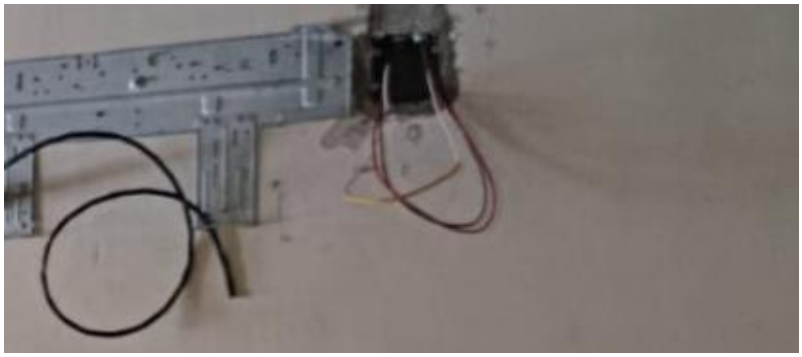

Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 350 kcmil

Esta actividad se realizó en el sótano de torre C

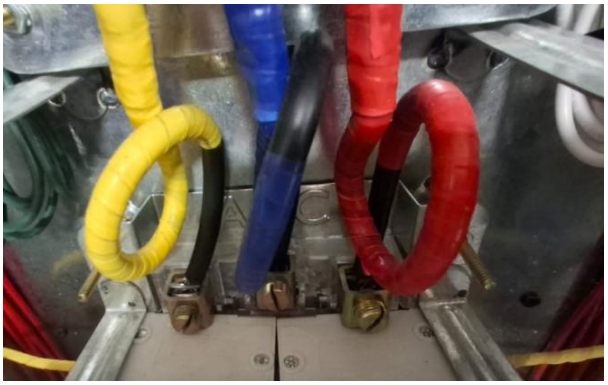

SUMINISTRO DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA DE 30 X 8. Incluye soporte

Esta actividad se realizó en cuarto técnico del primer piso.



EQUIPOTENCIALIZACION DE BANDEJA TIPO MALLA, TODOS EN CABLE DESNUDO LIBRE DE HALOGENO #12


Esta actividad se realiza en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro

penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, pasillo).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, pasillo).
Esta actividad se realiza en todos los juzgados de quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, pasillo).
En piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, pasillo).



SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PONCHABLE PARA CABLE #4

Esta actividad se realizó en el cuarto de aseo del segundo piso y en zona de tableros de los pisos 4,5 y 6.

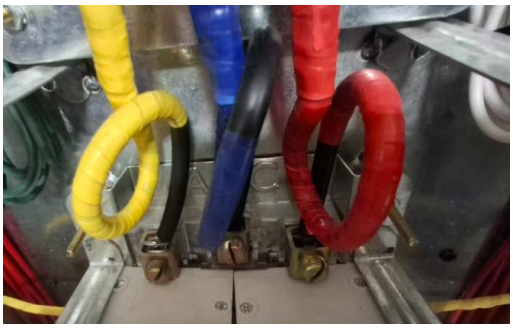

REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS

Esta actividad se realizó en los juzgados de piso 2 (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, adecuación de archivo nuevo). En piso 6 (sala de audiencias #5).



DESMONTE DE LUMINARIAS

Esta actividad se realizó en los juzgados de piso 2 (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, adecuación de archivo nuevo). En piso 6 (sala de audiencias #5).




Alimentador en cable libre de halógeno 3#10+1#12

Esta actividad se ejecuta en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal con funciones de garantía, pasillo).

Esta actividad se ejecuta en todos los juzgados de sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, pasillo, cuarto de rack).

Esta actividad se ejecuta en todos los juzgados de quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, pasillo).

En piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal.

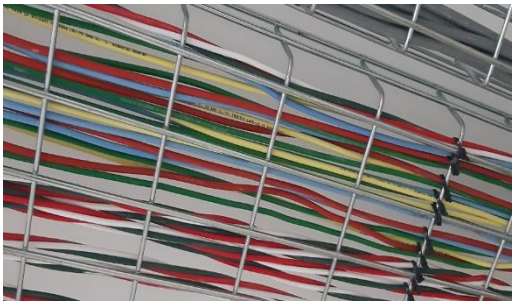

Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 30 cm * 5 cm. Incluye soporte.

Esta actividad se ejecuta en todos los juzgados de segundo piso (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, pasillo, cuarto rack, cuarto de aseo).
Esta actividad se ejecuta en zonas intervenidas de sexto piso (pasillo, cuarto de rack, cuarto de archivo).
Esta actividad se ejecuta en el pasillo de quinto piso y cuarto piso.



SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBA TECH DE 3/4 PARA DESAGUE

Esta actividad se ejecuta en algunos juzgados del segundo piso (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal municipal con funciones de garantía, juzgado 2do penal municipal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal municipal con funciones de garantía.)
Esta actividad se ejecuta en el cuarto de rack y adecuación de juzgado nuevo del sexto piso.
Esta actividad se ejecuta en algunos juzgados del quinto piso (juzgado 2do civil municipal. Juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal).

En piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal.



DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EXISTENTE

Esta actividad se realiza en piso 6 (juzgado 1ro penal del circuito especializado). En piso 4 (pasillo). En piso 2 (pasillo y cuarto de rack).



PERFORACIONES PARA BUITRONES DE 0,2 X 0,35 PISOS DEL 1 AL 6 TORRE AB SINCELEJO

Esta actividad se realizó en los pisos 1,2,3,4,5 y 6



SEÑALIZACION DE ACOMETIDAS

Esta actividad se realiza en los pisos 2,3,4,5 y 6 más específicamente en zona de tableros eléctricos.



SEÑALIZACION DE CABLEADO

Esta actividad se realiza en los pisos 1,2,3,4,5 y 6 en zona de tableros eléctricos.



SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA DE SOBREPONER

Esta actividad se ejecutó en todos los baños de los pisos 1,2,4,5 y 6.




DESMONTE DE CIELO RASO EN PVC

Esta actividad se realizó en sala de audiencias #5 y en el juzgado 2do penal del circuito especializado de sexto piso. En piso 2 (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad).




SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PONCHABLE PARA CABLE #6

Esta actividad se realiza en piso 2 (cuarto de aseo). En piso 4 (zona de tableros eléctricos). En piso 5 (zona de tableros eléctricos). En piso 6 (zona de tableros eléctricos).

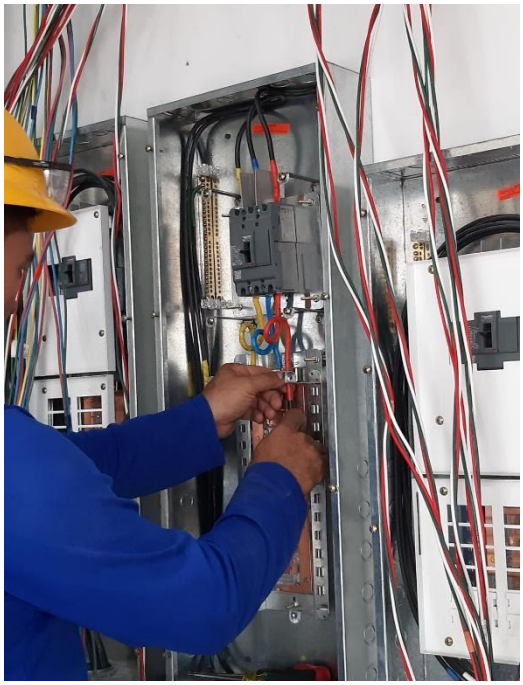


SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO PONCHABLE PARA CABLE #8

Esta actividad se realiza en los pisos 4,5 y 6 en zona de tableros eléctricos.

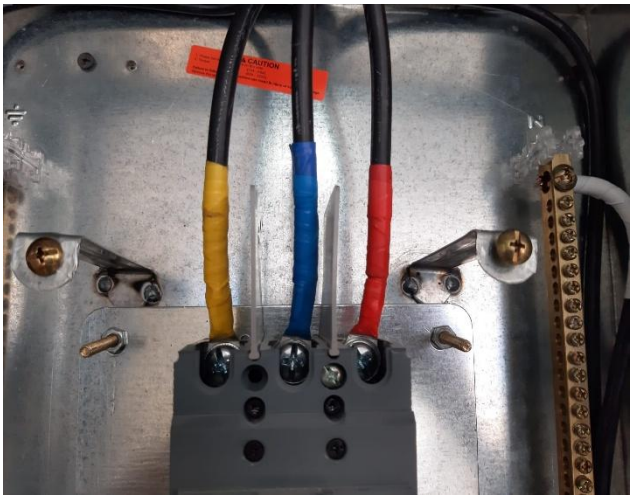


Suministro e instalación de breaker industrial de 80 A. Incluye conexión en el tablero principal regulado existente y conexión en los barrajes de neutro y tierra.

Esta actividad se realiza en los pisos 4,5 y 6 en zona de tableros eléctricos.

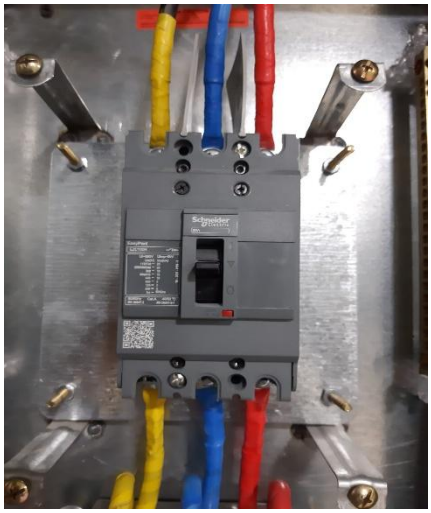


Suministro e instalación de breaker industrial de 40 A.

Esta actividad se realiza en los pisos 1,2,4,5 y 6 en zona de tableros eléctricos.

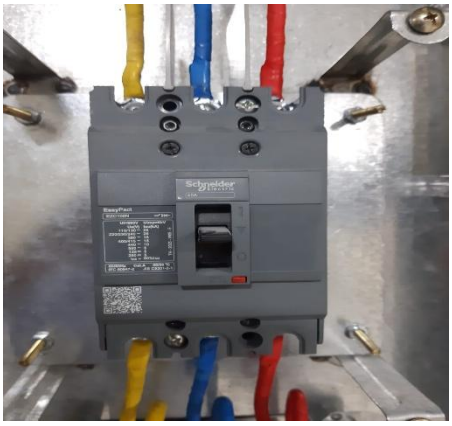

Suministro e instalación de breaker industrial de 60 A.

Esta actividad se realiza en los pisos 1,2,4,5 y 6 en zona de tableros eléctricos.

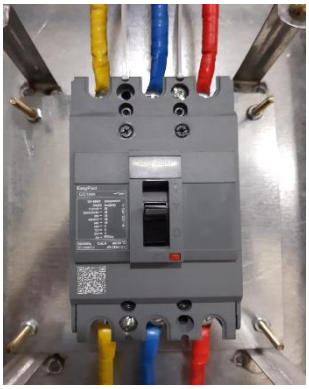

Suministro e instalación de breaker industrial de 150 A.

Esta actividad se realiza en los pisos 1 y 2 en zona de tableros eléctricos.



Tuberia EMT 1" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

Esta actividad se realiza en piso 6 (juzgado 1ro penal del circuito especializado). En piso 5 (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal). En piso 4 (juzgado 1ro civil municipal, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal). En piso 2 (juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad).



INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Esta actividad se realizó en los pasillos de los pisos 2,4,5 y 6.




INSTALACIONES REDES DE DATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A

Se ejecuta la instalación de cableado estructurado categoria 6ª para los puntos de redes de datos en las areas intervenidas del complejo judicial, como en los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, cuarto de rack); En los juzgados del sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, sala de audiencias #6 y cascada que va desde piso 6 hasta piso 2); en los juzgados de quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado quinto civil municipal, juzgado sexto civil municipal. En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).

La instalación se realiza mediante canalización independiente de la red eléctrica, garantizando separación técnica entre sistemas y adecuada organización del cableado. se verificó la continuidad de puntos de red y su correcta conexión para garantizar el funcionamiento del sistema de comunicaciones.

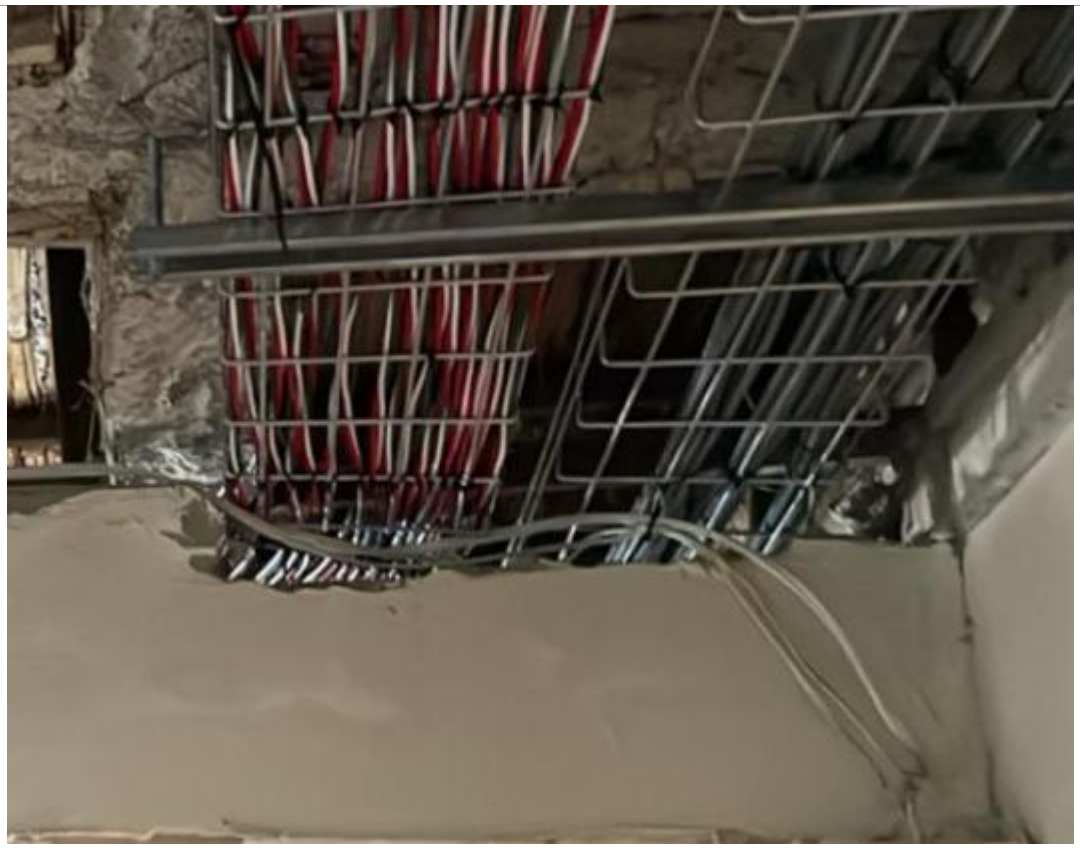

SALIDA DE DATOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (INCLUYE P/CORD CAT 6A DE 1MT)

Se realizó la instalación de salida de datos para red estructuras en los juzgados intervenidos del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad.)
En el sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).
En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal). Incluyendo suministro e instalación de modulos o jack rj45 categoria 6ª, faceplate y soportes correspondientes según el sistema de canalización correspondiente.
La actividad incluye ponchado y organización de cableado, garantizando la correcta conectividad. Esta actividad se continua ejecutando en las demas areas programadas.



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 X 5 CON TAPA TORNILLO BLANCA

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad.)
En el sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).
En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL TRIPLE 1 TOMA NORMAL, 1 TOMA REGULADO 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad).
En el sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).
En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL DOBLE 1 TOMA NORMAL 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO.

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad.)
En el sexto piso (sala de audiencias #5, juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).
En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL SENCILLO 1 TOMA NORMAL TAPA TORNILLO BLANCO

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad.)
En el sexto piso (juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).
En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 3MT AZUL

Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad.)

En el sexto piso (juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado).

En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal). En los juzgados de piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).



SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH, 48 PTO 10/100/100 4 SFP ADMINISTRABLE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Esta actividad se realiza en cuarto de rack de los pisos 2 y 6.




Suministro e instalación de Gabinete para rack de 28 a 30 Ru Certificado

Esta actividad se ejecutó en el cuarto de rack del sexto piso.



SUMINISTRO E INSTALACION DE Herraje Panel 48 ports CAT 6A y Nexxt NPM-DH2UB Horizontal Duct Cable Mgmt 19" 2U

Esta actividad se realiza en cuarto de rack de los pisos 2 y 6.

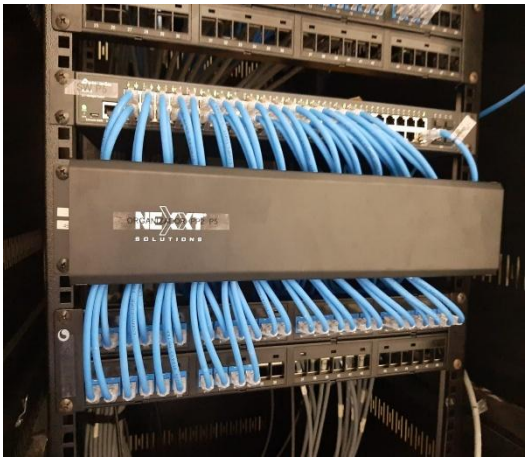

REGLETA MULTITOMAS PDU BASICA PARA MONTAJE HORIZONTAL EN RACK, 15A/120V, 8 TOMAS NEMA 5-15 TIERRA AISLADA


Esta actividad se realizó en cuarto de rack de piso 6.



MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO.

Esta actividad se ejecutó en los baños de damas y caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.

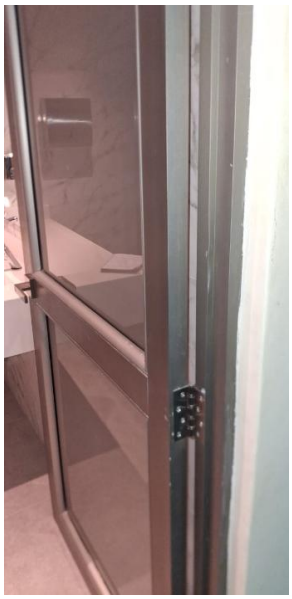

MANTENIMIENTO PUERTA DE ALUMINIO BODEGA DE ASEO

Esta actividad se ejecutó en la bodega de aseo del primer piso.



suministro e intalacion de puerta batiente. Incluye dintel superior, contramarco en canal 3X1 con aleta, hoja en tubo rectangular de aluminio T103, perfin divisor central, cerradura central de seguridad tipo palanca, fallebas aereas y de piso, bisagras en acero inoxidable de 4" X3", recubrimiento en persiana de aluminio. incluye marco y cerradura

Esta actividad se realizó en el cuarto técnico del primer piso.



ACABADOS

CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos y baterías no conductor de electricidad)


Se ejecuta el suministro e instalación de cielo raso en panel PVC, previo a la instalación se verificó la correcta nivelación de la estructura soporte, garantizando estabilidad y alineación del sistema. Posteriormente se procedió al montaje de los paneles asegurando continuidad en la modulación, fijación mecánica adecuada y acabado uniforme en las áreas intervenidas. Esta actividad se realiza en todos los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad y pasillo, pasillo adecuación de archivo nuevo). En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, baño mujeres). En piso 6 (juzgado penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado). En piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal). En el piso 1 (antigua oficina SST, cafeteria)

Esta actividad permite mejorar las condiciones estéticas de aislamiento termoacústico y resistencia a la humedad de los espacios intervenidos



SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL CON LAMINA DE 8MM BASE 9 PARA MURO DE CUARTO DE RACK POR 2 CARAS

Se ejecuta esta actividad en cuarto de rack del sexto piso y cuarto técnico de primer piso. Adicionalmente en cuartos técnicos de pisos 2,4,5 y 6.

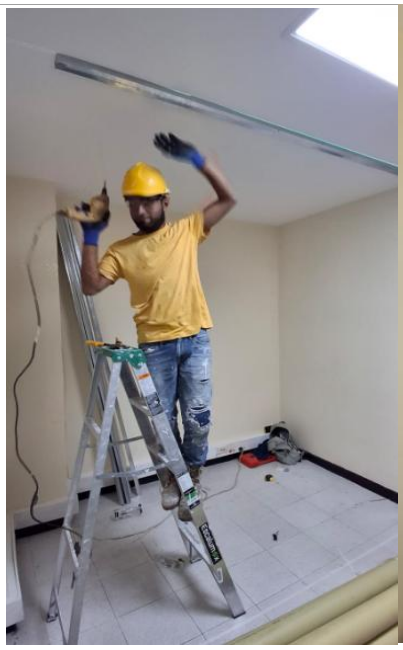


PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

Se ejecuta la aplicación de pintura en las áreas intervenidas utilizando color igual al existente para mantener la uniformidad estética del complejo judicial. Previo a la aplicación se realizaron labores de preparación de la superficie que incluye raspado de pintura deteriorada, resane, sellado de fisuras y lijado de los muros. Posterior se aplicaron 3 manos de pintura vinilo, garantizando adecuada adherencia, homogeneidad en la textura y acabado final uniforme.

Esta actividad se realiza en los juzgados del segundo piso (juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, juzgado tercero penal municipal con funciones de garantía, juzgado segundo penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero penal municipal con funciones de garantía, juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, pasillo, adecuación de archivo nuevo, zona de tableros, cuarto de rack). En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, pasillo, zona de tableros).

En el sexto piso (juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, pasillo, cuarto de rack, zona de tableros.)

En el primer piso (pasillo, cocineta, escalera.). en piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros).





DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL

Esta actividad se ejecutó en el primer piso (cuarto técnico, antigua oficina de sst, cafeteria).
En el segundo piso (pasillo, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal con funciones de garantía, juzgado 2do penal con funciones de conocimiento, adecuación de archivo nuevo).





CORTINERO EN PVC, INCLUYE PINTURA

En el quinto piso (juzgado 2do civil municipal, juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal).
En el segundo piso (juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgado 1ro penal municipal con funciones de garantía, juzgado 2do penal municipal con funciones de garantía, juzgado 3ro penal municipal con funciones de garantía). En el cuarto piso (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal).

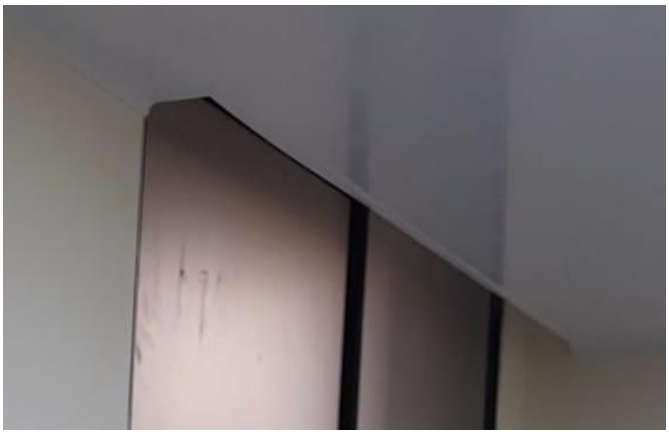

DESMONTE DE VENTANAS

Esta actividad se ejecutó en los pisos 2,3,4,5,6

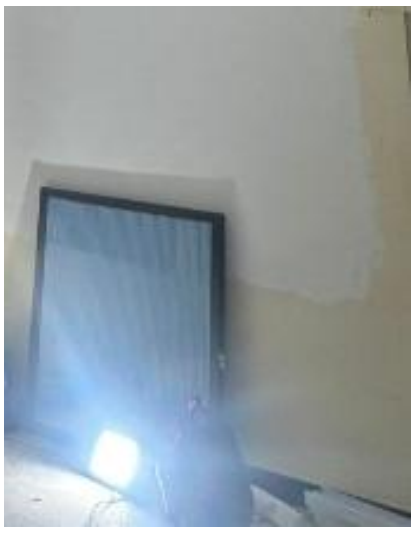

DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA

Esta actividad se ejecutó en el cuarto técnico del primer piso, en adecuación de archivo nuevo y cuarto de rack de piso 2



DESMONTE DE DUCTOS PISO 2 Y ACARREO PARA DISPOCION FINAL

Esta actividad fue ejecutada en el segundo piso (pasillo, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, juzgado 1ro penal municipal con funciones de garantía, juzgado 2do penal municipal con funciones de garantía y adecuación de archivo nuevo.)





ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Esta actividad se realiza en los juzgados del segundo piso (pasillo, adecuación de archivo nuevo, zona de tableros, cuarto de rack). En el quinto piso (juzgado 5to civil municipal, juzgado 6to civil municipal, juzgado 2do civil municipal, zona de tableros).
En el sexto piso (juzgado 1ro penal del circuito especializado, juzgado 2do penal del circuito especializado, pasillo, cuarto de rack, zona de tableros.)
En el primer piso (pasillo, cocineta, escalera.). en piso 4 (juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 3ro civil municipal, juzgado 1ro civil municipal, juzgado 4to civil municipal, zona de tableros, pasillo).



MURO EN DRAYWALL CON LAMINA DE SUPERBOARD 8MM Y BASE 9 CON DOS CARAS

Esta actividad se realiza en piso 2 (zona de tableros, juzgado 1ro penal con funciones de conocimiento, adecuación de juzgado nuevo). En piso 3 (zona de tableros). En piso 4 (zona de tableros). En piso 5 (zona de tableros). En piso 6 (zona de tableros, adecuación de juzgado nuevo).





PINTURA TIPO ESMALTE PARA SOCÁLOS

Esta actividad se realizó en el primer piso y en el segundo piso.





PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

Esta actividad se realiza en el primer piso (pasillo, baño de damas y caballeros). En el segundo piso (baño de damas y caballeros, adecuación de juzgado nuevo). En el cuarto piso (baño de damas y caballeros, juzgado 3ro civil del circuito, juzgado 1ro civil municipal). En el quinto piso (baño de damas y caballeros, juzgado 2do civil municipal). En el sexto piso (baño de damas y caballeros, cuarto técnico).



MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS

Desmonte de Sanitarios

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.





Desmonte de lavamanos

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.




Demolición de enchape de muros y piso

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.

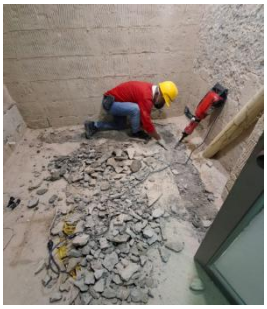Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 4"

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.





Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 2"

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.





Suministro e Instalación y enchape para muros de baños

Se realizó la instalación de enchape para muros en las áreas intervenidas de los baños de damas y caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6, incluyendo pañete impermeabilizado, para garantizar la adecuada protección contra la humedad. Cumpliendo con las especificaciones establecidas para este tipo de áreas húmedas. Posteriormente se realiza el sellado de juntas con boquilla para garantizar el correcto funcionamiento de las piezas de cerámica instaladas.



Suministro e Instalación y enchape piso baño

Se realizó la instalación de enchape para pisos en las áreas intervenidas de los baños de damas y caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6 de las torres A Y B, verificando previamente las pendientes necesarias garantizando el adecuado drenaje hacia los puntos de desagües, las piezas fueron instaladas con adhesivo especializado, asegurando correcta alineación, nivelación y separación de las juntas.



Suministro e instalacion de lavamano corrido

Esta actividad se realizó en los baños de damas y baños de caballeros de los pisos 1,2,4,5 y 6.



Suministro e instalación de sanitario ahorrador

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



Suministro e instalación de espejo

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



Suministro e instalación de grifería para lavamanos

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



Suministro e instalación de Rejilla Piso

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



suministro e instalación de Dispensador de Jabón liquido acero inoxidable 1000 ml de 20x13cm

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



Suministro e instalación de orinales

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



Punto sanitario para bateria sanitaria de 4"


Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.






Punto sanitario para lavamanos y orinales de 2"

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.

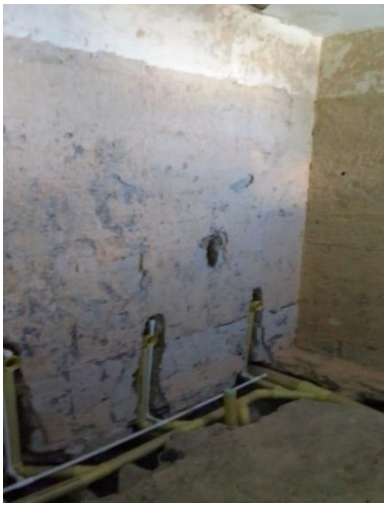

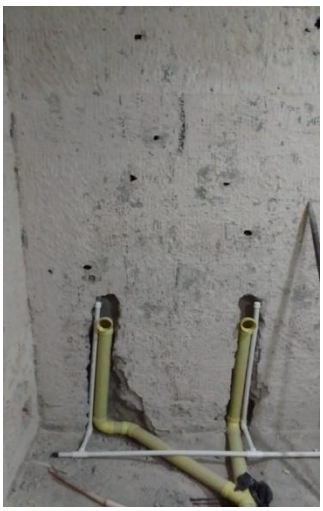

Punto sanitario de sifon de piso de 2"

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.





DEMOLICION PLANTILLA DE PISO

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.



DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUCOBON

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.



LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 009

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.



MACHONES DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.09 MX 0,20

Esta actividad se realiza en cuarto técnico y baños de piso 1 y en cuarto rack de piso 6.





VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.09MX0.20 M

Esta actividad se realiza en cuarto técnico y baños de piso 1





ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6.



PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1, en el baño de caballeros en piso 5 y cuarto técnico en piso 1




CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO. COMPUESTA POR CABINAS ENTANBORADA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIMAGNETICO ACABADO 2B, COMPUESTOS POR ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN ACERO INOX CON CHAPETAS INFERIORES, BISAGRAS EN ACERO INOX, MANIJAS Y PASADORES

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6



SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

Esta actividad se realiza en los baños de damas y caballero en los pisos 1,2,4,5 y 6

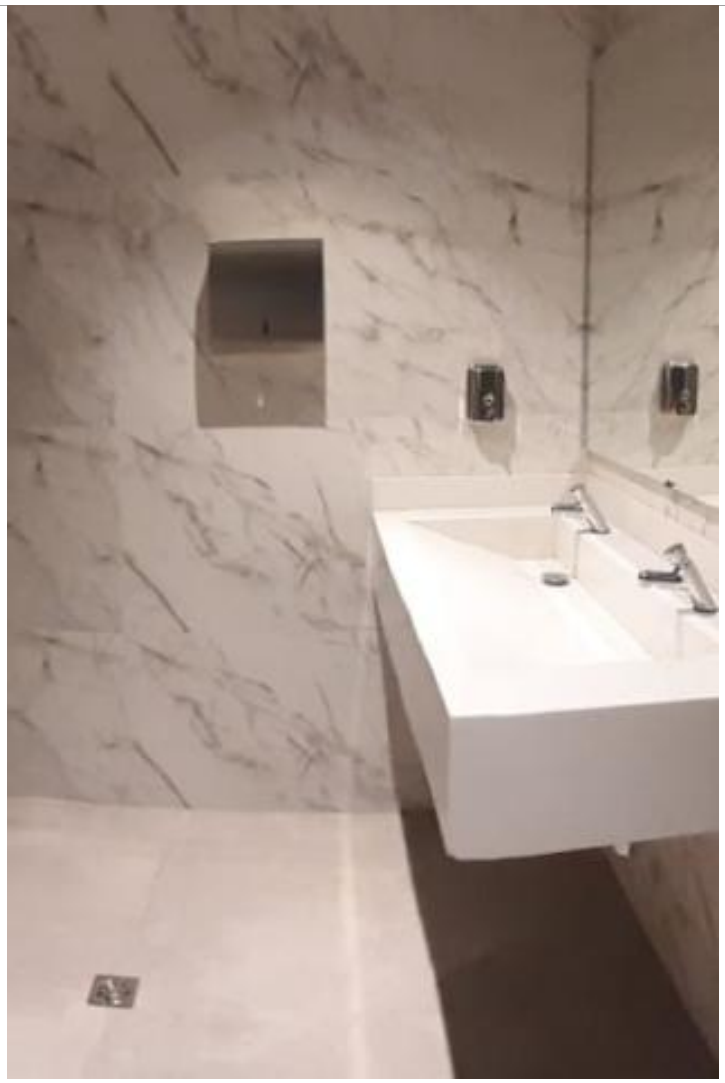

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9 ø ½"

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1,2,4,5, y 6




Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 ø ¾"

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1,2,4,5, y 6




Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 13,5 ø 1"

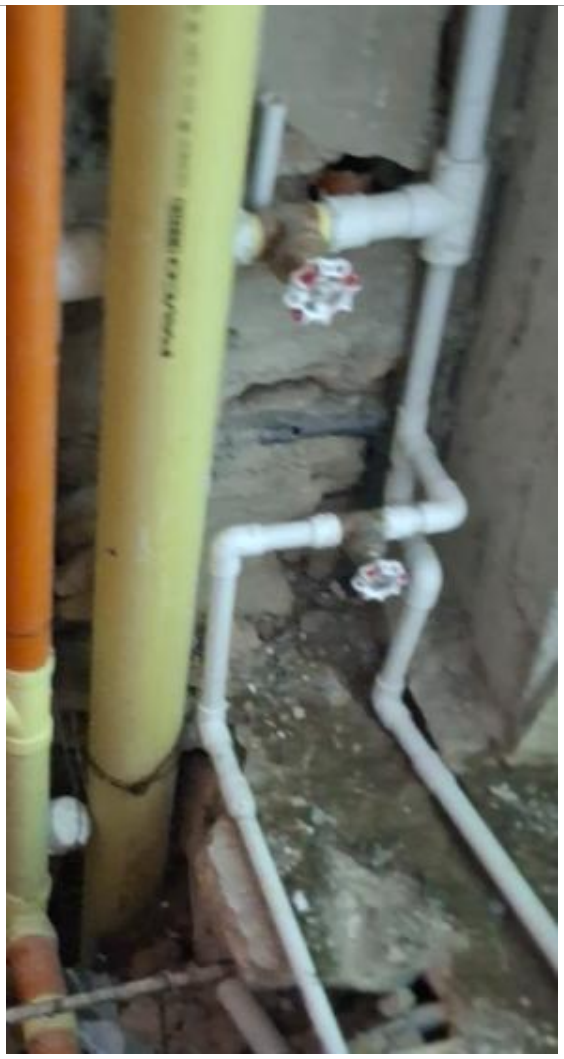

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 5 y 6

Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 embebida ø 1¼"

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 2 y 4

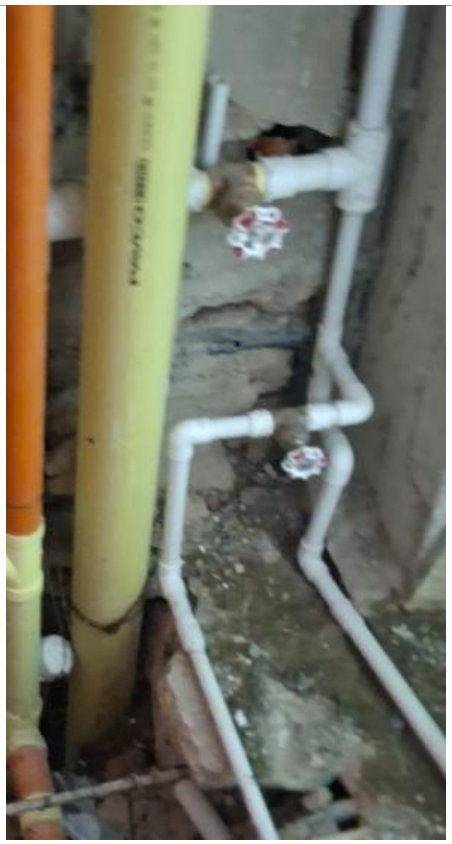


Válvula de compuerta NRS ø ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1,2,4,5, y 6




Válvula de compuerta NRS ø ¾" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1,2,4,5, y 6

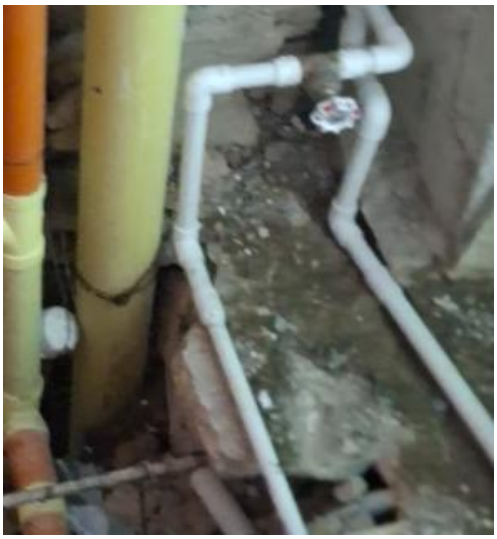


Válvula de compuerta NRS ø 1" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 5, y 6

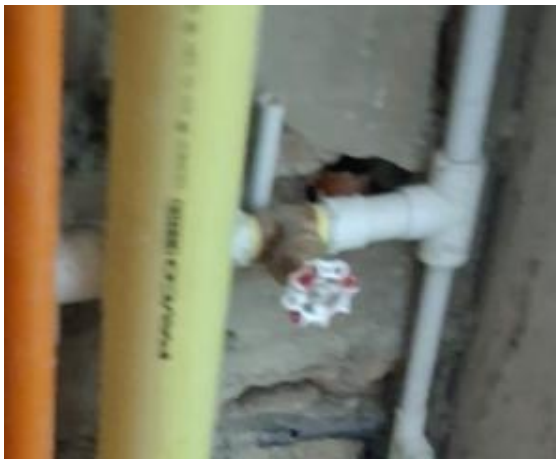

Válvula de compuerta NRS ø 1 ¼" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 4 y 2

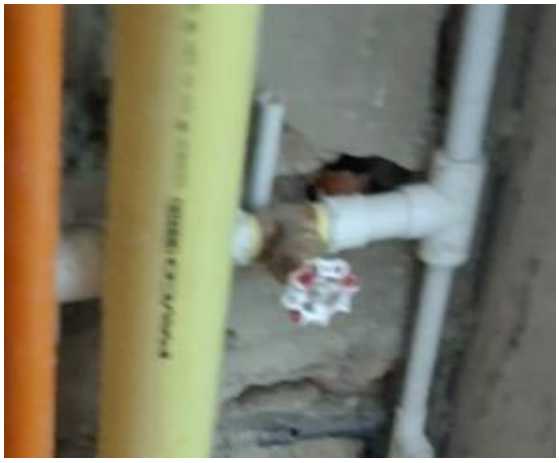


Válvula de compuerta NRS ø 1 ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1



Suministro e instalación punto de agua fría ø ½"

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1, piso 2 ,4, 5 y 6

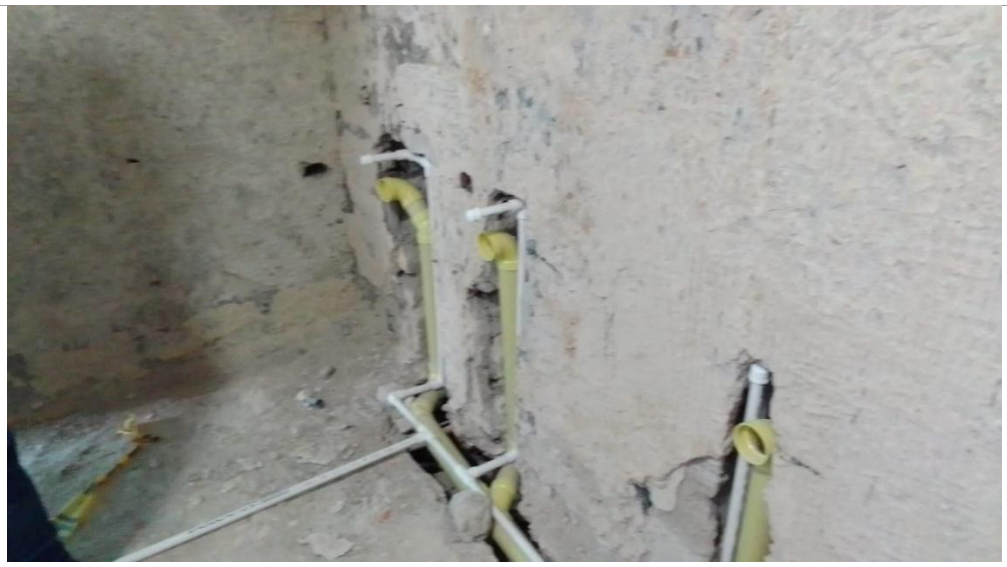

Suministro e instalación de tubería PVC Liviana ø 2”

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1, piso 2 ,3,4, 5 y 6



Suministro e instalación de bajante PVC-S ø 4”

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1, piso 2 ,3,4, 5 y 6



Suministro e instalación punto ventilación ø 2”

Esta actividad se realiza en todos los baños de piso 1, piso 2,4, 5 y 6



CONCLUSIONES

Las adecuaciones realizadas en el Complejo Judicial de Sincelejo han representado un avance significativo en la mejora de su infraestructura, optimizando tanto las condiciones físicas como funcionales de los espacios judiciales. Se están llevando a cabo mejoras en las labores de pintura en muros y cielo raso con sus respectivos resanes en el palacio de justicia de Corozal que ha contribuido a la renovación estética y funcional del complejo; del mismo modo se está llevando a cabo la remodelación de las baterías de baños de la Torre AB generando un impacto positivo en la operatividad del complejo judicial, beneficiando tanto a funcionarios como a usuarios del servicio, al brindar un entorno más seguro, eficiente y funcional.



Nombre o Razón Social del PROPONENTE:
CONSORCIO GESTIONAR SINCELEJO
Nombre del Representante:
JUAN CARLOS GARCES DAJUD
Nit o Cédula de Ciudadanía No: 9019829607
Correo electrónico: cgestionar2025@gmail.com
