
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	**30 días**	**mar 20/01/2**	**lun 2/03/26**
2		**MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA**	**60 días**	**mar 3/03/26**	**lun 25/05/26**
3		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**7 días**	**mar 3/03/26**	**mié 11/03/2**
6		**DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**	**10 días**	**jue 12/03/26**	**mié 25/03/2**
7		Demolición andenes o pisos en adoquin, con espesor variable de 10 a 15 cm. no incluye retiros. Incluye demolición en cualquier estado, y el acopio del material de demolición en el punto de cargue de volqueta.	10 días	jue 12/03/26	mié 25/03/26
8		Retiro de cubierta. Recuperación de los materiales aprovechables y su disposición hasta el sitio que lo indique la interventoría	7 días	jue 12/03/26	vie 20/03/26
9		Retiro de bancas existentes. No incluye botada de escombr	3 días	mar 17/03/2	jue 19/03/26
10		Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad en zona Parque. Incluye entibados y el pago de tarifa por derecho a botadero por m3 de material excavado, no incluye transporte	5 días	jue 12/03/26	mié 18/03/26
11		Llenos con material de préstamo en limo, compactados mecánicamente con rana o canguro.	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26
12		**CONCRETOS Y ACERO**	**30 días**	**jue 19/03/26**	**mié 29/04/2**
13		Construcción de COLUMNAS DE 30x30cm en concreto de 21 MPa con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, de	10 días	jue 2/04/26	mié 15/04/26
14		Construcción de VIGAS de fundacion; en concreto de 21 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26
15		Construcción de VIGAS de amarre; en concreto de 21 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y	10 días	jue 16/04/26	mié 29/04/26
16		Vaciado de piso en concreto de 21 Mpa de e=0.10 m. Incluye transporte de los materiales y todo lo necesario para la correcta construcción.	10 días	vie 3/04/26	jue 16/04/26
17		Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84. Incluye el suministro y el transporte del material. Pisos en concreto zona parque	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26
18		Suministro e Instalación de concreto Clase D de 21MPa para Andenes e=0.10 m. Incluye formaleta y todo lo necesario para la correcta consturcción.	10 días	vie 3/04/26	jue 16/04/26
19		Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26
20		**MAMPOSTERIA**	**10 días**	**vie 17/04/26**	**jue 30/04/26**
21		Construccion de Mamposteria en bloque catalan de perforación vertical 10x15x30 para alturas hasta 3.5m. Incluye el suministro, transporte y colocacion del bloque, mortero de pega y todos los items para su correcta construccion	10 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26
22		**TECHOS Y CUBIERTAS**	**15 días**	**jue 30/04/26**	**mié 20/05/2**
23		Suministro transporte e instalación de cubierta en teja. Incluye estructura en Madera para cubierta, Alfardas, caballete, tabilla, etc. Y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	10 días	jue 30/04/26	mié 13/05/26
24		Suministro, Transporte e instalacion dede canoa metálica en lamina galvanizada calibre 20 . Desarrollo de 1,0 m	5 días	jue 14/05/26	mié 20/05/26
25		**REDES HIDROSANITARIAS**	**13 días**	**jue 7/05/26**	**lun 25/05/26**
31		**PISOS Y ENCHAPES**	**30 días**	**jue 26/03/26**	**mié 6/05/26**
32		Piso en enchape en porcelanato Moon Luna Antislip 30×60 , con concreto de pega y demas elementos necesarios para su correcta instalación. En aulas , baños, corredores, cocina, cuartos tecnicos , etc.	30 días	jue 26/03/26	mié 6/05/26
33		Construcción de Piso en adoquines altotrafico de 20x10x8 con una combinacion de colores salteados: negro, samon oscuro, salmon claro, gris claro y blanco, de la empresa ADOQUIN-AR o similar, para colocar en zona de acceso exterior y deck posterior.	5 días	jue 26/03/26	mié 1/04/26
34		**PAISAJISMO**	**47 días**	**jue 5/03/26**	**vie 8/05/26**
37		**ETAPA DE LIQUIDACION**	**30 días**	**mar 26/05/2**	**lun 6/07/26**

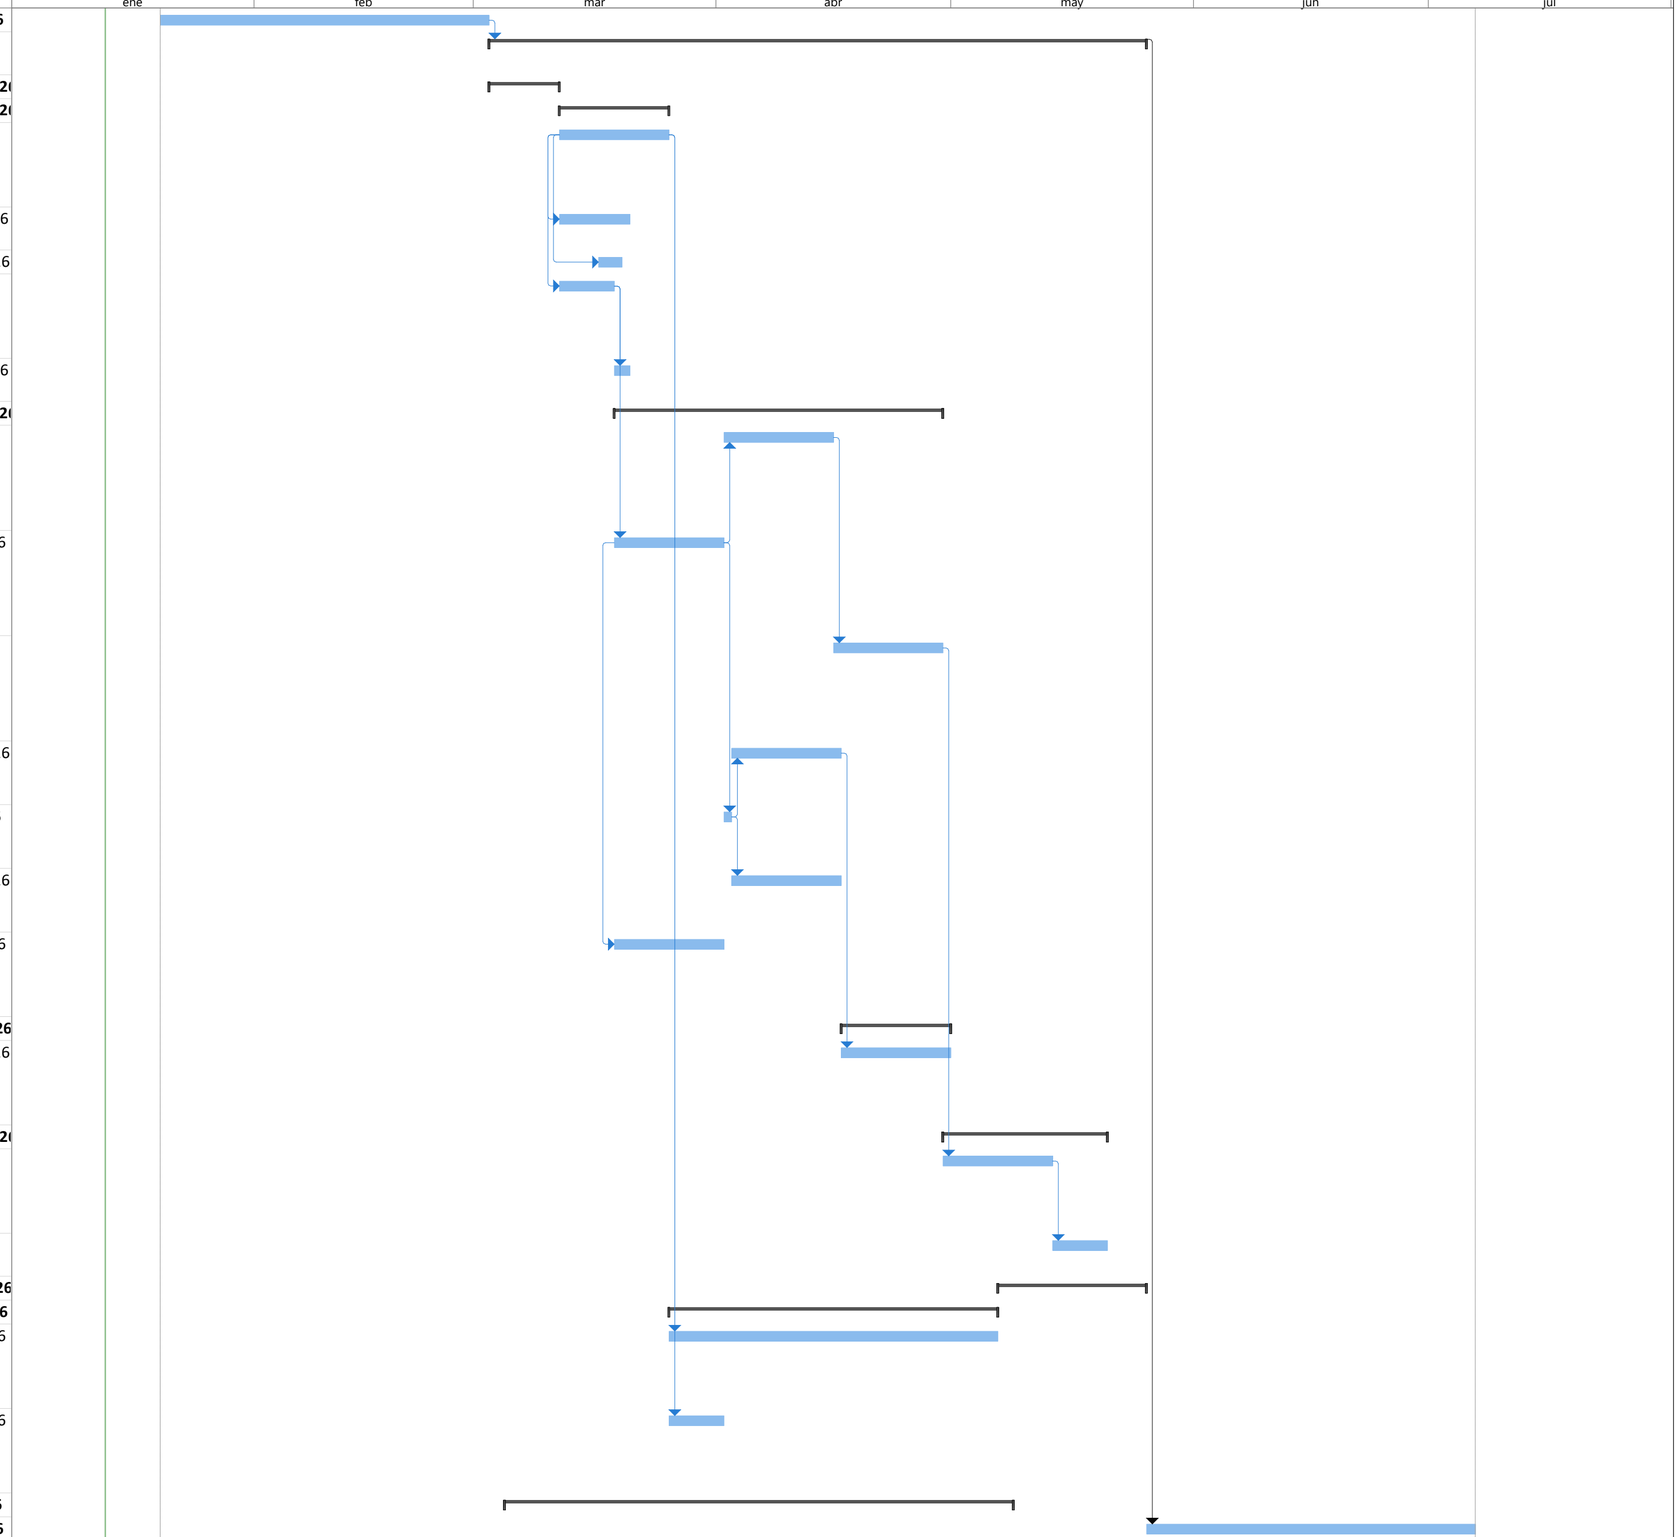

Proyecto: CRONOGRAMA PISC
Fecha: mar 13/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
