
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Vereda La Soledad - Sector Oficina de Acueducto - FELIDIA**	**47 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 6/06/26**	
2		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**1 día**	**mié 8/04/26**	**jue 9/04/26**	
3		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	1 día	mié 8/04/26	jue 9/04/26	21
4		**RELLENOS Y BASES**	**3 días**	**jue 9/04/26**	**lun 13/04/26**	
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	3
6		**CONCRETOS**	**1 día**	**lun 13/04/26**	**mar 14/04/2**	
7		CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	1 día	lun 13/04/26	mar 14/04/26	5
8		**ACEROS**	**10 días**	**lun 6/04/26**	**vie 17/04/26**	
9		ACERO DE REFUERZO 60000 PS	10 días	lun 6/04/26	vie 17/04/26	
10		**DRENAJES**	**7 días**	**lun 13/04/26**	**mié 22/04/2**	
11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	5
12		CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	5 días	mié 15/04/26	mié 22/04/26	11
13		**ITEMS NO PREVISTOS**	**47 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 6/06/26**	
14		LOCALIZACION Y REPLANTEO GAVIONES Y ESTRUCTURAS	1 día	lun 13/04/26	mar 14/04/26	5
15		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	12 días	mar 14/04/26	mié 29/04/26	14
16		FILTRO TIPO FRANCES GEOTEXTIL NT 2000, TRITURADO 3/4". INCLUYE EXCAVACION, Y TUBERIA PERFORADA PVC D=4".	3 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	17
17		EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	14
18		CARGUE DE SALDO EN SITIO (MANUAL)	7 días	jue 23/04/26	lun 4/05/26	15FC-5 días
19		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 1600 O SIMILAR INC DESPERDIC - TRASLAP	8 días	mar 21/04/26	jue 30/04/26	15CC+5 días
20		ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%), DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	7 días	mar 21/04/26	mié 29/04/26	15CC+5 días
21		TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA DE ORUGAS)	2 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	
22		TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y AGREGADOS VARIOS EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, HASTA 100 m.	10 días	mié 29/04/26	mié 13/05/26	17CC+1 día;20
23		SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES, EL PRECIO INCLUYE SUM E INST DE ABRAZADERAS, ALAMBRE GALVANIZADO, SEPARADORES, SILLETAS DE ALAMBRE, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA SOSTENER Y MANTENER EL GAVION EN SU SITIO.	25 días	lun 4/05/26	vie 5/06/26	22CC+2 días
24		BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (ANALIZADO PARA BORDILLOS EN CONCRETO DIMENSIONES	6 días	vie 29/05/26	sáb 6/06/26	23FC-5 días;9;25FC-7 días
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y TAPABAFLES PARA SUMIDEROS TIPO B	16 días	vie 8/05/26	vie 29/05/26	22FC-4 días

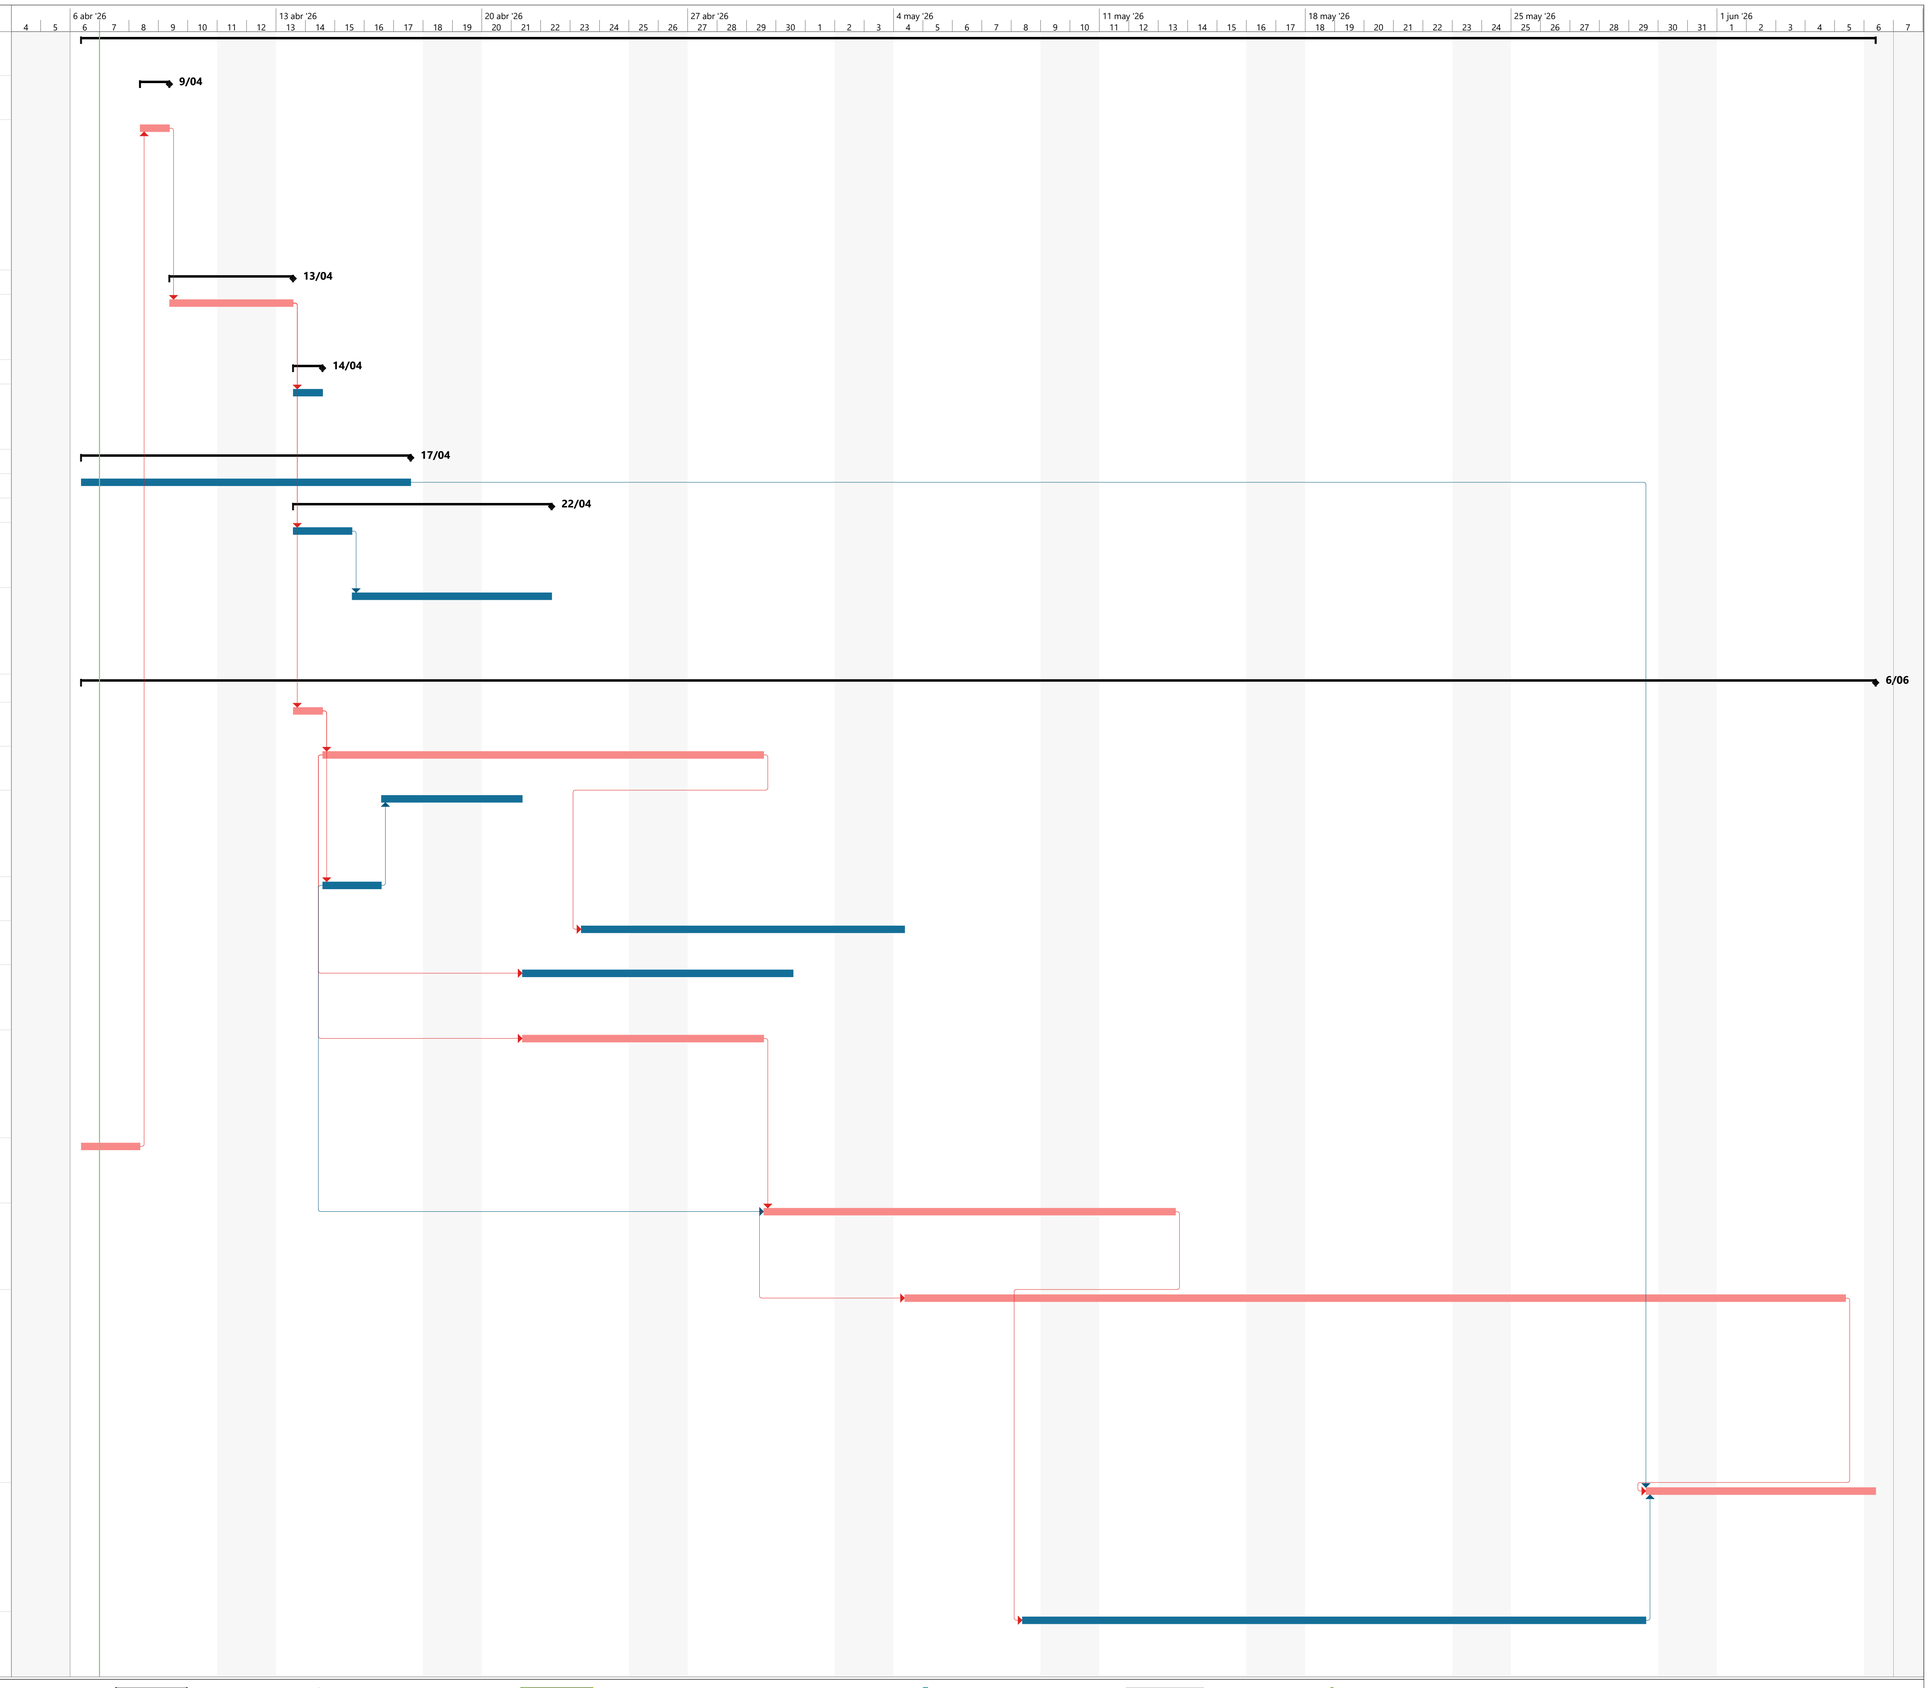

Proyecto: CRONOGRAMA SOLE
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
