INFORME MENSUAL

CONVENIO No. 2452 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

IBAGUÉ– TOLIMA

Enero del 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
   2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
      2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
      2.1.2 CONDICIONES INICIALES 4
      2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 4
3. CONTRATO DE OBRA 5
   3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
      3.1.1 GENERALIDADES 5
      3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 5
   3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
      3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
   3.3 PLAZO CONTRACTUAL 12
   3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO 12
4. CONCLUSIONES 15
5. ANEXOS 15

ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas del 14 al 31 de enero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. Adicionalmente, se han ejecutado actividades complementarias externas a la rehabilitación de la malla vial, relacionadas con el apoyo a otras labores operativas y logísticas que contribuyen al desarrollo integral de los frentes de trabajo y al buen avance del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud75°12'02''-Latitud4°26'16''N. K4+850aK5+750

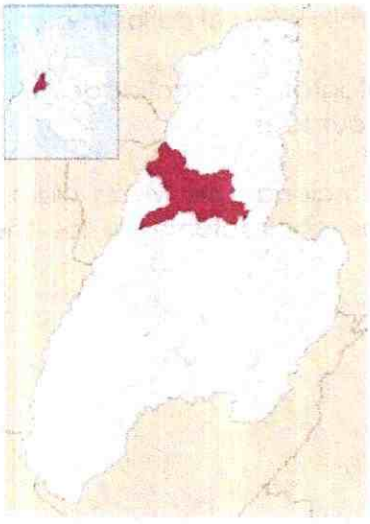

2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.

2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades

relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.
Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR	NNOVECIENTOS MILLONES MCTE ($900.000.000) IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
MODIFICACION 1	NOVENTA Y DOS (92) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	NOVENTA Y DOS (92) DIAS CALENDARIO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	1 DE OCTUBE DE 2025
SUSPENSION No.1	29 DE DICIEMBRE DE 205
REINICIO No.1	14 DE ENERO DE 2025

3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) inspector de obra.
- Un (1) topógrafo.
- Un (1) profesional SST.
- Tres (3) cuadrillas: Conformadas por un (1) oficial, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra y una cuarta (4) cuadrilla conformada por un (1) maestro y tres (3) ayudantes de obra.

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, realizando el cajeo, re parcheo y nivelaciones en las siguientes ubicaciones:

- RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO
- CLL 30 CRA 8
- CLL 93 CON CRA 8 SUR
- AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42
- VIRREY SOLÍS IPS SOBRE LA CRA 5 SUR
- CRA 6 ENTRE CLL 20 Y 21
- CRA 4 ENTRE CLL 80 Y AV PEDRO TAFUR

A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 14 al 17 enero

Área cajeo: 386,13 m2
Área nivelaciones: 0 m2
Volumen asfalta suelto: 52,23 m3
Viajes de escombros: 0 viajes

- Semana del 19 al 24 enero

Área cajeo: 215,42 m2
Área nivelaciones: 160,56 m2
Volumen asfalto suelto: 29,44 m3
Viajes de escombros: 1 viajes

- Semana del 26 al 31 enero

Área cajeo: 379,51 m2
Área nivelaciones: 70,86 m2
Volumen asfalta suelto: 49,35 m3
Viajes de escombros: 6 viajes


Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutas (Ver anexo III).

Alcaldía de IBAGUÉ

S.T.I.

También se realizaron actividades de apoyo en este periodo:

- Construcción andén, Av. Pedro Tafur con glorieta de Mirolindo

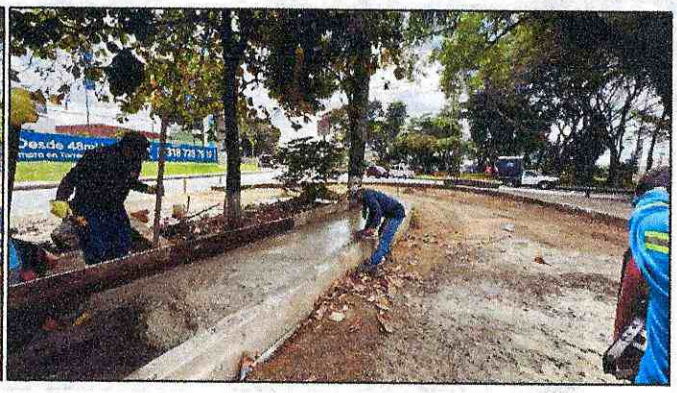- Aplicación de Fresado, Av. Pedro Tafur con glorieta de Mirolindo






- Preparación y aplicación de mezcla asfáltica, Av. Pedro Tafur con glorieta de Mirolindo






- Instalación de concreto, Barrio Tierra Grata

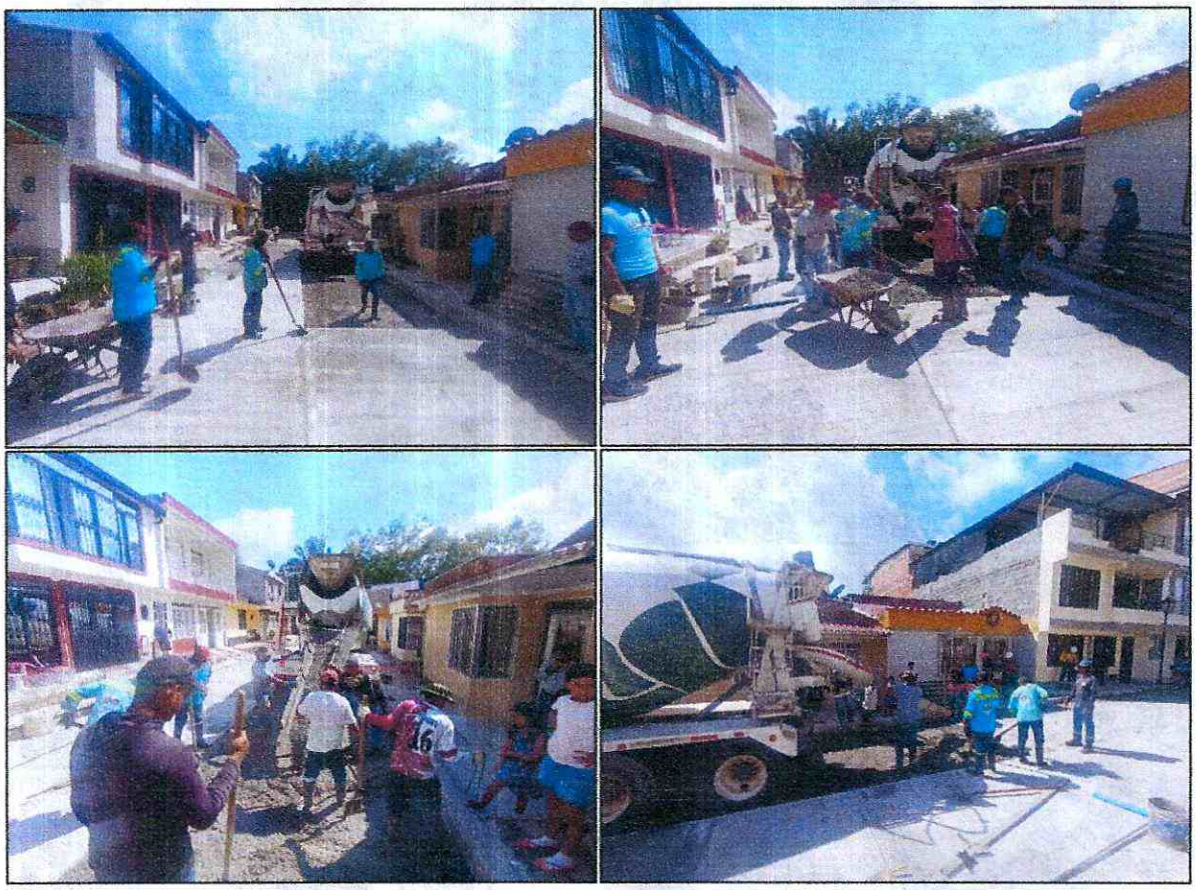

- Reparación de andenes con tabletas podo táctiles, Cll. 10 x Cra. 4






- Preparación de vía para instalación de concreto, Brisas del Pedregal






- Rehabilitación de anden, Cll. 12 entre Cra 1 y 2



3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

En cumplimiento de la ejecución del contrato, la Secretaría de Infraestructura pone a disposición del contratista, en la obra, los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto, tales como:

- Dos (2) retroexcavadoras.
- Cuatro (4) volquetas.
- Dos (2) vibrocompactador.

Por su parte, el contratista pone a disposición en la obra la siguiente herramienta:

- Herramienta menor.
- Un (1) benetin.

















3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		
PLAZO TOTAL		92
ACTA	**FECHA**	**DÍAS EJECUTADOS**
ACTA DE INICIO	1/10/2025	
SUSPENSION	29/12/2025	90
REINICIO	14/01/2026	90
PRORROGA No.1	17/01/2026	92
FECHA ACTUAL	31/01/2026	110
TOTAL		**110**


3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	**No. PÓLIZA**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	I-100048259	$90,000,000.00	17/01/2026-17/10/2026	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	I-100048259	$135,000,000.00	17/01/2026-17/03/2029	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100048259	$90,000,000.00	17/01/2026-17/10/2026	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	I-100012375	$350.181.000	18/09/2025-17/03/2026	SEGUROS MUNDIAL

3.5 PERSONAL EN OBRA


	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Cuadrilla 1	Luis Alberto Bobadilla	Oficial Rastríllero
	Andrés Fabian Garzón	Oficial Rastríllero
	Guillermo León Hernández	Auxiliar de Obra
	Luis Eduardo Salcedo	Auxiliar de Obra
	Junior Rafael Perdomo	Auxiliar de Obra
	Eduard Fabian Leal	Auxiliar de Obra
	Oscar Naranjo Ruiz	Auxiliar de Obra
	Cesar Augusto Pérez	Auxiliar de Obra
	Deivi Alejandro Martínez	Auxiliar de Obra
	Domingo Olmos	Auxiliar de Obra
	Robinson Camilo González	Auxiliar de Obra
	Juan Diego Rivera	Auxiliar de Obra
Cuadrilla 2	José Alfredo Giraldo	Oficial Rastríllero
	Alexander Vargas Peña	Oficial Rastríllero
	Alonso Guzmán Beltrán	Auxiliar de Obra
	Ramiro Varón Cabiedes	Auxiliar de Obra
	Andrea Jellinek Quintana	Auxiliar de Obra
	Luis Carlos Guio	Auxiliar de Obra
	Gabriel Quijano	Auxiliar de Obra
	Luis Fierro	Auxiliar de Obra
	Edwin Bernal	Auxiliar de Obra
Cuadrilla de Apoyo	Jesús Emilio Figueroa Garzón	Maestro
	Yerson Ferley Bocanegra	Auxiliar de Obra
	Jhobany Alba	Auxiliar de Obra

3.6 GRÁFICOS DE AVANCE

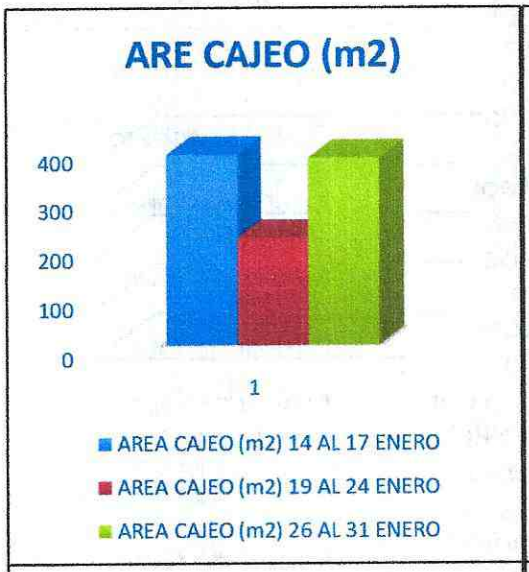





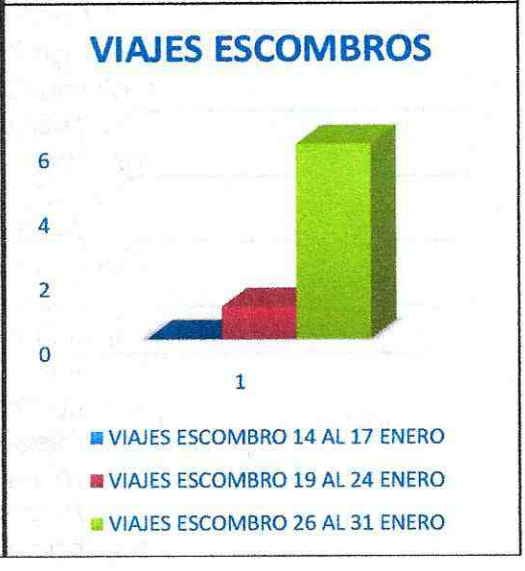

4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.

5. ANEXOS

I. Estado del tiempo.
II. Informe SST.
III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

ANEXOS

I. Estado del tiempo
II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST ENERO"
III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL ENERO"

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMÁTICO DIARIO ENERO							
Obra:	CUADRILLAS 2026						
Fecha	Estado Climático	Hora		Intensidad			Observaciones
		AM	PM	Baja	Media	Alta	
14/01/2026	LLUVIA	X				X	
15/01/2026	SOLEADO						
16/01/2026	SOLEADO						
17/01/2026	SOLEADO						
19/01/2026	SOLEADO						
20/01/2026	SOLEADO						
21/01/2026	LLUVIA	X				X	
22/01/2026	LLUVIA	X	X			X	
23/01/2026	LLUVIA	X	X			X	
24/01/2026	SOLEADO						
26/01/2026	LLUVIA	X				X	
27/01/2026	LLUVIA		X			X	
28/01/2026	LLUVIA		X			X	
29/01/2026	LLUVIA		X			X	
30/01/2026	LLUVIA	X				X	
31/01/2026	SOLEADO						

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	FECHA MENSUAL :	INFORME MENSUAL ENERO
		FRENTE 1 y 2

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

PROYECTO: A UNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE –

ELABORADO POR: Lina Marcela Camargo Conde

PERIODO: 1

FECHA ELABORACION: 31 DE ENERO

1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	No ACCIDENTES		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA		INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		JUNIO	ACUMULADO	OCTUBRE	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	
28	2.400	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. PERSONAL EN OBRA.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA
FRENTE 1		
Luis Alberto Bobadilla	Oficial Rastrillero	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Andres Fabian Garzon	Oficial Rastrillero	Sociedad Tolimense de ingenieros
Guillermo Leon Hernandez	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Luis Eduardo Salcedo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Junior Rafael Perdomo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Eduard Fabian Leal	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Oscar Naranjo Ruiz	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Cesar Augusto Perez	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Deivi Alejandro Martinez	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Domingo Olmos	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Robinson Camilo Gonzalez	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Jeison Betancur	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Juan Diego Rivera	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
FRENTE 2		
Jose Alfredo Giraldo	Oficial Rastrillero	Sociedad Tolimense de ingenieros
Alexander Vargas Peña	Oficial Rastrillero	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Alonso Guzman Beltran	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Ramiro Varon Cabiedes	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Andreal Jelneck Quintana	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Gabriel Quijano	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Luis Fierro	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Jairo Hernando Garcia Prada	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Alonso Murillo Ortegon	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Oscar Alejandro Echavarria	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Edwin Bernal	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros

CUADRILLA DE APOYO		
Jesús Emilio Figueroa Garzon	Oficial	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Yerson Ferley Bocanegra	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Jhobany Alba	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO		
Llano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Jose Policarpo Quintero	Conductor	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Aroca Laguna Laura Juliana	Inspectora de obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topógrafo	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Camargo Conde Lina	Profesional SST	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Sanchez Cardozo	Director de Obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*

INGRESO DE PERSONAL

EL dia 29 de Enero ingreso el trabajador ALONSO MURILLO ORTIGON & JAIRO HERNANDO GARCIA PRADA

RETIROS EN EL PERIODO

FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA
13/01/2026	Jose Alfredo Giraldo	Oficial	
15/01/2026	Juan Diego Rivera	Auxiliar de Obra	
30/01/2026	Edwin Bernal	Auxiliar de Obra	
30/01/2026	Yerson Bocanegra	Auxiliar de Obra	
30/01/2026	Luis Fierro	Auxiliar de Obra	
30/01/2026	Robinson Gonzales	Auxiliar de Obra	
30/01/2026	Alonso Guzman	Auxiliar de Obra	

AUSENTISMOS

NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DIAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	

LLAMADOS DE ATENCION

NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO

No se presentaron llamados de atención

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

ACTIVIDAD	TEMA	CONTRATISTA	Controles para Eliminar Reducir los Riesgos
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE VERIFICAN LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO(BARRAS, PICAS, PALAS, CEPILLOS, RASTRILLOS,NIVELETES, CARRETILLAS EN LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE LES HACE LA OBSERVACIÓN A LA CUADRILLAS CONFORMADAS QUE SON RESPONSABLES DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS CON LA QUE CUENTAN A DIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES DE IGUAL MANERA REPORTAR DAÑOS PARA SU RESPECTIVO CAMBIO O MANTENIMIENTO
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (MIROLINDO) (AV GUABINAL DIAGONAL A LA NORMAL SUPERIOR) (RINCON DEL PEDREGAL) (AVENIDA 38 CON FERROCARRIL)

ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES QUE PRESENTAN DETERIORO COMO LO SON: GUANTES CON PALMA DE NITRILO, GUANTES DE VAQUETA, MASCARILLAS.
HIDRATACCION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PERSONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DÍAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 1 VEZ AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS A GOLPES DE CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS.

8. ENTREGA DE DOTACION

TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION		COBERTURA %
	NUEVOS	ANTIGUOS	
2	2	22	80%

CONTROL PROGRAMACIÓN DEL PERIODO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DD/MM/AA
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN COMFORMACION DE LAS CUADRILLAS. SE INDICA PASOS A SEGUIR EN TEMAS SST.	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	14 AL 31 DE ENERO DE 2026
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENTES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	14 AL 31 DE ENERO DE 2026
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.	SE HACE SEÑALIZACION DEL AREA EN OBRA.	SI	14 AL 31 DE ENERO DE 2026
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOGE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	14 AL 31 DE ENERO DE 2026

10. ACTIVIDADES Y/O PROPUESTAS PARA EJECUTAR PROXIMO PERIODO

ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acuerdo a su frente de trabajo.)	REVISION
ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR TALES COMO: SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS AL INICIO Y FINAL DE LA JORNADA LABORAL	DIARIO
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN CADA FRENTE DE TRABAJO CON LOS LÍDERES DE CUADRILLA Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ASIGNADA DENTRO DEL PROCESO SST	DIARIO



FRENTE 2



ELABORADO POR:

Lina Marcela Camargo Conde
PROFESIONAL SST
Sociedad Tolimense de Ingenieros

	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO N° 2452 ALCALDIA DE IBAGUE CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452						
FECHA	**UBICACIÓN**	**N. CAJA**	**ANCHO**	**LARGO**	**AREA TOTAL**	**PROFUNDIDADES**	**VOLUMEN CAJEO**
14/01/2026	RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO	**1**	3,73	11,85	44,20	0,1	4,42
			5,5	21,4	117,70	0,1	11,77
			4,75	15	71,25	0,1	7,13
			2,5	6	15,00	0,1	1,50
		SUB TOTAL			**248,15**		**24,82**
15/01/2026	RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO	**2**	2,8	5,2	14,56	0,1	1,46
			1,5	3,6	5,40	0,11	0,59
		SUB TOTAL			**19,96**		**2,05**
16/01/2026	CLL 30 CRA 8	**3**	3,23	2,11	6,82	0,11	0,75
			7,15	6,6	47,19	0,11	5,19
			5,5	3,15	17,33	0,11	1,91
		SUB TOTAL			**71,33**		**7,85**
17/01/2026	CLL 30 CRA 8	**4**	2,60	4,40	11,44	0,08	0,92
			3,55	5,95	21,12	0,08	1,69
		SUB TOTAL			**32,56**		**2,61**
		5	2,5	5,65	14,13	0,08	1,13
		SUB TOTAL			**14,13**		**1,13**
SEMANA DEL 19 AL 24							
19/01/2026	AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42	**1**	2,18	3,55	7,74	0,1	0,77
		SUB TOTAL			**7,74**		**0,77**
		2	4,9	15	73,50	0,12	8,82
		SUB TOTAL			**73,50**		**8,82**
20/01/2026	AV FERROCARRIL ENTRE CLL 37 Y CLL 42	**3**	1,08	7,99	8,63	0,06	0,52
			1,45	3,2	4,64	0,06	0,28
			1,95	3,8	7,41	0,06	0,44
		SUB TOTAL			**20,68**		**1,24**
		4	1,9	1,85	3,52	0,05	0,18
			2,26	2,85	6,44	0,05	0,32
			2,43	4	9,72	0,05	0,49
			2,92	1,5	4,38	0,05	0,22
			2,62	3,18	8,33	0,05	0,42
			2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
		SUB TOTAL			**35,39**		**1,77**
22/01/2026	CLL 93 CON CRA 8 SUR	**5**	1,95	2,26	4,41	0,10	0,44
		SUB TOTAL			**4,41**		**0,44**
		6	2,6	5,2	13,52	0,09	1,22
			4,04	2,02	8,16	0,09	0,73
			2,54	1,97	5,00	0,09	0,45
		SUB TOTAL			**26,68**		**2,40**
		7	1,6	2,3	3,68	0,10	0,37
			2,4	3,3	7,92	0,09	0,71
			1,96	2,2	4,31	0,09	0,39
			2,73	6,05	16,52	0,09	1,49
			1,65	1,6	2,64	0,10	0,26
		SUB TOTAL			**35,07**		**3,22**
23/01/2026	CLL 93 CON CRA 8 SUR	**8**	1,12	4,12	4,61	0,09	0,42
		SUB TOTAL			**4,61**		**0,42**
		9	1,07	6,86	7,34	0,10	0,73
		SUB TOTAL			**7,34**		**0,73**
SEMANA 26 AL 31							
26/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	**1**	3,75	16,15	60,56	0,08	4,85
		SUB TOTAL			**60,56**		**4,85**
		2	2,15	10,83	23,28	0,1	2,33
		SUB TOTAL			**23,28**		**2,33**
27/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	**3**	4,8	3,4	16,32	0,12	1,96
			3,73	16,15	60,24	0,12	7,23
			4,8	3,4	16,32	0,12	1,96
		SUB TOTAL			**92,88**		**11,15**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
28/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	4	3,75	10,2	38,25	0,09	3,44
			3,2	4,95	15,84	0,09	1,43
		SUB TOTAL			**54,09**		**4,87**
		5	3,16	5,9	18,64	0,09	1,68
		SUB TOTAL			**18,64**		**1,68**
29/01/2026	cra 6 entre cll 20 y 21	6	1,50	1,56	2,34	0,14	0,33
			2,05	0,98	2,01	0,14	0,28
			3	1,85	5,55	0,14	0,78
			5,36	1,61	8,63	0,14	1,21
			3,75	4,15	15,56	0,14	2,18
		SUB TOTAL			**34,09**		**4,77**
		7	1,7	1,3	2,21	0,10	0,22
		SUB TOTAL			**2,21**		**0,22**
		8	1,25	1,46	1,83	0,10	0,18
		SUB TOTAL			**1,83**		**0,18**
		9	1,3	0,9	1,17	0,10	0,12
		SUB TOTAL			**1,17**		**0,12**
	cra 4 entre cll 80 y av pedro tafur	10	1,4	1,75	1,23	0,06	0,07
			3,3	1,6	5,28	0,06	0,32
			4,1	5	20,50	0,06	1,23
			4,35	6,07	26,40	0,06	1,58
			3,25	3,7	12,03	0,06	0,72
		SUB TOTAL			**65,43**		**3,93**
		11	3,65	6,1	22,27	0,07	1,56
			1,23	1,43	1,76	0,08	0,14
			0,86	1,5	1,29	0,08	0,10
		SUB TOTAL			**25,31**		**1,80**
TOTAL					**981,0538 m2**		

TOTAL SEMANA 4 DEL MES DE ENERO DEL 2026(M2)	379,505 m2
TOTAL SEMANA 3 DEL MES DE ENERO DEL 2026(M2)	215,4205 m2
TOTAL SEMANA 2 DEL MES DE ENERO DEL 2026(M2)	386,1283 m2
TOTAL MES DE DICIEMBRE	1771,8975 m2
TOTAL MES DE NOVIEMBRE (M2)	1133,3985 m2
TOTAL MES DE OCTUBRE (M2)	5411,6404 m2
Total Acumulado	**8.918,49**

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO

Presidente STI


	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		14	ENERO	2026
		31	ENERO	2026
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	
CONTRATO Nº:	2452
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	ENERO

1. RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO



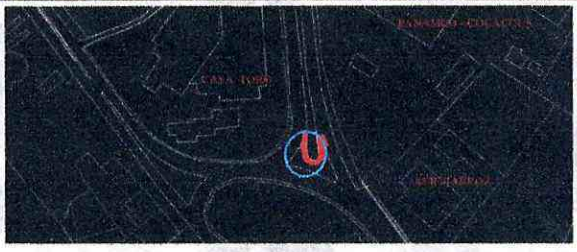

2. RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO





3. CLL 30 CRA 8






4. CLL 30 CRA 8





5. CLL 30 CRA 8



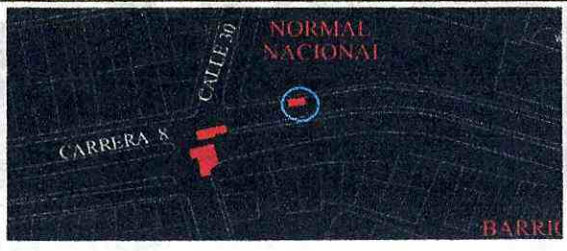

SEMANA DEL 19 AL 24

1. AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42





2. AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42





3. AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42






4. AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL 42





5. CLL 93 CON CRA 8 SUR



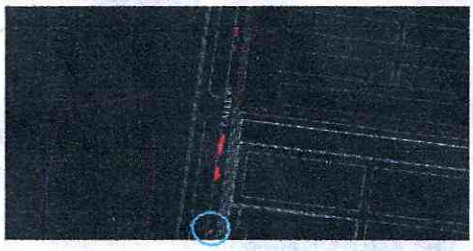


6. CLL 93 CON CRA 8 SUR






7. CLL 93 CON CRA 8 SUR



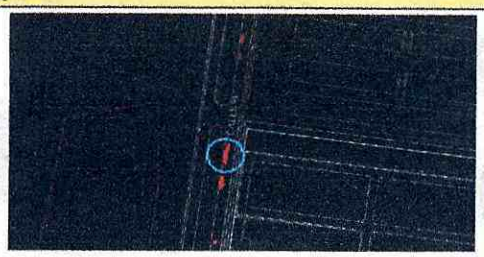


8. CLL 93 CON CRA 8 SUR



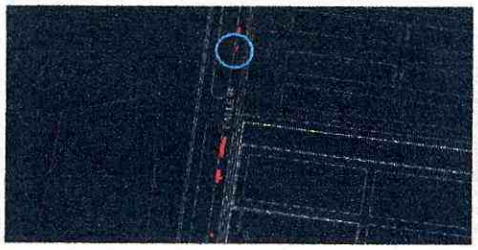

9. CLL 93 CON CRA 8 SUR




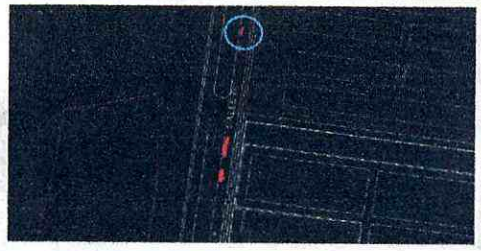

SEMANA DEL 26 AL 30

1. Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur



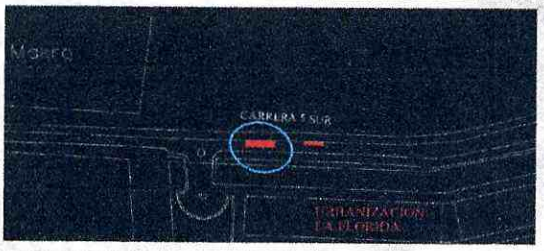

2. Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur





3. Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur





4. Virrey Solis IPS sobre la cra 5 sur






5. Virrey Solis IPS sobre la cra 5 sur






6. cra 6 entre cll 20 y 21






7. cra 6 entre cll 20 y 21



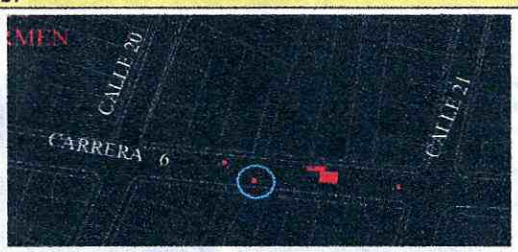


8. cra 6 entre cll 20 y 21





9. cra 6 entre cll 20 y 21



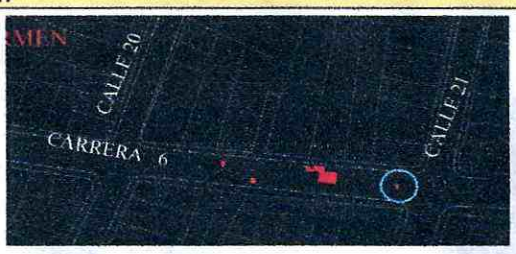

10. cra 4 entre cll 80 y av pedro tafur








11. cra 4 entre cll 80 y av pedro tafur



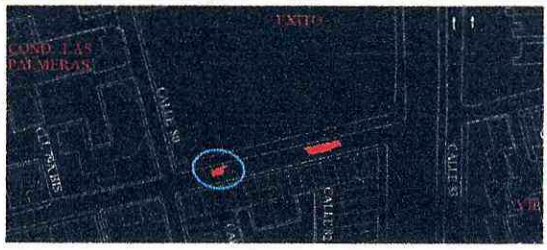

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE NIVELACION MENSUAL ENERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
21/01/2026	av ferrocarril entre cll 37 y cll42	1	3,85	10,55	40,62	0,03	1,22	1,52
			3,4	2,85	9,69	0,03	0,29	0,36
			2,8	1,90	5,32	0,03	0,16	0,20
		2	1,95	11,99	23,38	0,03	0,70	0,88
		3	1,8	8,00	14,40	0,03	0,43	0,54
		4	3,13	4,50	14,09	0,03	0,42	0,53
		5	1,2	7,40	8,88	0,03	0,27	0,33
			0,5	0,50	0,25	0,03	0,01	0,01
		6	3,2	5,80	18,56	0,03	0,56	0,70
			2,4	5,85	14,04	0,03	0,42	0,53
			2,7	4,20	11,34	0,03	0,34	0,43
28/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	1	3,3	20,00	66,00	0,04	2,64	3,30
30/01/2026	cra 6 entre cll 20 y 21	2	2,19	2,22	4,86	0,05	0,24	0,30
TOTAL							231,42	9,624975 m3

TOTAL RENIVELACION SEMANA 4 ENERO (M2)	70,8618 m2
TOTAL RENIVELACION SEMANA 3 ENERO (M2)	160,563 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE DICIEMBRE (M2)	445,7414 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE NOVIEMBRE (M2)	603 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE OCTUBRE (M2)	215,655 m2
Total Acumulado	**1264,40**

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		1	ENERO	2026
		30	ENERO	2026
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		


INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	2452
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	ENERO

REGISTRO FOTOGRAFICO


1. av ferrocarril entre cll 37 y cll42



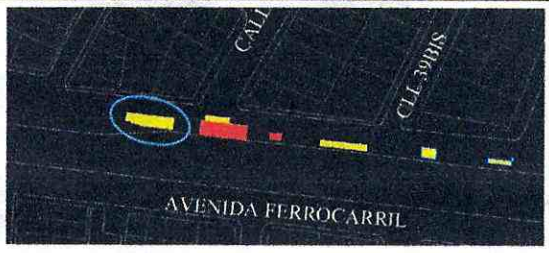

2. av ferrocarril entre cll 37 y cll42



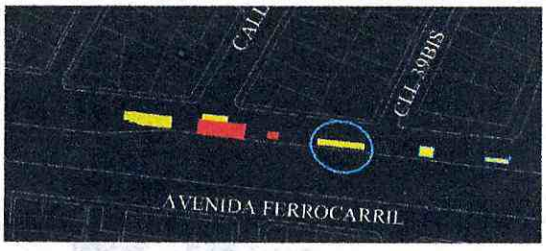


3. av ferrocarril entre cll 37 y cll42






4. av ferrocarril entre cll 37 y cll42



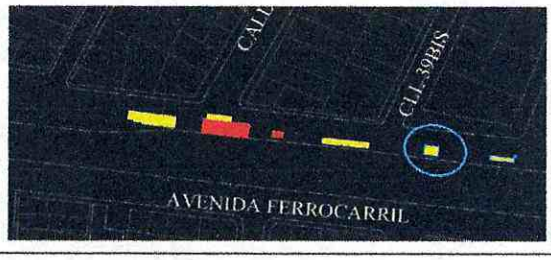


5. av ferrocarril entre cll 37 y cll42



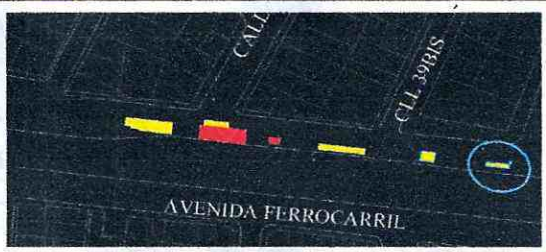

6. av ferrocarril entre cll 37 y cll42




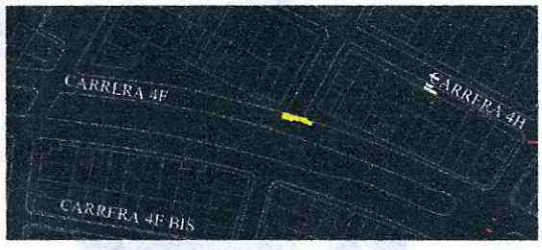

SEMANA DEL 26 AL 31


1. Virrey Solis IPS sobre la cra 5 sur





2. cra 6 entre cll 20 y 21





SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CANTIDAD ASFALTO MENSUAL ENERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	PLACA	EMULSION	CANTIDAD	TOTAL
14/01/2026	RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO	OTD 916		6,31	15,39
		OTE 038		9,08	
15/01/2026	RETORNO GLORIETA DE MIROLINDO	USE 124		7,94	22,4
		USC 112		7,64	
		OTD 916		6,82	
16/01/2026	CLL 30 CRA 8	USE 124		8,43	8,43
17/01/2026	CLL 30 CRA 8	USE 124	1	6,01	6,01
19/01/2026	AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL42	USC 112		8,29	8,29
21/01/2026	AV FERROCARRIL ENTRE CLL37 Y CLL42	USC 112		6,91	13,48
		OTD 916		6,57	
24/01/2026	CLL 93 CON CRA 8 SUR	USC 112	1	7,67	7,67
26/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	USC 112		7,43	7,43
27/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	OTD 916		6,39	14,42
		USC 112		8,03	
28/01/2026	Virrey Solís IPS sobre la cra 5 sur	OTD 916		6,78	13,85
		USC 112	1	7,07	
30/01/2026	cra 6 entre cll 20 y 21	USC 112	1	6,92	13,65
	cra 4 entre cll 80 y av pedro tafur	OTD 916	1	6,73	
TOTAL M3			**5**		**131,02**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

RECOLECCION ESCOMBRO MENSUAL ENERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	VEHICULO	CANTIDAD
19/01/2026	OTD 916	1
26/01/2026	OTD 916	3
27/01/2026	OTD 875	2
28/01/2026	OTD 875	1
TOTAL VIAJES		**7**
