PROYECTO CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS (META)

INFORME MENSUAL No.5

PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025

Contrato No. USPEC-CTO-293-2024

Entidad Contratante: Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC

Contratista: Consorcio Mar verde CV

Interventoría: Consorcio ACI Mar Verde

Ubicación del Proyecto: Colonia Agrícola de Acacias Meta, en lote de terreno aledaño al campamento para hombres “Colepato”.

Firmas:

Contratista: _____

ING. CAROLINA ALBA TOVAR
DIRECTORA DE OBRA

Interventor: _____

Entidad Contratante: _____

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 4
2. INTRODUCCIÓN 4
Fase de Pre construcción, ajuste, apropiación y diseño 4
Fase de Construcción 4
3. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 5
4. OBJETO DEL CONTRATO 6
5. LUGAR DE EJECUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
6. ALCANCE DEL CONTRATO 6
7. **AVANCES DEL CONTRATO** 7
7.1. AVANCES DEL DISEÑO 7
7.2. ACTIVIDADES DE EJECUCIÒN DE OBRA 11
7.3. OTRAS ACTIVIDADES 11
7.4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES ANTERIOR 11
7.5. INFORMACIÒN DE LAS REUNIONES DE OBRA 16
8. PROGRAMACIÓN 22
8.1. AVANCE DE LA EJECUCIÒN 22
8.2. AVANCE DE LA INVERSIÒN 24
8.3. HISTOGRAMA DE SEGUIMIENTO MENSUAL 25
8.4. GANTT DE SEGUIMIENTO 26
8.5. AVANCE DE LA FACTURACIÒN 27
8.6. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO 27
9. MEMORIAS DE MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 27
10. CANTIDADES FACTURADAS 27
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 27
12. GESTIÓN DE CALIDAD 27
13. BITÁCORA DE OBRA 27
14. RELACIÒN DEL PERSONAL 27
15. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28
16. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL 28
17. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 28
18. CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES 28
19. USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 28
20. CORRESPONDENCIA ENVIADA / RECIBIDA 29

20.1 ENVIADA..... 29
20.2 RECIBIDA..... 31

ANEXOS:

- Anexo 1 . Regsitro fotografico
- Anexo 2. Bitácora de obra
- Anexo 3. Informe HSE mes 5
- Anexo 4. Informe Ambiental mes 5
- Anexo 5. Informe social mes 5
- Anexo 6. Certificación pagos parafiscales

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este informe mensual de avance es proporcionar una actualización sobre el progreso de las Etapas de Pre-construcción y Construcción del proyecto CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE en la Colonia Agrícola de Acacias en el Departamento del Meta. El informe se centra en dos etapas principales del proyecto: la etapa de pre-construcción, ajuste y apropiación de los diseños, y la etapa de construcción de la infraestructura, incluyendo la edificación y los sistemas asociados. Con el informe se pretende ofrecer un panorama del estado actual del proyecto, identificar logros alcanzados, señalar cualquier desviación respecto al plan original y establecer las acciones correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

2. INTRODUCCIÓN

Este informe mensual detalla el avance de los procesos de pre-construcción y construcción del proyecto CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE en la Colonia Agrícola de Acacias (Meta), que incluye la actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos previamente suministrados por el USPEC. La segunda fase del contrato incluye la construcción de edificaciones y sistemas de acuerdo a los diseños aprobados por USPEC.

El proyecto se desarrolla en dos fases diferenciadas:

Fase de Pre construcción, ajuste, apropiación y diseño

En esta etapa se realiza la preparación necesaria para iniciar la construcción, incluyendo la actualización de estudios, ajustes en los diseños y la apropiación de recursos y estrategias para asegurar que todos los elementos estén en conformidad con la normativa vigente y los requisitos del contrato.

Fase de Construcción

Se enfoca en la edificación de las estructuras físicas y la implementación de los sistemas requeridos para el funcionamiento del CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE en la Colonia Agrícola de Acacias (Meta). Incluye la dotación de equipos y materiales, así como las actividades necesarias para asegurar la correcta puesta en marcha y eventual entrega del proyecto al operador.

Este informe cubrirá los aspectos claves de la ejecución de las 2 etapas, incluyendo los desafíos enfrentados y las medidas adoptadas para resolver cualquier inconveniente.

Además, se abordarán las actividades realizadas para asegurar la operatividad y funcionalidad completas del proyecto CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE, conforme a los requerimientos contractuales y técnicos establecidos.

3. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO



El proyecto consiste en la construcción de un Pabellón de Mujeres Privadas de la Libertad, un Pabellón de PPL gestantes y lactantes y sus edificios complementarios en la Colonia de Acacias (Meta) en un lote de terreno ubicado aledaño al predio en donde actualmente opera el Campamento para hombres Cola de Pato y la parte administrativa de la Colonia Agrícola.

4. OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE.

5. LUGAR DE EJECUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en la Colonia Penal y Agrícola de Acacias (Meta), en un lote con un área de 35.207 m2 aledaño al actual Campamento para hombres "Colepato" y la parte administrativa de la Colonia Agrícola.
Altitud: 498 m.s.n.m.
Ubicación: 3°59'20"N 73°45'53"O.
Temperatura: 24° C

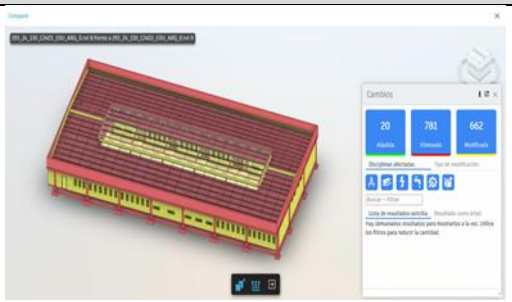
6. ALCANCE DEL CONTRATO


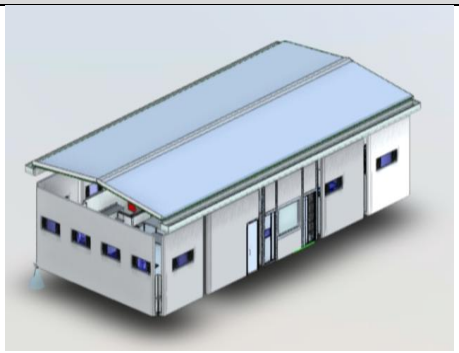
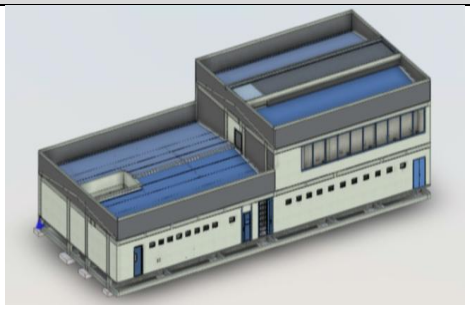
La Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios USPEC busca obtener como resultado del contrato la ejecución de las actividades necesarias desde los diseños de detalle, la preparación del terreno hasta la terminación del pabellón para el albergue de las privadas de la libertad y edificaciones para la labor resocializadora (trabajo, estudio y enseñanza), las cuales posteriormente se equiparán con condiciones para el funcionamiento integral del proyecto, de modo que el mismo pueda ser entregado al INPEC para su operación.


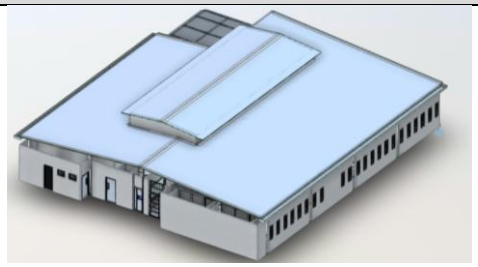

7. AVANCES DEL CONTRATO

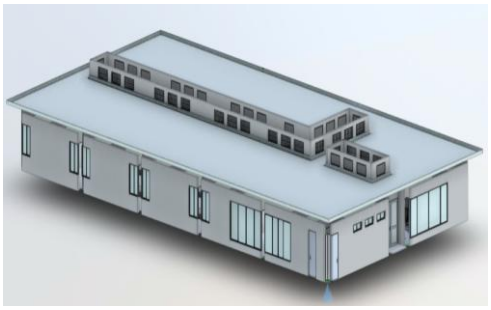
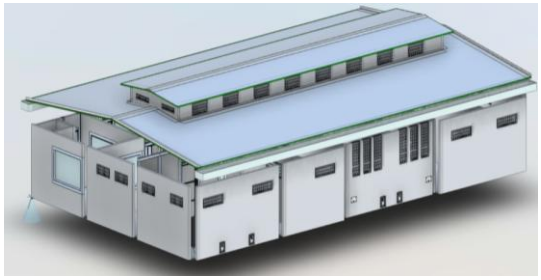
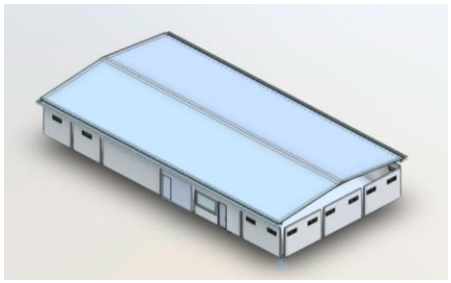
7.1. AVANCES DEL DISEÑO

En la presente tabla se presenta el % de avance de los diseños en las diferentes especialidades a la fecha de corte del presente informe 16/07/2025:

FECHA	Progreso a 16/07/2025	
	59,97%	
EXTERIOR		
Urbanismo	20%	
Rede Secas	0%	
Red Gas	0%	
Redes RCI	0%	
Redes HS	5%	
Topografía	100%	
% avance	20,83%	
PABELLÓN DE MUJERES		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	100%	
Mecánico	95%	
RCI	100%	
Iluminación	95%	
Seg y control	50%	
% avance	92,50%	
GUARDÍA EXTERNA		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	95%	
Mecánico	85%	
RCI	100%	
Iluminación	95%	
Seg y control	0%	
% avance	84,38%	
UAP - SANIDAD		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	

Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	95%	
Mecánico	90%	
RCI	95%	
Iluminación	95%	
Seg y control	0%	
% avance	84,38%	
RANCHO		
Arquitectura	95%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	90%	
Eléctrico	85%	
Mecánico	50%	
Gas	0%	
RCI	10%	
Iluminación	95%	
Seg y control	0%	
% avance	58,33%	
ASADERO		
Arquitectura	98%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	85%	
Eléctrico	60%	
Mecánico	50%	
Gas	0%	
RCI	10%	
Iluminación	50%	
Seg y control	0%	
% avance	50,33%	
VISITAS		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	75%	
Mecánico	90%	
RCI	100%	
Iluminación	95%	
Seg y control	0%	
% avance	82,50%	
GUARDÍA INTERNA		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	

Eléctrico	95%	
Mecánico	95%	
RCI	100%	
Iluminación	95%	
Seg y control	0%	
% avance	85,63%	
TALLERES		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	100%	
Mecánico	85%	
RCI	95%	
Iluminación	95%	
Seg y control	50%	
% avance	90,63%	
AULAS		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	5%	
Eléctrico	20%	
Mecánico	50%	
RCI	0%	
Iluminación	0%	
Seg y control	50%	
% avance	40,63%	
UDI - INFANCIA Y MATERNO		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	70%	
Mecánico	85%	
Gas	0%	
RCI	100%	
Iluminación	95%	
Seg y control	25%	
% avance	75,00%	
GARITAS		
Arquitectura	95%	
Estructura	90%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	70%	
Mecánico	50%	

RCI		
Iluminación	40%	
Seg y control	0%	
% avance	63,57%	
ALOJAMIENTO GUARDIANAS		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	100%	
Eléctrico	25%	
Mecánico	90%	
Gas	0%	
RCI	100%	
Iluminación	50%	
Seg y control	0%	
% avance	62,78%	
RESEÑA		
Arquitectura	100%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	10%	
Eléctrico	0%	
Mecánico	50%	
RCI	0%	
Iluminación	0%	
Seg y control	0%	
% avance	32,50%	
ACOPIO		
Arquitectura	85%	
Estructura	100%	
Hidrosanitario	0%	
Eléctrico	0%	
Mecánico	50%	
RCI	0%	
Iluminación	50%	
Seg y control	0%	
% avance	35,63%	
TANQUE DE RESERVA		
Arquitectura	0,00%	
Estructura	0,00%	
Hidrosanitario	0,00%	
Eléctrico	0,00%	
Mecánico	0,00%	
Gas	0,00%	
RCI	0,00%	

Iluminación	0,00%	
Seg y control	0,00%	
% avance	0,00%	

En el periodo del presente informe se presentaron avances en varias de las disciplinas que están contempladas en el proyecto. En este apartado del informe se presentan los avances más relevantes, los cuales a su vez pueden ser comprobados en el entorno común de datos de la USPEC con la fecha exacta del cargue de esta información, así como en los informes de transmisión que se generan en la plataforma. Dentro de la información cargada, se encuentra lo siguiente:

Componente Arquitectónico Todos los edificios asociados al proyecto cuentan con los planos de detalle asociados a sus puertas y así se puede comprobar desde los archivos en formato RVT que fueron centralizados en la plataforma de la USPEC, desde donde se está trabajando de manera colaborativa. Adicionalmente a lo anterior se están resolviendo las incidencias que se presentan.

Componente Hidrosanitario: Para este componente se realizó la actualización de los modelos centralizados en la plataforma del USPEC, detallando los mismos y agregando planimetrías para los edificios de: GUARDIA EXTERNA (GEX), UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARÍA (UAP), TALLERES (TLL), RANCHO - PABELLÓN DE PPL, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RAN-PAP), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLÓN MATERNAS (UDI-PAM). Se realizo el cargue de los planos y las memorias para los edificios de: TALLERES (TLL), GARITAS (GAR), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL - PABELLÓN MATERNAS (UDI-PAM).

Componente de Sistema Eléctrico: Para el componente eléctrico se tienen actualizaciones en los edificios de: GUARDIA EXTERNA (GEX), ASADERO-PANADERIA (ASA-PAN), UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP), GUARIA INTERNA (GIN), TALLERES (TLL), PABELLON DE MUJERES (PMU). Se realizo el cargue de los planos en formato PDF actualizados para el componente eléctrico de PABELLÓN MUJERES (PMU) y TALLERES (TLL)

Componente Mecánico: Se realizó la actualización de los siguientes modelos: ALOJAMIENTO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA (ACV), GUARDIA EXTERNA (GEX), VISITAS (VIS), UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA, GUARDIA INTERNA (GIN), TALLERES (TLL), PABELLÓN DE MUJERES (PMU). Se realizo el cargue de los documentos en PDF asociados al diseño para los siguientes edificios: ALOJAMIENTO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA (ACV), GUARDIA EXTERNA (GEX), VISITAS (VIS), UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI), TALLERES (TLL) Y PABELLÓN MUJERES (PMU).

7.2. ACTIVIDADES DE EJECUCIÒN DE OBRA

Las actividades desarrolladas en el periodo del informe del 17 junio al 16 de julio de 2025 se resumen a continuación:

- Construcción de campamento de obra
- Actividades de provisional de agua para la obra
- Cerramiento provisional de obra en teja de zinc y vara rolliza
- Excavación mecánica para vía interna de acceso
- Relleno y compactación en crudo de rio para vía interna de acceso

7.3. OTRAS ACTIVIDADES

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Fase 2 de Estudio de suelos

7.4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES ANTERIOR

En el periodo anterior al presente Informe que fue del 17 de junio al 16 de julio se desarrollaron las actividades de la etapa de Pre- construcción, Diseños de los edificios, llegando a los siguientes porcentajes de avance:

En el diseño:

FECHA	Progreso a 15/06/2025
	33,79%
EXTERIOR	
Urbanismo	20%
Rede Secas	0%
Redes RCI	0%
Redes HS	0%
Topografía	100%
% avance	24,00%
PABELLÓN	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	100%
Eléctrico	90%
Mecánico	60%
RCI	100%
Iluminación	0%
Seg y control	90%
% avance	80,00%
GUARDÍA EXTERNA	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	60%
Eléctrico	45%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	38,13%
SANIDAD	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	25%
Eléctrico	50%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%

Seg y control	0%
% avance	34,38%
RANCHO	
Arquitectura	95%
Estructura	90%
Hidrosanitario	10%
Eléctrico	30%
Mecánico	0%
Gas	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg. y control	0%
% avance	25,00%
ASADERO	
Arquitectura	98%
Estructura	90%
Hidrosanitario	0%
Eléctrico	30%
Mecánico	0%
Gas	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	24,22%
VISITAS	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	90%
Eléctrico	60%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	43,75%
GUARDÍA INTERNA	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	95%
Eléctrico	45%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%

% avance	42,50%
TALLERES	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	90%
Eléctrico	50%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	42,50%
AULAS	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	0%
Eléctrico	20%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	27,50%
INFANCIA Y MATERNO	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	95%
Eléctrico	70%
Mecánico	0%
Gas	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	40,56%
GARITAS	
Arquitectura	95%
Estructura	90%
Hidrosanitario	90%
Eléctrico	10%
Mecánico	0%
RCI	
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	40,71%

ALOJAMIENTO GUARDIANAS	
Arquitectura	100%
Estructura	90%
Hidrosanitario	60%
Eléctrico	25%
Mecánico	0%
Gas	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	30,56%
RESEÑA	
Arquitectura	100%
Estructura	100%
Hidrosanitario	0%
Eléctrico	0%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	25,00%
ACOPIO	
Arquitectura	85%
Estructura	90%
Hidrosanitario	0%
Eléctrico	0%
Mecánico	0%
RCI	0%
Iluminación	0%
Seg y control	0%
% avance	21,88%
TANQUE DE RESERVA	
Arquitectura	0,00%
Estructura	0,00%
Hidrosanitario	0,00%
Eléctrico	0,00%
Mecánico	0,00%
Gas	0,00%
RCI	0,00%
Iluminación	0,00%
Seguridad y control	0,00%
% avance	0,00%

7.5. INFORMACIÒN DE LAS REUNIONES DE OBRA

Reunión	Fecha	Temas tratados	Compromisos
Extraordinaria No. 35	02/07/2025	✓ Socialización del proyecto Mar Verde ante la Alcaldía de Acacias. ✓ Planeación de la Alcaldía Municipal de Acacías, señala que las empresas públicas no tenían inicialmente previsto atender este proyecto y se requiere una mesa de trabajo para su articulación preguntas y solicitudes de la Alcaldía y comunidad. ✓ Alcaldía manifiesta inquietud sobre el acceso vial al proyecto, el USPE aclara que para el proyecto se realizará el ingreso por la vía posterior pero el proyecto contempla el acceso por la portería de la Colonia Penal Agrícola. ✓ Alcaldía pregunta si el proyecto contempla paneles solares, USPEC indica que se encuentra en fase de diseños con el estudio de cargas y suplencias del sistema y que los edificios en su diseño estructural tienen contempladas las cargas de paneles en sus cubiertas, sin embargo, aclara que este tema es una normativa gubernamental. ✓ Representante de la comunidad, solicita que se priorice a la comunidad del barrio Nuevo Amanecer para oportunidades laborales y plantea la necesidad de mejorar la vía y apoyar procesos de legalización del alcantarillado. ✓ Alcaldía reitera la importancia de los permisos ambientales y solicita la verificación de vertimientos del proyecto. ✓ Alcaldía propone una mesa de trabajo con la dirección de la Colonia y los responsables del proyecto para	✓ Documentación anexa: presentación del proyecto, la cual hace parte integral de la presente acta. ✓ Convocar reunión entre la dirección de la Colonia, la ingeniera responsable del proyecto y la Alcaldía para alinear acciones y evitar retrasos. ✓ Evaluar la inclusión de mano de obra local, adquisición de bienes y servicios en el entorno, y priorización de mejoramiento vial en fases futuras del proyecto.

		revisar temas en conjunto y prevenir demoras y alteraciones al proyecto. Consorcio Mar Verde CV señala que algunas solicitudes de la comunidad no están incluidas dentro del alcance presupuestal del proyecto por lo que solicita revisar el tema en conjunto para evaluar las alternativas de mitigación. ✓ Alcaldía solicita que las vías no se deterioren con la obra y propone realizar una adecuación inicial con maquinaria y material al igual que al finalizar el proyecto. ✓ Representante de la comunidad solicita una visita técnica para evaluar la viabilidad de ampliar la vía de acceso al proyecto. ✓ Alcaldía expresa su respaldo al proyecto y sus expectativas frente al impacto positivo que puede tener en la región.	
Extraordinaria No. 36	14/07/2025	Mesa de trabajo para revisar el componente de seguridad y control: ✓ Se organizan las fechas de la entrega de la información. ✓ Insumos a entregar; REVIT con vistas, documento anexo con soportes para componente CCTV ✓ Fecha máxima de diseño 31/10/2025 ✓ En la programación V3 que soporta la prorroga al contrato se tendrán en cuenta las fechas programadas del componente Seguridad y control.	✓ Mar Verde CV entregara APUS y presupuesto el 24/10/2025 ✓ Mar Verde CV entregara memorias y anexos el 12/12/2025 ✓ Interventoría organizara con USPEC las mesas de trabajo estipuladas ✓ Se respetarán las fechas propuestas
De Comité No. 18	27/06/2025	✓ Presentación informe semanal No 18 ✓ Propuesta de implantación del proyecto ✓ Permisos ambientales ✓ Disponibilidades y servicios públicos ✓ Campamento de obra ✓ Inicio de actividades ✓ Plan de seguridad y salud en el trabajo ✓ Gestión ambiental y forestal ✓ Gestión social del proyecto ✓ Permisos y licencias ambientales	✓ Ejecución del Estudio de suelo ✓ Interventoría está a la espera de conceptos técnicos con respecto al tema de inundaciones del proyecto para definir la implantación del proyecto el día de hoy. ✓ Consorcio Mar Verde CV debe presentar los documentos para la

		✓ Estudio de suelo: Fase 2 contempla exploraciones en: Nuevos edificios de reseñas y acopio, 4 garitas, un tanque de agua. ✓ Avances de diseños: Se presentan los avances a la fecha en la plataforma y se informa que en la presente semana se estaba migrando la información desde la plataforma inicial al software BIM Collaborate PRO.Permisos y licencias ambientales ✓ Bioclimático: La Interventoría estima que se podrá garantizar el confort térmico que establece el contrato. ✓ Inundaciones: Se está a la espera del concepto técnico de los especialistas de Interventoría y la USPEC para definir el tema. De estar OK el concepto emitido por el Consorcio Mar Verde Consorcio Mar Verde CV, se debe dar solución técnica para el manejo de las aguas en el resultado del estudio de inundaciones. ✓ Forestal: Se adelanta la documentación para el trámite de la tala de árboles ante la Alcaldía y con el fin de obtener el poder de las directivas del establecimiento, se tiene programada una reunión el martes en la mañana. ✓ Medición de la resistividad del terreno: A la fecha, el Consorcio Mar Verde CV no ha presentado la metodología, alcance y demás documentos para la realización del presente estudio. ✓ Implantación del Proyecto: Interventoría esperan los conceptos técnicos de los especialistas para poder definir si el tema de inundaciones no afecta el proyecto y con esto se podrá emitir la aprobación el día de hoy.	prórroga del contrato. ✓ Se programa la disponibilidad eléctrica en obra para el 14 de julio. ✓ Se debe revisar en conjunto el tema de suministro de banda ancha para el proyecto y el pago del cerramiento provisional de obra. ✓ El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las especificaciones técnicas del contrato para ítems contractuales y NP ✓ Interventoría debe generar una reunión de diseño para revisar el proceso productivo de la sala de belleza para el martes 1 de julio de 10 a 12 am ✓ El Consorcio Mar Verde CV se compromete a enviar el informe de la semana 18 y 19 el sábado 28 de junio del 2025.

De Comité No. 19	03/07/2025	✓ Presentación informe semanal No 19 ✓ Propuesta de implantación del proyecto ✓ Permisos ambientales ✓ Disponibilidades y servicios públicos ✓ Campamento de obra ✓ Inicio de actividades ✓ Plan de seguridad y salud en el trabajo ✓ Gestión ambiental y forestal ✓ Gestión social del proyecto ✓ Permisos y licencias ambientales	✓ Consorcio Mar Verde CV de ejecutar la fase 2 del Estudio de suelo ✓ Consorcio ACI Mar Verde está a la espera de conceptos técnicos con respecto al tema de inundaciones del proyecto para definir la implantación del proyecto el día de hoy. ✓ Consorcio Mar Verde CV debe presentar los documentos para la prórroga del contrato. ✓ Se programa la disponibilidad eléctrica en obra para el 14 de julio. ✓ Se debe revisar en conjunto el tema de suministro de banda ancha para el proyecto y el pago del cerramiento provisional de obra. ✓ Consorcio Mar Verde CV debe presentar las especificaciones técnicas del contrato para ítems contractuales y NP ✓ La Interventoría debe generar una reunión de diseño para revisar el proceso productivo de la sala de belleza para el martes 1 de julio de 10 a 12 am ✓ Consorcio Mar Verde CV se compromete a enviar el informe de la semana 18 y 19 el sábado 28 de junio del 2025.
De Comité No. 20	11/07/2025	✓ Poderes requeridos para trámites ante las entidades ✓ Factibilidad eléctrica ✓ Vía de acceso ✓ Implantación, cuota de inundación ✓ Avance de diseños - Avance de obra ✓ Prórroga del contrato ✓ Apremio	✓ Consorcio ACI Mar Verde está a la espera de conceptos técnicos del estudio de inundación del proyecto para definir la cota de implantación de los edificios el día 15 de julio. ✓ El lunes 14 de julio el Consorcio Mar Verde CV debe presentar los documentos para la prórroga del contrato. ✓ El Consorcio Mar Verde CV debe presentar las especificaciones

			técnicas y detalles Arquitectónicos. ✓ Ingeniero Edgar solicita mesa de trabajo con los Arquitecto y especialistas. ✓ Se solicita entrega de cronograma de los edificios por parte de Consorcio Mar Verde CV para el seguimiento y control del proyecto. ✓ La interventoría se compromete a evaluar la norma para saber si la hoja de vida de la Ing. Patricia Alfonso como residente de obra cumple con el perfil requerido ✓ Se concreta reunión el lunes 14-07-2025 a las 08:00 a.m. con los Ing. Javier Rodríguez, Nelson Porras y especialista del Consorcio Mar Verde CV del componente de Seguridad y Comunicaciones. ✓ Se concreta reunión el martes 15-07-2025 con los especialistas para la revisión arquitectónica de planos y su normativa con el fin de cerrar las incidencias.
INPEC No. 12	02/07/2025	✓ Compensación del pasto ✓ Información contratista para el corte de pasto ✓ Trámite para la tala de árboles ante la Alcaldía ✓ Tener en cuenta las solicitudes de la comunidad	✓ La Dirección de la Colonia se compromete a compartir la información de contacto de los representantes de la Asociación de Volqueteros. ✓ Queda por confirmar la reunión con el alcalde por parte de la Dirección de la Colonia para la revisión del mantenimiento de la vía y una próxima con los especialistas para la conexión de servicios públicos.
INPEC No. 13	10/07/2025	✓ Gestión con empresa de servicios públicos (ESPA)	✓ La Dirección de la Colonia gestionará y confirmará la

		✓ Compensación ambiental ✓ Estado de la vía de acceso ✓ Ingreso del personal y materiales ✓ Ingreso al casino ✓ Construcción de capilla – Acompañamiento técnico	reunión con el Alcalde, el Consorcio y el representante de la USPEC, Ing. Juan José, programada para el jueves 17 de julio a las 10:00 a.m. ✓ El equipo del Consorcio ACI Mar Verde coordinará una visita y reunión con la empresa de servicios públicos ESPA para tratar temas de infraestructura y factibilidad de conexión. ✓ El Consorcio evaluará las propuestas recibidas y seleccionará la opción más viable para la contratación del servicio una vez sea recibida las cotizaciones.

CUDRO DE REVISIONES DEL DISEÑO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MAR VERDE - ACACIAS

CUADRO DE REVISIONES - ENTORNO BIM

No.	Subgrupos	EDIFICIO	Planteamiento de puntos por OBRA (Sin simulación)	Mesa de trabajo para definir puntos - (tres partes)	Diesño infraestructura con simulación por OBRA	Mesa de trabajo 2 para revisar infraestructura y simulación (Tres partes)	Revisión y Aprobación INPEC	Entrega de memorias y anexos por parte de OBRA	Revisión FINAL INTERVENTORIA	Revisón FINAL USPEC
1	Grupo 1	PABELLON MUJERES	21-jul-25	23-jul-25	15-ago-25	22-ago-25	25-ago-25	12-nov-25	22-nov-25	24-nov-25
2		AULAS								
3		TALLERES								
4		DIER Y PABELLON MATERNAS								
5	Grupo 2	VISITAS	15-ago-25	20-ago-25	12-sep-25	19-sep-25	24-sep-25			
6		RANCHO Y ALOJA RANCHERAS								
7		ASADERO Y REPOSTERIA								
8		SANIDAD								
9	Grupo 3	GUARDIA INTERNA	5-sep-25	9-sep-25	29-sep-25	6-oct-25	9-oct-25			
10		GUARDIA EXTERNA								
11		ALOJAMIENTO GUARDIANAS								
12	Grupo 4	GARITAS	12-sep-25	16-sep-25	10-oct-25	17-oct-25	22-oct-25			
13		RESEÑA								
14		ACOPIO								
15	Grupo 5	CERRAMIENTO	19-sep-25	23-sep-25	17-oct-25	24-oct-25	29-oct-25			
16		CAMINERIAS								
17		URBANISMO								

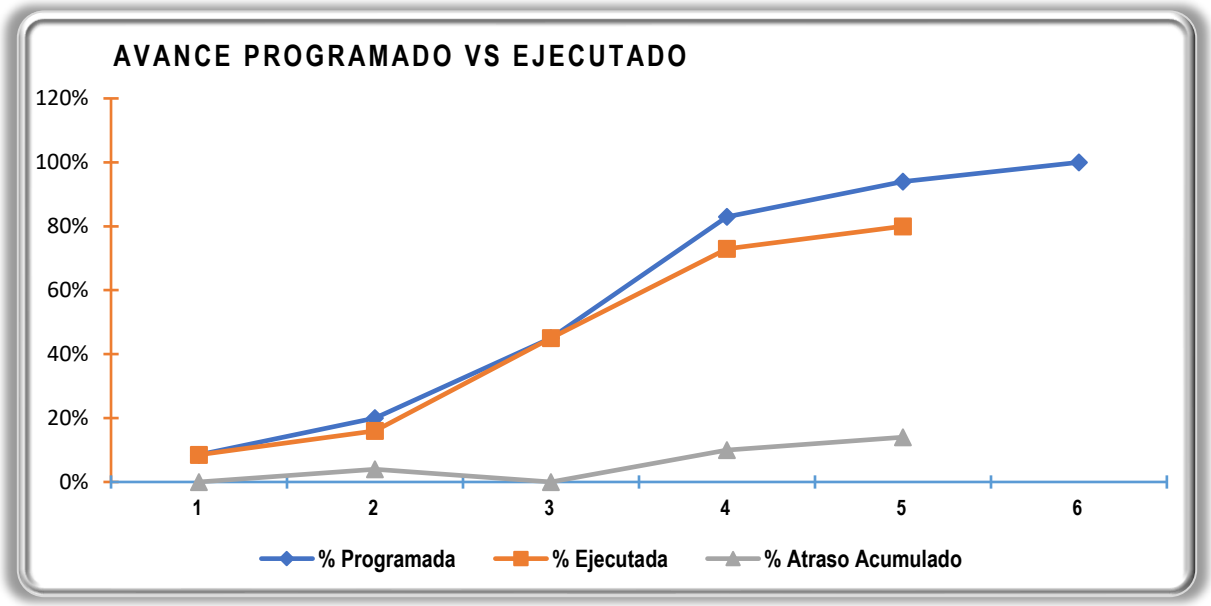
8. PROGRAMACIÓN

Periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2025
Programación aprobada V-2 el 24/04/2025

Inicio del contrato: 17/02/2025
Fecha de terminación actual: 31/12/2025
Plazo: 14 Meses, Máximo 31 diciembre 2025
Plazo faltante: 168 días
Valor inicial del contrato: junio$44.624.694.436

8.1. AVANCE DE LA EJECUCIÒN

AVANCE DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO			
CON CORTE A	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
16/03/2025	8,52%	8,52%	0,00%
16/04/2025	20%	16%	4,00%
16/05/2025	45%	45%	0,00%
16/06/2025	83%	73%	10,00%
16/07/2025	94%	80%	14,00%



Avance programado: 94%
Avance ejecutado: 80%
Diferencia:14%
Estado: Continua la ejecución de la obra fuera los tiempos programados
Estado: Diferencia mayor entre el programado y ejecutado (Atraso) 14%
El control y seguimiento se realiza con la versión No 02 de la programación aprobada por la interventoría el 24/04/.

Avance del diseño:

DISEÑO ARQUITECTONICO: Los diseños cumplen con los requisitos normativos, la diferencia entre lo programado (100%) VS lo ejecutado (99 %) es el 1% debido a los detalles arquitectónicos los cuales se trabajan simultáneamente en el CDE y se atienden las modificaciones puntuales de las revisiones realizadas por los especialistas de la USPEC Y LA INTERVENTORIA por este motivo no se puede dar avance para completar el 100%. Las fichas técnicas y especificaciones corresponden al desarrollo de presupuesto y no deben ser tenidas en cuenta para la aprobación de los diseños, si no a la entrega final del balance. Es una actividad en proceso continuo.

DISEÑO ESTRUCTURAL Todos los diseños de los edificios están en el CED y en revisión por parte de la Interventoría para la aprobación. Entre lo programado (100%) VS lo ejecutado (96 %) se presenta una diferencia del 4%.

DISEÑO HIDROSANITARIO: Los diseños cumplen con los requisitos normativos, la diferencia entre lo programado (96%) VS lo ejecutado (92 %) es el 4%. Durante el periodo del informe se trabajó en los edificios de Rancho, Alojamiento de rancheras, Talleres. UDI, UAP, Guardia interna y Alojamiento de guardianas.

DISEÑO ELECTRICO: Los diseños cumplen con los requisitos normativos, la diferencia entre lo programado (93%) VS lo ejecutado (89%) es del 4%. Este capítulo tiene la alerta de que se necesitan las cargas del Sistema de seguridad y control, dichas cargas son esenciales para poder dimensionar los transformadores de baja tensión de 480v a 220v para cada uno de los edificios, así como las UPS, acometidas en las mismas, tableros regulados. Es fundamental la información del componente de COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL para poder finalizar los diseños de este capítulo.

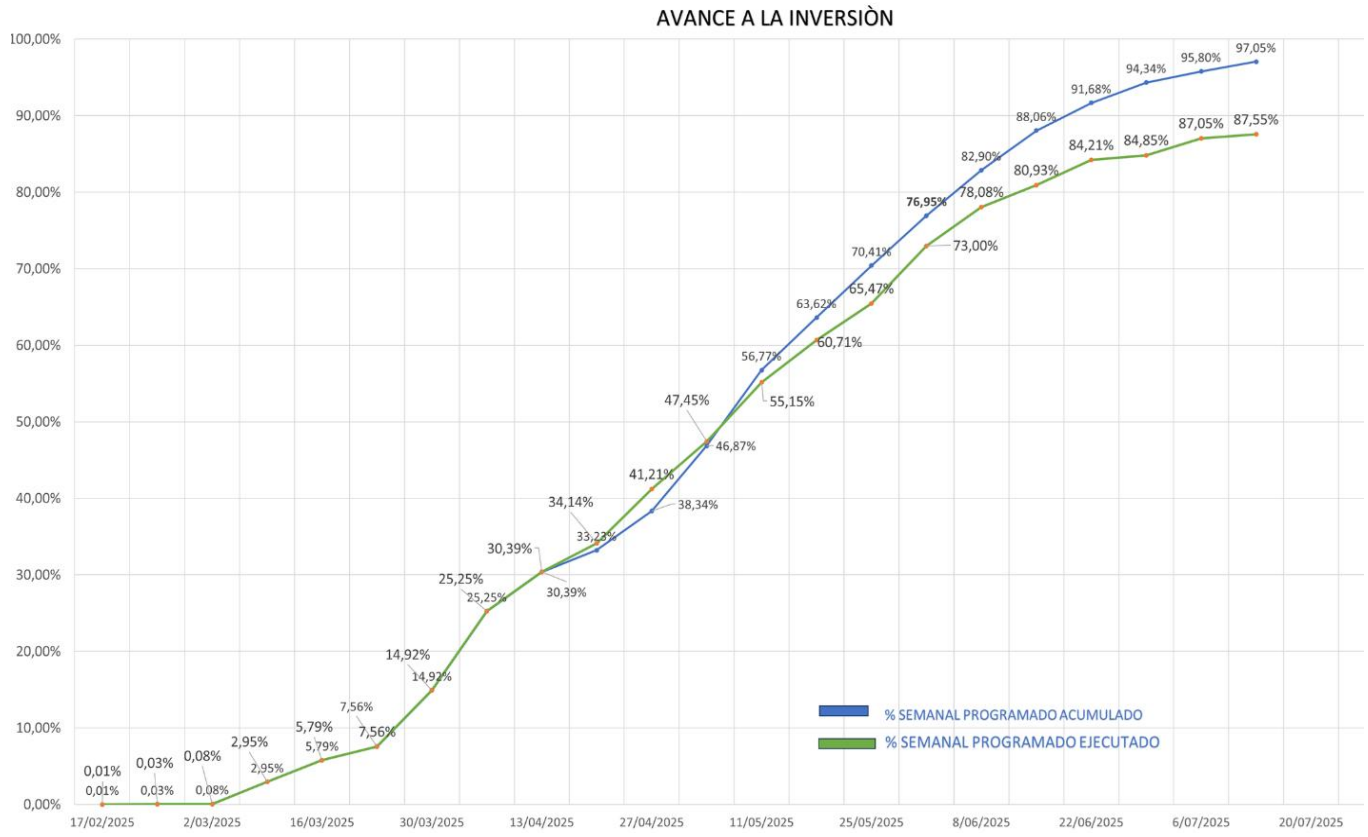
DISEÑO DE COMUNICACIONES SEGURIDAD Y CONTROL: La diferencia entre lo programado (96%) VS lo ejecutado (11%) es el 85% La principal alerta se origina en el hecho que no se cuenta con la información de las necesidades y alcance de la USPEC para este componente. La falta de esta información impacta el avance ejecutado. Este componente tiene como sucesores el balance del presupuesto, el cálculo de cantidades, los cuales son los insumos para la etapa de construcción. El capítulo de Seguridad y Control impacta de manera representativa la ejecución y el comportamiento económico evitando una recuperación en la programación total.

Hasta el momento no se tiene aprobación escrita de los diseños de ninguna especialidad.

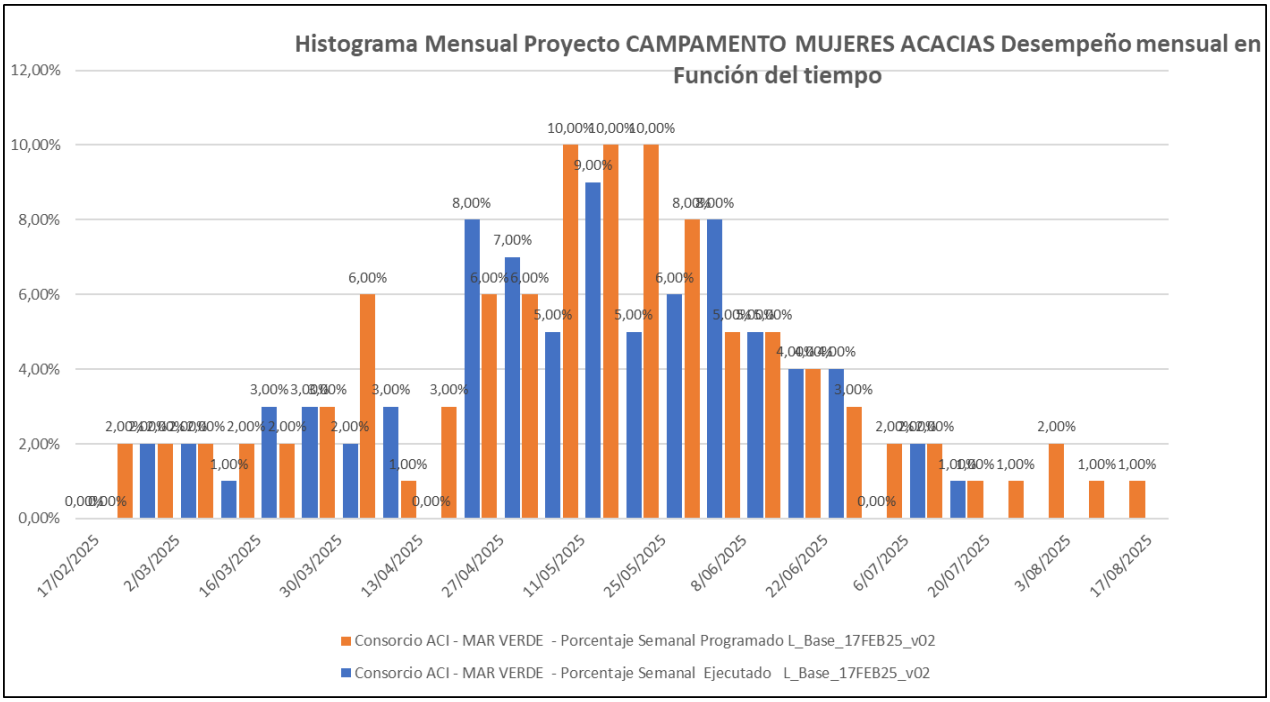
A la fecha de cierre del mes 5 de la etapa pre-cosntrucción y semana 8 de obra, la Colonia no ha realizado el corte del pasto de los procesos de productivos que existen en lote donde se va a construir el proyecto. La ejecución tardía y extemporánea de estas actividades está ocasionando afectaciones directas en la posibilidad de avanzar de manera normal, causando atraso en las actividades de inicio de obra que estaban inicialmente programadas para ejecución en trabajo continuo, sin embargo, por lo anteriormente expuesto no ha sido posible cumplirlas. El acceso en el lote del proyecto para la construcción solo se da a partir del 06/06/2025, fecha en la cual el USPEC y la Colonia llegan a un acuerdo monetario de la compensación de los Procesos productivos que se llevan a cabo en el lote. Hasta el 18/06/2025 en reunión realizada y solicitada por el CONSORCIO MAR VERDE CV con las Directivas de la Colonia se establece un corredor de 60 m x 5 m de corte de pastos por parte de la Colonia por el sector de la vereda del Carmen para acceso del personal y los materiales. Por lo que a partir de esta de esta fecha se inician las actividades de construcción del campamento provisional de obra y el cerramiento provisional en teja de zinc. Sin embargo, en aras de no atrasar la ejecución, se realizaron actividades de topografía, actas de entorno, excavación y colocación de postes en madera, láminas de zinc para el cerramiento en la zona del perímetro. Debido a los inconvenientes técnicos, sociales y de seguridad que presenta la vía de la vereda del Carmen se propone a la Colonia un Corredor de acceso provisional para la ejecución de la obra ingresando por la diagonal 15 de occidente a oriente por el interior de la Colonia. El Consorcio MAR VERDE CV presenta esta alternativa valorizada a la USPEC y la Interventoría.

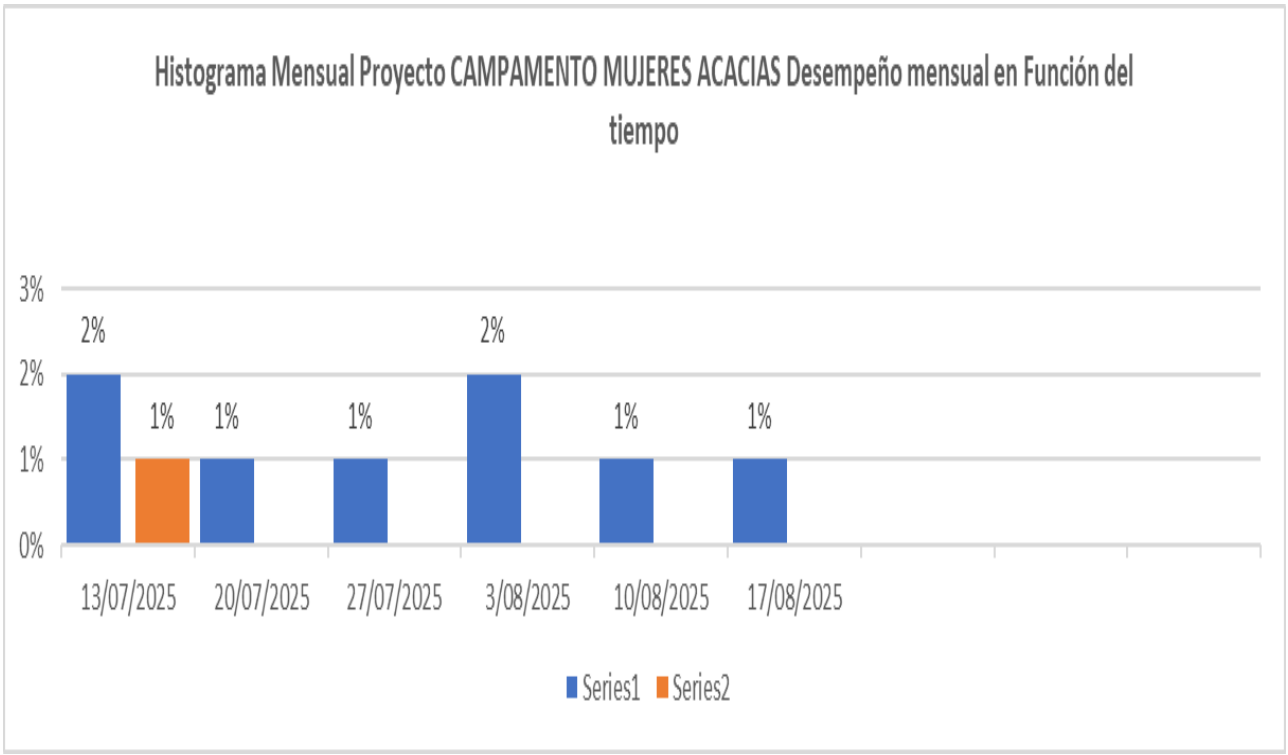
8.2. AVANCE DE LA INVERSIÒN

AVANCE DE LA INVERSIÒN DEL CONTRATO		
CON CORTE A	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
17/02/2025	$ 30.800,00	$ 30.800,00
16/03/2025	$ 34.747.333,34	$ 34.747.333,34
13/04/2025	$ 182.353.396,19	$ 182.353.396,19
18/05/2025	$ 381.727.681,01	$ 364.232.300,39
15/06/2025	$ 528.361.077,05	$ 485.585.532,66
13/07/2025	$ 582.321.420,32	$ 525.327.073,84



8.3. HISTOGRAMA DE SEGUIMIENTO MENSUAL





8.4. GANTT DE SEGUIMIENTO

EDT	Tareas críticas	Nombre de tarea	%Avan.Ejecu	%Avan.Progra	Costo-ejecutado	Costo progra
1	Sí	PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	80%	94%	$ 525.327.073,84	$ 582.321.420,32
1.2.2	Sí	DISEÑOS	79%	97%	$ 525.327.073,84	$ 582.321.420,32
1.2.2.1	No	DATOS DE ENTRADA	100%	100%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.2.2	No	TOPOGRAFIA	100%	100%	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
1.2.2.3	No	ESTUDIO DE SUELOS	99%	100%	$ 99.975.000,00	$ 100.000.000,00
1.2.2.4	No	DISEÑO ARQUITECTONICO	99%	100%	$ 93.978.417,43	$ 94.382.931,07
1.2.2.5	No	DISEÑO ESTRUCTURAL	96%	100%	$ 121.841.786,62	$ 123.448.275,51
1.2.2.6	No	DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO	92%	96%	$ 70.303.698,27	$ 71.641.896,54
1.2.2.7	Sí	DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	89%	93%	$ 94.358.573,15	$ 93.023.601,50
1.2.2.8	No	DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL	11%	96%	$ 14.869.598,38	$ 69.824.715,70
1.2.3	No	PROGRAMACION DE OBRA	84%	100%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.3.1	No	Programacion Preconstrucción Etapa 1	100%	100%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.3.2	No	Programación Construcción	75%	100%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4	No	BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	80%	24%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4.1	No	Calculo de cantidades Arquitectonicas	89%	40%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4.2	No	Calculo de cantidades Estructurales	90%	18%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4.3	No	Elaboración Balance	55%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4.4	No	Revisión	35%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.4.5	No	Aprobación	25%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5	No	AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	16%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.1	No	Calculo de cantidades Hidrosanitarias y RCI	45%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.2	No	Calculo de cantidades Eléctricas	20%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.3	No	Calculo de cantidades Red de Comunicaciones y Seguridad	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.4	No	Elaboración Balance	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.5	No	Revisión	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.6	No	Aprobación	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00
1.2.5.7	No	CONSTRUCCION	100%	100%	$ 0,00	$ 0,00

8.5. AVANCE DE LA FACTURACIÒN

No se ha procedido a la facturación debido a que los diseños se vienen ejecutando de acuerdo a las necesidades de la USPEC. A la fecha se continúan haciendo modificaciones y atendiendo observaciones para poder cerrar las diferentes especialidades del diseño y lograr la aprobación de los planos.

8.6. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO

Valor del anticipo: $ 22.312.347.218,00

SEGUIMIENTO ALA INVERSION DEL ANTICIPO						
CON CORTE A	SALDO ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIERO	PAGO A MINSITERIO DE HACIENDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO 4X1000	PAGOS DE EJECUCIÒN OBRA	SALDO ACTUALIZADO
30/03/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
30/04/2025	$ 21.196.729.857,00	$ 7.825.597,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.204.555.454,20
30/05/2025	$ 21.204.555.454,20	$ 9.186.105,34	$ 7.825.597,20	$ 31.302,38	$ 0,00	$ 21.205.884.659,96
30/06/2025	$ 21.205.884.659,96	$ 8.695.834,33	$ 8.986.105,34	$ 35.944,42	$ 0,00	$ 21.205.558.444,53

9. MEMORIAS DE MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

No se presenta avance en las memorias de cantidades ejecutadas

10. CANTIDADES FACTURADAS

A la fecha no se cuenta con cantidades de obra facturadas

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver Anexo No. 1

12. GESTIÓN DE CALIDAD

Se cuenta con el Plan de Calidad aprobado para implementar en la obra.

13. BITÁCORA DE OBRA

Ver anexo No. 2

14. RELACIÒN DEL PERSONAL

Ver anexo No. 3

15. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ver anexo No. 3

16. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

Ver Anexo No. 4

17. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Ver Anexo No. 5

18. CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES

Ver Anexo No. 6

19. USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Para la ejecución de las actividades de Localización y replanteo topográfico, construcción de cerramiento provisional en teja de zinc y construcción de campamento de obra durante el periodo del presenta informe se han utilizado los siguientes equipos:

Equipo	Cantidad
Retroexcavadora de llantas	1 unidad
Vibrocompactador de neumáticos y cilindro	1 unidad
Volquetas sencillas	3 unidad
Equipo de topografía	1 estación Total Topcon con: 1 bastón de 5 m 1 Mini Prisma de 1 m 1 trípode 1 nivel Topcon con: 1 trípode, 1 mira o regla de 5 m
Planta eléctrica 8.5 kva	1 unidad

20. CORRESPONDENCIA ENVIADA / RECIBIDA

Del periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2025:

20.1 ENVIADA

1. ENT-25-010485, asunto 162-DEFINICIONES Y CRITERIOS PARA DISEÑOS HIDROSANITARIOS – RCI DE PABELLÒN MUJERES de fecha 2025-06-17
2. ENT-25-010525, asunto 163-RESPUESTA COMUNICADO SAL-25-007553 ALCANCE COMPONENTE BIM de fecha 2025-06-17
3. ENT-25-010560, asunto 163-CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OBRA Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO de fecha 2025-06-17
4. ENT-25-010561, asunto 164- ANEXOS DE 375-164-2025 CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OBRA Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO de fecha 2025-06-17.
5. ENT-25-010593, asunto 165-RESPUESTA SOLICITUD ACCESO INDEPENDIENTE de fecha 2025-06-18
6. ENT-25-010685, asunto 166-RESPUESTA SAL-25-005771 INFORME MENSUAL No. 2 DEL 17 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025 de fecha 2025-06-18
7. ENT-25-010983, asunto 167- PROGRAMA DE OBRA de fecha 2025-06-21.
8. ENT-25-010992, asunto 168- INFORME MENSUAL No. 3 DEL 17 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2025 de fecha 2025-06-23.
9. ENT-25-010994, asunto 169-ANEXOS INFORME MENSUAL No. 3 DEL 17 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2025 de fecha 2025-06-23
10. ENT-25-010983, asunto PROGRAMA DE OBRA de fecha 2025-06-21.
11. ENT-25-011135, asunto 170-ENTREGA ACTA DE REUNIÒN EXTRAORDINARIA No. 29-2025.05.23 FIRMADA – DEFINICIONES FALTANTES EN EL ACTA de fecha 2025-06-25
12. ENT-25-011194, asunto 171-ASUNTO: ACTA DE ENTORNO – LEVANTAMIENTO DE ESTADO DE LAS VIAS de fecha 2025-06-26
13. ENT-25-011211, asunto 172-DOCUMENTO DE NO INUNDACIÓN de fecha 2025-06-26
14. ENT-25-011216, asunto 173- RESPUESTA SAL-25-008544 Observaciones Sistema de Gestión SST de fecha 2025-06-26
15. ENT-25-011217, asunto 174-RESPUESTA SAL-25-008598 DEFINICIONES Y CRITERIOS PARA DISEÑOS HIDROSANITARIOS – RCI DE PABELLÒN MUJERES de fecha 2025-06-26.
16. ENT-25-011250, asunto 175- RESPUESTA SAL-25-007388 MANUAL DE OPERACIÒN DEL PROYECTO y fecha 2025-06-27
17. ENT-25-011284, asunto 176- SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 de fecha 2025-06-27
18. ENT-25-011340, asunto 177- Formato IN-FO-041 Informes semanales de seguimiento No. 15 (del 26 mayo 2025 al 01 de junio de 2025) y No. 16 (del 02 al 08 de junio de 2025) y fecha 2025-07-01.
19. ENT-25-011357, asunto 178-Formato IN-FO-041 Informes semanales de seguimiento No. 18 (del 16 al 22 de junio de 2025) y No. 19 (del 23 al 29 de junio de 2025) y fecha 2025-07-01
20. ENT-25-011372, asunto 179-Formato IS-FE-TE-73 Informes semanales No. 18 (del 16 al 22 de junio de 2025) y No. 19 (del 23 al 29 de junio de 2025) y fecha 2025-07-01

21. ENT-25-011378, asunto 180-INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2025 y fecha 2025-07-01.
22. ENT-25-011379, asunto 181-INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2025 y fecha 2025-07-01
23. ENT-25-011500, asunto 182-DOCUMENTOS PARA LA FACTIBILIDAD ELECTRICA y fecha 2025-07-03
24. ENT-25-011543, asunto 183 - REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO DE VUELO DE DRON DE FECHA 27.06.2025 y fecha 2025-07-03
25. ENT-25-011671, asunto 184-ACTA DE RECORRIDO VIAS ACCESO A LA OBRA DE FECHA 04.05.2025 y fecha 2025-07-06.
26. ENT-25-011715, asunto 185-HV PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÒN de fecha 2025-07-07.
27. ENT-25-011840, asunto 187-RESPUESTA OFICIO SAL-25-009113 REQUERIMIENTOS A SOLICITUD DE PRORROGA de fecha 2025-07-08.
28. ENT-25-011858, asunto 188-CORREDOR DE ACCESO PROVISIONAL INGRESO POR DIAGONAL 15 de fecha 2025-07-08.
29. ENT-25-011872, asunto 189-INFORME SEMANA No. 20 DEL 30 JUNIO AL 06 DE JULIO 2025 de fecha 2025-07-09
30. ENT-25-011995, asunto 190-VALIDACIÒN DOCUMENTO DE NO INUNDACIÒN de fecha 2025-07-09.
31. ENT-25-011993, asunto 191-TRANSITO ASUMIDO PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO de fecha 2025-07-09
32. ENT-25-012076, asunto 192- RESPUESTA A SOLICITUD DE INTERVENTORIA SOBRE LA VIA DE ACCESO EN ESTUDIO de fecha 2025-07-10
33. ENT-25-012094, asunto 193-RESPUESTA SAL-25-009325 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO JUNIO 2025 de fecha 2025-07-10.
34. ENT-25-012100, asunto 195-Formato IN-FO-041 Informes semanales de seguimiento No. 20 (del 30 junio 2025 al 06 de julio de 2025) de fecha 2025-07-11.
35. ENT-25-012122, asunto 196-INFORME BIOCLIMATICO No. 5 V1 de fecha 2025-07-11.
36. ENT-25-012134, asunto 197-RESPUESTA A SAL-25-008550 RESPUESTA OBSERVACIONES ESTUDIO BIOCLIMATICO No. 4 de fecha 2025-07-11.
37. ENT-25-012136, asunto 198-RESPUESTA A SAL-25-008969 - CONSIDERACIONES PARA DISEÑO CLIMATIZACIÒN de fecha 2025-07-11.
38. ENT-25-012170, asunto 199- HV YULIAN ALEJANDRO ROJAS – CARGO TECNÒLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN HSEQ de fecha 2025-07-11
39. ENT-25-012171, asunto 200- RESPUESTA A SAL-25-009355 INFORMES SEMANALES FORMATOS IS-FE-TE-O73 E IN-FO-041 DEL 14 AL 19 de fecha 2025-07-11
40. ENT-25-012183, asunto 201-SOLICITUD DE PRORROGA #1 y fecha 2025-07-14.
41. ENT-25-012315, asunto 203-INFORME DE MEDICIÒN DE RESISTIVIDAD y fecha 2025-07-15.
42. ENT-25-012328, asunto 204- VIA PARA INGRESO DE EQUIPOS Y MATERIALES y fecha 2025-07-15.
43. ENT-25-012331, asunto 205-INFORME SEMANA No. 21 DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025 – FORMATOS IS-FE-TE-O73 e IN-FO-041 y fecha 2025-07-15

44. ENT-25-012332, asunto 206-HV VICTOR VELEZ ROJAS – TECNÒLOGO EN TOPOGRAFIA y fecha 2025-07-15.
45. ENT-25-012396, asunto 207-DOCUMENTOS PARA LA FACTIBILIDAD ELECTRICA y fecha 2025-07-16
46. ENT-25-012413, asunto 208-VIA DE ACCESO PARA EJECUTAR LA OBRA y fecha 2025-07-16
47. ENT-25-012414, asunto 209-SOLICITUD DE PRORROGA #1 y fecha 2025-07-16
48. ENT-25-012417, asunto 210-ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA #1 y fecha 2025-07-16.

20.2 RECIBIDA

1. SAL-25-008472 Asunto: 163-CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OBRA Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO de fecha 2025-06-17
2. SAL-25-008537 Asunto: 165-RESPUESTA SOLICITUD ACCESO INDEPENDIENTE de fecha 2025-06-18
3. SAL-25-008544 Asunto: 135-Respuesta SAL-25-007294 Observaciones Sistema de Gestión SST de fecha 2025-06-18
4. SAL-25-008545 Asunto: 132-Informe semanal No. 15 etapa temprana del 25 mayo 2025 al 01 de junio de 2025de fecha 2025-06-18
5. SAL-25-008546 Asunto: 147-Informe semanal No. 16 etapa temprana del 02 al 08 de junio de 2025 – Formato IS-FT-TE-73de fecha 2025-06-18
6. SAL-25-008551 Asunto: 160-Informe semanal No. 17 del 09 al 15 de junio de 2025 – Formato IS-FT-TE-73 de fecha 2025-06-18
7. SAL-25-008613 Asunto: Documentación requerida para actividad de cerramiento perimetral. De fecha 2025-06-19
8. SAL-25-008615 Asunto: 155-RESPUESTA A SAL-25-007799 - PROGRAMACIÓN CONSTRUCCION MAR VERDE VR1de fecha 2025-06-19
9. SAL-25-008598 Asunto: 162-DEFINICIONES Y CRITERIOS PARA DISEÑOS HIDROSANITARIOS – RCI DE PABELLÒN MUJERES de fecha 2025-06-19
10. SAL-25-008721 Asunto: PROGRAMA DE OBRA, de fecha 2025-06-24
11. SAL-25-008775 Asunto: 156-INFORME SEMANAL No. 13 DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025 de fecha 2025-06-24
12. SAL-25-008778 Asunto: 129-Informe semanal No. 14 etapa temprana del 19 al 25 de mayo de 2025 – Formato IS-FT-TE-73 de fecha 2025-06-24
13. SAL-25-008810 Asunto: 166-RESPUESTA SAL-25-005771 INFORME MENSUAL No. 2 DEL 17 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025 de fecha 2025-06-25
14. SAL-25-008826 Asunto: 168- INFORME MENSUAL No. 3 DEL 17 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2025 de fecha 2025-06-25
15. SAL-25-008921 Asunto: 171-ASUNTO: ACTA DE ENTORNO – LEVANTAMIENTO DE ESTADO DE LAS VIAS de fecha 2025-06-26
16. SAL-25-008933 Asunto: 170-ENTREGA ACTA DE REUNIÒN EXTRAORDINARIA No. 29-2025.05.23 FIRMADA – DEFINICIONES FALTANTES EN EL ACTA de fecha 2025-06-26
17. SAL-25-008969 Asunto: 152-RESPUESTA SAL-25-007800 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN de 2025-06-27

18. SAL-25-009006 Asunto: 173- RESPUESTA SAL-25-008544 Observaciones Sistema de Gestión SST de fecha 2025-06-27
19. SAL-25-009113, asunto 176- SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 y fecha 2025-07-02
20. SAL-25-009116, asunto 157-RESPUESTA A SAL-25-007869 DEMANDA RECURSOS NATURALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO y fecha 2025-07-02
21. SAL-25-009118, asunto 172-DOCUMENTO DE NO INUNDACIÓN - Solicita la certificación de No inundación de Consorcio Mar Verde CV y fecha 2025-07-02
22. SAL-25-009325, asunto: 186-PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO JUNIO 2025 de fecha 2025-07-07
23. SAL-25-009355, asunto 177- Formato IN-FO-041 Informes semanales de seguimiento No. 15 (del 26 mayo 2025 al 01 de junio de 2025) y No. 16 (del 02 al 08 de junio de 2025) de fecha 2025-07-07
24. SAL-25-009356, asunto Requerimiento de APREMIO No. 01 "Incumplimiento de obligaciones contractuales: entrega de informes, actas parciales y plan de contingencia" de fecha2025-07-07
25. SAL-25-009545, asunto190-VALIDACIÒN DOCUMENTO DE NO INUNDACIÒN de fecha del 2025-07-10
26. SAL-25-009550, asunto: 187-RESPUESTA OFICIO SAL-25-009113 REQUERIMIENTOS A SOLICITUD DE PRORROGA de fecha 2025-07-10
27. SAL-25-009569, asunto: 189-INFORME SEMANA No. 20 DEL 30 JUNIO AL 06 DE JULIO 2025 de fecha 2025-07-10
28. SAL-25-009718, asunto: 185-HV PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÒN y fecha 2025-07-14
29. SAL-25-009769, asunto: 182-DOCUMENTOS PARA LA FACTIBILIDAD ELECTRICA y fecha 2025-07-15
30. SAL-25-009773, asunto: 196-INFORME BIOCLIMATICO No. 5 V1 y fecha 2025-07-15
31. SAL-25-009868, asunto: 206-HV VICTOR VELEZ ROJAS – TECNÒLOGO EN TOPOGRAFIA y fecha 2025-07-16
32. SAL-25-009870, asunto: 191-TRANSITO ASUMIDO PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO y fecha 2025-07-16
33. SAL-25-009871, asunto: 199- HV YULIAN ALEJANDRO ROJAS – CARGO TECNÒLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN HSEQ y fecha 2025-07-16
34. SAL-25-009919, asunto: 208-VIA DE ACCESO PARA EJECUTAR LA OBRA y fecha 2025-07-16

ANEXOS:

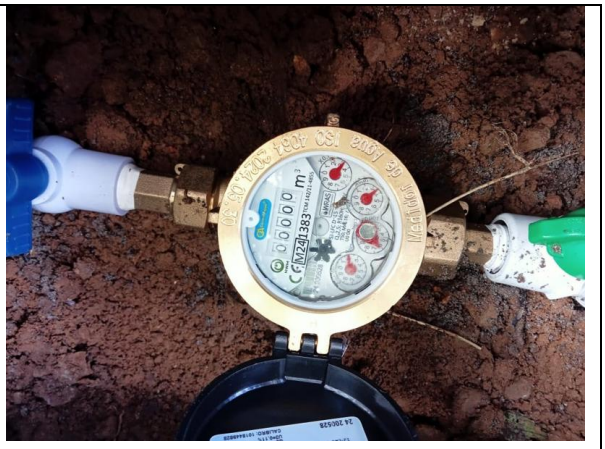
- Anexo 1 . Regsitro fotografico
- Anexo 2. Bitácora de obra
- Anexo 3. Informe HSE mes 5
- Anexo 4. Informe Ambiental mes 5
- Anexo 5. Informe social mes 5
- Anexo 6. Certificación pagos parafiscales

ANEXOS

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO
Periodo del 17 de junio al 16 de julio 2025


























16/07/2025 2:56:54 p. m.
4°0'21"N 73°46'56"W
95° E
Acacías
Meta
Número de índice: 138


4°0'20"N 73°46'55"W
26° NE
Acacías
Meta
Número de índice: 57

ANEXO 2. BITACORA DE OBRA

Bitacora de Obra.
Datos generales del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
La construcción, equipamento y dotación estructural, de seguridad y comunicaciones del campamento para mujeres "Mar Verde" en fases de confianza, mínima y mediana seguridad, adecuado para la operación por parte del INPEC, en la Colonia Agrícola de Acacías, departamento de Meta, por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, incluye las actividades para actualizar, ajustar y complementar los pre-estudios, prediseños, planos y especificaciones suministradas por la USPEC de acuerdo con la normatividad y tecnología vigente - Contrato de Obra No. USPEC-CTO-293-2024.

fecha apertura de este libro: 19 de junio/2025

firman:
Contratista:
Directora de Obra: Carolina Alba Tovar.
Residente de Obra: Patricia Alfonso S.

Interventoria:
Directora de Interventoria: Olga Patricia Penteria
Residente de Obra: Claudia Rodriguez

Powered by CamScanner

Residente HSEQ: Pedro Cabarca

Powered by CamScanner

19/06/2025

Se inician actividades para campamento de obra y cerramiento provisional de acuerdo a la autorización dada el dia de ayer por la interventoria y la colonia. Se usará para ingreso a la obra el área que la colonia despejó quitando los pastos del proyecto productivo. Dicha área se adecuará para el ingreso de materiales y maquinarias.
Consorcio MarVerde CV elaboró broche para ingreso en el carreteable frente al lote del proyecto, en este punto se dispuso el personal de vigilancia privada.
La interventoria enfatiza en el cumplimiento de la entrega de documentacion requerida para los permisos de ingreso de la maquinaria

Residente HSEQ

4:30 PM

20/06/2025

Se continua con la ejecucion del cerramiento provicional. Se inician las actividades de descapote y cajeo para el mejoramiento del ingreso al campamento, asi como el relleno de material crudo de rio traido en volquetas a los cuales ya se les dio autorización de ingreso.
La interventoria en el marco de sus funciones asignadas por la CSREC emitio un oficio con el fin de comunicar consideraciones tecnicas, ambientales y de normativa detallando los requisitos, documentos de soporte y acciones correctivas para garantizar la correcta ejecucion de las actividades. Dichos aspectos son:

- Materiales e insumos utilizados: Presentar licencia ambiental y titulo minero de los materiales petreos, salvo conducto de la movilizacion de la madera rolliza.
- Captacion de agua: Permiso de captacion de agua emitido por la autoridad competente.
- Condiciones sanitarias en obra: la unidad sanitaria instalada debe cumplir con:
  - Licencia de funcionamiento - permiso de vertimiento - frecuencia del servicio de aseo
  - Registro fotografico de las actividades de aseo
- Gestion de residuos y manejo ambiental: implementacion de punto ecologico, punto de acopio para bolsas de cemento.
- Capacitacion ambiental del personal administrativo y operativo.

Powered by CamScanner

- Prohibicion de almacenamiento de combustibles en zona de obra.
- Registros para los vehiculos en operacion: SOAT - tarjeta de propiedad - licencia de operador - Revision tecnomecanica.
- Proteccion del medio ambiente: - Establecer medidas de proteccion para las especies arboreas cercanas - Mantener en obra kit antiderrames - implementar medidas ambientales necesarias para la instalacion y operacion del campamento.

Residente Hseq
Consorcio Aci Proyectos

21/06/2025

Se continua con el encerramiento Provisional del Proyecto.
Se trabajo en la adecuación de la via de acceso con relleno y compactación del material.
Al contratista se le recordo la importancia de cumplir con la normatividad ambiental en manejo de residuos y señalización demarcación de Acopio de RCD.
Al contratista no se le permitio el ingreso de volquetas diferentes a la autorizada hasta la fecha. y se le recordo la importancia de cumplir con el ingreso de vehiculos y maquinarias solo los autorizados por esta interventoria.

Residente Hseq.
Consorcio Aci Proyectos

Powered by CamScanner

24/06/2025

Se continua con el cerramiento provicional del proyecto.
Se realizaron actividades de cargo y relleno de material para la adecuacion de la vía.
Segun por las nuevas directivas del INPEC. se prohibe el ingreso del personal por la colonia desde la entrada de la guardia principal dejando el ingreso por la via de acceso que se esta adecuando. Se realizó la acometida de acueducto

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

25/06/2025

Se realiza descapote del area designada para la construccion del campamento.
Se continua con el cerramiento provicional. Se ejecutan actividades de relleno con material de rio, conformacion y compactacion.

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

26/06/2025

Se realiza mantenimiento de la unidad sanitaria, se continua con la actividad del cerramiento y la construccion del campamento (conformacion, relleno y compactacion de la base). Se continua con el relleno para el mejoramiento de la via de acceso.

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

27/06/2025

Se realiza registro fotografico aereo por medio de dron previamente autorizado

Powered by CamScanner

por el INPEC, se continua con actividades de cerramiento provicional y con la construccion del campamento, se instala el acceso de agua potable para el campamento desde la acometida.
NOTA: La interventoria hace enfasis al Consorcio Mar Verde IV sobre la prohibicion del acceso a personal no autorizado al sitio de obra.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

28/06/2025

Se continua con la ejecucion del cerramiento provicional y con el mejoramiento de la base para el campamento de obra, se instala malla electrosoldada, se nivela el material de base y se prepara el terreno para la proxima semana realizar fundido de concreto.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

01/07/2025

Se continua con la adecuacion del campamento, se avanzar con la nivelacion manual del material para preparar el area donde se fundirá la base del campamento, se suspende la actividad del cerramiento para disponer del personal para avanzar con la construccion del campamento. Se ingresa a obra dos baños portatiles donde se dispone uno para mujeres.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Residente Interventoria

02/07/2025

Reunion en alcaldia presentando ante la administracion municipal el proyecto de la

construccion del campamento para mujeres "Mar Verde". En horas de la tarde se lleva a cabo una reunion con los directivos del INPEC, donde se socializan los temas de la obra que son relevantes para tenerlos informados. En aspectos constructivos se continua con la construccion del campamento pero, los fuertes lluvias afectan el avance de las actividades.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

03/07/2025

Inicia el dia con fuertes lluvias que impiden la ejecucion de las actividades. Se realiza el aseo de las instalaciones sanitarias portatiles. En horas de la tarde se hace un tramo de area en fundidos de concreto para la losa que soportara el campamento. Se realiza el comité semanal donde se revelan aspectos tecnicos, contractuales, de diseño y programacion de obra.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

04/07/2025

Se hace acompañamiento y recorrido con personal de la USPEC, la interventoria y el contratista en las vias de acceso al proyecto para encontrar una solucion a la problematica de logistica que se presentará a futuro para el ingreso de materiales y suministros a la obra, asi como el transporte de vehiculos de carga pesada. Por cuestiones de clima en la tarde se realiza el suministro de concreto para la continuacion de la construccion de la losa que soportará el campamento.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

05/07/2025

Se hace la supervision de la charla dictada por parte de la interventoria.
Se continua con la construccion de la losa de concreto para el campamento de obra.

Powered by CamScanner

descargando el concreto para dar finalizacion de esta. Se hacen labores de aseo para las unidades sanitarias portatiles.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

7/07/2025
Se continua con la construccion del campamento instalando la estructura metalica para el portico, se reinician las actividades del (campamento) cerramiento - se instalan las laminas de zinc y los tejas de madera, y se continua con la excavacion para la madera rolliza.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

8/07/2025
Se continua con las actividades del cerramiento, instalacion de laminas de zinc, tejas y madera rolliza. El personal del contratista sigue con la construccion del campamento de obra. Se realiza el mantenimiento de las unidades sanitarias portatiles.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

9/07/2025
Se continua con actividades del cerramiento. Se instala estructura metalica para la construccion de los muros del campamento.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

10/07/2025
Se continua con actividades de construccion del campamento y construccion del

cerramiento. Se cita a reunion con los directivos del INPEC para definir el trazado de la via de acceso a la obra

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

11/07/2025
Se realiza levantamiento topografico para socializar con los directivos del INPEC los posibles trazados de vía para el acceso a la obra. Se continua con actividades de construccion del campamento y del muro en lamina del cerramiento.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente interventoria.

12/07/2025
Se continua con la ejecucion de las actividades preliminares, construccion del campamento y del cerramiento de obra. Se realiza mantenimiento de las unidades portatiles sanitarias.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

14/07/2025
Se continua las actividades de construccion del campamento y del cerramiento.
En horas de la tarde se hace recorrido junto con personal del INPEC Y LA USPEC para analizar la accesibilidad del proyecto y definir el trazado para realizar un nuevo levantamiento topografico. Se hace reunion para determinar la informacion recopilada durante el recorrido en la oficina de direccion del INPEC.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

15/07/2025
En horas de la mañana se inicia las actividades para los estudios de suelos. Se continua con actividades del cerramiento y construccion del campamento.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

16/07/2025
Se continua con el estudio de suelos, la construccion del campamento y la elaboracion del cerramiento de obra. Se termina el levantamiento topografico para determinar el trazado de la via de acceso al proyecto. Se hace de manera formal la solicitud ante el INPEC para la via de acceso.

Residente HSEQ
Consorcio Aci Proyectos.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

17/07/2025
En horas de la mañana se asiste a una reunion en conjunto con el contratista consorcio Mar Verde, la interventoria Consorcio Aci Mar Verde, la supervisor USPEC y el cliente INPEC. Para tomar una desicion respecto a la vía de acceso al proyecto. Se continua con actividades en la construccion del campamento y el muro de cerramiento provicional, asi: como los ensayos INSITU del estudio de suelos. Tambien se realiza una reunion con la alcaldia y con el personal de las entidades mensionados anteriormente.
En reunión se acuerda el ingreso de personal y vehiculos livianos por la vía del barrio Nuevo amanecer y maquinaria y carga pesada por la vía interna de la Colonia.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

18/07/2025
Se continua con la ejecucion de las actividades preliminares, construccion del campamento y del cerramiento. Se realiza reunion con directivos del INPEC para aclarar temas de via de acceso y acometidas de servicios publicos.
Se continua con los ensayos del estudio de suelo

Claudia Rodriguez
Residente Interventora

19/07/2025
Continuan actividades de construccion del campamento y del cerramiento provicional llega al campamento el contenedor que sera oficina de la interventoria. Se continuan los estudios de suelo.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora

21/07/2025
Se sigue ejecutando las actividades de construccion del campamento y el levantamiento del cerramiento provisional. Se hace estudios de suelos in sito.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

22/07/2025
Se continua con las actividades preliminares de construccion del campamento y levantamiento del cerramiento provisional. Se termina los ensayos del estudio de suelos.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

23/07/2025.
Se da continuidad a la construccion del campamento y a la actividad del levantamiento del estudio del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

24/07/2025
Se solicita al contratista la habilitacion de un sendero peatonal por la vía de acceso al campamento. Se instala la señalizacion para rutas de emergencia y la vayo para PAR del consorcio Mar Verde CV. Se continua con la construccion del campamento y el levantamiento del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

25/07/2025
Se continua con la construccion del campamento y del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

32 26/07/2025

El dia de hoy se acerca a la colonia el especialista de suelos del contratista de obra a realizar un reconocimiento del ponton existente en la via de acceso a la colonia la cual fue definida como via de acceso de vehiculos de carga pesada para el desarollo del Proyecto.

El contratista de obra no permite el acompañamiento de la Interventoria a esta visita del especialista, desconociendo los alcances de esta revision.

Se presentan lluvias fuertes durante toda la jornada de 7:00 am a 11:00 am.

33 28/07/2025

Se inician actividades de excavacion para la acometida de energia electrica que alimentara el campamento de obra y sus instalaciones, asi como tambien será alimentado el contenedor de interventoria. Se continuan las actividades de construccion del campamento y se finaliza la construccion del cerramiento provisional.

Residente HSEQ

34 29/07/2025

Se continuan las labores de construccion del campamento, la excavacion para la acometida de energia electrica y se inicia la adecuacion para el paso peatonal para ingresar desde el portón de entrada hasta el campamento.

Se realiza la limpieza de los unidades sanitarios portatiles.

Residente HSEQ

35 30/07/2025

Se instalan las cajas de inspeccion de la red de acometida electrica y la tuberia de esta. Se ponen los perfiles metalicos del campamento de obra. Se cala y se hace asiento

Powered by CamScanner

cia de los portes tanto de interventoria como el contratista de obra o uno reunion con la secretaria de salud. Se inicia con el ensamble de la cubierta del campamento y la aplicacion de soldadura de las uniones y nodos de la estructura metalica del campamento. Residente HSEQ

36 31/07/2025
El dia de hoy se lleva a cabo una reunion para tratar los temas pendientes para dar inicio a las actividades contractuales de obra, hacer compromiso para la entrega de informes de obra y subsanar temas relacionados con la prorroga del contrato. Los soldadores continuan con las actividades de metalmecanica en el campamento, y el personal de obra instala la teja para la cubierta que corresponde al area de la cafeteria. Se termina con la excavacion para la acometida electrica.
Residente HSEQ

37 01/08/2025
Se hace reunion en las instalaciones provisionales que el INPEC suministro al contratista donde se socializó el tema del inicio de obra y se subsanó el tramado para la via de ingreso desde la zona que conecta con sanidad.
se continua con la construccion de la cubierta y de la acometida de energia electrica. Residente HSEQ.

38 02/08/2025
Se suspenden actividades por motivos de fuertes lluvias durante la mañana.
Residente HSEQ

39 04/08/2025
Se inicia el dia con las actividades de metalmecanica para la cubierta, se continua con la adecuación del paso peatonal y se instala el cableado para la acometida electrica.
Residente HSEQ

Powered by CamScanner

40 5/08/2025

Se da inicio al plan de ensayos propuesto por el Consorcio Marverde cv y observado por la interventoria para evaluacion del puente de acceso ubicado en el Corredor de entrada aprobado por la Adonia. Los ensayos que se realizaran Seran los dispuestos en el Comunicado SAL-25-0873 de la interventoria

41 6/08/2025

Se realiza ensayo de resistividad por parte del contratista, para evaluacion del puente se realiza extraccion de nucleos, escaneo ferromagnetico y analisis de la placa de rodamiento. En el campamento de obra se inician instalacion de ventanas y cableado electrico interno. Se ingresa al sitio de obra una retroexcavadora Arrugada.

El

42 7/08/2025

El contratista realiza actividades sin previa autorizacion por parte del INPEC a través de la interventoria, siendo el día de hoy un dia festivo. Siendo así las actividades realizadas: Terminacion de la cubierta del campamento, instalacion de cableado electrico y de vidrios en la ventaneria.

43 8/08/2025.

Se informa a la interventoria que el dia de hoy Se inicia con el suministro de Material crudo de Rio en la Volqueta ACD694.

Powered by CamScanner

Conductor Cristian Arevalo.

46 8/08/2025

Se realizan pruebas de conexión de electricidad del campamento de interventoría a 110V

Realizado.

Claudia Rodríguez

ANEXO 4. INFORME AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL No. 05

PERIODO DE REPORTE:

17 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO MAR VERDE CV
Nit. 901.900.732-3

INTERVENTORIA:

CONSORCIO ACI MAR VERDE
Nit. 901.902.216-3

ACACIAS – META
VERSION 01.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. OBJETIVO GENERAL....3
3. ALCANCE DEL PROYECTO....3
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO....4
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....4
6. GESTION DOCUMENTAL....5
7.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD....5
7.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos....5
7.3 Correspondencia....6
7.4 Reuniones y/o comités ambientales....7
8. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)....7
8.2 PM02 MAQUINARIA Y VEHICULOS....7
8.3 PM03 RECURSO HIDRICO....8
8.8 MATERIALES E INSUMOS....9
8.9 PM09 SUSTANCIAS QUIMICAS:....14
9. ESTADO DETRAMITES AMBIENTALES....14
10. CONCLUSIONES....15
11. ANEXOS....15
12. CONTROL DE MODIFICACIONES....19

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato, el 15 de junio de 2025 se dio inicio a la segunda etapa del proyecto, en la cual se comenzará a ejecutar las actividades constructivas contractuales del CONSORCIO MAR VERDE CV. Por lo anterior, el presente informe detalla las actividades ambientales realizadas durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 16 de julio de 2025, en la fase de CONSTRUCCIÓN.

TABLA DE PROFESIONAL AMBIENTAL APROBADO PARA EL PROYECTO

CARGO CONTRACTUAL	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIÓN
RESIDENTE AMBIENTAL	CRISTIAN DAVID ABELLO RAMIREZ	ING. AMBIENTAL

Tabla 1. Personal mínimo requerido-componente ambiental

2. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las medidas ambientales durante la fase de construcción del campamento para mujeres Mar Verde CV, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la mitigación efectiva de los impactos generados por las actividades constructivas, y promoviendo prácticas que aseguren la protección del entorno natural, en concordancia con los lineamientos del plan de manejo ambiental del proyecto.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del contrato contempla la construcción, equipamiento y dotación estructural, de seguridad y de comunicaciones del Campamento para Mujeres “Mar Verde”, en fases de confianza, mínima y mediana seguridad. Este complejo penitenciario estará ubicado en la Colonia Agrícola de Acacías (Meta), y estará destinado a su operación por parte del INPEC.

El contrato incluye además actividades de actualización, ajuste y complementación de los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas inicialmente suministrados por la USPEC, todo ello en concordancia con la normatividad vigente y bajo el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste. Durante la etapa de construcción se ejecutan las actividades propias de la obra, conforme a la planificación técnica, los trámites previamente gestionados y el alistamiento del área, garantizando el avance progresivo del proyecto y el cumplimiento de las exigencias legales.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	USPEC (UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS)
OBJETO DE CONTRATO	LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES “MAR VERDE” EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE- ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO MAR VERDE CV
NIT. CONTRATISTA	901.900.732-3
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO.	293-2024
VALOR CONTRATO DE OBRA	$44.624.694.436
PLAZO DEL CONTRATO	14 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

Tabla 2. Información del contrato

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la Colonia Agrícola de Acacias Meta, en lote de terreno, ubicado aledaño al predio en donde actualmente opera el campamento para hombres “Cola de pato” y la parte administrativa de la Colonia Agrícola.

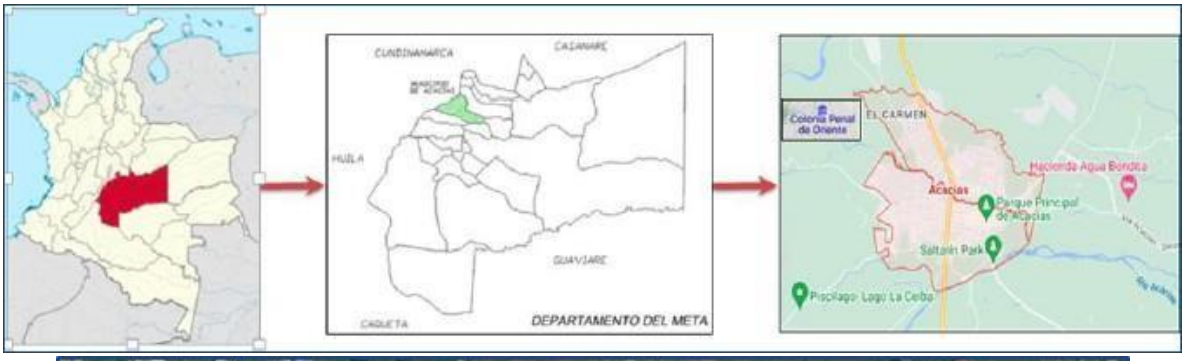




Ilustración 1. Ubicación Mar Verde - Acacías
Fuente: (Anexo Técnico)

6. GESTION DOCUMENTAL

7.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD.

Durante el presente mes, no se realizaron modificaciones ni ajustes al Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), manteniéndose las directrices y medidas establecidas inicialmente.

7.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Durante el presente mes, no se efectuaron modificaciones ni actualizaciones al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), manteniéndose su implementación conforme a los lineamientos previamente establecidos y aprobados.

7.3 Correspondencia

Durante el periodo de reporte, se emitió la siguiente correspondencia.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
375-194-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717561	11- Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias
375-211-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717999	17-Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias

Tabla 3. Control y seguimiento de correspondencia

7.4 Reuniones y/o comités ambientales

Como parte del seguimiento y control de las actividades ambientales correspondientes al mes de julio del presente año, se informa que **no se llevaron a cabo reuniones ni comités ambientales** durante este periodo.

8. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

A continuación, se presentan los respectivos registros de cumplimiento ambiental:

8.2 PM02 MAQUINARIA Y VEHICULOS

A continuación, se presentan los vehículos y maquinaria que se han usado en obra.

VEHICULO/MAQUINARIA	PLACA	GPS	MODELO/MARCA	VIGENCIA RTM	SOAT	TARJETA DE REGISTRO	TIPO DE TRANSPORTE
EXCAVADORA	HHIHN606KB00	N/A	HYUNDAI	N/A	N/A	MC031603	N/A
CAMIONETA	DAR981	16/09/2025	FORD	25/09/2025	13/09/2025	10019222971	PARTICULAR
CARGADOR	FK1140F50011	N/A	2000/KOMATSU	N/A	N/A	MC040350	N/A
VIBROCOMPACTADOR	SD-77DX TF	N/A	2007/INGERSOLL RAND	N/A	N/A	MC101243	N/A
VOLQUETA	UPQ663	N/A	HINO	21/06/2026	07/10/2025	10008487602	21/06/2026
VOLQUETA	WAA181	N/A	FORD	02/08/2025	05/03/2026	10028194529	02/08/2025
VOLQUETA	XJE076	N/A	FARGO	21/06/2026	19/06/2026	10028895413	21/06/2026

Tabla 4. Vehículos y Maquinaria

Indicadores de seguimiento:

INDICADOR	FORMULA	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COTROL DE FUGAS	# de mantenimientos preventivos programados / # de mantenimientos preventivos ejecutados	0/0 * 100 = 0%	Durante el periodo de reporte no se tuvo mantenimientos preventivos preventivos programados ni ejecutados
CONTROL DE EMISIONES POR FUENTES MOVILES	# de vehiculos con documentación vigente / # de vehiculos totales en la obra	6/6*100 = 100%	Se anexa la información de lo vehiculos durante el periodo de reporte * (1) vehiculo de transporte de personal * (3) Volquetas * (1) Cargador * (1) Vibrocompactador

Tabla 5. Indicadores de seguimiento Maquinaria y vehículos

8.3 PM03 RECURSO HIDRICO

El día 25 de junio del año 2025, se realizó la conexión del sistema de conducción de agua potable al punto de suministro autorizado por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías S.A. E.S.P. (ESPA). Esta conexión fue llevada a cabo en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la empresa prestadora del servicio.

La instalación se realizó en el sitio designado por la ESPA, a la tubería principal del sistema de acueducto municipal, garantizando así el abastecimiento continuo y de calidad del recurso hídrico para las actividades a desarrollar.

La intervención fue supervisada por personal técnico certificado, utilizando materiales homologados que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para conexiones domiciliarias y comerciales. Asimismo, se dejó registro fotográfico y planimétrico del punto de conexión, el cual ha sido remitido a la ESPA para su archivo y control.

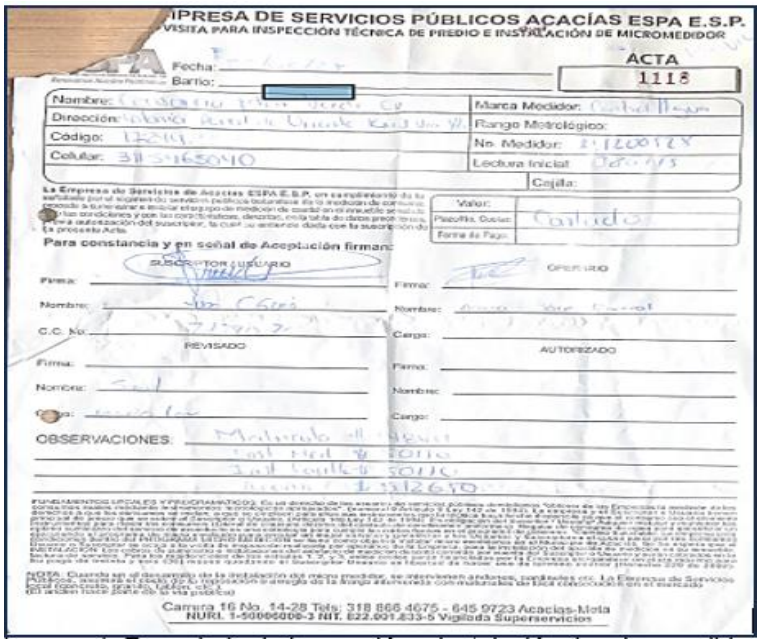

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACACÍAS ESPA E.S.P.
VISITA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR
ACTA 1118
Fecha:
Barrio:
Nombre:
Dirección:
Código:
Celular:
Marca Medidor:
Rango Metrológico:
No. Medidor:
Lectura Inicial:
Cajilla:
Valor:
Para constancia y en señal de Aceptación firman:
SUSCRIPTOR/USUARIO
OFICIAL
Firma:
Nombre:
C.C. No:
Cargo:
REVISADO
AUTORIZADO
OBSERVACIONES:
Carrera 16 No. 14-28 Tels: 318 866 4675 - 645 9723 Acacías-Meta
NURI. 1-50006008-3 NIT. 822.001.833-5 Vigilada Supersevicios

Imagen 1. Formulario de inspección e instalación de micromedidor

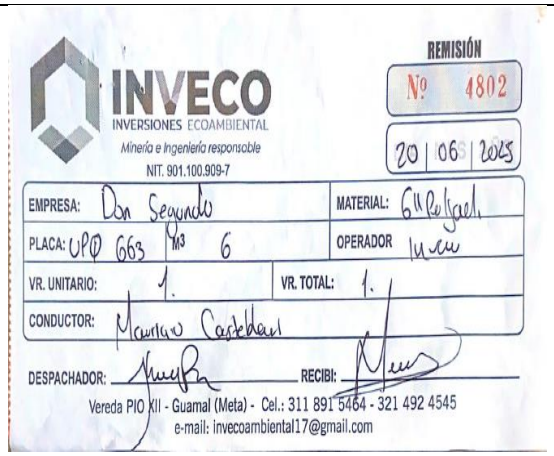
INDICADOR	FORMULA	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Limpieza de sedimentadores	# de limpiezas realizadas a los sedimentadores / # de limpiezas programadas a los sedimentadores	0/0*100 = 100%	Durante el periodo de reporte no se realizaron actividades donde se tengan que implementar sedimentadores
Disposición de residuos líquidos	# de unidades sanitarias portátiles instaladas durante el periodo / # de unidades sanitarias portátiles que cuentan con certificados de disposición de residuos líquidos	3/3*100 = 100%	Durante el periodo de reporte se cuenta con (2) dos unidades sanitarias portatiles para hombres y (1) una unidad sanitaria portatil para mujeres. El personal activo en obra es de 24 personas promedio.

Tabla 6. Indicador de recurso hídrico

8.8 MATERIALES E INSUMOS

En el presente periodo se realizo la compra de los siguientes materiales:

- Material pétreo: El material pétreo tiene procedencia de la trituradora Mina la Isla SAS, ubicado en la vereda pio XII del municipio de Guamal – meta, los documentos y licencias ambientales se adjuntan. Este material se utilizo para la conformación de la plataforma y vía de acceso al campamento temporal.


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4802
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6" Relgel
PLACA: UPO 663
M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4802	**Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4804
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don segundo
MATERIAL: 6" Relgel
PLACA: XJE 076
M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

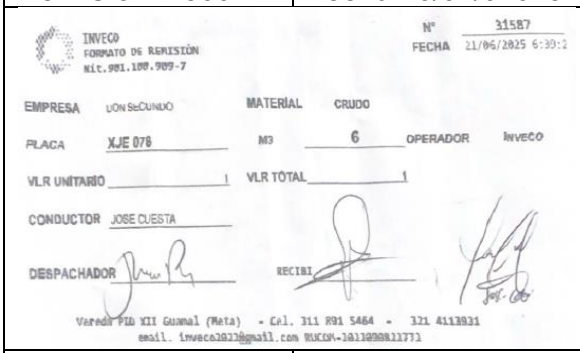
Remisión: 4804	**Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4806
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6ª Rejecta
PLACA: XJE 076
M3: 6
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cuesta
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

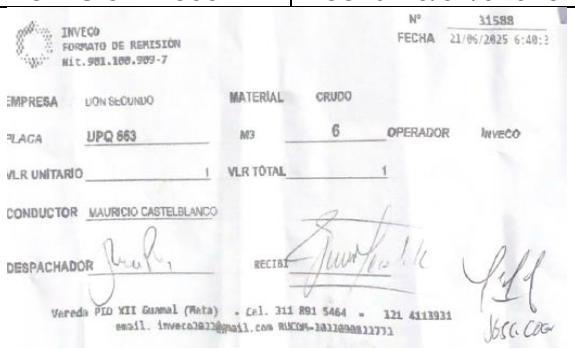
Remisión: 4806 | **Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4805
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6ª Rejecta
PLACA: UPQ 663
M3: 6
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Mauricio Castelblanco
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

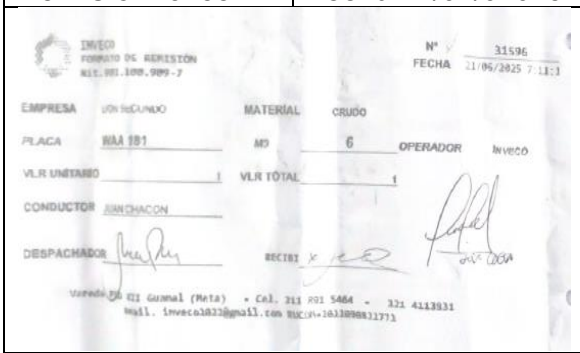
Remisión: 4805 | **Fecha**:20/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31587
FECHA 21/06/2025 6:39:2
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA XJE 078
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JOSE CUESTA
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

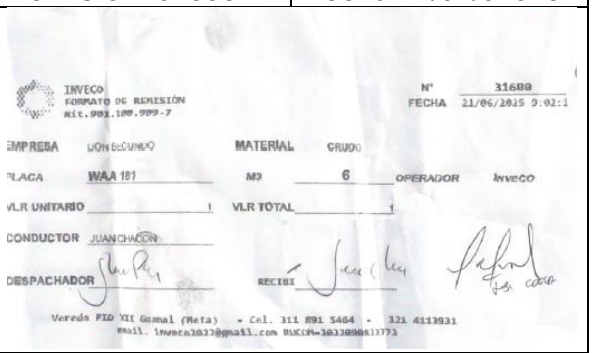
Remisión: 31587 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31588
FECHA 21/06/2025 6:40:3
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA UPQ 663
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR MAURICIO CASTELBLANCO
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

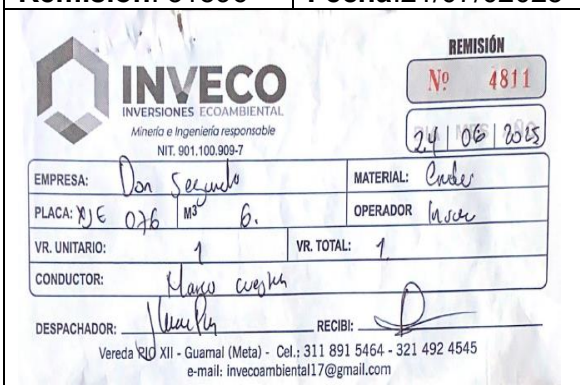
Remisión: 31588 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31596
FECHA 21/06/2025 7:11:1
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA WAA 181
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JUAN CHACON
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

Remisión: 31596 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31600
FECHA 21/06/2025 9:02:1
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA WAA 181
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JUAN CHACON
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

Remisión: 31600 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4811
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Crudo
PLACA: XJE 076
M3: 6.
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cuesta
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

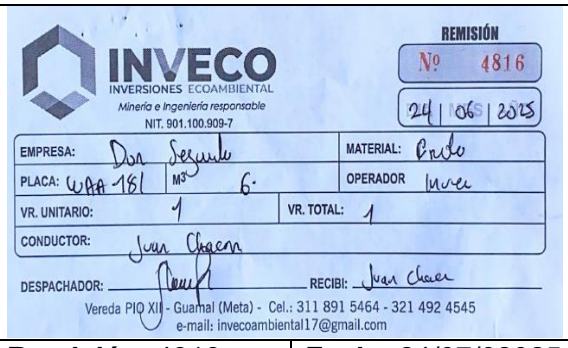
Remisión: 4811 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4812
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Crudo
PLACA: UPQ 663.
M3: 6.
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Mauricio Castelblanco
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4812 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4815
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

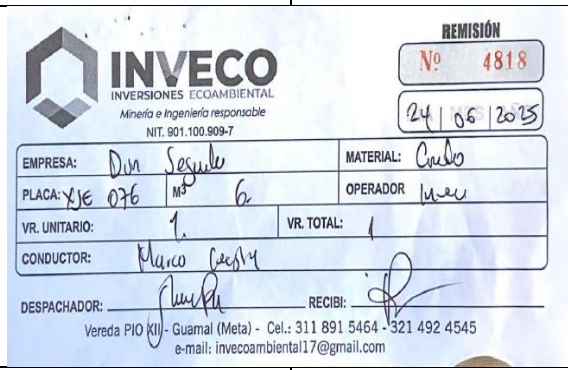
Remisión:4815 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4816
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4816 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4817
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO:
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4817 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4818
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4818 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4824
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

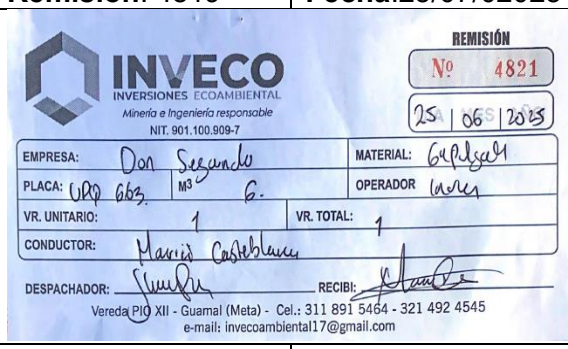
Remisión:4824 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4819
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

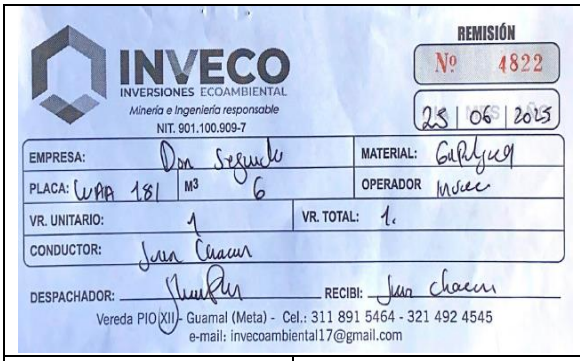
Remisión: 4819 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4820
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

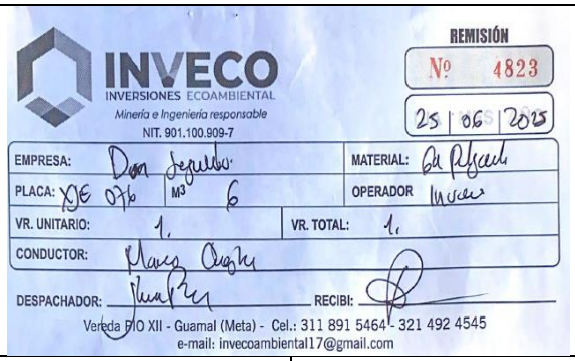
Remisión:4820 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4821
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

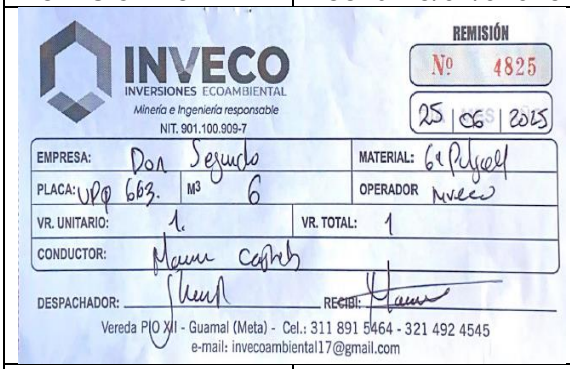
Remisión: 4821 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4822
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

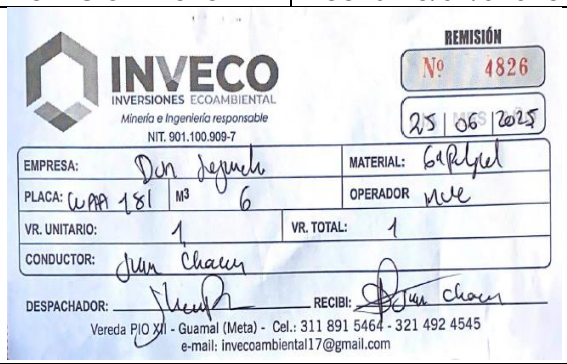
Remisión:4822	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4823
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

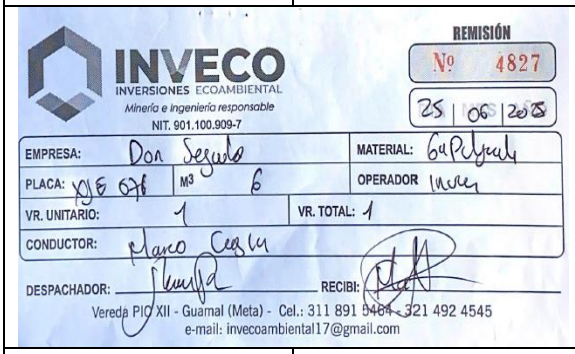
Remisión: 4823	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4825
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663. M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4825	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4826
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

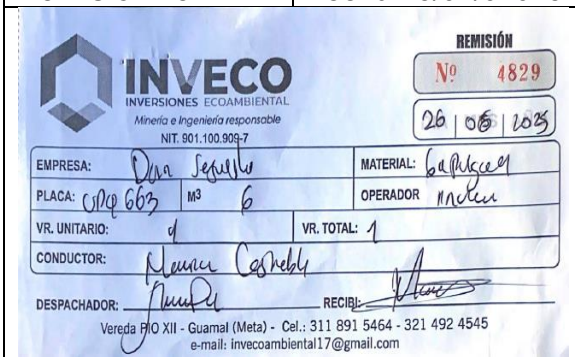
Remisión: 4826	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4827
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

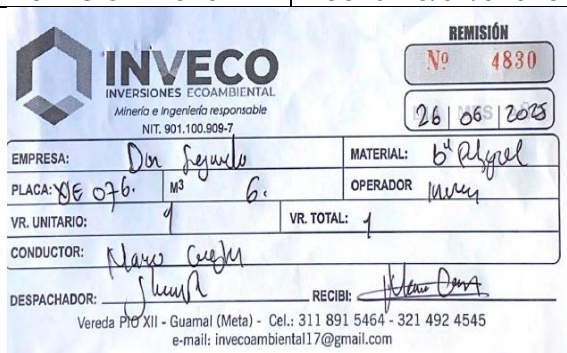
Remisión:4827	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4828
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663. M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

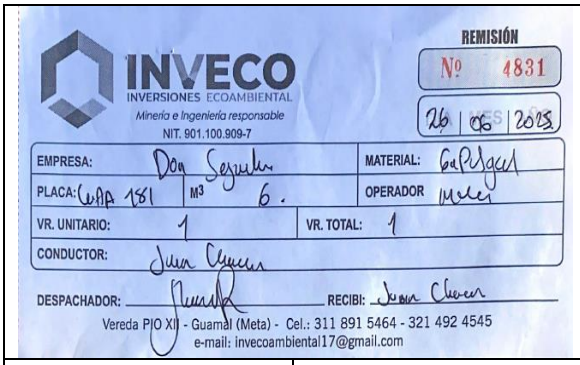
Remisión: 4828	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4829
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

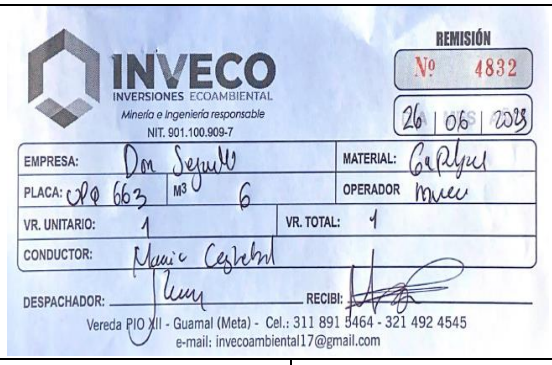
Remisión:4829	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4830
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076. M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

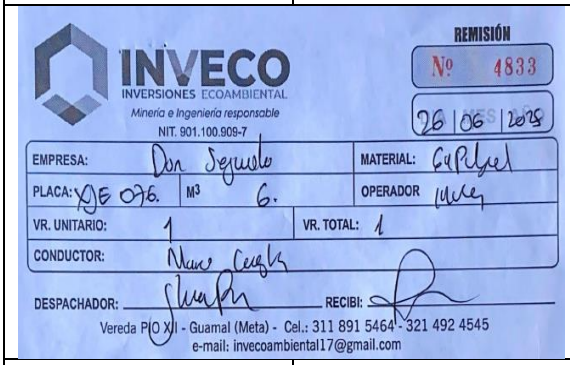
Remisión: 4830	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4831
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WAA 181 M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

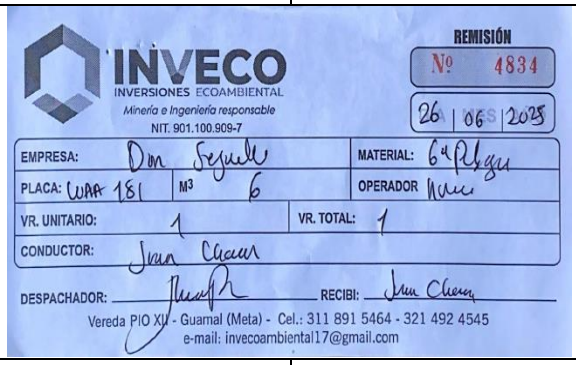
Remisión:4831	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4832
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WPQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4832	**Fecha**:26/07/02025

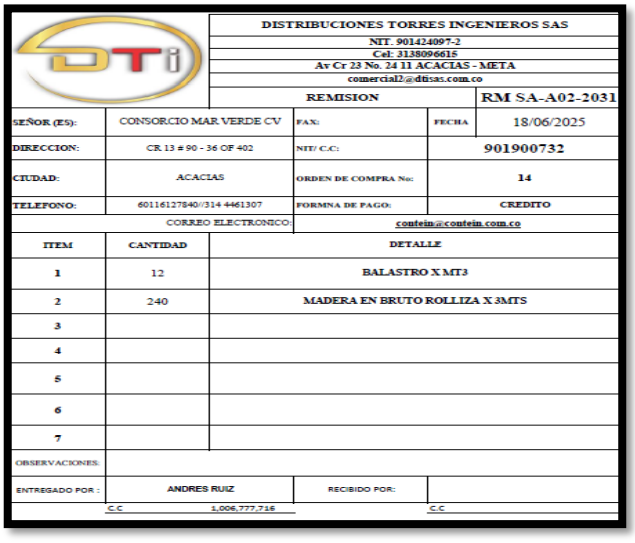

INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4833
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: XDE 076 M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4833	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4834
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4834	**Fecha**:26/07/02025

- Material de madera: El material de madera tiene procedencia de la empresa Moldutriplex ubicado en el municipio de acacias barrio cooperativo. De igual manera se anexará la respectiva licencia ambiental del lugar procedente del material de madera.


DISTRIBUCIONES TORRES INGENIEROS SAS
NIT. 901424097-2
Cel: 3138096615
Av Cr 23 No. 24 11 ACACIAS - META
comercial2@dtisas.com.co
REMISION RM SA-A02-2031

SEÑOR (ES):	CONSORCIO MAR VERDE CV	FAX:	FECHA: 18/06/2025
DIRECCION:	CR 13 # 90 - 36 OF 402	NIT/ C.C:	901900732
CIUDAD:	ACACIAS	ORDEN DE COMPRA No:	14
TELEFONO:	60116127840//314 4461307	FORMNA DE PAGO:	CREDITO
	CORREO ELECTRONICO:		contein@contein.com.co

ITEM	CANTIDAD	DETALLE
1	12	BALASTRO X MT3
2	240	MADERA EN BRUTO ROLLIZA X 3MTS
3		
4		
5		
6		
7		
OBSERVACIONES:		

ENTREGADO POR : ANDRES RUIZ RECIBIDO POR:
C.C 1,006,777,716 C.C

Remisión: SA-A02-2031	**Fecha:** 18/06/2025

8.9 PM09 SUSTANCIAS QUIMICAS:

En el periodo correspondiente se conto con los siguientes productos químicos los cuales cuentan con su respectiva hoja de seguridad, estas reposan en la base de datos de almacén.

contein Construimos Beneficios	INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS														
	CODIGO						FECHA EMISIÓN					REVISIÓN 06			
	FO.HSE.018						MAYO DE 2016					PAGINA 1 DE 1			
Proveedor	Fabricante	Nombre comercial	Nombre quimico o componente peligroso principal	NUMERO CAS	Estado Físico	Clase de peligro para el transporte UN	Peligros para la salud	Peligros Físicos	Periodicidad o Frecuencia de uso	Existencia de medidas de control con EPP	Presentacion (Caneca, bulto, garrafa, frasco)	Cantidad existente	Usuario (AREA o PROCESO)	Hoja de seguridad actualizada (Si ó NO)	ROMBO NFPA 704
	CEMEX	CEMENTO	CEMENTO HIDRAULICO	65997-15-1 - 14808-60-7 - 7440-47-3 - 1317-65-3 - 7778-18-9	Material particulado fino Volatil	No clasificado	Nocivo por inhalacion	Sin peligro físico / No aplica	No aplica	Si	BULTO	N/A		Si	
	QUIMINSA	CAL HIDRATADA	HIDROXIDO DE CALCIO	1305-62-0	Material particulado fino Volatil	Clase 8 - Corrosivo	Irritante	Corrosivo	Esporadicamente	Si	BULTO	N/A		Si	
	PRIMAX	ACPM	BIODISEL B1 - B20	68334-30-5 - 68990-52-3 - 100-41-4 - 91-20-3	Liquido ligero volátil	Clase 3 - Liquido Inflamable	Nocivo por ingestion	Inflamable	No aplica	Si	GARRAFA	N/A		Si	

Tabla 7. Inventario productos químicos

9. ESTADO DETRAMITES AMBIENTALES

Con el seguimiento de los trámites ambientales correspondientes al proyecto, informo que se realizo radicación de solicitud de tala de individuos arbóreos con radicado interno 375-211-2025 del 2025 el cual se radico en la Alcaldía Municipal de Acacias con Id. Control: 1717999 del 17 de julio de 2025. A la fecha se espera respuesta por parte de la alcaldía municipal de Acacias.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
375-211-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717999	17-Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias

10. CONCLUSIONES

La entrega del presente informe ambiental en la etapa de construcción del proyecto evidencia el compromiso del Consorcio Mar Verde CV con una gestión ambiental rigurosa y responsable frente a los impactos que pueden generarse durante esta fase. Esta labor se enmarca dentro de los principios de prevención y mitigación contemplados en la normatividad ambiental vigente, asegurando su cumplimiento durante la ejecución de las obras civiles.

La disponibilidad de este informe ambiental facilita la labor de las autoridades competentes en materia de control y seguimiento, al proporcionar insumos técnicos actualizados que permiten verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales aplicables a la fase constructiva del proyecto.

De esta manera se refuerza la transparencia en las actuaciones del Consorcio ante las medidas implementadas para proteger los recursos naturales.

11. ANEXOS

- ✓ **Registro fotográfico**

			
Foto No.	1	**Foto No.**	2
Fecha	26/06/2025	**Fecha**	26/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Instalación de USP	**Observaciones**	Instalación de USP

			
Foto No.	3	**Foto No.**	4
Fecha	01/07/2025	**Fecha**	01/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Vibro-compactador utilizado en obra	**Observaciones**	Retroexcavadora utilizada en obra
			
Foto No.	5	**Foto No.**	6
Fecha	26/06/2025	**Fecha**	27/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Material de rio utilizado para vía de ingreso y plataforma de campamento temporal	**Observaciones**	Material de rio utilizado para vía de ingreso y plataforma de campamento temporal

			
Foto No.	7	**Foto No.**	8
Fecha	27/06/2025	**Fecha**	27/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Vía de acceso al campamento y vehículo tipo volqueta	**Observaciones**	Vía de acceso al campamento
			
Foto No.	9	**Foto No.**	10
Fecha	24/06/2025	**Fecha**	03/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Orden y aseo material de madera	**Observaciones**	Orden y aseo material de madera

			
Foto No.	11	**Foto No.**	12
Fecha	02/07/2025	**Fecha**	04/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Charla ambiental	**Observaciones**	Charla ambiental
			
Foto No.	13	**Foto No.**	14
Fecha	14/07/2025	**Fecha**	16/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Se utilizo plástico negro y una caneca metálica dividida para evitar contaminación al suelo	**Observaciones**	Actividades de cerramiento sin contaminación al suelo

12. CONTROL DE MODIFICACIONES



ING. CRISTIAN ABELLO RAMIREZ
RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO MAR VERDE CV

FECHA	VERSIÓN	OBSERVACIONES
16/07/2025	01	Se remite informe ambiental No. 05 de la etapa de Construcción

ANEXO 5. INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL

Componente Social – Proyecto Mar Verde
Periodo reportado: 17 de junio al 17 de julio de 2025
Responsable: Melisa Meneses Castro – Profesional Social
Entidad: Consorcio Mar verde CV

OBJETIVO DEL INFORME

Documentar de manera integral las actividades realizadas por el componente psicosocial del Proyecto Mar Verde, en el marco de la construcción del campamento penitenciario para mujeres en la Colonia Agrícola de Acacias, Meta. El informe detalla las acciones ejecutadas en materia de acercamiento comunitario, levantamiento de información, socialización, atención de inquietudes y diseño de estrategias preventivas y de mitigación de impactos sociales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Levantamiento de Actas de Apertura de Vecindad

Fecha: 17 al 22 de junio

Se recorrió nuevamente la vereda El Carmen para realizar el levantamiento de las actas de apertura de vecindad mediante verificación directa del estado actual de las viviendas. En total se abordaron 43 viviendas, de las cuales:

- 38 actas fueron diligenciadas exitosamente.
- 2 viviendas no se intervinieron por ausencia reiterada de sus propietarios.
- 1 vivienda se encontró en condición de abandono.
- 1 vivienda no permitió el ingreso ni la realización del acta.
- 1 lote sin habitar.

  Esta información fue compartida y consolidada en reunión interinstitucional con USPEC, INPEC y el consorcio.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



2. Entrega de invitaciones a la Primera Jornada de Capacitación Comunitaria

Fecha: 20 de junio

Se entregaron invitaciones a los habitantes de la vereda para participar en la jornada de capacitación sobre el "Cuidado del entorno familiar". Esta actividad formativa se llevó a cabo con alta participación comunitaria, y fortaleció el vínculo entre el proyecto y la población, fomentando una cultura de corresponsabilidad y apropiación social.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



3. Primera Jornada de Capacitación Comunitaria

Fecha: 28 de junio del 2025
Hora: 9:00 am
Lugar: Casa los Potrillos, Vereda del Carmen

Propósito: Promover comportamientos responsables, seguros y solidarios mientras se desarrollan los trabajos, sin perder nuestra esencia como vecinos y cuidadores de nuestro territorio.

Tema tratado: "CUIDADO DEL ENTORNO FAMILIAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA".

Se realizó la presentación oficial de las profesionales del componente social por parte del Consorcio Mar verde CV y la Interventoría del Proyecto Mar Verde.
La jornada inició con una cálida bienvenida a los asistentes, contextualizando el tema central de la capacitación denominada "Cuidado del entorno familiar", resaltando el mensaje clave: "El cuidado del entorno empieza en casa... y se fortalece en comunidad.".

Durante el encuentro, se explicó que el cuidado del entorno familiar implica fomentar relaciones sanas, respetuosas y solidarias dentro del hogar, reconociendo que este es el primer espacio donde se construyen los valores y comportamientos que impactan directamente en la vida comunitaria. Se abordaron aspectos como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, el mantenimiento de espacios limpios y el fortalecimiento del vínculo familiar como pilares fundamentales para una convivencia armónica.

Posteriormente, se comenzó la actividad principal, conformando cinco grupos de tres personas. A cada grupo se le entregaron preguntas orientadoras que debían
abordar desde su experiencia personal. La participación fue activa y emotiva, generándose espacios de diálogo e intercambio de ideas. A medida que avanzaba la actividad, surgieron diversas inquietudes por parte de los asistentes, lo que permitió enriquecer el espacio con aportes significativos desde la comunidad.
Como cierre de la actividad, se entregaron papeles de colores a cada participante, en los cuales debían escribir un compromiso personal relacionado con el tema tratado durante la capacitación, el cual ira pegado en un mural denominada Vereda El Carmen: Unidos Por El Bienestar De Todos.

Finalmente, la comunidad expresó una necesidad sentida: manifestaron su inconformidad con algunos aspectos de la construcción e hicieron un llamado a contar con un representante del área técnica o de obra civil que pueda atender y resolver inquietudes específicas de tipo

estructural que los afectan directamente. Esta solicitud se considera prioritaria para lograr una mayor disposición y participación de la comunidad en próximos encuentros.

Solicitudes de la Comunidad de manera verbal

Se solicita el acompañamiento de un profesional representante de cada una de las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto Mar Verde —Constructora, INPEC, USPEC e Interventoría— con el propósito de brindar respuestas claras y oportunas a las inquietudes manifestadas por la comunidad durante el espacio de socialización.
Entre los temas que requieren aclaración por parte de los entes responsables, se destacan los siguientes:

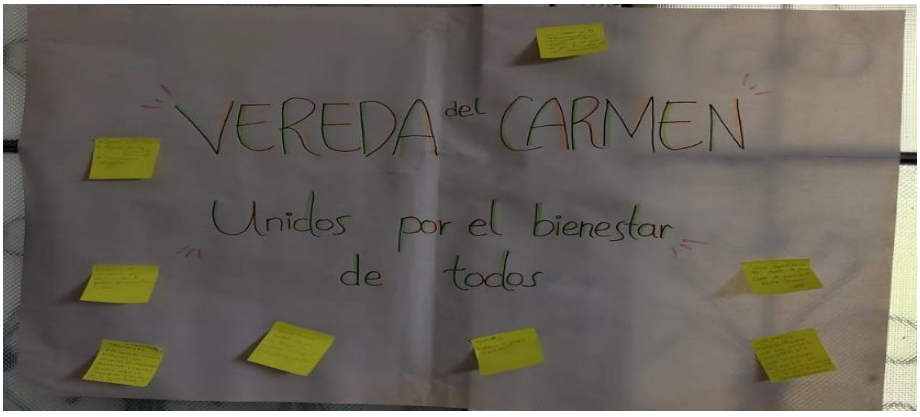
- Implementación de señalización que informe a la comunidad sobre el tránsito de maquinaria pesada, así como socialización del plan vial previsto.
- Establecimiento de horarios específicos para el paso de maquinaria, teniendo en cuenta que en la zona hay un alto flujo de personas, incluyendo estudiantes.
- Claridad sobre la distancia prevista para la construcción del muro frente a las viviendas.
- Funcionamiento de los inhibidores de señal y su impacto en la cotidianidad de los habitantes.
- Información sobre el estado y protección de la bocatoma que abastece de agua a la colonia, ante la preocupación de una posible disminución de presión.
- Posibilidad de participación de la comunidad en el proyecto mediante generación de empleo local.
- Manejo de los accesos de entrada y salida del personal y maquinaria de la obra.
- Señalización visible y adecuada en toda la maquinaria utilizada por el consorcio.

Se solicita que, en lo posible, todas estas inquietudes sean abordadas y resueltas mediante una presentación clara y estructurada durante el próximo encuentro con la comunidad.
Con el fin de brindar una experiencia cálida e integral a los asistentes, se ofreció un refrigerio que consistió en un jugo en caja y un ponqué Gala. Esta atención buscó valorar la participación de la comunidad, favorecer un ambiente de diálogo cercano

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Sistematización de la Jornada y Atención a PQR
Fecha: 30 de junio al 6 de julio

- Se elaboró el acta oficial de la jornada de capacitación y fue remitida por correo electrónico a Interventoría, INPEC, USPEC, Junta de Acción Comunal y Consorcio mar verde CV.
- Se inició la digitalización de las actas de apertura de vecindad con sus respectivas fotografías.
- Durante este periodo, se recibió una PQR que fue verificada inmediatamente y remitida con el respectivo informe técnico de atención**.**

4. Gestión Documental y Vinculación Institucional

Fecha: 7 al 13 de julio

- Se atendió una nueva PQR de forma directa, incluyendo visita de verificación el 9 de julio con el propietario de la vivienda, quien recibió una propuesta de solución y quedó en emitir respuesta en fecha acordada.
- Se remitió por correo electrónico el acta de apertura del entorno vial a los actores institucionales mencionados. El proceso de digitalización de las actas continuó conforme al cronograma.
- Desde el Consorcio mar verde CV se inició el trámite para vinculación con la Red de Empleo de la Alcaldía, gestionando usuario y contraseña institucionales para publicar hojas de vida en la plataforma oficial. El 11 de julio se comenzaron a recopilar los documentos requeridos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA






COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Finalizar la digitalización y archivo de las actas de vecindad.
- Continuar con las capacitaciones comunitarias conforme al cronograma social.
- Dar atención eficiente a las PQR presentadas por la comunidad.
- Consolidar la vinculación con la Red de Empleo de la Alcaldía.

CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 17 de julio de 2025, se evidenció un avance significativo en la implementación del componente psicosocial del Proyecto Mar Verde. La ejecución efectiva de las actas de apertura, el desarrollo de actividades formativas, la atención oportuna a PQRs y la consolidación de la gestión documental reflejan un trabajo comprometido con los principios de participación, transparencia y corresponsabilidad.

La articulación interinstitucional y la recepción positiva por parte de la comunidad permiten visualizar un escenario favorable para el desarrollo del proyecto, consolidando acciones alineadas con sus objetivos sociales y técnicos, y reforzando la confianza entre la comunidad, el equipo técnico y las entidades participantes.



MELISA MENESES CASTRO
Profesional Social – CONSORCIO MARVERDE CV

ANEXO 6. CERTIFICACION DE PARAFISCALES

DECLARACION JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Yo **JAIME ARTURO GARZÓN HUERTAS**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **CONTEIN S.A.S**, con NIT: 860.090.819-1, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.326.357 de Bogotá, de acuerdo con la Ley 789 del 2002, manifiesto bajo juramento que la Compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados, de igual forma ha dado cumplimiento aportes al Fondo de la Industrial de la Construcción – FIC. En relación con sus empleados, Por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación, incluido el mes de junio del 2025.



JAIME ARTURO GARZÓN HUERTAS
C.C No. 19.326.357 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional **Nº 8191-T**
En calidad de: **Revisor Fiscal**

Fecha: julio 04 de 2025.
