

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**Realizar el mantenimiento y renovación de obras civiles en los bienes inmuebles propiedad del Distrito Lote 2: Mantenimiento y renovación de las unidades sanitarias del CAD**	**190 días**	**jue 20/11/25**	**sab 20/06/26**	
2			**INICIO DEL PROYECTO**	**0 días**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**	
3			**Diagnósticos, levantamientos y preliminares documentales**	**22 días**	**jue 20/11/25**	**dom 14/12/25**	2
4			Subtotal Inversión Socio Ambiental	135 días	jue 20/11/25	lun 20/04/26	2
5			Subtotal pólizas	80 días	jue 20/11/25	mar 17/02/26	2
6			Destinación pago de reajustes	80 días	sab 17/01/26	jue 16/04/26	2FC+52 días
7			**PISO 1 - ORIENTAL**	**120 días**	**lun 15/12/25**	**mar 28/04/26**	
8		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	
9		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
10		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	9;20
11		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	9
12		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	9CC
13		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	11;18;19
14		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	11
15		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	9CC
16		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento y	1 día	vie 30/01/26	sab 31/01/26	14;13
17		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	9CC;10
18		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	9CC
19		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	9CC
20		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	14
21		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sab 31/01/26	20
22		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
23		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	16FC+17 días
24		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
25		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
26		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	21;10;20;23
27		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	26CC
28		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	26CC
29		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
30		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	26CC
31		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	26CC
32		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	26CC
33		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
34		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	32
35		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
36		3.10.4	De diámetro 1½", RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
37		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
38		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
39		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
40		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
41		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	34CC
42		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
43		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	41
44		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	31;32
45		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	37;36;34
46		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
47		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sab 28/02/26	45
48		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sab 28/02/26	mié 4/03/26	47
49		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sab 28/02/26	mié 4/03/26	48CC

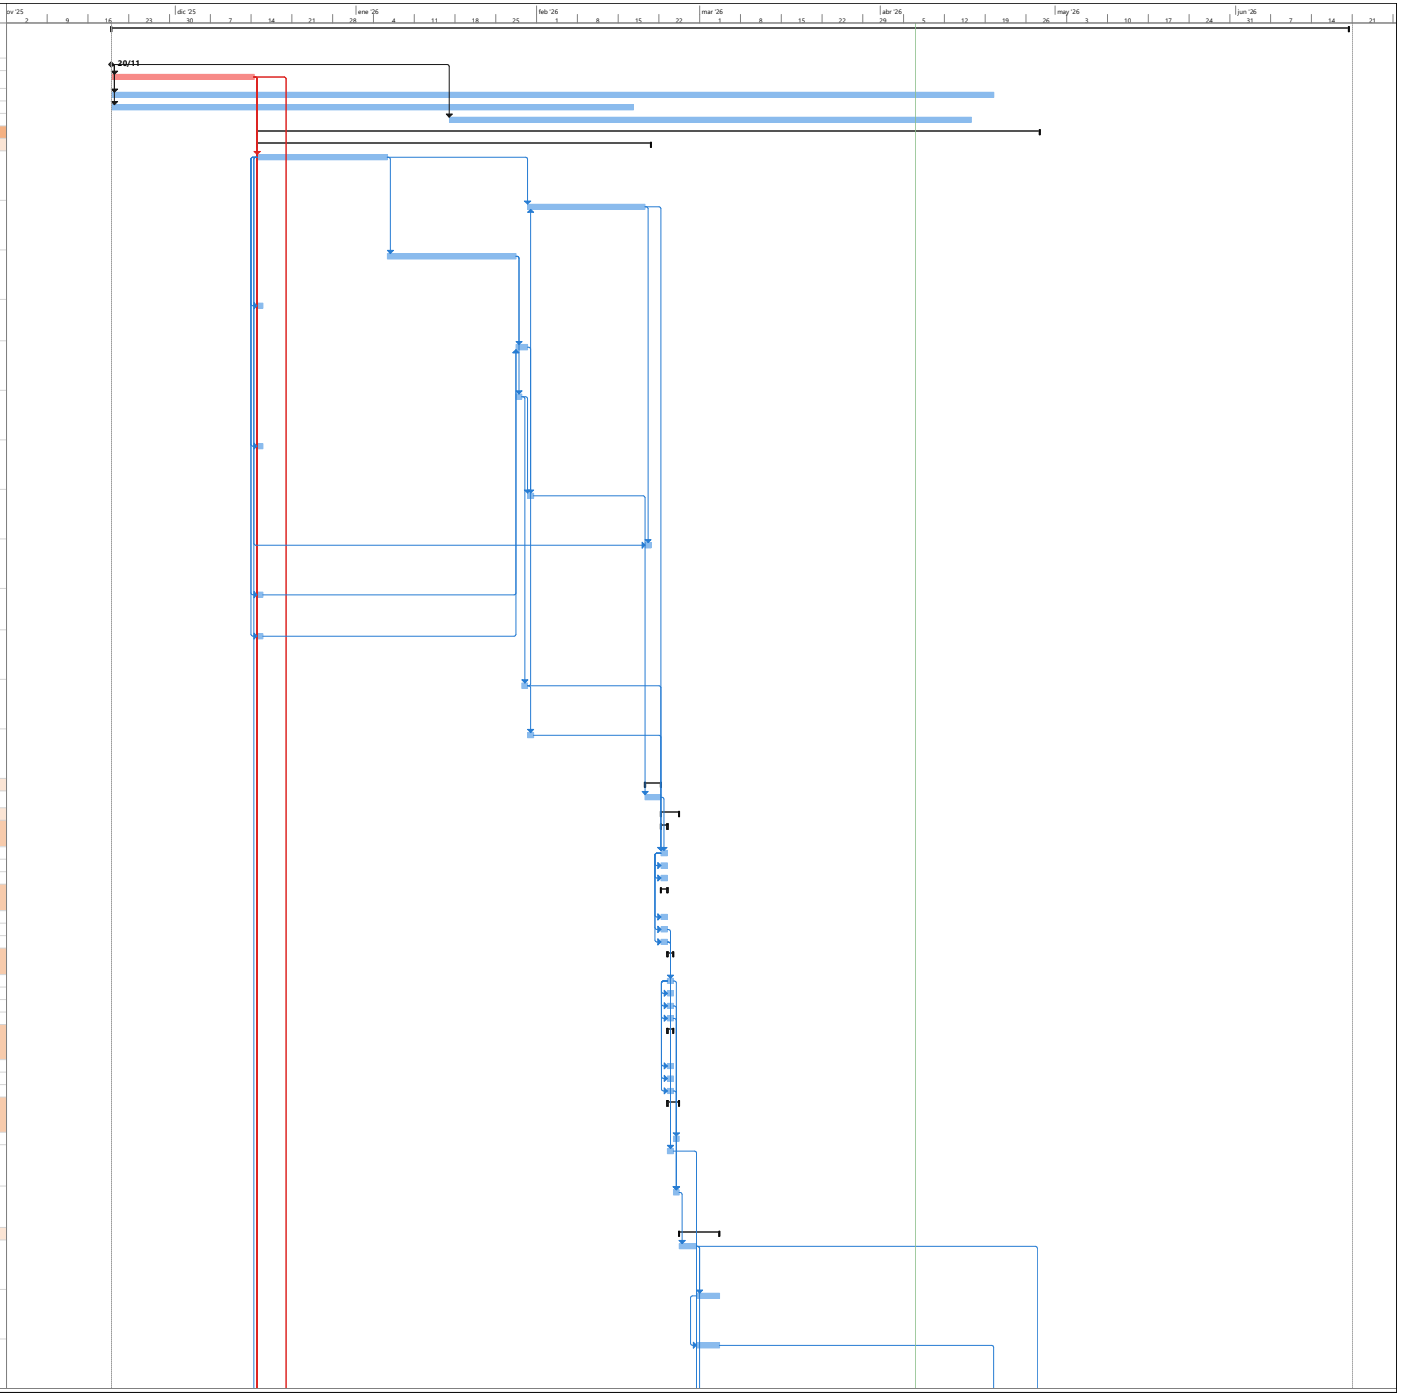

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
50		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**sáb 28/02/26**	**vie 6/03/26**	
51		6.1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	47;44
52		6.3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	51
53		6.6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	54
54		6.7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	51CC
55		6.8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rulsada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	54
56		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**lun 20/04/26**	
57		5.1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	52CC+34 días
58		5.2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26	57CC
59		5.3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	57CC
60		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**5 días**	**lun 20/04/26**	**sáb 25/04/26**	
61		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	52FC+41 días
62		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	61
63		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	62CC
64		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	62CC
65		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	62CC
66		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	49FC+42 días
67		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	66CC
68		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
69		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
70		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	jue 23/04/26	jue 23/04/26	62CC
71		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	62CC;9CC
72		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	61CC
73		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	62CC
74		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	63CC
75		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**	
76		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
77		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
78		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
79		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
80		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
81		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m, e = 15 cm.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
82		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy MZ5 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
83		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta: de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	71CC
84		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**mar 21/04/26**	**mar 28/04/26**	

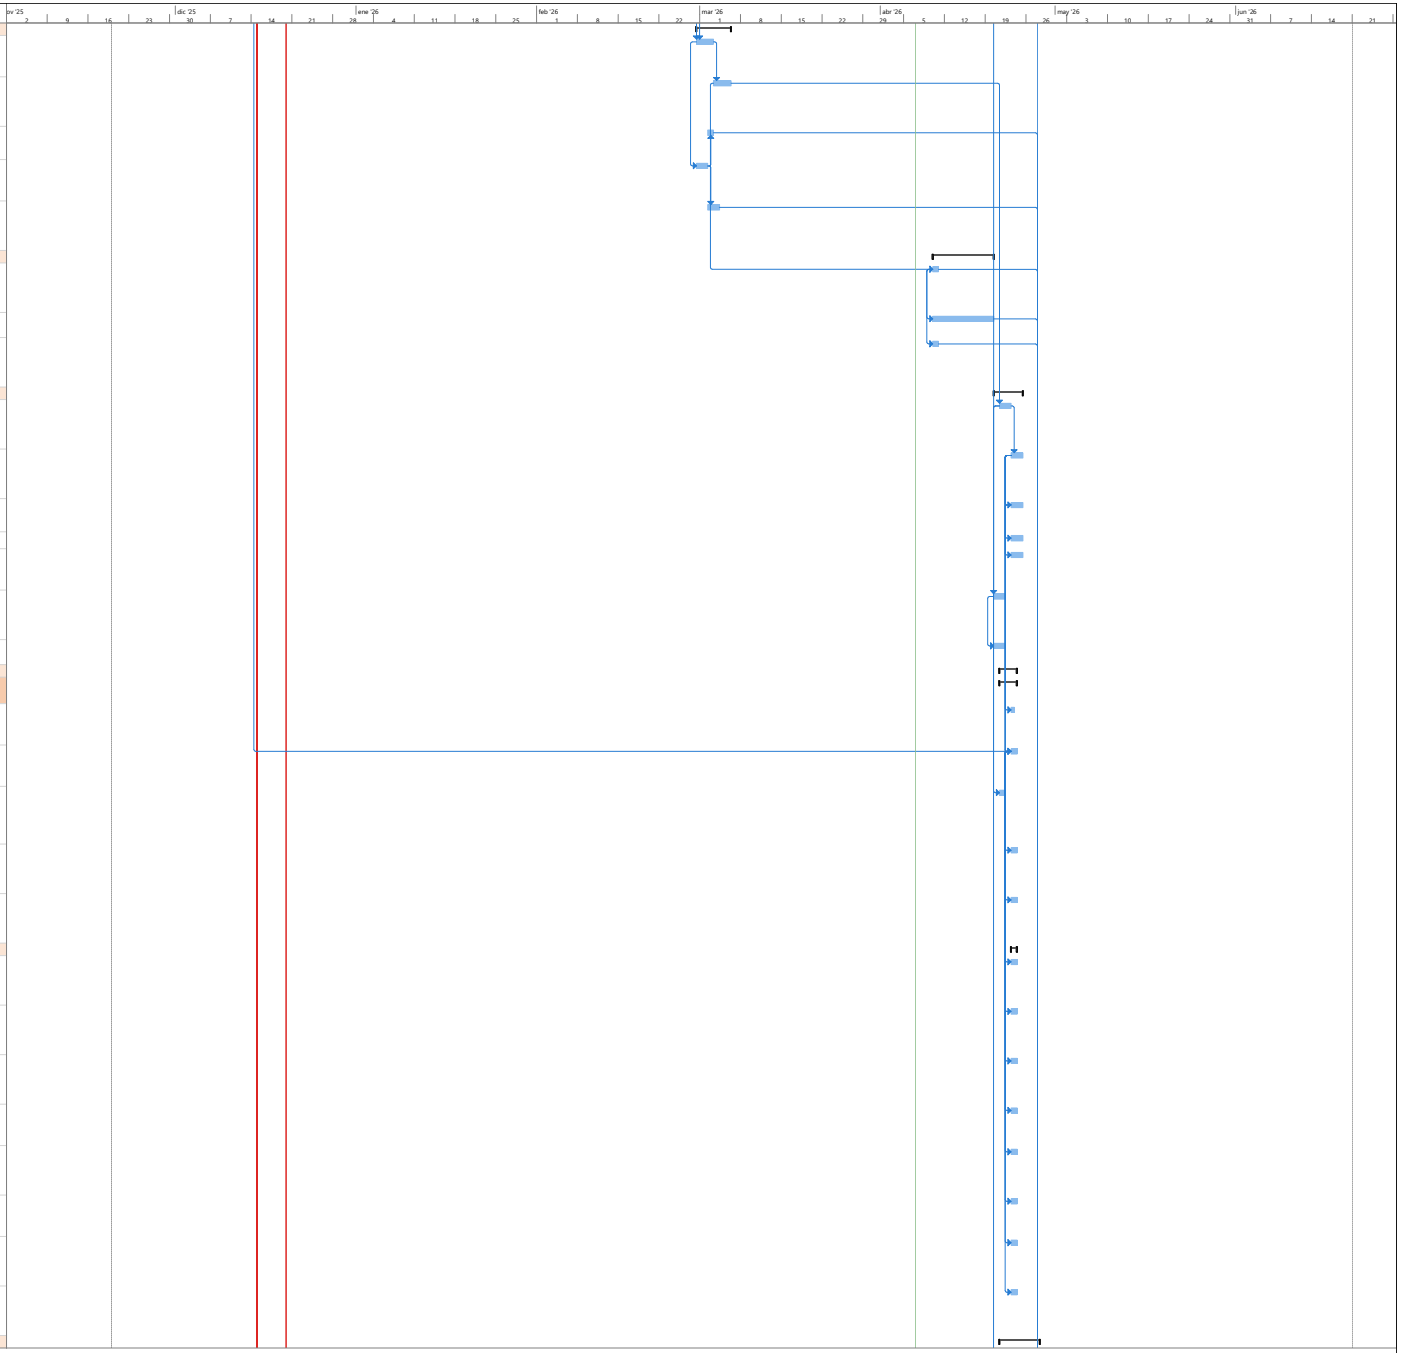

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
85		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26	61CC
86		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	85CC
87			**ENTREGA DE PISO 1 - ORIENTAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**47;53;58;57;59;55;85**
88			**PISO 2 - ORIENTAL**	**121 días**	**lun 15/12/25**	**mié 29/04/26**	
89		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	
90		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
91		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	90;101
92		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	90
93		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	90CC
94		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	92;99;100
95		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	92
96		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	90CC
97		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	94;95
98		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	90CC;91
99		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	90CC
100		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	90CC
101		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	95
102		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	101
103		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
104		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	97FC+17 días
105		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
106		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
107		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	91;101;102;104
108		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	107CC
109		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	107CC
110		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
111		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	107CC
112		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	107CC
113		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	107CC
114		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
115		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	113
116		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
117		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
118		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
119		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
120		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
121		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
122		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	115CC
123		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
124		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	122
125		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	112;113
126		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	115;117;118
127		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**38 días**	**mié 25/02/26**	**mié 8/04/26**	
128		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	126
129		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	128
130		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	129CC
131		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**39 días**	**sáb 28/02/26**	**lun 13/04/26**	

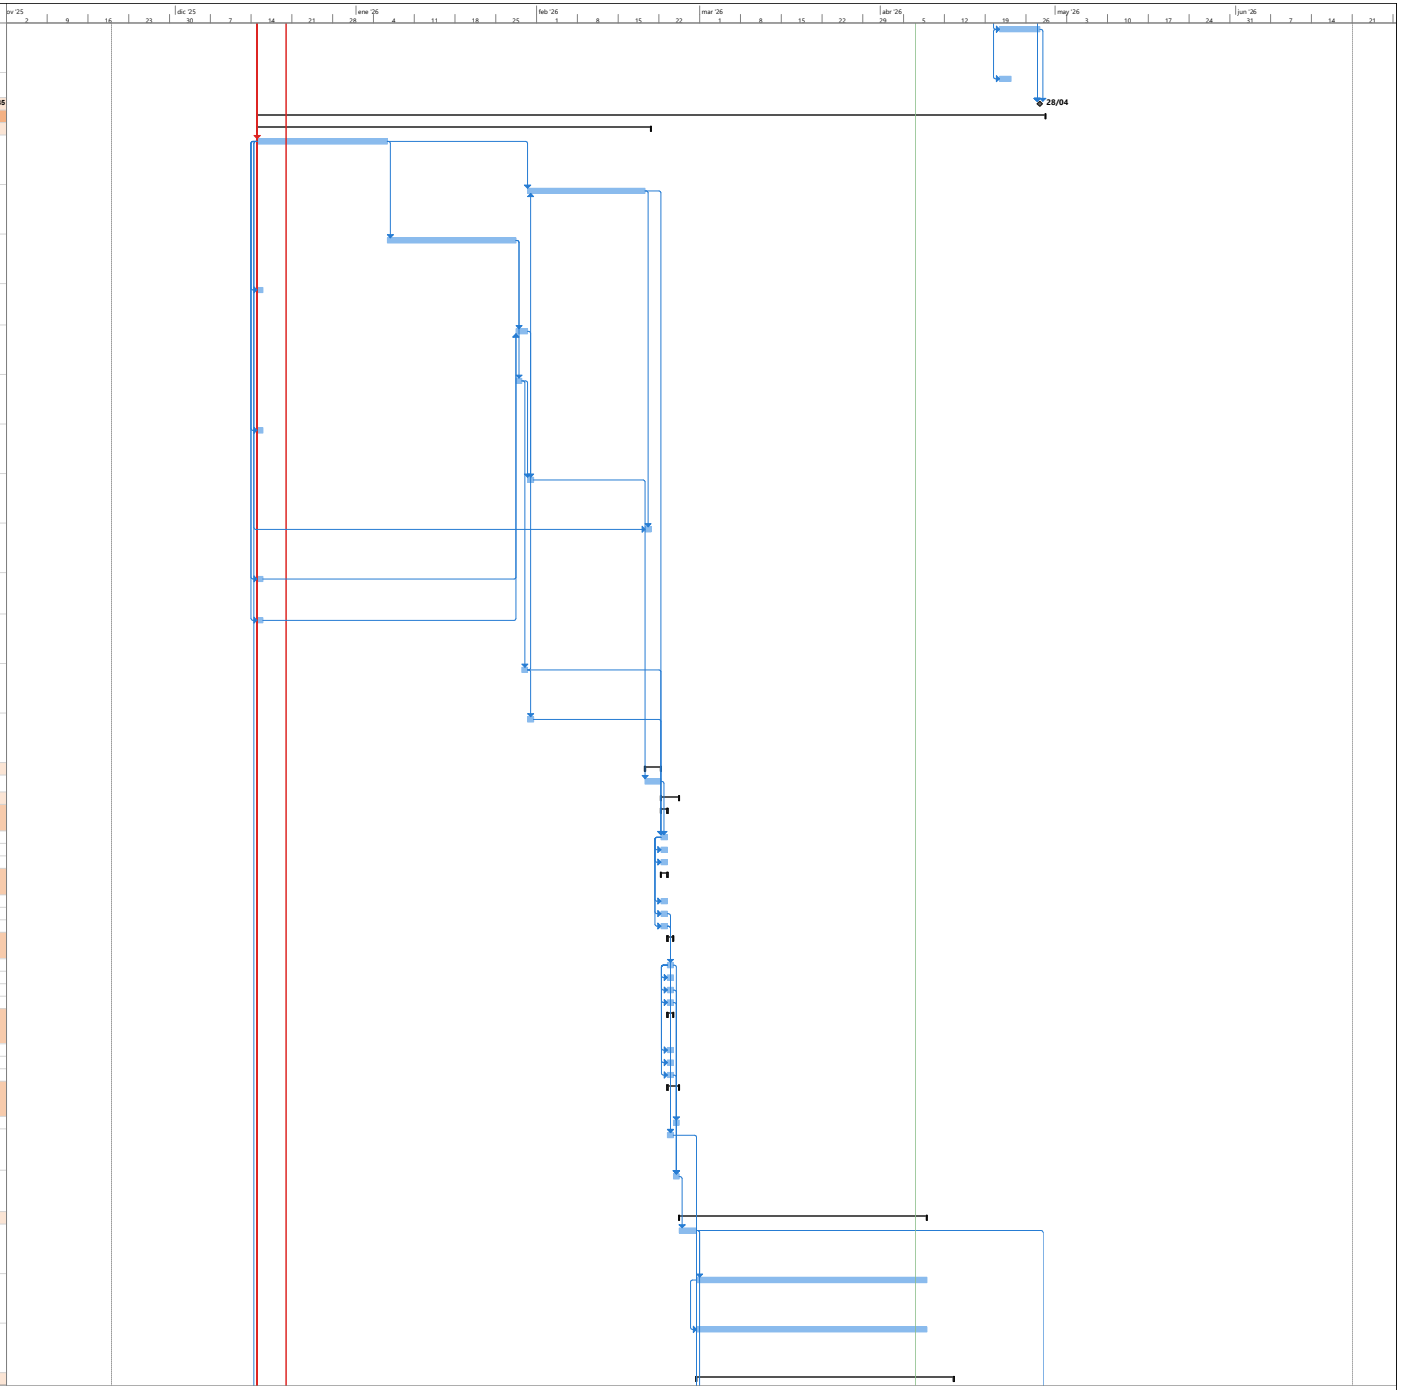

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
132		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	125;128
133		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	132FC+32 días
134		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	sáb 11/04/26	dom 12/04/26	135FC+36 días
135		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	132CC
136		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	sáb 11/04/26	lun 13/04/26	134CC
137		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**dom 12/04/26**	**jue 23/04/26**	
138		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	133CC+4 días
139		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	138CC
140		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	139
141		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/04/26**	
142		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	140FC+1 día
143		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	142
144		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	143CC
145		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	143CC
146		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	143CC
147		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	142CC
148		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	147CC
149		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
150		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
151		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	143CC
152		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	90CC;143CC
153		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	142CC
154		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	143CC
155		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	144CC
156		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**	
157		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
158		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
159		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
160		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para otinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,90 x 0,46 m.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
161		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
162		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con hialadera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m, e = 15 cm.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
163		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
164		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	152CC
165		**9.0**	**VARIOS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
166		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	142CC

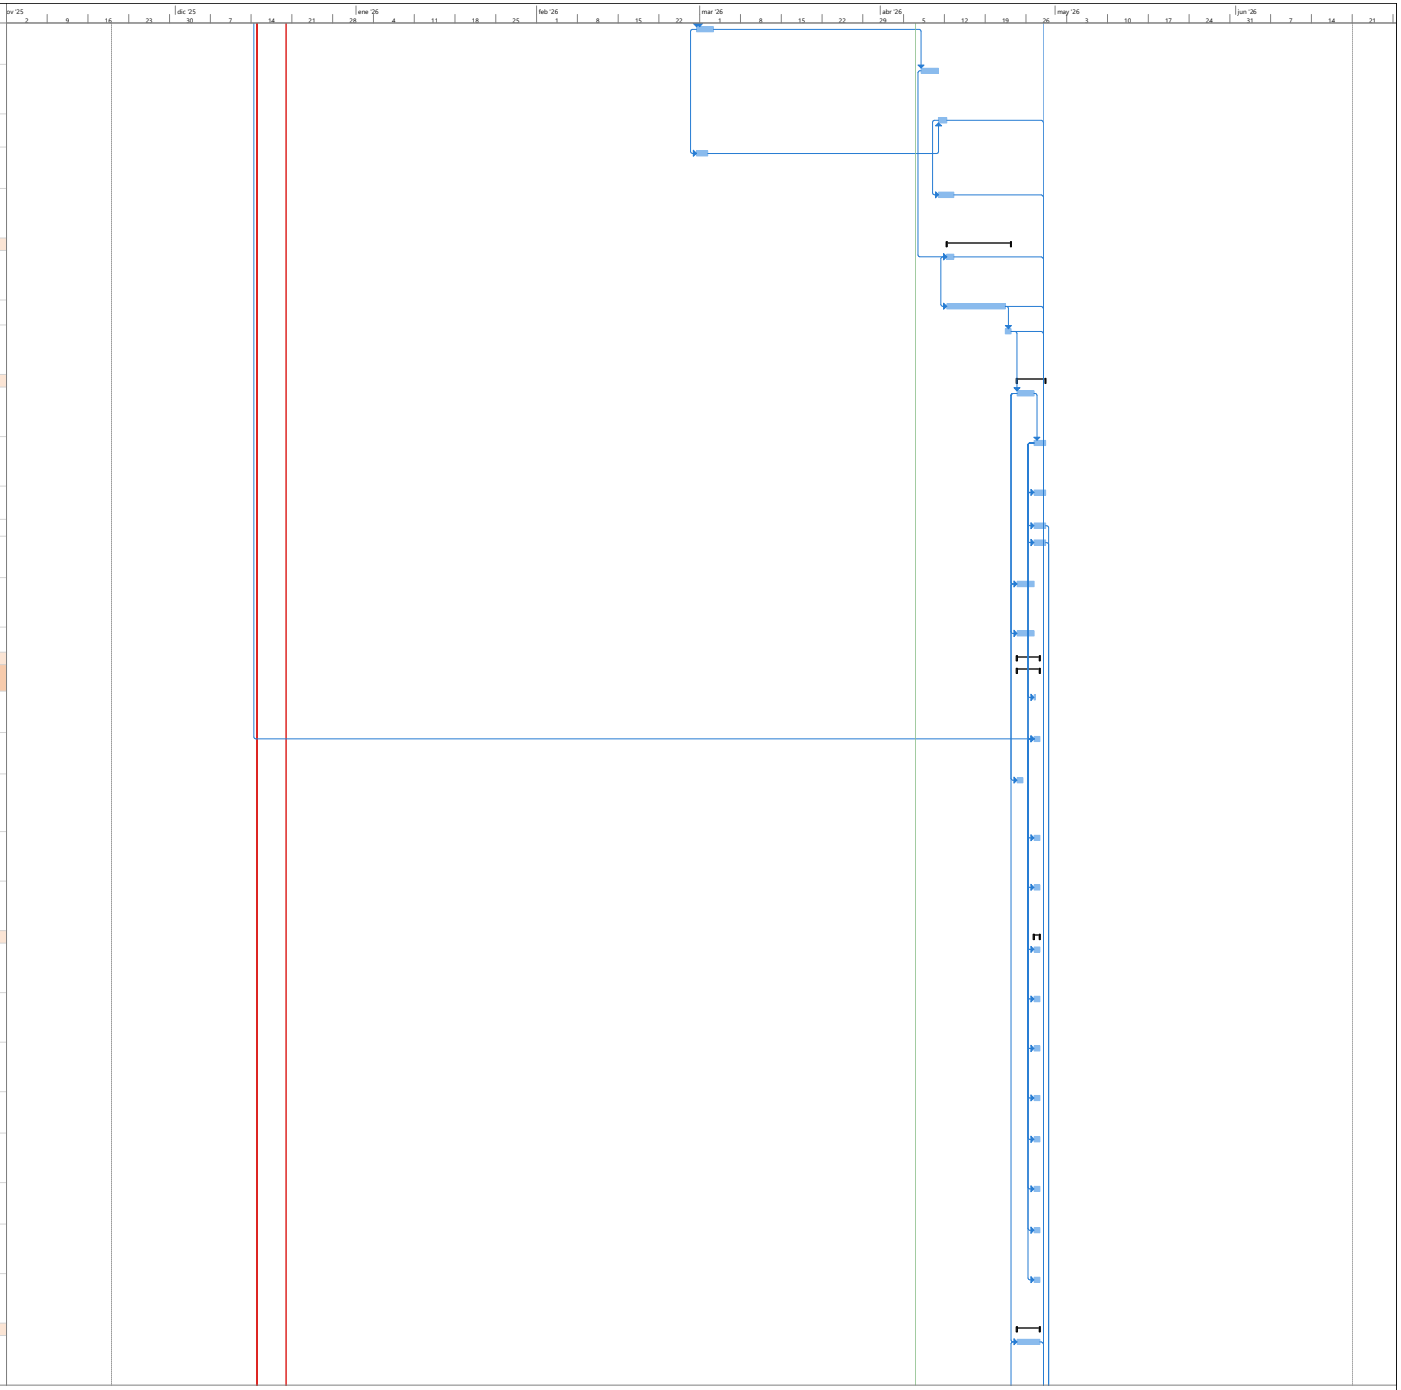

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
167		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	166CC
168			**ENTREGA DE PISO 2 - ORIENTAL**	**0 días**	**mié 29/04/26**	**mié 29/04/26**	**128;134;136;138;139;**
169			**PISO 3 - ORIENTAL**	**121 días**	**lun 15/12/25**	**mié 29/04/26**	
170		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	
171		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
172		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	171;182
173		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	171
174		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	171CC
175		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	173;180;181
176		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	173
177		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	171CC
178		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	175;176
179		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	171CC;172
180		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	171CC
181		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	171CC
182		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	176
183		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	182
184		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
185		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	178FC+17 días
186		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
187		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
188		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	172;182;183;185
189		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	188CC
190		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	188CC
191		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
192		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	188CC
193		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	188CC
194		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	188CC
195		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
196		3.10.1	De diámetro ½"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	194
197		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
198		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
199		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
200		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
201		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
202		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
203		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	196CC
204		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
205		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	203
206		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	193;194
207		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	196;198;199
208		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**38 días**	**mié 25/02/26**	**mié 8/04/26**	
209		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorzados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	207
210		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	209
211		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	210CC
212		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**39 días**	**sáb 28/02/26**	**lun 13/04/26**	
213		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	206;209

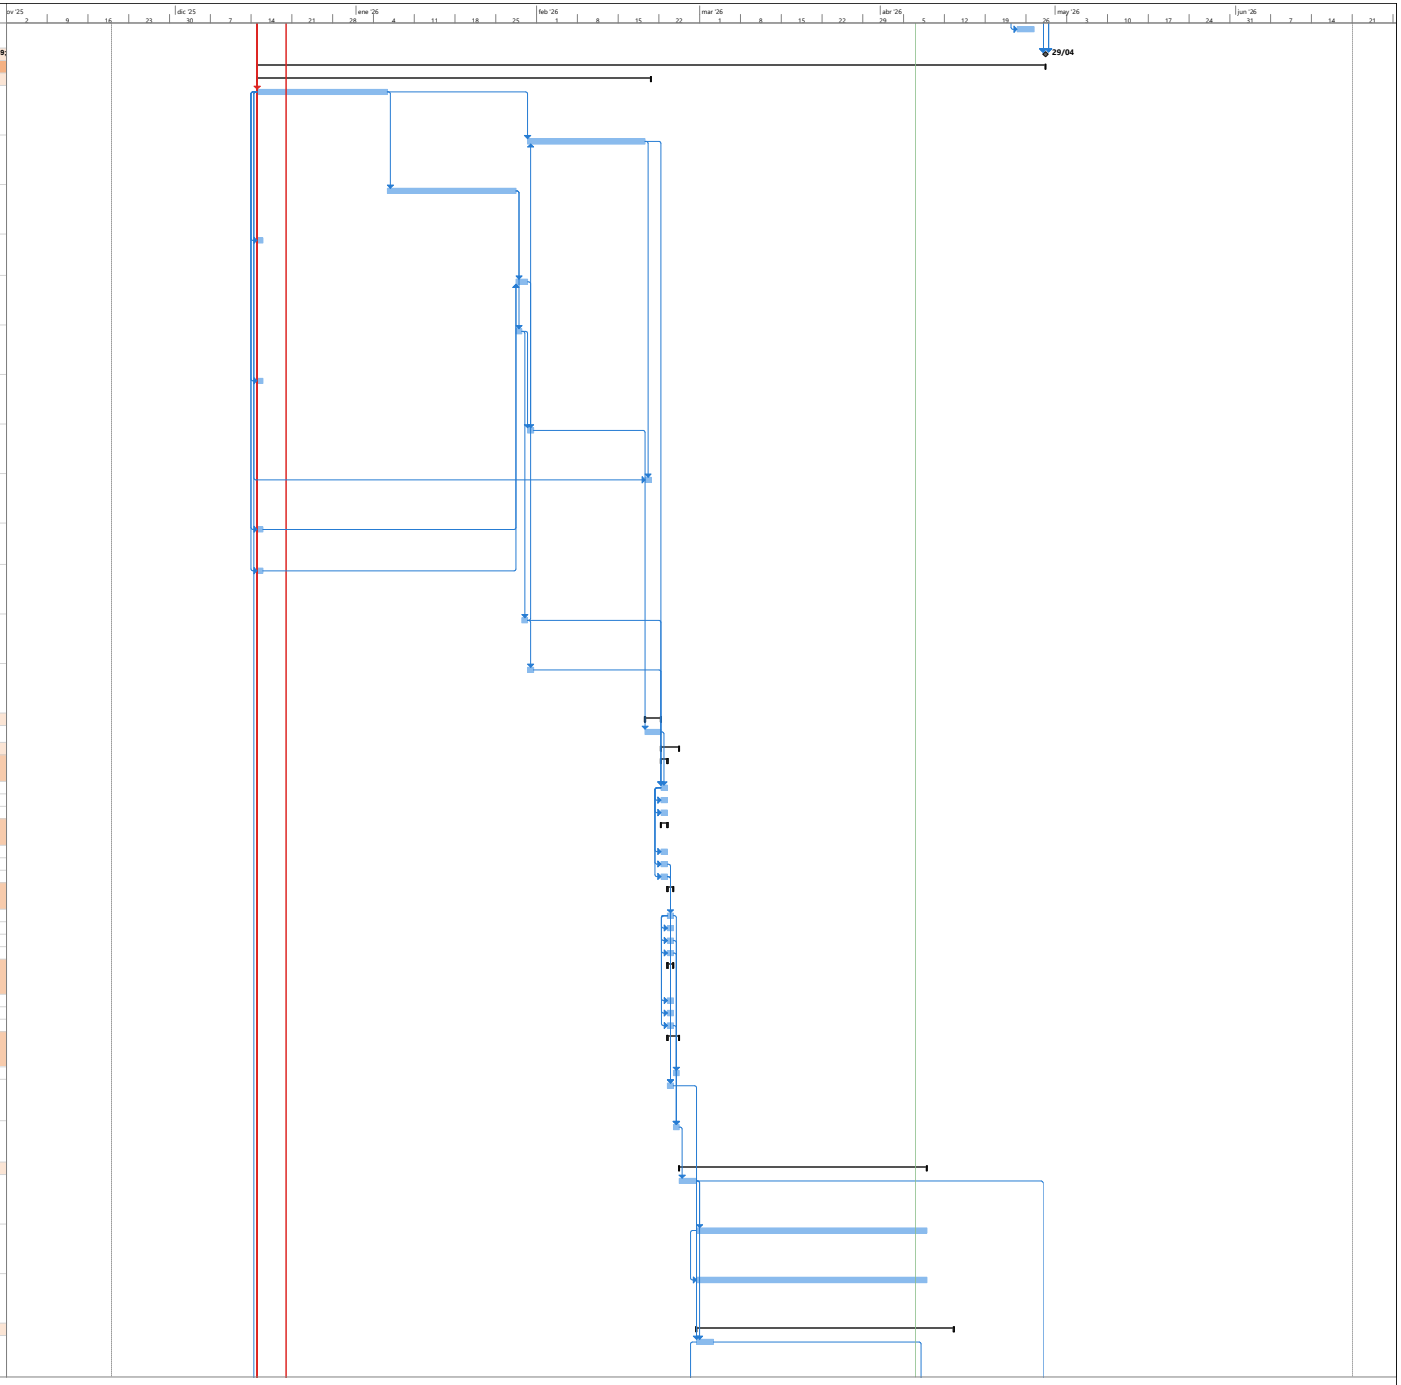


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
214		6.3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	213FC+32 días
215		6.6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	sáb 11/04/26	dom 12/04/26	216FC+36 días
216		6.7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	213CC
217		6.8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir. (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	sáb 11/04/26	lun 13/04/26	215CC
218		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**dom 12/04/26**	**jue 23/04/26**	
219		5.1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	214CC+4 días
220		5.2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	219CC
221		5.3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción,	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	220
222		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/04/26**	
223		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	221FC+1 día
224		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	223
225		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	224CC
226		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	224CC
227		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	224CC
228		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	223CC
229		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	228CC
230		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
231		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
232		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	224CC
233		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	171CC;224CC
234		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	223CC
235		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	224CC
236		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	225CC
237		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**	
238		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
239		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
240		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
241		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,90 x 0,46 m.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
242		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
243		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con hallatlera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m, e = 15 cm.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
244		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
245		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	233CC
246		**9.0**	**VARIOS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
247		9.1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	223CC
248		9.2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	247CC
249			**ENTREGA DE PISO 3 - ORIENTAL**	**0 días**	**mié 29/04/26**	**mié 29/04/26**	**209;215;217;219;220;**

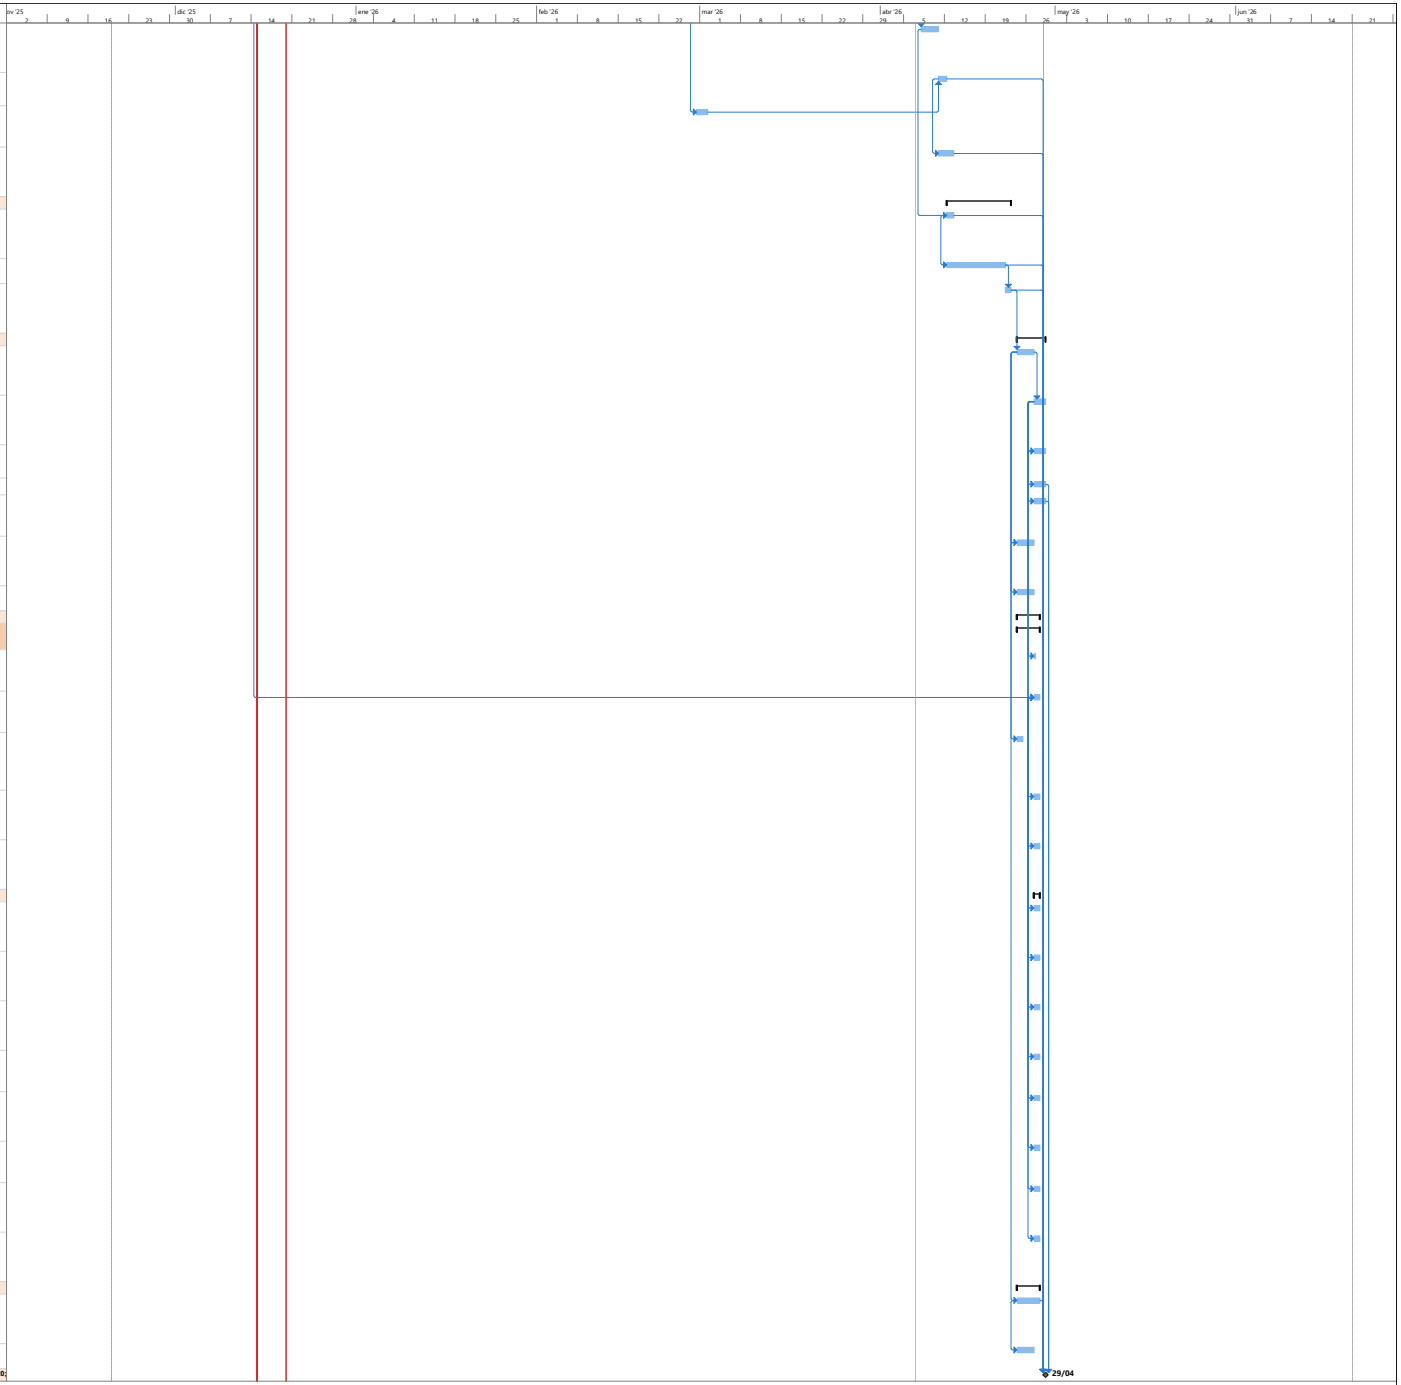

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
250			**PISO 4 - ORIENTAL**	**121 días**	**lun 15/12/25**	**mié 29/04/26**	
251		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	
252		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o pocetas). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
253		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	252;263
254		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	252
255		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	252CC
256		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	254;261;262
257		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	254
258		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	252CC
259		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	256;257
260		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	252CC;253
261		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	252CC
262		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	252CC
263		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	257
264		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	263
265		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
266		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	259FC+17 días
267		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
268		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
269		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	253;263;264;266
270		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	269CC
271		3.1.3	Diámetro 4"	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	269CC
272		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
273		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	269CC
274		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	269CC
275		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	269CC
276		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
277		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	275
278		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
279		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
280		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
281		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
282		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
283		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
284		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	277CC
285		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
286		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	284
287		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3". 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	274,275
288		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	277;279;280
289		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**38 días**	**mié 25/02/26**	**mié 8/04/26**	
290		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	288
291		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	290
292		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	291CC
293		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**39 días**	**sáb 28/02/26**	**lun 13/04/26**	
294		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	287,290
295		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	294FC+32 días

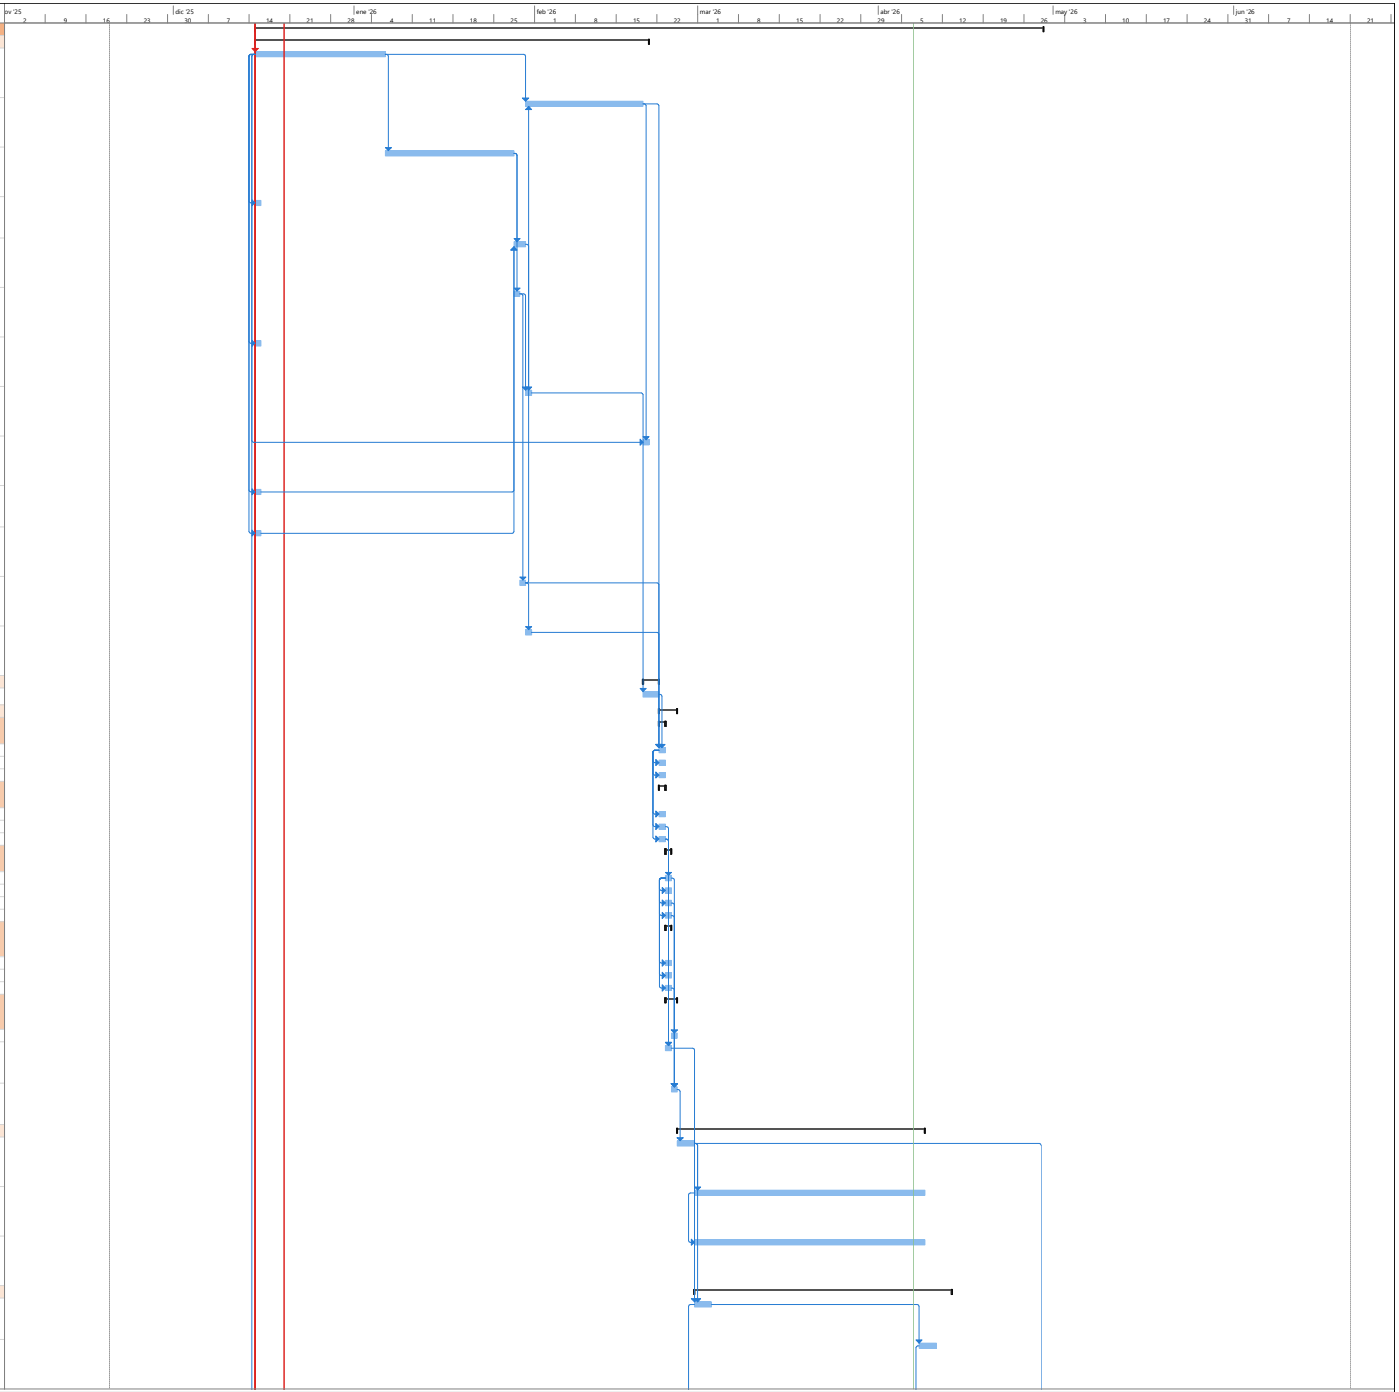


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
296		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	sáb 11/04/26	dom 12/04/26	297FC+36 días
297		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	294CC
298		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	sáb 11/04/26	lun 13/04/26	296CC
299		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**dom 12/04/26**	**jue 23/04/26**	
300		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	295CC+4 días
301		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	300CC
302		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	301
303		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/04/26**	
304		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	302FC+1 día
305		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	304
306		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	305CC
307		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	305CC
308		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	305CC
309		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	304CC
310		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	309CC
311		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
312		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
313		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	305CC
314		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	252CC;305CC
315		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	304CC
316		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	305CC
317		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	306CC
318		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**	
319		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
320		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
321		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
322		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
323		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
324		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
325		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
326		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	314CC
327		**9.0**	**VARIOS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
328		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	304CC
329		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	328CC
330			**ENTREGA DE PISO 4 - ORIENTAL**	**0 días**	**mié 29/04/26**	**mié 29/04/26**	**290;296;298;300;301**
331			**PISO 6 - ORIENTAL**	**121 días**	**lun 15/12/25**	**mié 29/04/26**	
332		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

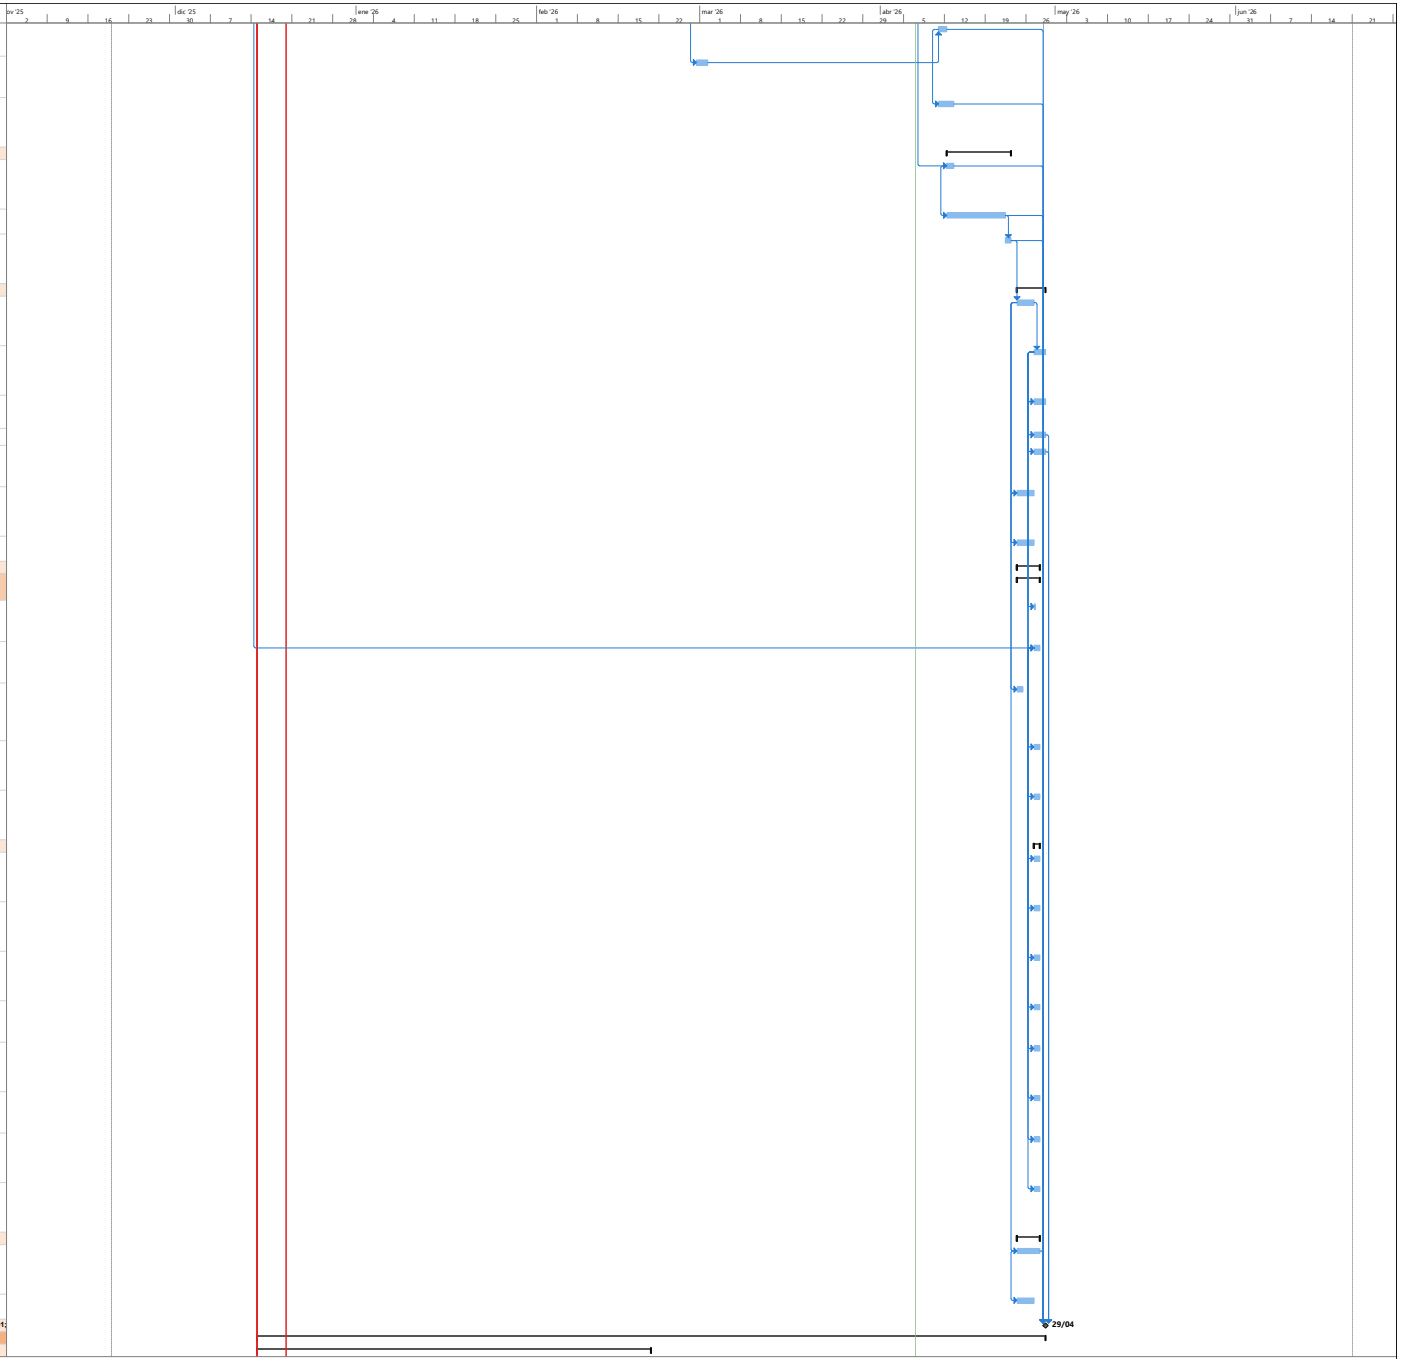

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
333		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
334		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	333;344
335		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	333
336		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	333CC
337		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	335;342;343
338		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	335
339		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	333CC
340		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	337;338
341		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	333CC;334
342		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	333CC
343		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	333CC
344		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	338
345		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	344
346		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
347		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	340FC+17 días
348		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
349		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
350		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	334;344;345;347
351		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	350CC
352		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	350CC
353		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
354		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	350CC
355		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	350CC
356		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	350CC
357		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
358		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	356
359		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
360		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
361		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
362		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
363		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
364		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
365		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	358CC
366		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
367		3.12.5	Diámetro 2"	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	365
368		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	355;356
369		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	358;360;361
370		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**38 días**	**mié 25/02/26**	**mié 8/04/26**	
371		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	369
372		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	371
373		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	35 días	sáb 28/02/26	mié 8/04/26	372CC
374		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**39 días**	**sáb 28/02/26**	**lun 13/04/26**	
375		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	368;371
376		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	375FC+32 días

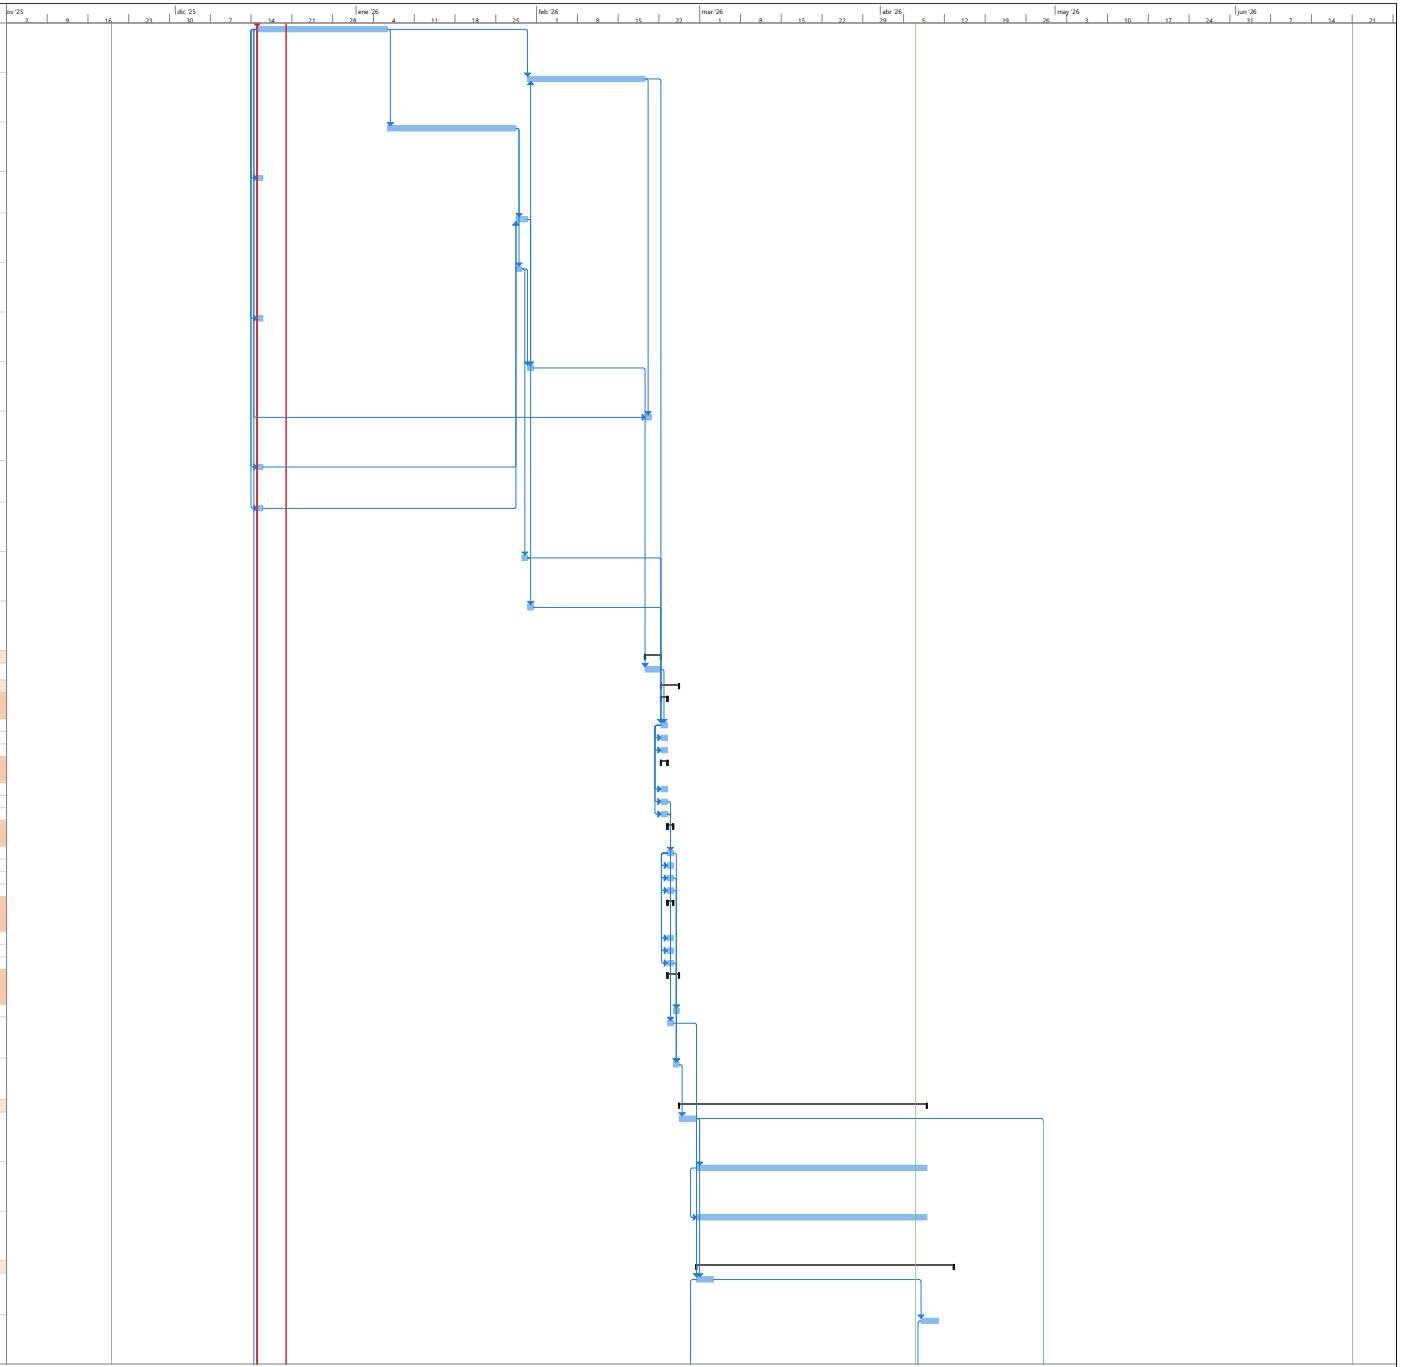

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
377		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	sáb 11/04/26	dom 12/04/26	378FC+36 días
378		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	375CC
379		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rultada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	sáb 11/04/26	lun 13/04/26	377CC
380		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**dom 12/04/26**	**jue 23/04/26**	
381		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	376CC+4 días
382		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	381CC
383		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	382
384		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/04/26**	
385		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	383FC+1 día
386		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	385
387		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	386CC
388		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	386CC
389		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26	386CC
390		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	385CC
391		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	390CC
392		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
393		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
394		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	lun 27/04/26	lun 27/04/26	386CC
395		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	333CC;386CC
396		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	385CC
397		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	386CC
398		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	387CC
399		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**lun 27/04/26**	**mar 28/04/26**	
400		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
401		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
402		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
403		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
404		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
405		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
406		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
407		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	395CC
408		**9.0**	**VARIOS**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**	
409		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	385CC
410		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	vie 24/04/26	lun 27/04/26	409CC
411			**ENTREGA DE PISO 6 - ORIENTAL**	**0 días**	**mié 29/04/26**	**mié 29/04/26**	**371;377;379;381;382;**
412			**PISO 7 - ORIENTAL**	**122 días**	**lun 15/12/25**	**jue 30/04/26**	
413		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

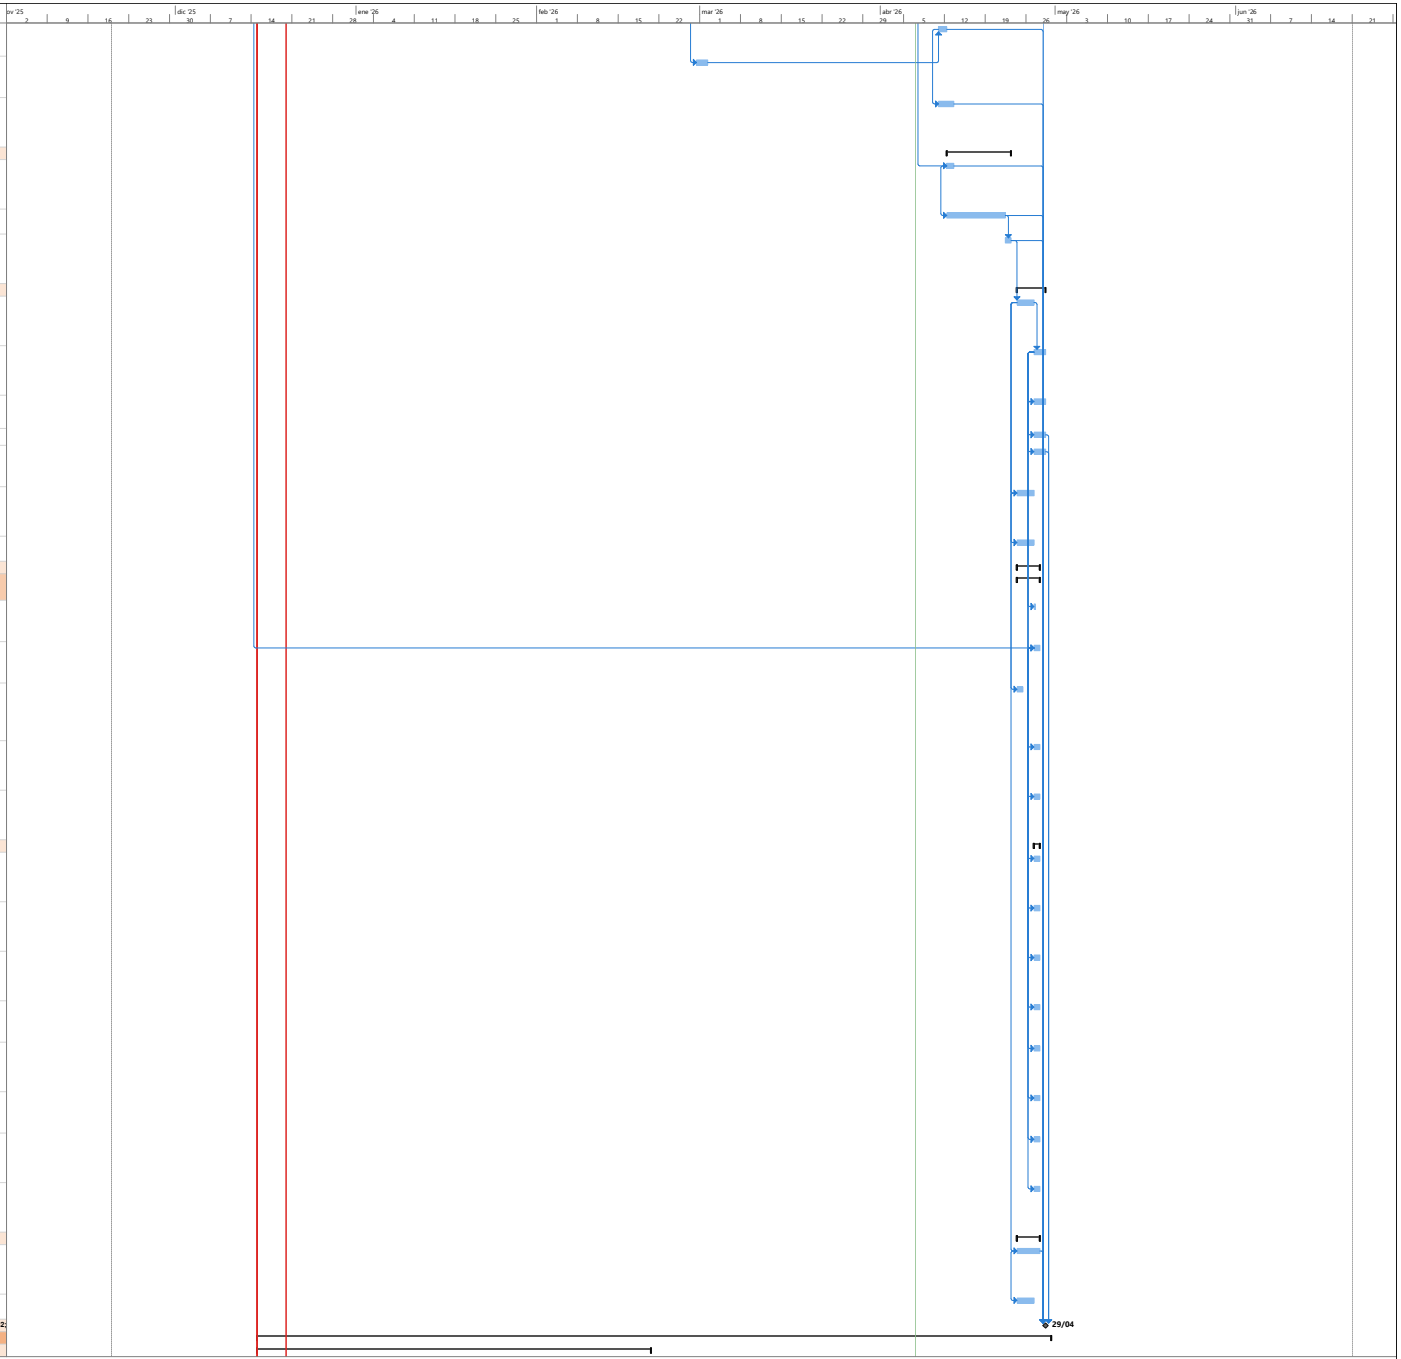

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
414		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
415		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	414;425
416		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	414
417		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	414CC
418		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	416;423;424
419		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	416
420		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	414CC
421		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	418;419
422		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	414CC;415
423		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	414CC
424		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	414CC
425		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	419
426		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	425
427		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
428		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	421FC+17 días
429		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
430		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
431		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	415;425;426;428
432		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	431CC
433		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	431CC
434		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
435		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	431CC
436		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	431CC
437		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	431CC
438		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
439		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	437
440		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
441		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
442		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
443		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
444		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
445		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
446		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	439CC
447		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
448		3.12.5	Diámetro 2"	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	446
449		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	436;437
450		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	439;441;442
451		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
452		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorzados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	450
453		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	452
454		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	453CC
455		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**jue 16/04/26**	**mié 22/04/26**	
456		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	jue 16/04/26	dom 19/04/26	449FC+46 días;452
457		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruzetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	dom 19/04/26	mié 22/04/26	456

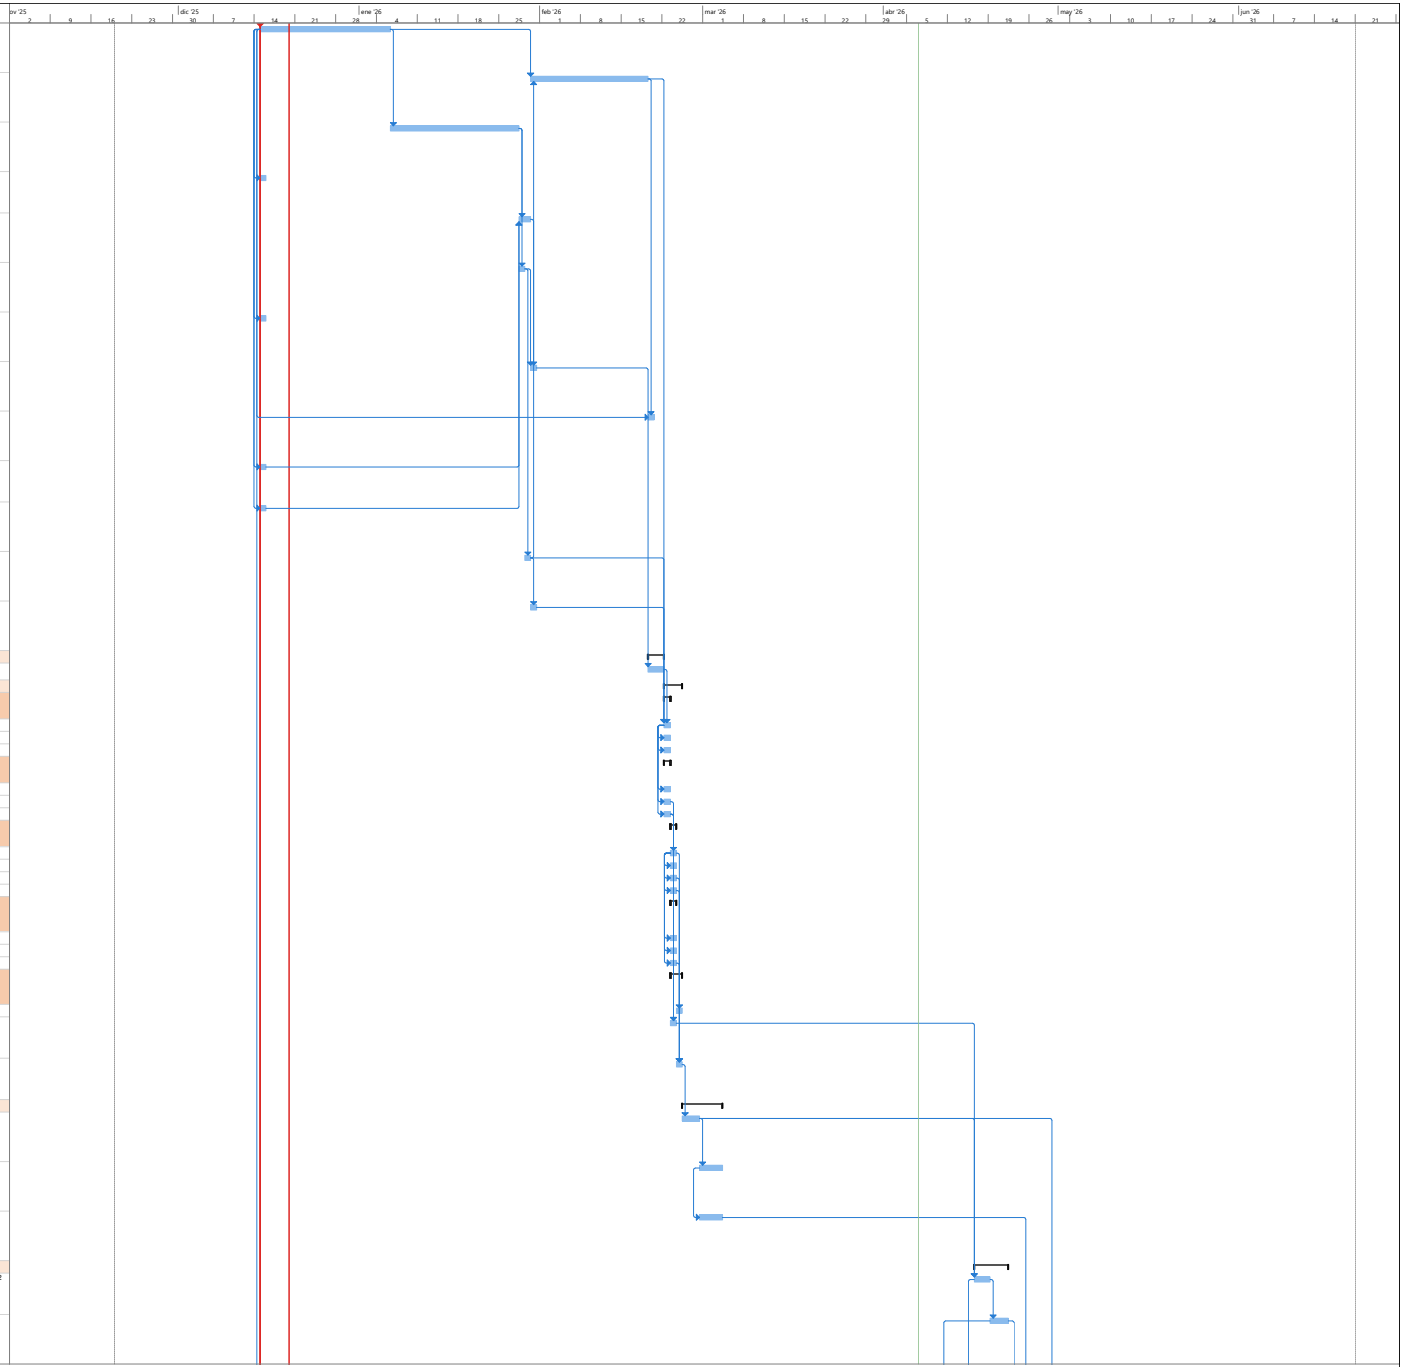

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
458		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	vie 17/04/26	dom 19/04/26	459
459		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	456CC
460		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rultada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26	459
461		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**dom 12/04/26**	**mié 22/04/26**	
462		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	457CC-6 días
463		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	462CC
464		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	462CC
465		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**jue 23/04/26**	**mar 28/04/26**	
466		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	457FC+1 día
467		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	466
468		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	467CC
469		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	467CC
470		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	467CC
471		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	454FC+47 días
472		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	471CC
473		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**jue 23/04/26**	**lun 27/04/26**	
474		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**jue 23/04/26**	**lun 27/04/26**	
475		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	sáb 25/04/26	dom 26/04/26	467CC
476		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	414CC;467CC
477		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	466CC
478		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	467CC
479		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	468CC
480		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**sáb 25/04/26**	**lun 27/04/26**	
481		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
482		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
483		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
484		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
485		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapajuices, pasador recibidor, chapetas	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
486		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y flaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
487		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
488		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	476CC
489		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**	
490		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	466CC
491		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	490CC
492			**ENTREGA DE PISO 7 - ORIENTAL**	**0 días**	**jue 30/04/26**	**jue 30/04/26**	**452;458;460;462;463;**
493			**PISO 8 - ORIENTAL**	**122 días**	**lun 15/12/25**	**jue 30/04/26**	
494		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

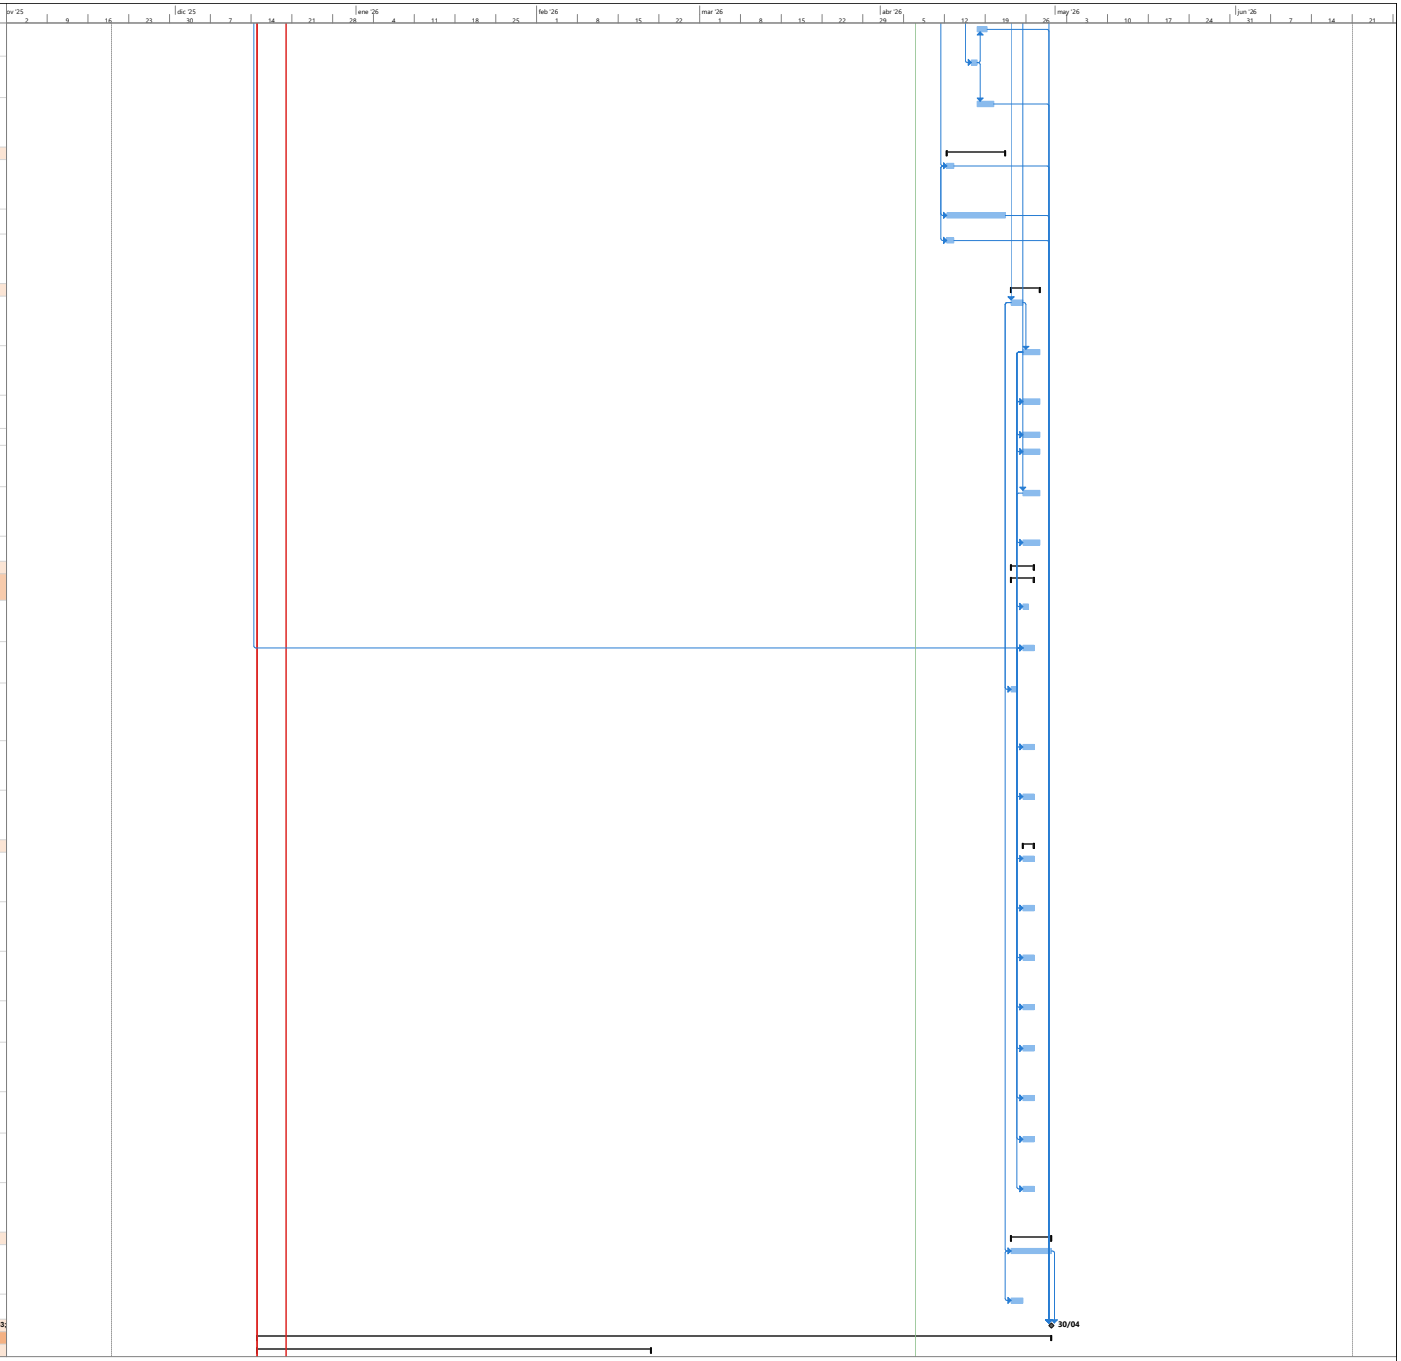


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
495		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
496		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	495;506
497		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	495
498		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	495CC
499		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	497;504;505
500		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	497
501		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	495CC
502		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	499;500
503		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	495CC;496
504		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	495CC
505		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	495CC
506		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	500
507		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	506
508		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
509		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	502FC+17 días
510		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
511		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
512		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	496;506;507;509
513		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	512CC
514		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	512CC
515		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
516		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	512CC
517		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	512CC
518		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	512CC
519		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
520		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	518
521		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
522		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
523		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
524		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
525		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
526		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
527		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	520CC
528		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
529		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	527
530		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	517;518
531		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	520;522;523
532		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
533		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	531
534		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	533
535		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	534CC
536		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**jue 16/04/26**	**mié 22/04/26**	
537		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	jue 16/04/26	dom 19/04/26	530FC+46 días;533
538		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	dom 19/04/26	mié 22/04/26	537

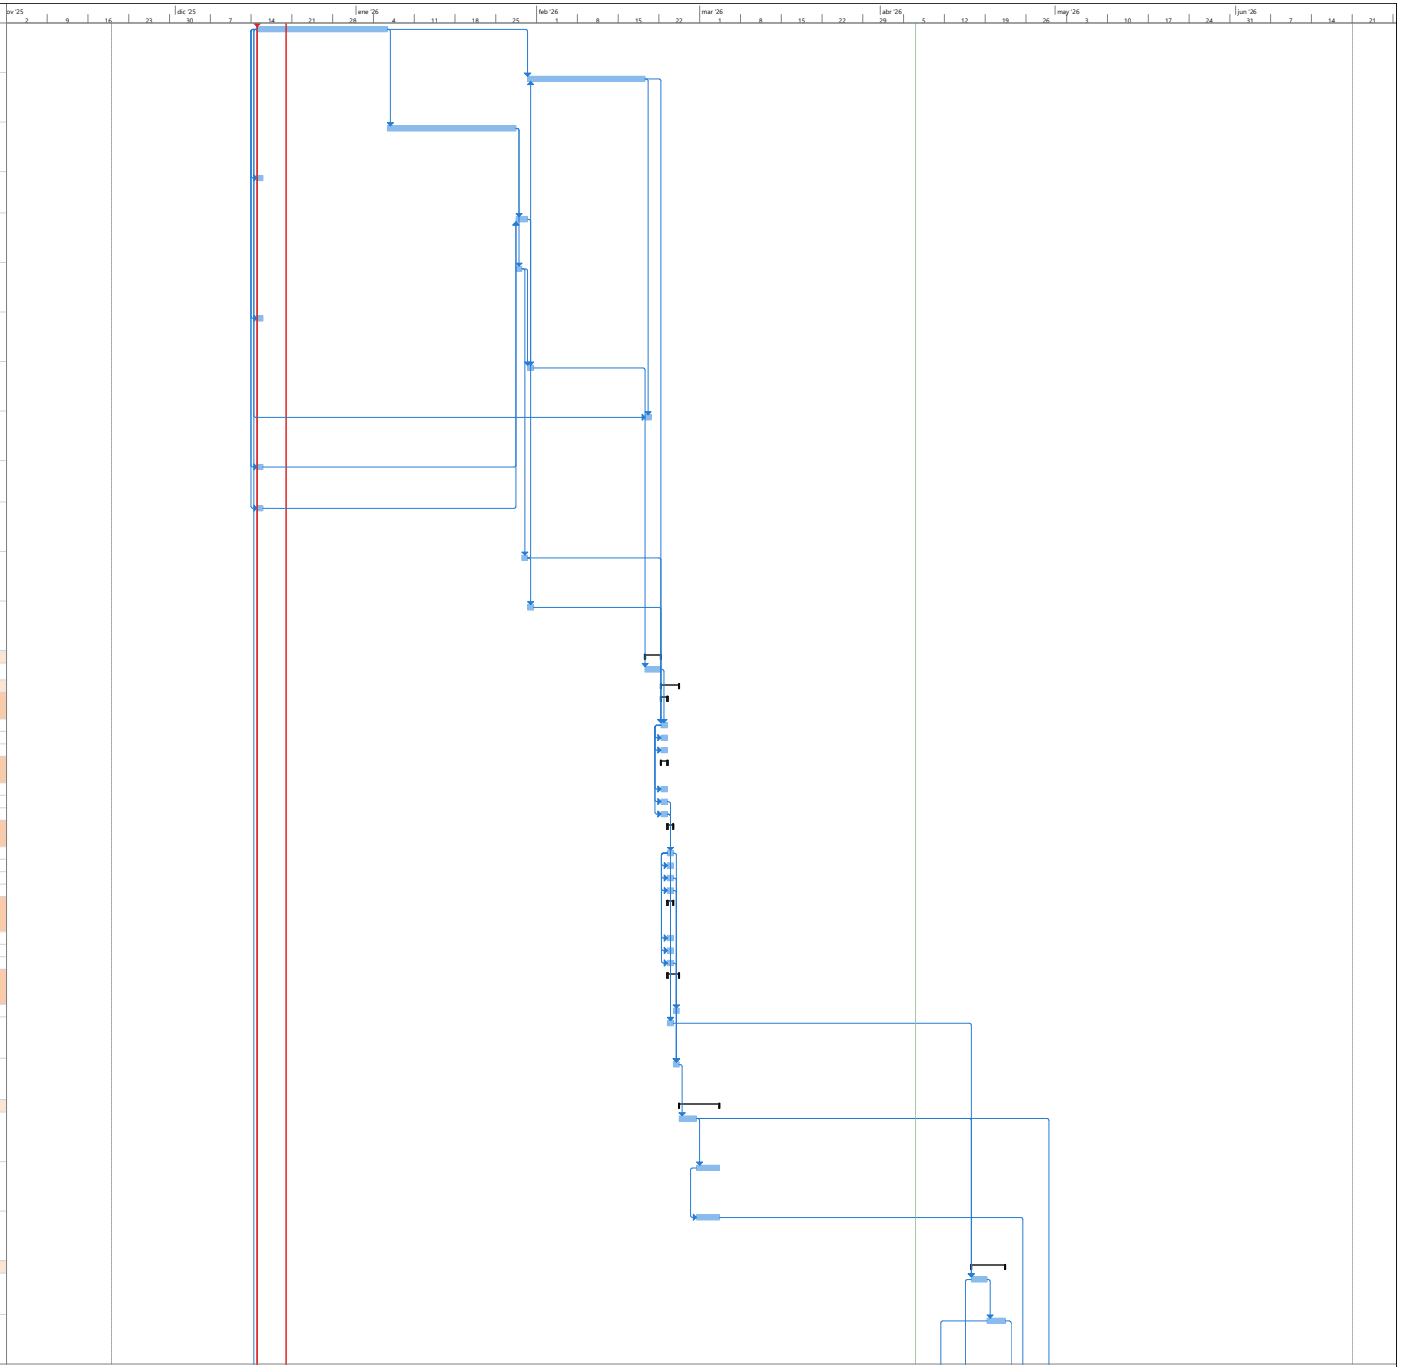


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
539		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	vie 17/04/26	dom 19/04/26	540
540		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	537CC
541		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rultada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	vie 17/04/26	lun 20/04/26	540
542		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**dom 12/04/26**	**mié 22/04/26**	
543		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	538CC-6 días
544		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26	543CC
545		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	dom 12/04/26	lun 13/04/26	543CC
546		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días**	**jue 23/04/26**	**mar 28/04/26**	
547		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	538FC+1 día
548		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	547
549		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	548CC
550		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	548CC
551		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	548CC
552		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	535FC+47 días
553		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	552CC
554		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**jue 23/04/26**	**lun 27/04/26**	
555		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**jue 23/04/26**	**lun 27/04/26**	
556		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	sáb 25/04/26	dom 26/04/26	548CC
557		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	495CC;548CC
558		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	547CC
559		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	548CC
560		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	549CC
561		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**sáb 25/04/26**	**lun 27/04/26**	
562		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
563		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,150;0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
564		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
565		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
566		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
567		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
568		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
569		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	557CC
570		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**	
571		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	547CC
572		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	571CC
573			**ENTREGA DE PISO 8 - ORIENTAL**	**0 días**	**jue 30/04/26**	**jue 30/04/26**	**533;539;541;543;544**
574			**PISO 9 - ORIENTAL**	**120 días**	**lun 15/12/25**	**mar 28/04/26**	
575		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

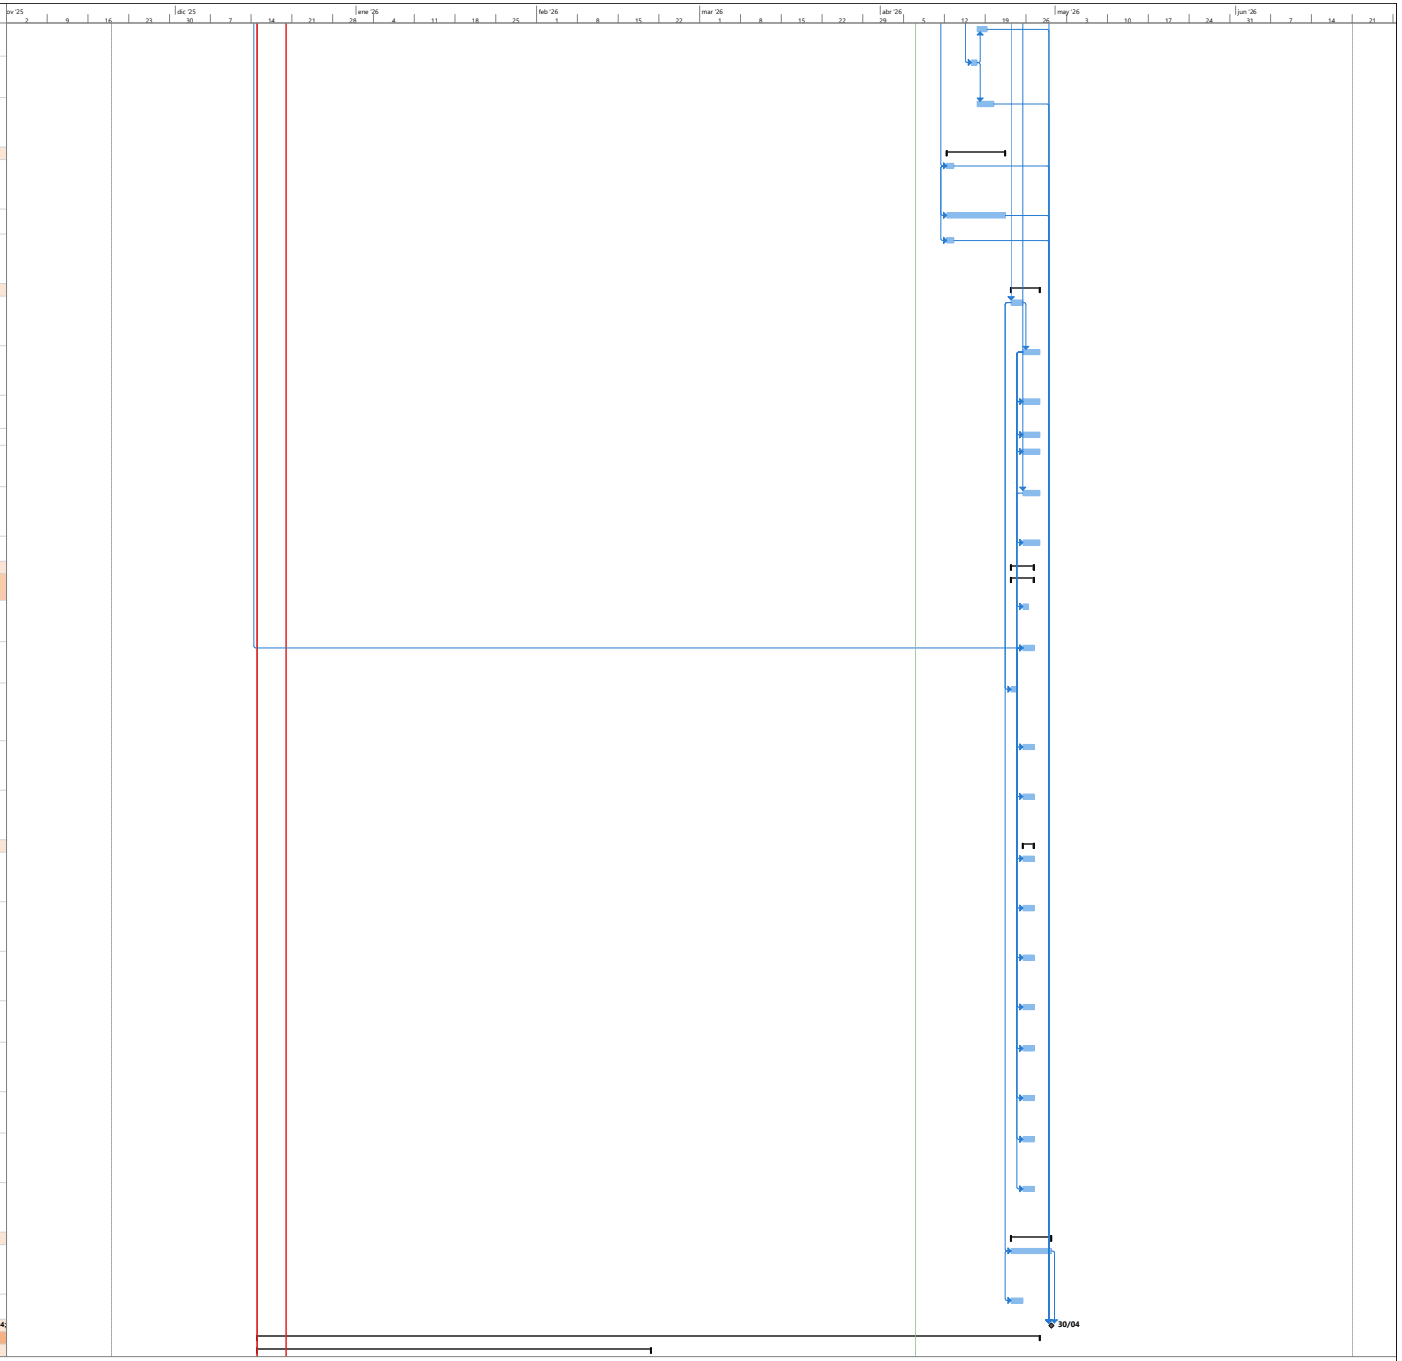

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
576		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
577		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	576;587
578		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	576
579		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	576CC
580		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	578;585;586
581		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	578
582		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	576CC
583		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	580;581
584		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	576CC;577
585		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	576CC
586		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	576CC
587		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	581
588		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	587
589		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
590		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	583FC+17 días
591		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
592		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
593		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	577;587;588;590
594		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	593CC
595		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	593CC
596		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
597		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	593CC
598		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	593CC
599		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	593CC
600		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
601		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	599
602		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
603		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
604		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
605		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
606		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
607		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
608		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	601CC
609		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
610		3.12.5	Diámetro 2"	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	608
611		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	598;599
612		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	601;603;604
613		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
614		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	612
615		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	614
616		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	615CC
617		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**sáb 28/02/26**	**vie 6/03/26**	
618		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	611;614
619		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Construlir de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	618

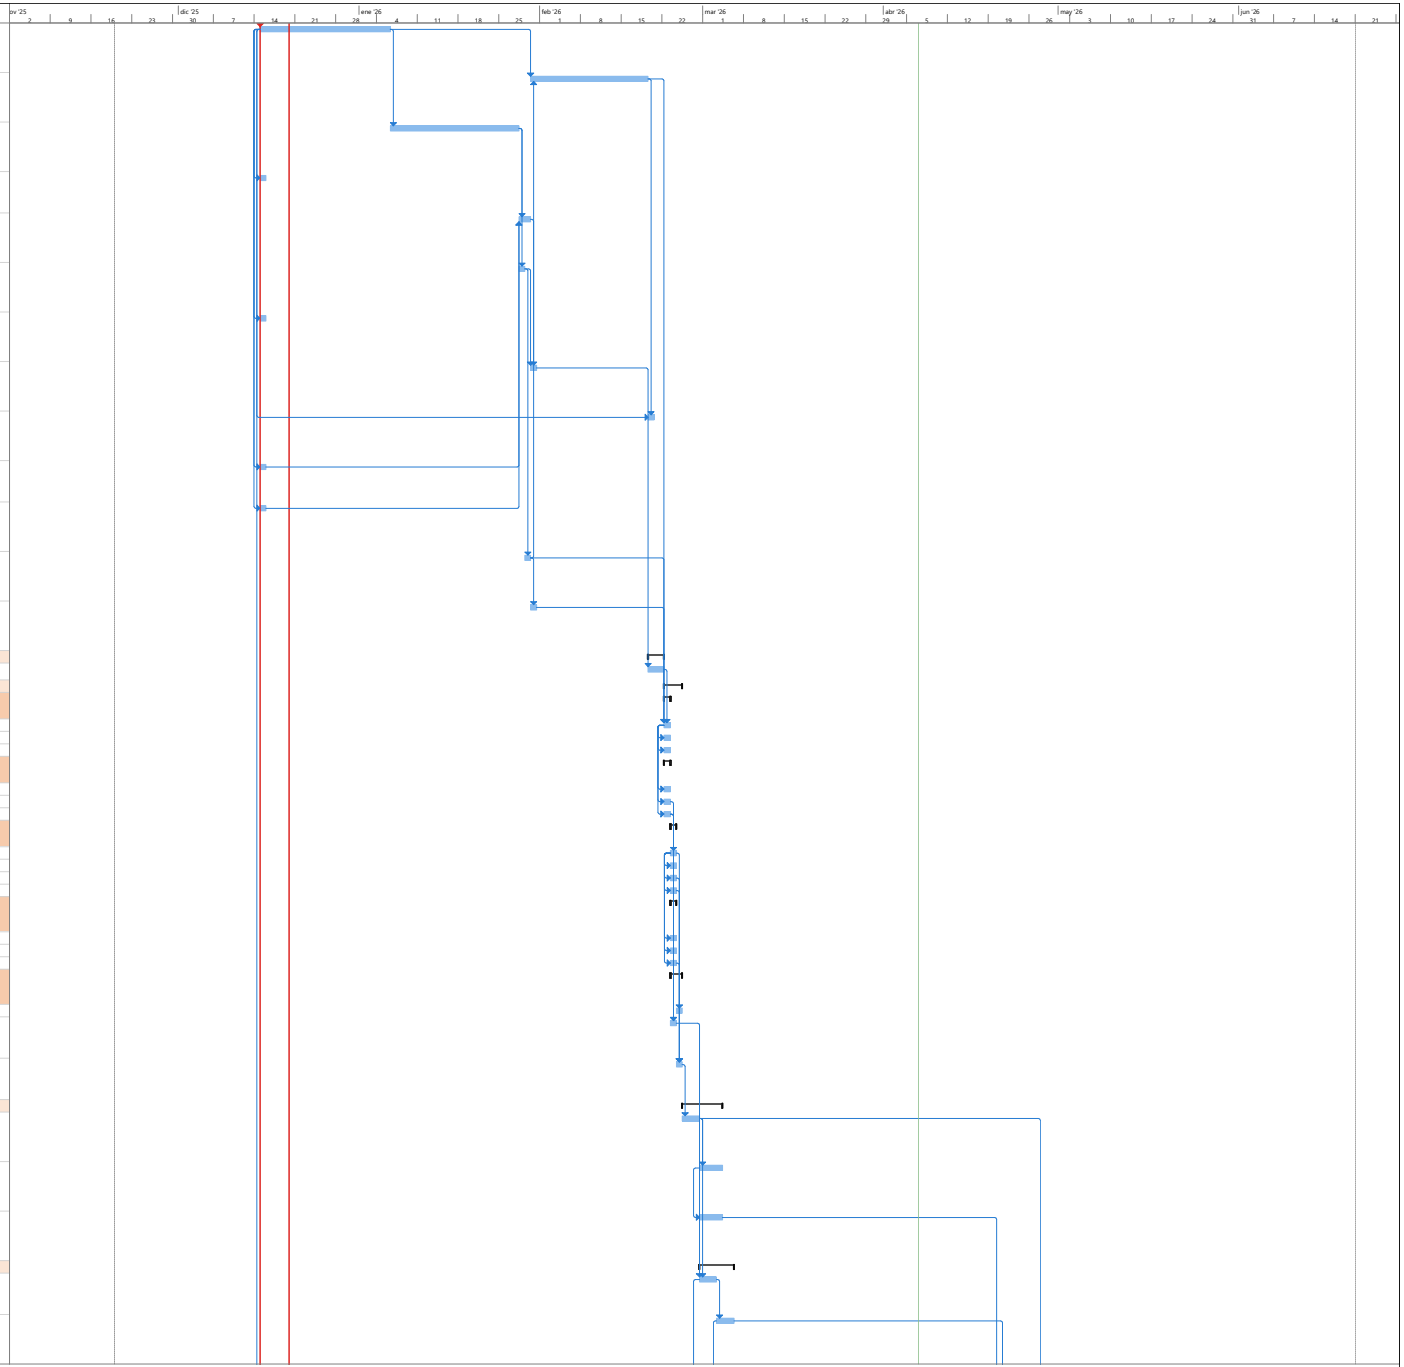

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
620		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	621
621		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	618CC
622		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	621
623		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**lun 20/04/26**	
624		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	619CC+34 días
625		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26	624CC
626		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	624CC
627		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**5 días**	**lun 20/04/26**	**sáb 25/04/26**	
628		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	619FC+41 días
629		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	628
630		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	629CC
631		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	629CC
632		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	629CC
633		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	616FC+42 días
634		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	633CC
635		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
636		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
637		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	jue 23/04/26	jue 23/04/26	629CC
638		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	576CC;629CC
639		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	628CC
640		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	629CC
641		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	630CC
642		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**	
643		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
644		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
645		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
646		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
647		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
648		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
649		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
650		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	638CC
651		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**mar 21/04/26**	**mar 28/04/26**	
652		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26	628CC
653		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	652CC
654			**ENTREGA DE PISO 9 - ORIENTAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**614;620;622;624;625;**
655			**PISO 10 - ORIENTAL**	**120 días**	**lun 15/12/25**	**mar 28/04/26**	
656		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

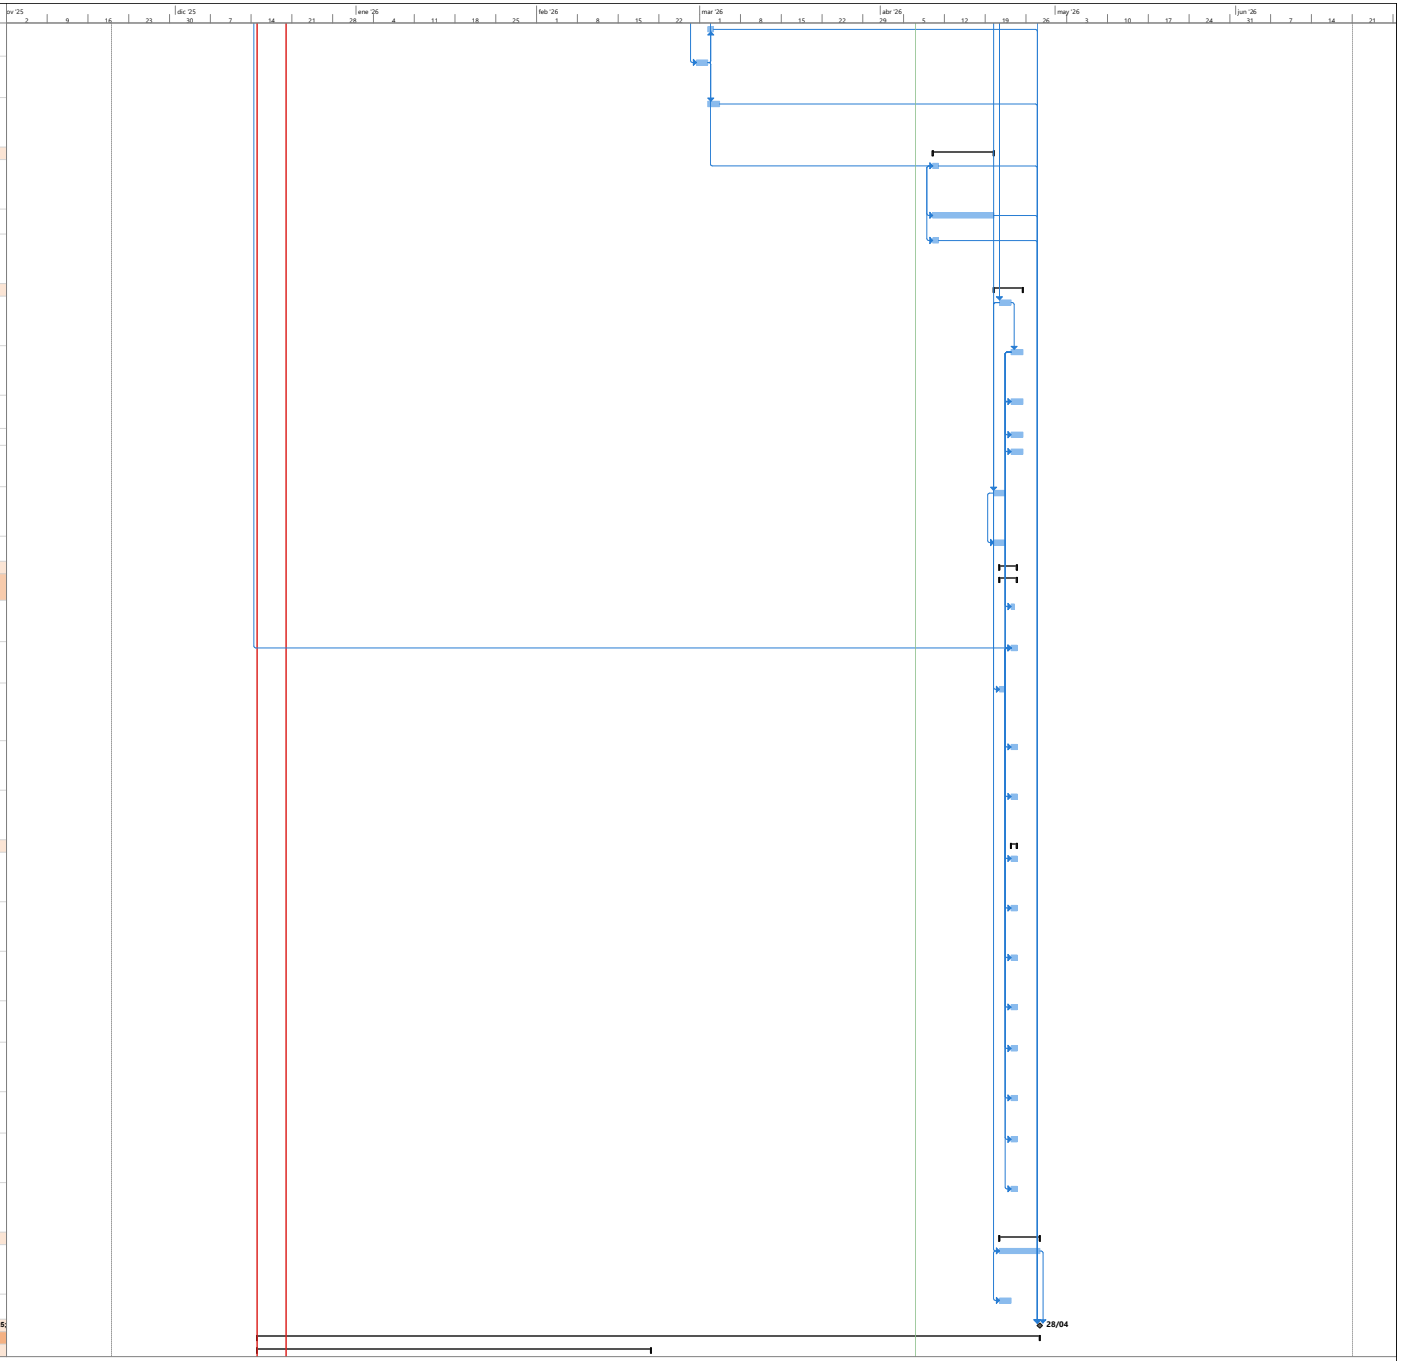

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
657		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
658		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	657;668
659		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	657
660		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	657CC
661		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	659;666;667
662		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	659
663		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	657CC
664		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	661;662
665		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	657CC;658
666		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	657CC
667		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	657CC
668		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	662
669		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	668
670		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
671		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	664FC+17 días
672		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
673		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
674		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	658;668;669;671
675		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	674CC
676		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	674CC
677		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
678		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	674CC
679		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	674CC
680		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	674CC
681		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
682		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	680
683		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
684		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
685		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
686		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
687		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
688		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
689		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	682CC
690		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
691		3.12.5	Diámetro 2"	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	689
692		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	679;680
693		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	682;684;685
694		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
695		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	693
696		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	695
697		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	696CC
698		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**sáb 28/02/26**	**vie 6/03/26**	
699		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	692;695
700		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	699

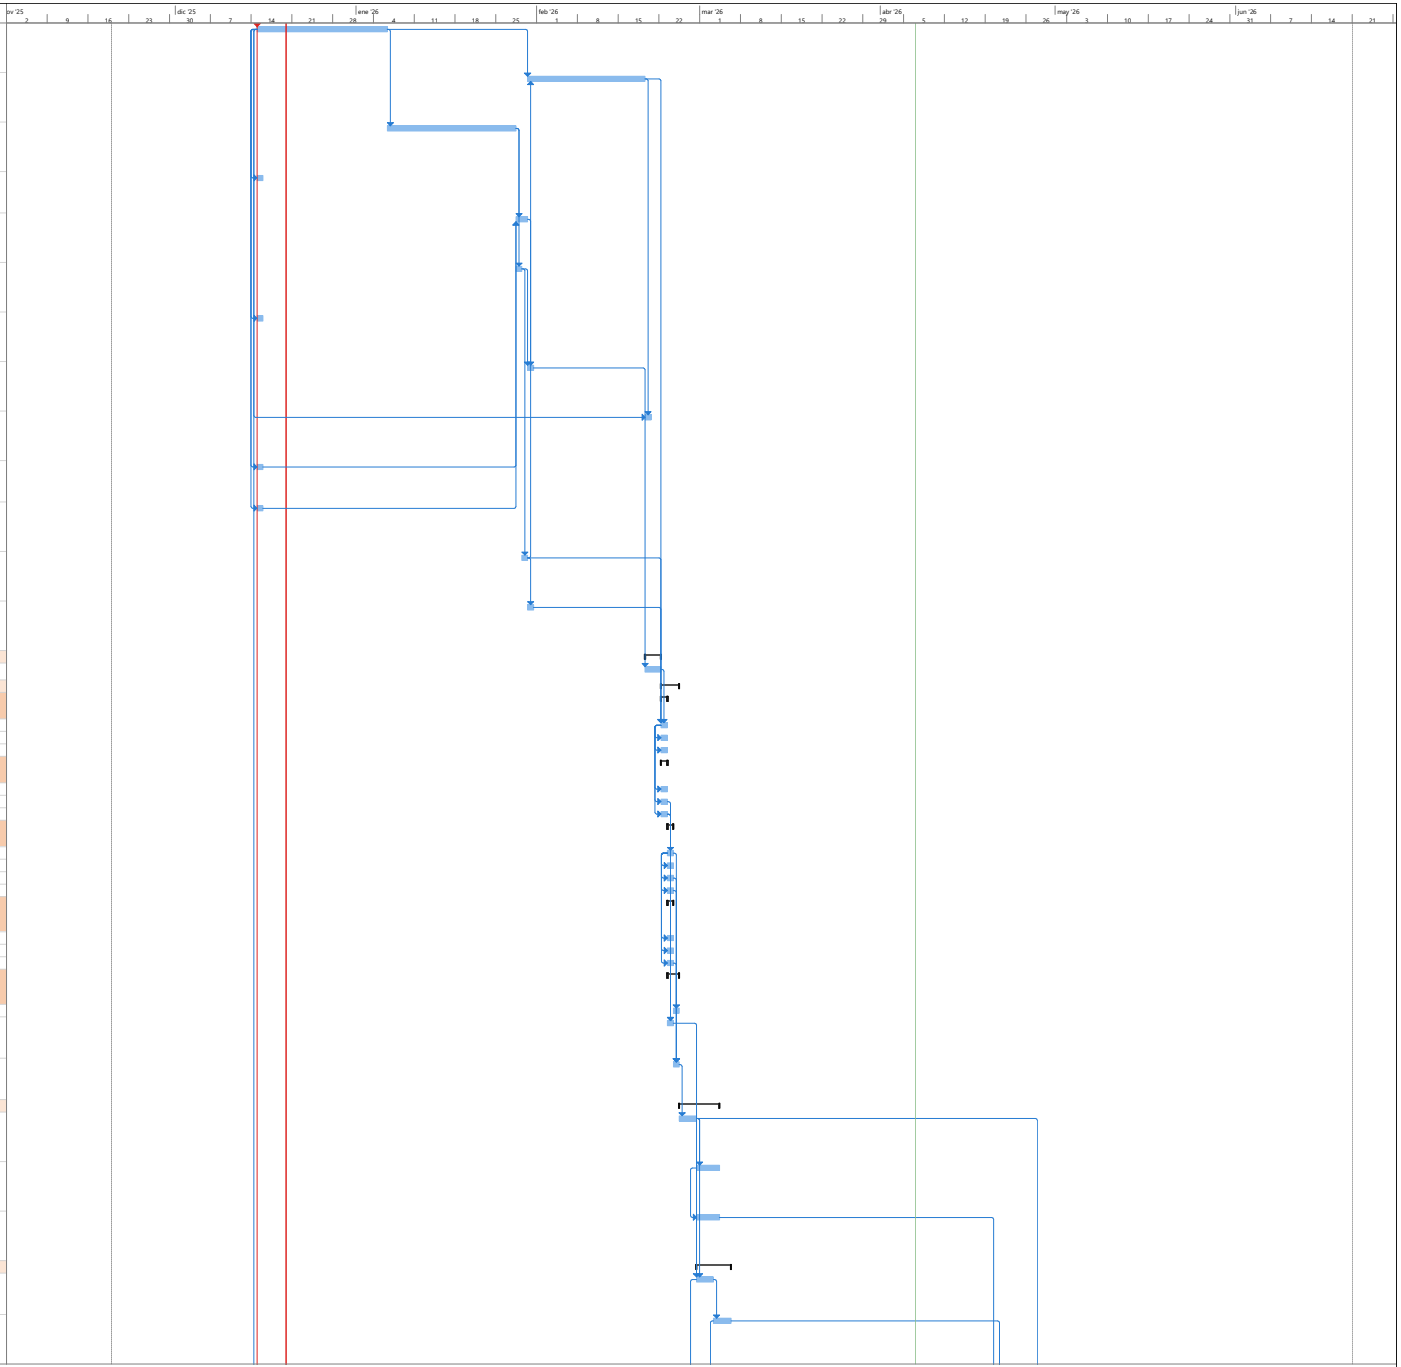

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
701		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	702
702		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sab 28/02/26	lun 2/03/26	699CC
703		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	702
704		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**lun 20/04/26**	
705		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	700CC+34 días
706		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26	705CC
707		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	705CC
708		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**5 días**	**lun 20/04/26**	**sáb 25/04/26**	
709		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	700FC+41 días
710		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	709
711		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	710CC
712		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	710CC
713		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	710CC
714		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	697FC+42 días
715		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	714CC
716		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
717		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
718		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	jue 23/04/26	jue 23/04/26	710CC
719		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	657CC;710CC
720		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	709CC
721		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	710CC
722		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	711CC
723		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**	
724		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
725		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
726		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
727		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
728		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
729		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y fijaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
730		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
731		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	719CC
732		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**mar 21/04/26**	**mar 28/04/26**	
733		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26	709CC
734		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	733CC
735			**ENTREGA DE PISO 10 - ORIENTAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**695;701;703;705;706;**
736			**PISO 11 - ORIENTAL**	**120 días**	**lun 15/12/25**	**mar 28/04/26**	
737		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**61 días**	**lun 15/12/25**	**vie 20/02/26**	

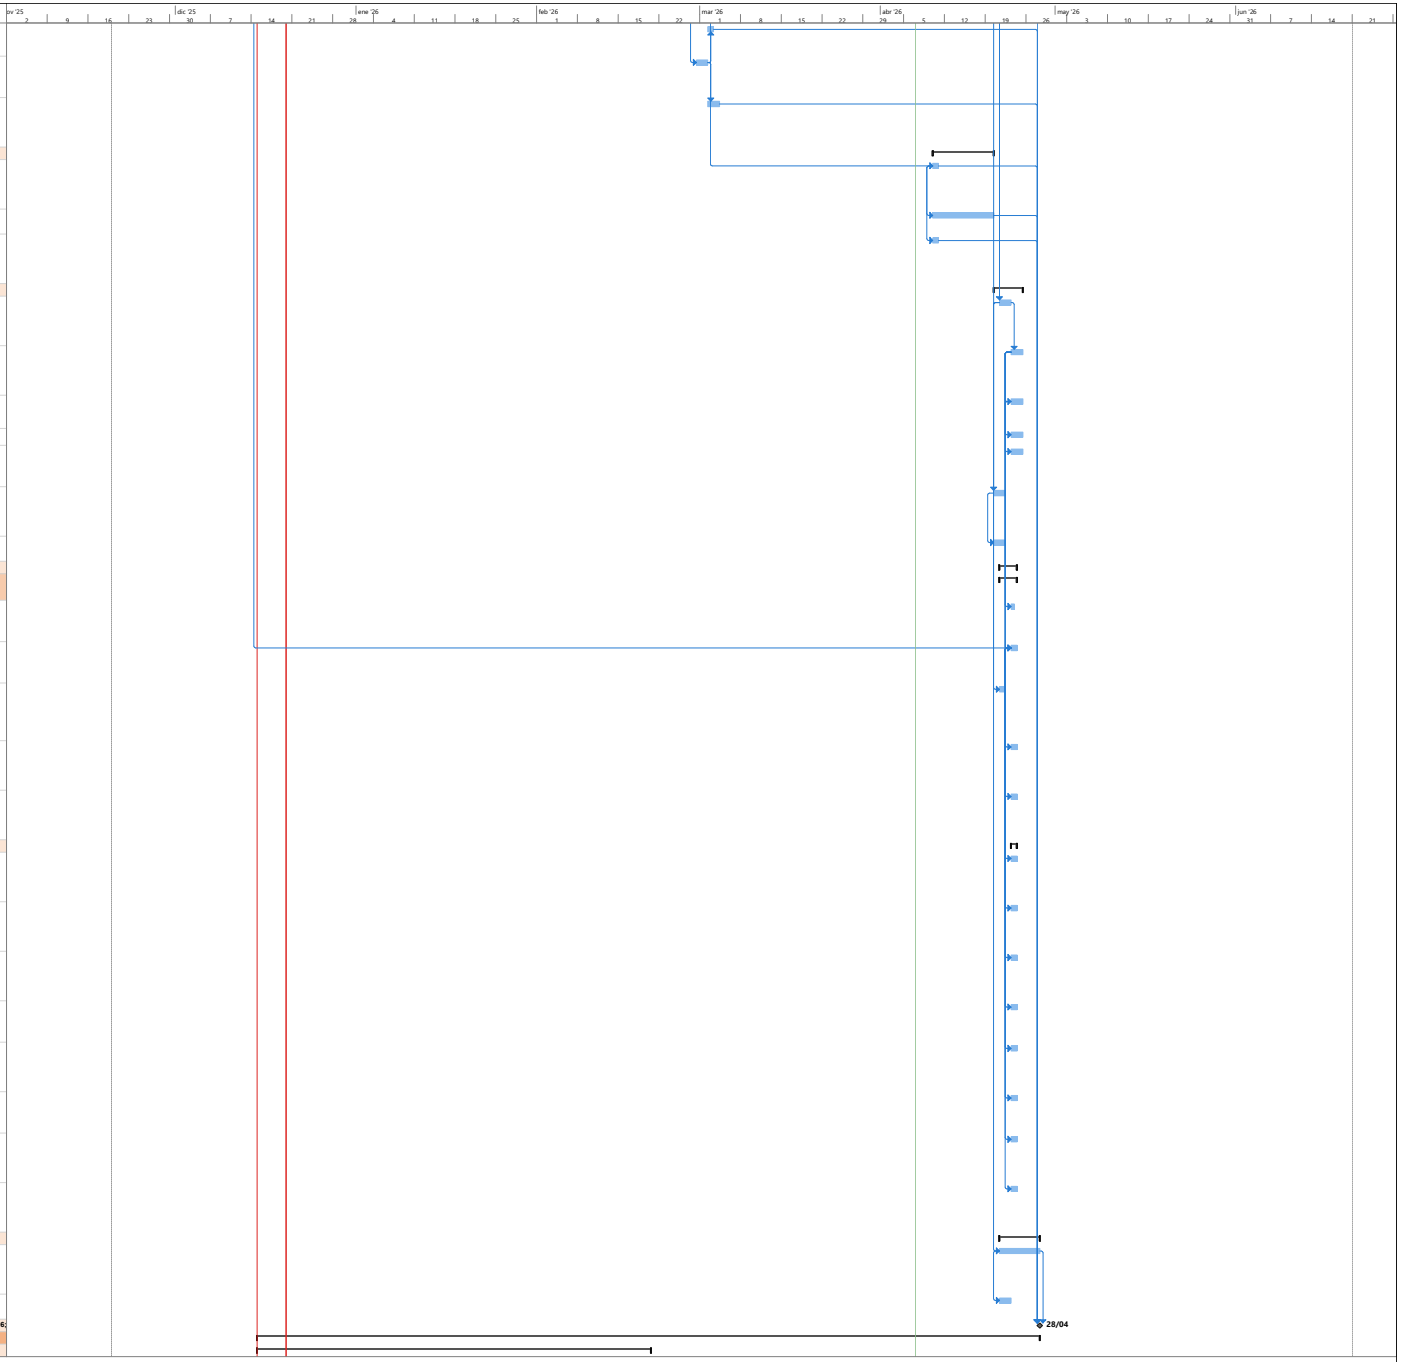


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
738		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	20 días	lun 15/12/25	mar 6/01/26	3
739		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	18 días	vie 30/01/26	jue 19/02/26	738;749
740		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	20 días	mar 6/01/26	mié 28/01/26	738
741		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	738CC
742		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 28/01/26	vie 30/01/26	740;747;748
743		1,6	Retiro de cielo raso en cualquier material. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	mié 28/01/26	jue 29/01/26	740
744		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	738CC
745		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	742;743
746		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	jue 19/02/26	vie 20/02/26	738CC;739
747		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	738CC
748		1,12	Retiro de ventanería existente. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	738CC
749		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 29/01/26	vie 30/01/26	743
750		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 30/01/26	sáb 31/01/26	749
751		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**2 días**	**jue 19/02/26**	**dom 22/02/26**	
752		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26	745FC+17 días
753		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**dom 22/02/26**	**mié 25/02/26**	
754		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
755		3.1.1	Diámetro 2".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	739;749;750;752
756		3.1.2	Diámetro 3".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	755CC
757		3.1.3	Diámetro 4".	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	755CC
758		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**1 día**	**dom 22/02/26**	**lun 23/02/26**	
759		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	755CC
760		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	755CC
761		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	dom 22/02/26	lun 23/02/26	755CC
762		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
763		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	761
764		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
765		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
766		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
767		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 23/02/26**	**mar 24/02/26**	
768		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
769		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
770		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	763CC
771		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
772		3.12.5	Diámetro 2"	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	770
773		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 23/02/26	mar 24/02/26	760;761
774		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	763;765;766
775		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	
776		2.1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados,	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	774
777		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	776
778		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	3 días	sáb 28/02/26	mié 4/03/26	777CC
779		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**5 días**	**sáb 28/02/26**	**vie 6/03/26**	
780		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	2 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	773;776
781		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruzetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	780

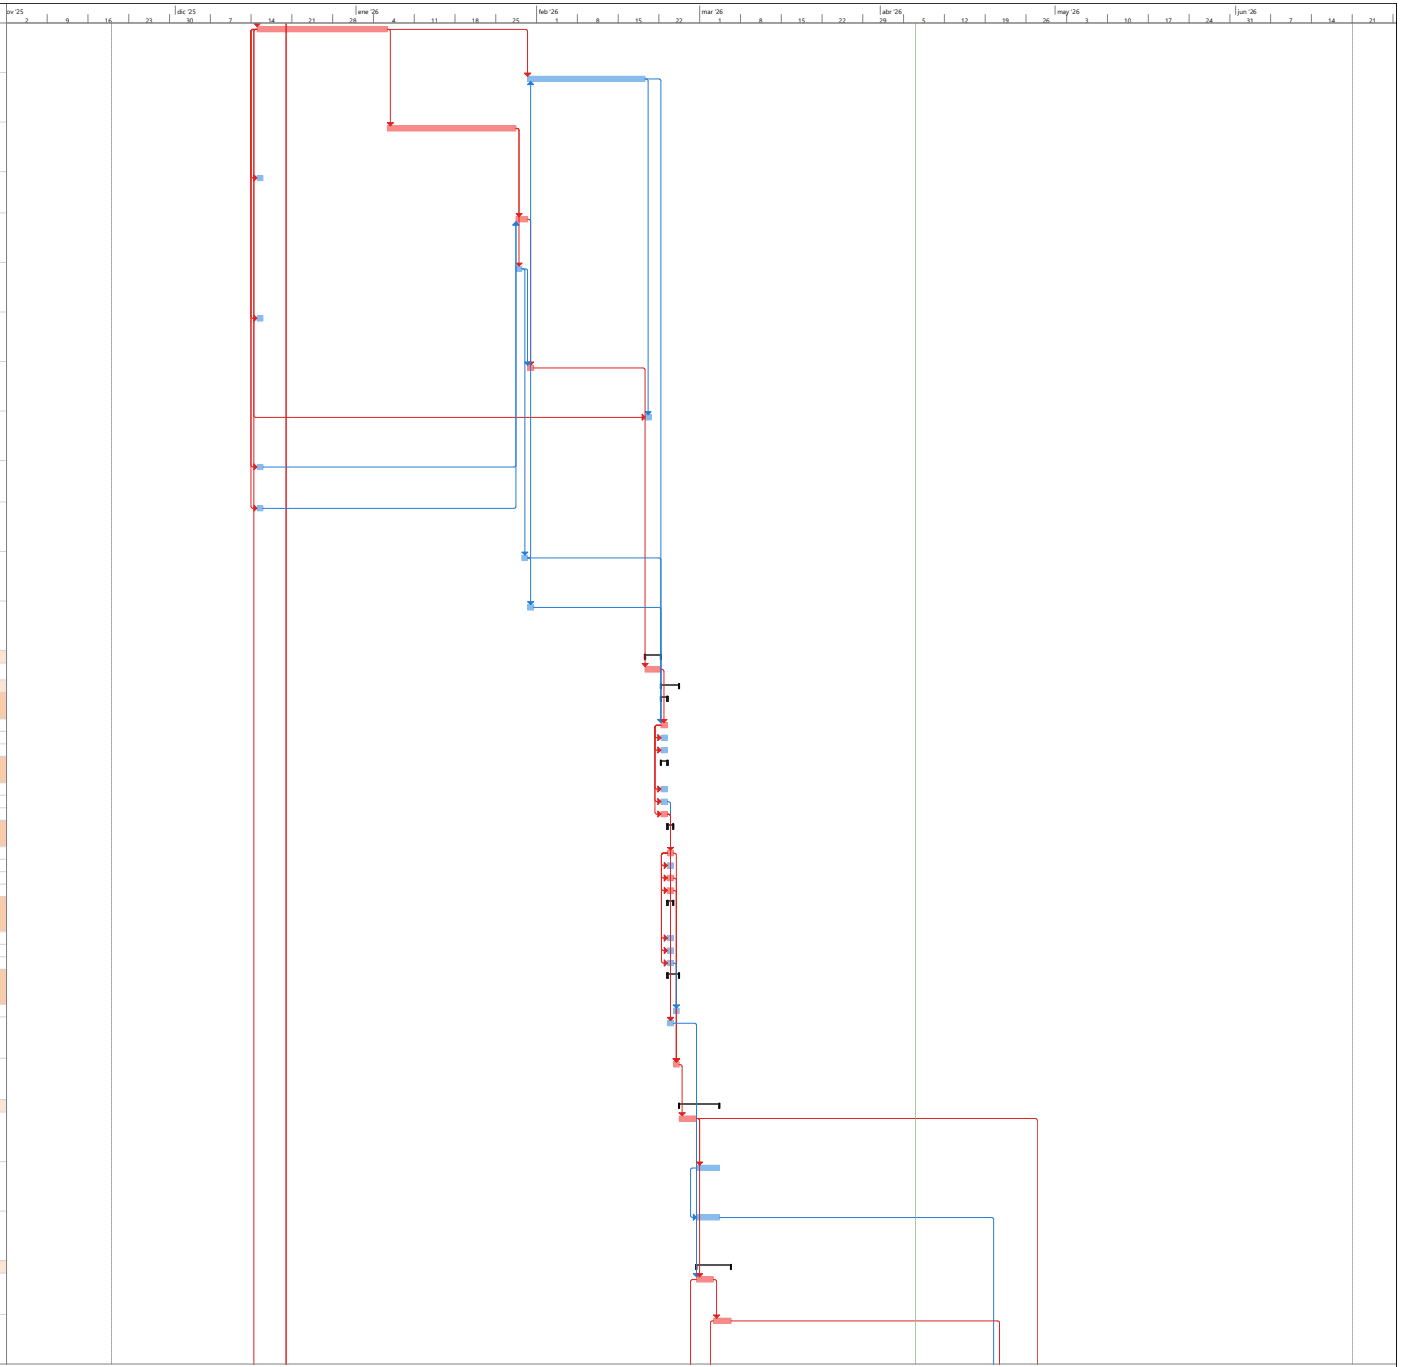

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
782		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	783
783		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	780CC
784		6,8	Suministro y aplicación de pintura para baños y cocinas tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir, aprobado por la interventoría. En	2 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26	783
785		**5.0**	**PISOS**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**lun 20/04/26**	
786		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	781CC+34 días
787		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26	786CC
788		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	786CC
789		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**5 días**	**lun 20/04/26**	**sáb 25/04/26**	
790		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	781FC+41 días
791		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	790
792		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	791CC
793		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	791CC
794		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	791CC
795		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	778FC+42 días
796		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	795CC
797		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
798		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/04/26**	
799		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	jue 23/04/26	jue 23/04/26	791CC
800		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	738CC,791CC
801		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	790CC
802		3.5	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma según interventoría, silicona y todos los elementos n	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	791CC
803		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	792CC
804		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**1 día**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**	
805		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
806		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
807		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
808		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
809		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
810		8.7	Suministro, transporte y colocación de puertas corredizas BAÑOS PMR (marco en Roble), ala entamborada en Madecor RH, con haladera, incluye rieles, rodamiento, herrajes y flaciones P-2 0.80/1.00 x 2.10 m. e = 15 cm.	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
811		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
812		8.13	Suministro, transporte e instalación de celosía en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijac	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	800CC
813		**9.0**	**VARIOS**	**6 días**	**mar 21/04/26**	**mar 28/04/26**	
814		9,1	Suministro e instalación de revestimiento tipo WPC (Wood Plastic Composite) para fachada interior, compuesto por perfiles extrusionados en mezcla de fibras de madera natural y polímeros reciclados. Instalado sobre estructura soporte metálica o de madera s	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26	790CC
815		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	814CC
816			**ENTREGA DE PISO 11 - ORIENTAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**776;782;784;786;787;**
817			**PISO 1 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
818		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	

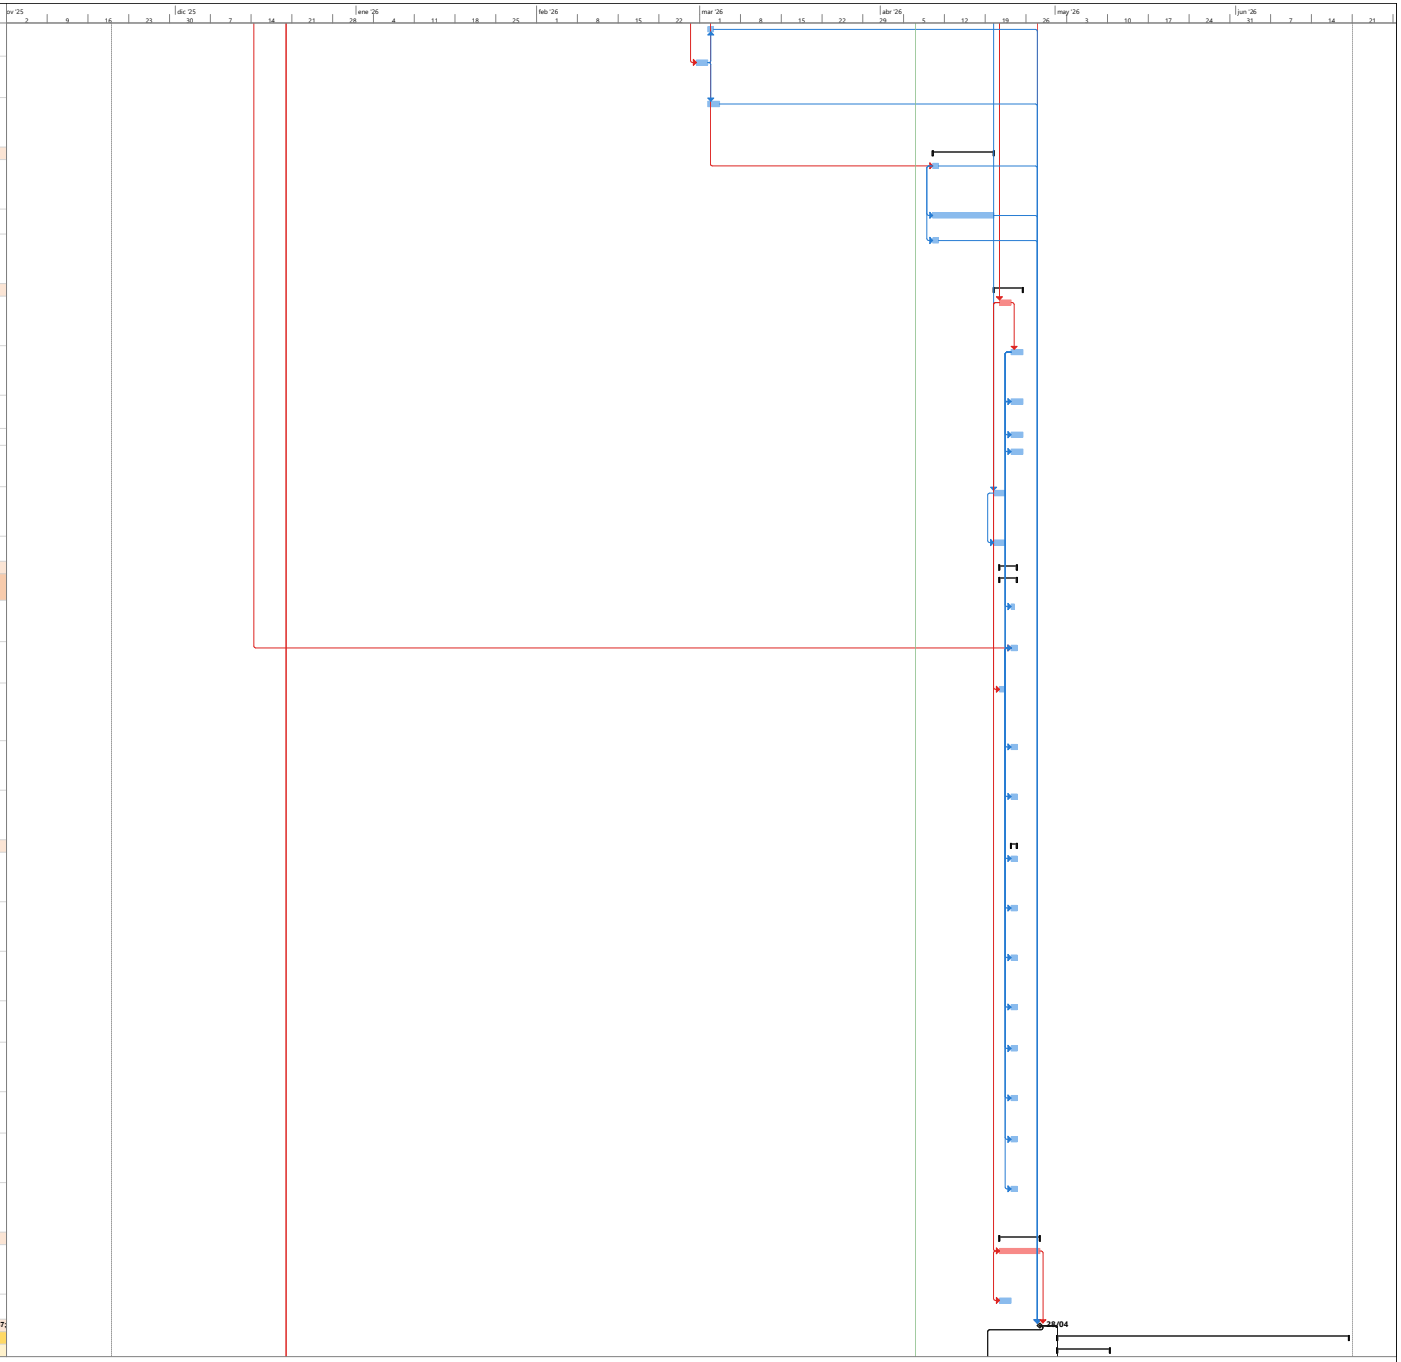

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
819		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
820		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	819;829
821		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	819
822		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	819CC
823		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	821;828
824		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tablaje y/o jua el mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	819CC
825		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	823
826		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	824CC
827		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	819CC;820
828		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	819CC
829		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	825
830		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	829
831		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
832		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	823,825
833		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
834		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
835		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	820,829,830,832
836		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	835CC
837		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	835CC
838		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
839		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	835CC
840		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	835CC
841		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	835CC
842		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
843		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	841
844		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
845		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
846		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
847		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
848		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
849		3.11.2	Ø = ½"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
850		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	843CC
851		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
852		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	850
853		3.13	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	840,841
854		3.14	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	843,845,846
855		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
856		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqu	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	854FC+5 días
857		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	856
858		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
859		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye rampas, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	853,856
860		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruces plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	859
861		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir; (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	864
862		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	864
863		6,6	Suministro y aplicacion de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir: (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	864



Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
864		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, fileles y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	856
865		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
866		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	860CC+2 días
867		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	866
868		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	866
869		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
870		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4.8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	860
871		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	870
872		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	871CC
873		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	871CC
874		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona anthongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	871CC
875		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	857
876		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	875CC
877		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
878		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
879		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	871CC
880		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	819CC;871CC
881		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	870CC
882		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	872CC
883		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
884		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
885		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
886		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
887		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
888		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
889		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	880CC
890		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
891		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	884CC
892		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
893		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	889
894			**ENTREGA DE PISO 1 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**856;863;864;866;867**
895			**PISO 2 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
896		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
897		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
898		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	897;907
899		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	897
900		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	897CC
901		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	899;906

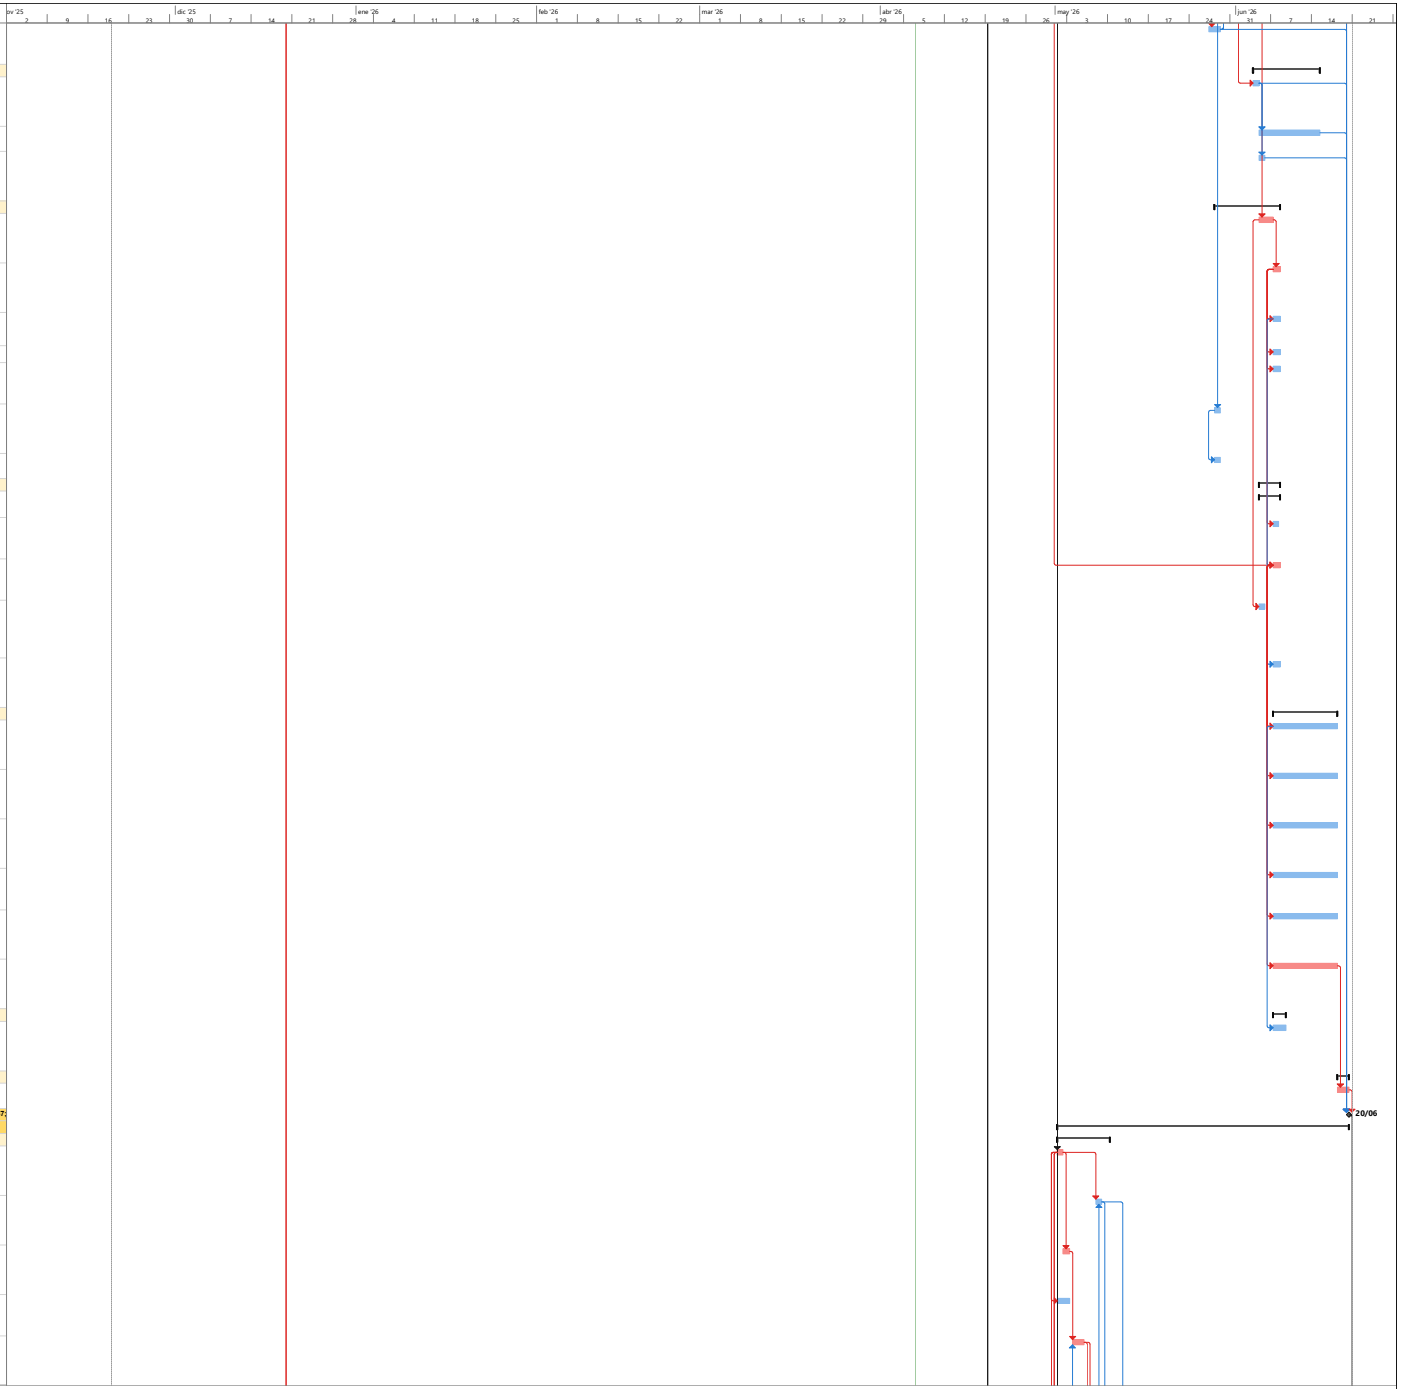

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
902		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	897CC
903		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	901
904		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	902CC
905		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	897CC;898
906		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	897CC
907		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	903
908		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclu	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	907
909		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
910		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	901;903
911		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
912		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
913		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	898;907;908;910
914		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	913CC
915		3.1.3	Diámetro 4"	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	913CC
916		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
917		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	913CC
918		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	913CC
919		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	913CC
920		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
921		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	919
922		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
923		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
924		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
925		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
926		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
927		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
928		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	921CC
929		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
930		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	928
931		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3". 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	918;919
932		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	921;923;924
933		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
934		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	932FC+5 días
935		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	934
936		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
937		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	931;934
938		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	937
939		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	942
940		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminale, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	942
941		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	942
942		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	934
943		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
944		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	938CC+2 días
945		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	944
946		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	944
947		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
948		4,3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	938

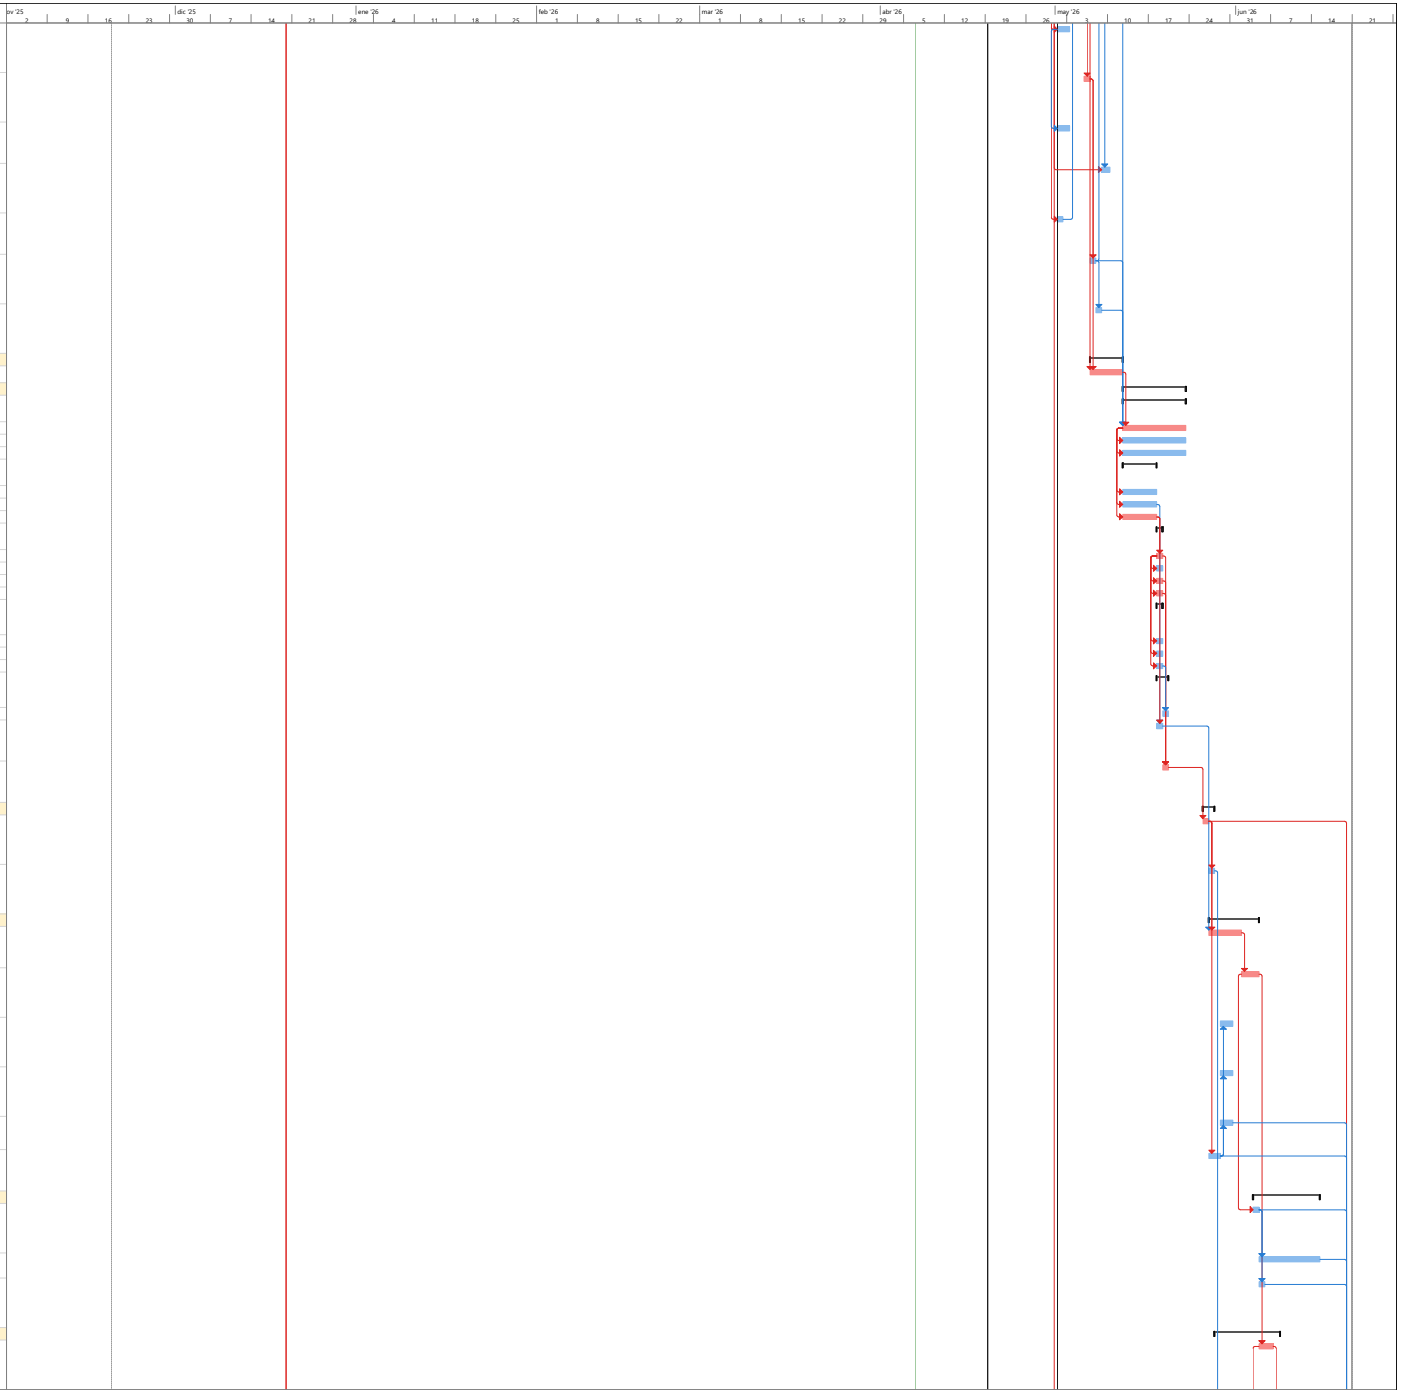

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
949		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	948
950		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	949CC
951		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	949CC
952		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	949CC
953		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	935
954		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	953CC
955		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
956		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
957		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	949CC
958		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	897CC;949CC
959		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	948CC
960		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	950CC
961		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
962		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
963		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
964		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
965		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
966		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
967		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PTF y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	958CC
968		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
969		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	962CC
970		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
971		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	967
972			**ENTREGA DE PISO 2 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**934;941;942;944;945;**
973			**PISO 3 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
974		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
975		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
976		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	975;985
977		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	975
978		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	975CC
979		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	977;984
980		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	975CC
981		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	979
982		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	980CC
983		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	975CC;976
984		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	975CC

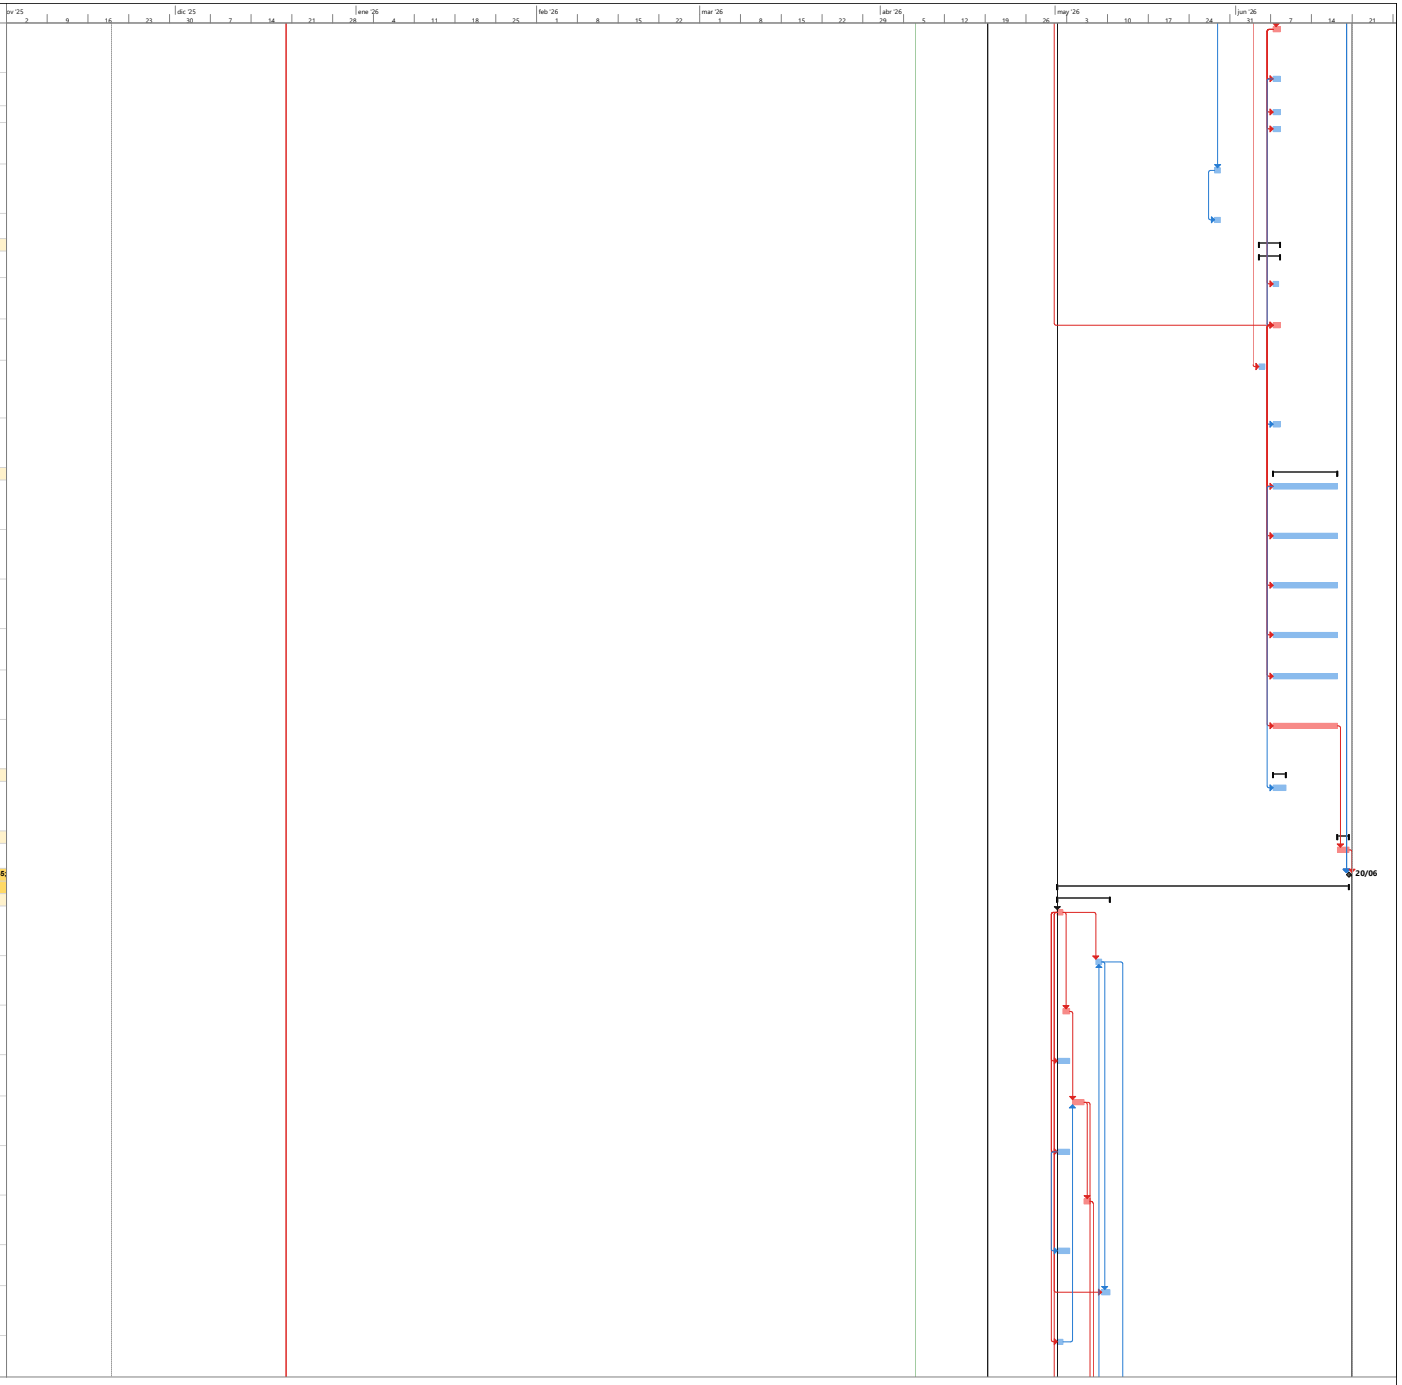

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
985		1.13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	981
986		1.14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	985
987		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
988		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	979;981
989		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
990		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
991		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	976;985;986;988
992		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	991CC
993		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	991CC
994		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
995		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	991CC
996		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	991CC
997		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	991CC
998		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
999		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	997
1000		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1001		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1002		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1003		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1004		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1005		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1006		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	999CC
1007		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1008		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1006
1009		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	996;997
1010		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	999;1001;1002
1011		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1012		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1010FC+5 días
1013		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1012
1014		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1015		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1009;1012
1016		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1015
1017		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o sutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1020
1018		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporcion 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1020
1019		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1020
1020		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1012
1021		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1022		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1016CC+2 días
1023		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1022
1024		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1022
1025		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1026		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1016
1027		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1026
1028		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1027CC
1029		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1027CC
1030		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1027CC
1031		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1013
1032		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1031CC
1033		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	

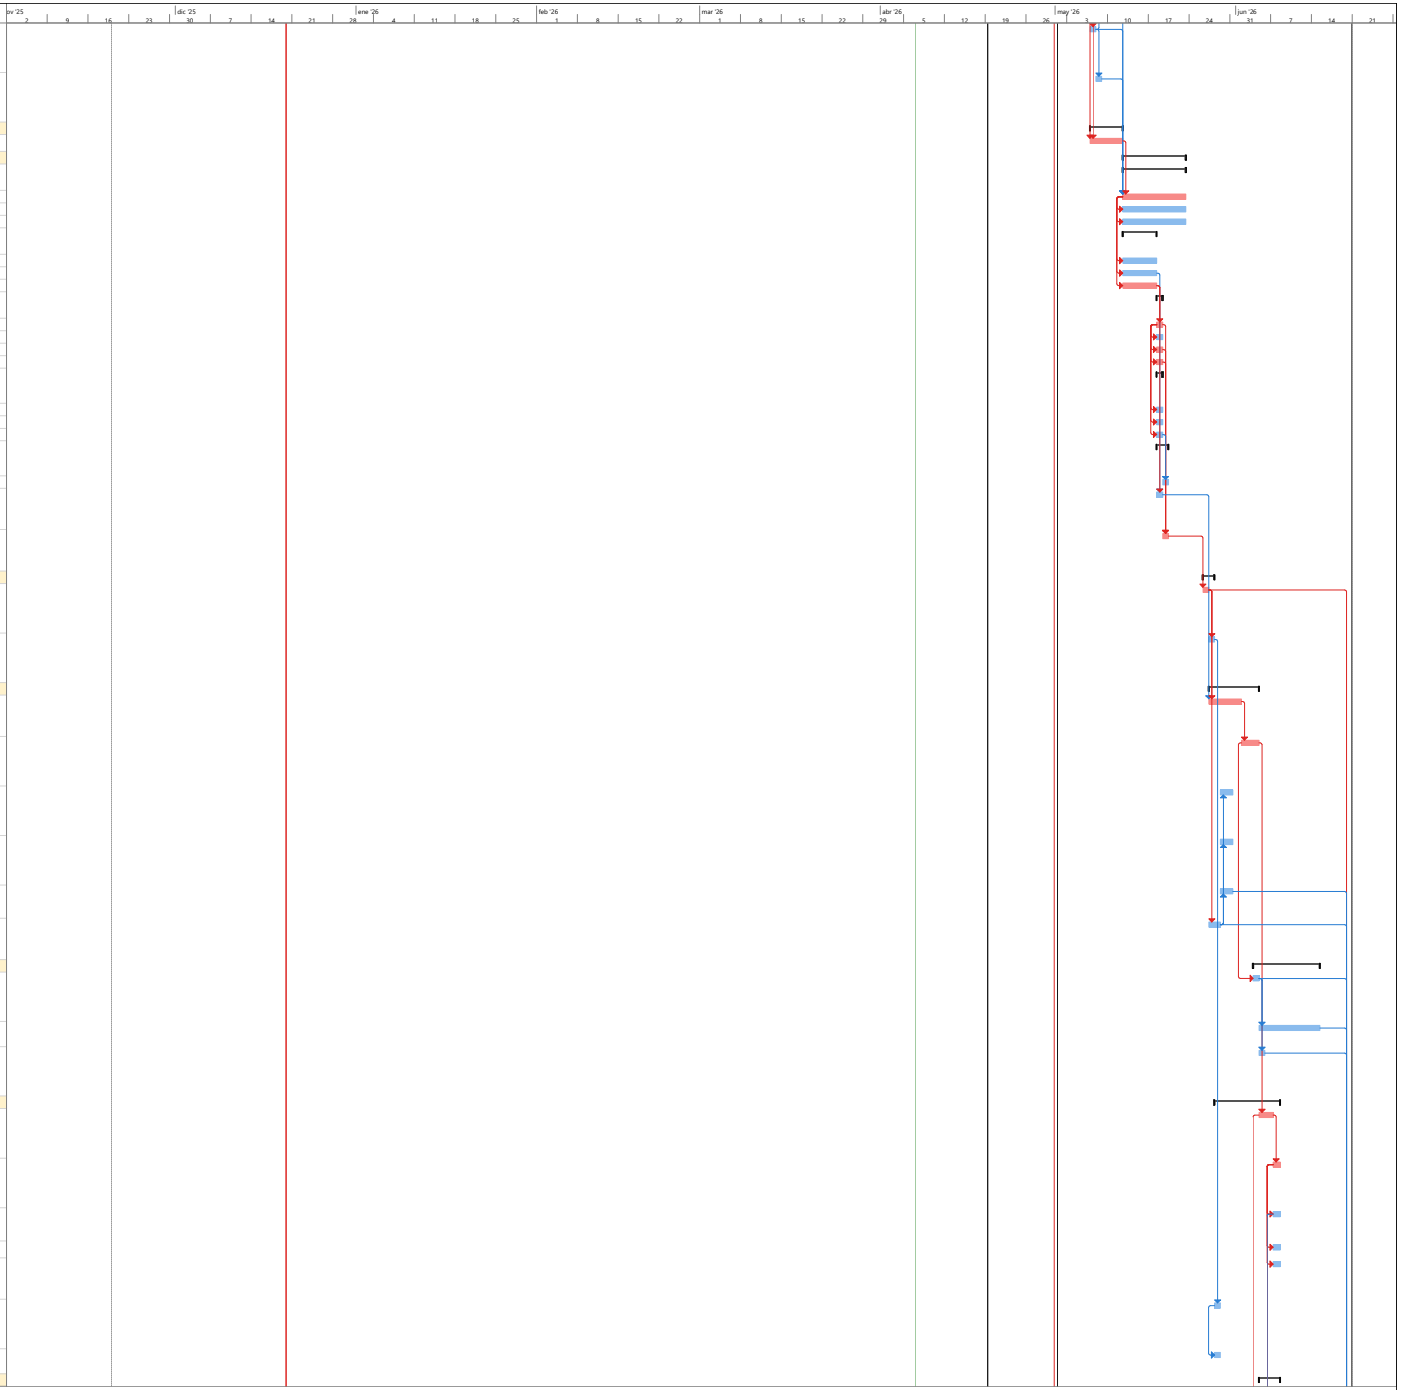

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1034		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1035		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1027CC
1036		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	975CC;1027CC
1037		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1026CC
1038		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1028CC
1039		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1040		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1041		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1042		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1043		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1044		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1045		8.9	Suministro, transporte e instalación de plato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1036CC
1046		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1047		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1040CC
1048		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1049		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1045
1050			**ENTREGA DE PISO 3 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1012;1019;1020;1022**
1051			**PISO 4 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1052		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1053		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1054		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1053;1063
1055		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1053
1056		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1053CC
1057		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1055;1062
1058		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1053CC
1059		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1057
1060		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1058CC
1061		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1053CC;1054
1062		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1053CC
1063		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1059
1064		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1063
1065		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1066		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1057;1059
1067		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1068		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1069		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1054;1063;1064;1066
1070		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1069CC
1071		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1069CC
1072		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yeo al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	

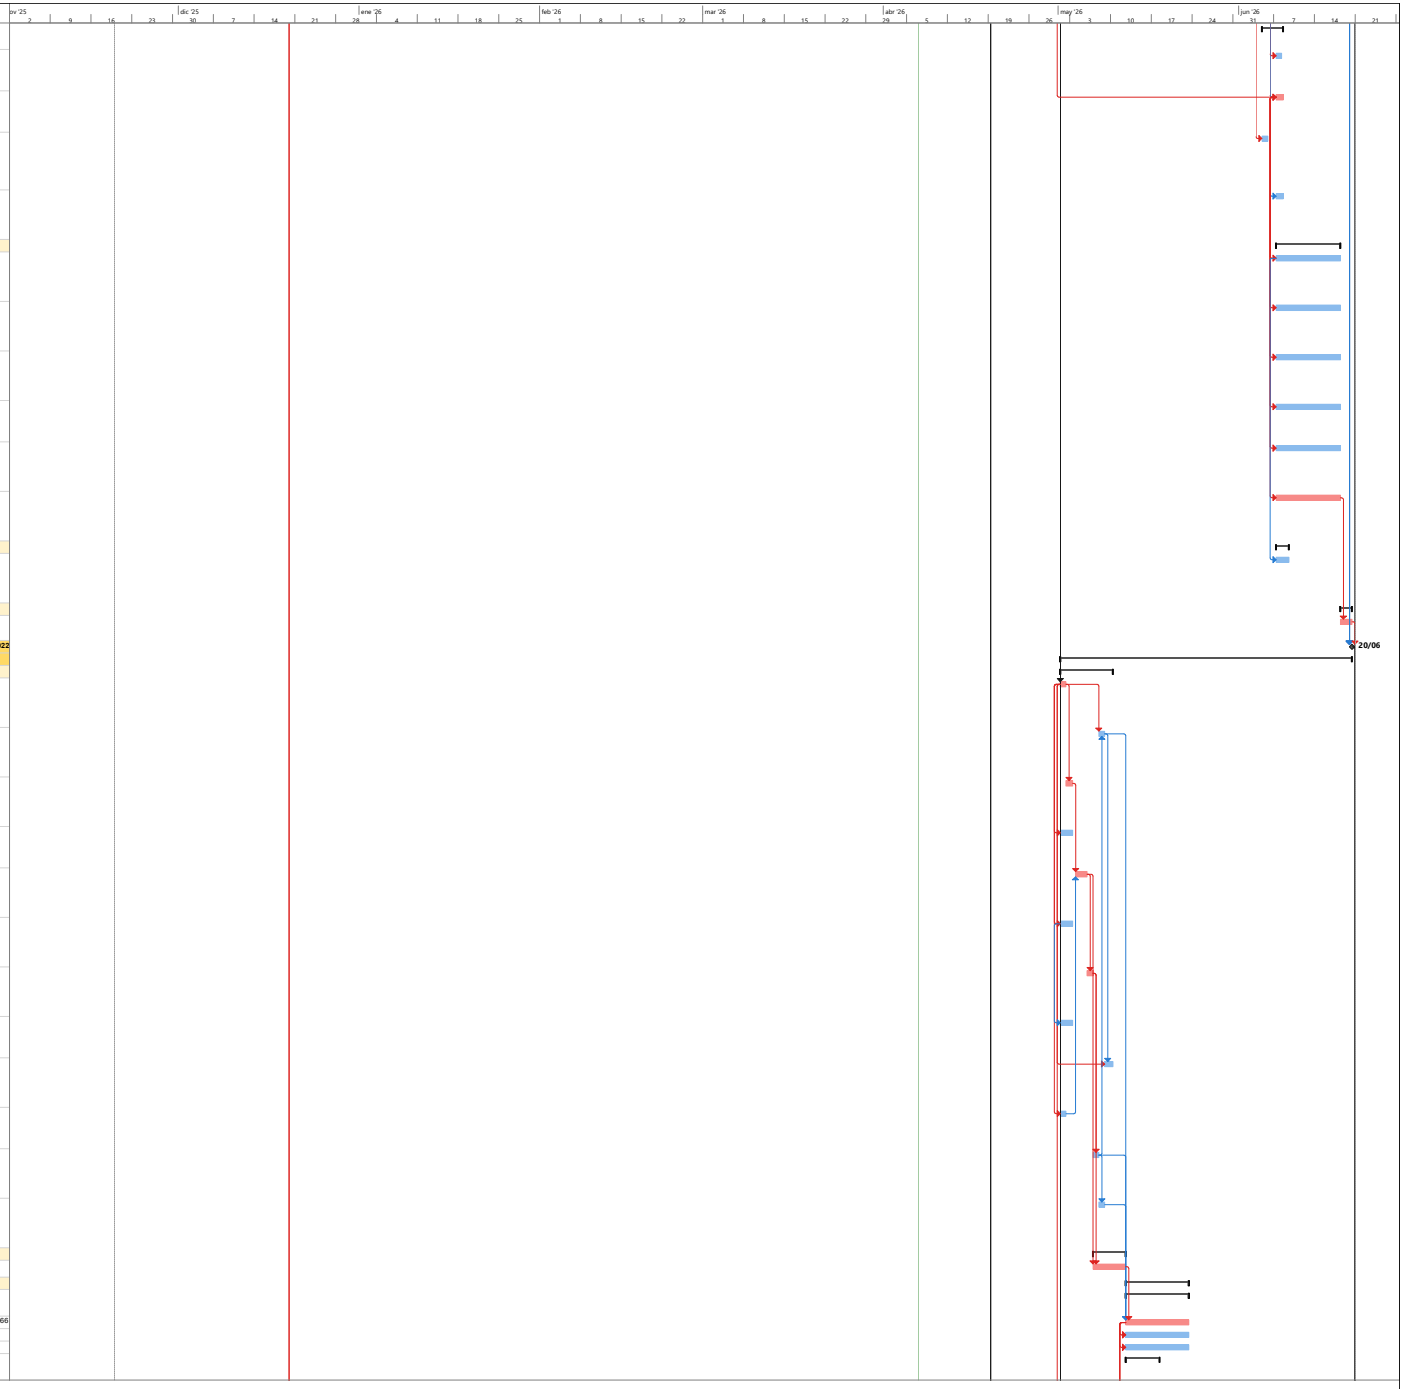

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · División · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1073		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1069CC
1074		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1069CC
1075		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1069CC
1076		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1077		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1075
1078		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1079		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1080		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1081		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1082		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1083		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1084		3.11.4	Ø = 1 1/4" - 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1077CC
1085		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1086		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1084
1087		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1074;1075
1088		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1077;1079;1080
1089		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1090		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1088FC+5 días
1091		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1090
1092		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1093		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1087;1090
1094		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1093
1095		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1098
1096		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1098
1097		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir. (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1098
1098		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1090
1099		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1100		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1094CC+2 días
1101		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1100
1102		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1100
1103		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1104		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1094
1105		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1104
1106		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1105CC
1107		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1105CC
1108		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1105CC
1109		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1091
1110		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1109CC
1111		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1112		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1113		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1105CC
1114		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1053CC;1105CC
1115		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1104CC
1116		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1106CC
1117		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**lun 18/06/26**	

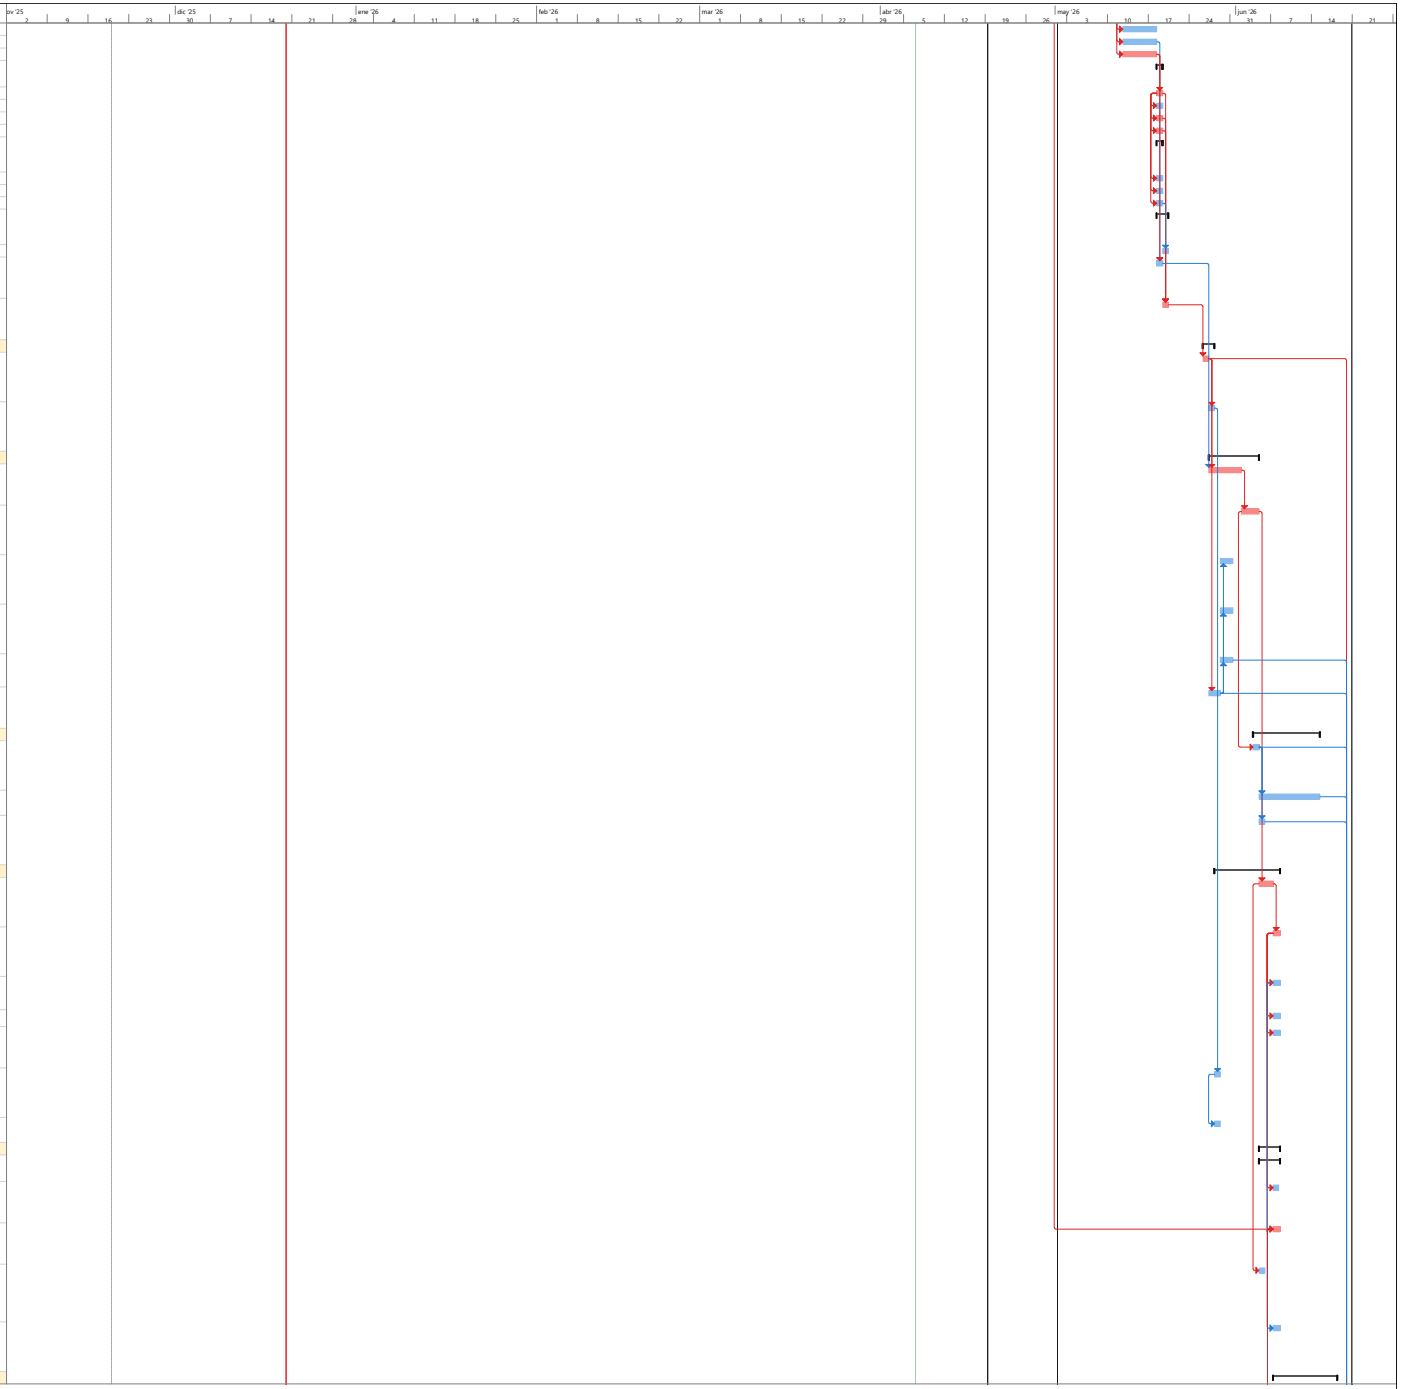

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · División · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1118		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1119		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1120		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1121		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para otinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1122		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1123		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PTP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1114CC
1124		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1125		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1118CC
1126		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1127		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1123
1128			**ENTREGA DE PISO 4 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1090;1097;1098;1100**
1129			**PISO 6 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1130		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1131		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1132		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1131;1141
1133		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1131
1134		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1131CC
1135		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1133;1140
1136		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1131CC
1137		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1135
1138		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1136CC
1139		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1131CC;1132
1140		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1131CC
1141		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1137
1142		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1141
1143		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1144		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1135;1137
1145		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1146		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1147		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1132;1141;1142;1144
1148		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1147CC
1149		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1147CC
1150		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1151		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1147CC
1152		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1147CC
1153		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1147CC
1154		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1155		3.10.1	De diámetro ½"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1153
1156		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1157		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1158		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1159		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1160		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1161		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1162		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1155CC
1163		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1164		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1162

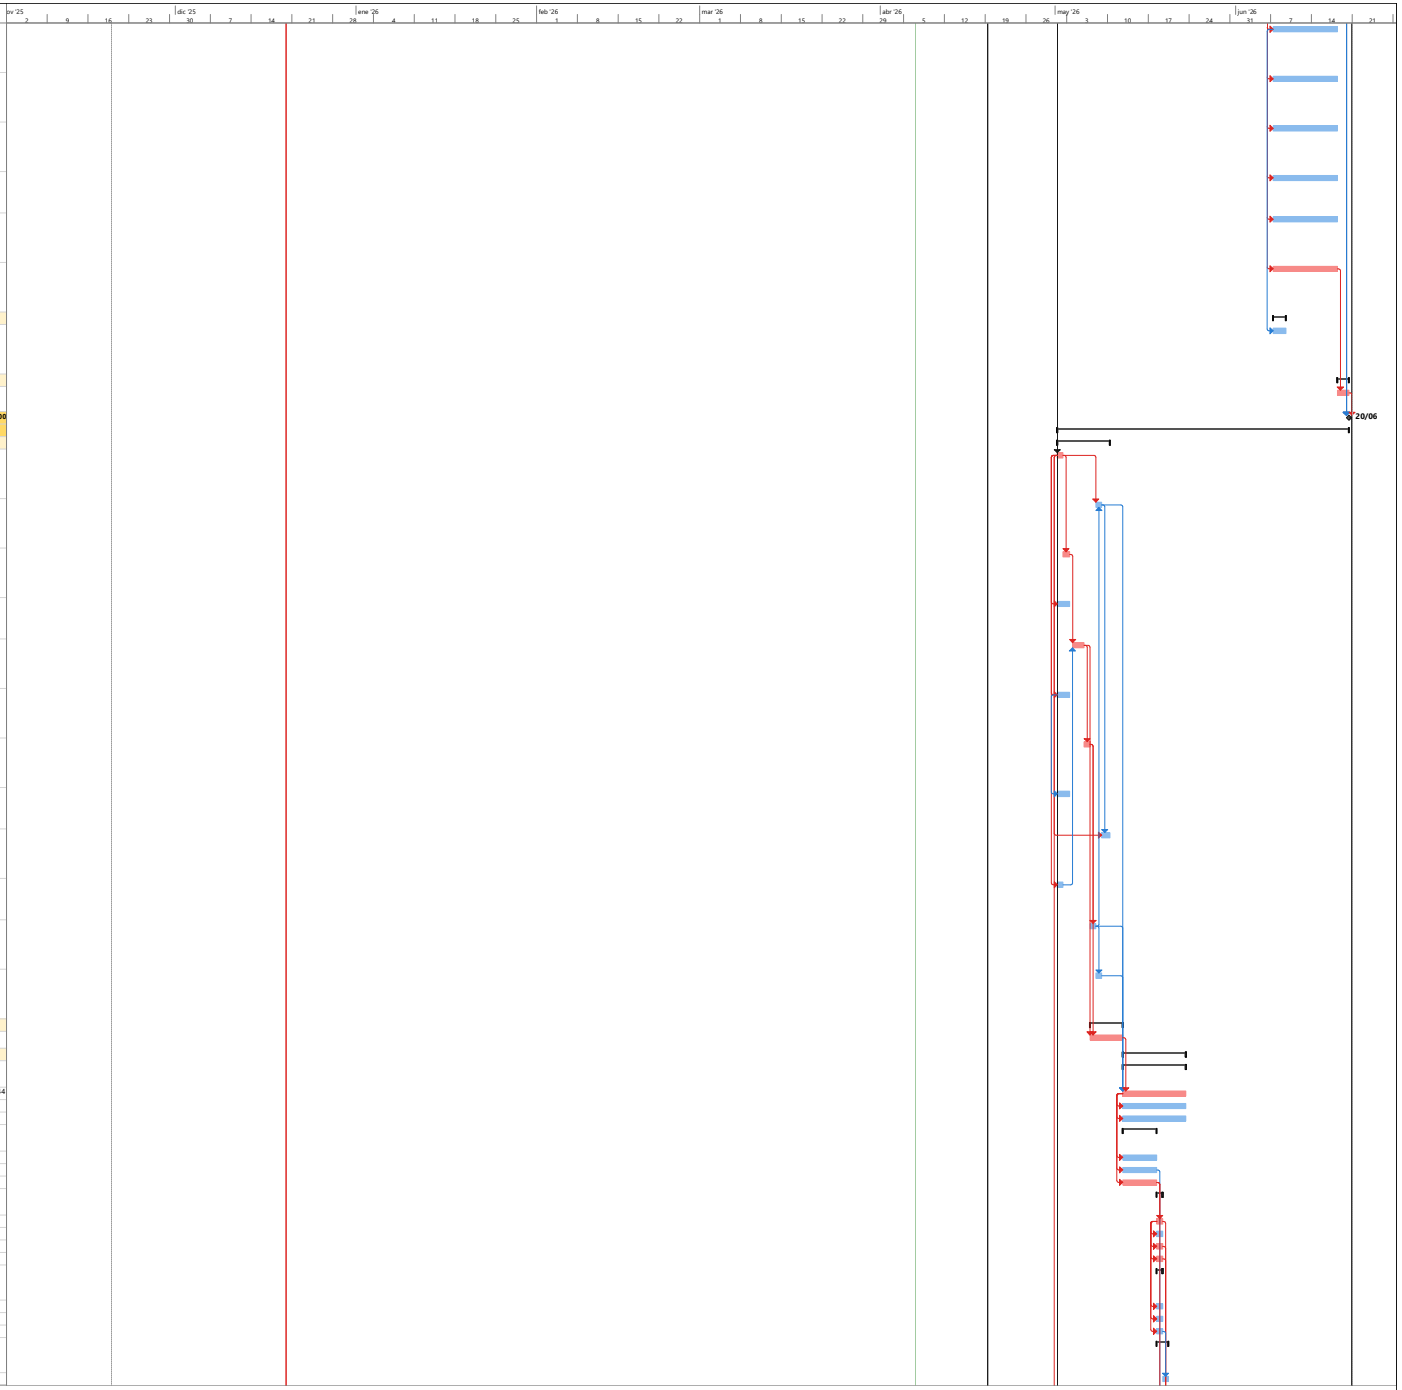

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1165		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1152;1153
1166		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1155;1157;1158
1167		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1168		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 16mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1166FC+5 días
1169		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1168
1170		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1171		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1165;1168
1172		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1171
1173		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasquanteada o rutlada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1176
1174		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1176
1175		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1176
1176		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1168
1177		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1178		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1172CC+2 días
1179		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1178
1180		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1178
1181		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1182		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1172
1183		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1182
1184		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1183CC
1185		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1183CC
1186		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1183CC
1187		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1169
1188		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1187CC
1189		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1190		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1191		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1183CC
1192		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1131CC;1183CC
1193		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1182CC
1194		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1184CC
1195		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1196		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23' 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC
1197		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC
1198		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC
1199		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC
1200		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC

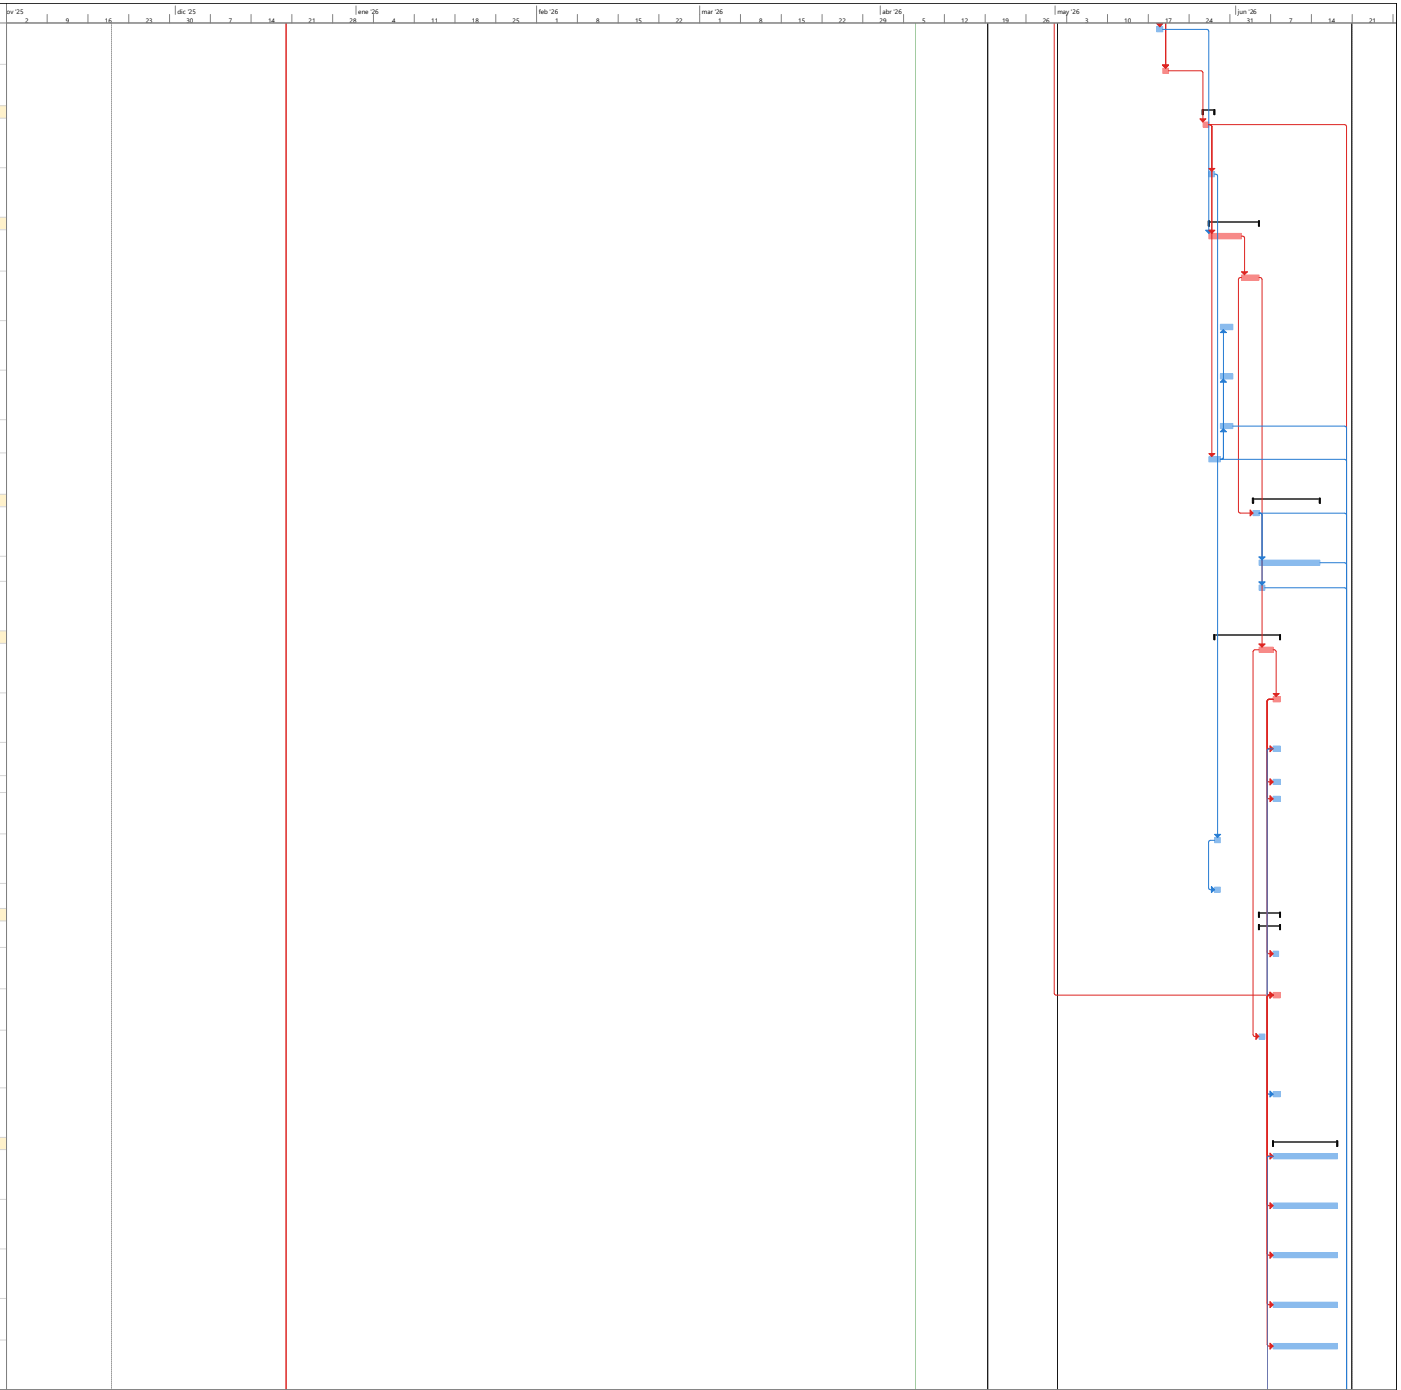

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1201		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidraulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PTP y picaporte. Incluye retiro del existente. adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1192CC
1202		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1203		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTB de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1198CC
1204		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1205		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1201
1206			**ENTREGA DE PISO 6 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1168;1175;1176;1178**
1207			**PISO 7 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1208		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1209		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1210		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1209;1219
1211		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1209
1212		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1209CC
1213		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1211;1218
1214		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1209CC
1215		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento n	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1213
1216		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1214CC
1217		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1209CC;1210
1218		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1209CC
1219		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1215
1220		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El Item incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1219
1221		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1222		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1213;1215
1223		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1224		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1225		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1210;1219;1220;1222
1226		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1225CC
1227		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1225CC
1228		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Consideradas de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1229		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1225CC
1230		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1225CC
1231		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1225CC
1232		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1233		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1231
1234		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1235		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1236		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1237		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1238		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1239		3.11.2	Ø = ½"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1240		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1233CC
1241		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1242		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1240
1243		3.13	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1230;1231
1244		3.14	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1233;1235;1236
1245		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1246		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara; incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1244FC+5 días
1247		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1246
1248		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	

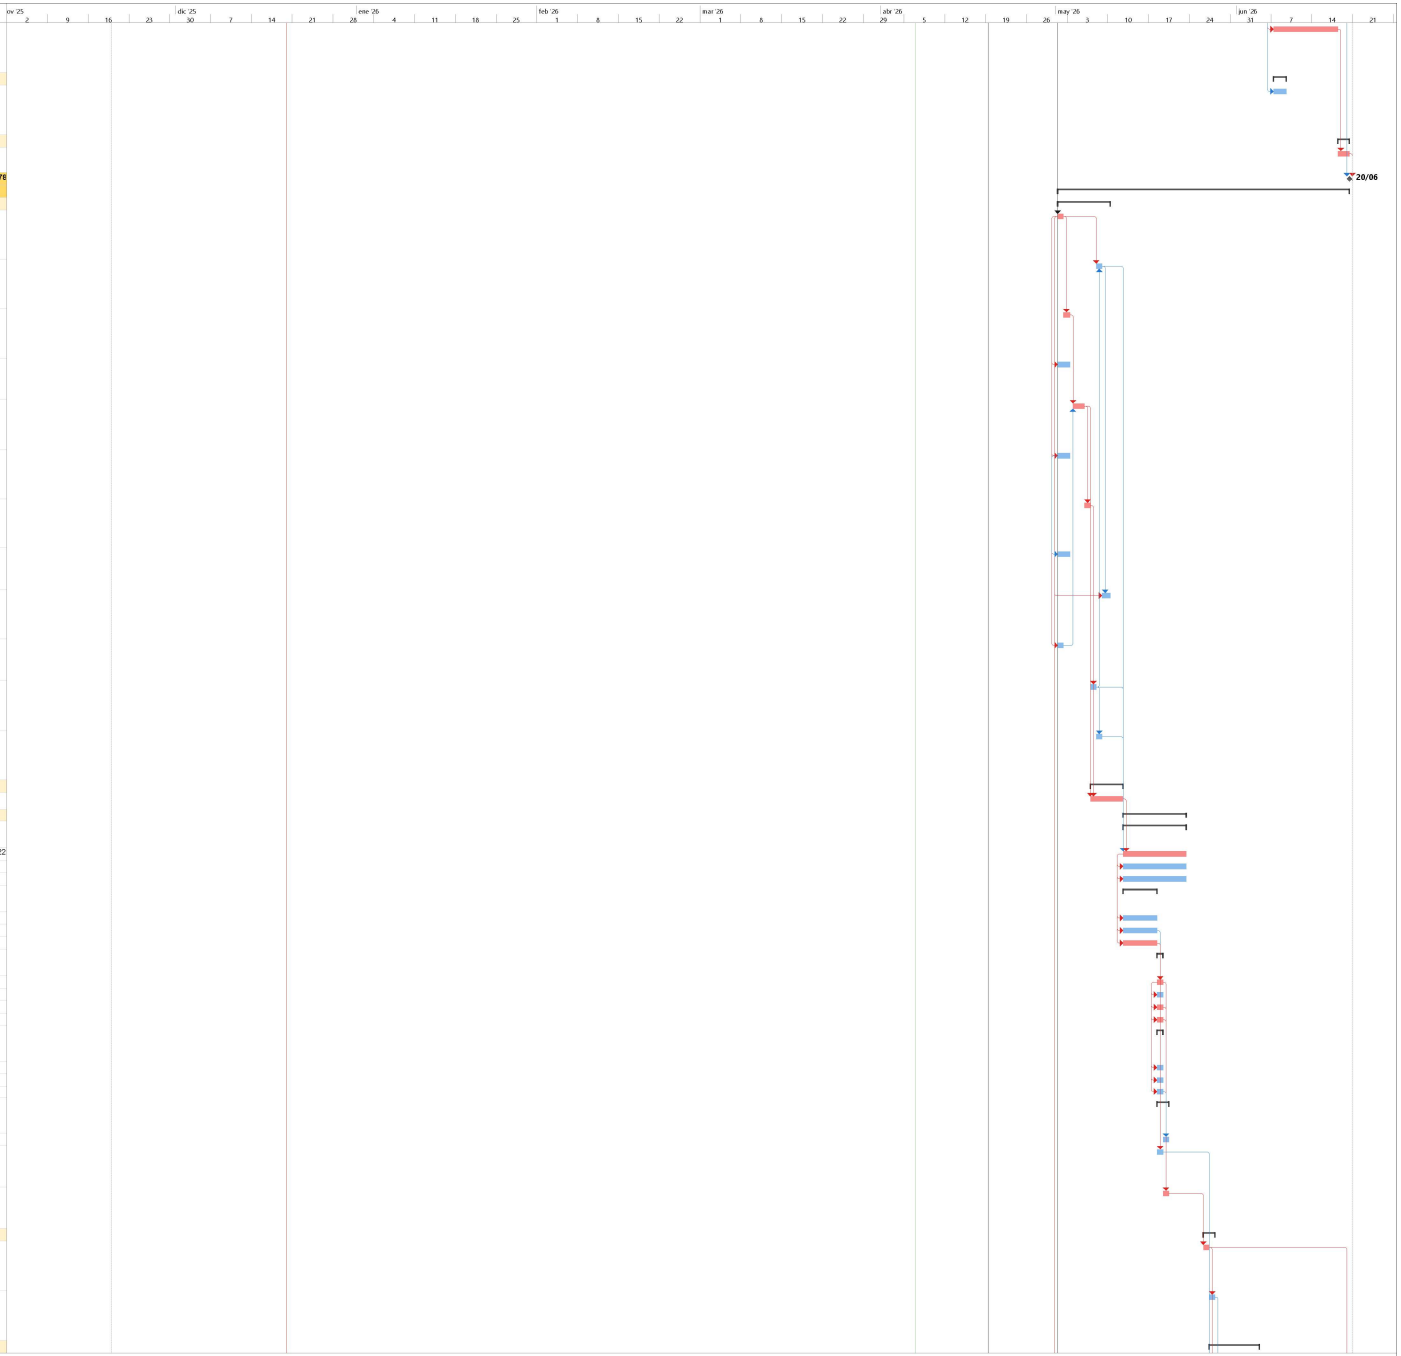

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1249		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1243;1246
1250		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1249
1251		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o sutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1254
1252		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pinturco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1254
1253		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1254
1254		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1246
1255		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1256		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1250CC+2 días
1257		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1256
1258		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1256
1259		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1260		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4.8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1250
1261		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1260
1262		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1261CC
1263		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1261CC
1264		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1261CC
1265		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1247
1266		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1265CC
1267		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1268		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1269		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1261CC
1270		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1209CC;1261CC
1271		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1260CC
1272		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1262CC
1273		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1274		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23' 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1275		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1276		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1277		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para otinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,90 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1278		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1279		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1270CC
1280		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1281		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1274CC
1282		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1283		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1279
1284			**ENTREGA DE PISO 7 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1246;1253;1254;1256**
1285			**PISO 8 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1286		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	

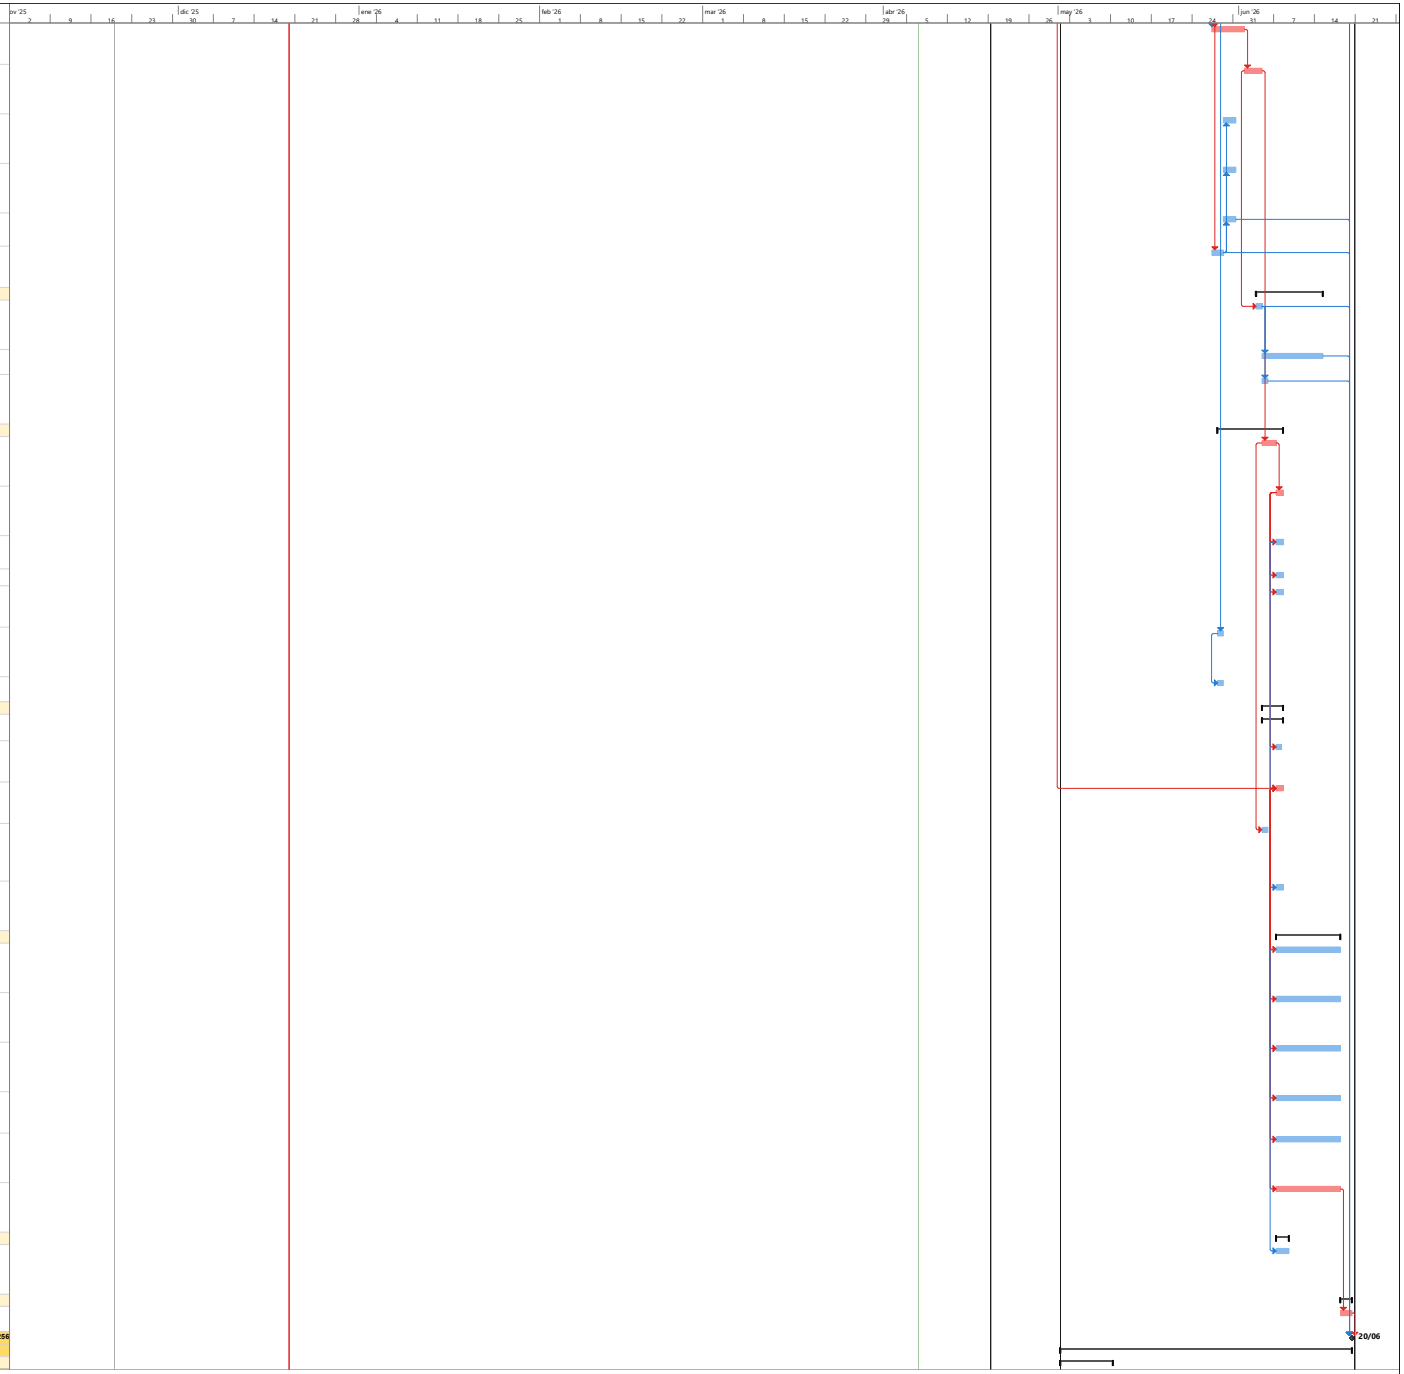

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1287		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1288		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1287;1297
1289		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1287
1290		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1287CC
1291		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1289;1296
1292		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tablaje y/o jua el mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1287CC
1293		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1291
1294		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1292CC
1295		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1287CC;1288
1296		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1287CC
1297		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1293
1298		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1297
1299		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1300		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1291;1293
1301		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1302		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1303		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1288;1297;1298;1300
1304		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1303CC
1305		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1303CC
1306		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1307		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1303CC
1308		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1303CC
1309		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1303CC
1310		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1311		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1309
1312		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1313		3.10.4	De diámetro 1¼". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1314		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1315		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1316		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1317		3.11.2	Ø = ½"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1318		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1311CC
1319		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1320		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1318
1321		3.13	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1308;1309
1322		3.14	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1311;1313;1314
1323		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1324		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqu	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1322FC+5 días
1325		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1324
1326		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1327		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, fileles y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1321;1324
1328		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruces plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1327
1329		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir; (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1332
1330		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1332
1331		6,6	Suministro y aplicacion de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir: (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1332



Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1332		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, fileles y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1324
1333		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1334		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1328CC+2 días
1335		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1334
1336		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1334
1337		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1338		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4.8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1328
1339		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1338
1340		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1339CC
1341		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1339CC
1342		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1339CC
1343		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1325
1344		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1343CC
1345		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1346		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1347		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1339CC
1348		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1287CC;1339CC
1349		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1338CC
1350		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1340CC
1351		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1352		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1353		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1354		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1355		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1356		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1357		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1348CC
1358		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1359		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1352CC
1360		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1361		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1357
1362			**ENTREGA DE PISO 8 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1324;1331;1332;1334**
1363			**PISO 9 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1364		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1365		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1366		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1365;1375
1367		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1365
1368		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1365CC
1369		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1367;1374

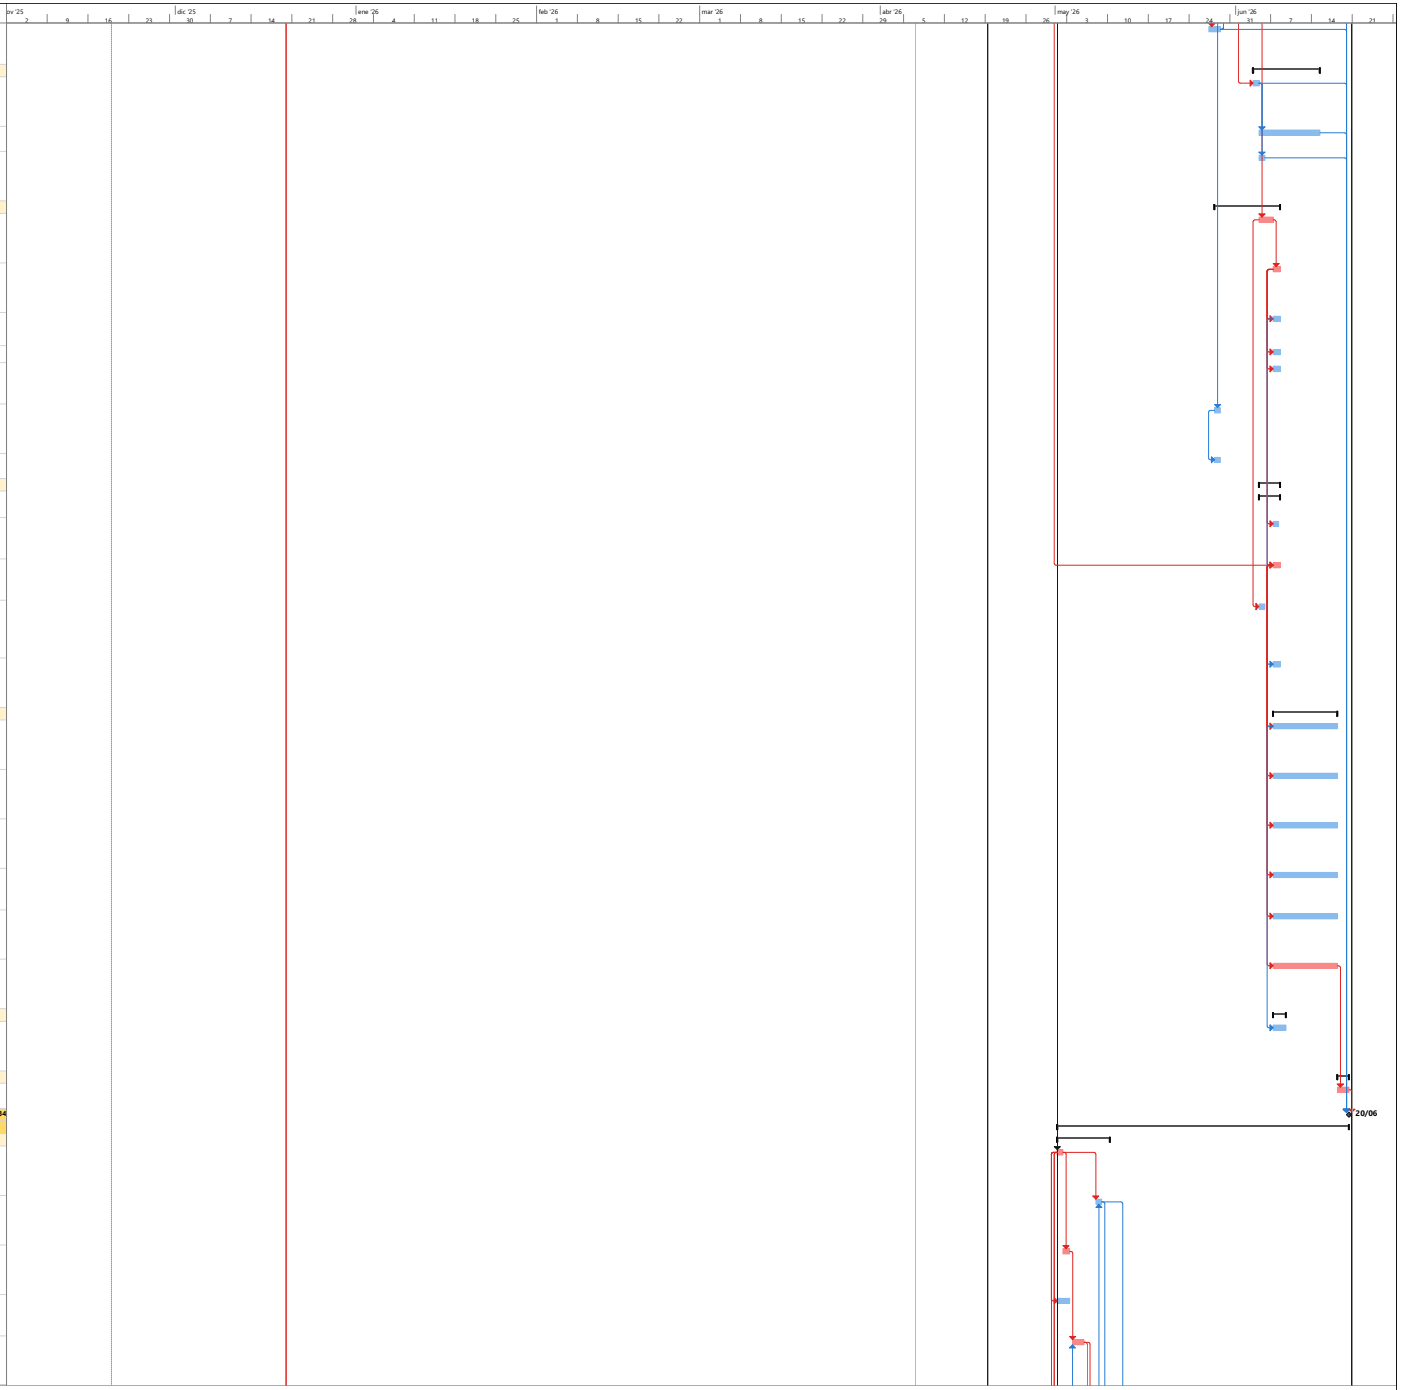

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · División · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1370		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1365CC
1371		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1369
1372		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1370CC
1373		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1365CC;1366
1374		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1365CC
1375		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1371
1376		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclu	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1375
1377		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1378		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1369;1371
1379		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1380		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1381		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1366;1375;1376;1378
1382		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1381CC
1383		3.1.3	Diámetro 4"	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1381CC
1384		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1385		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1381CC
1386		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1381CC
1387		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1381CC
1388		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1389		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1387
1390		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1391		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1392		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1393		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1394		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1395		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1396		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1389CC
1397		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1398		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1396
1399		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3". 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1386;1387
1400		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1389;1391;1392
1401		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1402		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1400FC+5 días
1403		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1402
1404		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1405		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1399;1402
1406		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1405
1407		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1410
1408		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminale, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1410
1409		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1410
1410		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1402
1411		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1412		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1406CC+2 días
1413		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1412
1414		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1412
1415		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1416		4,3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1406

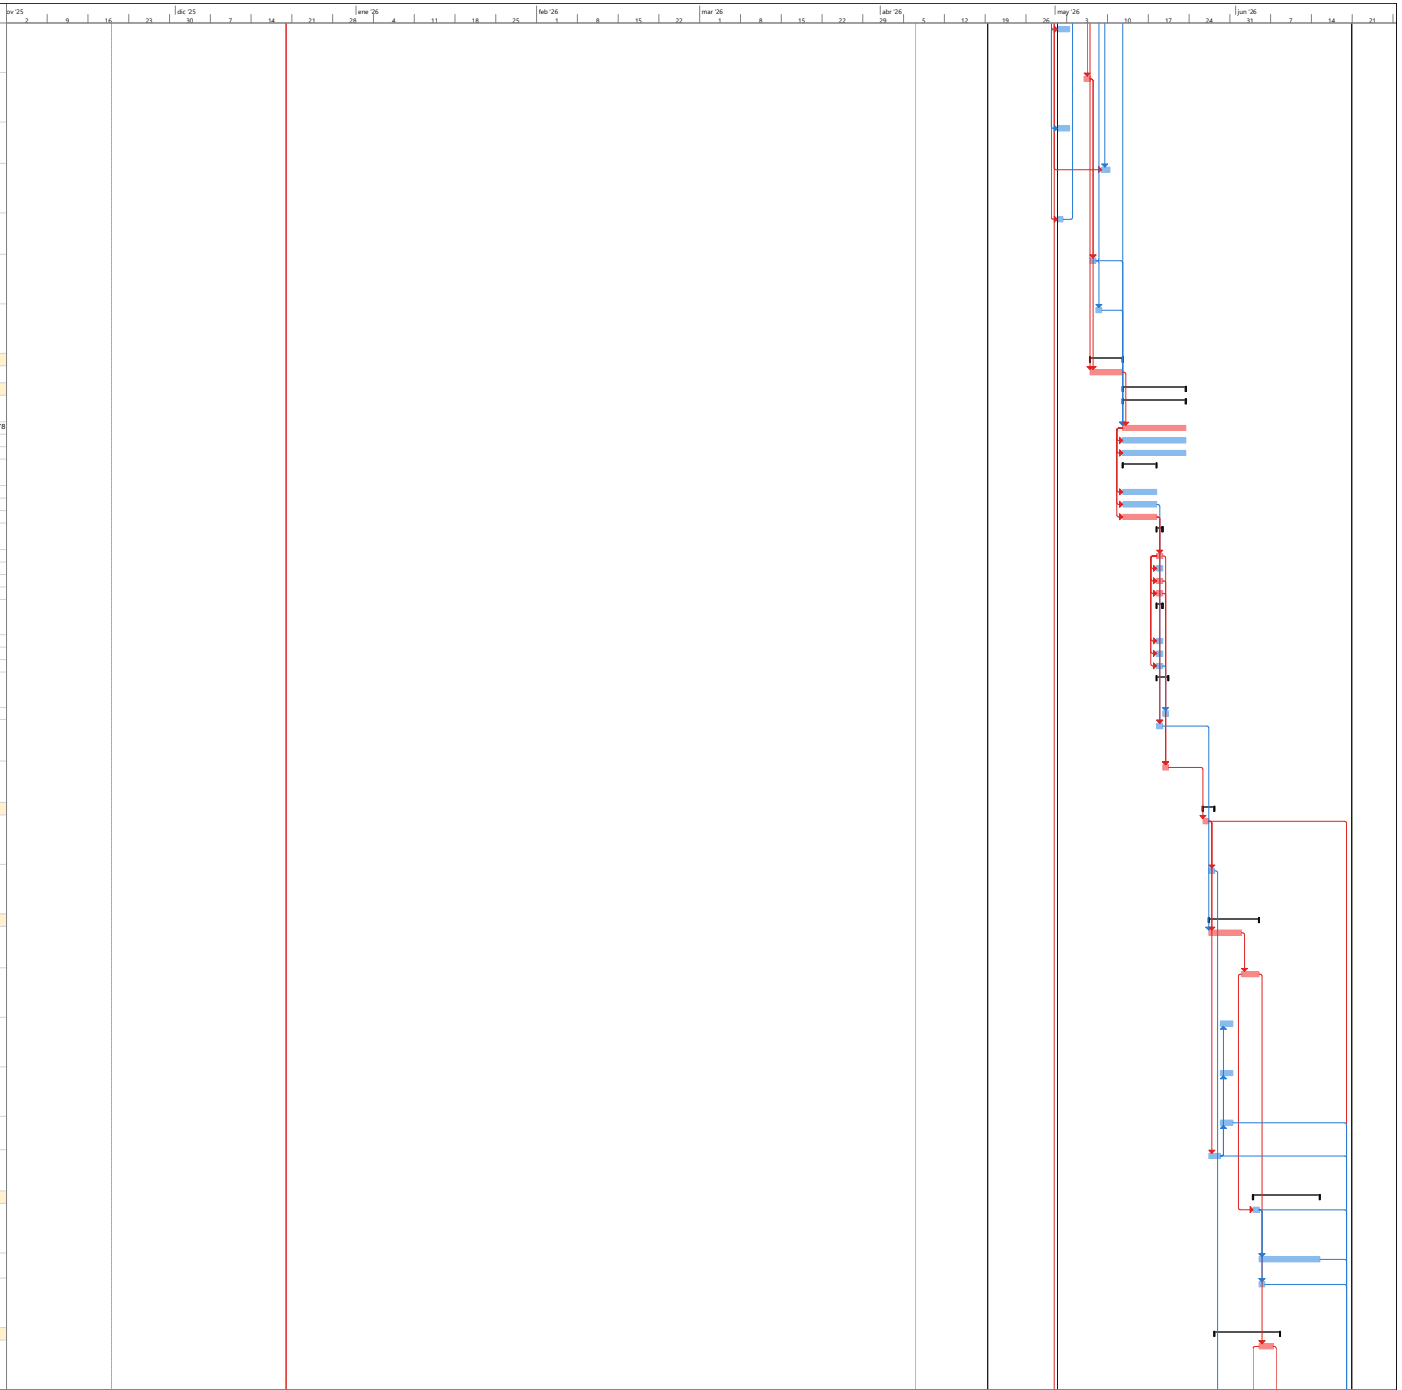

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1417		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1416
1418		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1417CC
1419		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1417CC
1420		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1417CC
1421		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1403
1422		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1421CC
1423		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1424		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1425		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1417CC
1426		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1365CC;1417CC
1427		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1416CC
1428		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1418CC
1429		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1430		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1431		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1432		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1433		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1434		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1435		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PTFE y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1426CC
1436		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1437		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1430CC
1438		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1439		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1435
1440			**ENTREGA DE PISO 9 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1402;1409;1410;1412**
1441			**PISO 10 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1442		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1443		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1444		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1443;1453
1445		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1443
1446		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1443CC
1447		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1445;1452
1448		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1443CC
1449		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1447
1450		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1448CC
1451		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1443CC;1444
1452		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1443CC

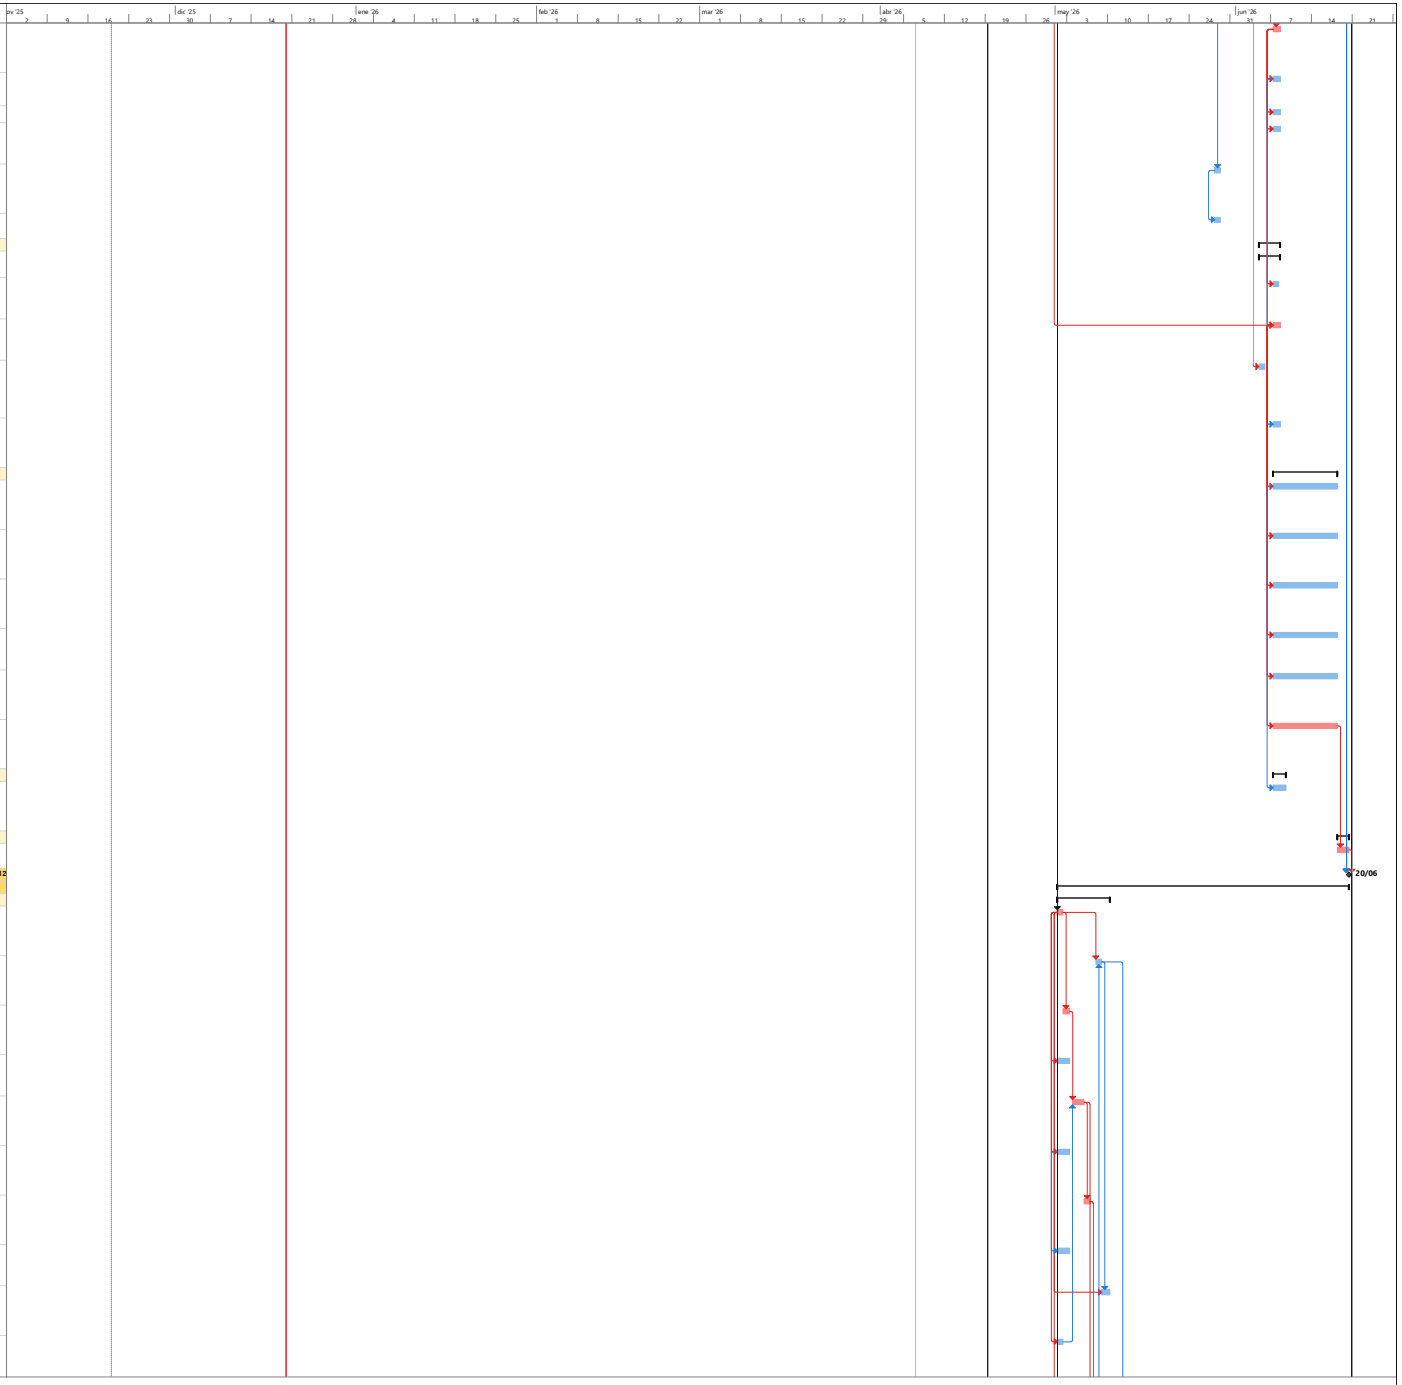


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1453		1.13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1449
1454		1.14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1453
1455		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1456		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1447;1449
1457		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1458		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1459		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1444;1453;1454;1456
1460		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1459CC
1461		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1459CC
1462		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1463		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1459CC
1464		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1459CC
1465		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1459CC
1466		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1467		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1465
1468		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1469		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1470		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1471		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1472		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1473		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1474		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1467CC
1475		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1476		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1474
1477		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1464;1465
1478		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1467;1469;1470
1479		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1480		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1478FC+5 días
1481		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1480
1482		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1483		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1477;1480
1484		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1483
1485		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o sutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1488
1486		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporcion 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1488
1487		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1488
1488		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1480
1489		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1490		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1484CC+2 días
1491		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1490
1492		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1490
1493		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1494		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1484
1495		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1494
1496		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1495CC
1497		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1495CC
1498		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1495CC
1499		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1481
1500		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1499CC
1501		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	

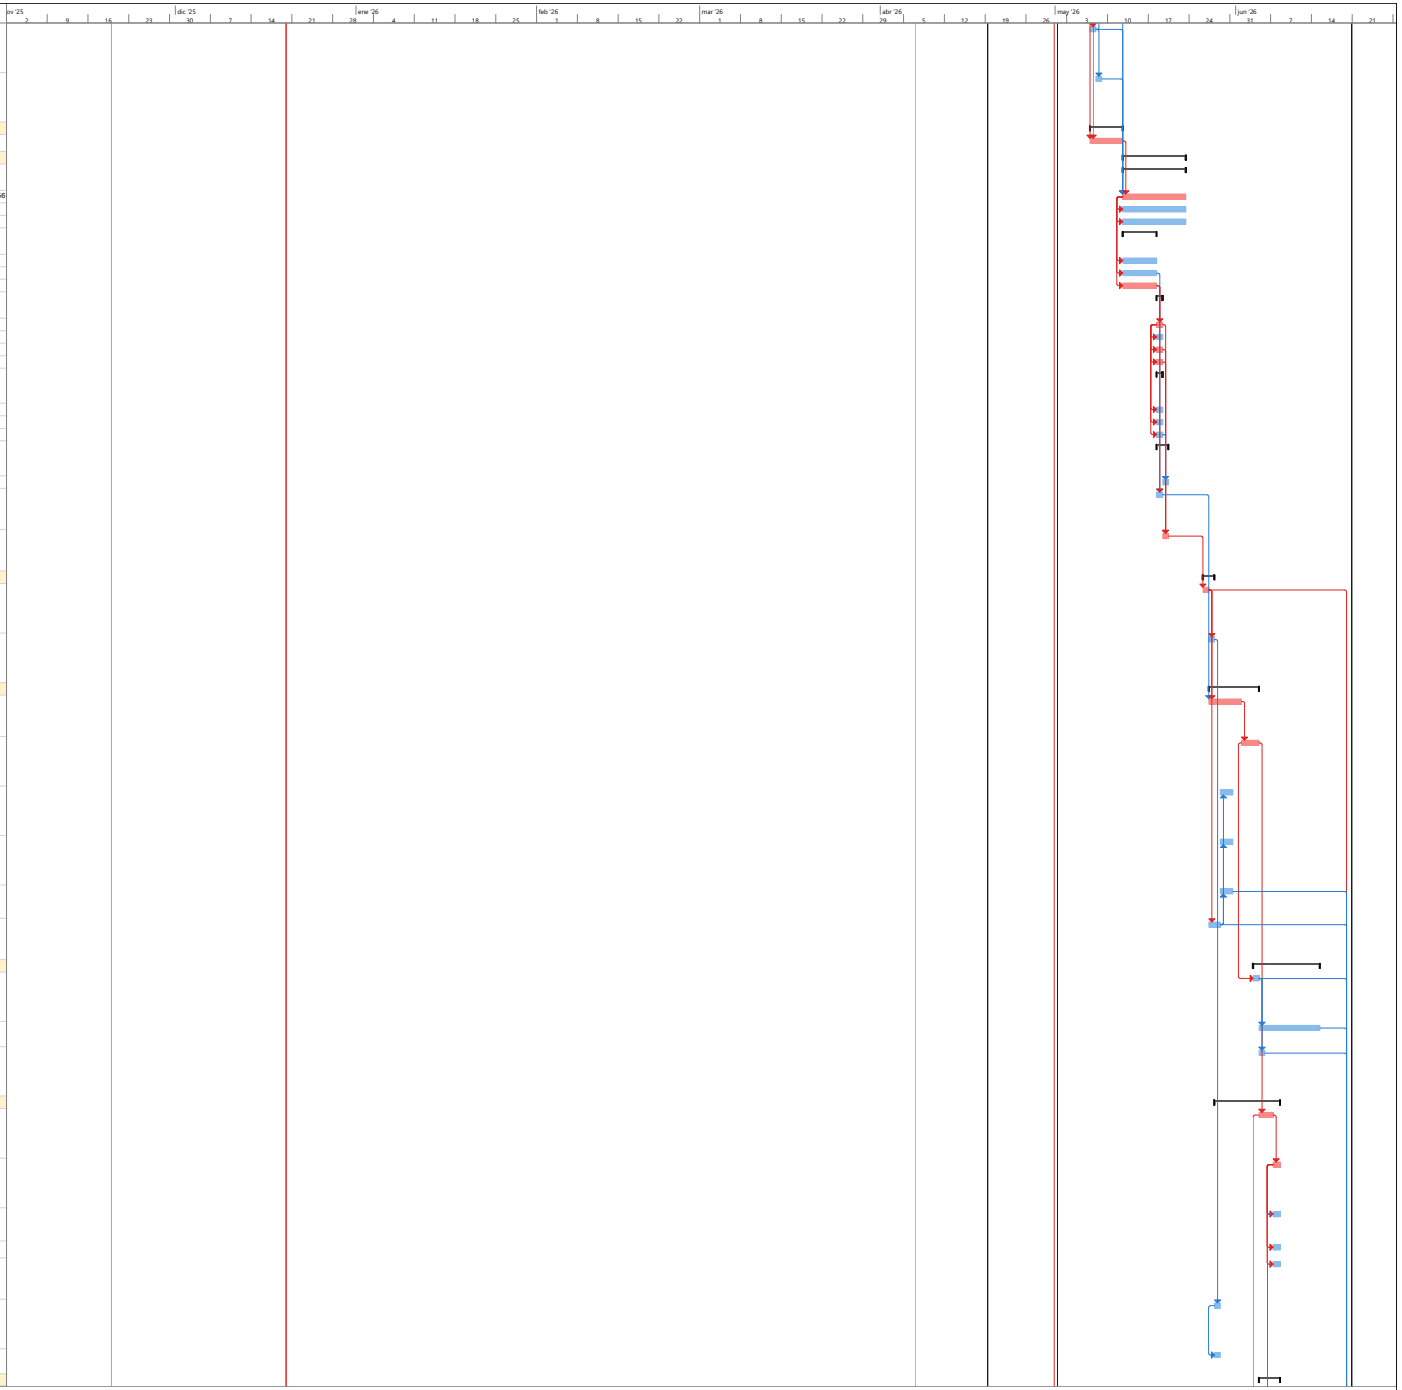


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1502		3.1	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1503		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1495CC
1504		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1443CC;1495CC
1505		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1494CC
1506		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1496CC
1507		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1508		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1509		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1510		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1511		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1512		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1513		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1504CC
1514		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1515		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1508CC
1516		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1517		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1513
1518			**ENTREGA DE PISO 10 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1480;1487;1488;1490**
1519			**PISO 11 - OCCIDENTAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1520		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1521		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1522		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1521;1531
1523		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1521
1524		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1521CC
1525		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1523;1530
1526		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1521CC
1527		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1525
1528		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1526CC
1529		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1521CC;1522
1530		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1521CC
1531		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1527
1532		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1531
1533		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1534		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1525;1527
1535		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1536		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1537		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1522;1531;1532;1534
1538		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1537CC
1539		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1537CC
1540		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yeo al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	

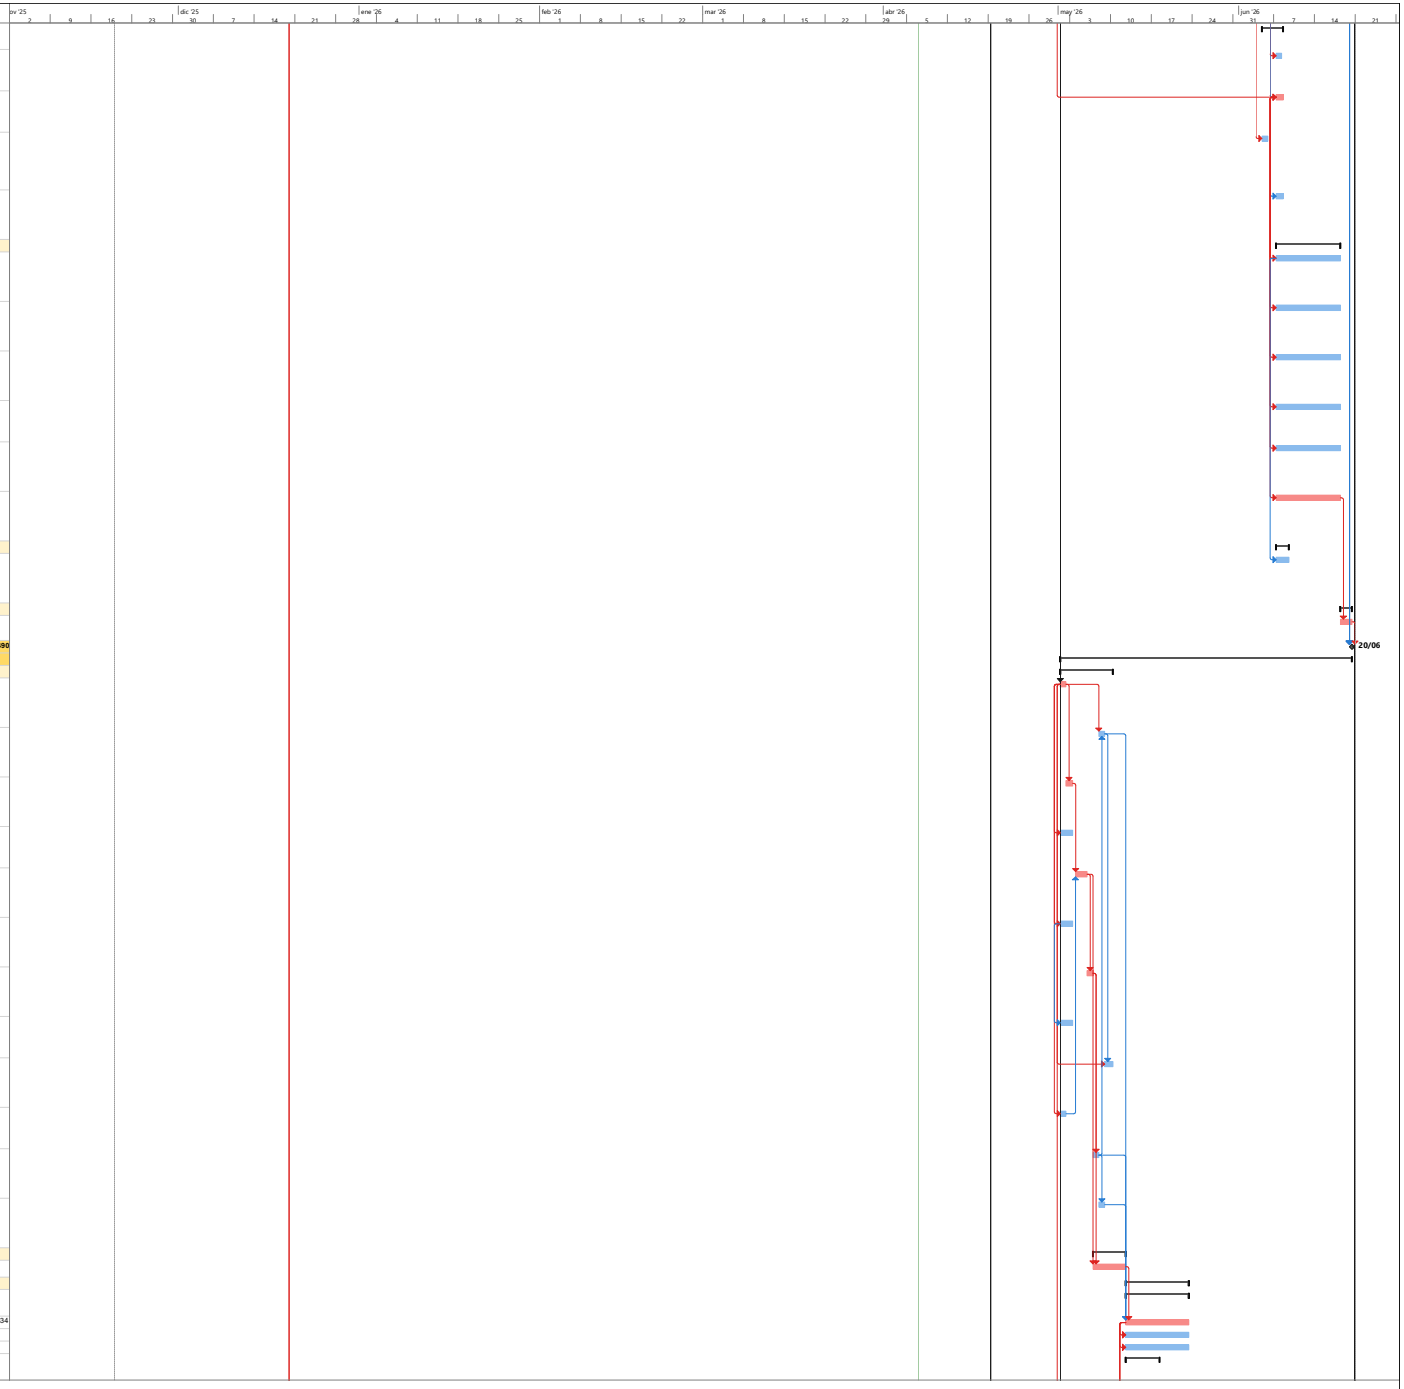

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1541		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1537CC
1542		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1537CC
1543		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1537CC
1544		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1545		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1543
1546		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1547		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1548		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1549		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura. L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1550		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1551		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1552		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1545CC
1553		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1554		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1552
1555		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1542;1543
1556		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1545;1547;1548
1557		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1558		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1556FC+5 días
1559		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1558
1560		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1561		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1555;1558
1562		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruzetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1561
1563		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1566
1564		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1566
1565		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir. (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1566
1566		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1558
1567		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1568		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1562CC+2 días
1569		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1568
1570		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1568
1571		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1572		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1562
1573		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1572
1574		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1573CC
1575		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1573CC
1576		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1573CC
1577		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1559
1578		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1577CC
1579		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1580		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1581		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1573CC
1582		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1521CC;1573CC
1583		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1572CC
1584		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1574CC
1585		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	

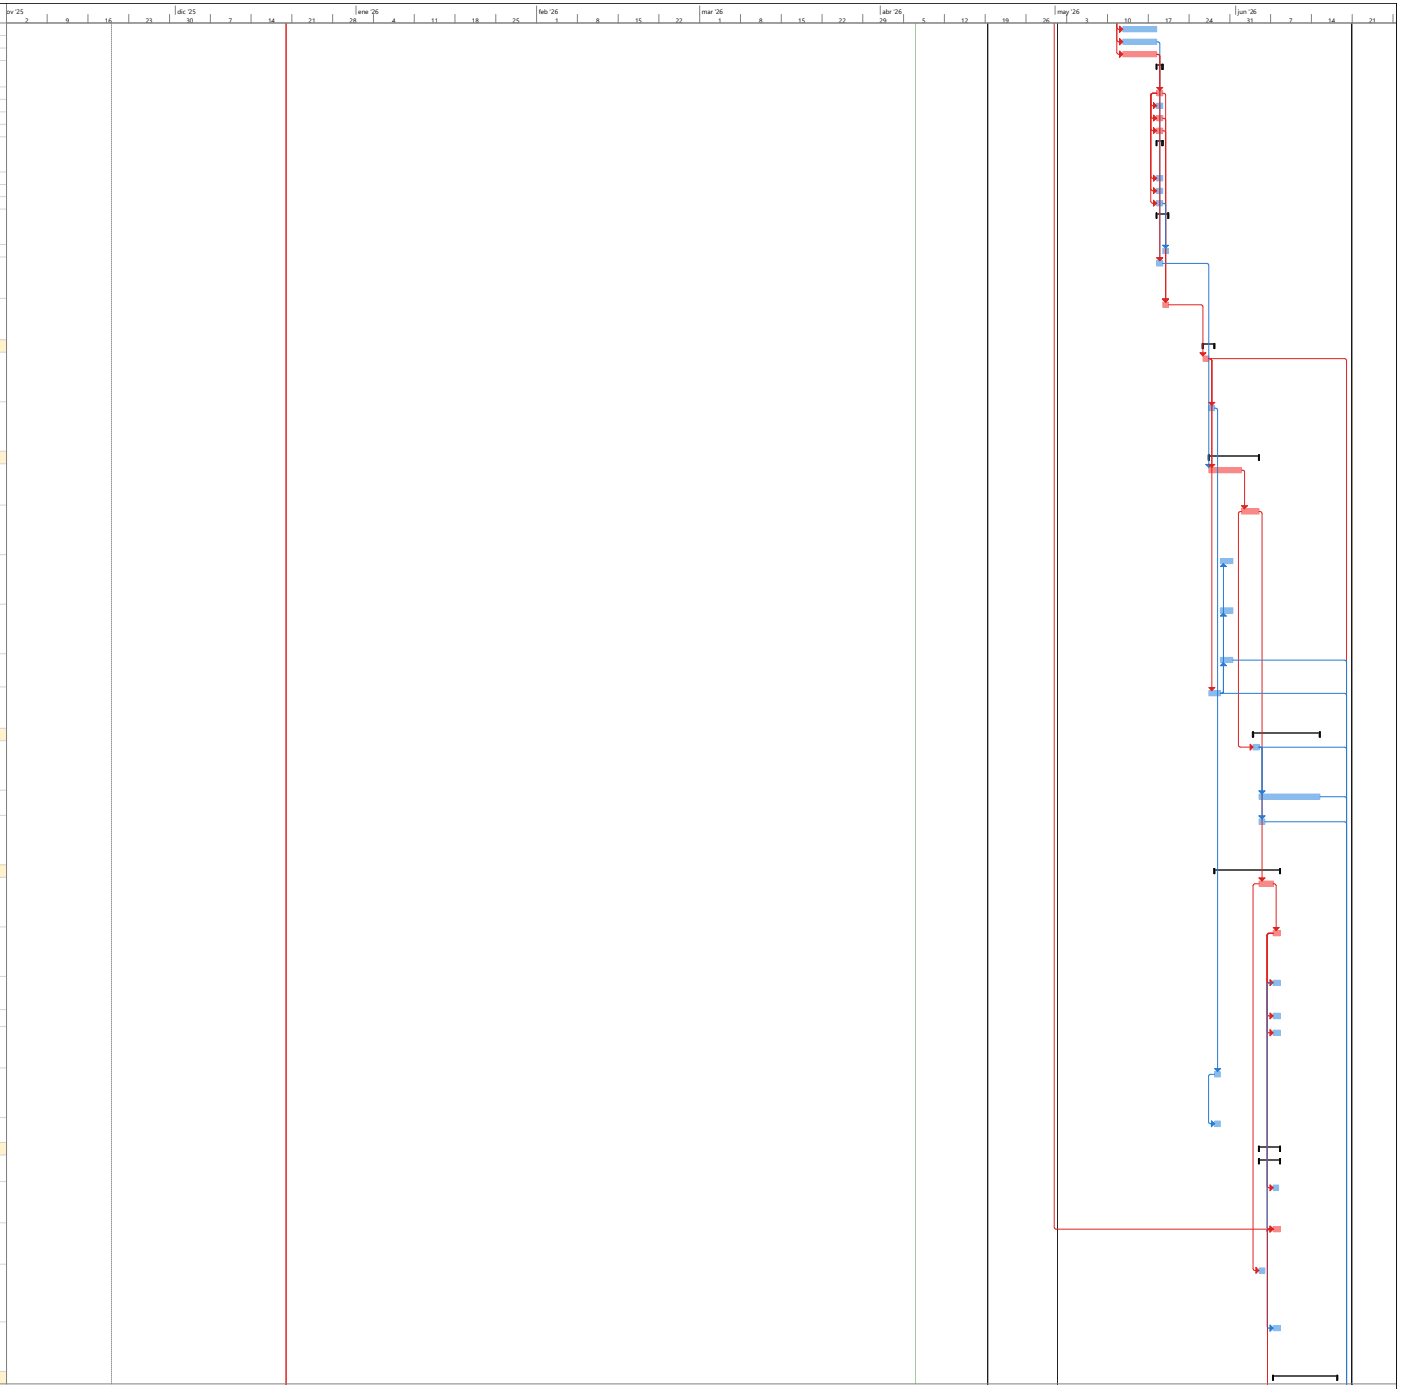

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1586		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1587		8.2	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1588		8.3	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1589		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1590		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1591		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M20 o M90 con pivote superior PTP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1582CC
1592		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1593		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metálica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1586CC
1594		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1595		9.2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1591
1596			**ENTREGA DE PISO 11 - OCCIDENTAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1558;1565;1566;1568**
1597			**SOTANO - CONDUCTORES - CENTRAL**	**115 días**	**sáb 20/12/25**	**mar 28/04/26**	
1598		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**55 días**	**sáb 20/12/25**	**jue 19/02/26**	
1599		6.1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos, incluye ranuras, fisteles y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	20 días	sáb 20/12/25	dom 11/01/26	3FC+5 días
1600		6.3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), cruceitas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	20 días	lun 12/01/26	mar 3/02/26	1599
1601		6.4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir; (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	20 días	mié 28/01/26	jue 19/02/26	1604
1602		6.5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporcion 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	18 días	mié 28/01/26	mar 17/02/26	1604
1603		6.6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir: (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	15 días	mié 28/01/26	vie 13/02/26	1604
1604		6.7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastiestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, fisteles y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	15 días	lun 12/01/26	mié 28/01/26	1599
1605		**5.0**	**PISOS**	**11 días**	**mar 14/04/26**	**lun 27/04/26**	
1606		5.1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2949. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1619CC-10 días
1607		5.2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26	1606CC+2 días
1608		5.3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No 1 h= 7 cm en madacaffia. incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	mié 15/04/26	jue 16/04/26	1606CC+1 día
1609		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**62 días**	**mar 17/02/26**	**mar 28/04/26**	
1610		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	1602
1611		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1610FC+48 días
1612		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1610CC
1613		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1611CC
1614		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1611CC
1615		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	1614CC
1616		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	1615FC+8 días
1617		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**51 días**	**mar 17/02/26**	**mié 15/04/26**	
1618		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**51 días**	**mar 17/02/26**	**mié 15/04/26**	
1619		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1611CC
1620		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mar 14/04/26	mié 15/04/26	1611CC
1621		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1610CC
1622		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1612CC
1623		**8.0**	**CARPINTERÍA METALICA Y DE MADERA**	**5 días**	**mar 14/04/26**	**lun 20/04/26**	

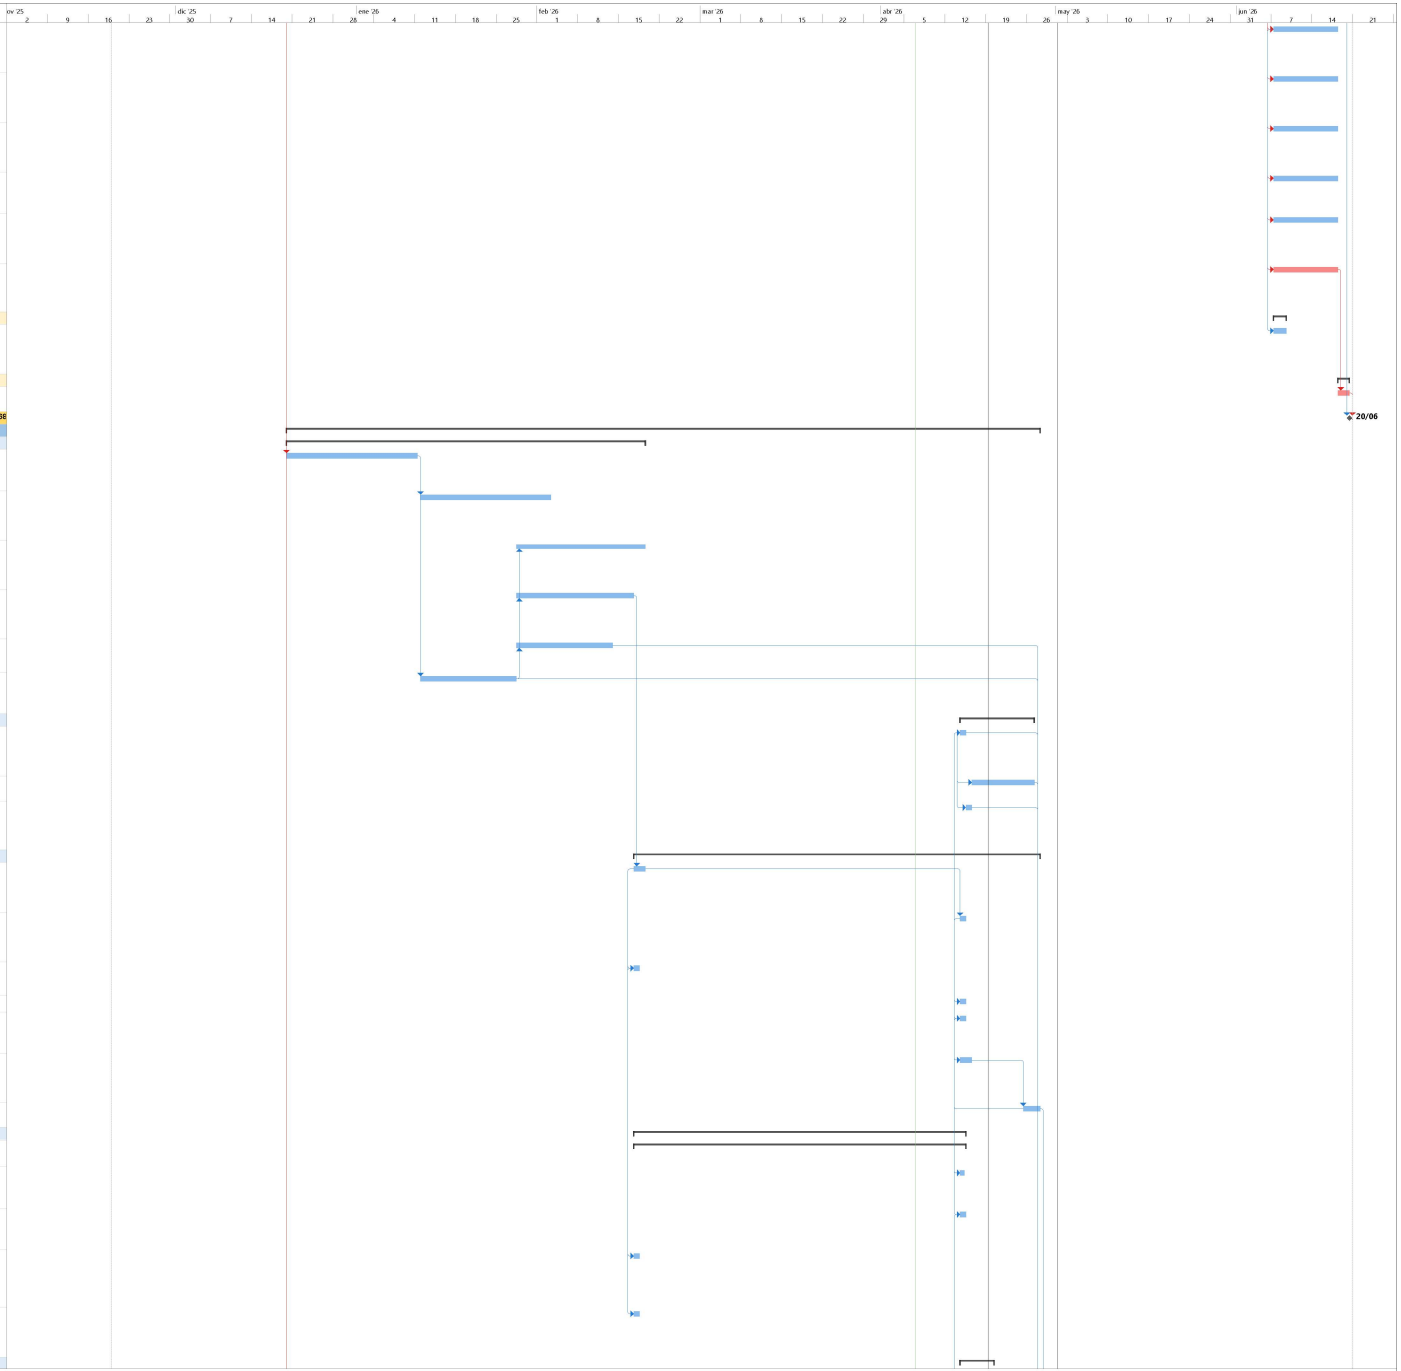

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1624		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1625		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1626		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1627		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para otinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1628		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1629		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	1620CC
1630		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**lun 20/04/26**	**mié 22/04/26**	
1631		9.2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1629
1632			**ENTREGA SOTANOS - CONDUCTORES - CENTRAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**1603;1604;1606;1607**
1633			**SOTANO - ADMINISTRACION - CENTRAL**	**115 días**	**sáb 20/12/25**	**mar 28/04/26**	
1634		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**55 días**	**sáb 20/12/25**	**jue 19/02/26**	
1635		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	20 días	sáb 20/12/25	dom 11/01/26	3FC+5 días
1636		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	20 días	lun 12/01/26	mar 3/02/26	1635
1637		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	20 días	mié 28/01/26	jue 19/02/26	1640
1638		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pinturco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	18 días	mié 28/01/26	mar 17/02/26	1640
1639		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	15 días	mié 28/01/26	vie 13/02/26	1640
1640		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	15 días	lun 12/01/26	mié 28/01/26	1635
1641		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**mié 15/04/26**	**lun 27/04/26**	
1642		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Rosa o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	mié 15/04/26	jue 16/04/26	1652CC-7 días
1643		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26	1642CC+1 día
1644		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	jue 16/04/26	vie 17/04/26	1642CC+1 día
1645		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**60 días**	**mar 17/02/26**	**sáb 25/04/26**	
1646		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	1638
1647		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	1646FC+55 días
1648		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1646CC
1649		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1646CC
1650		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1646CC
1651		4.14	Suministro e instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	2 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	1650CC
1652		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	1647
1653		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**58 días**	**mar 17/02/26**	**jue 23/04/26**	
1654		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**58 días**	**mar 17/02/26**	**jue 23/04/26**	
1655		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26	1647CC
1656		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	1647CC
1657		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1646CC
1658		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26	1648CC
1659		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**5 días**	**mié 22/04/26**	**mar 28/04/26**	
1660		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC

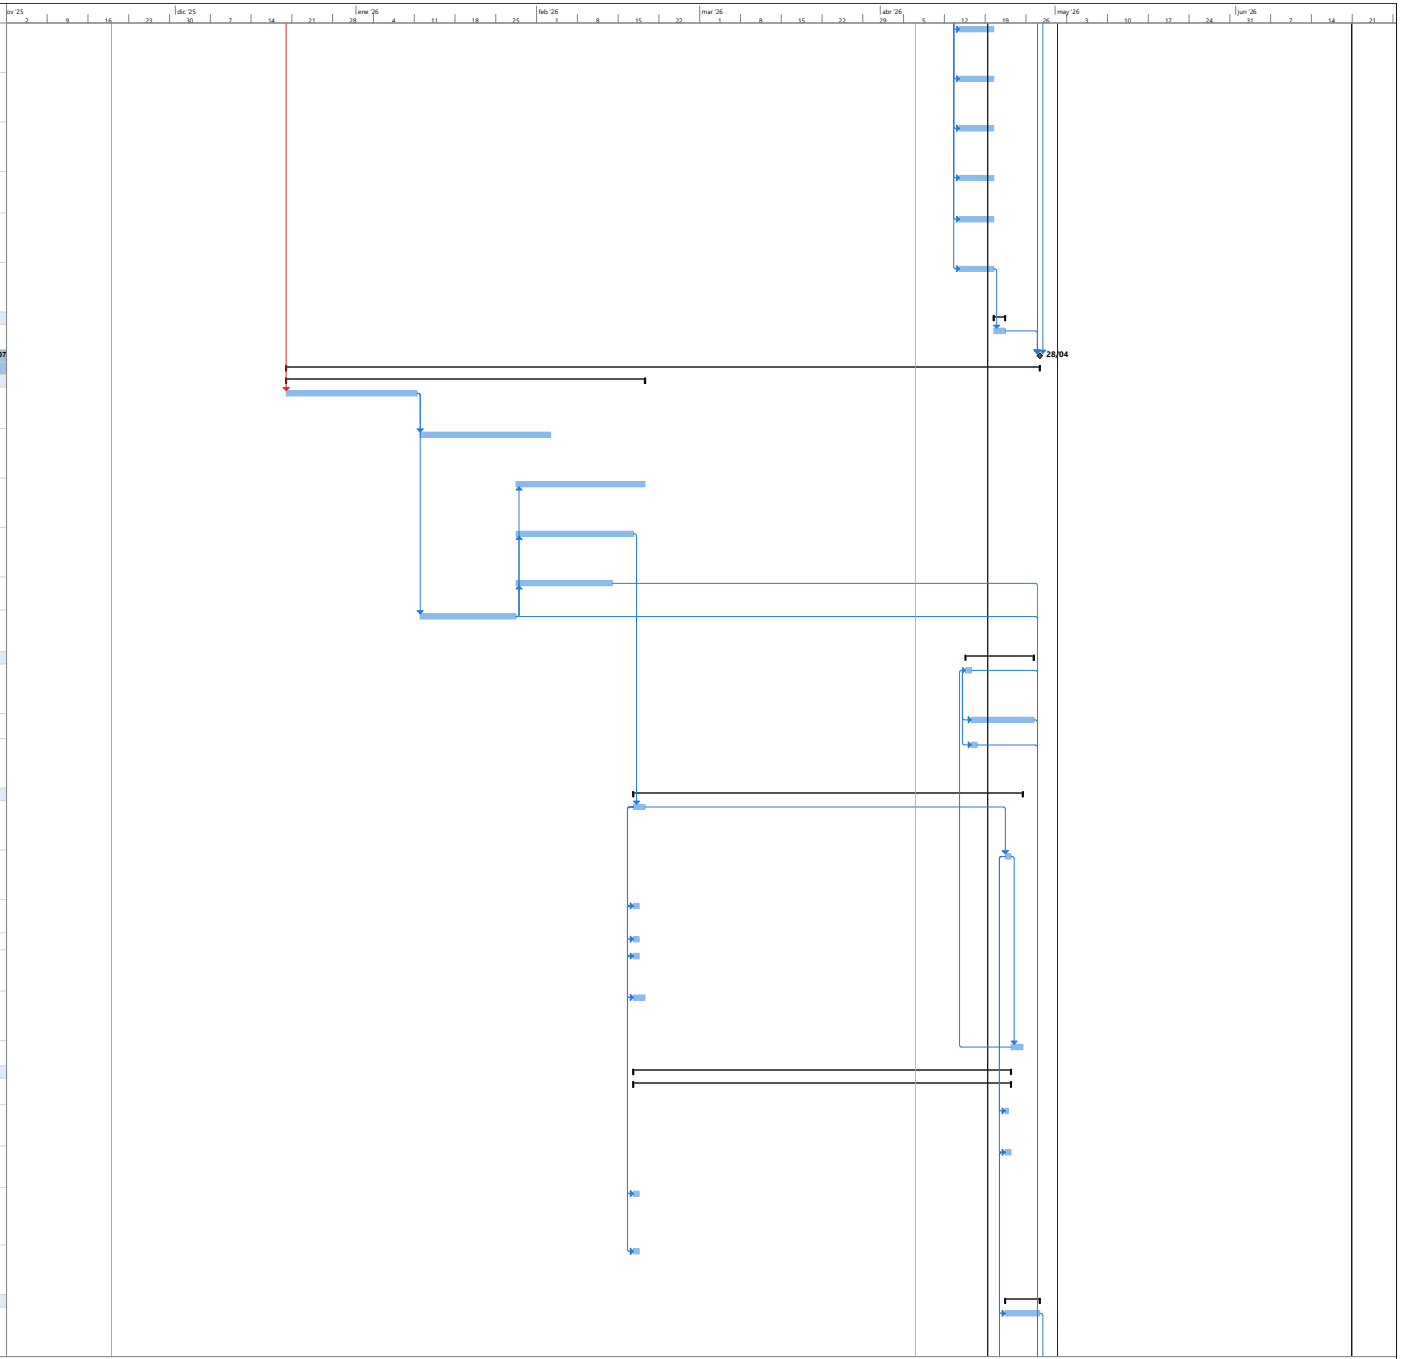


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1661		8.2	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1,80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC
1662		8.3	Suministro e instalación de panel en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1,80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC
1663		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC
1664		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapalúces, pasador recibidor, chapetas	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC
1665		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	1656CC
1666		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**mié 22/04/26**	**vie 24/04/26**	
1667		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	1665CC
1668			**ENTREGA SOTANOS - ADMINISTRACIÓN - CENTRAL**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**1639;1640;1642;1643**
1669			**SOTANO 2 - CENTRAL**	**45 días**	**lun 20/04/26**	**mar 9/06/26**	
1670		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**	
1671		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o pocetas). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	816FC-7 días
1672		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	1671;1681
1673		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	1671
1674		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1671CC
1675		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	1673;1680
1676		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1671CC
1677		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento o	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	1675
1678		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1676CC
1679		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	mar 28/04/26	mié 29/04/26	1671CC;1672
1680		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	1671CC
1681		1.13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	1677
1682		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	1681
1683		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**sáb 25/04/26**	**vie 1/05/26**	
1684		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26	1675;1677
1685		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**vie 1/05/26**	**mar 12/05/26**	
1686		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**vie 1/05/26**	**mar 12/05/26**	
1687		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1672;1681;1682;1684
1688		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1687CC
1689		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1687CC
1690		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**vie 1/05/26**	**mié 6/05/26**	
1691		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1687CC
1692		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1687CC
1693		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1687CC
1694		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**jue 7/05/26**	**jue 7/05/26**	
1695		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1693
1696		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1697		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1698		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1699		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**jue 7/05/26**	**jue 7/05/26**	
1700		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1701		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1702		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1695CC
1703		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**	
1704		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1702
1705		3.13	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1692,1693
1706		3.14	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1695,1697,1698
1707		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**jue 14/05/26**	**dom 17/05/26**	

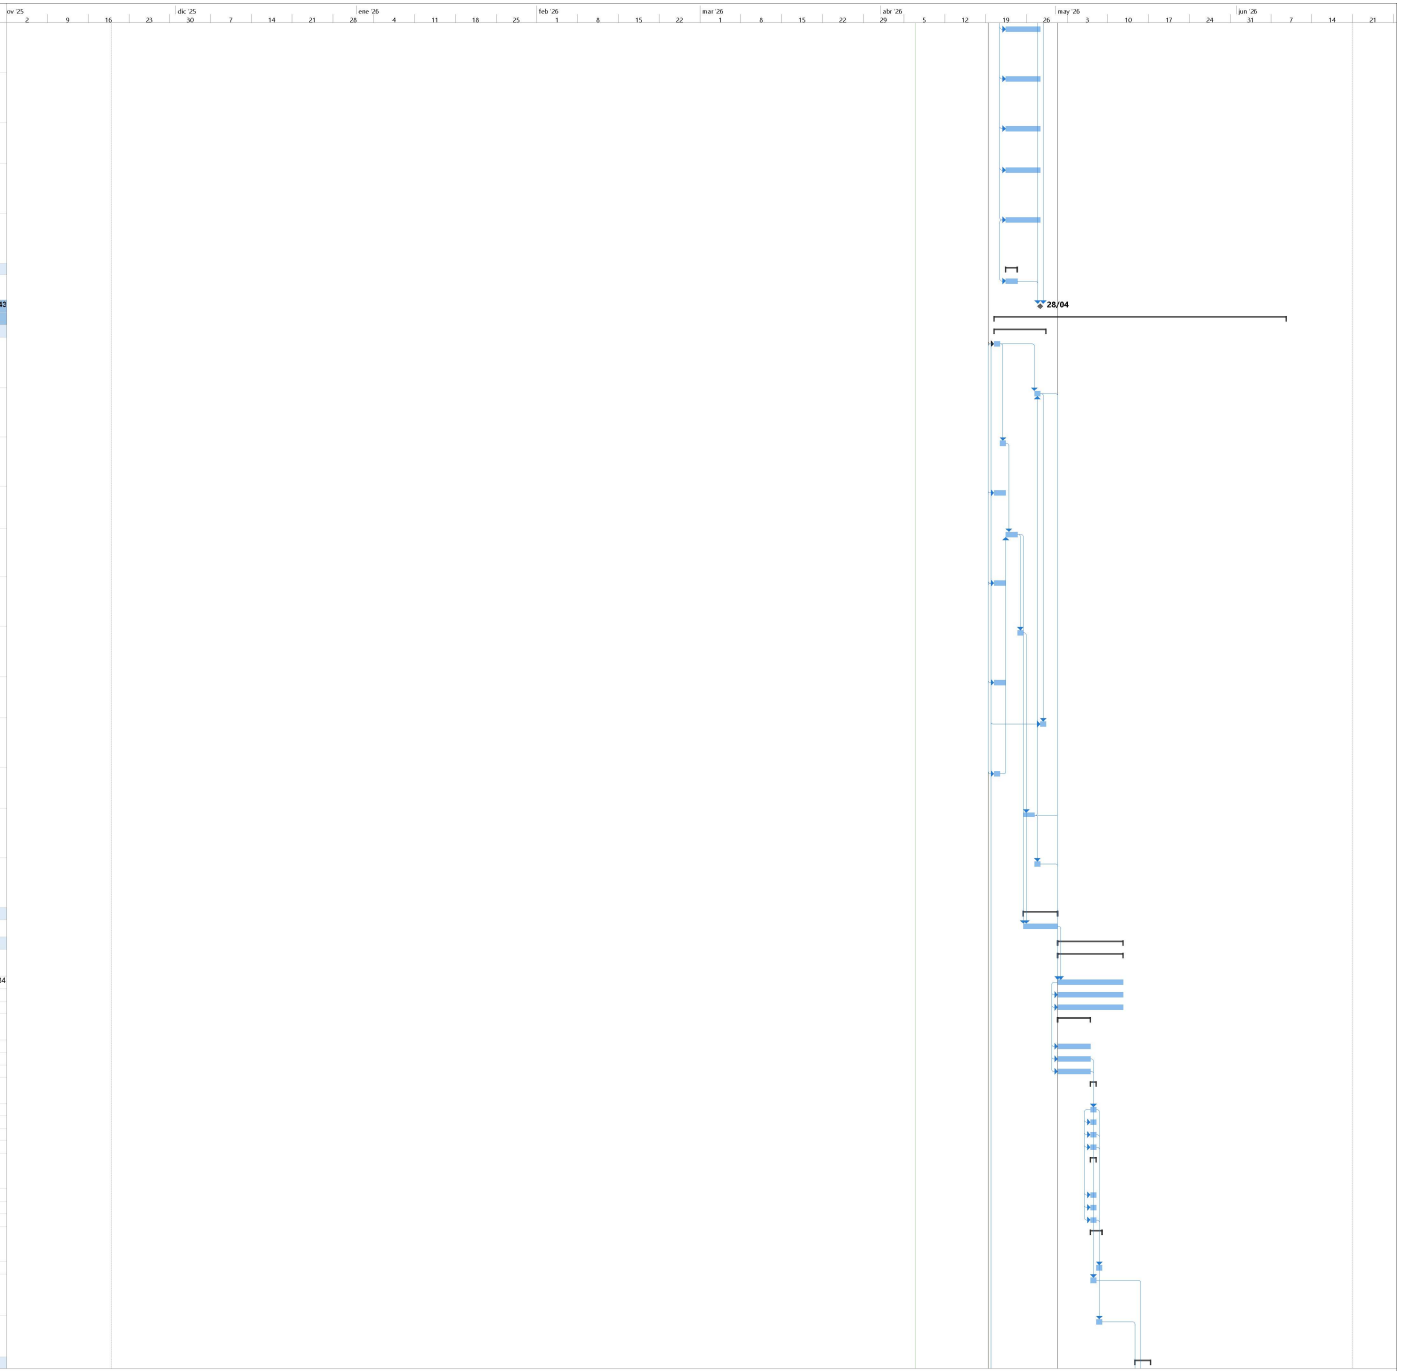


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1708		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	jue 14/05/26	vie 15/05/26	1706FC+5 días
1709		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	vie 15/05/26	dom 17/05/26	1708
1710		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**vie 15/05/26**	**lun 25/05/26**	
1711		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	1705;1708
1712		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26	1711
1713		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir. (raqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1716
1714		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pinturco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1716
1715		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1716
1716		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	vie 15/05/26	lun 18/05/26	1708
1717		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**sáb 23/05/26**	**mié 3/06/26**	
1718		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Rosa o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	1712CC+2 días
1719		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	lun 25/05/26	mié 3/06/26	1718
1720		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	1718
1721		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**dom 17/05/26**	**jue 28/05/26**	
1722		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	1712
1723		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1722
1724		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1723CC
1725		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1723CC
1726		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1723CC
1727		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	dom 17/05/26	lun 18/05/26	1709
1728		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	dom 17/05/26	lun 18/05/26	1727CC
1729		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**lun 25/05/26**	**jue 28/05/26**	
1730		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**lun 25/05/26**	**jue 28/05/26**	
1731		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	1723CC
1732		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1671CC;1723CC
1733		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	1722CC
1734		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1724CC
1735		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**mié 27/05/26**	**dom 7/06/26**	
1736		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1737		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1738		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1739		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1740		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m / 0,70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1741		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1732CC
1742		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mié 27/05/26**	**vie 29/05/26**	

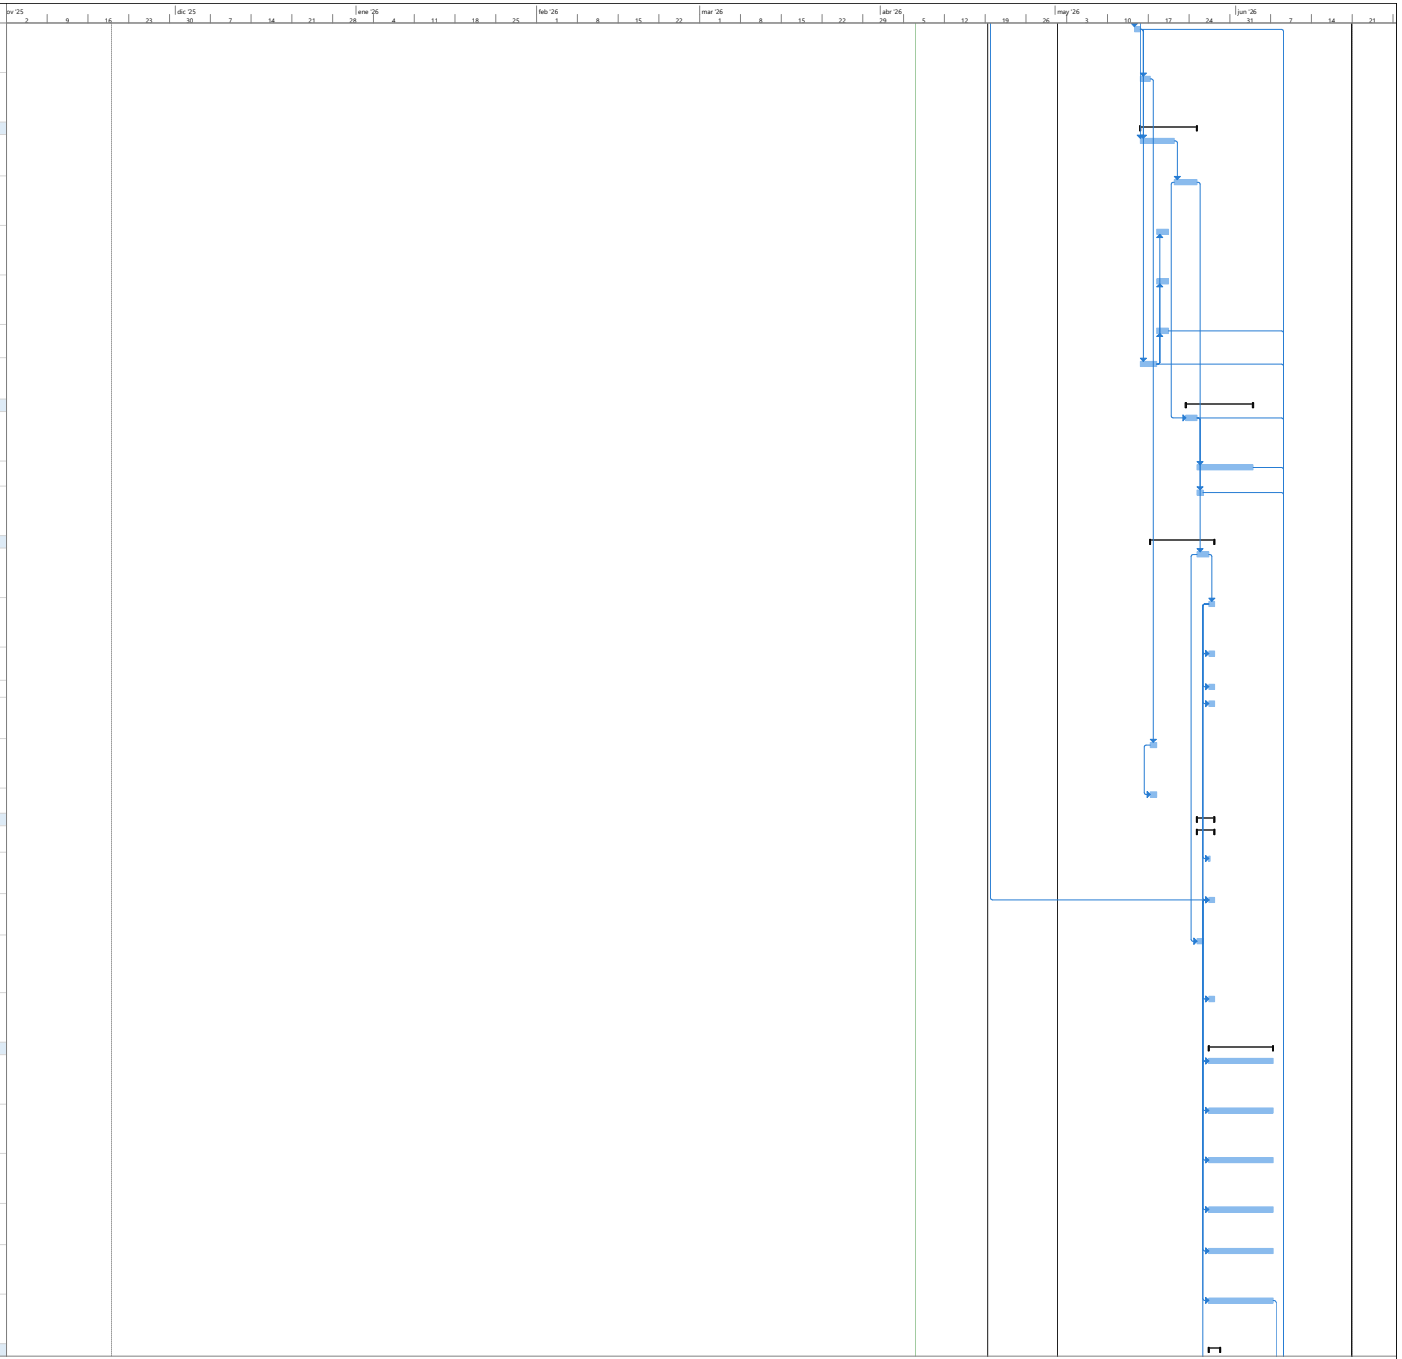

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1743		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1736CC
1744		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1745		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1741
1746			**ENTREGA DE SOTANO 2 - CENTRAL**	**0 días**	**mar 9/06/26**	**mar 9/06/26**	**1708;1715;1716;1718**
1747			**ESCALERAS - CENTRAL**	**45 días**	**lun 20/04/26**	**mar 9/06/26**	
1748		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**	
1749		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	816FC-7 días
1750		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	1749,1759
1751		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	1749
1752		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1749CC
1753		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	1751;1758
1754		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1749CC
1755		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	1753
1756		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	1754CC
1757		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	mar 28/04/26	mié 29/04/26	1749CC;1750
1758		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	1749CC
1759		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	1755
1760		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	1759
1761		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**sáb 25/04/26**	**vie 1/05/26**	
1762		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26	1753;1755
1763		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**vie 1/05/26**	**mar 12/05/26**	
1764		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**vie 1/05/26**	**mar 12/05/26**	
1765		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1750;1759;1760;1762
1766		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1765CC
1767		3.1.3	Diámetro 4"	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	1765CC
1768		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**vie 1/05/26**	**mié 6/05/26**	
1769		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1765CC
1770		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1765CC
1771		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	1765CC
1772		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**jue 7/05/26**	**jue 7/05/26**	
1773		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1771
1774		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1775		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1776		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1777		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.60 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**jue 7/05/26**	**jue 7/05/26**	
1778		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1779		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1780		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1773CC
1781		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**	
1782		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1780
1783		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3". 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1770;1771
1784		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1773;1775;1776
1785		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**jue 14/05/26**	**dom 17/05/26**	
1786		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	jue 14/05/26	vie 15/05/26	1784FC+5 días
1787		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	vie 15/05/26	dom 17/05/26	1786
1788		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**vie 15/05/26**	**lun 25/05/26**	
1789		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye rasuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	1783;1786
1790		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26	1789

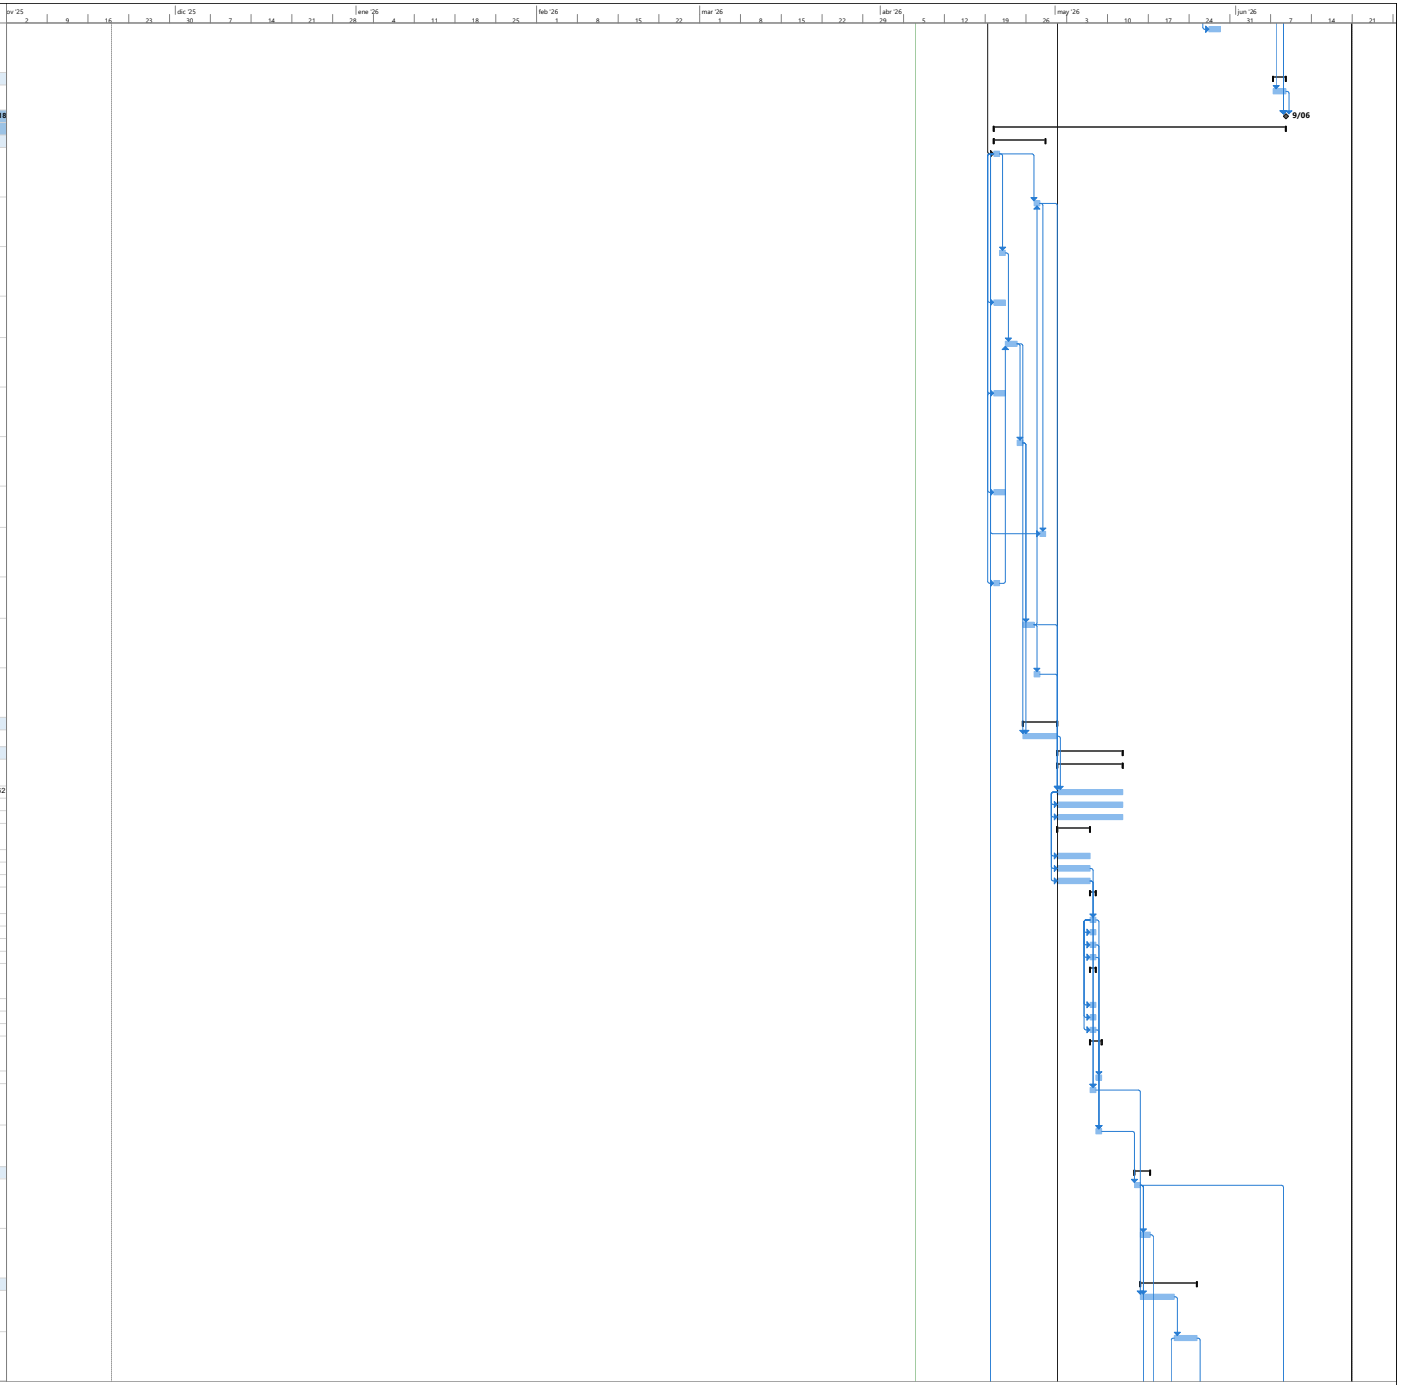

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1791		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1794
1792		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1794
1793		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir. (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	1794
1794		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	vie 15/05/26	lun 18/05/26	1786
1795		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**sáb 23/05/26**	**mié 3/06/26**	
1796		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	1790CC+2 días
1797		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	lun 25/05/26	mié 3/06/26	1796
1798		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción,	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	1796
1799		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**dom 17/05/26**	**jue 28/05/26**	
1800		4.3	Suministro y colocación de taza báltica plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	1790
1801		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1800
1802		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1801CC
1803		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1801CC
1804		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1801CC
1805		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	dom 17/05/26	lun 18/05/26	1787
1806		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	dom 17/05/26	lun 18/05/26	1805CC
1807		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**lun 25/05/26**	**jue 28/05/26**	
1808		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**lun 25/05/26**	**jue 28/05/26**	
1809		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	1801CC
1810		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1749CC;1801CC
1811		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	1800CC
1812		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1802CC
1813		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**mié 27/05/26**	**dom 7/06/26**	
1814		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1815		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1816		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1817		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1818		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1819		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior P7P y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26	1810CC
1820		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mié 27/05/26**	**vie 29/05/26**	
1821		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metalica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1814CC
1822		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1823		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1819
1824			**ENTREGA DE ESCALERAS - CENTRAL**	**0 días**	**mar 9/06/26**	**mar 9/06/26**	**1786;1793;1794;1796**
1825			**BATERIA INNOVACION - PISO 1**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1826		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1827		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o poceta). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1828		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1827;1837

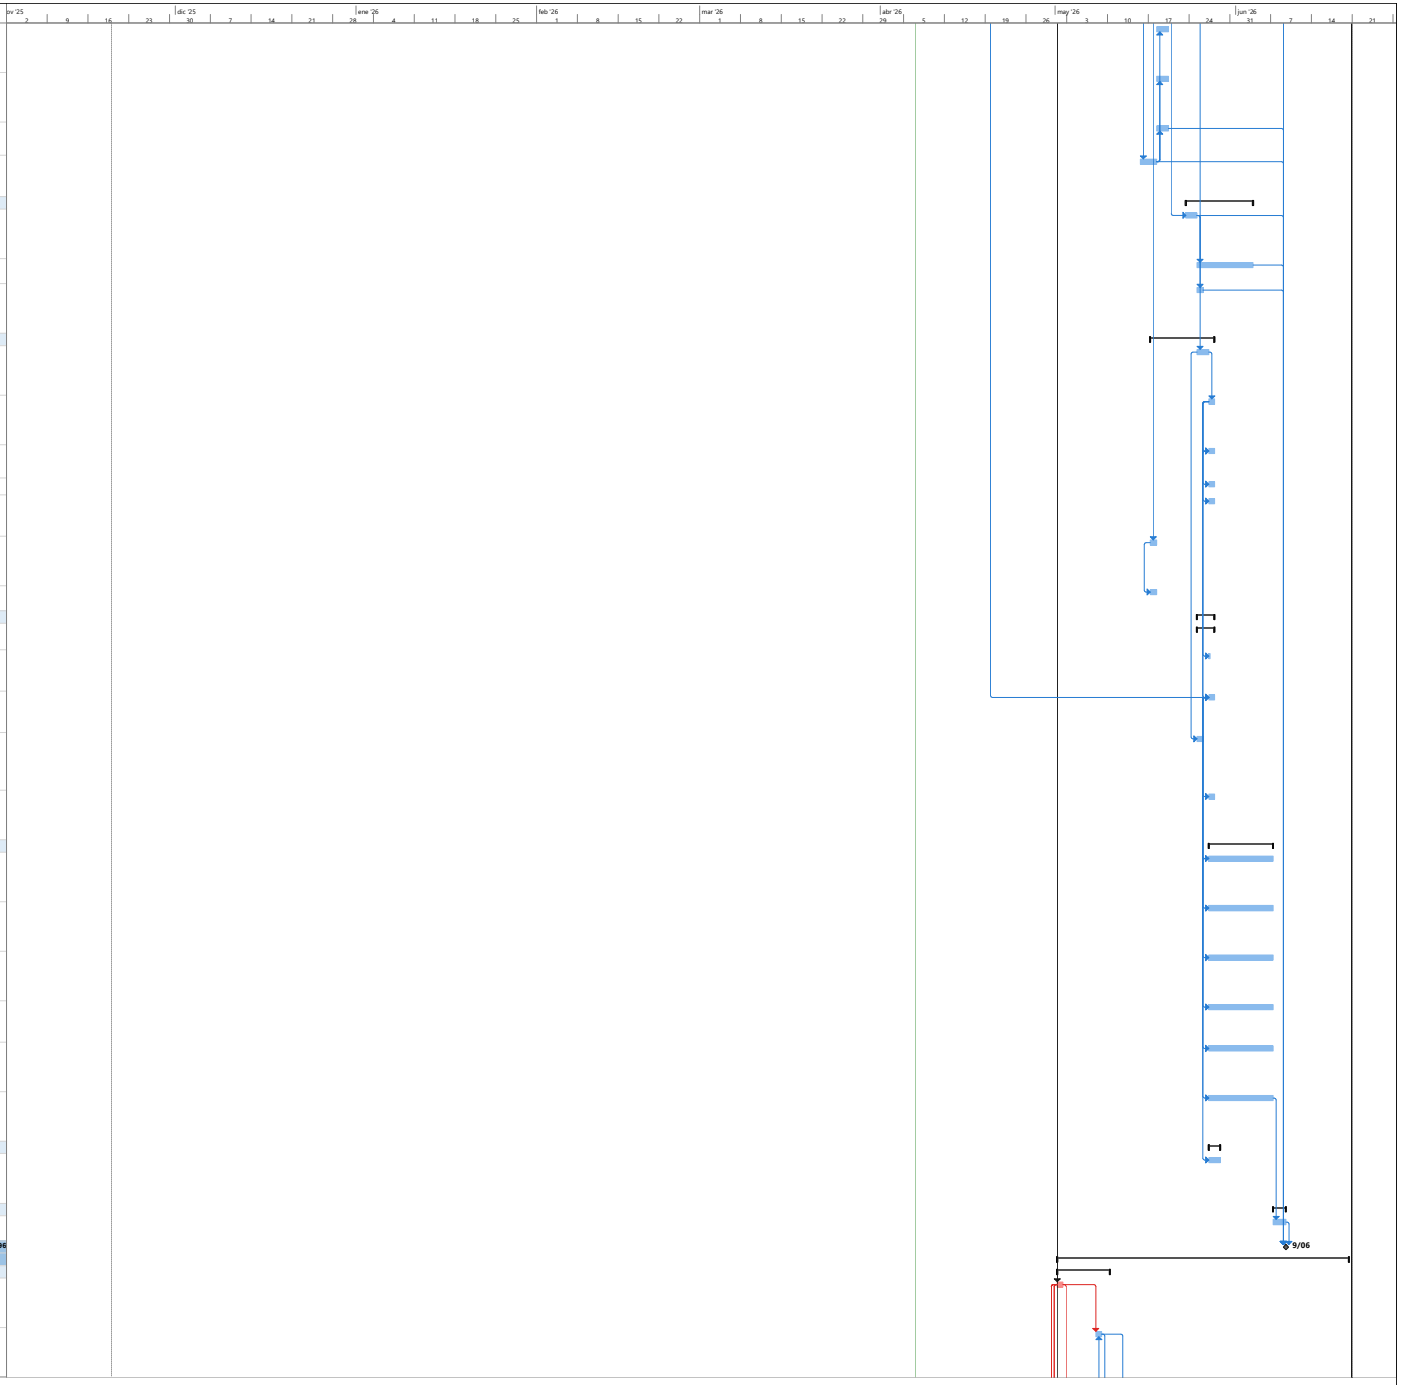


Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1829		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1827
1830		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1827CC
1831		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1829;1836
1832		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1827CC
1833		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1831
1834		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1832CC
1835		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1827CC;1828
1836		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1827CC
1837		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1833
1838		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluy	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1837
1839		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1840		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1831;1833
1841		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1842		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1843		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1828;1837;1838;1840
1844		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1843CC
1845		3.1.3	Diámetro 4"	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1843CC
1846		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1847		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1843CC
1848		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1843CC
1849		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1843CC
1850		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1851		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1849
1852		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1853		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1854		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1855		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tuberia, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1856		3.11.1	Ø = ¾"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1857		3.11.2	Ø = ½"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1858		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1851CC
1859		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1860		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1858
1861		3.13	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 3". 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1848;1849
1862		3.14	Suministro, transporte e instalación de andaje para tubería de 2". 1 1/2". 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1851;1853;1854
1863		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1864		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1862FC+5 días
1865		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1864
1866		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1867		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y dados. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1861;1864
1868		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1867
1869		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o rutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1872
1870		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente para muros y cielos, acabado seminmate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1872
1871		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir. (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1872
1872		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastoestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1864
1873		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	

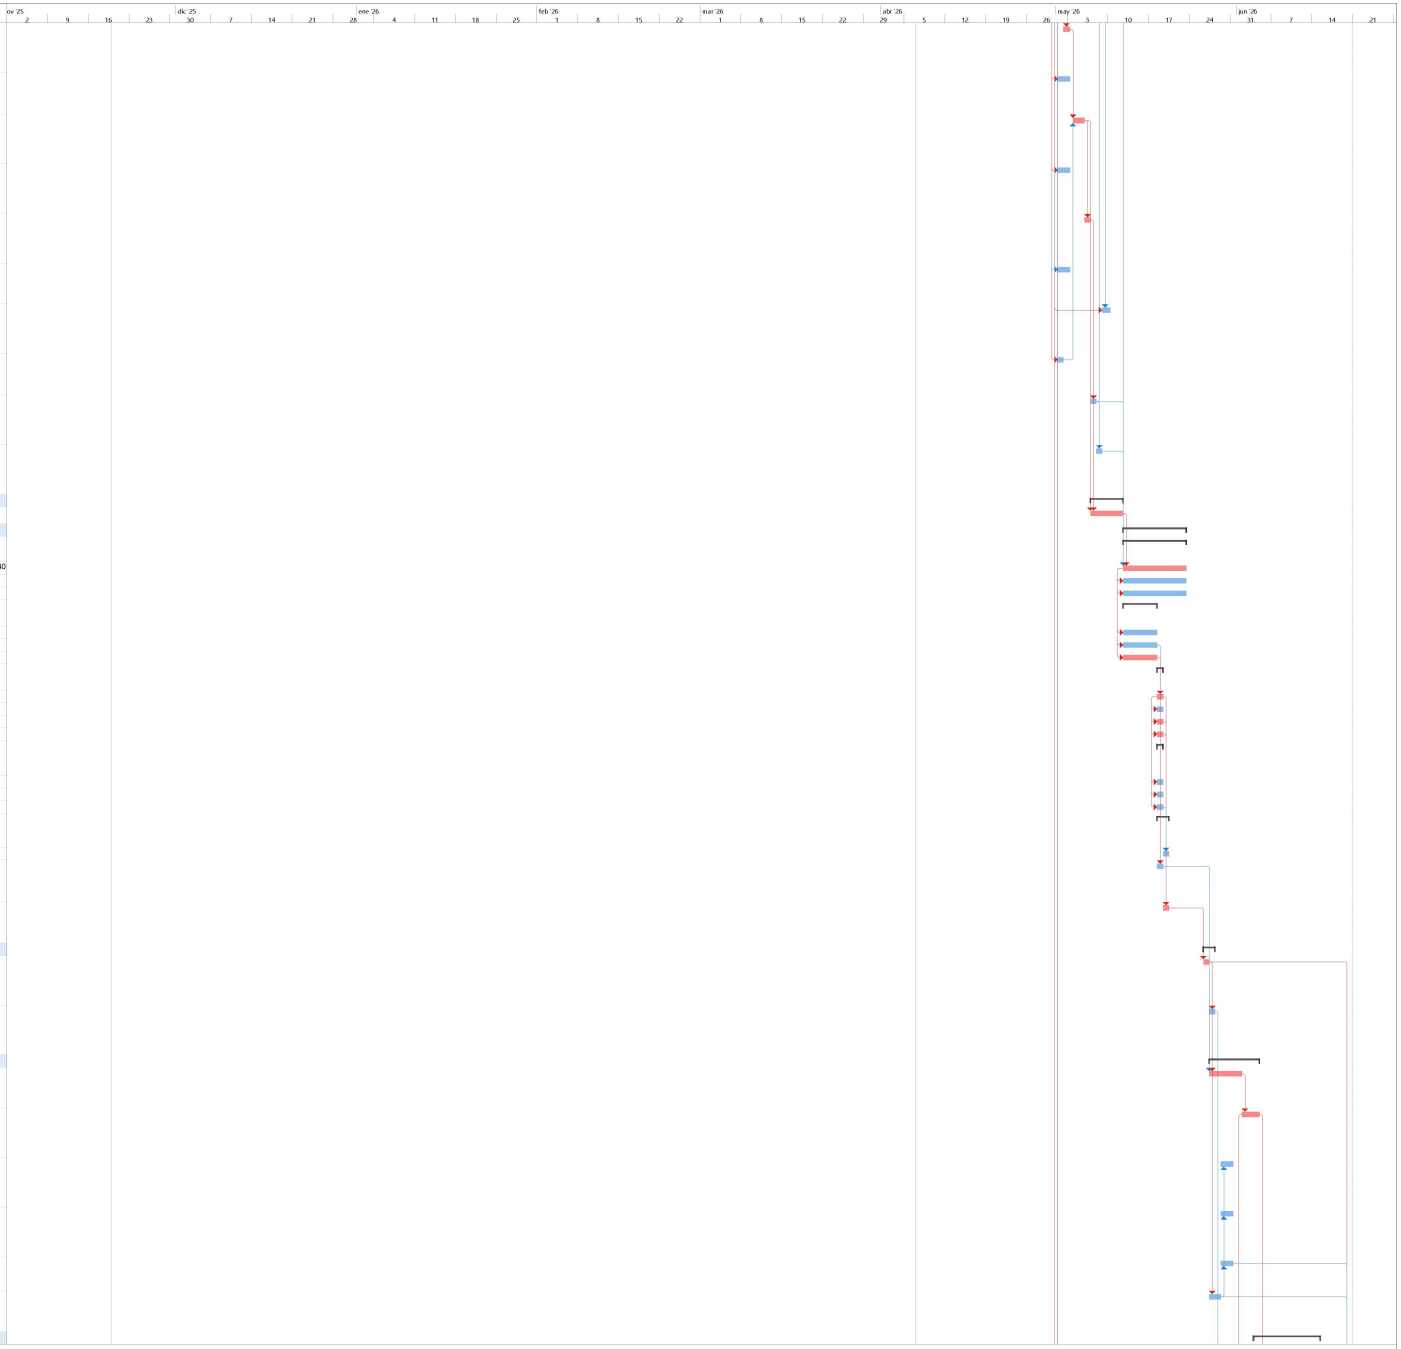


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1874		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1868CC+2 días
1875		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1874
1876		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1874
1877		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1878		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1868
1879		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1878
1880		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1879CC
1881		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1879CC
1882		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1879CC
1883		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1865
1884		4. 15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1883CC
1885		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1886		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1887		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera, Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1879CC
1888		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1827CC;1879CC
1889		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1878CC
1890		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1880CC
1891		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1892		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23' 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1893		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1894		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1895		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1896		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1897		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PTP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1888CC
1898		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1899		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tuberia PTS de 40x40x2 mm. y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1892CC
1900		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1901		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1897
1902			**ENTREGA DE BATERIA INNOVACIÓN PISO 1**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1864;1871;1872;1874**
1903			**BATERIA PISO 4 - CENTRAL**	**45 días**	**vie 1/05/26**	**sáb 20/06/26**	
1904		**1.0**	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**vie 1/05/26**	**dom 10/05/26**	
1905		1,1	Retiro de aparatos sanitarios (Sanitarios, lavamanos, lavaescobas, orinales y/o pocela). Incluye retiro de abastos y/o grifería y tapón de salida; cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte d	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	816FC+3 días
1906		1,2	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes eléctricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales re	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1905;1915
1907		1,3	Retiro de marco de puerta de cualquier material y dimensión. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	1 día	sáb 2/05/26	dom 3/05/26	1905
1908		1,4	Retiro de mesones de lavamanos. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1905CC
1909		1,5	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de lo	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	1907;1914
1910		1,7	Retiro de división en acero inoxidable, altura hasta 1.80 m. La unidad Incluye tabique y/o paral mas puerta. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1905CC

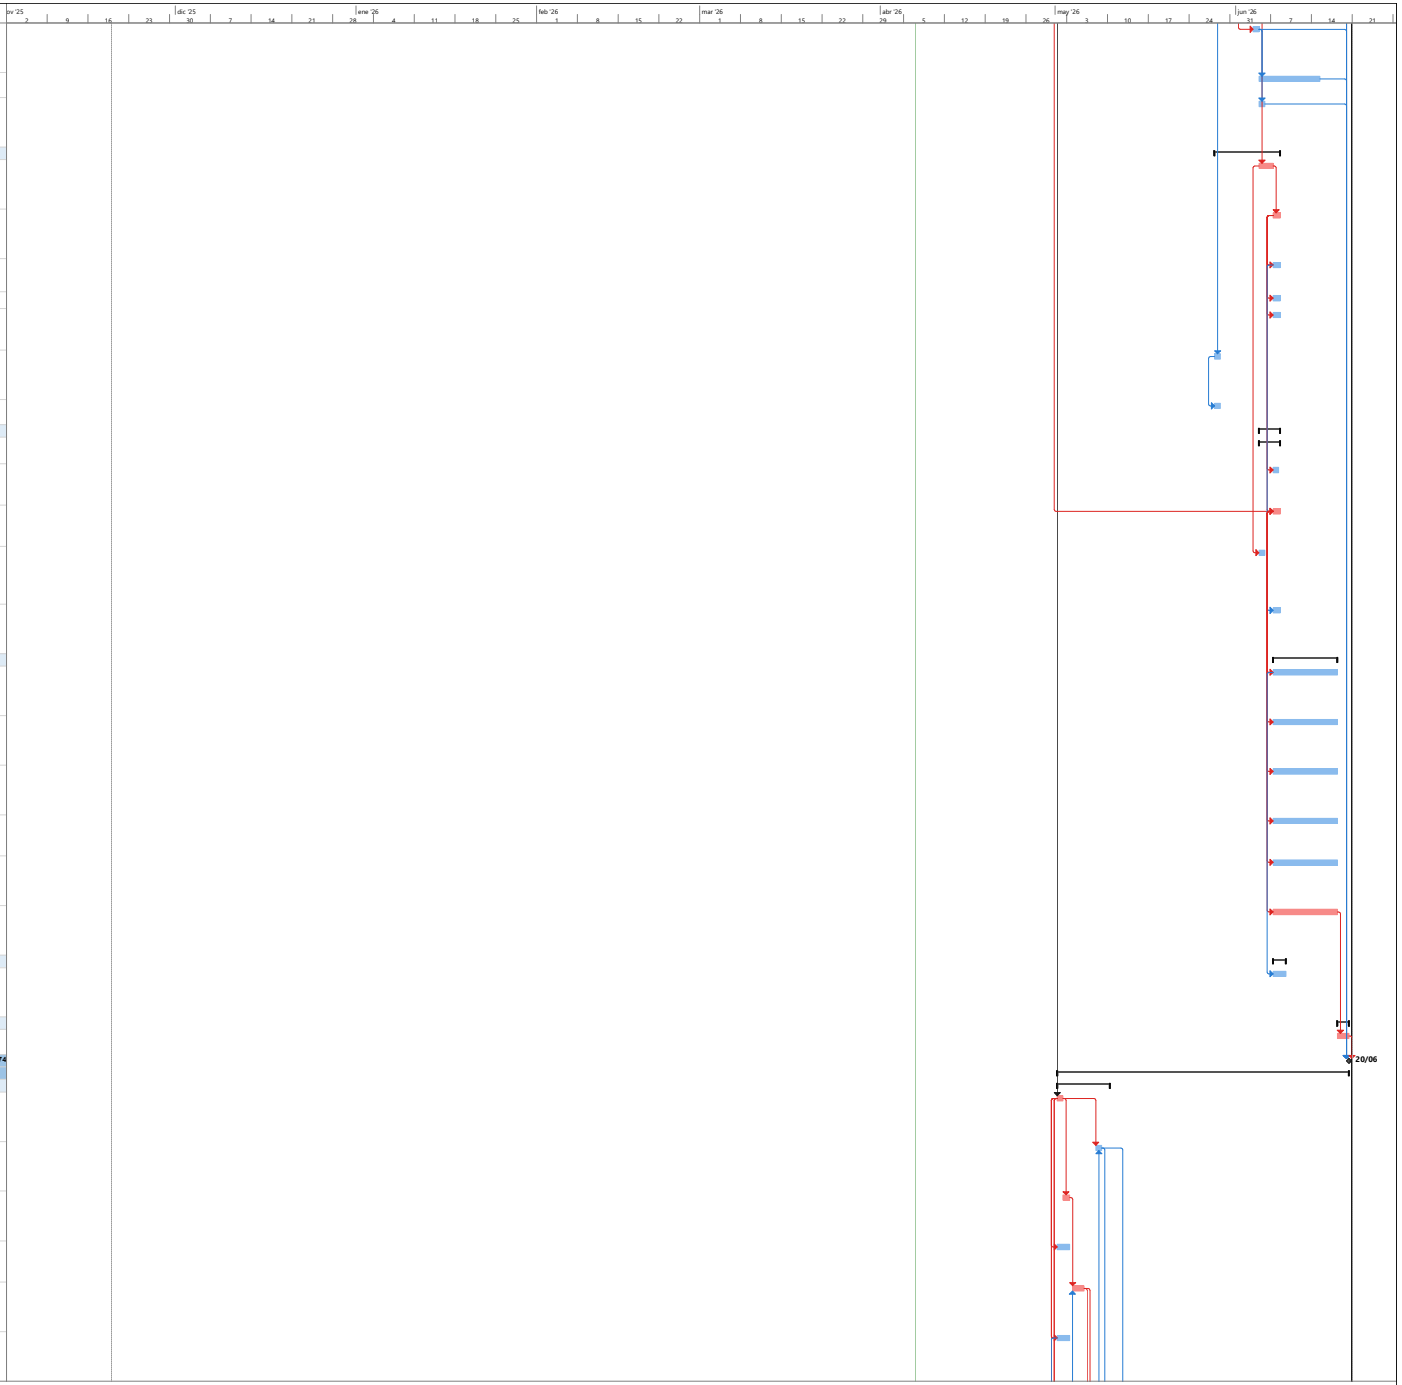

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1911		1,8	Demolición muro en ladrillo aligerado, espesor 15-20 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento q	1 día	mié 6/05/26	mié 6/05/26	1909
1912		1,9	Retiro de mueble en madera. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría.	2 días	vie 1/05/26	dom 3/05/26	1910CC
1913		1,10	Retiro de accesorios como jaboneras, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, toalleros. Incluye disposición final de los elementos en el sitio que indique la normatividad vigente y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables	1 día	sáb 9/05/26	dom 10/05/26	1905CC;1906
1914		1,11	Retiro de espejo. Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normalividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	1905CC
1915		1,13	Demolición de pisos en baldosa de cualquier material y cualquier espesor. Incluye demolición de mortero de nivelación hasta nivel de losa. (Manual o a máquina). Incluye cargue, transporte y botada, cumpliendo la normatividad establecida por la entidad com	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	1911
1916		1,14	Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Inclay	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	1915
1917		**NP**	**OBRAS EXTRAS**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	
1918		NP03	Regata en muro para instalaciones hidrosanitarias y ventilaciones	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	1909;1911
1919		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1920		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**10 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 23/05/26**	
1921		3.1.1	Diámetro 2".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1906;1915;1916;1918
1922		3.1.2	Diámetro 3".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1921CC
1923		3.1.3	Diámetro 4".	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	1921CC
1924		**3.9**	**Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S. Incluye accesorios (Considerada de la Yee al aparato).**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**lun 18/05/26**	
1925		3.9.1	En 2", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1921CC
1926		3.9.2	En 3", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1921CC
1927		3.9.3	En 4", de L=1.50/2.00 m.	5 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	1921CC
1928		**3.10**	**Suministro y colocación de tubería PVC - Presión, incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1929		3.10.1	De diámetro ¾"RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1927
1930		3.10.2	De diámetro ½"RDE 9.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1931		3.10.4	De diámetro 1½". RDE 11	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1932		3.10.5	De diámetro 2"RDE 21	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1933		**3.11**	**Construcción de salida hidráulica en tubería PVC-P. Incluye tubería, accesorios, cámara de aire , limpiador, soldadura, L= 0.50 a 2.00 m. (Considerada de la red principal al aparato) .**	**1 día**	**lun 18/05/26**	**mar 19/05/26**	
1934		3.11.1	Ø = ½"RDE 11, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1935		3.11.2	Ø = 1/2"RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1936		3.11.4	Ø = 1 1/4"- 2 - 2½" RDE 9, 500 PSI.	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1929CC
1937		**3.12**	**Suministro e instalación de llaves de paso tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**	**2 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**	
1938		3.12.5	Diámetro 2".	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1936
1939		3.13	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 3", 4"y 6" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	1926;1927
1940		3.14	Suministro, transporte e instalación de anclaje para tubería de 2", 1 1/2", 1"y 3/4" con abrazadera tipo horquilla: Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	1 día	mar 19/05/26	mié 20/05/26	1929;1931;1932
1941		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**mar 26/05/26**	**jue 28/05/26**	
1942		2.2	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualqui	1 día	mar 26/05/26	mié 27/05/26	1940FC+5 días
1943		2.3	Suministro, transporte e instalación de muros en placa superboard de 10mm, 1 (una) cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualq	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	1942
1944		**6.0**	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**8 días**	**mié 27/05/26**	**jue 4/06/26**	
1945		6,1	Construcción de revoque con mortero 1:4 para muros y cielos. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3m. Las alturas superiores en el mismo muro se pagarán en el ítem correspondiente	5 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	1939;1942
1946		6,3	Suministro e instalación de enchape cerámica pared 30x60 Corona o equivalente. Incluye pegacor de Corona o equivalente, lechada (Concolor de Corona o equivalente), crucetas plásticas de 2 mm y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	1945
1947		6,4	Suministro y aplicación de pintura para baños, tipo Corona o equivalente sobre pintura existente, tres manos. Incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasqueteada o sutiada). Color a definir aprobado por la interventoría. En muros y c	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1950
1948		6,5	Suministro y aplicación de pintura Epóxica (Dos componentes proporción 3:1) de primera calidad, tipo tipo epoxiconstrucción de pinturco o equivalente para muros y cielos, acabado semimate, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1950
1949		6,6	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para tubería PVC. Incluye preparación de la superficie a intervenir, (limpieza de tubería). Color a definir, aprobado por la interventoría.	2 días	vie 29/05/26	dom 31/05/26	1950
1950		6,7	Suministro y aplicación de estuco plástico, tipo plastestuco o similar, para exteriores. Incluye ranuras, filetes y dilataciones y acondicionamiento de la superficie. En cualquier altura	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	1942
1951		**5.0**	**PISOS**	**10 días**	**jue 4/06/26**	**lun 15/06/26**	
1952		5,1	Suministro, transporte e instalación de piso en Baldosa 30 x 30 blanca grano mixtura crema tipo Roca o equivalente,que cumpla con la norma NTC 2849. Incluye juntas, mortero 1:4 para pega de espesor 4cm, lechada preparada, remates, varilla de dilatación, d	1 día	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1946CC+2 días
1953		5,2	Pulida y brillada de piso en baldosa de grano existente, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	9 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	1952
1954		5,3	Construcción de guardaescoba en granito pulido No.1, h= 7 cm en mediacaña, incluye mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm en aluminio y todo lo necesario para su correcta construcción.	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1952
1955		**4.0**	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**10 días**	**jue 28/05/26**	**lun 8/06/26**	
1956		4.3	Suministro y colocación de taza bática plus color blanco, de entrada posterior Institucional tipo Corona o equivalente, con capacidad de evacuación de 1000 gr. de sólidos y 4,8 lpf. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para su correcta ins	2 días	vie 5/06/26	dom 7/06/26	1946
1957		4.4	Suministro y colocación de lavamanos para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona o equivalente, color blanco. Incluye soporte de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1956

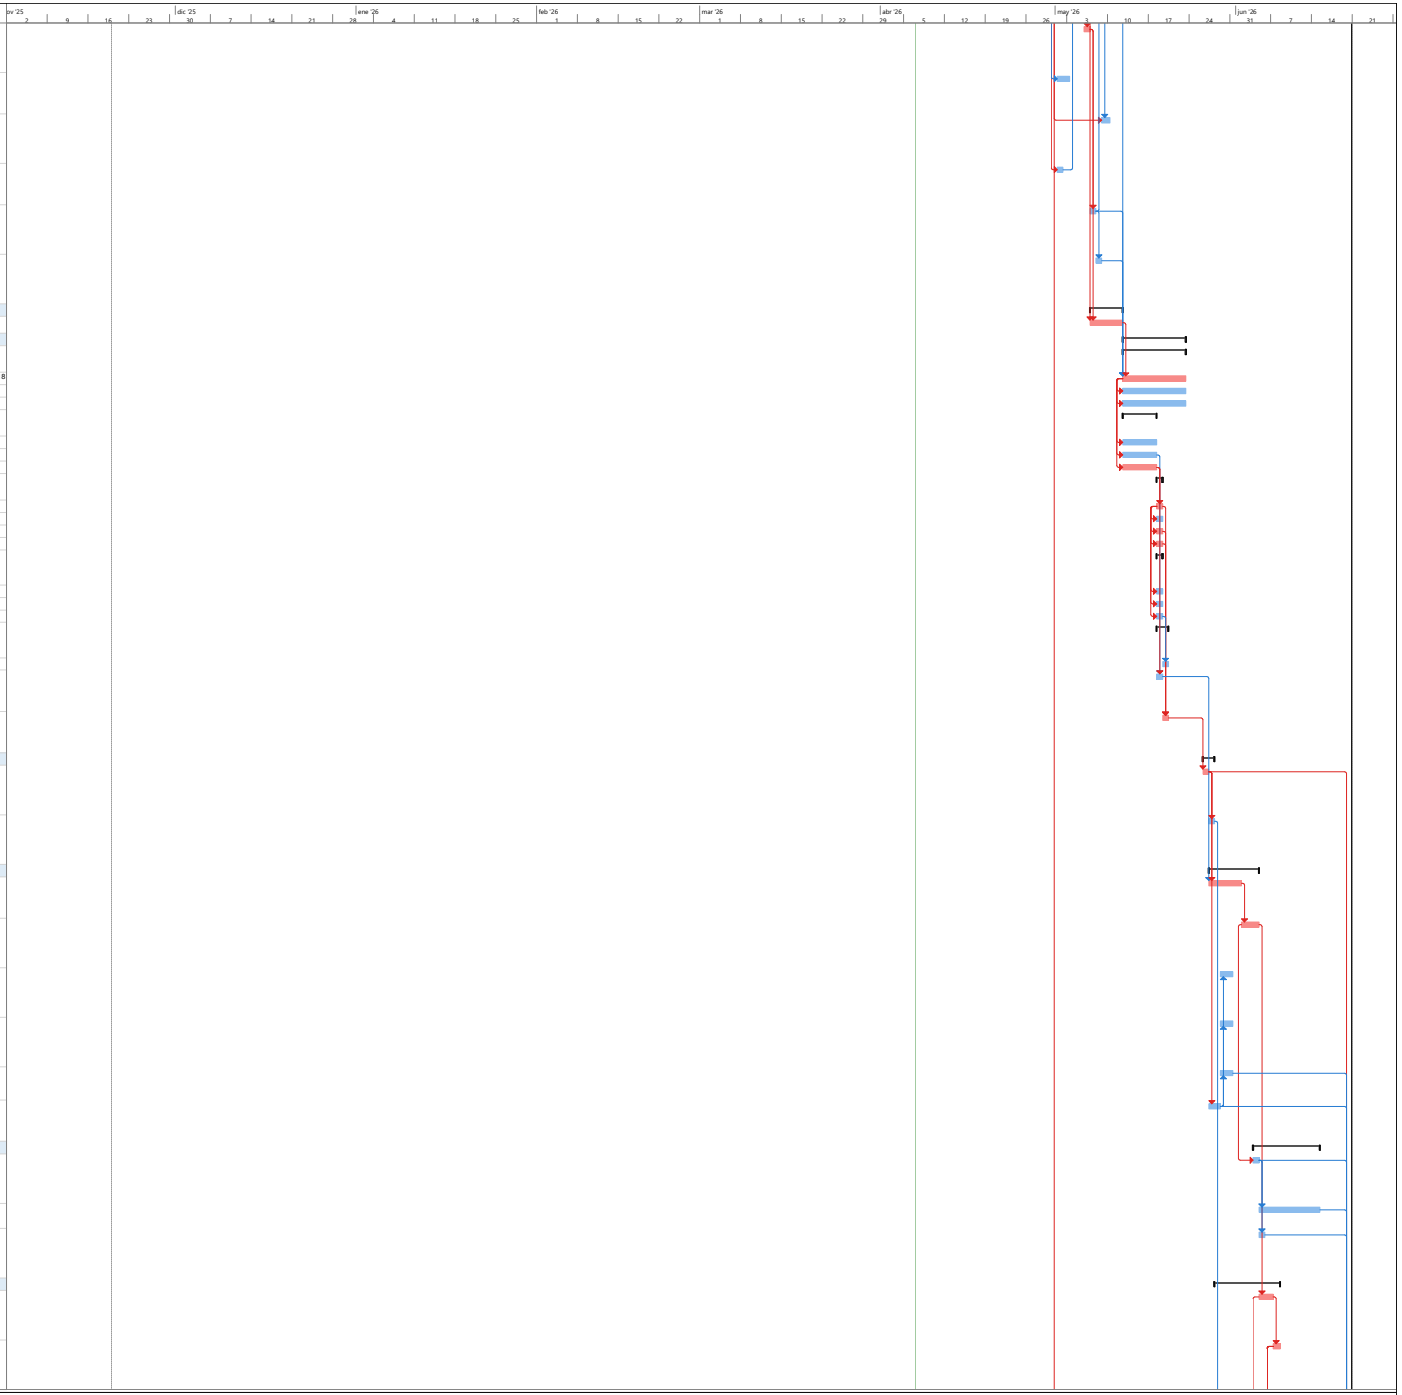

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1958		4.6	Suministro y colocación de orinal Gota tipo institucional. Incluye desagüe sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1957CC
1959		4.7	Suministro y colocación de rejilla de piso en aluminio. De Ø = 3".	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1957CC
1960		4.12	Suministro e instalación de barra recta en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida de 1.00m. Incluye pernos de anclaje, escudos, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1957CC
1961		4.14	Suministro e Instalación de mesón lineal en Quarztone de 0,60mts de ancho, con salpicadero Integrado de 10cms (contra muro) y faldones de 25cms X 3 lados (partes libres). Incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y fun	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1943
1962		4.15	Suministro y colocación de espejo biselado de 4mm flotante. Incluye elementos de fijación y demás elementos para su correcta instalación.	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	1961CC
1963		**3.0**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1964		**3.1**	**Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**lun 8/06/26**	
1965		3.2	Suministro y colocación abastos para lavamanos, se debe retirar el existente cuando se requiera. Incluye acoples y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	0,5 días	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1957CC
1966		3.3	Retiro y reinstalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona. Incluye silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1905CC;1957CC
1967		3.4	Suministro e instalación de Válvula de descarga tipo push para tazas Institucionales. Consumo de 4.8 Litros de agua por descarga. Diseño robusto para alto tráfico de personas. Sistema antivandálico; incluye todos los materiales necesarios para su correcta	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1956CC
1968		3.7	Suministro e instalación de válvula para orinal tipo push de Corona entrada posterior empotrada. Incluye retiro de la válvula existente y disposición final de la misma y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	1 día	dom 7/06/26	lun 8/06/26	1958CC
1969		**8.0**	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**10 días**	**dom 7/06/26**	**jue 18/06/26**	
1970		8.1	Suministro, transporte e instalación de tabique de 1.23/ 1.44m x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable, e	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1971		8.2	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,15/0,30 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1972		8.3	Suministro e instalación de paral en acero inoxidable entre 0,40/0,60 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1973		8.4	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado tipo Socoda o equivalente. Incluye chazos y tornillos de fijación de 0,96 x 0,46 m.	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1974		8.5	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.50m / 0.70m x 1.60m en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, tipo Socoda o equivalente. Incluye bisagras pivotantes, paral estructural de soporte, tapaluces, pasador recibidor, chapetas	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1975		8.9	Suministro, transporte e instalación de gato hidráulico de piso tipo Speedy M25 o M60 con pivote superior PYP y picaporte. Incluye retiro del existente, adecuación y/o ampliación de la caja donde se instalará el nuevo elemento, en caso de requerirse y tod	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26	1966CC
1976		**2.0**	**MAMPOSTERÍA**	**2 días**	**dom 7/06/26**	**mar 9/06/26**	
1977		2.4	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina metalica calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm, y 1 refuerzo horizontal en tubería metálica de 40x40x2 mm, marco metálico c	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	1970CC
1978		**9.0**	**VARIOS**	**2 días**	**jue 18/06/26**	**sáb 20/06/26**	
1979		9,2	Perforación cilíndrica sobre elementos de concreto. Incluye perforación y, limpieza. No incluye refuerzos.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	1975
1980			**ENTREGA DE BATERÍA PISO 4 CENTRAL**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**1942;1949;1950;1952**
1981			ENTREGA FINAL, DOCUMENTACIÓN Y CIERRE ADMINISTRATIVO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	894;972;1050;1128;12
1982			FIN DEL PROYECTO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1981

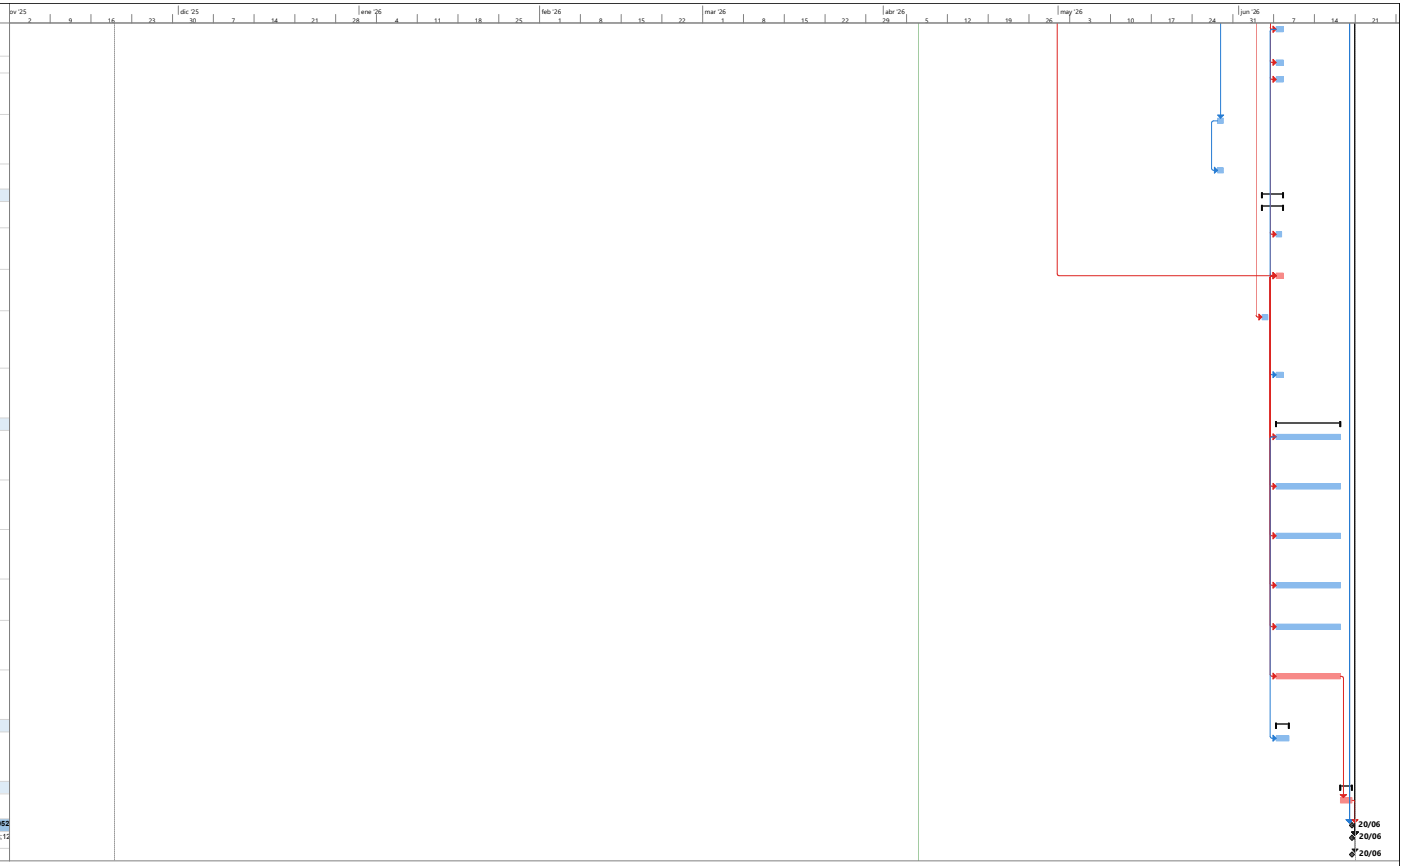

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
