
CRONOGRAMA DE TRABAJO - CONSORCIO VIAS URBANAS

Grupo	Actividad	Inicio	Fin	Duración
G1	**TOTAL GRUPO 1**	**1/5/2026**	**18/8/2026**	109
G1	Preliminares	1/5/2026	15/5/2026	14
G1	Descapote y excavación	15/5/2026	30/5/2026	15
G1	Mejoramiento subrasante y sub base granular	30/5/2026	14/6/2026	15
G1	Excavación bordillos y sumideros	14/6/2026	29/6/2026	15
G1	Reparación de MH existentes	14/6/2026	29/6/2026	15
G1	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	14/6/2026	29/6/2026	15
G1	Instalación de bordillos y sumideros	29/6/2026	14/7/2026	15
G1	Instalación de pavimento rígido	14/7/2026	3/8/2026	20
G1	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	3/8/2026	18/8/2026	15
G1	Demolición de pavimento viejo (No Aplica)	-	-	-
G2	**TOTAL GRUPO 2**	**29/5/2026**	**23/9/2026**	117
G2	Preliminares	29/5/2026	12/6/2026	14
G2	**Demolición de pavimento viejo**	**12/6/2026**	**26/6/2026**	14
G2	**Excavación**	**26/6/2026**	**17/7/2026**	21
G2	Mejoramiento subrasante y sub base granular	17/7/2026	1/8/2026	15
G2	Excavación bordillos y sumideros	1/8/2026	16/8/2026	15
G2	Reparación de MH existentes	1/8/2026	16/8/2026	15
G2	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	1/8/2026	16/8/2026	15
G2	Instalación de bordillos y sumideros	9/8/2026	20/8/2026	11
G2	**Instalación de pavimento rígido**	**18/8/2026**	**8/9/2026**	21
G2	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	8/9/2026	23/9/2026	15
G3	**TOTAL GRUPO 3**	**26/6/2026**	**13/10/2026**	109
G3	Preliminares	26/6/2026	10/7/2026	14
G3	Descapote y excavación	10/7/2026	25/7/2026	15
G3	Mejoramiento subrasante y sub base granular	25/7/2026	9/8/2026	15
G3	Excavación bordillos y sumideros	9/8/2026	24/8/2026	15
G3	Reparación de MH existentes	9/8/2026	24/8/2026	15
G3	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	9/8/2026	24/8/2026	15
G3	Instalación de bordillos y sumideros	24/8/2026	8/9/2026	15
G3	Instalación de pavimento rígido	8/9/2026	28/9/2026	20
G3	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	28/9/2026	13/10/2026	15
G3	Demolición de pavimento viejo (No Aplica)	-	-	-
G4	**TOTAL GRUPO 4**	**24/7/2026**	**10/11/2026**	109
G4	Preliminares	24/7/2026	7/8/2026	14
G4	Demolición de pavimento viejo	7/8/2026	14/8/2026	7
G4	Excavación	14/8/2026	22/8/2026	8
G4	Mejoramiento subrasante y sub base granular	22/8/2026	6/9/2026	15
G4	Excavación bordillos y sumideros	6/9/2026	21/9/2026	15
G4	Reparación de MH existentes	6/9/2026	21/9/2026	15
G4	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	6/9/2026	21/9/2026	15
G4	Instalación de bordillos y sumideros	21/9/2026	6/10/2026	15
G4	Instalación de pavimento rígido	6/10/2026	26/10/2026	20
G4	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	26/10/2026	10/11/2026	15
G5	**TOTAL GRUPO 5**	**21/8/2026**	**8/12/2026**	109
G5	Preliminares	21/8/2026	4/9/2026	14
G5	Demolición de pavimento viejo	4/9/2026	11/9/2026	7
G5	Excavación	11/9/2026	19/9/2026	8
G5	Mejoramiento subrasante y sub base granular	19/9/2026	4/10/2026	15
G5	Excavación bordillos y sumideros	4/10/2026	19/10/2026	15
G5	Reparación de MH existentes	4/10/2026	19/10/2026	15

CRONOGRAMA DE TRABAJO - CONSORCIO VIAS URBANAS

G5	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	4/10/2026	19/10/2026	15
G5	Instalación de bordillos y sumideros	19/10/2026	3/11/2026	15
G5	Instalación de pavimento rígido	3/11/2026	23/11/2026	20
G5	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	23/11/2026	8/12/2026	15
G6	**TOTAL GRUPO 6**	**18/9/2026**	**5/1/2027**	109
G6	Preliminares	18/9/2026	2/10/2026	14
G6	Demolición de pavimento viejo	2/10/2026	9/10/2026	7
G6	Excavación	9/10/2026	17/10/2026	8
G6	Mejoramiento subrasante y sub base granular	17/10/2026	1/11/2026	15
G6	Excavación bordillos y sumideros	1/11/2026	16/11/2026	15
G6	Reparación de MH existentes	1/11/2026	16/11/2026	15
G6	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	1/11/2026	16/11/2026	15
G6	Instalación de bordillos y sumideros	16/11/2026	1/12/2026	15
G6	Instalación de pavimento rígido	1/12/2026	21/12/2026	20
G6	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	21/12/2026	5/1/2027	15
G7	**TOTAL GRUPO 7**	**16/10/2026**	**2/2/2027**	109
G7	Preliminares	16/10/2026	30/10/2026	14
G7	Demolición de pavimento viejo	30/10/2026	6/11/2026	7
G7	Excavación	6/11/2026	14/11/2026	8
G7	Mejoramiento subrasante y sub base granular	14/11/2026	29/11/2026	15
G7	Excavación bordillos y sumideros	29/11/2026	14/12/2026	15
G7	Reparación de MH existentes	29/11/2026	14/12/2026	15
G7	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	29/11/2026	14/12/2026	15
G7	Instalación de bordillos y sumideros	14/12/2026	29/12/2026	15
G7	Instalación de pavimento rígido	29/12/2026	18/1/2027	20
G7	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	18/1/2027	2/2/2027	15
G8	**TOTAL GRUPO 8**	**13/11/2026**	**2/3/2027**	109
G8	Preliminares	13/11/2026	27/11/2026	14
G8	Demolición de pavimento viejo	27/11/2026	4/12/2026	7
G8	Excavación	4/12/2026	12/12/2026	8
G8	Mejoramiento subrasante y sub base granular	12/12/2026	27/12/2026	15
G8	Excavación bordillos y sumideros	27/12/2026	11/1/2027	15
G8	Reparación de MH existentes	27/12/2026	11/1/2027	15
G8	Reparación por daños en acueductos y alcantarillados	27/12/2026	11/1/2027	15
G8	Instalación de bordillos y sumideros	11/1/2027	26/1/2027	15
G8	Instalación de pavimento rígido	26/1/2027	15/2/2027	20
G8	Construcción de cunetas, andenes y limpieza	15/2/2027	2/3/2027	15
Liquidación	**TOTAL LIQUIDACIÓN**	**3/3/2027**	**30/4/2027**	58
Liquidación	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA (MES 1)	3/3/2027	30/3/2027	27
Liquidación	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA (MES 2)	31/3/2027	30/4/2027	30

GANTT - CONSORCIO VIAS URBANAS

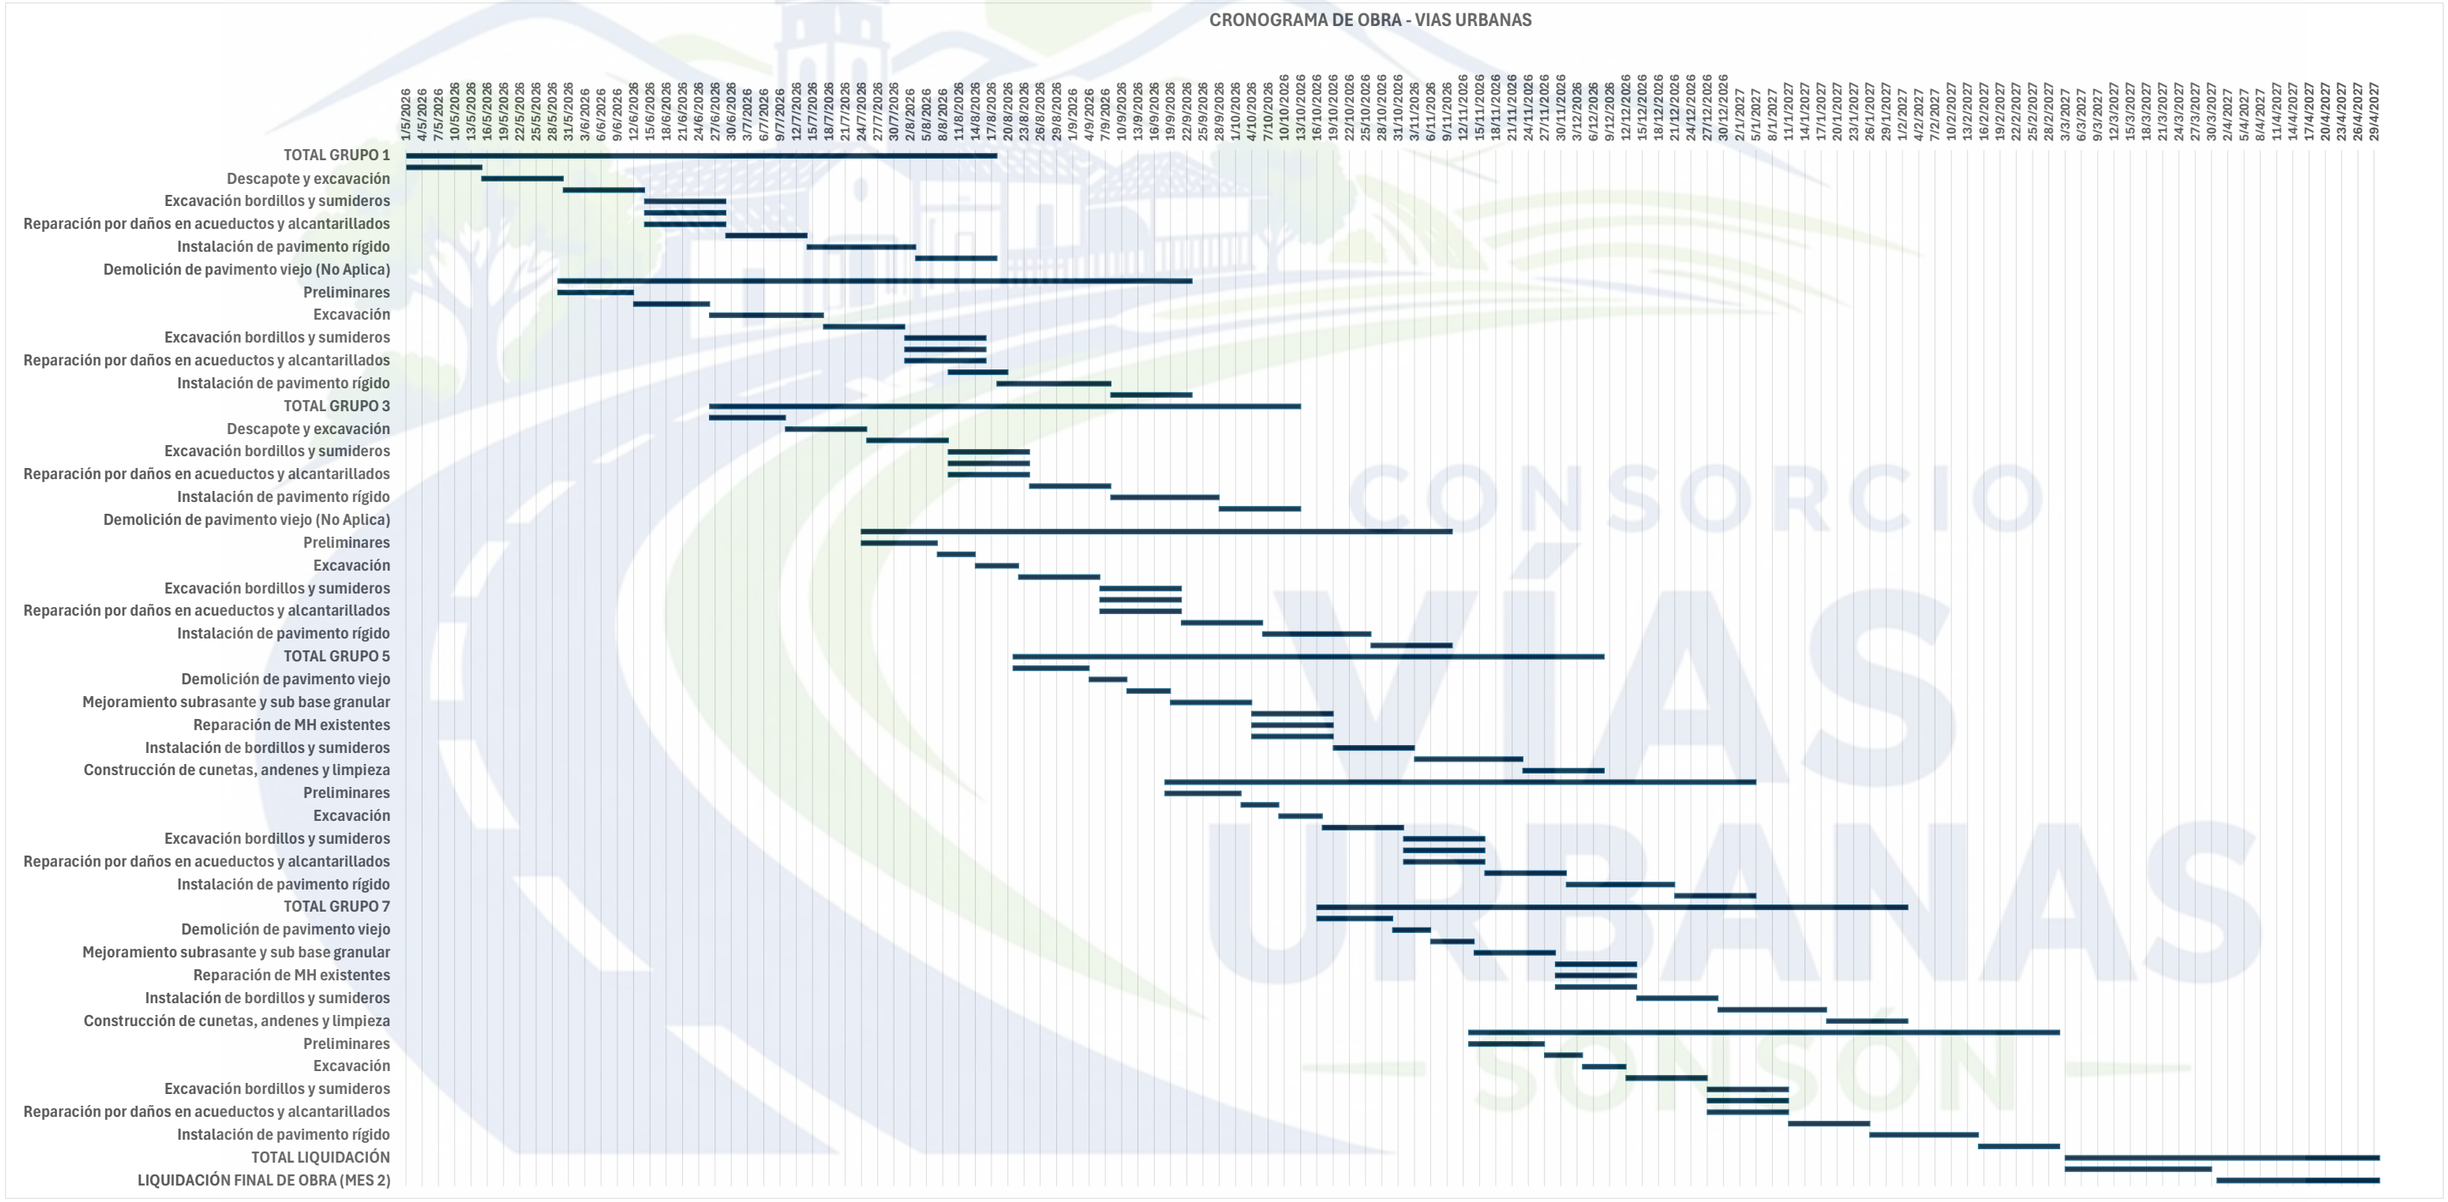

CONSTRUIMOS CAMINOS, CONECTAMOS FUTURO
