
ANEXO 6. Reprogramación etapa de diseños

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
1	**1**	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**124 día**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
2	**1.1**	**Acta de inicio**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
3	1.1.1	Firma Acta de Inicio	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	
4	**1.1.2**	**Documentos Entregados**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
5	1.1.2.1	Programa Inversion del Anticipo Aprobado	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
6	1.1.2.2	Entrega hojas de Vida Preconstrucción y construc	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
7	1.1.2.3	Aprobación Hojas de vida	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
8	1.1.2.4	Desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
9	1.1.2.5	Aprobación desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	8
10	1.1.2.6	Aprobación polizas del contrato	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
11	**1.2**	**PRECONSTRUCCION**	**124 día**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
12	**1.2.1**	**SISTEMAS DE GESTION**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
13	**1.2.1.1**	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**47 días**	**mar 25/02/25**	**lun 5/05/25**	
14	1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	32 días	mar 25/02/25	mié 9/04/25	3CC+6 d
15	1.2.1.1.2	Elaboración	4 días	jue 10/04/25	mar 15/04/25	14
16	1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	15
17	1.2.1.1.4	Aprobación	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	16
18	**1.2.1.2**	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trab**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	
19	1.2.1.2.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
20	1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	19
21	1.2.1.2.3	Aprobación	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	20
22	**1.2.1.3**	**Plan de Gestion de Calidad Et Construcción y Plan de Inspeccion y ensayos**	**28 días**	**lun 17/02/25**	**mié 26/03/25**	
23	1.2.1.3.1	Elaboración	12 días	lun 17/02/25	mar 4/03/25	3
24	1.2.1.3.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	mié 5/03/25	mar 25/03/25	23
25	1.2.1.3.3	Aprobación	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	24
26	**1.2.1.4**	**Plan de Gestion Ambiental y Residuos**	**46 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	
27	1.2.1.4.1	Elaboración	30 días	lun 17/02/25	vie 28/03/25	3
28	1.2.1.4.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	lun 31/03/25	mar 22/04/25	27
29	1.2.1.4.3	Aprobación	1 día	mié 23/04/25	mié 23/04/25	28
30	**1.2.1.5**	**Tabla de Fuerza de trabajo directivo**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	
31	1.2.1.5.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
32	1.2.1.5.2	Revision - Mesa de Trabajo	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	31
33	1.2.1.5.3	Aprobación	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	32

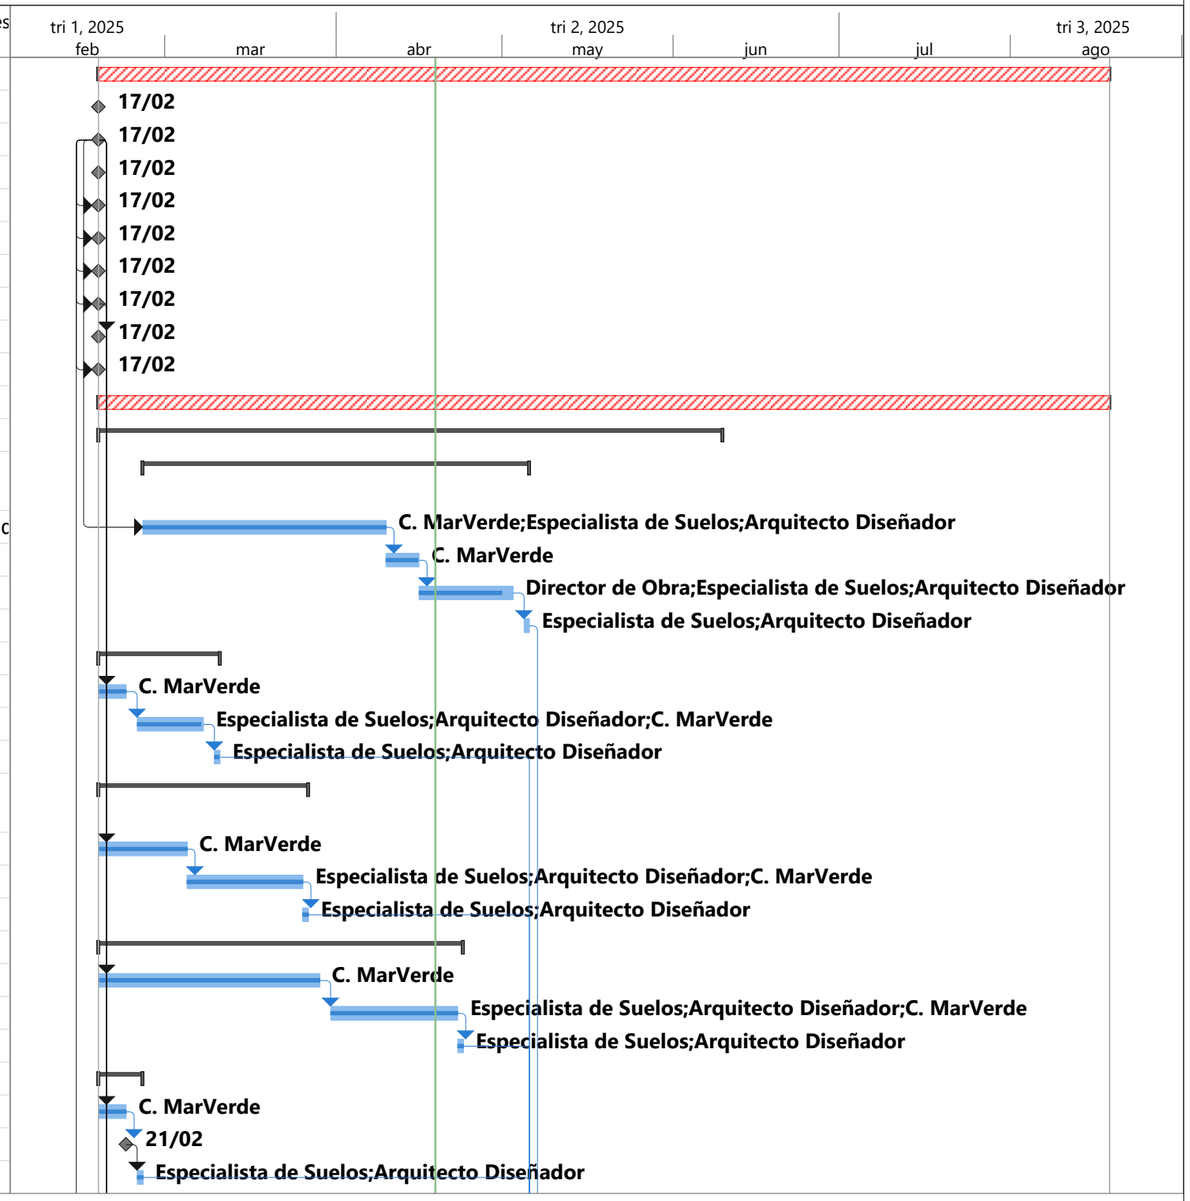


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica			

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
34	**1.2.1.6**	**Manual de Operación del Proyecto**	**24 días**	**mar 6/05/25**	**lun 9/06/25**	
35	1.2.1.6.1	Elaboración	19 días	mar 6/05/25	vie 30/05/25	25;17;2
36	1.2.1.6.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	35
37	1.2.1.6.3	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	36
38	**1.2.2**	**DISEÑOS**	**119 día**	**lun 17/02/25**	**lun 11/08/25**	
39	**1.2.2.1**	**DATOS DE ENTRADA**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
40	1.2.2.1.1	Entrega planos iniciales	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
41	1.2.2.1.2	Revisión planos Arquitectonicos y Estructurale	10 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25	40
42	1.2.2.1.3	Solicitud Planos Faltantes	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
43	1.2.2.1.4	Recibo planos faltantes	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	42
44	1.2.2.1.5	Visita de Obra	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	3
45	**1.2.2.2**	**TOPOGRAFIA**	**38 días**	**lun 3/03/25**	**vie 25/04/25**	
46	1.2.2.2.1	Levantamiento topografico	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	71
47	1.2.2.2.2	Calculos y elaboración de planos	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	46
48	**1.2.2.2.3**	**Entregables**	**32 días**	**mar 11/03/25**	**vie 25/04/25**	
49	1.2.2.2.3.1	Entrega levantamiento planimetrico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	47CC+1
50	1.2.2.2.3.2	Entrega Informe Topografico y planos	6 días	lun 17/03/25	lun 24/03/25	47
51	1.2.2.2.3.3	Revisión Interventoria	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	50
52	1.2.2.2.3.4	Mesa de trabajo	4 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25	51
53	1.2.2.2.3.5	Revisión Constructor	12 días	jue 3/04/25	mar 22/04/25	52
54	1.2.2.2.3.6	Aprobación	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	53
55	**1.2.2.3**	**ESTUDIO DE SUELOS**	**29 días**	**mar 25/03/25**	**mié 7/05/25**	
56	1.2.2.3.1	Exploracion de suelos en campo	8 días	mar 25/03/25	jue 3/04/25	50
57	1.2.2.3.2	Ensayos de laboratorio	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	56CC+3
58	1.2.2.3.3	Datos para revisión de cimentación	7 días	lun 7/04/25	mar 15/04/25	57CC+6
59	1.2.2.3.4	Analisis y elaboración de Informe	4 días	vie 11/04/25	mié 16/04/25	57
60	**1.2.2.3.5**	**Entregables**	**12 días**	**lun 21/04/25**	**mié 7/05/25**	
61	1.2.2.3.5.1	Revision - Mesa de trabajo Datos para revisión de estructuras	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	59
62	1.2.2.3.5.2	Aprobación Datos de Suelos para revisión de	1 día	jue 24/04/25	jue 24/04/25	61
63	1.2.2.3.5.3	Entrega de Estudio de suelos	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	62
64	1.2.2.3.5.4	Revisión Interventoria	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	63
65	1.2.2.3.5.5	Mesa de trabajo	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	64
66	1.2.2.3.5.6	Revisión Constructor	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	65
67	1.2.2.3.5.7	Aprobación	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	66

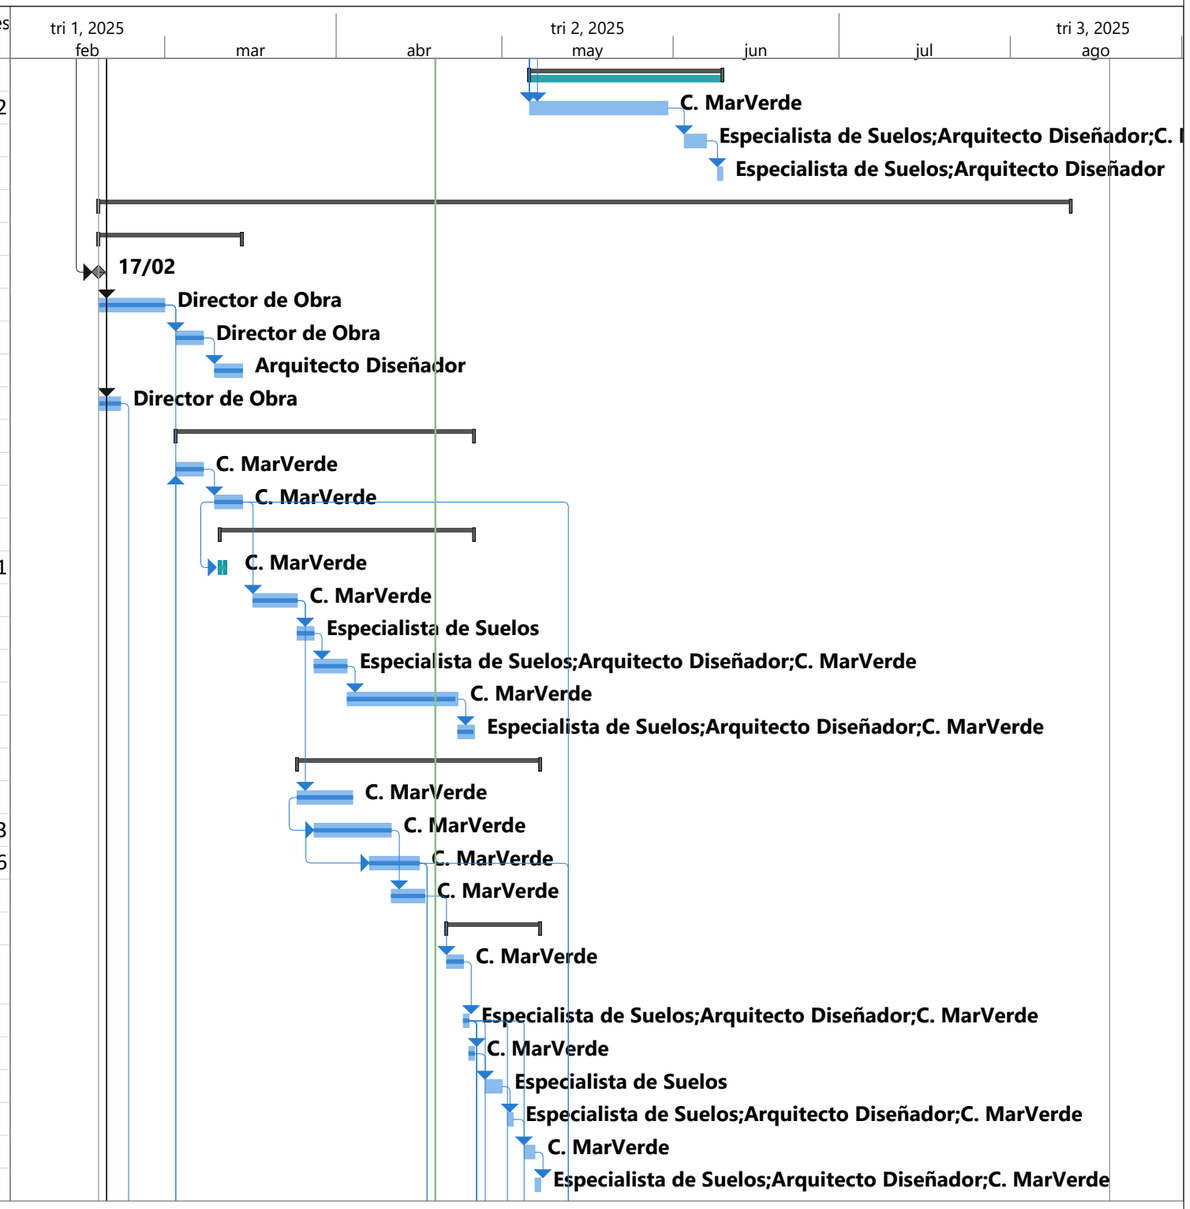


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
68	**1.2.2.4**	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**67 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	
69	**1.2.2.4.1**	**Implantación del Proyecto**	**55 días**	**lun 17/02/25**	**mié 7/05/25**	
70	1.2.2.4.1.1	Alternativas de Implantacion	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	3
71	1.2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de in	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	70
72	1.2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimatico	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	71
73	1.2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	29 días	jue 13/03/25	jue 24/04/25	72
74	1.2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	73
75	1.2.2.4.1.6	Implantación definitiva	8 días	mié 23/04/25	lun 5/05/25	109;119
76	1.2.2.4.1.7	Revisión - Mesa de trabajo Implantación arquitectónica definitiva	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	75
77	1.2.2.4.1.8	Aprobación Implantación arquitectónico	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	76
78	**1.2.2.4.2**	**Cerramiento**	**54 días**	**vie 21/02/25**	**lun 12/05/25**	
79	1.2.2.4.2.1	Entrega especificación Uspec	2 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	44
80	1.2.2.4.2.2	Elaboración Detalle cerramiento	3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	79
81	1.2.2.4.2.3	Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramie	7 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	80FC+2(
82	1.2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	81FC+7
83	1.2.2.4.2.5	Trazado cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	82CC
84	1.2.2.4.2.6	Revision - Mesa de trabajo Trazado Cerrami	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	83CC
85	1.2.2.4.2.7	Aprobación Trazado Cerramiento	14 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	84
86	**1.2.2.4.3**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**50 días**	**lun 3/03/25**	**mié 14/05/25**	
87	1.2.2.4.3.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
88	1.2.2.4.3.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	87CC+1
89	1.2.2.4.3.3	Aprobación Esquema Basico	6 días	jue 13/03/25	jue 20/03/25	88CC+2
90	1.2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	89
91	1.2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	90
92	1.2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 7/04/25	lun 7/04/25	91
93	1.2.2.4.3.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	12 días	jue 24/04/25	lun 12/05/25	92FC+1(
94	1.2.2.4.3.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25	93
95	1.2.2.4.3.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	94
96	**1.2.2.4.4**	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**49 días**	**lun 10/03/25**	**mar 20/05/25**	

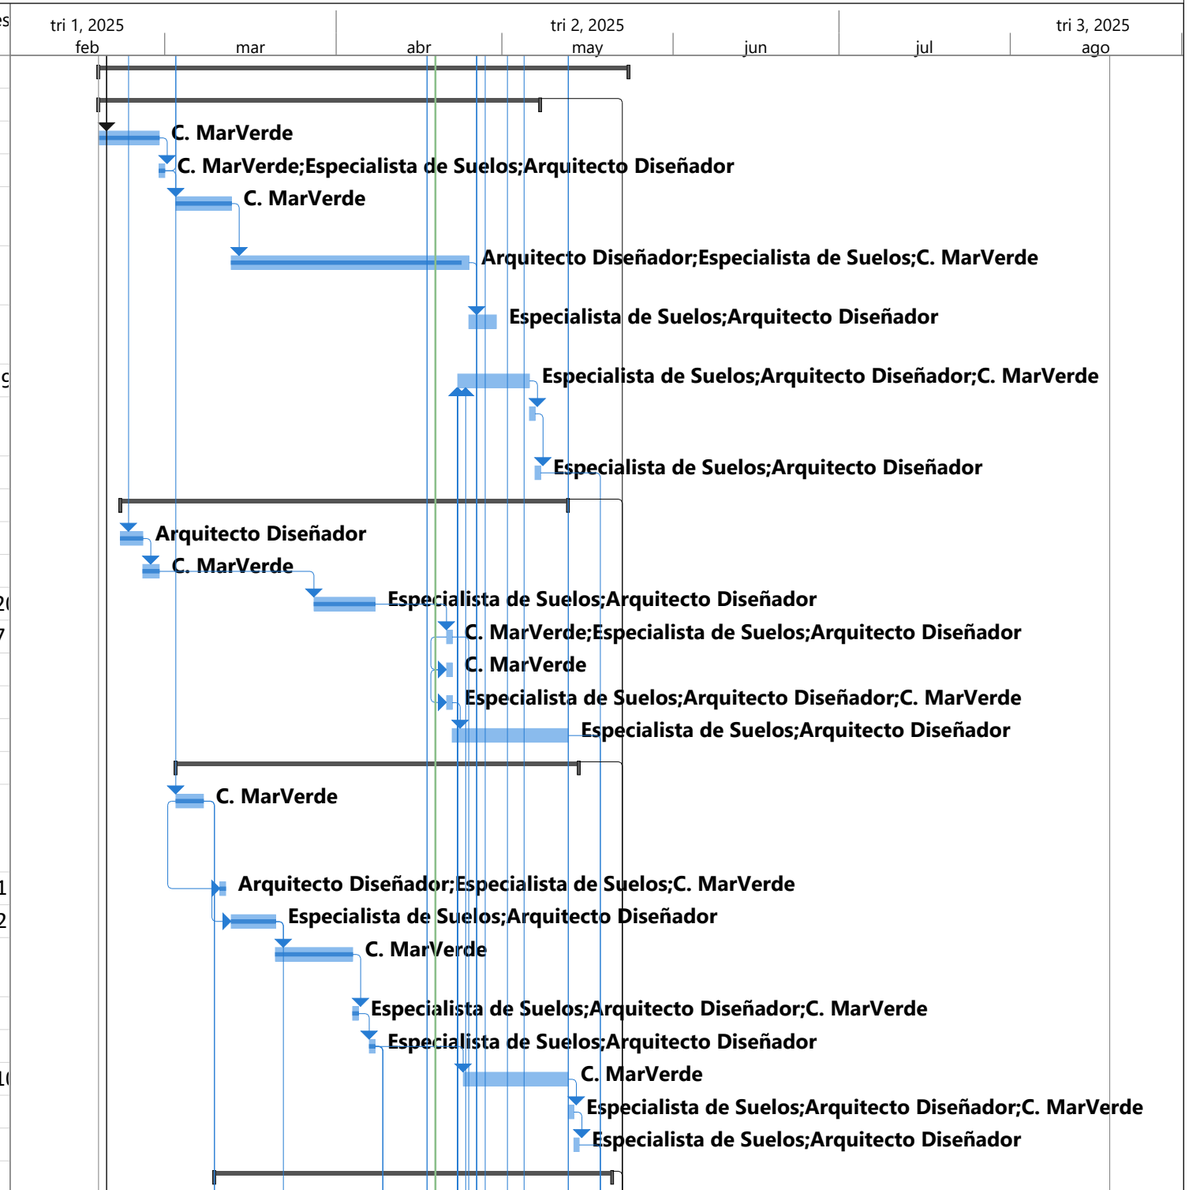


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica			

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
97	1.2.2.4.4.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	87
98	1.2.2.4.4.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	97
99	1.2.2.4.4.3	Aprobación Esquema Basico	21 días	mar 18/03/25	mar 15/04/25	98
100	1.2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
101	1.2.2.4.4.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	100
102	1.2.2.4.4.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	101CC+
103	1.2.2.4.4.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102
104	1.2.2.4.4.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	103
105	1.2.2.4.4.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	104
106	**1.2.2.4.5**	**Talleres**	**51 días**	**lun 10/03/25**	**jue 22/05/25**	
107	1.2.2.4.5.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25	87
108	1.2.2.4.5.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	107
109	1.2.2.4.5.3	Aprobación Esquema Basico	16 días	jue 20/03/25	jue 10/04/25	108
110	1.2.2.4.5.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	vie 11/04/25	lun 28/04/25	109
111	1.2.2.4.5.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	110
112	1.2.2.4.5.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	111CC+
113	1.2.2.4.5.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112
114	1.2.2.4.5.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mar 20/05/25	mié 21/05/25	113
115	1.2.2.4.5.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	114
116	**1.2.2.4.6**	**Sanidad**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
117	1.2.2.4.6.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25	107
118	1.2.2.4.6.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	117FC+4
119	1.2.2.4.6.3	Aprobación Esquema Basico	11 días	vie 28/03/25	vie 11/04/25	118
120	1.2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	119
121	1.2.2.4.6.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	120
122	1.2.2.4.6.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	121CC+
123	1.2.2.4.6.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122
124	1.2.2.4.6.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	123

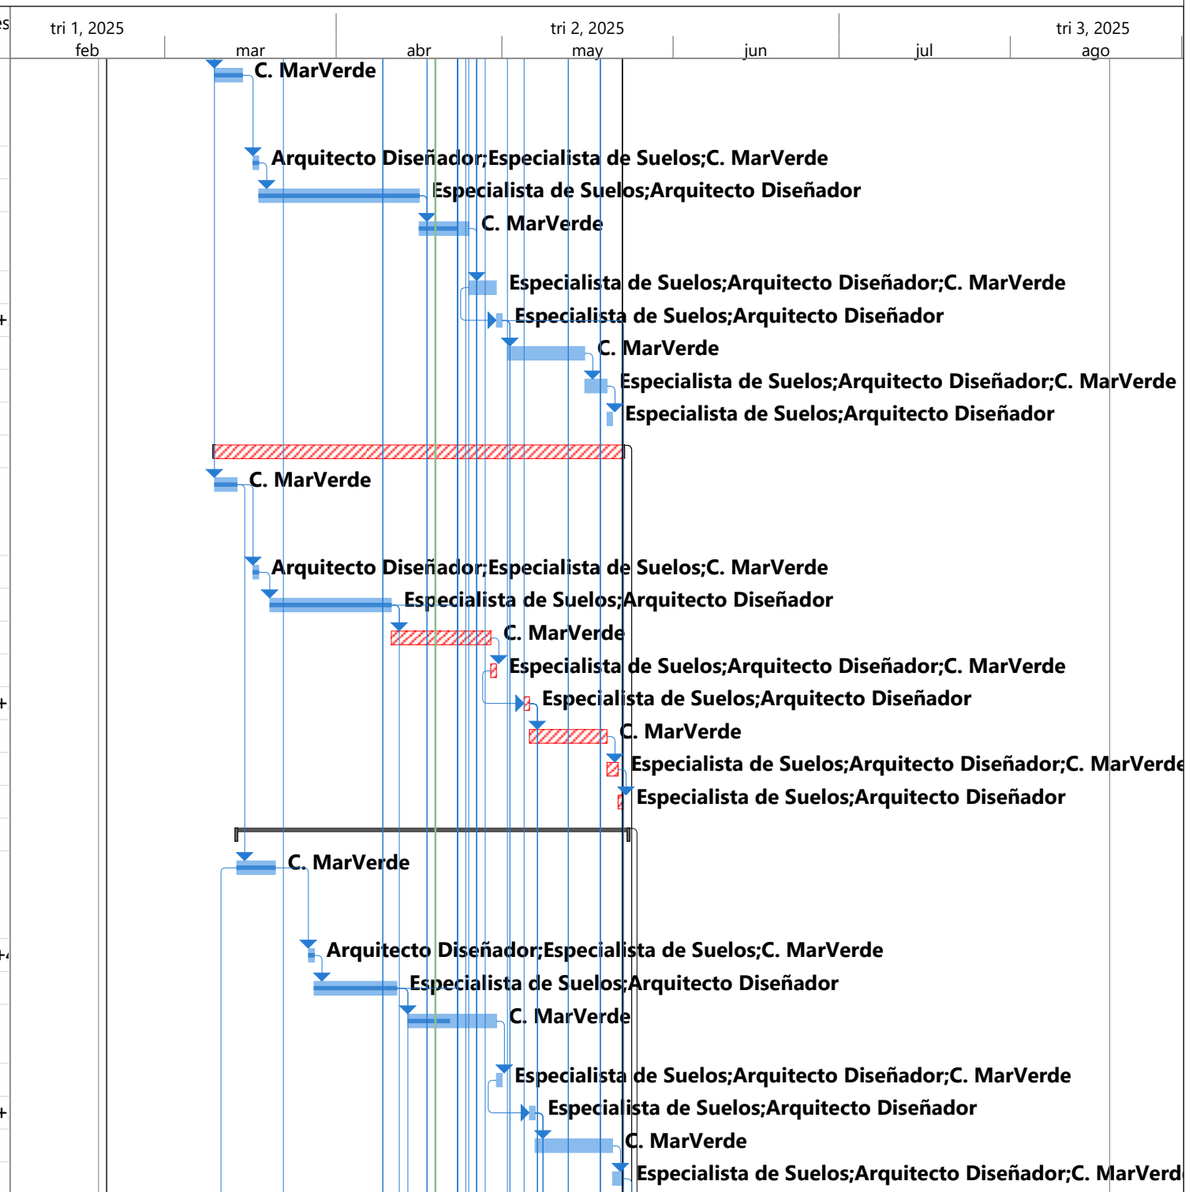


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
125	1.2.2.4.6.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	124
126	**1.2.2.4.7**	**Visitas**	**37 días**	**vie 14/03/25**	**jue 8/05/25**	
127	1.2.2.4.7.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	117CC
128	1.2.2.4.7.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	127
129	1.2.2.4.7.3	Aprobación Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	128CC
130	1.2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	129
131	1.2.2.4.7.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	130
132	1.2.2.4.7.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 16/04/25	mié 16/04/25	131CC+
133	1.2.2.4.7.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132
134	1.2.2.4.7.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mar 6/05/25	mié 7/05/25	133
135	1.2.2.4.7.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	134
136	**1.2.2.4.8**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
137	1.2.2.4.8.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	127CC
138	1.2.2.4.8.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	137
139	1.2.2.4.8.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	138
140	1.2.2.4.8.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	139
141	1.2.2.4.8.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	140
142	1.2.2.4.8.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	141CC+
143	1.2.2.4.8.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142
144	1.2.2.4.8.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	143
145	1.2.2.4.8.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	144
146	**1.2.2.4.9**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**35 días**	**mié 19/03/25**	**vie 9/05/25**	
147	1.2.2.4.9.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	mié 19/03/25	lun 24/03/25	137CC+ días
148	1.2.2.4.9.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	147FC+
149	1.2.2.4.9.3	Aprobación Esquema Basico	12 días	jue 27/03/25	vie 11/04/25	148CC
150	1.2.2.4.9.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	149CC+ días
151	1.2.2.4.9.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	2 días	lun 14/04/25	mar 15/04/25	150
152	1.2.2.4.9.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	151CC+

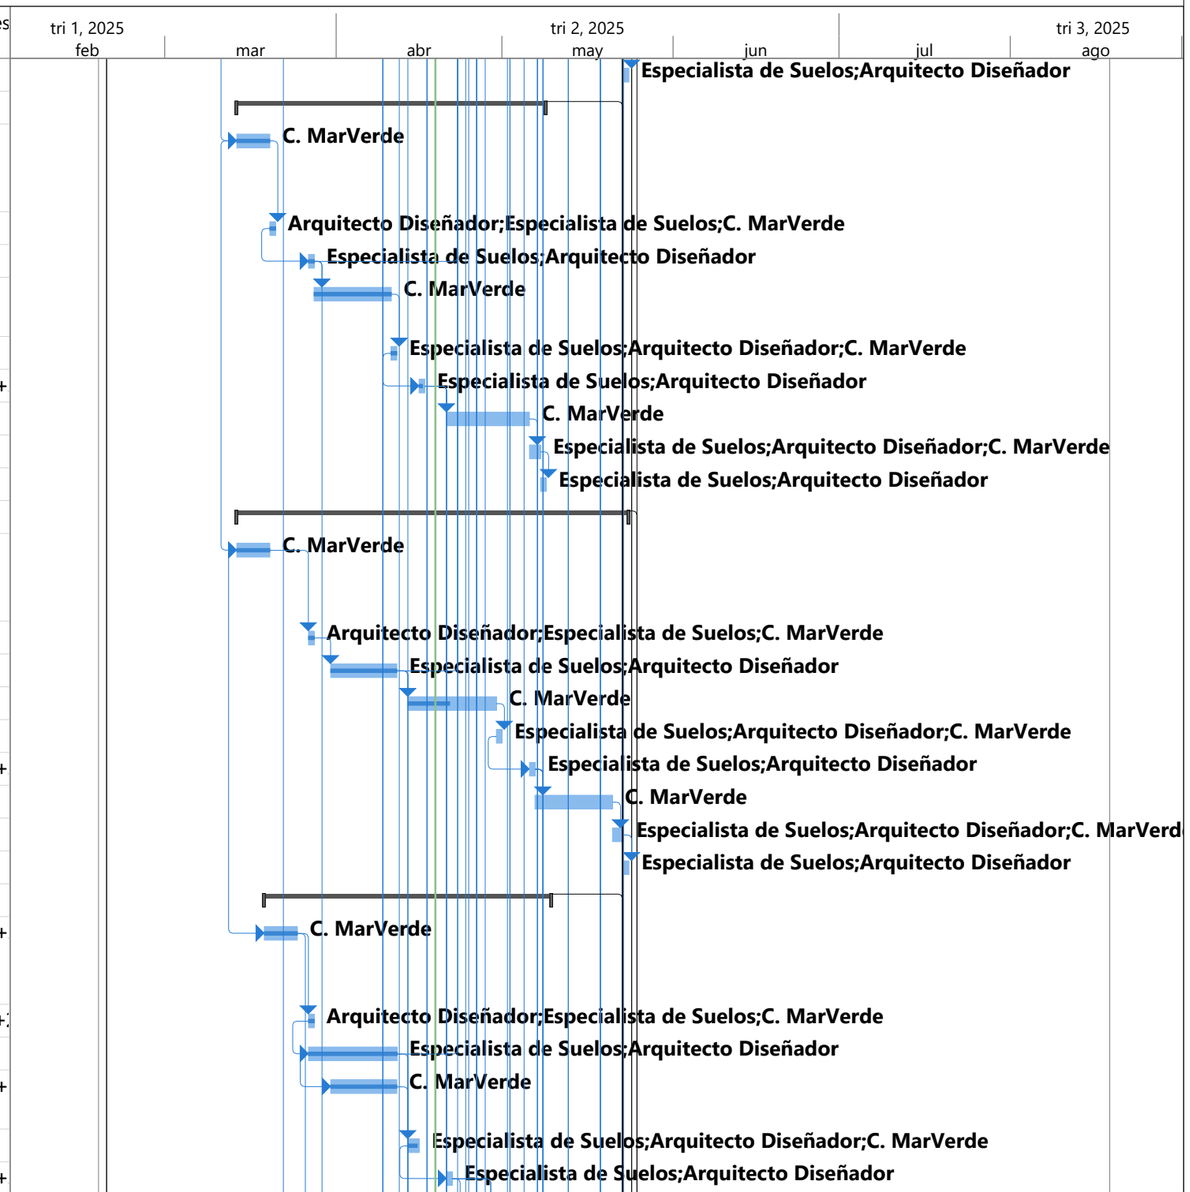


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
153	1.2.2.4.9.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	11 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	152
154	1.2.2.4.9.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	153
155	1.2.2.4.9.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	154
156	**1.2.2.4.10**	**Alojamiento Guardianas**	**39 días**	**mar 25/03/25**	**mié 21/05/25**	
157	1.2.2.4.10.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	147
158	1.2.2.4.10.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	3 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	157
159	1.2.2.4.10.3	Aprobación Esquema Basico	9 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25	158
160	1.2.2.4.10.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	159
161	1.2.2.4.10.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	160
162	1.2.2.4.10.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	161CC+
163	1.2.2.4.10.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162
164	1.2.2.4.10.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	163
165	1.2.2.4.10.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	164
166	**1.2.2.4.11**	**Garitas**	**41 días**	**mar 25/03/25**	**vie 23/05/25**	
167	1.2.2.4.11.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	157CC
168	1.2.2.4.11.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	167
169	1.2.2.4.11.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	
170	1.2.2.4.11.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	7 días	mié 23/04/25	vie 2/05/25	169
171	1.2.2.4.11.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	170
172	1.2.2.4.11.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	171CC+
173	1.2.2.4.11.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	172
174	1.2.2.4.11.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	173
175	1.2.2.4.11.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	174
176	**1.2.2.4.12**	**Urbanismo**	**28 días**	**jue 10/04/25**	**jue 22/05/25**	
177	1.2.2.4.12.1	Anteproyecto de Urbanismo	5 días	jue 10/04/25	mié 16/04/25	167FC+
178	1.2.2.4.12.2	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Ar	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	177
179	1.2.2.4.12.3	Aprobación anteproyecto arquitectónico	4 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	178
180	1.2.2.4.12.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	4 días	lun 28/04/25	vie 2/05/25	179
181	1.2.2.4.12.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	180

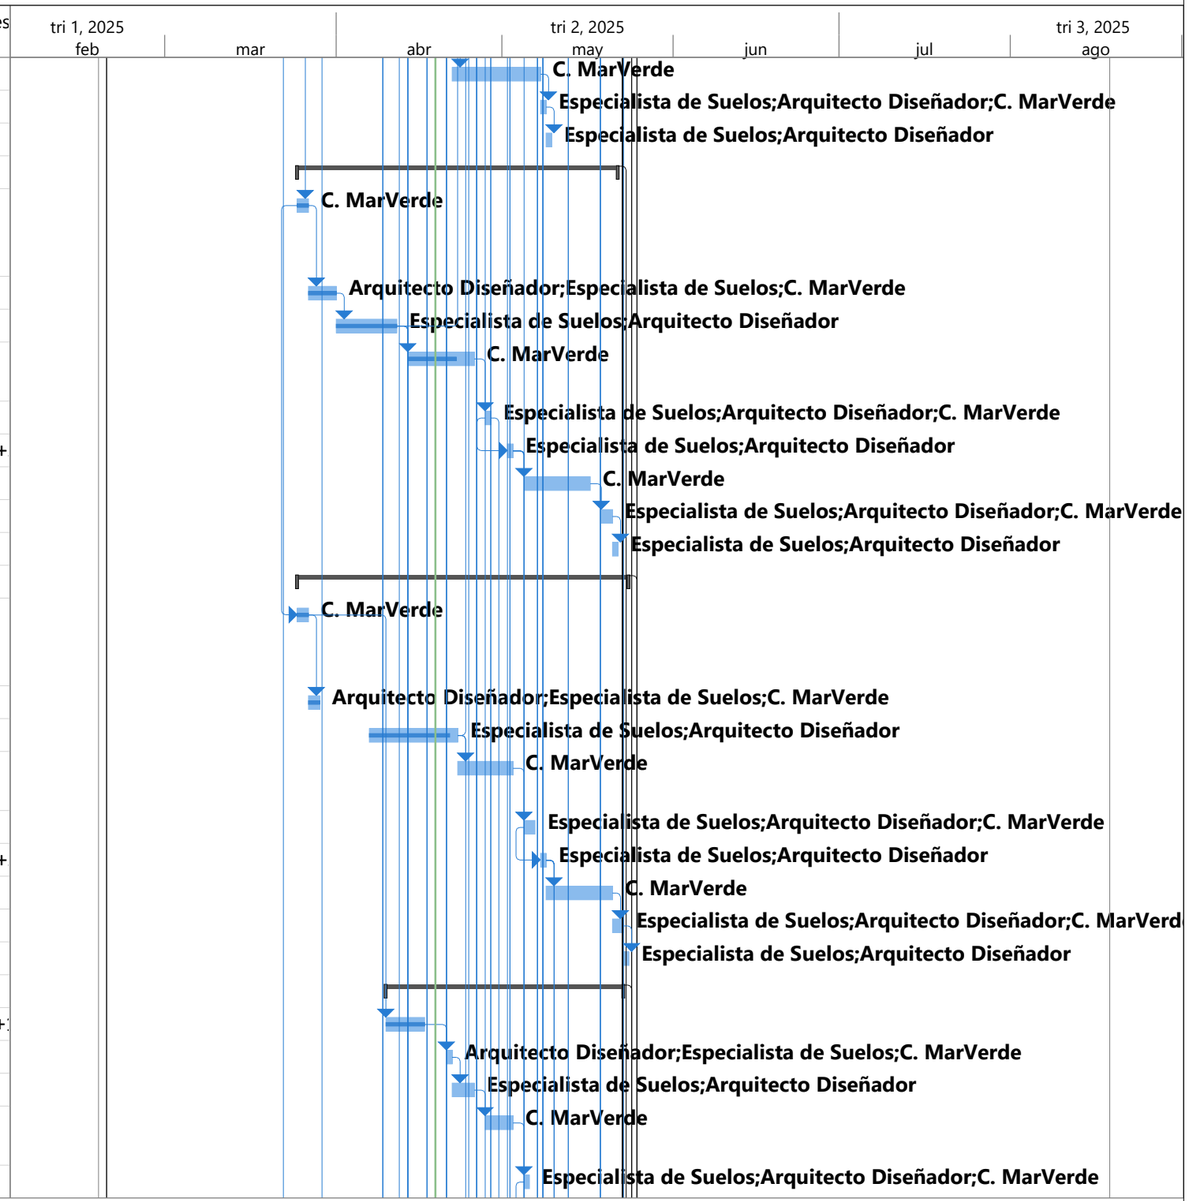


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
182	1.2.2.4.12.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	181CC+
183	1.2.2.4.12.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	182
184	1.2.2.4.12.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	183
185	1.2.2.4.12.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	184
186	1.2.2.4.13	**Fin Diseño Arquitectonico**	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	69;86;1
187	**1.2.2.5**	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**50 días**	**vie 21/03/25**	**mié 4/06/25**	
188	**1.2.2.5.1**	**Cerramiento**	**17 días**	**vie 25/04/25**	**mar 20/05/25**	
189	1.2.2.5.1.1	Diseño estructural Cerramiento	9 días	vie 25/04/25	jue 8/05/25	82;62
190	1.2.2.5.1.2	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	2 días	vie 9/05/25	lun 12/05/25	189
191	1.2.2.5.1.3	Revisión diseño de acuerdo a Estudio de suelos y topografica	3 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25	190;58;
192	1.2.2.5.1.4	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	191
193	1.2.2.5.1.5	Aprobación Diseño Estructural Cerramiento	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	192
194	**1.2.2.5.2**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**44 días**	**vie 21/03/25**	**lun 26/05/25**	
195	1.2.2.5.2.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 21/03/25	jue 27/03/25	89
196	1.2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	195
197	1.2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	196
198	1.2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 3/04/25	vie 4/04/25	197
199	1.2.2.5.2.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 25/04/25	vie 16/05/25	197;62
200	1.2.2.5.2.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	lun 12/05/25	vie 16/05/25	199FF
201	1.2.2.5.2.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	199
202	1.2.2.5.2.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	201
203	**1.2.2.5.3**	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**30 días**	**mié 16/04/25**	**vie 30/05/25**	
204	1.2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
205	1.2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	204
206	1.2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	205
207	1.2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	206
208	1.2.2.5.3.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	206;62
209	1.2.2.5.3.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	208FF
210	1.2.2.5.3.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	208
211	1.2.2.5.3.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	210
212	**1.2.2.5.4**	**Talleres**	**30 días**	**vie 11/04/25**	**mar 27/05/25**	
213	1.2.2.5.4.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 11/04/25	lun 21/04/25	109
214	1.2.2.5.4.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	213
215	1.2.2.5.4.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	214

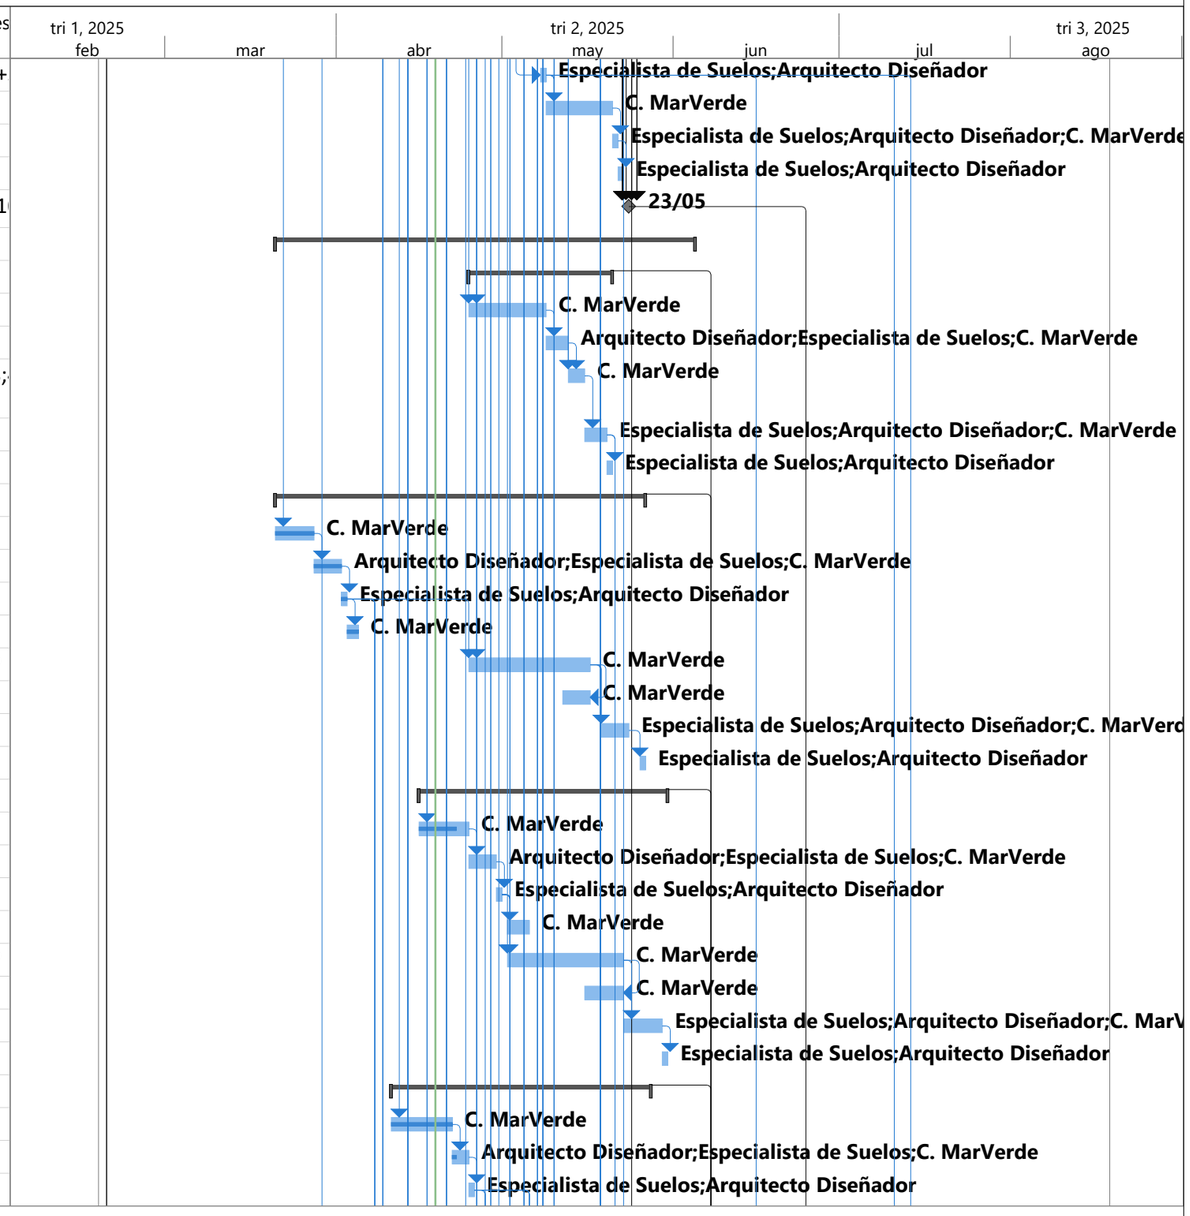


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
216	1.2.2.5.4.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	215
217	1.2.2.5.4.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 28/04/25	lun 19/05/25	215;62
218	1.2.2.5.4.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	217FF
219	1.2.2.5.4.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	217
220	1.2.2.5.4.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25	219
221	**1.2.2.5.5**	**Sanidad**	**34 días**	**lun 14/04/25**	**mié 4/06/25**	
222	1.2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	119
223	1.2.2.5.5.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	222
224	1.2.2.5.5.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	223
225	1.2.2.5.5.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	224
226	1.2.2.5.5.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	16 días	lun 5/05/25	lun 26/05/25	224;62
227	1.2.2.5.5.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	226FF
228	1.2.2.5.5.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	226
229	1.2.2.5.5.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	228
230	**1.2.2.5.6**	**Visitas**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**mié 21/05/25**	
231	1.2.2.5.6.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	129
232	1.2.2.5.6.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	231
233	1.2.2.5.6.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	232
234	1.2.2.5.6.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 10/04/25	vie 11/04/25	233
235	1.2.2.5.6.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
236	1.2.2.5.6.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	235FF
237	1.2.2.5.6.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	235
238	1.2.2.5.6.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	237
239	**1.2.2.5.7**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
240	1.2.2.5.7.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	139
241	1.2.2.5.7.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	240
242	1.2.2.5.7.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	241
243	1.2.2.5.7.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	242
244	1.2.2.5.7.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
245	1.2.2.5.7.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	244FF
246	1.2.2.5.7.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	244
247	1.2.2.5.7.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	246
248	**1.2.2.5.8**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
249	1.2.2.5.8.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	149
250	1.2.2.5.8.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	249

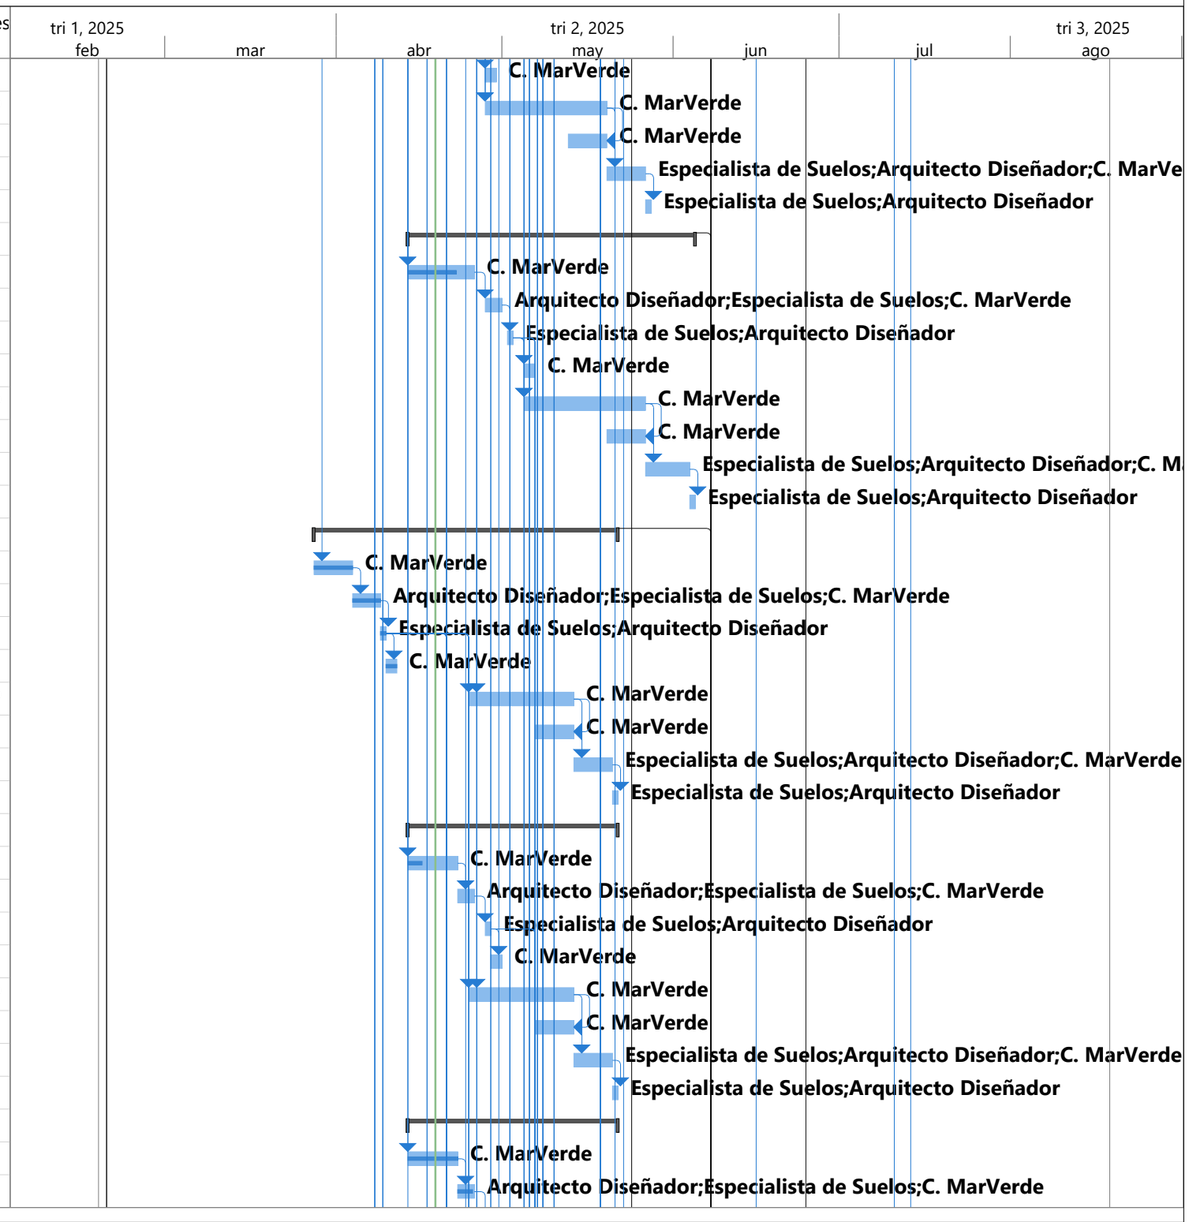


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
251	1.2.2.5.8.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	250
252	1.2.2.5.8.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	251
253	1.2.2.5.8.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
254	1.2.2.5.8.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	253FF
255	1.2.2.5.8.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	253
256	1.2.2.5.8.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	255
257	**1.2.2.5.9**	**Alojamiento de Guardianas**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
258	1.2.2.5.9.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	159
259	1.2.2.5.9.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	258
260	1.2.2.5.9.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	259
261	1.2.2.5.9.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	260
262	1.2.2.5.9.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
263	1.2.2.5.9.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	262FF
264	1.2.2.5.9.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	262
265	1.2.2.5.9.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	264
266	**1.2.2.5.10**	**Garitas**	**20 días**	**mié 23/04/25**	**mié 21/05/25**	
267	1.2.2.5.10.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 23/04/25	mar 29/04/25	169
268	1.2.2.5.10.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 30/04/25	lun 5/05/25	267
269	1.2.2.5.10.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	268
270	1.2.2.5.10.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mié 7/05/25	jue 8/05/25	269
271	1.2.2.5.10.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
272	1.2.2.5.10.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	271FF
273	1.2.2.5.10.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	271
274	1.2.2.5.10.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	273
275	**1.2.2.5.11**	**Urbanismo**	**10 días**	**vie 9/05/25**	**jue 22/05/25**	
276	1.2.2.5.11.1	Definicion de elementos de urbanismo que requieren diseño	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	182
277	1.2.2.5.11.2	Calculo detallado - Elaboración de planos	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25	276
278	1.2.2.5.11.3	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	277
279	1.2.2.5.11.4	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	278
280	**1.2.2.5.12**	**Fin Diseño Estructural**	**0 días**	**mié 4/06/25**	**mié 4/06/25**	**194FF**
281	**1.2.2.6**	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCEN**	**77 días**	**mar 8/04/25**	**jue 31/07/25**	
282	**1.2.2.6.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**32 días**	**mar 8/04/25**	**lun 26/05/25**	
283	1.2.2.6.1.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 8/04/25	mié 23/04/25	92;197

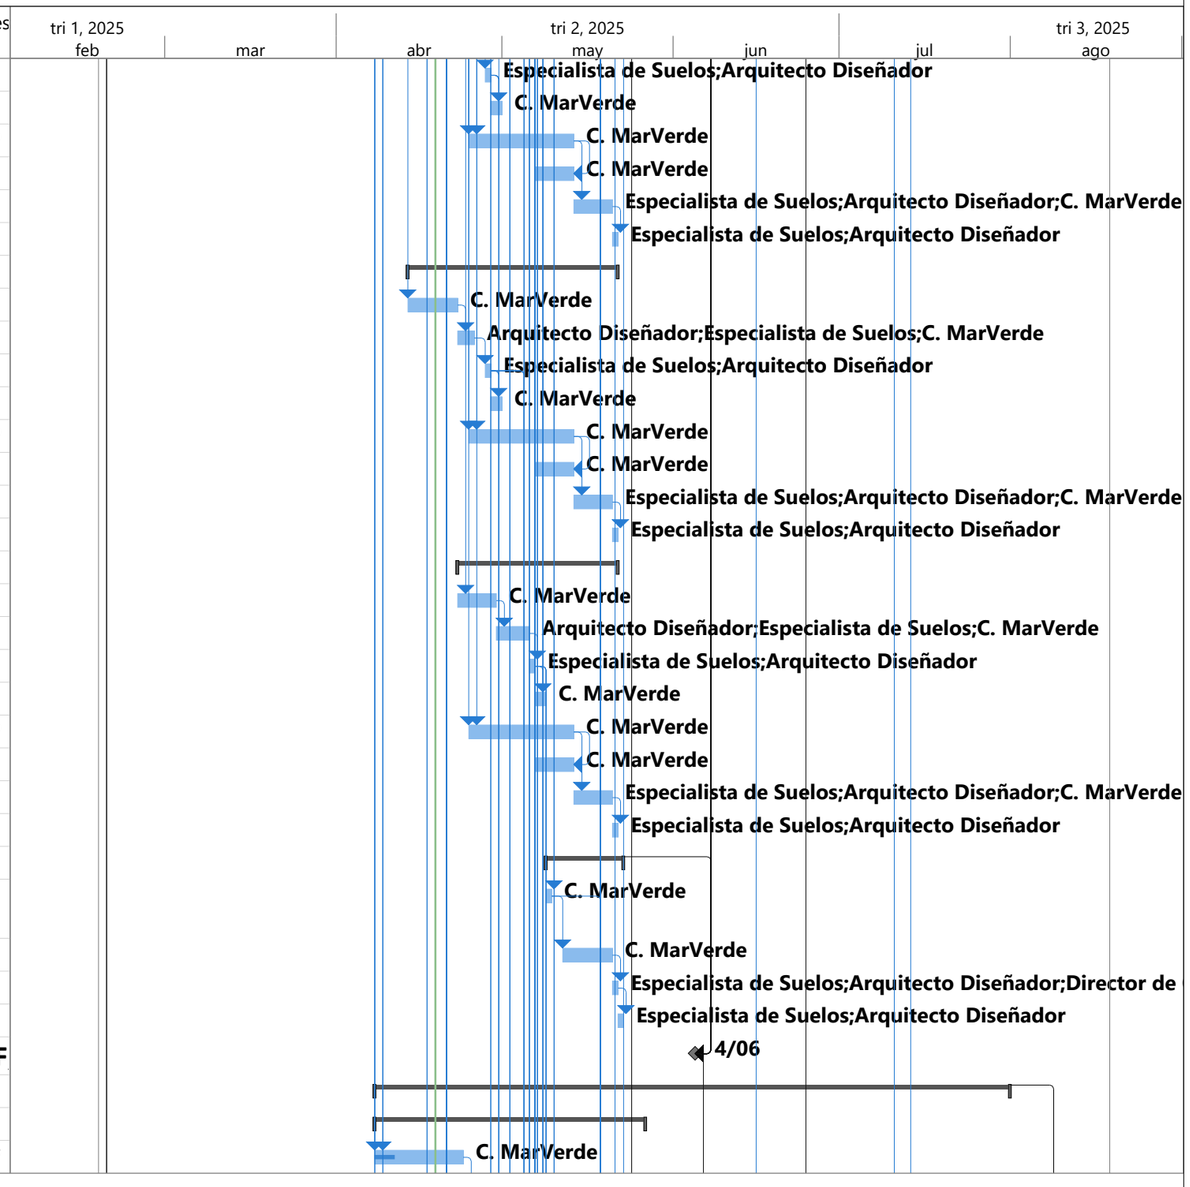


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
284	1.2.2.6.1.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	jue 24/04/25	mié 30/04/25	283
285	1.2.2.6.1.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	284
286	1.2.2.6.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	285
287	1.2.2.6.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	286
288	1.2.2.6.1.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	287
289	**1.2.2.6.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**32 días**	**vie 2/05/25**	**mar 17/06/25**	
290	1.2.2.6.2.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102;206
291	1.2.2.6.2.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	290
292	1.2.2.6.2.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	291
293	1.2.2.6.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 26/05/25	lun 9/06/25	292
294	1.2.2.6.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 10/06/25	lun 16/06/25	293
295	1.2.2.6.2.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	294
296	**1.2.2.6.3**	**Talleres**	**32 días**	**mar 6/05/25**	**jue 19/06/25**	
297	1.2.2.6.3.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112;215
298	1.2.2.6.3.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	297
299	1.2.2.6.3.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25	298
300	1.2.2.6.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 28/05/25	mié 11/06/25	299
301	1.2.2.6.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	300
302	1.2.2.6.3.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	301
303	**1.2.2.6.4**	**Sanidad**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**	
304	1.2.2.6.4.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122;224
305	1.2.2.6.4.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	304
306	1.2.2.6.4.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	305
307	1.2.2.6.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25	306
308	1.2.2.6.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	307
309	1.2.2.6.4.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	308
310	**1.2.2.6.5**	**Visitas**	**32 días**	**lun 21/04/25**	**jue 5/06/25**	
311	1.2.2.6.5.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132;233

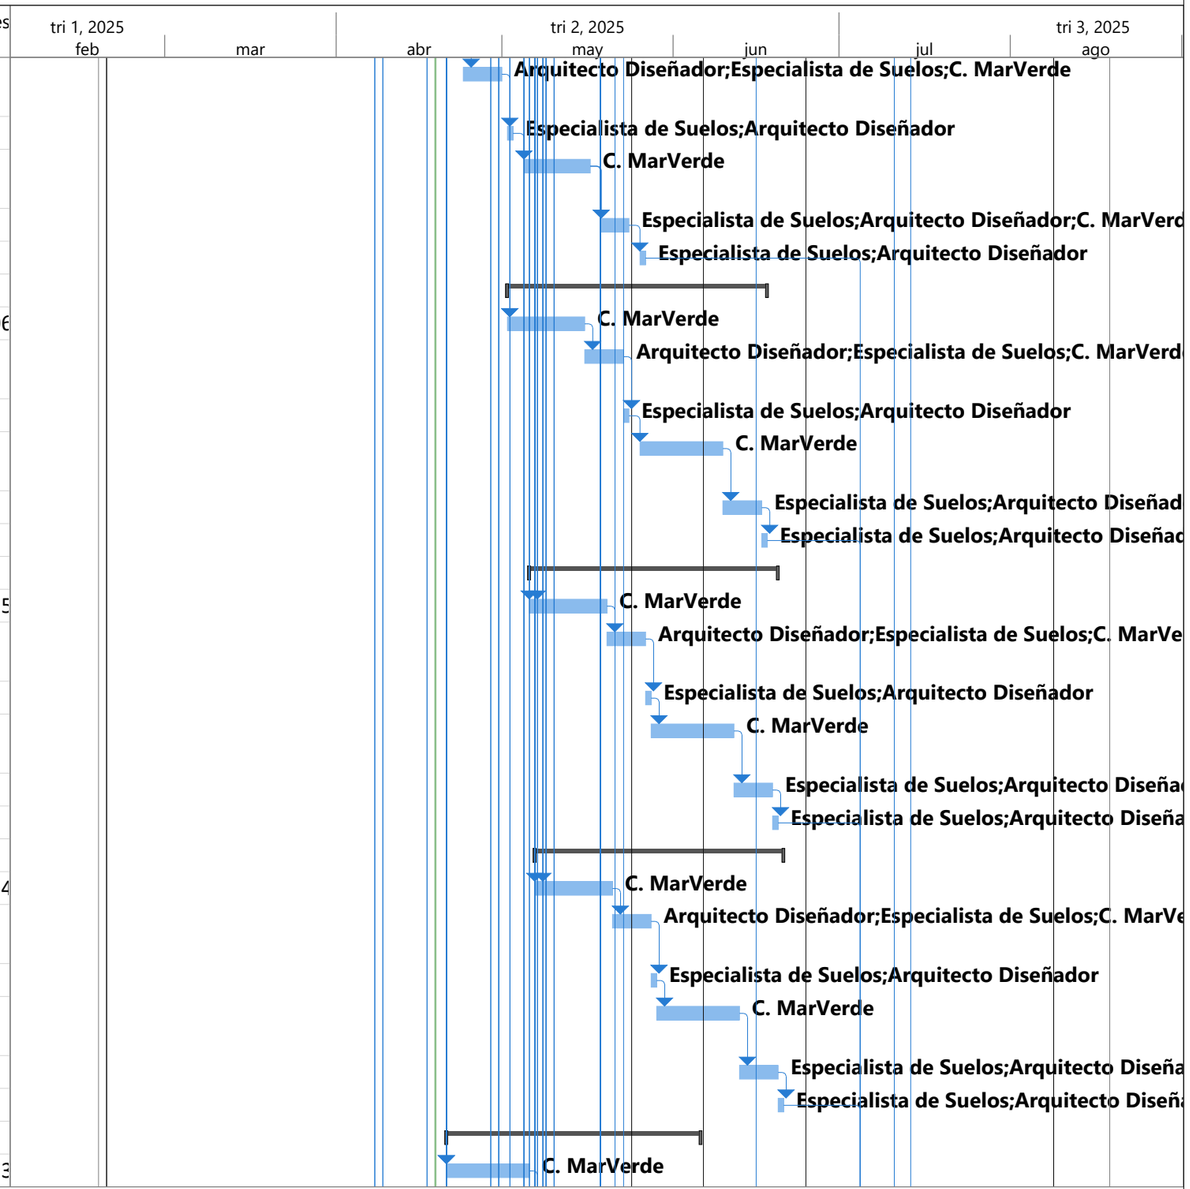


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
312	1.2.2.6.5.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 6/05/25	lun 12/05/25	311
313	1.2.2.6.5.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25	312
314	1.2.2.6.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25	313
315	1.2.2.6.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	314
316	1.2.2.6.5.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	315
317	**1.2.2.6.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**	
318	1.2.2.6.6.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142;242
319	1.2.2.6.6.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	318
320	1.2.2.6.6.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	319
321	1.2.2.6.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25	320
322	1.2.2.6.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	321
323	1.2.2.6.6.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	322
324	**1.2.2.6.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**32 días**	**mar 29/04/25**	**vie 13/06/25**	
325	1.2.2.6.7.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 29/04/25	mar 13/05/25	152;251
326	1.2.2.6.7.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	325
327	1.2.2.6.7.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	326
328	1.2.2.6.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 22/05/25	jue 5/06/25	327
329	1.2.2.6.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	328
330	1.2.2.6.7.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	329
331	**1.2.2.6.8**	**Alojamiento Guardianas**	**32 días**	**lun 5/05/25**	**mié 18/06/25**	
332	1.2.2.6.8.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162;260
333	1.2.2.6.8.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	332
334	1.2.2.6.8.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	333
335	1.2.2.6.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 27/05/25	mar 10/06/25	334
336	1.2.2.6.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 11/06/25	mar 17/06/25	335
337	1.2.2.6.8.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mié 18/06/25	mié 18/06/25	336
338	**1.2.2.6.9**	**Garitas**	**32 días**	**vie 9/05/25**	**mié 25/06/25**	
339	1.2.2.6.9.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 9/05/25	jue 22/05/25	172;269

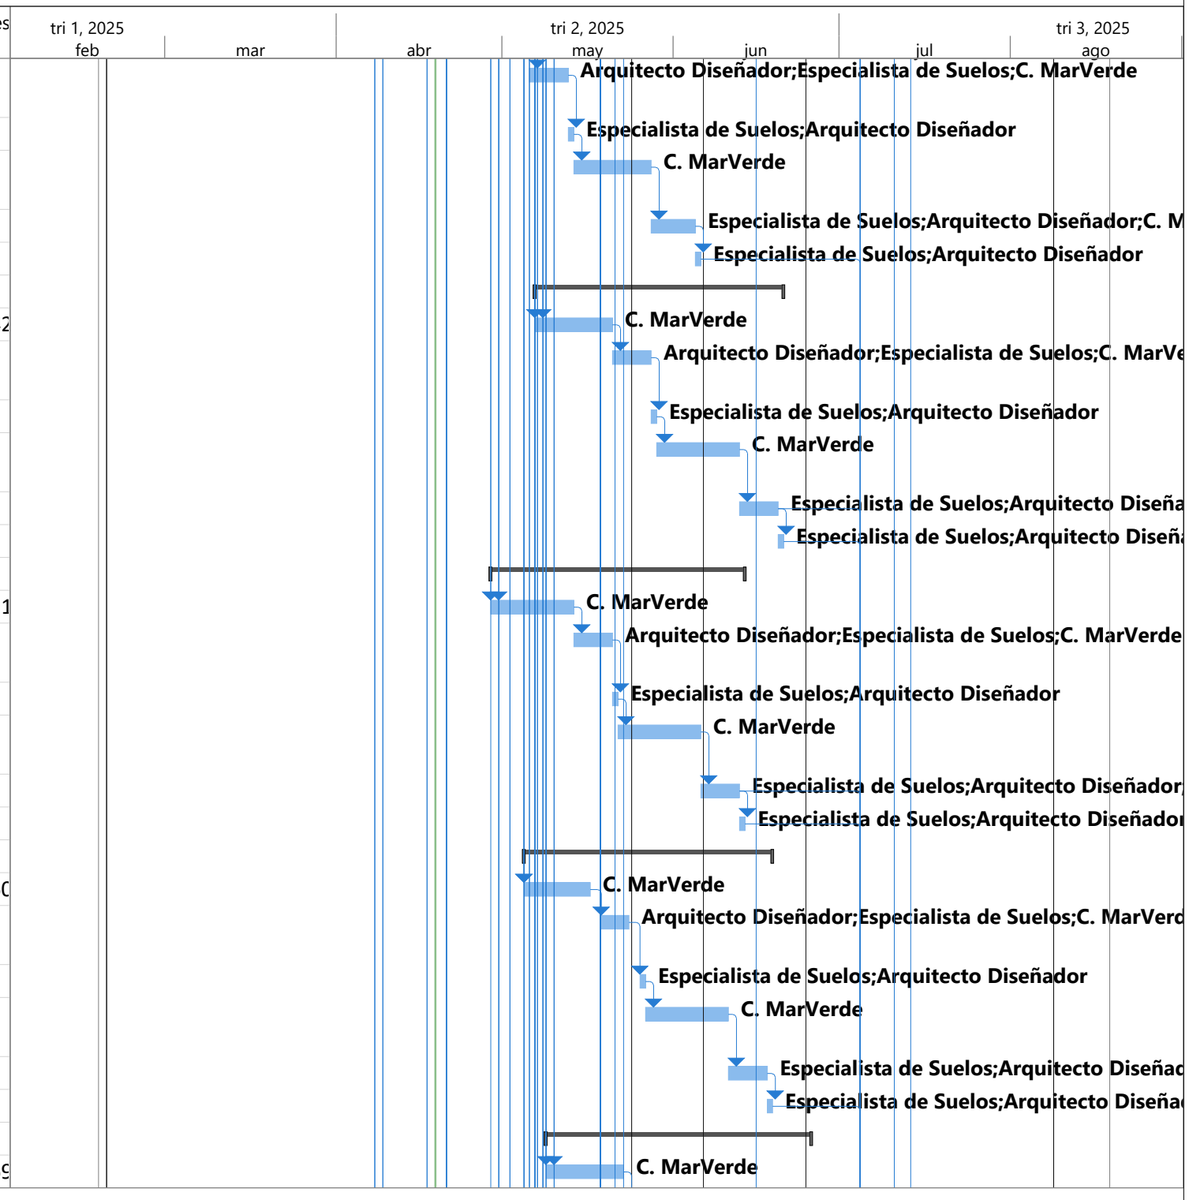


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
340	1.2.2.6.9.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	339
341	1.2.2.6.9.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	340
342	1.2.2.6.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 3/06/25	lun 16/06/25	341
343	1.2.2.6.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 17/06/25	mar 24/06/25	342
344	1.2.2.6.9.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	343
345	**1.2.2.6.10**	**Redes Exteriores -Urbanismo**	**32 días**	**lun 16/06/25**	**jue 31/07/25**	
346	1.2.2.6.10.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25	182;322
347	1.2.2.6.10.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	346
348	1.2.2.6.10.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	347
349	1.2.2.6.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 10/07/25	mié 23/07/25	348
350	1.2.2.6.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	349
351	1.2.2.6.10.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 31/07/25	jue 31/07/25	350
352	**1.2.2.7**	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**83 días**	**mar 8/04/25**	**lun 11/08/25**	
353	**1.2.2.7.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	
354	1.2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	92;197
355	1.2.2.7.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	354
356	1.2.2.7.1.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	355
357	1.2.2.7.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	356
358	1.2.2.7.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	357
359	1.2.2.7.1.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	358
360	**1.2.2.7.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 23/05/25**	**jue 24/07/25**	
361	1.2.2.7.2.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 23/05/25	vie 13/06/25	102;106
362	1.2.2.7.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 16/06/25	vie 20/06/25	361
363	1.2.2.7.2.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	362
364	1.2.2.7.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 25/06/25	mié 16/07/25	363
365	1.2.2.7.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 17/07/25	mié 23/07/25	364
366	1.2.2.7.2.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	365
367	**1.2.2.7.3**	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	
368	1.2.2.7.3.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	215;112
369	1.2.2.7.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	368

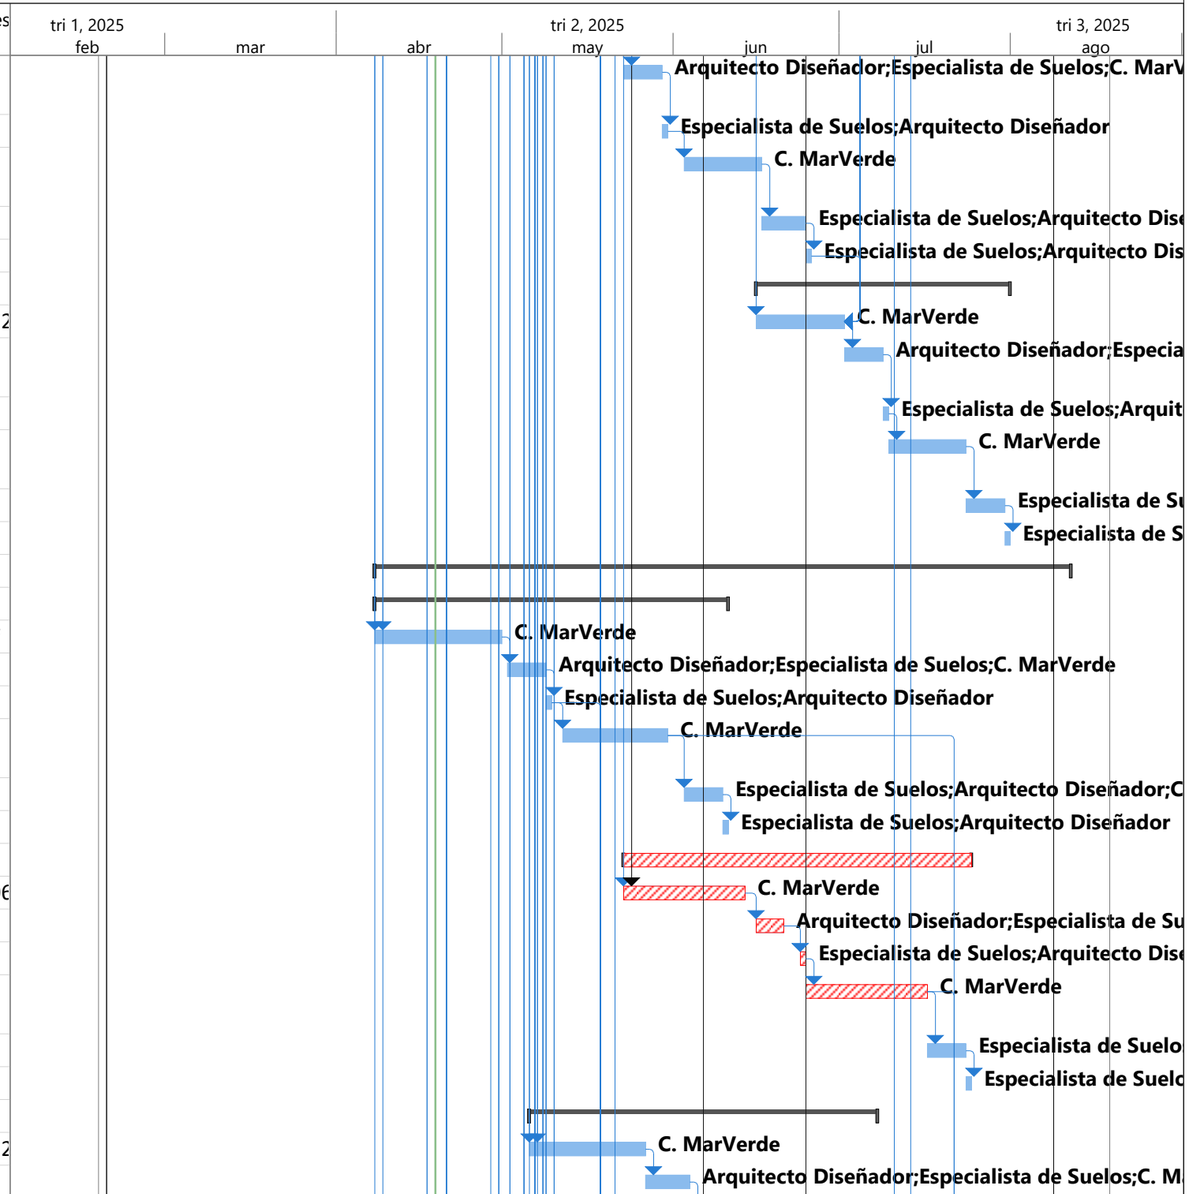


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
370	1.2.2.7.3.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	369
371	1.2.2.7.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	370
372	1.2.2.7.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	371
373	1.2.2.7.3.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	372
374	**1.2.2.7.4**	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
375	1.2.2.7.4.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	122;224
376	1.2.2.7.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	375
377	1.2.2.7.4.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	376
378	1.2.2.7.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	377
379	1.2.2.7.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	378
380	1.2.2.7.4.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	379
381	**1.2.2.7.5**	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	
382	1.2.2.7.5.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	132;233
383	1.2.2.7.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	382
384	1.2.2.7.5.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	383
385	1.2.2.7.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	384
386	1.2.2.7.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	385
387	1.2.2.7.5.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	386
388	**1.2.2.7.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
389	1.2.2.7.6.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	142;242
390	1.2.2.7.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	389
391	1.2.2.7.6.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	390
392	1.2.2.7.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	391
393	1.2.2.7.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	392
394	1.2.2.7.6.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	393
395	**1.2.2.7.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
396	1.2.2.7.7.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
397	1.2.2.7.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	396
398	1.2.2.7.7.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	397
399	1.2.2.7.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	398
400	1.2.2.7.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	399

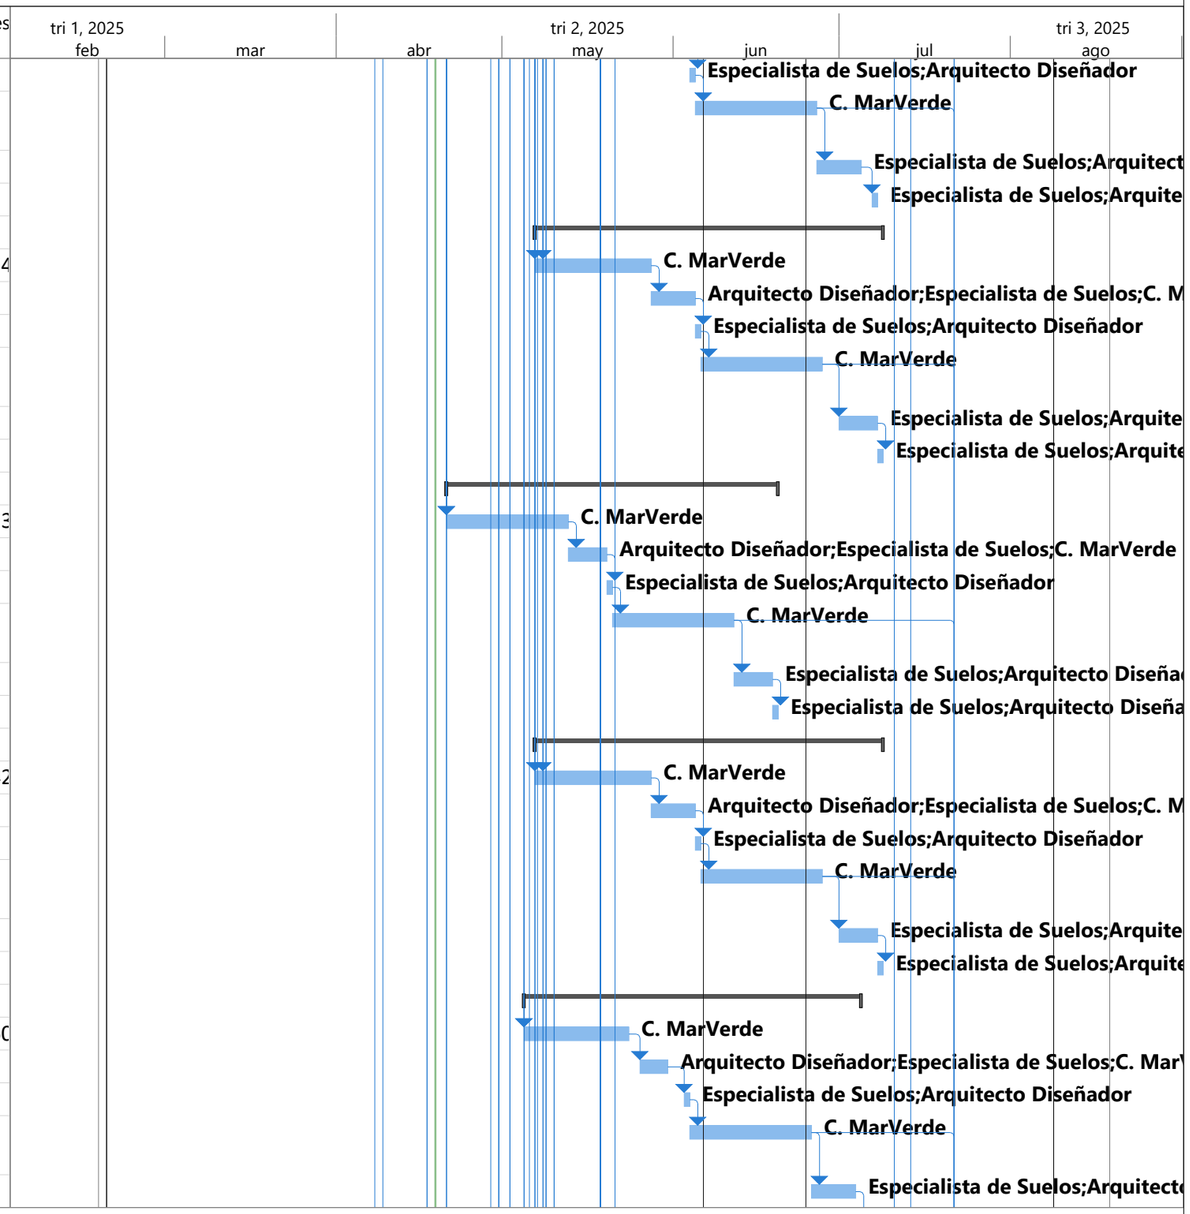


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
401	1.2.2.7.7.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	400
402	**1.2.2.7.8**	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
403	1.2.2.7.8.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
404	1.2.2.7.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	403
405	1.2.2.7.8.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	404
406	1.2.2.7.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	405
407	1.2.2.7.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	406
408	1.2.2.7.8.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	407
409	**1.2.2.7.9**	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
410	1.2.2.7.9.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
411	1.2.2.7.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	410
412	1.2.2.7.9.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	411
413	1.2.2.7.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	412
414	1.2.2.7.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	413
415	1.2.2.7.9.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	414
416	**1.2.2.7.10**	**Redes Exteiores - Urbanismo**	**20 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**	
417	1.2.2.7.10.1	Planteamiento diseño eléctrico	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	182;357
418	1.2.2.7.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	3 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	417
419	1.2.2.7.10.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	418
420	1.2.2.7.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	8 días	vie 25/07/25	mar 5/08/25	419
421	1.2.2.7.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	2 días	mié 6/08/25	vie 8/08/25	420
422	1.2.2.7.10.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 11/08/25	lun 11/08/25	421
423	**1.2.2.8**	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y C(**	**80 días**	**mar 8/04/25**	**mar 5/08/25**	
424	**1.2.2.8.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	
425	1.2.2.8.1.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	92;197
426	1.2.2.8.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	425
427	1.2.2.8.1.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	426
428	1.2.2.8.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	427
429	1.2.2.8.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	428
430	1.2.2.8.1.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	429
431	**1.2.2.8.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 2/05/25**	**jue 3/07/25**	

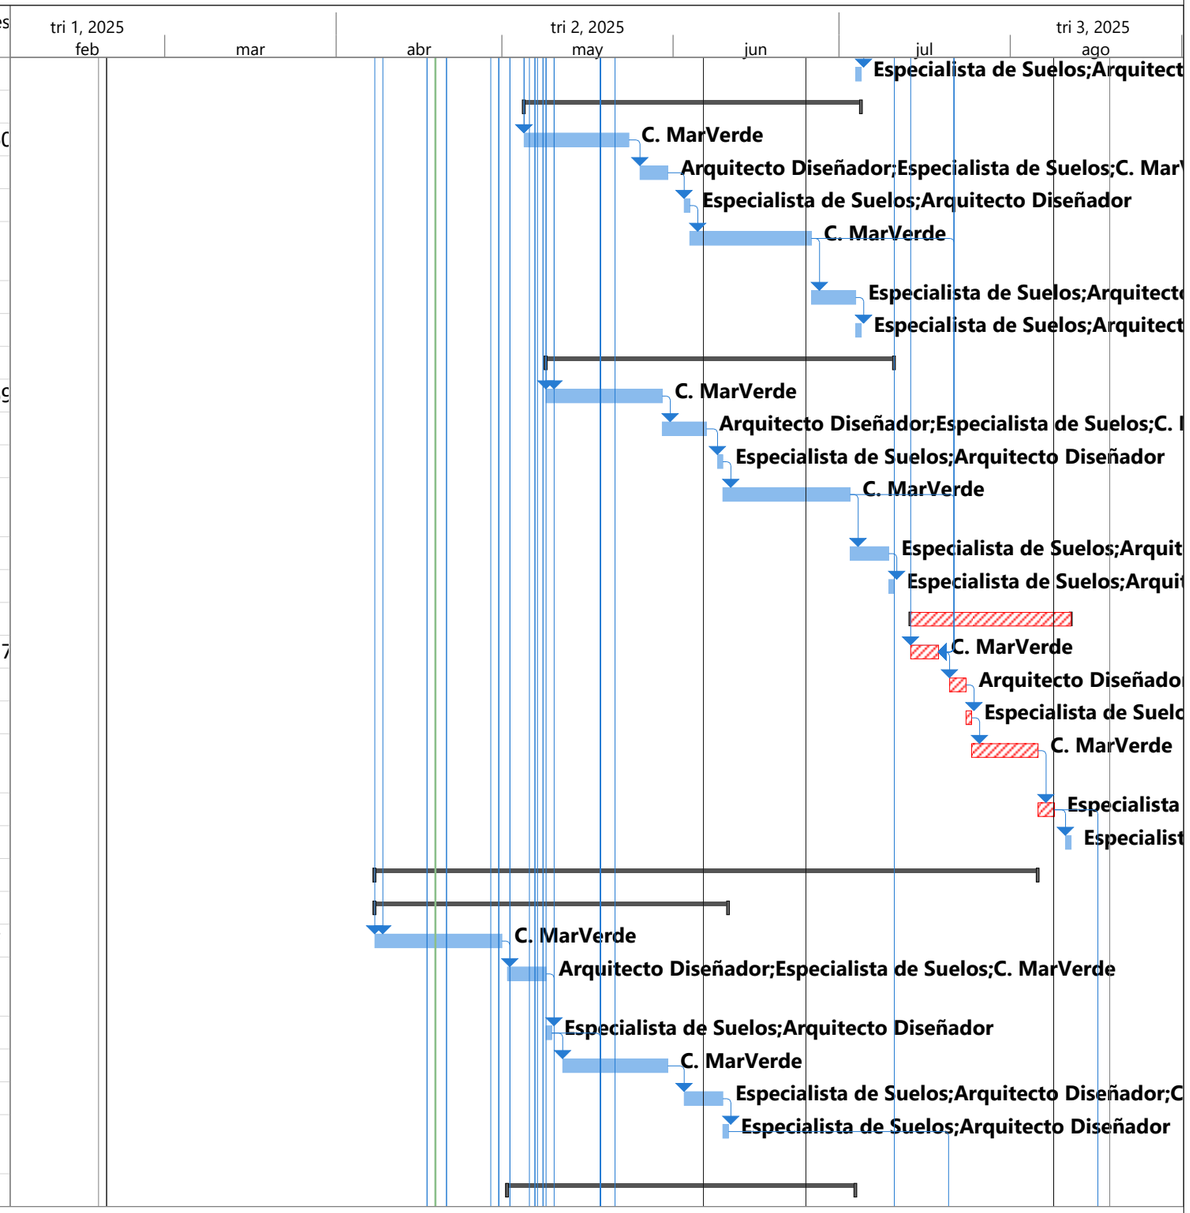

Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
432	1.2.2.8.2.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	102;206
433	1.2.2.8.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	432
434	1.2.2.8.2.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	433
435	1.2.2.8.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 3/06/25	mar 24/06/25	434
436	1.2.2.8.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 25/06/25	mié 2/07/25	435
437	1.2.2.8.2.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	436
438	**1.2.2.8.3**	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	
439	1.2.2.8.3.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	112;215
440	1.2.2.8.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	439
441	1.2.2.8.3.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	440
442	1.2.2.8.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	441
443	1.2.2.8.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	442
444	1.2.2.8.3.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	443
445	**1.2.2.8.4**	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
446	1.2.2.8.4.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	122;224
447	1.2.2.8.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	446
448	1.2.2.8.4.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	447
449	1.2.2.8.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	448
450	1.2.2.8.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	449
451	1.2.2.8.4.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	450
452	**1.2.2.8.5**	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	
453	1.2.2.8.5.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	132;233
454	1.2.2.8.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	453
455	1.2.2.8.5.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	454
456	1.2.2.8.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	455
457	1.2.2.8.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	456
458	1.2.2.8.5.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	457
459	**1.2.2.8.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
460	1.2.2.8.6.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	142;242




Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
461	1.2.2.8.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	460
462	1.2.2.8.6.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	461
463	1.2.2.8.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	462
464	1.2.2.8.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	463
465	1.2.2.8.6.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	464
466	**1.2.2.8.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	
467	1.2.2.8.7.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	152;251
468	1.2.2.8.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	467
469	1.2.2.8.7.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	468
470	1.2.2.8.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	469
471	1.2.2.8.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	470
472	1.2.2.8.7.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	471
473	**1.2.2.8.8**	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	
474	1.2.2.8.8.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	161;260
475	1.2.2.8.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	474
476	1.2.2.8.8.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	475
477	1.2.2.8.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	476
478	1.2.2.8.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	477
479	1.2.2.8.8.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	478
480	**1.2.2.8.9**	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
481	1.2.2.8.9.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
482	1.2.2.8.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	481
483	1.2.2.8.9.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	482
484	1.2.2.8.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	483
485	1.2.2.8.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	484
486	1.2.2.8.9.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	485
487	**1.2.2.8.10**	**Redes Exteriores - Urbanismo**	**18 días**	**vie 11/07/25**	**mar 5/08/25**	
488	1.2.2.8.10.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25	182;430

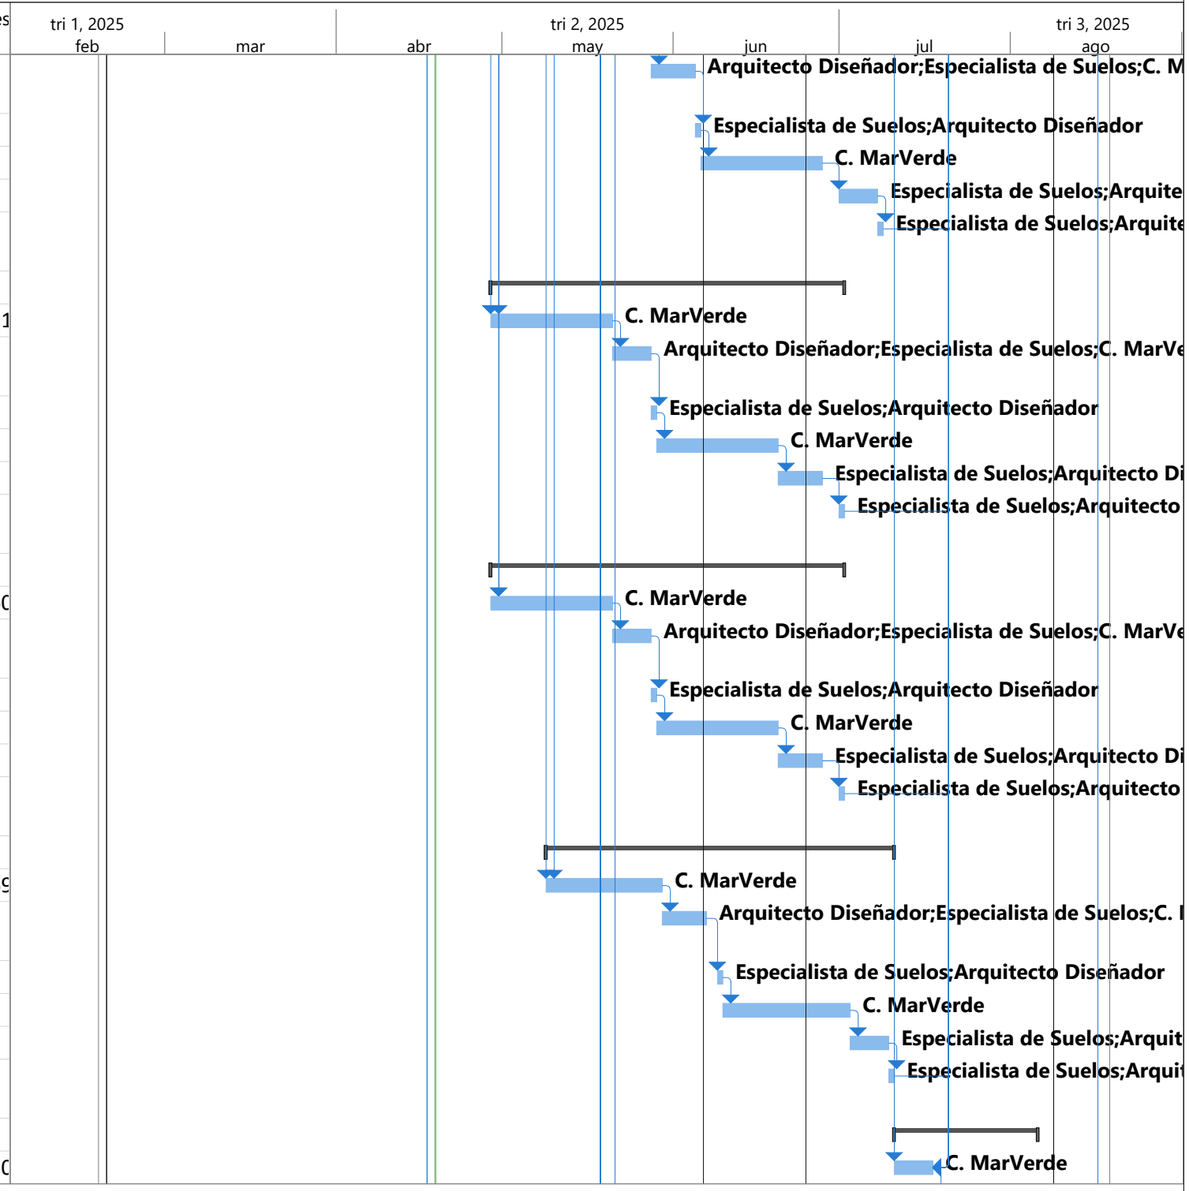


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
489	1.2.2.8.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	3 días	vie 18/07/25	mar 22/07/25	488
490	1.2.2.8.10.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	489
491	1.2.2.8.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	490
492	1.2.2.8.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	3 días	jue 31/07/25	lun 4/08/25	491
493	1.2.2.8.10.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	492
494	**1.2.3**	**PROGRAMACION DE OBRA**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
495	**1.2.3.1**	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
496	1.2.3.1.1	Entrega	7 días	lun 17/02/25	mar 25/02/25	3
497	1.2.3.1.2	Revisión Interventoria - Mesa de trabajo	10 días	mié 26/02/25	mar 11/03/25	496
498	1.2.3.1.3	Aprobación	1 día	mié 12/03/25	mié 12/03/25	497
499	1.2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	3
500	**1.2.3.2**	**Programación Construcción**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**	
501	**1.2.3.2.1**	**Programación**	**15 días**	**mié 14/05/25**	**mié 4/06/25**	
502	1.2.3.2.1.1	Elaboración	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25	280FF-5
503	1.2.3.2.1.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	502
504	1.2.3.2.1.3	Aprobación	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	503
505	**1.2.3.2.2**	**Entregables**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**	
506	1.2.3.2.2.1	Estructura desglosada del trabajo EDT	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
507	1.2.3.2.2.2	Programación de obra detallada	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25	504FF
508	1.2.3.2.2.3	Programa mensual de uso de Fuerza de trab	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
509	1.2.3.2.2.4	Programa de suministro de Materiales	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
510	1.2.3.2.2.5	Programa de subcontratos y compras	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
511	1.2.3.2.2.6	Programa de uso de equipo y maquinaria	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
512	1.2.3.2.2.7	Revision Mesa de trabajo - entregables	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25	506;507
513	1.2.3.2.2.8	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	512
514	1.2.3.2.2.9	Programa de Inversión mensual del Anticipo	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	58
515	1.2.3.2.2.10	Programa de Inversión mensual del proyect	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	58
516	1.2.3.2.2.11	Revision Mesa de trabajo - entregables	25 días	lun 5/05/25	lun 9/06/25	515
517	1.2.3.2.2.12	Aprobación	15 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25	516FF
518	**1.2.4**	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el**	**35 días**	**mié 25/06/25**	**jue 14/08/25**	
519	1.2.4.1	Calculo de cantidades Arquitectonicas	30 días	mié 25/06/25	mié 6/08/25	186FC+
520	1.2.4.2	Calculo de cantidades Estructurales	22 días	mar 8/07/25	mié 6/08/25	519CC+

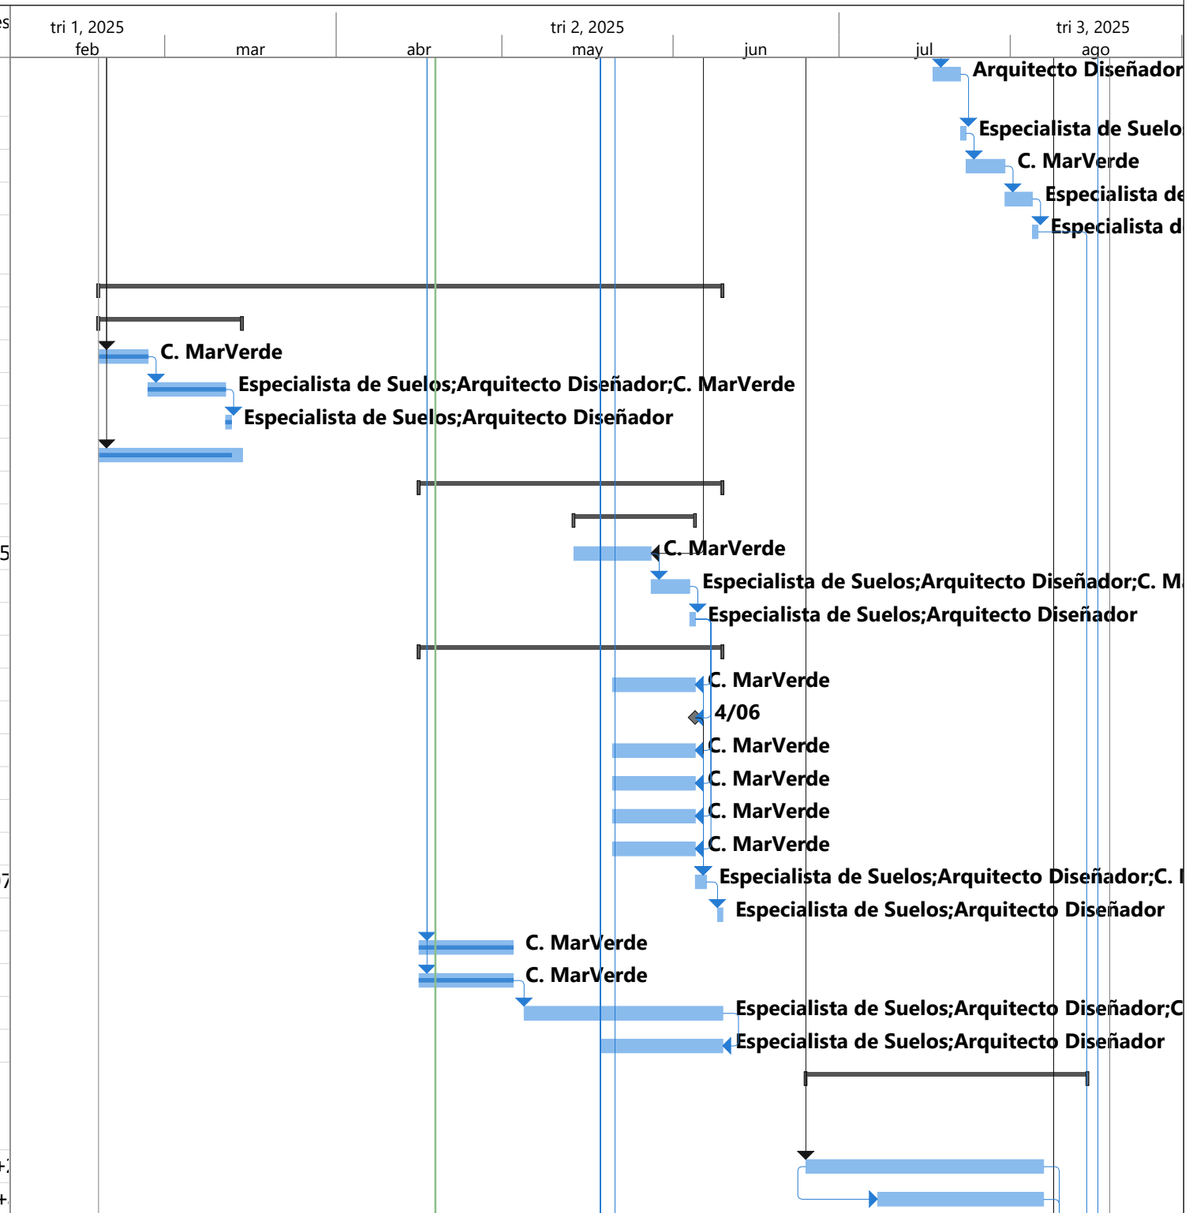


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
521	1.2.4.3	Elaboración Balance	10 días	jue 24/07/25	mié 6/08/25	519FF;5
522	1.2.4.4	Revisión	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25	521
523	1.2.4.5	Aprobación	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25	522
524	**1.2.5**	**AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS**	**61 días**	**lun 19/05/25**	**lun 18/08/25**	
525	1.2.5.1	Calculo de cantidades Hidrosanitarias y RCI	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25	281FF+3
526	1.2.5.2	Calculo de cantidades Eléctricas	9 días	jue 31/07/25	mié 13/08/25	421FF+3
527	1.2.5.3	Calculo de cantidades Red de Comunicaciones y S	12 días	jue 24/07/25	lun 11/08/25	493FF+3
528	1.2.5.4	Elaboración Balance	12 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25	525FF;5
529	1.2.5.5	Revisión	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25	528
530	1.2.5.6	Aprobación	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25	529
531	**1.2.5.7**	**CONSTRUCCION**	**0 días**	**lun 19/05/25**	**lun 19/05/25**	
532	1.2.5.7.1	Inicio Construcción	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	**182;77;**

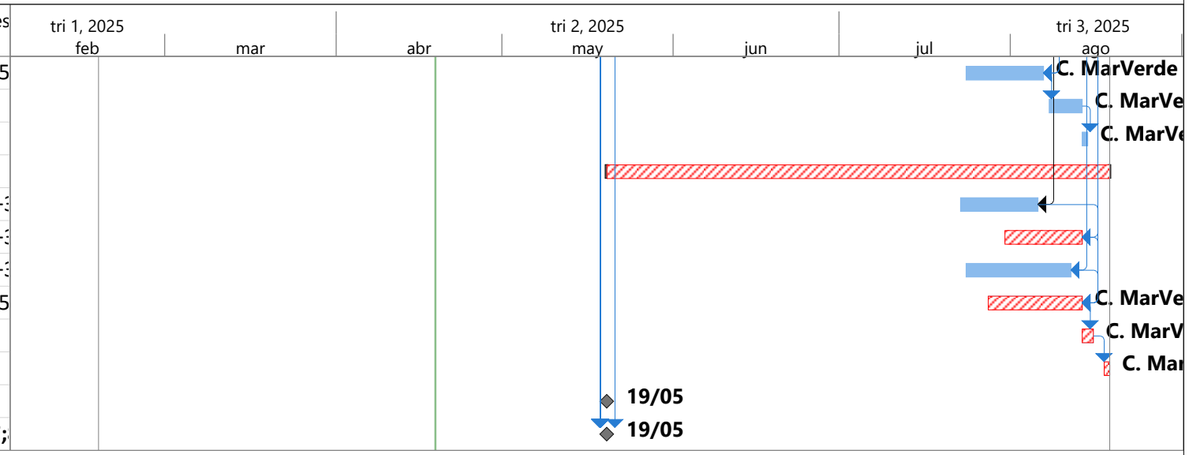

Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

REPROGRAMACIÓN ETAPA DE DISEÑOS

PROYECTO: CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS (META)

1. **1. Título:**

"Informe de Presentación de Nueva Programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2 - LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE" – CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-293-2024

2. **2. Resumen Ejecutivo:**

La premisa de la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1 presentada para la etapa de diseños del contrato de la referencia fue establecida bajo la premisa principal que se cumplieran las fechas de aprobación de los diseños básicos presentados por el CONSORCIO MAR VERDE CV los cuales después de ser recibidos por parte de la USPEC como documentos de partida, después de un análisis fueron apropiados y mejorados y presentados en mesas de diseño las cuales iniciaron el 11 de marzo del 2025.

Se establecieron las siguientes fechas de revisiones y aprobaciones, el cumplimiento de las cuales aseguraban el normal avance en la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1. Ver cuadro

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ACACIAS


CUADRO DE REVISIONES

No.	EDIFICIO	REVISON USPEC			REVISION INPEC	
		revision diseño basico	2 da revision diseño basico	APROBADO USPEC EDGAR LUZ DARY		fecha aprob
	IMPLANTACION	27/03/2025				
1	PABELLON MUJERES	11/03/2025		17/03/2025		20/03/2025
2	AULAS	13/03/2025		17/03/2025	OK	20/03/2025
3	TALLERES	17/03/2025	REP20/03/2025	10/04/2025	OK	
4	DIER Y PABELLON MATERNAS	13/03/2025		11/04/2025	NO	
5	VISITAS	20/03/2025	27/03/2025	31/03/2025	NO	
6	RANCHO Y ALOJA RANCHERAS	20/03/2025	REP 31/03,2025	11/04/2025	NO	
7	RESEÑA	nuevo	7/04/2025		NO	
8	ASADERO Y REPOSTERIA	27/03/2025	REP 31/03,2025	11/04/2025	NO	
9	SANIDAD	27/03/2025	27/032025	11/04/2025	NO	
10	GUARDIA INTERNA	20/03/2025		7/04/2025	NO	
11	GUARDIA EXTERNA	20/03/2025		7/04/2025	NO	
12	ALOJAMIENTO GUARDIANAS	20/03/2025	REP31/03/2025	11/04/2025	NO	
13	CAMINERAS				NO	
14	GARITAS	31/03/2025			NO	
15	CERRAMIENTO	27/03/2025			NO	
16	ACOPIO	NUEVO				
17	TANQUE DE AGUA	NUEVO				
18	PLANTA ELECTRICA	NUEVO				

La variacion de las observadas en las fechhas de aprobacion de los diseños basicos es generada debido a las revisiones necesarias para aprobacion de los diferentes actores los cuales deacuerdo a su especialidad han realizado modificaciones.

Esto ha generado un atraso acumulado como se observa a continuacion en la curva S

T1	Semana 1	2%	2%	
	Semana 2	4%	4%	
	Semana 3	6%	5%	1%
	Semana 4	9%	8%	
	Semana 5	12%	11%	
	Semana 6	15%	13%	
	Semana 7	19%	14%	
T2	Semana 8	23%	15%	
	Semana 10	28%		
	Semana 11	36%		
	Semana 12	45%		
	Semana 13	58%		
	Semana 14	70%		
	Semana 15	77%		
	Semana 16	83%		
	Semana 17	88%		
	Semana 18	92%		
	Semana 19	95%		
	Semana 20	96%		
	Semana 21	97%		
T3	Semana 22	98%		
	Semana 23	99%		
	Semana 24	99%		
	Semana 25	99%		
	Semana 26	100%		
	Semana 27	100%		

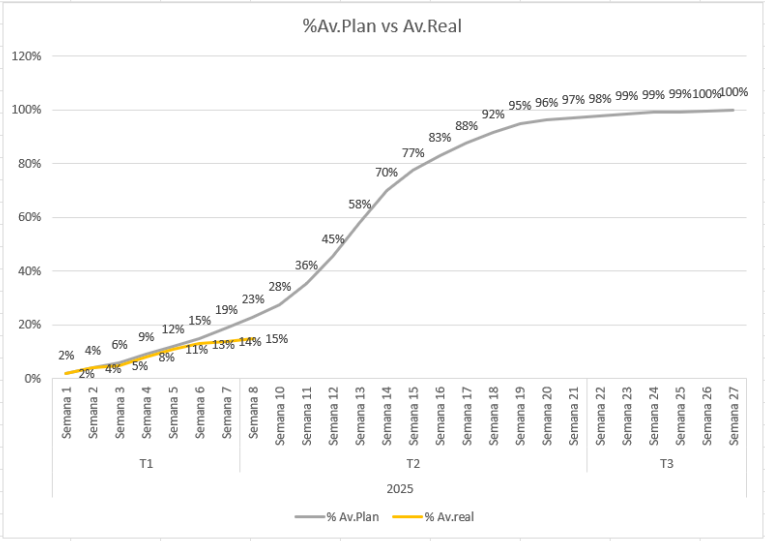

3. **3. Introducción:**

De acuerdo con lo contextualizado anteriormente el atraso que presenta la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1 es de del 8% el cual se ha venido acumulando desde la semana 3, desde que las fechas de aprobación de los diseños básicos no se cumplieron. Es importante mencionar que el diseño básico aprobado marca la ruta crítica para los diseños estructurales, hidro sanitario, red contra incendio red de gas, eléctrico, iluminación, seguridad y comunicaciones, implantación del proyecto, urbanismo, cerramiento, análisis forestal, bioclimático y de inundaciones, coordinación BIM, extracción mecánica.

Después de analizar la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1 en su seguimiento se ve la necesidad de plantear una nueva reprogramación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2

4. **4. Nueva Programación:**

Cronograma Detallado: PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2

	PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2				
EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**124 días**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
1.1	**Acta de inicio**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
1.1.1	Firma Acta de Inicio	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	
1.1.2	**Documentos Entregados**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
1.1.2.1	Programa Inversion del Anticipo Aprobado	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.1.2.2	Entrega hojas de Vida Preconstrucción y construcción	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.1.2.3	Aprobación Hojas de vida	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.1.2.4	Desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.1.2.5	Aprobación desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	8
1.1.2.6	Aprobación polizas del contrato	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.2	**PRECONSTRUCCION**	**124 días**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
1.2.1	**SISTEMAS DE GESTION**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
1.2.1.1	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**47 días**	**mar 25/02/25**	**lun 5/05/25**	
1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	32 días	mar 25/02/25	mié 9/04/25	3CC+6 días
1.2.1.1.2	Elaboración	4 días	jue 10/04/25	mar 15/04/25	14
1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	15
1.2.1.1.4	Aprobación	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	16
1.2.1.2	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	
1.2.1.2.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	19
1.2.1.2.3	Aprobación	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	20
1.2.1.3	**Plan de Gestion de Calidad Et Construcción y Plan de Inspeccion y ensa**	**28 días**	**lun 17/02/25**	**mié 26/03/25**	
1.2.1.3.1	Elaboración	12 días	lun 17/02/25	mar 4/03/25	3
1.2.1.3.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	mié 5/03/25	mar 25/03/25	23
1.2.1.3.3	Aprobación	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	24
1.2.1.4	**Plan de Gestion Ambiental y Residuos**	**46 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	
1.2.1.4.1	Elaboración	30 días	lun 17/02/25	vie 28/03/25	3
1.2.1.4.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	lun 31/03/25	mar 22/04/25	27
1.2.1.4.3	Aprobación	1 día	mié 23/04/25	mié 23/04/25	28
1.2.1.5	**Tabla de Fuerza de trabajo directivo**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	
1.2.1.5.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
1.2.1.5.2	Revision - Mesa de Trabajo	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	31
1.2.1.5.3	Aprobación	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	32
1.2.1.6	**Manual de Operación del Proyecto**	**24 días**	**mar 6/05/25**	**lun 9/06/25**	
1.2.1.6.1	Elaboración	19 días	mar 6/05/25	vie 30/05/25	25;17;21;29;33
1.2.1.6.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	35
1.2.1.6.3	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	36
1.2.2	**DISEÑOS**	**119 días**	**lun 17/02/25**	**lun 11/08/25**	
1.2.2.1	**DATOS DE ENTRADA**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
1.2.2.1.1	Entrega planos iniciales	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
1.2.2.1.2	Revisión planos Arquitectonicos y Estructurales	10 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25	40
1.2.2.1.3	Solicitud Planos Faltantes	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
1.2.2.1.4	Recibo planos faltantes	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	42
1.2.2.1.5	Visita de Obra	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	3
1.2.2.2	**TOPOGRAFIA**	**38 días**	**lun 3/03/25**	**vie 25/04/25**	
1.2.2.2.1	Levantamiento topografico	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	71
1.2.2.2.2	Calculos y elaboración de planos	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	46

1.2.2.2.3	**Entregables**	**32 días**	**mar 11/03/25**	**vie 25/04/25**	
1.2.2.2.3.1	Entrega levantamiento planimetrico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	47CC+1 día
1.2.2.2.3.2	Entrega Informe Topografico y planos	6 días	lun 17/03/25	lun 24/03/25	47
1.2.2.2.3.3	Revisión Interventoria	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	50
1.2.2.2.3.4	Mesa de trabajo	4 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25	51
1.2.2.2.3.5	Revisión Constructor	12 días	jue 3/04/25	mar 22/04/25	52
1.2.2.2.3.6	Aprobación	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	53
1.2.2.3	**ESTUDIO DE SUELOS**	**29 días**	**mar 25/03/25**	**mié 7/05/25**	
1.2.2.3.1	Exploracion de suelos en campo	8 días	mar 25/03/25	jue 3/04/25	50
1.2.2.3.2	Ensayos de laboratorio	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	56CC+3 días
1.2.2.3.3	Datos para revisión de cimentación	7 días	lun 7/04/25	mar 15/04/25	57CC+6 días
1.2.2.3.4	Analisis y elaboración de Informe	4 días	vie 11/04/25	mié 16/04/25	57
1.2.2.3.5	**Entregables**	**12 días**	**lun 21/04/25**	**mié 7/05/25**	
1.2.2.3.5.1	Revision - Mesa de trabajo Datos para revisión de estructuras	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	59
1.2.2.3.5.2	Aprobación Datos de Suelos para revisión de cimentación	1 día	jue 24/04/25	jue 24/04/25	61
1.2.2.3.5.3	Entrega de Estudio de suelos	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	62
1.2.2.3.5.4	Revisión Interventoria	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	63
1.2.2.3.5.5	Mesa de trabajo	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	64
1.2.2.3.5.6	Revisión Constructor	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	65
1.2.2.3.5.7	Aprobación	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	66
1.2.2.4	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**67 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	
1.2.2.4.1	**Implantación del Proyecto**	**55 días**	**lun 17/02/25**	**mié 7/05/25**	
1.2.2.4.1.1	Alternativas de Implantacion	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	3
1.2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de implantacion	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	70
1.2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioc	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	71
1.2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	29 días	jue 13/03/25	jue 24/04/25	72
1.2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	73
1.2.2.4.1.6	Implantación definitiva	8 días	mié 23/04/25	lun 5/05/25	109;119;149; 159;169;129; 139
1.2.2.4.1.7	Revisión - Mesa de trabajo Implantación arquitectónica definitiva	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	75
1.2.2.4.1.8	Aprobación Implantación arquitectónico	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	76
1.2.2.4.2	**Cerramiento**	**54 días**	**vie 21/02/25**	**lun 12/05/25**	
1.2.2.4.2.1	Entrega especificación Uspec	2 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	44
1.2.2.4.2.2	Elaboración Detalle cerramiento	3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	79
1.2.2.4.2.3	Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramiento	7 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	80FC+20 días
1.2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	81FC+7 días
1.2.2.4.2.5	Trazado cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	82CC
1.2.2.4.2.6	Revision - Mesa de trabajo Trazado Cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	83CC
1.2.2.4.2.7	Aprobación Trazado Cerramiento	14 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	84

1.2.2.4.3	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**50 días**	**lun 3/03/25**	**mié 14/05/25**	
1.2.2.4.3.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
1.2.2.4.3.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	87CC+1 día
1.2.2.4.3.3	Aprobación Esquema Basico	6 días	jue 13/03/25	jue 20/03/25	88CC+2 días
1.2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	89
1.2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	90
1.2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 7/04/25	lun 7/04/25	91
1.2.2.4.3.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	12 días	jue 24/04/25	lun 12/05/25	92FC+10 días
1.2.2.4.3.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25	93
1.2.2.4.3.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	94
1.2.2.4.4	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**49 días**	**lun 10/03/25**	**mar 20/05/25**	
1.2.2.4.4.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	87
1.2.2.4.4.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	97
1.2.2.4.4.3	Aprobación Esquema Basico	21 días	mar 18/03/25	mar 15/04/25	98
1.2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
1.2.2.4.4.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	100
1.2.2.4.4.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	101CC+3 días
1.2.2.4.4.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102
1.2.2.4.4.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	103
1.2.2.4.4.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	104
1.2.2.4.5	**Talleres**	**51 días**	**lun 10/03/25**	**jue 22/05/25**	
1.2.2.4.5.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25	87
1.2.2.4.5.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	107
1.2.2.4.5.3	Aprobación Esquema Basico	16 días	jue 20/03/25	jue 10/04/25	108
1.2.2.4.5.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	vie 11/04/25	lun 28/04/25	109
1.2.2.4.5.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	110
1.2.2.4.5.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	111CC+3 días
1.2.2.4.5.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112
1.2.2.4.5.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	mar 20/05/25	mié 21/05/25	113
1.2.2.4.5.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	114
1.2.2.4.6	**Sanidad**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
1.2.2.4.6.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25	107
1.2.2.4.6.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	117FC+4 días
1.2.2.4.6.3	Aprobación Esquema Basico	11 días	vie 28/03/25	vie 11/04/25	118
1.2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	119
1.2.2.4.6.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	120
1.2.2.4.6.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	121CC+3 días
1.2.2.4.6.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122
1.2.2.4.6.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	123
1.2.2.4.6.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	124
1.2.2.4.7	**Visitas**	**37 días**	**vie 14/03/25**	**jue 8/05/25**	
1.2.2.4.7.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	117CC
1.2.2.4.7.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	127
1.2.2.4.7.3	Aprobación Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	128CC
1.2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	129
1.2.2.4.7.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	130
1.2.2.4.7.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 16/04/25	mié 16/04/25	131CC+3 días
1.2.2.4.7.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132
1.2.2.4.7.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	mar 6/05/25	mié 7/05/25	133
1.2.2.4.7.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	134

1.2.2.4.8	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
1.2.2.4.8.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	127CC
1.2.2.4.8.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	137
1.2.2.4.8.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	138
1.2.2.4.8.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	139
1.2.2.4.8.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	140
1.2.2.4.8.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	141CC+3 días
1.2.2.4.8.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142
1.2.2.4.8.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	143
1.2.2.4.8.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	144
1.2.2.4.9	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**35 días**	**mié 19/03/25**	**vie 9/05/25**	
1.2.2.4.9.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	4 días	mié 19/03/25	lun 24/03/25	137CC+3 días
1.2.2.4.9.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	147FC+2 días
1.2.2.4.9.3	Aprobación Esquema Basico	12 días	jue 27/03/25	vie 11/04/25	148CC
1.2.2.4.9.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	149CC+2 días
1.2.2.4.9.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	2 días	lun 14/04/25	mar 15/04/25	150
1.2.2.4.9.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	151CC+3 días
1.2.2.4.9.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	11 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	152
1.2.2.4.9.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	153
1.2.2.4.9.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	154
1.2.2.4.10	**Alojamiento Guardianas**	**39 días**	**mar 25/03/25**	**mié 21/05/25**	
1.2.2.4.10.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	147
1.2.2.4.10.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	3 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	157
1.2.2.4.10.3	Aprobación Esquema Basico	9 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25	158
1.2.2.4.10.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	159
1.2.2.4.10.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	160
1.2.2.4.10.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	161CC+3 días
1.2.2.4.10.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162
1.2.2.4.10.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	163
1.2.2.4.10.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	164
1.2.2.4.11	**Garitas**	**41 días**	**mar 25/03/25**	**vie 23/05/25**	
1.2.2.4.11.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativ	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	157CC
1.2.2.4.11.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	167
1.2.2.4.11.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	
1.2.2.4.11.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	7 días	mié 23/04/25	vie 2/05/25	169
1.2.2.4.11.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	170
1.2.2.4.11.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	171CC+3 días
1.2.2.4.11.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	172
1.2.2.4.11.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	173
1.2.2.4.11.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	174

1.2.2.4.12	**Urbanismo**	**28 días**	**jue 10/04/25**	**jue 22/05/25**	
1.2.2.4.12.1	Anteproyecto de Urbanismo	5 días	jue 10/04/25	mié 16/04/25	167FC+10 días
1.2.2.4.12.2	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Arquitectonico	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	177
1.2.2.4.12.3	Aprobación anteproyecto arquitectónico	4 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	178
1.2.2.4.12.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	4 días	lun 28/04/25	vie 2/05/25	179
1.2.2.4.12.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquitectonico	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	180
1.2.2.4.12.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	181CC+3 días
1.2.2.4.12.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	182
1.2.2.4.12.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitectonicos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	183
1.2.2.4.12.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	184
1.2.2.4.13	**Fin Diseño Arquitectonico**	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	69;86;106;166;176;116;146;156;78;96;126;136
1.2.2.5	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**50 días**	**vie 21/03/25**	**mié 4/06/25**	
1.2.2.5.1	**Cerramiento**	**17 días**	**vie 25/04/25**	**mar 20/05/25**	
1.2.2.5.1.1	Diseño estructural Cerramiento	9 días	vie 25/04/25	jue 8/05/25	82;62
1.2.2.5.1.2	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural	2 días	vie 9/05/25	lun 12/05/25	189
1.2.2.5.1.3	Revisión diseño de acuerdo a Estudio de suelos y topografica	3 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25	190;58;47
1.2.2.5.1.4	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	191
1.2.2.5.1.5	Aprobación Diseño Estructural Cerramiento	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	192
1.2.2.5.2	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**44 días**	**vie 21/03/25**	**lun 26/05/25**	
1.2.2.5.2.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 21/03/25	jue 27/03/25	89
1.2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	195
1.2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	196
1.2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 3/04/25	vie 4/04/25	197
1.2.2.5.2.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 25/04/25	vie 16/05/25	197;62
1.2.2.5.2.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	lun 12/05/25	vie 16/05/25	199FF
1.2.2.5.2.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	199
1.2.2.5.2.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	201
1.2.2.5.3	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**30 días**	**mié 16/04/25**	**vie 30/05/25**	
1.2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
1.2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	204
1.2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	205
1.2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	206
1.2.2.5.3.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	206;62
1.2.2.5.3.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	208FF
1.2.2.5.3.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	208
1.2.2.5.3.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	210
1.2.2.5.4	**Talleres**	**30 días**	**vie 11/04/25**	**mar 27/05/25**	
1.2.2.5.4.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 11/04/25	lun 21/04/25	109
1.2.2.5.4.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	213
1.2.2.5.4.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	214
1.2.2.5.4.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	215
1.2.2.5.4.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 28/04/25	lun 19/05/25	215;62

1.2.2.5.4.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	217FF	
1.2.2.5.4.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25		217
1.2.2.5.4.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25		219
1.2.2.5.5	**Sanidad**	**34 días**	**lun 14/04/25**	**mié 4/06/25**		
1.2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25		119
1.2.2.5.5.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25		222
1.2.2.5.5.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25		223
1.2.2.5.5.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25		224
1.2.2.5.5.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	16 días	lun 5/05/25	lun 26/05/25	224;62	
1.2.2.5.5.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	226FF	
1.2.2.5.5.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25		226
1.2.2.5.5.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25		228
1.2.2.5.6	**Visitas**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**mié 21/05/25**		
1.2.2.5.6.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25		129
1.2.2.5.6.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25		231
1.2.2.5.6.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25		232
1.2.2.5.6.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 10/04/25	vie 11/04/25		233
1.2.2.5.6.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62	
1.2.2.5.6.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	235FF	
1.2.2.5.6.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25		235
1.2.2.5.6.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25		237
1.2.2.5.7	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**		
1.2.2.5.7.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25		139
1.2.2.5.7.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25		240
1.2.2.5.7.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25		241
1.2.2.5.7.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25		242
1.2.2.5.7.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62	
1.2.2.5.7.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	244FF	
1.2.2.5.7.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25		244
1.2.2.5.7.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25		246
1.2.2.5.8	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**		
1.2.2.5.8.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25		149
1.2.2.5.8.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25		249
1.2.2.5.8.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25		250
1.2.2.5.8.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25		251
1.2.2.5.8.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62	
1.2.2.5.8.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	253FF	
1.2.2.5.8.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25		253
1.2.2.5.8.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25		255

1.2.2.5.9	**Alojamiento de Guardianas**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
1.2.2.5.9.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	159
1.2.2.5.9.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	258
1.2.2.5.9.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	259
1.2.2.5.9.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	260
1.2.2.5.9.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
1.2.2.5.9.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	262FF
1.2.2.5.9.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	262
1.2.2.5.9.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	264
1.2.2.5.10	**Garitas**	**20 días**	**mié 23/04/25**	**mié 21/05/25**	
1.2.2.5.10.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 23/04/25	mar 29/04/25	169
1.2.2.5.10.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento estructural	3 días	mié 30/04/25	lun 5/05/25	267
1.2.2.5.10.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	268
1.2.2.5.10.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mié 7/05/25	jue 8/05/25	269
1.2.2.5.10.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
1.2.2.5.10.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	271FF
1.2.2.5.10.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	271
1.2.2.5.10.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	273
1.2.2.5.11	**Urbanismo**	**10 días**	**vie 9/05/25**	**jue 22/05/25**	
1.2.2.5.11.1	Definicion de elementos de urbanismo que requieren diseño	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	182
1.2.2.5.11.2	Calculo detallado - Elaboración de planos	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25	276
1.2.2.5.11.3	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	277
1.2.2.5.11.4	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	278
1.2.2.5.12	**Fin Diseño Estructural**	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25	194FF;212FF; 221FF;230FF;
1.2.2.6	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO**	**77 días**	**mar 8/04/25**	**jue 31/07/25**	
1.2.2.6.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**32 días**	**mar 8/04/25**	**lun 26/05/25**	
1.2.2.6.1.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 8/04/25	mié 23/04/25	92;197
1.2.2.6.1.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	jue 24/04/25	mié 30/04/25	283
1.2.2.6.1.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	284
1.2.2.6.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	285
1.2.2.6.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	286
1.2.2.6.1.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	287
1.2.2.6.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**32 días**	**vie 2/05/25**	**mar 17/06/25**	
1.2.2.6.2.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102;206
1.2.2.6.2.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	290
1.2.2.6.2.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	291
1.2.2.6.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 26/05/25	lun 9/06/25	292
1.2.2.6.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 10/06/25	lun 16/06/25	293
1.2.2.6.2.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	294

1.2.2.6.3	**Talleres**	**32 días**	**mar 6/05/25**	**jue 19/06/25**		
1.2.2.6.3.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112;215	
1.2.2.6.3.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25		297
1.2.2.6.3.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25		298
1.2.2.6.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 28/05/25	mié 11/06/25		299
1.2.2.6.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25		300
1.2.2.6.3.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25		301
1.2.2.6.4	**Sanidad**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**		
1.2.2.6.4.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122;224	
1.2.2.6.4.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25		304
1.2.2.6.4.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25		305
1.2.2.6.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25		306
1.2.2.6.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25		307
1.2.2.6.4.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25		308
1.2.2.6.5	**Visitas**	**32 días**	**lun 21/04/25**	**jue 5/06/25**		
1.2.2.6.5.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132;233	
1.2.2.6.5.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 6/05/25	lun 12/05/25		311
1.2.2.6.5.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25		312
1.2.2.6.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25		313
1.2.2.6.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25		314
1.2.2.6.5.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25		315
1.2.2.6.6	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**		
1.2.2.6.6.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142;242	
1.2.2.6.6.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25		318
1.2.2.6.6.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25		319
1.2.2.6.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25		320
1.2.2.6.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25		321
1.2.2.6.6.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25		322
1.2.2.6.7	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**32 días**	**mar 29/04/25**	**vie 13/06/25**		
1.2.2.6.7.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 29/04/25	mar 13/05/25	152;251	
1.2.2.6.7.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25		325
1.2.2.6.7.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25		326
1.2.2.6.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 22/05/25	jue 5/06/25		327
1.2.2.6.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25		328
1.2.2.6.7.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25		329
1.2.2.6.8	**Alojamiento Guardianas**	**32 días**	**lun 5/05/25**	**mié 18/06/25**		
1.2.2.6.8.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162;260	
1.2.2.6.8.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25		332
1.2.2.6.8.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25		333
1.2.2.6.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 27/05/25	mar 10/06/25		334
1.2.2.6.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 11/06/25	mar 17/06/25		335
1.2.2.6.8.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	mié 18/06/25	mié 18/06/25		336

1.2.2.6.9	**Garitas**	**32 días**	**vie 9/05/25**	**mié 25/06/25**	
1.2.2.6.9.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 9/05/25	jue 22/05/25	172;269
1.2.2.6.9.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	339
1.2.2.6.9.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	340
1.2.2.6.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 3/06/25	lun 16/06/25	341
1.2.2.6.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 17/06/25	mar 24/06/25	342
1.2.2.6.9.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	343
1.2.2.6.10	**Redes Exteriores -Urbanismo**	**32 días**	**lun 16/06/25**	**jue 31/07/25**	
1.2.2.6.10.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25	182;322FF+5 días;329FF+5 días;288FF+5 días;295FF+5 días;302FF+5
1.2.2.6.10.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	346
1.2.2.6.10.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	347
1.2.2.6.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 10/07/25	mié 23/07/25	348
1.2.2.6.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	349
1.2.2.6.10.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y planos	1 día	jue 31/07/25	jue 31/07/25	350
1.2.2.7	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**83 días**	**mar 8/04/25**	**lun 11/08/25**	
1.2.2.7.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	
1.2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	92;197
1.2.2.7.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	354
1.2.2.7.1.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	355
1.2.2.7.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	356
1.2.2.7.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	357
1.2.2.7.1.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	358
1.2.2.7.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 23/05/25**	**jue 24/07/25**	
1.2.2.7.2.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 23/05/25	vie 13/06/25	102;106
1.2.2.7.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 16/06/25	vie 20/06/25	361
1.2.2.7.2.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	362
1.2.2.7.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 25/06/25	mié 16/07/25	363
1.2.2.7.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 17/07/25	mié 23/07/25	364
1.2.2.7.2.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	365
1.2.2.7.3	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	
1.2.2.7.3.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	215;112
1.2.2.7.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	368
1.2.2.7.3.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	369
1.2.2.7.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	370
1.2.2.7.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	371
1.2.2.7.3.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	372
1.2.2.7.4	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
1.2.2.7.4.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	122;224
1.2.2.7.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	375
1.2.2.7.4.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	376
1.2.2.7.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	377
1.2.2.7.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	378
1.2.2.7.4.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	379

1.2.2.7.5	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	
1.2.2.7.5.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	132;233
1.2.2.7.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	382
1.2.2.7.5.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	383
1.2.2.7.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	384
1.2.2.7.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	385
1.2.2.7.5.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	386
1.2.2.7.6	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
1.2.2.7.6.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	142;242
1.2.2.7.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	389
1.2.2.7.6.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	390
1.2.2.7.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	391
1.2.2.7.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	392
1.2.2.7.6.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	393
1.2.2.7.7	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
1.2.2.7.7.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
1.2.2.7.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	396
1.2.2.7.7.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	397
1.2.2.7.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	398
1.2.2.7.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	399
1.2.2.7.7.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	400
1.2.2.7.8	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
1.2.2.7.8.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
1.2.2.7.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	403
1.2.2.7.8.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	404
1.2.2.7.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	405
1.2.2.7.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	406
1.2.2.7.8.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	407
1.2.2.7.9	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
1.2.2.7.9.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
1.2.2.7.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	410
1.2.2.7.9.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	411
1.2.2.7.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	412
1.2.2.7.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	413
1.2.2.7.9.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	414
1.2.2.7.10	**Redes Exteiores - Urbanismo**	**20 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**	
1.2.2.7.10.1	Planteamiento diseño eléctrico	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	182;357FF+5 días;378FF+5 días;385FF+5 días;392FF+2 días;399FF+2
1.2.2.7.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	3 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	417
1.2.2.7.10.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	418
1.2.2.7.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	8 días	vie 25/07/25	mar 5/08/25	419
1.2.2.7.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	2 días	mié 6/08/25	vie 8/08/25	420
1.2.2.7.10.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 11/08/25	lun 11/08/25	421

1.2.2.8	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL**	**80 días**	**mar 8/04/25**	**mar 5/08/25**	**1.2.2.9**
1.2.2.8.1	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	**1.2.2.8.2**
1.2.2.8.1.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	1.2.2.8.1.1
1.2.2.8.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	1.2.2.8.1.2
1.2.2.8.1.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	1.2.2.8.1.3
1.2.2.8.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	1.2.2.8.1.4
1.2.2.8.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	1.2.2.8.1.5
1.2.2.8.1.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	1.2.2.8.1.6
1.2.2.8.2	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 2/05/25**	**jue 3/07/25**	**1.2.2.8.3**
1.2.2.8.2.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	1.2.2.8.2.1
1.2.2.8.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	1.2.2.8.2.2
1.2.2.8.2.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	1.2.2.8.2.3
1.2.2.8.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 3/06/25	mar 24/06/25	1.2.2.8.2.4
1.2.2.8.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 25/06/25	mié 2/07/25	1.2.2.8.2.5
1.2.2.8.2.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	1.2.2.8.2.6
1.2.2.8.3	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	**1.2.2.8.4**
1.2.2.8.3.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	1.2.2.8.3.1
1.2.2.8.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	1.2.2.8.3.2
1.2.2.8.3.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	1.2.2.8.3.3
1.2.2.8.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	1.2.2.8.3.4
1.2.2.8.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	1.2.2.8.3.5
1.2.2.8.3.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	1.2.2.8.3.6
1.2.2.8.4	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	**1.2.2.8.5**
1.2.2.8.4.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	1.2.2.8.4.1
1.2.2.8.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	1.2.2.8.4.2
1.2.2.8.4.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	1.2.2.8.4.3
1.2.2.8.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	1.2.2.8.4.4
1.2.2.8.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	1.2.2.8.4.5
1.2.2.8.4.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	1.2.2.8.4.6
1.2.2.8.5	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	**1.2.2.8.6**
1.2.2.8.5.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	1.2.2.8.5.1
1.2.2.8.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	1.2.2.8.5.2
1.2.2.8.5.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	1.2.2.8.5.3
1.2.2.8.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	1.2.2.8.5.4
1.2.2.8.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	1.2.2.8.5.5
1.2.2.8.5.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	1.2.2.8.5.6
1.2.2.8.6	**Rancho - Asadero - Alojamiento cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	**1.2.2.8.7**
1.2.2.8.6.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	1.2.2.8.6.1
1.2.2.8.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	1.2.2.8.6.2
1.2.2.8.6.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	1.2.2.8.6.3
1.2.2.8.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	1.2.2.8.6.4
1.2.2.8.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	1.2.2.8.6.5
1.2.2.8.6.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	1.2.2.8.6.6

1.2.2.8.7	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	**1.2.2.8.8**
1.2.2.8.7.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	1.2.2.8.7.1
1.2.2.8.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	1.2.2.8.7.2
1.2.2.8.7.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	1.2.2.8.7.3
1.2.2.8.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	1.2.2.8.7.4
1.2.2.8.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	1.2.2.8.7.5
1.2.2.8.7.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	1.2.2.8.7.6
1.2.2.8.8	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	**1.2.2.8.9**
1.2.2.8.8.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	161;260
1.2.2.8.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	474
1.2.2.8.8.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	475
1.2.2.8.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	476
1.2.2.8.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	477
1.2.2.8.8.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	478
1.2.2.8.9	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
1.2.2.8.9.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
1.2.2.8.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	481
1.2.2.8.9.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	482
1.2.2.8.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	483
1.2.2.8.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	484
1.2.2.8.9.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	485
1.2.2.8.10	**Redes Exteriores - Urbanismo**	**18 días**	**vie 11/07/25**	**mar 5/08/25**	
1.2.2.8.10.1	Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25	182;430FF+5 días;437FF+5 días;444FF+5 días;451FF+5 días;458FF+5 días;465FF+5 días;472FF+5 días;479FF+5 días;486FF+5 días
1.2.2.8.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y contro	3 días	vie 18/07/25	mar 22/07/25	488
1.2.2.8.10.3	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	489
1.2.2.8.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	490
1.2.2.8.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	3 días	jue 31/07/25	lun 4/08/25	491
1.2.2.8.10.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	492
1.2.3	**PROGRAMACION DE OBRA**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
1.2.3.1	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
1.2.3.1.1	Entrega	7 días	lun 17/02/25	mar 25/02/25	3
1.2.3.1.2	Revisión Interventoria - Mesa de trabajo	10 días	mié 26/02/25	mar 11/03/25	496
1.2.3.1.3	Aprobación	1 día	mié 12/03/25	mié 12/03/25	497
1.2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	3
1.2.3.2	**Programación Construcción**	**39 días**	**jue 10/04/25**	**lun 9/06/25**	
1.2.3.2.1	**Programación**	**15 días**	**mié 14/05/25**	**mié 4/06/25**	
1.2.3.2.1.1	Elaboración	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25	280FF-5 días
1.2.3.2.1.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	502
1.2.3.2.1.3	Aprobación	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	503

1.2.3.2.2	**Entregables**	**39 días**	**jue 10/04/25**	**lun 9/06/25**	
1.2.3.2.2.1	Estructura desglosada del trabajo EDT	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.2	Programación de obra detallada	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.3	Programa mensual de uso de Fuerza de trabajo operativa	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.4	Programa de suministro de Materiales	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.5	Programa de subcontratos y compras	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.6	Programa de uso de equipo y maquinaria	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
1.2.3.2.2.7	Revision Mesa de trabajo - entregables	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25	506;507;508; 509;510
1.2.3.2.2.8	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	512
1.2.3.2.2.9	Programa de Inversión mensual del Anticipo	10 días	jue 10/04/25	vie 25/04/25	58
1.2.3.2.2.10	Programa de Inversión mensual del proyecto	10 días	jue 10/04/25	vie 25/04/25	58
1.2.3.2.2.11	Revision Mesa de trabajo - entregables	25 días	lun 28/04/25	mar 3/06/25	515
1.2.3.2.2.12	Aprobación	15 días	mar 13/05/25	mar 3/06/25	516FF
1.2.4	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectur**	**33 días**	**mar 15/04/25**	**mié 4/06/25**	
1.2.4.1	Calculo de cantidades Arquitectonicas	20 días	mar 15/04/25	jue 15/05/25	186FF-6 días
1.2.4.2	Calculo de cantidades Estructurales	20 días	lun 28/04/25	lun 26/05/25	280FF-6 días
1.2.4.3	Elaboración Balance	10 días	mar 13/05/25	lun 26/05/25	519FF;520FF
1.2.4.4	Revisión	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	521
1.2.4.5	Aprobación	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	522
1.2.5	**AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS**	**22 días**	**jue 17/07/25**	**lun 18/08/25**	
1.2.5.1	Calculo de cantidades Hidrosanitarias y RCI	14 días	jue 17/07/25	mar 5/08/25	281FF+3 días
1.2.5.2	Calculo de cantidades Eléctricas	13 días	vie 25/07/25	mié 13/08/25	421FF+3 días
1.2.5.3	Calculo de cantidades Red de Comunicaciones y Seguridad	12 días	jue 24/07/25	lun 11/08/25	493FF+3 días
1.2.5.4	Elaboración Balance	12 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25	525FF;526FF; 527FF
1.2.5.5	Revisión	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25	528
1.2.5.6	Aprobación	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25	529
1.2.6	**CONSTRUCCION**	**0 días**	**jue 5/06/25**	**jue 5/06/25**	
1.2.6.1	Inicio Construcción	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	**182;77;85;95; 192;199;286; 356;427;276**

- **Descripción de los Cambios:** Se verificaron en la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr1 como primera medida el límite de comienzo y el límite de finalización vs el margen de demora las actividades de aprobación de diseño básico es cero por ser actividades de duración de 1 día, por esta razón se modificaron las fechas con la aprobación real. Adicionalmente se redistribuyo los márgenes en otras actividades para evitar que la variación en el tiempo total del cronograma no se viera tan afectado. A continuación, se puede observar el impacto, las afectaciones y modificaciones que genero las nuevas fechas de las aprobaciones en las mesas de trabajo de diseño, por especialidad.

DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS						
	PROGRAMACION VR1			PROGRAMACION VR2		
	Límite de comienzo	Límite de finalización	Duración	Duración	Comienzo	Fin
PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE	lun 17/02/25	vie 15/08/25	130 días	124 días	lun 17/02/25	lun 18/08/25
DISEÑO ARQUITECTONICO	**lun 17/02/25**	**jue 14/08/25**	65 días	**67 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**
Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	**mar 18/03/25**	**jue 14/08/25**	1 día	**3 días**	**vie 25/04/25**	**mar 29/04/25**
Implantación definitiva	vie 9/05/25	jue 22/05/25	10 días	8 días	mié 23/04/25	lun 5/05/25
Aprobacion Detalle Cerramiento	**jue 24/07/25**	**jue 24/07/25**	1 día	**1 día**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**
Aprobación Trazado Cerramiento	jue 14/08/25	jue 14/08/25	1 día	14 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25
Pabellón Reclusión de Mujeres	**lun 3/03/25**	**jue 14/08/25**	**33 días**	**50 días**	**lun 3/03/25**	**mié 14/05/25**
Aprobación Esquema Basico	jue 13/03/25	jue 13/03/25	1 día	6 días	jue 13/03/25	jue 20/03/25
Pabellón DIER - Pabellón Maternas	**mié 5/03/25**	**jue 14/08/25**	36 días	**49 días**	**lun 10/03/25**	**mar 20/05/25**
Aprobación Esquema Basico	**lun 17/03/25**	**lun 17/03/25**	1 día	**21 días**	**mar 18/03/25**	**mar 15/04/25**
Talleres	**vie 7/03/25**	**lun 28/04/25**	37 días	**51 días**	**lun 10/03/25**	**jue 22/05/25**
Aprobación Esquema Basico	jue 20/03/25	jue 20/03/25	1 día	16 días	jue 20/03/25	jue 10/04/25
Sanidad	**mié 12/03/25**	**jue 14/08/25**	39 días	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**
Aprobación Esquema Basico	jue 27/03/25	jue 27/03/25	1 día	11 días	vie 28/03/25	vie 11/04/25
Visitas	**mié 12/03/25**	**jue 14/08/25**	39 días	**37 días**	**vie 14/03/25**	**jue 8/05/25**
Aprobación Esquema Basico	jue 27/03/25	jue 27/03/25	1 día	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25
Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras	**mié 19/03/25**	**jue 14/08/25**	36 días	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**
Aprobación Esquema Basico	**lun 31/03/25**	**lun 31/03/25**	1 día	**10 días**	**lun 31/03/25**	**vie 11/04/25**
Guardia Interna - Guardia Externa	**vie 21/03/25**	**jue 14/08/25**	37 días	**35 días**	**mié 19/03/25**	**vie 9/05/25**
Aprobación Esquema Basico	**jue 3/04/25**	**jue 3/04/25**	1 día	**12 días**	**jue 27/03/25**	**vie 11/04/25**
Alojamiento Guardianas	**mié 26/03/25**	**jue 14/08/25**	36 días	**39 días**	**mar 25/03/25**	**mié 21/05/25**
Aprobación Esquema Basico	**lun 7/04/25**	**lun 7/04/25**	1 día	**9 días**	**mar 1/04/25**	**vie 11/04/25**
Garitas	**mié 26/03/25**	**jue 14/08/25**	33 días	**41 días**	**mar 25/03/25**	**vie 23/05/25**
Aprobación Esquema Basico	**mié 9/04/25**	**jue 10/04/25**	1 día	**10 días**	**lun 7/04/25**	**mar 22/04/25**
Urbanismo	**mié 21/05/25**	**jue 14/08/25**	21 días	**28 días**	**jue 10/04/25**	**jue 22/05/25**
Aprobación anteproyecto arquitectónico	**jue 29/05/25**	**jue 29/05/25**	1 día	**4 días**	**mar 22/04/25**	**vie 25/04/25**

DISEÑO ESTRUCTURAL	vie 14/03/25	vie 15/08/25	46 días	50 días	vie 21/03/25	mié 4/06/25
Cerramiento	**vie 25/07/25**	**mar 12/08/25**	13 días	**17 días**	**vie 25/04/25**	**mar 20/05/25**
Diseño estructural Cerramiento	**vie 25/07/25**	**jue 31/07/25**	5 días	**9 días**	**vie 25/04/25**	**jue 8/05/25**
Pabellón Reclusión de Mujeres	vie 14/03/25	mar 12/08/25	45 días	44 días	vie 21/03/25	lun 26/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	lun 31/03/25	mar 1/04/25	1 día	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 15/07/25	lun 4/08/25	15 días	15 días	vie 25/04/25	vie 16/05/25
Pabellón DIER - Pabellón Maternas	mar 18/03/25	mar 12/08/25	43 días	30 días	mié 16/04/25	vie 30/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	**mar 15/07/25**	**lun 4/08/25**	15 días	**15 días**	**vie 2/05/25**	**jue 22/05/25**
Talleres	vie 21/03/25	mar 12/08/25	40 días	30 días	vie 11/04/25	mar 27/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	mié 9/04/25	jue 10/04/25	1 día	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 15/07/25	lun 4/08/25	15 días	15 días	lun 28/04/25	lun 19/05/25
Sanidad	mar 15/04/25	mar 12/08/25	36 días	34 días	lun 14/04/25	mié 4/06/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	lun 14/07/25	lun 4/08/25	16 días	16 días	lun 5/05/25	lun 26/05/25
Visitas	**vie 28/03/25**	**mar 12/08/25**	32 días	**36 días**	**vie 28/03/25**	**mié 21/05/25**
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	vie 18/07/25	lun 4/08/25	12 días	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25
Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera	mar 1/04/25	vie 15/08/25	30 días	25 días	lun 14/04/25	mié 21/05/25
Planteamiento estructural	mar 1/04/25	lun 21/04/25	5 días	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mié 23/07/25	jue 7/08/25	12 días	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25
Guardia Interna - Guardia Externa	vie 4/04/25	vie 15/08/25	27 días	25 días	lun 14/04/25	mié 21/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mié 23/07/25	jue 7/08/25	12 días	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25
Alojamiento de Guardianas	mar 8/04/25	vie 15/08/25	25 días	25 días	lun 14/04/25	mié 21/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mié 23/07/25	jue 7/08/25	12 días	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25
Garitas	mar 8/04/25	vie 15/08/25	25 días	20 días	mié 23/04/25	mié 21/05/25
Aprobación Planteamiento Estructural	vie 25/04/25	vie 25/04/25	1 día	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mié 23/07/25	jue 7/08/25	12 días	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25
Urbanismo	mié 30/07/25	mar 12/08/25	10 días	10 días	vie 9/05/25	jue 22/05/25
Definicion de elementos de urbanismo que requieren diseño	mié 30/07/25	mié 30/07/25	1 día	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	jue 31/07/25	vie 8/08/25	7 días	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25

DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO	mar 1/04/25	jue 24/07/25	78 días	77 días	mar 8/04/25	jue 31/07/25
Pabellón Reclusión de Mujeres	mar 1/04/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	mar 8/04/25	lun 26/05/25
Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25
DIER - Pabellón Maternas	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	vie 2/05/25	mar 17/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25
Aprobación Planteamiento Diseño hidrosanitario y RCI	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	lun 26/05/25	lun 9/06/25
Talleres	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	mar 6/05/25	jue 19/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	mié 28/05/25	mié 11/06/25
Sanidad	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	mié 7/05/25	vie 20/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25
Visitas	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	lun 21/04/25	jue 5/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25
Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	mié 7/05/25	vie 20/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25
Guardia Interna - Guardia Externa	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	mar 29/04/25	vie 13/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	mar 29/04/25	mar 13/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	jue 22/05/25	jue 5/06/25
Alojamiento Guardianas	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	lun 5/05/25	mié 18/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	mar 27/05/25	mar 10/06/25
Garitas	lun 5/05/25	mar 17/06/25	32 días	32 días	vie 9/05/25	mié 25/06/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	10 días	vie 9/05/25	jue 22/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mar 27/05/25	lun 9/06/25	10 días	10 días	mar 3/06/25	lun 16/06/25
Redes Exteriores -Urbanismo	mié 11/06/25	jue 24/07/25	32 días	32 días	lun 16/06/25	jue 31/07/25
Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	mié 11/06/25	mar 24/06/25	10 días	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	jue 3/07/25	mié 16/07/25	10 días	10 días	jue 10/07/25	mié 23/07/25

DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION	mar 1/04/25	jue 24/07/25	83 días	83 días	mar 8/04/25	lun 11/08/25
Pabellón Reclusión de Mujeres	mar 1/04/25	jue 24/07/25	42 días	42 días	mar 8/04/25	mar 10/06/25
Planteamiento diseño eléctrico	mar 1/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25
DIER - Pabellón Maternas	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**vie 23/05/25**	**jue 24/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	vie 23/05/25	vie 13/06/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	mié 25/06/25	mié 16/07/25
Talleres	**jue 10/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	jue 10/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25
Sanidad	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25
Visitas	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25
Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25
Guardia Interna - Guardia Externa	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25
Alojamiento Guardianas	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25
Garitas	**mar 29/04/25**	**jue 24/07/25**	**42 días**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**
Planteamiento diseño eléctrico	mar 29/04/25	lun 19/05/25	15 días	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25
Aprobación Diseño eléctrico	mar 27/05/25	mar 27/05/25	1 día	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	mié 28/05/25	mar 17/06/25	15 días	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25
Redes Exteiores - Urbanismo	mié 11/06/25	jue 24/07/25	32 días	20 días	lun 14/07/25	lun 11/08/25
Planteamiento diseño eléctrico	mié 11/06/25	mar 24/06/25	10 días	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25
Aprobación Diseño eléctrico	mié 2/07/25	mié 2/07/25	1 día	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25
Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	jue 3/07/25	mié 16/07/25	10 días	8 días	vie 25/07/25	mar 5/08/25

DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL	lun 28/04/25	jue 24/07/25	81 días	80 días	mar 8/04/25	mar 5/08/25
Pabellón Reclusión de Mujeres	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25
DIER - Pabellón Maternas	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**vie 2/05/25**	**jue 3/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	mar 3/06/25	mar 24/06/25
Talleres	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25
Sanidad	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25
Visitas	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25
Rancho - Asadero - Alojamiento cocineras	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25
Guardia Interna - Guardia Externa	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25
Alojamiento Guardianas	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25
Garitas	**lun 28/04/25**	**mar 24/06/25**	**42 días**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	lun 26/05/25	lun 26/05/25	1 día	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	mar 27/05/25	lun 16/06/25	15 días	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25
Redes Exteriores - Urbanismo	**mié 18/06/25**	**jue 24/07/25**	**27 días**	**18 días**	**vie 11/07/25**	**mar 5/08/25**
Planteamiento diseño comunicaciones, seguridad y control	mié 18/06/25	mar 1/07/25	10 días	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control	mié 9/07/25	mié 9/07/25	1 día	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25
Calculo detallado - Elaboración de planos	jue 10/07/25	mié 16/07/25	5 días	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25
Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	jue 24/07/25	jue 24/07/25	1 día	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25

6. **5. Impacto en el Proyecto:**

- **Impacto en el Presupuesto:** De acuerdo con las mesas de trabajo de diseño se estima que el presupuesto de diseño tenga un incremento debido al requerimiento del cliente de nuevas estructuras, como son reseña, acopio, planta eléctrica, tanque de agua que todavía no están definidas por esta razón no están incluidas en la presente programación.
- **Impacto en los Recursos:** En la presente programación se realizaron Cambios en la asignación de recursos humanos, al interior del equipo de diseñadores
- **Impacto en los Entregables:** Modificaciones en los plazos de entrega de los entregables claves del proyecto.


		PROGRAMACION VR1			PROGRAMACION VR2	
	Límite de comienzo	Límite de finalización	Demora permisible	Duración	Comienzo	Fin
	lun 17/02/25	vie 15/08/25	0 días	124 días	lun 17/02/25	lun 18/08/25
Programación Construcción	**35 días**	**vie 11/04/25**	**jue 29/05/25**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**
Programación	15 días	lun 28/04/25	vie 16/05/25	15 días	mié 14/05/25	mié 4/06/25
Elaboración	10 días	lun 28/04/25	vie 9/05/25	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25
Revision - Mesa de Trabajo	4 días	lun 12/05/25	jue 15/05/25	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25
Aprobación	1 día	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25
Entregables	**35 días**	**vie 11/04/25**	**jue 29/05/25**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**
Estructura desglosada del trabajo EDT	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25
Programación de obra detallada	0 días	vie 16/05/25	vie 16/05/25	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25
Programa mensual de uso de Fuerza de trabajo operativa	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25
Programa de suministro de Materiales	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25
Programa de subcontratos y compras	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25
Programa de uso de equipo y maquinaria	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25
Revision Mesa de trabajo - entregables	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25
Aprobación	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25
Programa de Inversión mensual del Anticipo	10 días	vie 11/04/25	jue 24/04/25	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25
Programa de Inversión mensual del proyecto	10 días	vie 11/04/25	jue 24/04/25	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25
Revision Mesa de trabajo - entregables	25 días	vie 25/04/25	jue 29/05/25	25 días	lun 5/05/25	lun 9/06/25
Aprobación	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	15 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25
BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el numeral 4.1.2 8 no están terminados)	**26 días**	**vie 11/04/25**	**vie 16/05/25**	**35 días**	**mié 25/06/25**	**jue 14/08/25**
Calculo de cantidades Arquitectonicas	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	30 días	mié 25/06/25	mié 6/08/25
Calculo de cantidades Estructurales	20 días	vie 11/04/25	jue 8/05/25	22 días	mar 8/07/25	mié 6/08/25
Elaboración Balance	10 días	vie 25/04/25	jue 8/05/25	10 días	jue 24/07/25	mié 6/08/25
Revisión	5 días	vie 9/05/25	jue 15/05/25	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25
Aprobación	1 día	vie 16/05/25	vie 16/05/25	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25
AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS	**36 días**	**vie 27/06/25**	**vie 15/08/25**	**61 días**	**lun 19/05/25**	**lun 18/08/25**
Calculo de cantidades Hidrosanitarias y RCI	20 días	vie 27/06/25	jue 24/07/25	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25
Calculo de cantidades Eléctricas	20 días	vie 4/07/25	jue 31/07/25	9 días	jue 31/07/25	mié 13/08/25
Calculo de cantidades Red de Comunicaciones y Seguridad	20 días	mié 2/07/25	mar 29/07/25	12 días	jue 24/07/25	lun 11/08/25
Elaboración Balance	10 días	jue 24/07/25	mié 6/08/25	12 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25
Revisión	6 días	jue 7/08/25	jue 14/08/25	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25
Aprobación	1 día	vie 15/08/25	vie 15/08/25	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25
CONSTRUCCION	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	**0 días**	**lun 19/05/25**	**lun 19/05/25**
Inicio Construcción	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25

6. Conclusiones:

Después de correr la programación PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2 para las semanas 8 y 9 es evidente el impacto entre lo ejecutado y lo programado, viéndose la curva s así :

Trabajo acumulado

Año	Trimestre	Semana	% Av.Plan	% Av.real	
	T1	Semana 1	1%	2%	1%
		Semana 2	3%	4%	3%
		Semana 3	5%	5%	5%
		Semana 4	7%	8%	7%
		Semana 5	10%	11%	10%
		Semana 6	13%	13%	13%
		Semana 7	17%	14%	17%
	T2	Semana 8	20%	21%	22%
		Semana 9	23%	24%	24%
		Semana 10	30%		30%
		Semana 11	36%		36%
		Semana 12	44%		44%
		Semana 13	53%		53%
		Semana 14	64%		64%
		Semana 15	73%		73%
		Semana 16	79%		79%
		Semana 17	84%		84%
		Semana 18	88%		88%
		Semana 19	91%		91%
		Semana 20	94%		94%
	T3	Semana 21	96%		96%
		Semana 22	97%		97%
		Semana 23	98%		98%
		Semana 24	99%		99%
		Semana 26	99%		99%
2025		Semana 27	100%		100%

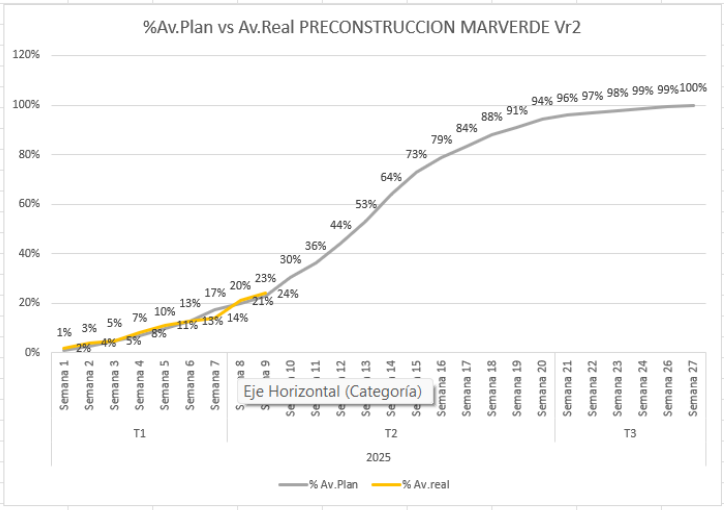

7. Anexos:

Diagrama de GANTT PRECONSTRUCCION MARVERDE Vr2

Cordialmente,


ING. CAROLINA ALBA TOVAR
DIRECTORA DE OBRA - OBRA "CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"

CONSORCIO MAR VERDE CV
VARELA FINOL - CIA SAS - CONTEIN SAS – INVYDES
Calle 103#14A-53 OFC 403 Edificio BUSINESS CENTER
+57 3332667463
Email: marverde@contein.com.co, www.contein.com.co
Bogotá- Colombia

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
1	**1**	**PRECONSTRUCCION CAMPAMENTO MAR VERDE**	**124 día**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
2	**1.1**	**Acta de inicio**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
3	1.1.1	Firma Acta de Inicio	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	
4	**1.1.2**	**Documentos Entregados**	**0 días**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**	
5	1.1.2.1	Programa Inversion del Anticipo Aprobado	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
6	1.1.2.2	Entrega hojas de Vida Preconstrucción y construc	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
7	1.1.2.3	Aprobación Hojas de vida	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
8	1.1.2.4	Desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
9	1.1.2.5	Aprobación desglose del AIU	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	8
10	1.1.2.6	Aprobación polizas del contrato	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
11	**1.2**	**PRECONSTRUCCION**	**124 día**	**lun 17/02/25**	**lun 18/08/25**	
12	**1.2.1**	**SISTEMAS DE GESTION**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
13	**1.2.1.1**	**Plan de Ejecucion BIM (PEB) y Plan de Calidad de Diseños**	**47 días**	**mar 25/02/25**	**lun 5/05/25**	
14	1.2.1.1.1	Definición Requerimientos y Metodologia	32 días	mar 25/02/25	mié 9/04/25	3CC+6 d
15	1.2.1.1.2	Elaboración	4 días	jue 10/04/25	mar 15/04/25	14
16	1.2.1.1.3	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	15
17	1.2.1.1.4	Aprobación	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	16
18	**1.2.1.2**	**Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trab**	**16 días**	**lun 17/02/25**	**lun 10/03/25**	
19	1.2.1.2.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
20	1.2.1.2.2	Revision - Mesa de Trabajo	10 días	lun 24/02/25	vie 7/03/25	19
21	1.2.1.2.3	Aprobación	1 día	lun 10/03/25	lun 10/03/25	20
22	**1.2.1.3**	**Plan de Gestion de Calidad Et Construcción y Plan de Inspeccion y ensayos**	**28 días**	**lun 17/02/25**	**mié 26/03/25**	
23	1.2.1.3.1	Elaboración	12 días	lun 17/02/25	mar 4/03/25	3
24	1.2.1.3.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	mié 5/03/25	mar 25/03/25	23
25	1.2.1.3.3	Aprobación	1 día	mié 26/03/25	mié 26/03/25	24
26	**1.2.1.4**	**Plan de Gestion Ambiental y Residuos**	**46 días**	**lun 17/02/25**	**mié 23/04/25**	
27	1.2.1.4.1	Elaboración	30 días	lun 17/02/25	vie 28/03/25	3
28	1.2.1.4.2	Revision - Mesa de Trabajo	15 días	lun 31/03/25	mar 22/04/25	27
29	1.2.1.4.3	Aprobación	1 día	mié 23/04/25	mié 23/04/25	28
30	**1.2.1.5**	**Tabla de Fuerza de trabajo directivo**	**6 días**	**lun 17/02/25**	**lun 24/02/25**	
31	1.2.1.5.1	Elaboración	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	3
32	1.2.1.5.2	Revision - Mesa de Trabajo	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	31
33	1.2.1.5.3	Aprobación	1 día	lun 24/02/25	lun 24/02/25	32

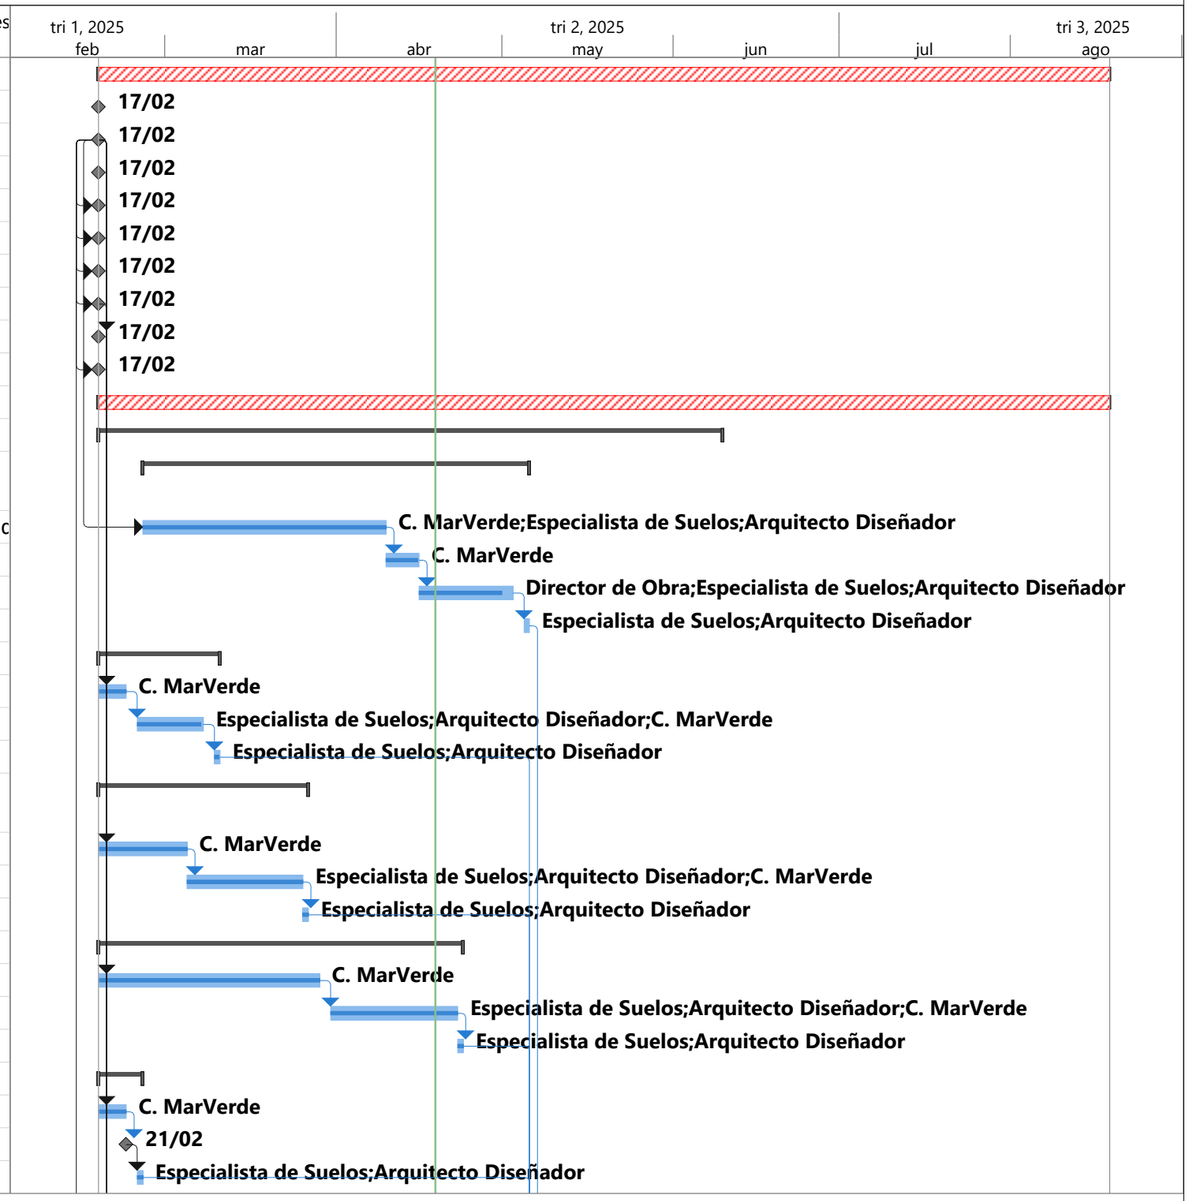


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica			

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
34	**1.2.1.6**	**Manual de Operación del Proyecto**	**24 días**	**mar 6/05/25**	**lun 9/06/25**	
35	1.2.1.6.1	Elaboración	19 días	mar 6/05/25	vie 30/05/25	25;17;2
36	1.2.1.6.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	35
37	1.2.1.6.3	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	36
38	**1.2.2**	**DISEÑOS**	**119 día**	**lun 17/02/25**	**lun 11/08/25**	
39	**1.2.2.1**	**DATOS DE ENTRADA**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
40	1.2.2.1.1	Entrega planos iniciales	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	3CC
41	1.2.2.1.2	Revisión planos Arquitectonicos y Estructurale	10 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25	40
42	1.2.2.1.3	Solicitud Planos Faltantes	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
43	1.2.2.1.4	Recibo planos faltantes	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	42
44	1.2.2.1.5	Visita de Obra	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	3
45	**1.2.2.2**	**TOPOGRAFIA**	**38 días**	**lun 3/03/25**	**vie 25/04/25**	
46	1.2.2.2.1	Levantamiento topografico	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	71
47	1.2.2.2.2	Calculos y elaboración de planos	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	46
48	**1.2.2.2.3**	**Entregables**	**32 días**	**mar 11/03/25**	**vie 25/04/25**	
49	1.2.2.2.3.1	Entrega levantamiento planimetrico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	47CC+1
50	1.2.2.2.3.2	Entrega Informe Topografico y planos	6 días	lun 17/03/25	lun 24/03/25	47
51	1.2.2.2.3.3	Revisión Interventoria	3 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25	50
52	1.2.2.2.3.4	Mesa de trabajo	4 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25	51
53	1.2.2.2.3.5	Revisión Constructor	12 días	jue 3/04/25	mar 22/04/25	52
54	1.2.2.2.3.6	Aprobación	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	53
55	**1.2.2.3**	**ESTUDIO DE SUELOS**	**29 días**	**mar 25/03/25**	**mié 7/05/25**	
56	1.2.2.3.1	Exploracion de suelos en campo	8 días	mar 25/03/25	jue 3/04/25	50
57	1.2.2.3.2	Ensayos de laboratorio	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	56CC+3
58	1.2.2.3.3	Datos para revisión de cimentación	7 días	lun 7/04/25	mar 15/04/25	57CC+6
59	1.2.2.3.4	Analisis y elaboración de Informe	4 días	vie 11/04/25	mié 16/04/25	57
60	**1.2.2.3.5**	**Entregables**	**12 días**	**lun 21/04/25**	**mié 7/05/25**	
61	1.2.2.3.5.1	Revision - Mesa de trabajo Datos para revisión de estructuras	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	59
62	1.2.2.3.5.2	Aprobación Datos de Suelos para revisión de	1 día	jue 24/04/25	jue 24/04/25	61
63	1.2.2.3.5.3	Entrega de Estudio de suelos	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	62
64	1.2.2.3.5.4	Revisión Interventoria	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	63
65	1.2.2.3.5.5	Mesa de trabajo	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	64
66	1.2.2.3.5.6	Revisión Constructor	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	65
67	1.2.2.3.5.7	Aprobación	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	66

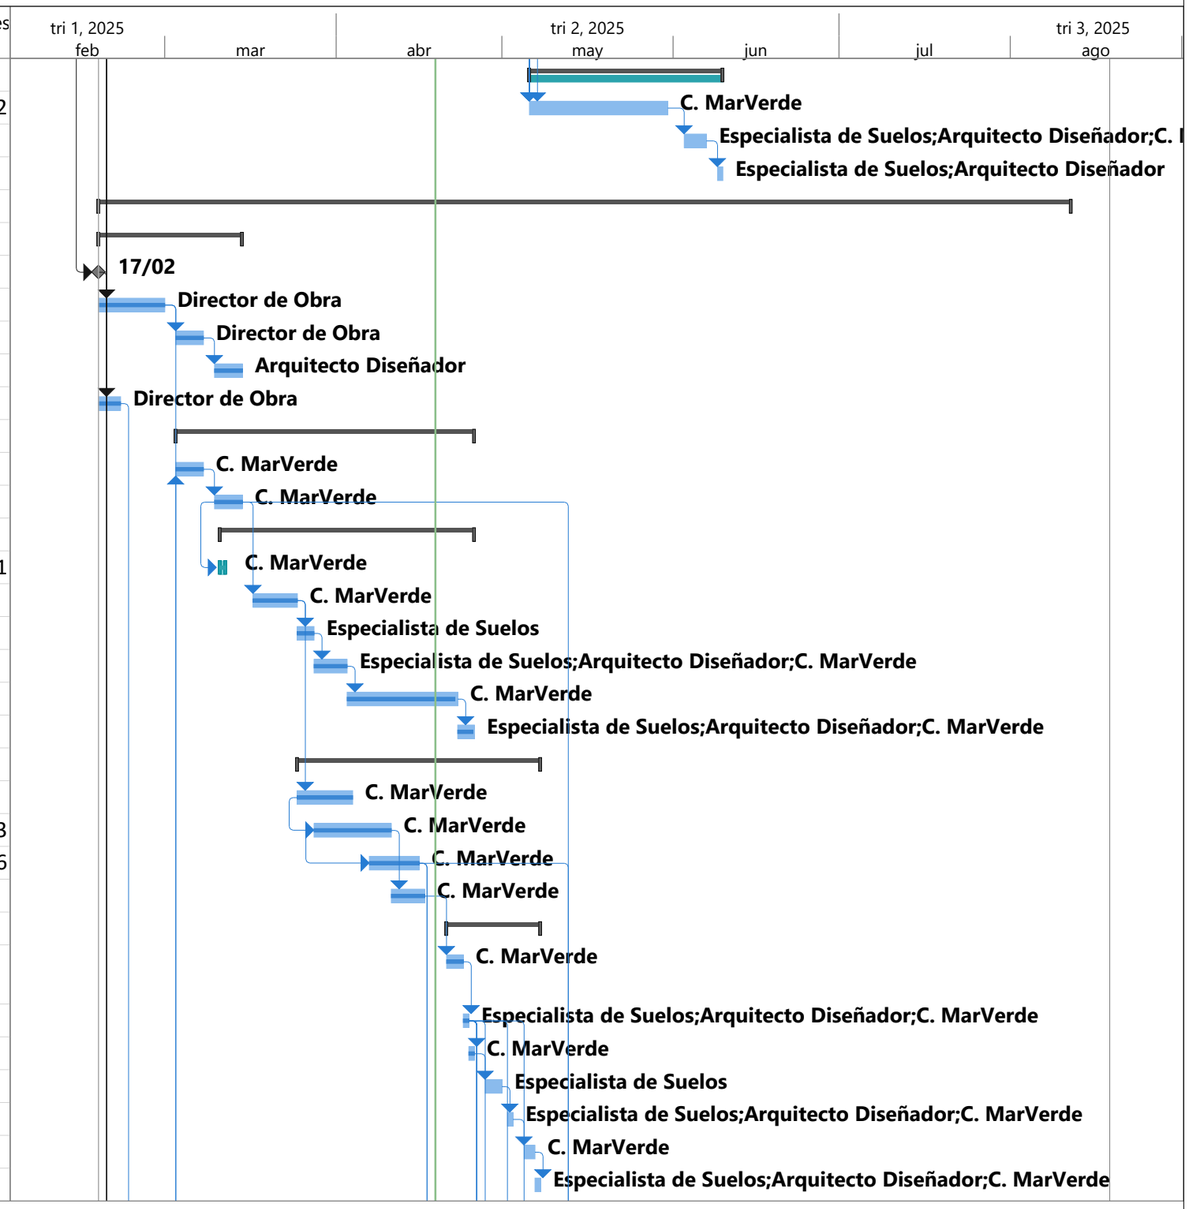


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
68	**1.2.2.4**	**DISEÑO ARQUITECTONICO**	**67 días**	**lun 17/02/25**	**vie 23/05/25**	
69	**1.2.2.4.1**	**Implantación del Proyecto**	**55 días**	**lun 17/02/25**	**mié 7/05/25**	
70	1.2.2.4.1.1	Alternativas de Implantacion	9 días	lun 17/02/25	jue 27/02/25	3
71	1.2.2.4.1.2	Revision en comité - Selección de zona de in	1 día	vie 28/02/25	vie 28/02/25	70
72	1.2.2.4.1.3	Revisión Implantación entregado por USPEC vrs Visita de Obra vrs Bioclimatico	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	71
73	1.2.2.4.1.4	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Implantación Arquitectonico	29 días	jue 13/03/25	jue 24/04/25	72
74	1.2.2.4.1.5	Aprobación Anteproyecto Implantación arquitectónica preliminar	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	73
75	1.2.2.4.1.6	Implantación definitiva	8 días	mié 23/04/25	lun 5/05/25	109;119
76	1.2.2.4.1.7	Revisión - Mesa de trabajo Implantación arquitectónica definitiva	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	75
77	1.2.2.4.1.8	Aprobación Implantación arquitectónico	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	76
78	**1.2.2.4.2**	**Cerramiento**	**54 días**	**vie 21/02/25**	**lun 12/05/25**	
79	1.2.2.4.2.1	Entrega especificación Uspec	2 días	vie 21/02/25	lun 24/02/25	44
80	1.2.2.4.2.2	Elaboración Detalle cerramiento	3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	79
81	1.2.2.4.2.3	Revision - Mesa de trabajo Detalle Cerramie	7 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	80FC+2(
82	1.2.2.4.2.4	Aprobacion Detalle Cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	81FC+7
83	1.2.2.4.2.5	Trazado cerramiento	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	82CC
84	1.2.2.4.2.6	Revision - Mesa de trabajo Trazado Cerrami	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	83CC
85	1.2.2.4.2.7	Aprobación Trazado Cerramiento	14 días	mar 22/04/25	lun 12/05/25	84
86	**1.2.2.4.3**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**50 días**	**lun 3/03/25**	**mié 14/05/25**	
87	1.2.2.4.3.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	41
88	1.2.2.4.3.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	mar 11/03/25	mar 11/03/25	87CC+1
89	1.2.2.4.3.3	Aprobación Esquema Basico	6 días	jue 13/03/25	jue 20/03/25	88CC+2
90	1.2.2.4.3.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 21/03/25	jue 3/04/25	89
91	1.2.2.4.3.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	vie 4/04/25	vie 4/04/25	90
92	1.2.2.4.3.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 7/04/25	lun 7/04/25	91
93	1.2.2.4.3.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	12 días	jue 24/04/25	lun 12/05/25	92FC+1(
94	1.2.2.4.3.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25	93
95	1.2.2.4.3.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 14/05/25	mié 14/05/25	94
96	**1.2.2.4.4**	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**49 días**	**lun 10/03/25**	**mar 20/05/25**	

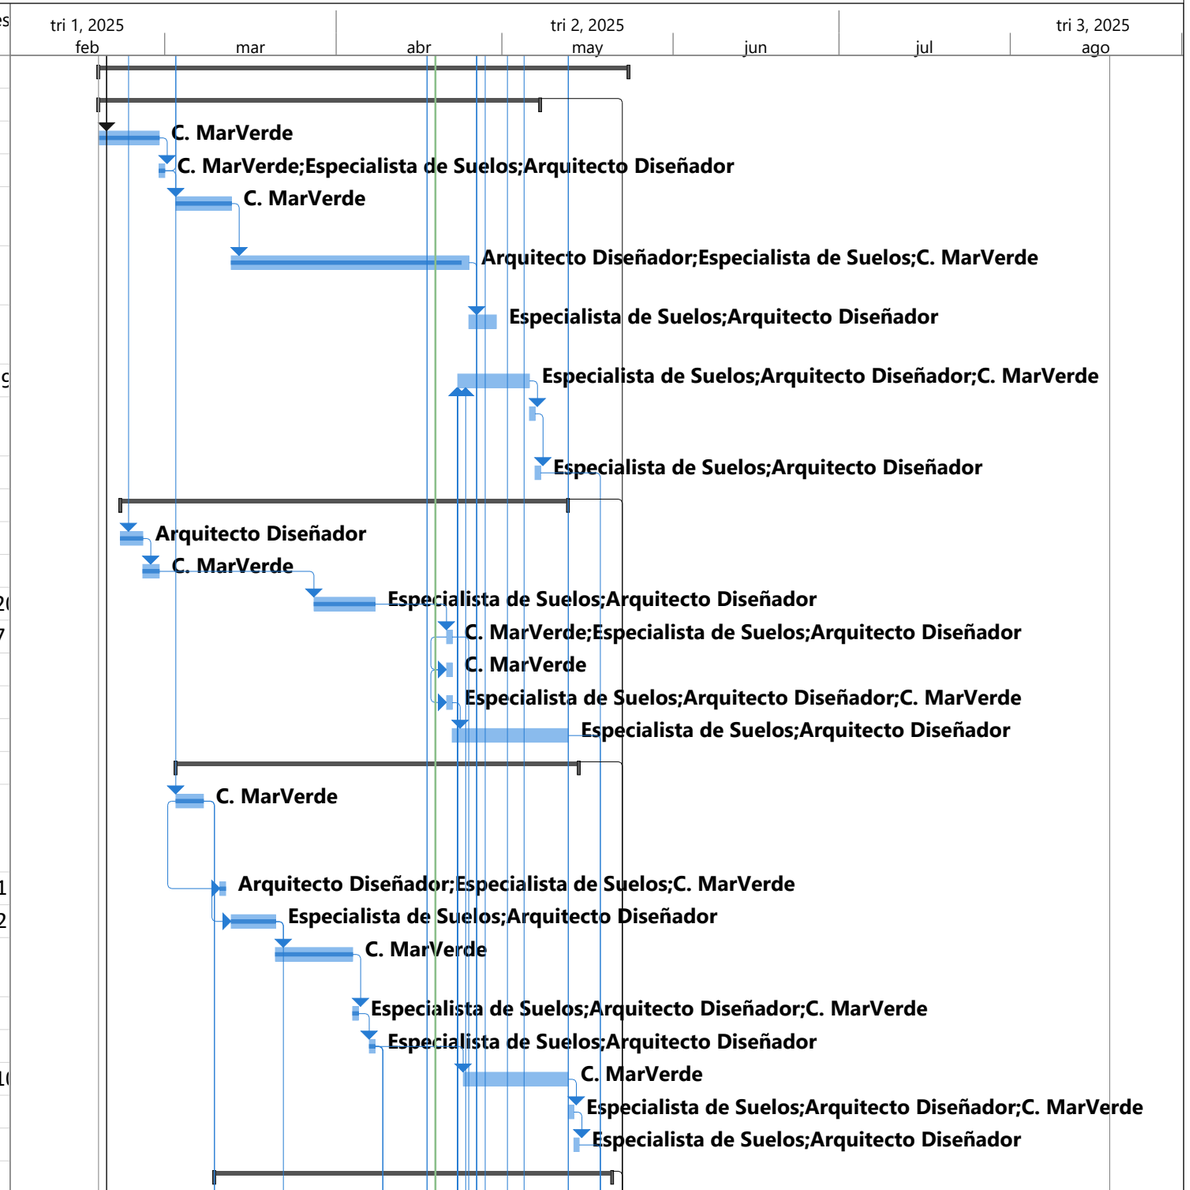


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica			

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
97	1.2.2.4.4.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	lun 10/03/25	vie 14/03/25	87
98	1.2.2.4.4.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	97
99	1.2.2.4.4.3	Aprobación Esquema Basico	21 días	mar 18/03/25	mar 15/04/25	98
100	1.2.2.4.4.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
101	1.2.2.4.4.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	100
102	1.2.2.4.4.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	101CC+
103	1.2.2.4.4.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102
104	1.2.2.4.4.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	103
105	1.2.2.4.4.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	104
106	**1.2.2.4.5**	**Talleres**	**51 días**	**lun 10/03/25**	**jue 22/05/25**	
107	1.2.2.4.5.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25	87
108	1.2.2.4.5.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	lun 17/03/25	lun 17/03/25	107
109	1.2.2.4.5.3	Aprobación Esquema Basico	16 días	jue 20/03/25	jue 10/04/25	108
110	1.2.2.4.5.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	vie 11/04/25	lun 28/04/25	109
111	1.2.2.4.5.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	110
112	1.2.2.4.5.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	111CC+
113	1.2.2.4.5.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112
114	1.2.2.4.5.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mar 20/05/25	mié 21/05/25	113
115	1.2.2.4.5.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	114
116	**1.2.2.4.6**	**Sanidad**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
117	1.2.2.4.6.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	5 días	vie 14/03/25	jue 20/03/25	107
118	1.2.2.4.6.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	117FC+4
119	1.2.2.4.6.3	Aprobación Esquema Basico	11 días	vie 28/03/25	vie 11/04/25	118
120	1.2.2.4.6.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	119
121	1.2.2.4.6.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	120
122	1.2.2.4.6.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	121CC+
123	1.2.2.4.6.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122
124	1.2.2.4.6.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	123

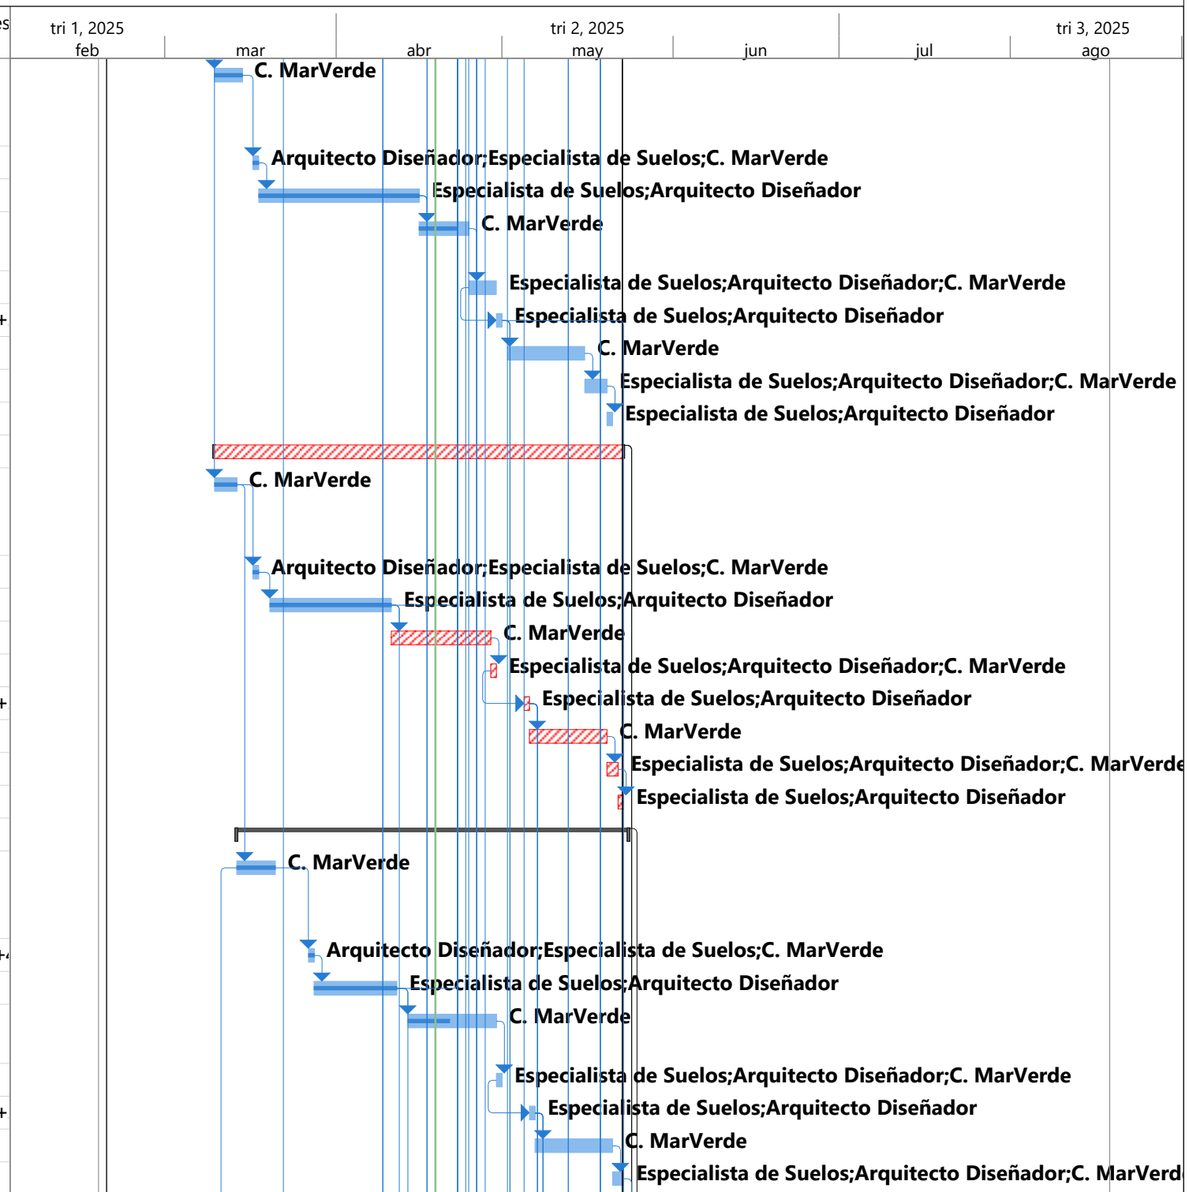


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
125	1.2.2.4.6.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	124
126	**1.2.2.4.7**	**Visitas**	**37 días**	**vie 14/03/25**	**jue 8/05/25**	
127	1.2.2.4.7.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	117CC
128	1.2.2.4.7.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 20/03/25	jue 20/03/25	127
129	1.2.2.4.7.3	Aprobación Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	128CC
130	1.2.2.4.7.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	vie 28/03/25	jue 10/04/25	129
131	1.2.2.4.7.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	vie 11/04/25	vie 11/04/25	130
132	1.2.2.4.7.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mié 16/04/25	mié 16/04/25	131CC+
133	1.2.2.4.7.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132
134	1.2.2.4.7.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mar 6/05/25	mié 7/05/25	133
135	1.2.2.4.7.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	134
136	**1.2.2.4.8**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**48 días**	**vie 14/03/25**	**vie 23/05/25**	
137	1.2.2.4.8.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	vie 14/03/25	mié 19/03/25	127CC
138	1.2.2.4.8.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	137
139	1.2.2.4.8.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	138
140	1.2.2.4.8.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico	10 días	lun 14/04/25	mar 29/04/25	139
141	1.2.2.4.8.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	140
142	1.2.2.4.8.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	141CC+
143	1.2.2.4.8.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142
144	1.2.2.4.8.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	143
145	1.2.2.4.8.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	144
146	**1.2.2.4.9**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**35 días**	**mié 19/03/25**	**vie 9/05/25**	
147	1.2.2.4.9.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	4 días	mié 19/03/25	lun 24/03/25	137CC+ días
148	1.2.2.4.9.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	1 día	jue 27/03/25	jue 27/03/25	147FC+
149	1.2.2.4.9.3	Aprobación Esquema Basico	12 días	jue 27/03/25	vie 11/04/25	148CC
150	1.2.2.4.9.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	10 días	lun 31/03/25	vie 11/04/25	149CC+ días
151	1.2.2.4.9.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	2 días	lun 14/04/25	mar 15/04/25	150
152	1.2.2.4.9.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	151CC+

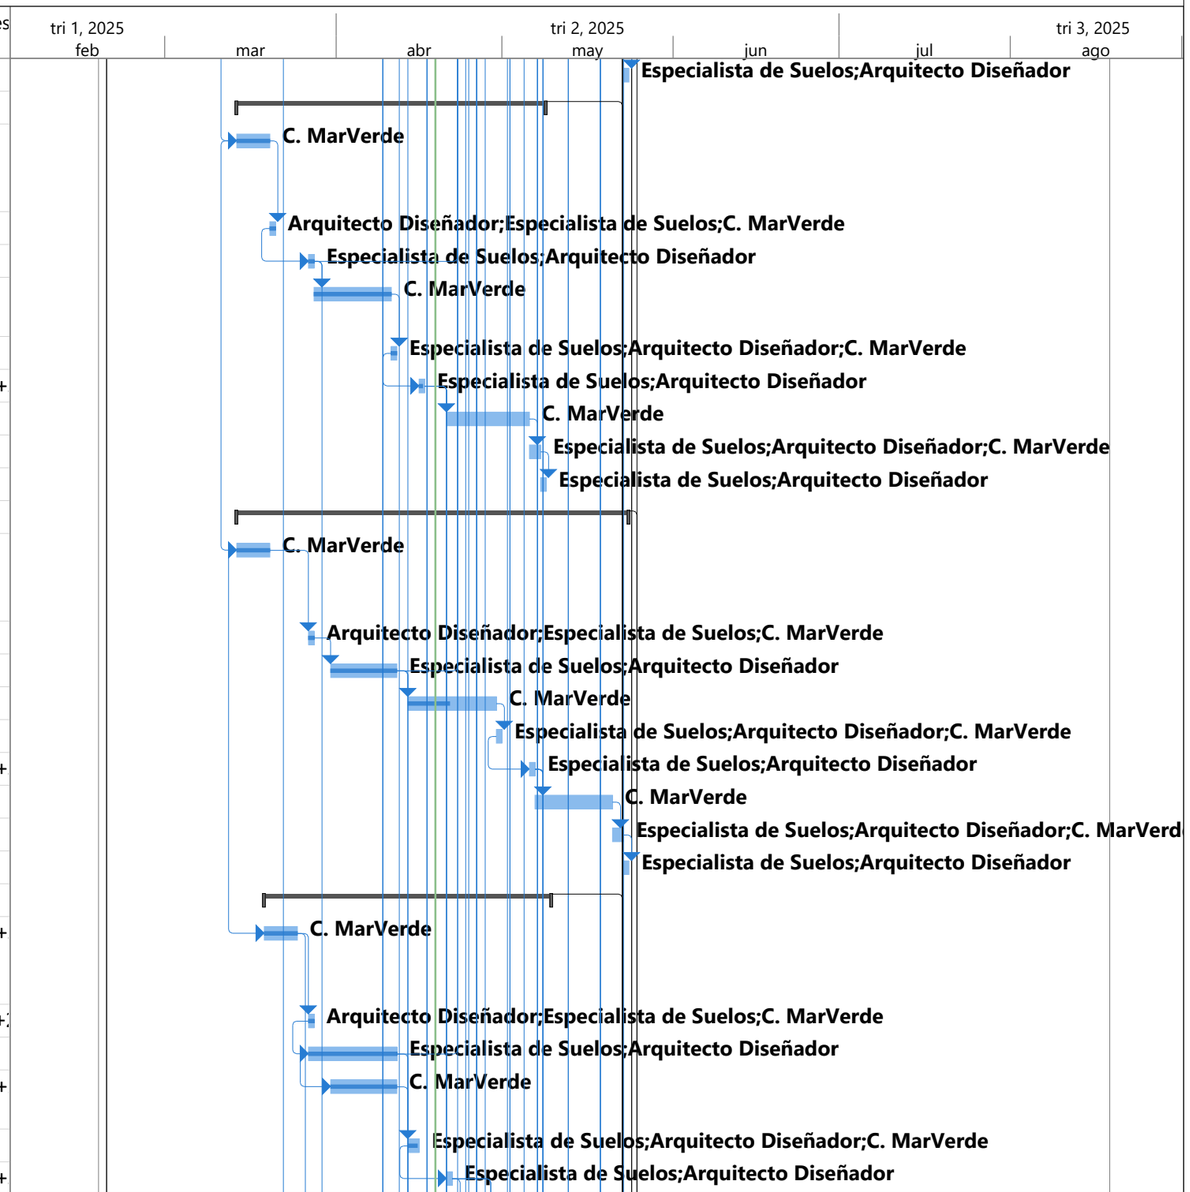


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
153	1.2.2.4.9.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	11 días	mar 22/04/25	mié 7/05/25	152
154	1.2.2.4.9.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	153
155	1.2.2.4.9.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	154
156	**1.2.2.4.10**	**Alojamiento Guardianas**	**39 días**	**mar 25/03/25**	**mié 21/05/25**	
157	1.2.2.4.10.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	147
158	1.2.2.4.10.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	3 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	157
159	1.2.2.4.10.3	Aprobación Esquema Basico	9 días	mar 1/04/25	vie 11/04/25	158
160	1.2.2.4.10.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	159
161	1.2.2.4.10.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	160
162	1.2.2.4.10.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	161CC+
163	1.2.2.4.10.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162
164	1.2.2.4.10.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	163
165	1.2.2.4.10.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	164
166	**1.2.2.4.11**	**Garitas**	**41 días**	**mar 25/03/25**	**vie 23/05/25**	
167	1.2.2.4.11.1	Revisión esquema basico entregado por USPEC aplicación de normativa, elaboración de ajustes a nivel de	2 días	mar 25/03/25	mié 26/03/25	157CC
168	1.2.2.4.11.2	Revision - Mesa de trabajo Esquema Basico	2 días	jue 27/03/25	vie 28/03/25	167
169	1.2.2.4.11.3	Aprobación Esquema Basico	10 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	
170	1.2.2.4.11.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	7 días	mié 23/04/25	vie 2/05/25	169
171	1.2.2.4.11.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	170
172	1.2.2.4.11.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	171CC+
173	1.2.2.4.11.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	172
174	1.2.2.4.11.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	173
175	1.2.2.4.11.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	174
176	**1.2.2.4.12**	**Urbanismo**	**28 días**	**jue 10/04/25**	**jue 22/05/25**	
177	1.2.2.4.12.1	Anteproyecto de Urbanismo	5 días	jue 10/04/25	mié 16/04/25	167FC+
178	1.2.2.4.12.2	Revision - Mesa de trabajo Anteproyecto Ar	1 día	lun 21/04/25	lun 21/04/25	177
179	1.2.2.4.12.3	Aprobación anteproyecto arquitectónico	4 días	mar 22/04/25	vie 25/04/25	178
180	1.2.2.4.12.4	Elaboración Proyecto final arquitectonico - Coordinación BIM	4 días	lun 28/04/25	vie 2/05/25	179
181	1.2.2.4.12.5	Revision - Mesa de trabajo Proyecto Arquite	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25	180

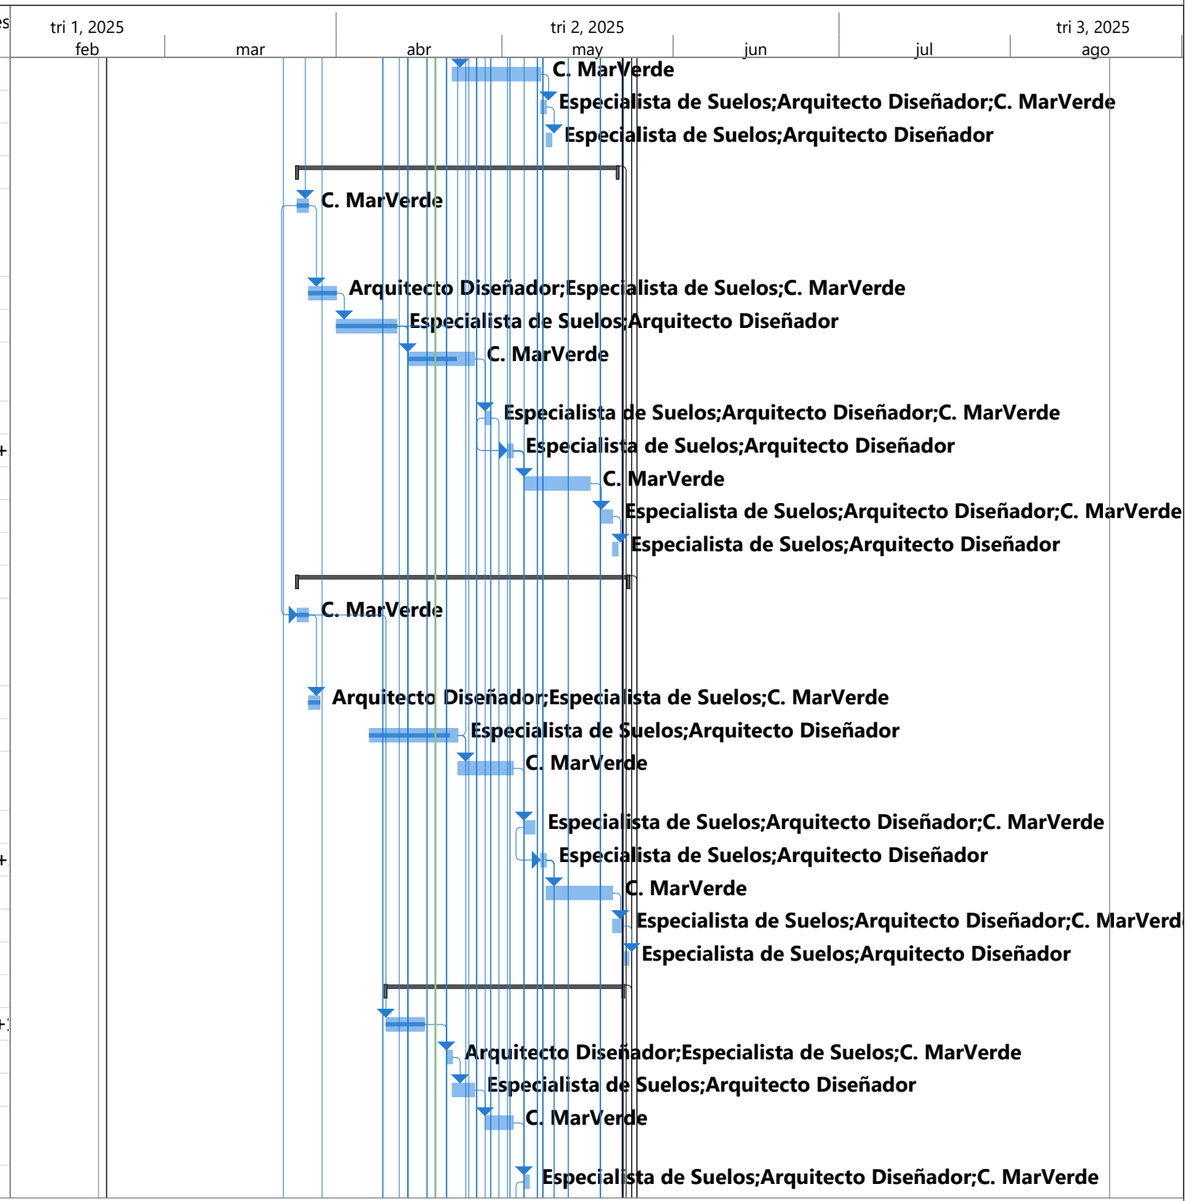


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
182	1.2.2.4.12.6	Aprobación Proyecto arquitectónico	1 día	jue 8/05/25	jue 8/05/25	181CC+
183	1.2.2.4.12.7	Elaboración Detalles Arquitectónicos	8 días	vie 9/05/25	mar 20/05/25	182
184	1.2.2.4.12.8	Revision - Mesa de trabajo Detalles Arquitec	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	183
185	1.2.2.4.12.9	Aprobación Detalles arquitectónicos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	184
186	1.2.2.4.13	**Fin Diseño Arquitectonico**	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	69;86;1
187	**1.2.2.5**	**DISEÑO ESTRUCTURAL**	**50 días**	**vie 21/03/25**	**mié 4/06/25**	
188	**1.2.2.5.1**	**Cerramiento**	**17 días**	**vie 25/04/25**	**mar 20/05/25**	
189	1.2.2.5.1.1	Diseño estructural Cerramiento	9 días	vie 25/04/25	jue 8/05/25	82;62
190	1.2.2.5.1.2	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	2 días	vie 9/05/25	lun 12/05/25	189
191	1.2.2.5.1.3	Revisión diseño de acuerdo a Estudio de suelos y topografica	3 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25	190;58;
192	1.2.2.5.1.4	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	2 días	vie 16/05/25	lun 19/05/25	191
193	1.2.2.5.1.5	Aprobación Diseño Estructural Cerramiento	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	192
194	**1.2.2.5.2**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**44 días**	**vie 21/03/25**	**lun 26/05/25**	
195	1.2.2.5.2.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 21/03/25	jue 27/03/25	89
196	1.2.2.5.2.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	195
197	1.2.2.5.2.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 2/04/25	mié 2/04/25	196
198	1.2.2.5.2.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 3/04/25	vie 4/04/25	197
199	1.2.2.5.2.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 25/04/25	vie 16/05/25	197;62
200	1.2.2.5.2.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	lun 12/05/25	vie 16/05/25	199FF
201	1.2.2.5.2.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	199
202	1.2.2.5.2.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	201
203	**1.2.2.5.3**	**Pabellón DIER - Pabellón Maternas**	**30 días**	**mié 16/04/25**	**vie 30/05/25**	
204	1.2.2.5.3.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 16/04/25	jue 24/04/25	99
205	1.2.2.5.3.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	204
206	1.2.2.5.3.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	205
207	1.2.2.5.3.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	206
208	1.2.2.5.3.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	206;62
209	1.2.2.5.3.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	208FF
210	1.2.2.5.3.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	208
211	1.2.2.5.3.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	210
212	**1.2.2.5.4**	**Talleres**	**30 días**	**vie 11/04/25**	**mar 27/05/25**	
213	1.2.2.5.4.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 11/04/25	lun 21/04/25	109
214	1.2.2.5.4.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mar 22/04/25	jue 24/04/25	213
215	1.2.2.5.4.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	214

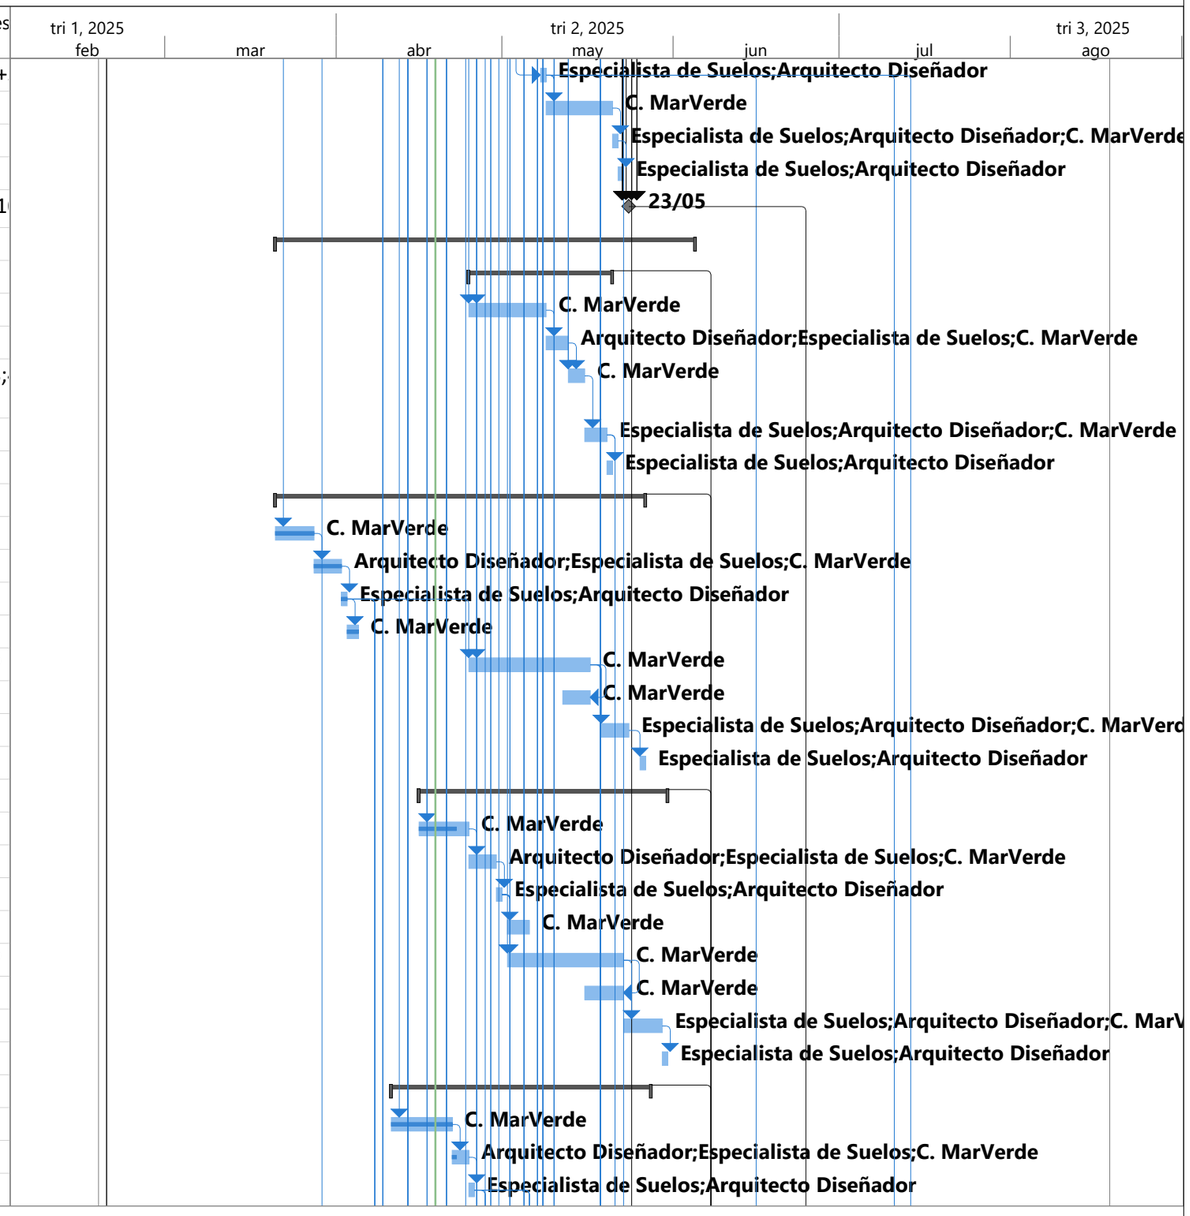


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
216	1.2.2.5.4.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	215
217	1.2.2.5.4.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 28/04/25	lun 19/05/25	215;62
218	1.2.2.5.4.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	217FF
219	1.2.2.5.4.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	217
220	1.2.2.5.4.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25	219
221	**1.2.2.5.5**	**Sanidad**	**34 días**	**lun 14/04/25**	**mié 4/06/25**	
222	1.2.2.5.5.1	Planteamiento estructural	8 días	lun 14/04/25	vie 25/04/25	119
223	1.2.2.5.5.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	222
224	1.2.2.5.5.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	223
225	1.2.2.5.5.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	lun 5/05/25	mar 6/05/25	224
226	1.2.2.5.5.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	16 días	lun 5/05/25	lun 26/05/25	224;62
227	1.2.2.5.5.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	226FF
228	1.2.2.5.5.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	226
229	1.2.2.5.5.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	228
230	**1.2.2.5.6**	**Visitas**	**36 días**	**vie 28/03/25**	**mié 21/05/25**	
231	1.2.2.5.6.1	Planteamiento estructural	5 días	vie 28/03/25	jue 3/04/25	129
232	1.2.2.5.6.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	vie 4/04/25	mar 8/04/25	231
233	1.2.2.5.6.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	232
234	1.2.2.5.6.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	jue 10/04/25	vie 11/04/25	233
235	1.2.2.5.6.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
236	1.2.2.5.6.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	235FF
237	1.2.2.5.6.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	235
238	1.2.2.5.6.8	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	237
239	**1.2.2.5.7**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocinera**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
240	1.2.2.5.7.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	139
241	1.2.2.5.7.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	240
242	1.2.2.5.7.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	241
243	1.2.2.5.7.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	242
244	1.2.2.5.7.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
245	1.2.2.5.7.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	244FF
246	1.2.2.5.7.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	244
247	1.2.2.5.7.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	246
248	**1.2.2.5.8**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
249	1.2.2.5.8.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	149
250	1.2.2.5.8.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	249

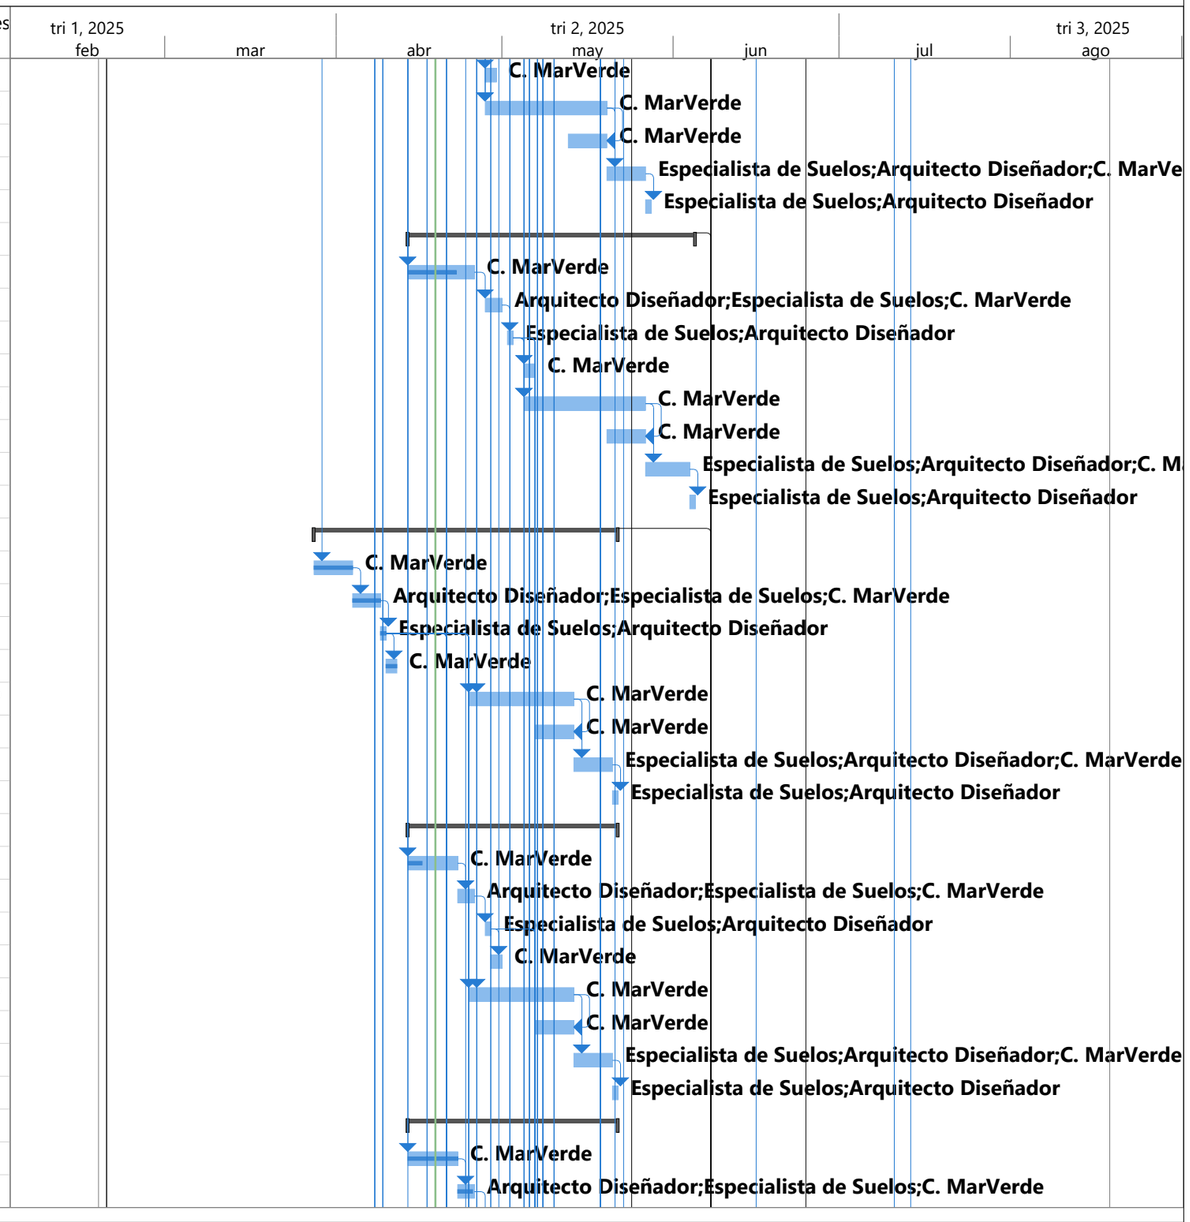


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
251	1.2.2.5.8.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	250
252	1.2.2.5.8.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	251
253	1.2.2.5.8.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
254	1.2.2.5.8.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	253FF
255	1.2.2.5.8.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	253
256	1.2.2.5.8.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	255
257	**1.2.2.5.9**	**Alojamiento de Guardianas**	**25 días**	**lun 14/04/25**	**mié 21/05/25**	
258	1.2.2.5.9.1	Planteamiento estructural	5 días	lun 14/04/25	mar 22/04/25	159
259	1.2.2.5.9.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	258
260	1.2.2.5.9.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	lun 28/04/25	lun 28/04/25	259
261	1.2.2.5.9.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mar 29/04/25	mié 30/04/25	260
262	1.2.2.5.9.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
263	1.2.2.5.9.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	262FF
264	1.2.2.5.9.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	262
265	1.2.2.5.9.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	264
266	**1.2.2.5.10**	**Garitas**	**20 días**	**mié 23/04/25**	**mié 21/05/25**	
267	1.2.2.5.10.1	Planteamiento estructural	5 días	mié 23/04/25	mar 29/04/25	169
268	1.2.2.5.10.2	Revision - Mesa de trabajo planteamiento e	3 días	mié 30/04/25	lun 5/05/25	267
269	1.2.2.5.10.3	Aprobación Planteamiento Estructural	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	268
270	1.2.2.5.10.4	Verificacion Coordinación BIM	2 días	mié 7/05/25	jue 8/05/25	269
271	1.2.2.5.10.5	Calculo detallado - Elaboración de planos	12 días	vie 25/04/25	mar 13/05/25	233;62
272	1.2.2.5.10.6	Verificacion Coordinacion BIM	5 días	mié 7/05/25	mar 13/05/25	271FF
273	1.2.2.5.10.7	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	271
274	1.2.2.5.10.8	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	273
275	**1.2.2.5.11**	**Urbanismo**	**10 días**	**vie 9/05/25**	**jue 22/05/25**	
276	1.2.2.5.11.1	Definicion de elementos de urbanismo que requieren diseño	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	182
277	1.2.2.5.11.2	Calculo detallado - Elaboración de planos	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25	276
278	1.2.2.5.11.3	Revision - Mesa de trabajo Diseño estructur	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	277
279	1.2.2.5.11.4	Aprobación Proyecto Estructural y planos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	278
280	**1.2.2.5.12**	**Fin Diseño Estructural**	**0 días**	**mié 4/06/25**	**mié 4/06/25**	**194FF**
281	**1.2.2.6**	**DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCEN**	**77 días**	**mar 8/04/25**	**jue 31/07/25**	
282	**1.2.2.6.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**32 días**	**mar 8/04/25**	**lun 26/05/25**	
283	1.2.2.6.1.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 8/04/25	mié 23/04/25	92;197

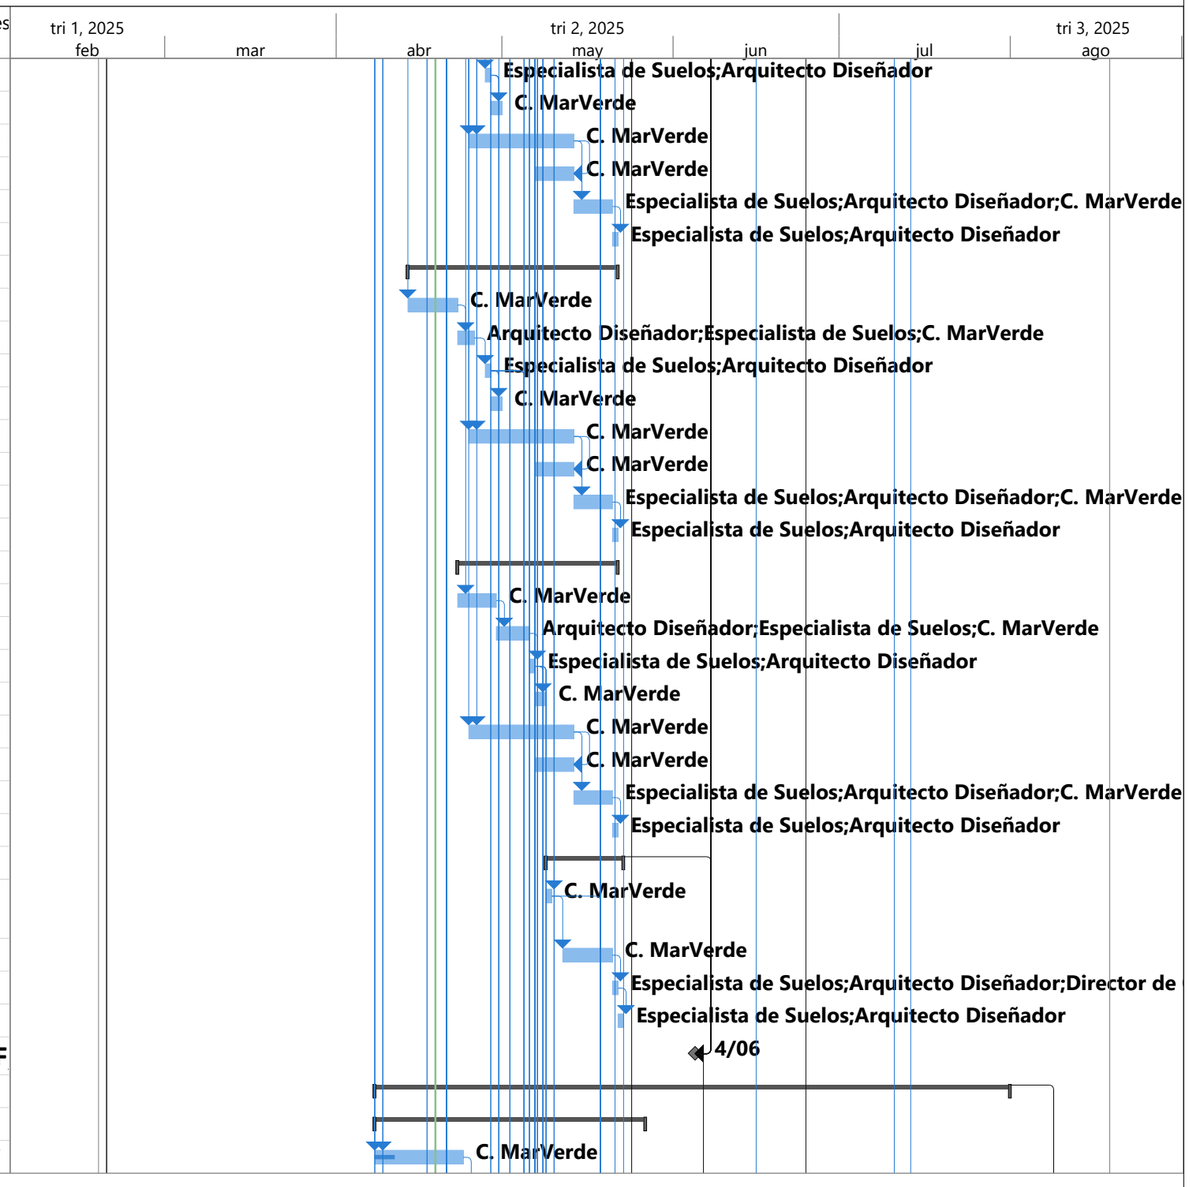


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
284	1.2.2.6.1.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	jue 24/04/25	mié 30/04/25	283
285	1.2.2.6.1.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	284
286	1.2.2.6.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	285
287	1.2.2.6.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	286
288	1.2.2.6.1.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	287
289	**1.2.2.6.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**32 días**	**vie 2/05/25**	**mar 17/06/25**	
290	1.2.2.6.2.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 2/05/25	jue 15/05/25	102;206
291	1.2.2.6.2.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 16/05/25	jue 22/05/25	290
292	1.2.2.6.2.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	291
293	1.2.2.6.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	lun 26/05/25	lun 9/06/25	292
294	1.2.2.6.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 10/06/25	lun 16/06/25	293
295	1.2.2.6.2.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mar 17/06/25	mar 17/06/25	294
296	**1.2.2.6.3**	**Talleres**	**32 días**	**mar 6/05/25**	**jue 19/06/25**	
297	1.2.2.6.3.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 6/05/25	lun 19/05/25	112;215
298	1.2.2.6.3.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 20/05/25	lun 26/05/25	297
299	1.2.2.6.3.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mar 27/05/25	mar 27/05/25	298
300	1.2.2.6.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 28/05/25	mié 11/06/25	299
301	1.2.2.6.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	300
302	1.2.2.6.3.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	301
303	**1.2.2.6.4**	**Sanidad**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**	
304	1.2.2.6.4.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	122;224
305	1.2.2.6.4.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	304
306	1.2.2.6.4.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	305
307	1.2.2.6.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25	306
308	1.2.2.6.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	307
309	1.2.2.6.4.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	308
310	**1.2.2.6.5**	**Visitas**	**32 días**	**lun 21/04/25**	**jue 5/06/25**	
311	1.2.2.6.5.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 21/04/25	lun 5/05/25	132;233

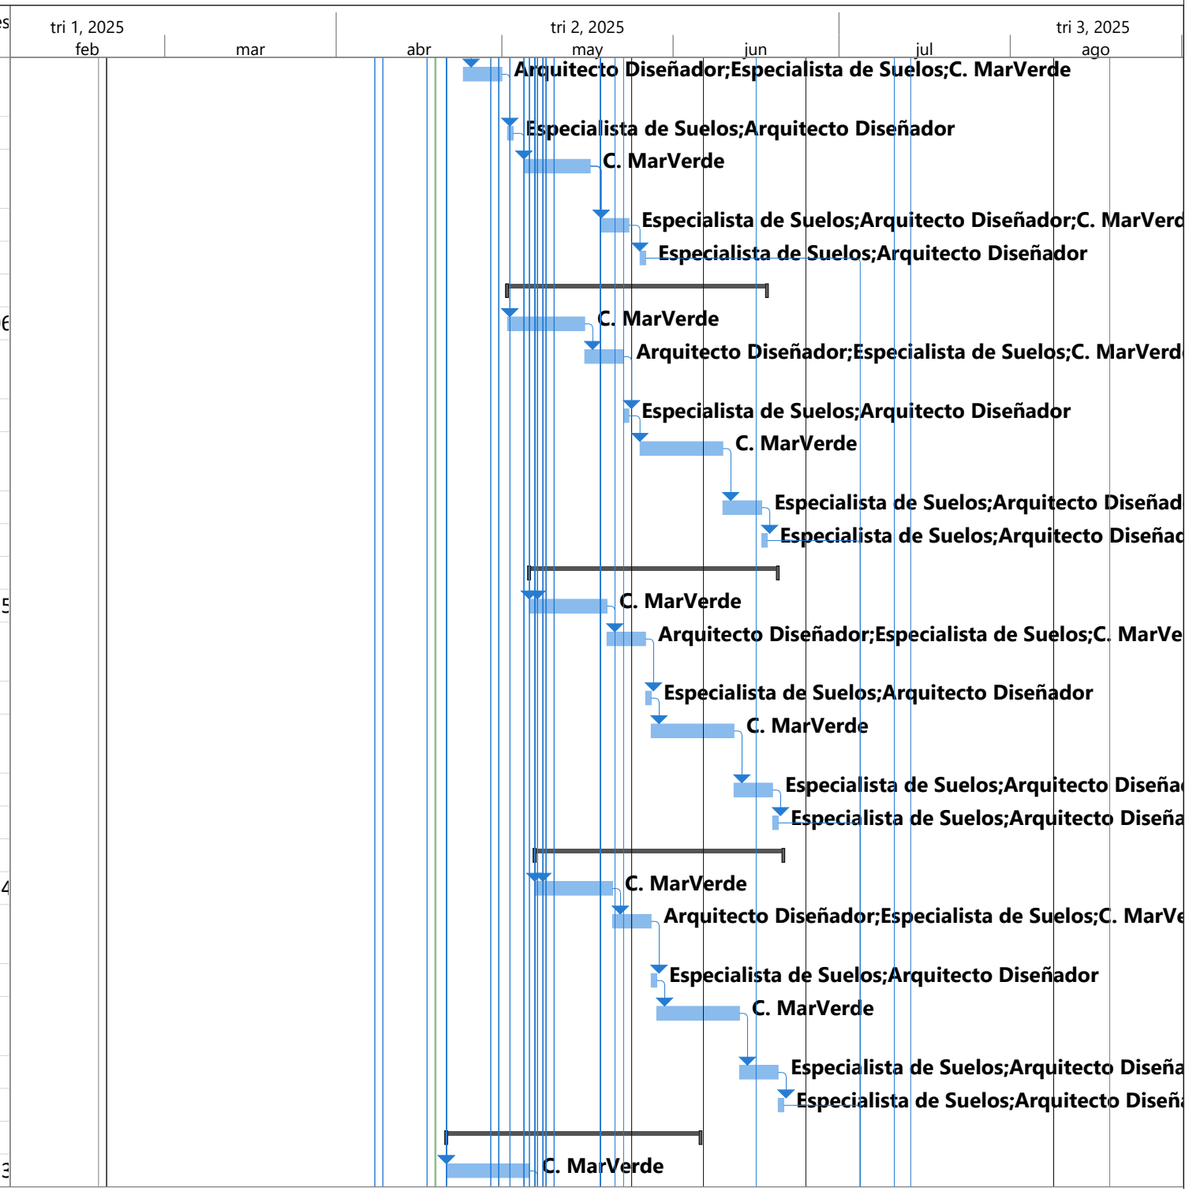


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
312	1.2.2.6.5.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mar 6/05/25	lun 12/05/25	311
313	1.2.2.6.5.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mar 13/05/25	mar 13/05/25	312
314	1.2.2.6.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25	313
315	1.2.2.6.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	314
316	1.2.2.6.5.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	315
317	**1.2.2.6.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**32 días**	**mié 7/05/25**	**vie 20/06/25**	
318	1.2.2.6.6.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mié 7/05/25	mar 20/05/25	142;242
319	1.2.2.6.6.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	318
320	1.2.2.6.6.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	319
321	1.2.2.6.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 29/05/25	jue 12/06/25	320
322	1.2.2.6.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	321
323	1.2.2.6.6.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 20/06/25	vie 20/06/25	322
324	**1.2.2.6.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**32 días**	**mar 29/04/25**	**vie 13/06/25**	
325	1.2.2.6.7.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	mar 29/04/25	mar 13/05/25	152;251
326	1.2.2.6.7.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 14/05/25	mar 20/05/25	325
327	1.2.2.6.7.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25	326
328	1.2.2.6.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 22/05/25	jue 5/06/25	327
329	1.2.2.6.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	328
330	1.2.2.6.7.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	vie 13/06/25	vie 13/06/25	329
331	**1.2.2.6.8**	**Alojamiento Guardianas**	**32 días**	**lun 5/05/25**	**mié 18/06/25**	
332	1.2.2.6.8.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 5/05/25	vie 16/05/25	162;260
333	1.2.2.6.8.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	lun 19/05/25	vie 23/05/25	332
334	1.2.2.6.8.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	333
335	1.2.2.6.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 27/05/25	mar 10/06/25	334
336	1.2.2.6.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 11/06/25	mar 17/06/25	335
337	1.2.2.6.8.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mié 18/06/25	mié 18/06/25	336
338	**1.2.2.6.9**	**Garitas**	**32 días**	**vie 9/05/25**	**mié 25/06/25**	
339	1.2.2.6.9.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	vie 9/05/25	jue 22/05/25	172;269

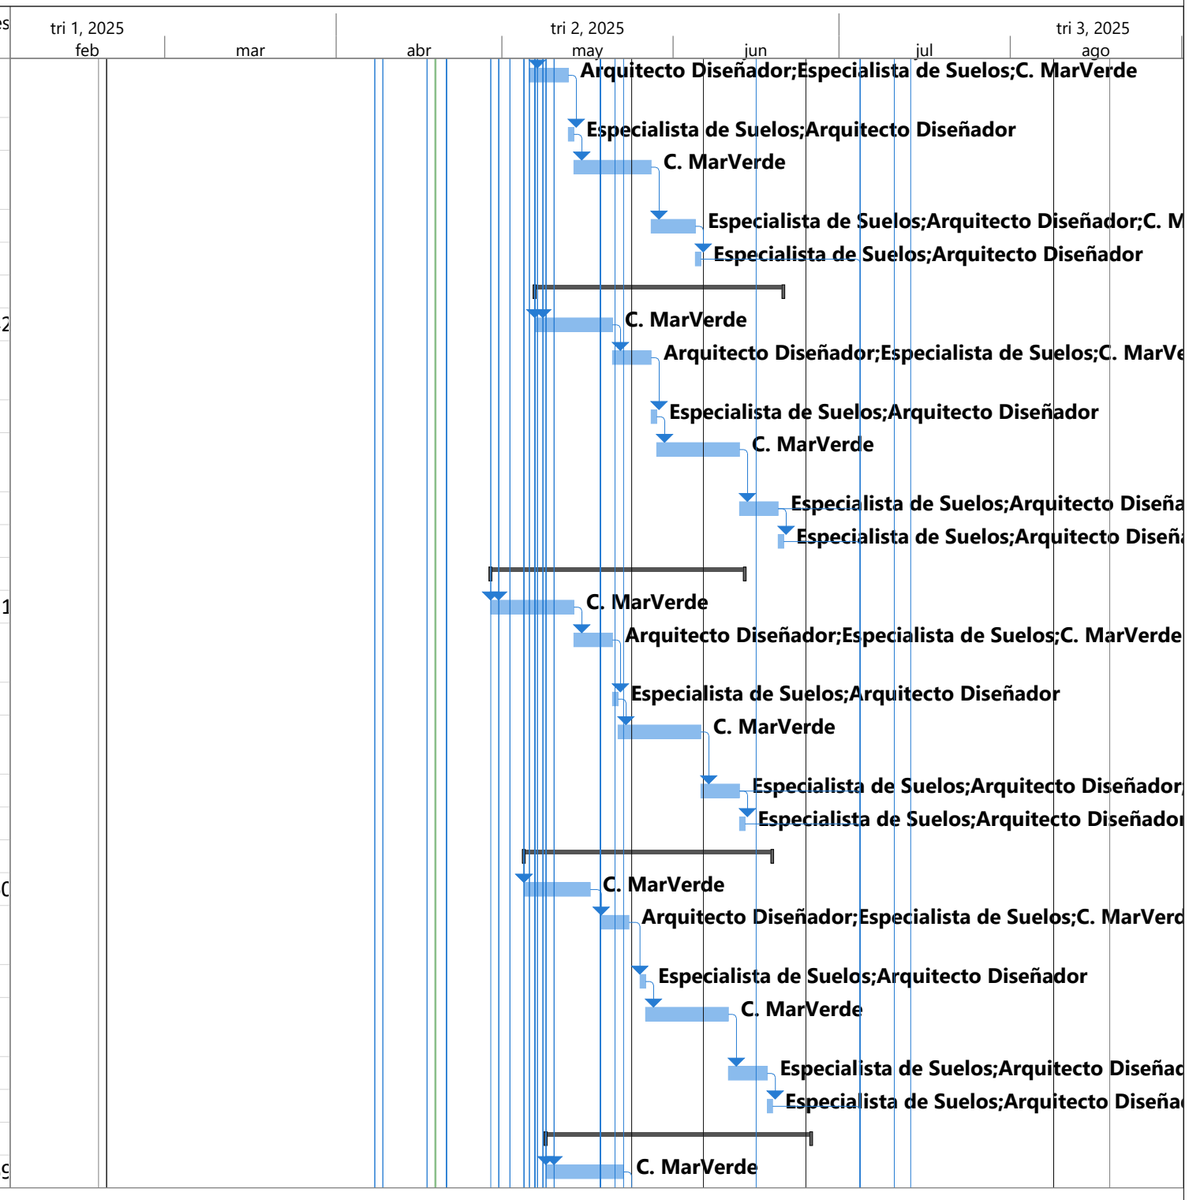


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
340	1.2.2.6.9.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	339
341	1.2.2.6.9.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	340
342	1.2.2.6.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	mar 3/06/25	lun 16/06/25	341
343	1.2.2.6.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 17/06/25	mar 24/06/25	342
344	1.2.2.6.9.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	343
345	**1.2.2.6.10**	**Redes Exteriores -Urbanismo**	**32 días**	**lun 16/06/25**	**jue 31/07/25**	
346	1.2.2.6.10.1	Planteamiento Diseño Hidrosanitario y RCI	10 días	lun 16/06/25	mar 1/07/25	182;322
347	1.2.2.6.10.2	Revision - Mesa de trabajo Planteamiento diseño hidrosanitario y RCI	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	346
348	1.2.2.6.10.3	Aprobación Planteamiento Diseño hidrosani	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	347
349	1.2.2.6.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	10 días	jue 10/07/25	mié 23/07/25	348
350	1.2.2.6.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	349
351	1.2.2.6.10.6	Aprobación Diseño Hidrosanitario y RCI y pl	1 día	jue 31/07/25	jue 31/07/25	350
352	**1.2.2.7**	**DISEÑO ELECTRICO E ILUMINACION**	**83 días**	**mar 8/04/25**	**lun 11/08/25**	
353	**1.2.2.7.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	
354	1.2.2.7.1.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	92;197
355	1.2.2.7.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	354
356	1.2.2.7.1.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	355
357	1.2.2.7.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	356
358	1.2.2.7.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	357
359	1.2.2.7.1.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	358
360	**1.2.2.7.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 23/05/25**	**jue 24/07/25**	
361	1.2.2.7.2.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 23/05/25	vie 13/06/25	102;106
362	1.2.2.7.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 16/06/25	vie 20/06/25	361
363	1.2.2.7.2.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 24/06/25	mar 24/06/25	362
364	1.2.2.7.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 25/06/25	mié 16/07/25	363
365	1.2.2.7.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 17/07/25	mié 23/07/25	364
366	1.2.2.7.2.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	365
367	**1.2.2.7.3**	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	
368	1.2.2.7.3.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	215;112
369	1.2.2.7.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	368

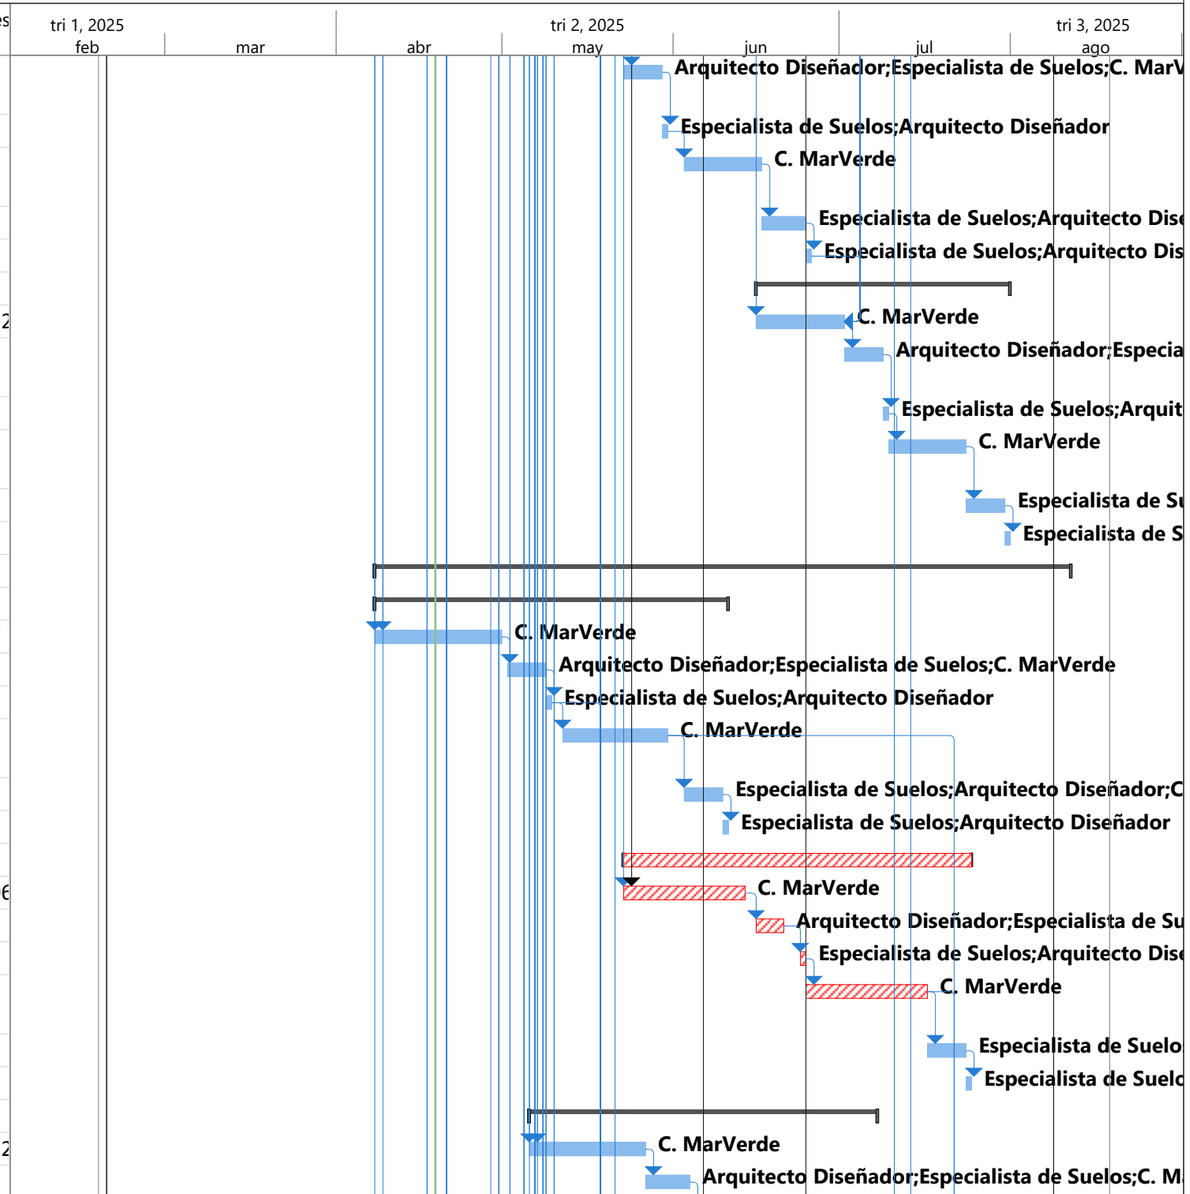


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
370	1.2.2.7.3.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	369
371	1.2.2.7.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	370
372	1.2.2.7.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	371
373	1.2.2.7.3.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	372
374	**1.2.2.7.4**	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
375	1.2.2.7.4.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	122;224
376	1.2.2.7.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	375
377	1.2.2.7.4.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	376
378	1.2.2.7.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	377
379	1.2.2.7.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	378
380	1.2.2.7.4.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	379
381	**1.2.2.7.5**	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	
382	1.2.2.7.5.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	132;233
383	1.2.2.7.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	382
384	1.2.2.7.5.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	383
385	1.2.2.7.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	384
386	1.2.2.7.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	385
387	1.2.2.7.5.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	386
388	**1.2.2.7.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento Cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
389	1.2.2.7.6.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	142;242
390	1.2.2.7.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	389
391	1.2.2.7.6.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	390
392	1.2.2.7.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	391
393	1.2.2.7.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	392
394	1.2.2.7.6.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	393
395	**1.2.2.7.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
396	1.2.2.7.7.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
397	1.2.2.7.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	396
398	1.2.2.7.7.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	397
399	1.2.2.7.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	398
400	1.2.2.7.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	399

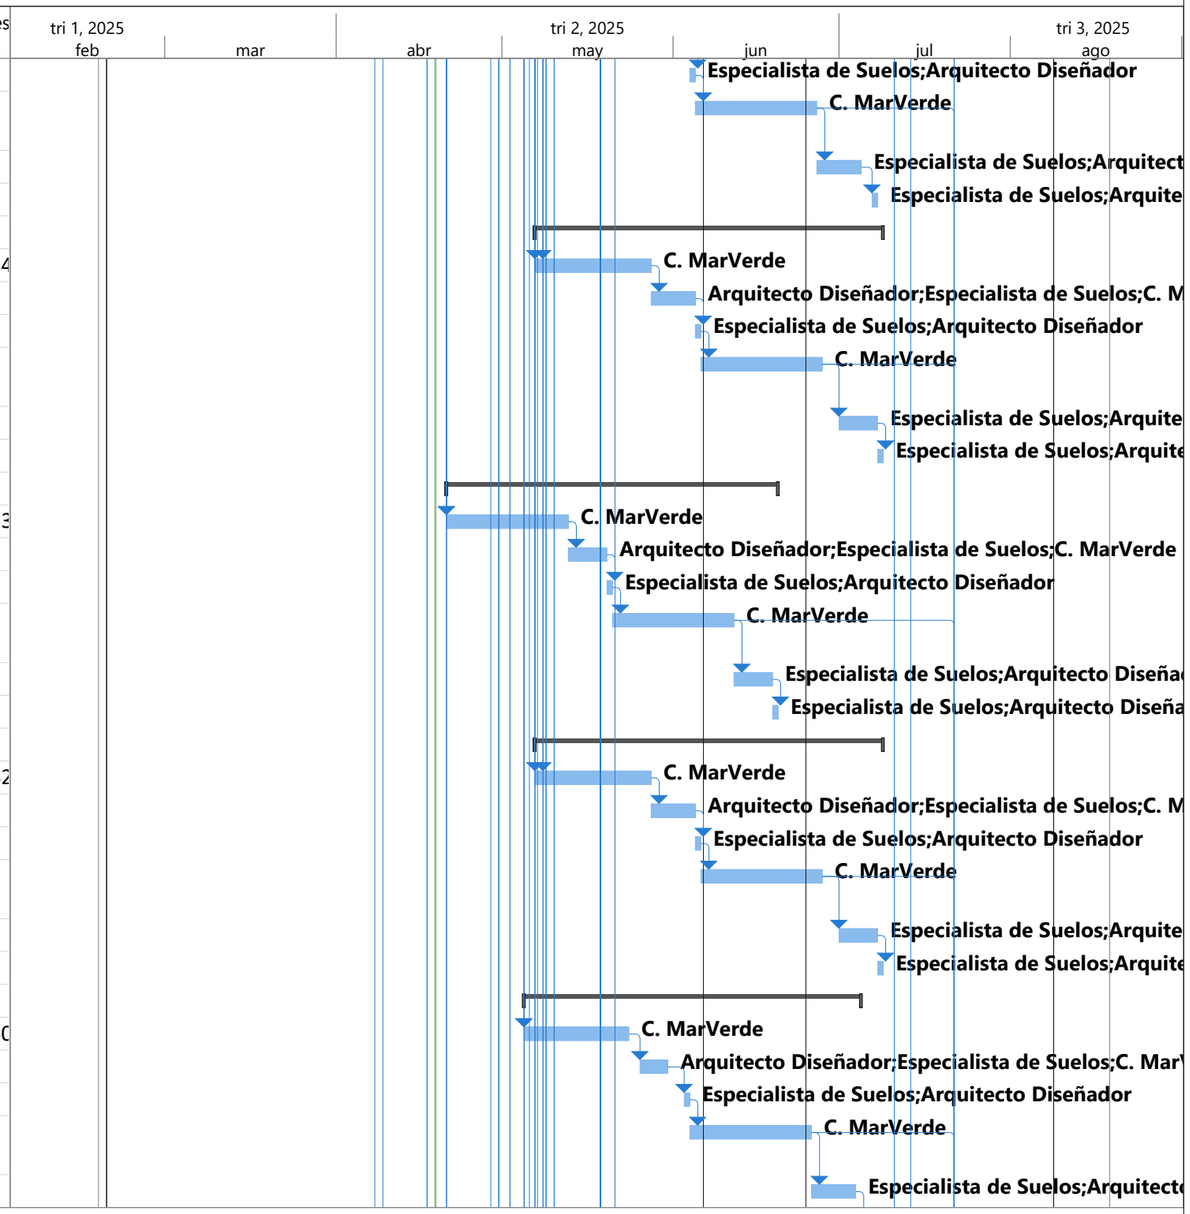


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
401	1.2.2.7.7.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	400
402	**1.2.2.7.8**	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**lun 5/05/25**	**vie 4/07/25**	
403	1.2.2.7.8.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	lun 5/05/25	vie 23/05/25	162;260
404	1.2.2.7.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	403
405	1.2.2.7.8.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	404
406	1.2.2.7.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	405
407	1.2.2.7.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	406
408	1.2.2.7.8.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	vie 4/07/25	vie 4/07/25	407
409	**1.2.2.7.9**	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
410	1.2.2.7.9.1	Planteamiento diseño eléctrico	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
411	1.2.2.7.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	410
412	1.2.2.7.9.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	411
413	1.2.2.7.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	412
414	1.2.2.7.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	413
415	1.2.2.7.9.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	414
416	**1.2.2.7.10**	**Redes Exteiores - Urbanismo**	**20 días**	**lun 14/07/25**	**lun 11/08/25**	
417	1.2.2.7.10.1	Planteamiento diseño eléctrico	5 días	lun 14/07/25	vie 18/07/25	182;357
418	1.2.2.7.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño eléctrico	3 días	lun 21/07/25	mié 23/07/25	417
419	1.2.2.7.10.3	Aprobación Diseño eléctrico	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	418
420	1.2.2.7.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos - Coordinación BIM	8 días	vie 25/07/25	mar 5/08/25	419
421	1.2.2.7.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	2 días	mié 6/08/25	vie 8/08/25	420
422	1.2.2.7.10.6	Aprobación Diseño Eléctrico y planos	1 día	lun 11/08/25	lun 11/08/25	421
423	**1.2.2.8**	**DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y C(**	**80 días**	**mar 8/04/25**	**mar 5/08/25**	
424	**1.2.2.8.1**	**Pabellón Reclusión de Mujeres**	**42 días**	**mar 8/04/25**	**mar 10/06/25**	
425	1.2.2.8.1.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 8/04/25	mié 30/04/25	92;197
426	1.2.2.8.1.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 2/05/25	jue 8/05/25	425
427	1.2.2.8.1.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	vie 9/05/25	vie 9/05/25	426
428	1.2.2.8.1.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	lun 12/05/25	vie 30/05/25	427
429	1.2.2.8.1.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25	428
430	1.2.2.8.1.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 10/06/25	mar 10/06/25	429
431	**1.2.2.8.2**	**DIER - Pabellón Maternas**	**42 días**	**vie 2/05/25**	**jue 3/07/25**	

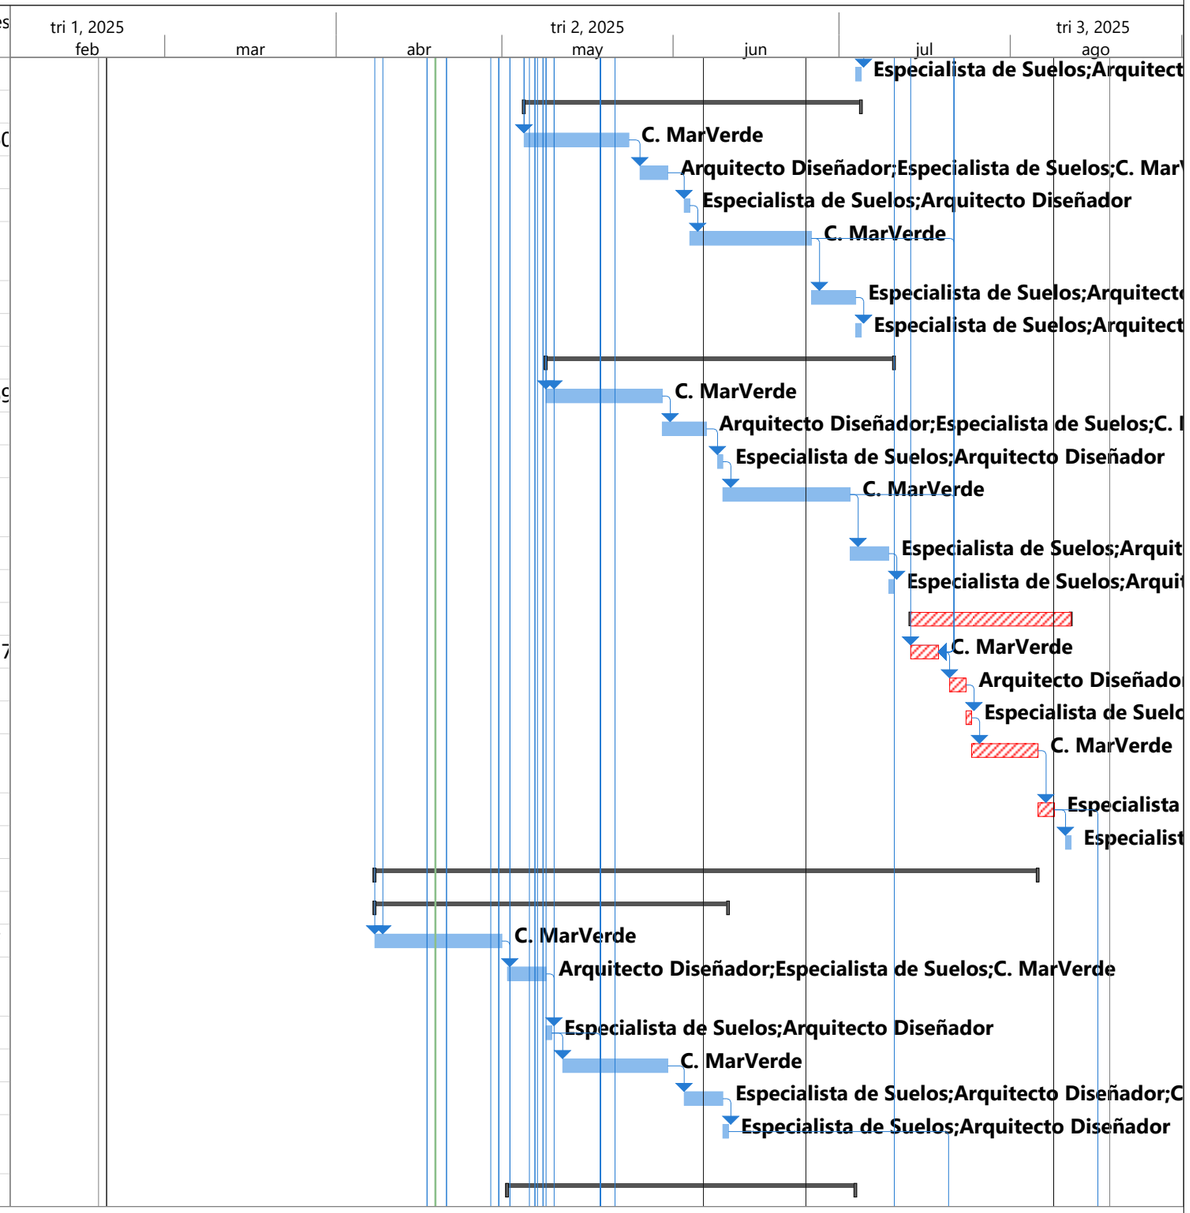

Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
432	1.2.2.8.2.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	vie 2/05/25	jue 22/05/25	102;206
433	1.2.2.8.2.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	432
434	1.2.2.8.2.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	433
435	1.2.2.8.2.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 3/06/25	mar 24/06/25	434
436	1.2.2.8.2.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mié 25/06/25	mié 2/07/25	435
437	1.2.2.8.2.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	436
438	**1.2.2.8.3**	**Talleres**	**42 días**	**mar 6/05/25**	**lun 7/07/25**	
439	1.2.2.8.3.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 6/05/25	lun 26/05/25	112;215
440	1.2.2.8.3.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	439
441	1.2.2.8.3.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	440
442	1.2.2.8.3.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 5/06/25	jue 26/06/25	441
443	1.2.2.8.3.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	442
444	1.2.2.8.3.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	443
445	**1.2.2.8.4**	**Sanidad**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
446	1.2.2.8.4.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	122;224
447	1.2.2.8.4.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	446
448	1.2.2.8.4.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	447
449	1.2.2.8.4.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	448
450	1.2.2.8.4.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	449
451	1.2.2.8.4.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	450
452	**1.2.2.8.5**	**Visitas**	**42 días**	**lun 21/04/25**	**jue 19/06/25**	
453	1.2.2.8.5.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	lun 21/04/25	lun 12/05/25	132;233
454	1.2.2.8.5.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mar 13/05/25	lun 19/05/25	453
455	1.2.2.8.5.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mar 20/05/25	mar 20/05/25	454
456	1.2.2.8.5.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mié 21/05/25	mié 11/06/25	455
457	1.2.2.8.5.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 12/06/25	mié 18/06/25	456
458	1.2.2.8.5.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 19/06/25	jue 19/06/25	457
459	**1.2.2.8.6**	**Rancho - Asadero - Alojamiento cocineras**	**42 días**	**mié 7/05/25**	**mar 8/07/25**	
460	1.2.2.8.6.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mié 7/05/25	mar 27/05/25	142;242




Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
461	1.2.2.8.6.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	460
462	1.2.2.8.6.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	461
463	1.2.2.8.6.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	vie 6/06/25	vie 27/06/25	462
464	1.2.2.8.6.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	463
465	1.2.2.8.6.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	464
466	**1.2.2.8.7**	**Guardia Interna - Guardia Externa**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	
467	1.2.2.8.7.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	152;251
468	1.2.2.8.7.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	467
469	1.2.2.8.7.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	468
470	1.2.2.8.7.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	469
471	1.2.2.8.7.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	470
472	1.2.2.8.7.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	471
473	**1.2.2.8.8**	**Alojamiento Guardianas**	**42 días**	**mar 29/04/25**	**mar 1/07/25**	
474	1.2.2.8.8.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	mar 29/04/25	mar 20/05/25	161;260
475	1.2.2.8.8.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	mié 21/05/25	mar 27/05/25	474
476	1.2.2.8.8.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 28/05/25	mié 28/05/25	475
477	1.2.2.8.8.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	jue 29/05/25	jue 19/06/25	476
478	1.2.2.8.8.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	477
479	1.2.2.8.8.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	478
480	**1.2.2.8.9**	**Garitas**	**42 días**	**vie 9/05/25**	**jue 10/07/25**	
481	1.2.2.8.9.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	15 días	vie 9/05/25	jue 29/05/25	172;269
482	1.2.2.8.9.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	5 días	vie 30/05/25	vie 6/06/25	481
483	1.2.2.8.9.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	482
484	1.2.2.8.9.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	15 días	mar 10/06/25	mié 2/07/25	483
485	1.2.2.8.9.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	484
486	1.2.2.8.9.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	jue 10/07/25	jue 10/07/25	485
487	**1.2.2.8.10**	**Redes Exteriores - Urbanismo**	**18 días**	**vie 11/07/25**	**mar 5/08/25**	
488	1.2.2.8.10.1	Planteamiento diseño comunicaciones, segu	5 días	vie 11/07/25	jue 17/07/25	182;430

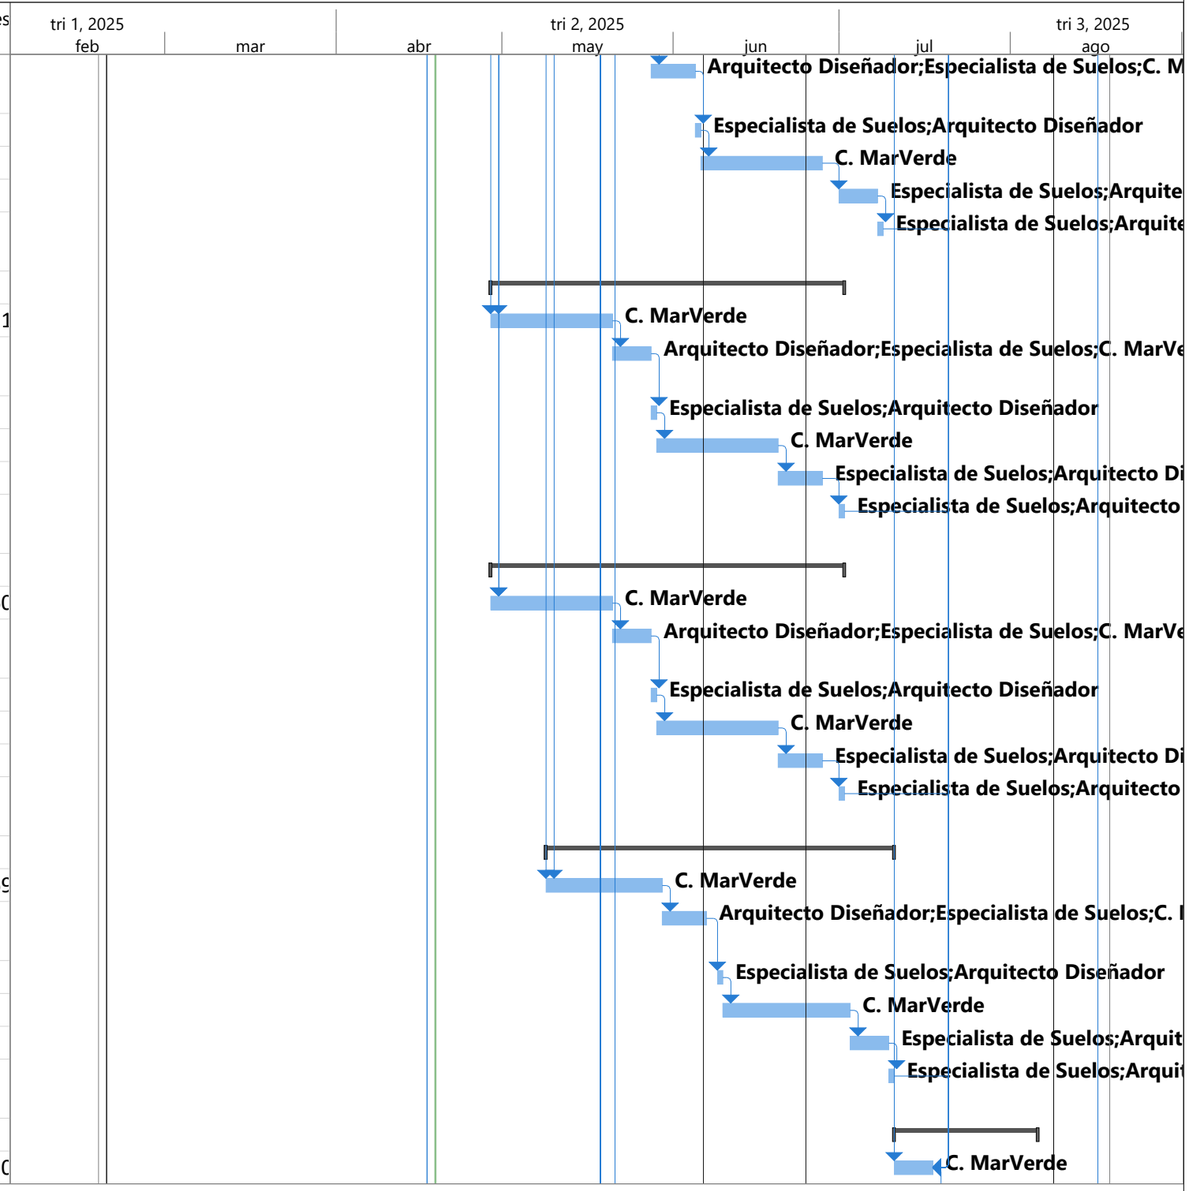


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
489	1.2.2.8.10.2	Revision - Mesa de trabajo diseño comunicaciones, seguridad y control	3 días	vie 18/07/25	mar 22/07/25	488
490	1.2.2.8.10.3	Aprobación Diseño comunicaciones, segurid	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	489
491	1.2.2.8.10.4	Calculo detallado - Elaboración de planos	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	490
492	1.2.2.8.10.5	Revision - Mesa de trabajo Diseño y planos	3 días	jue 31/07/25	lun 4/08/25	491
493	1.2.2.8.10.6	Aprobación Diseño comunicaciones, seguridad y control y planos	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	492
494	**1.2.3**	**PROGRAMACION DE OBRA**	**77 días**	**lun 17/02/25**	**lun 9/06/25**	
495	**1.2.3.1**	**Programacion Preconstrucción Etapa 1**	**20 días**	**lun 17/02/25**	**vie 14/03/25**	
496	1.2.3.1.1	Entrega	7 días	lun 17/02/25	mar 25/02/25	3
497	1.2.3.1.2	Revisión Interventoria - Mesa de trabajo	10 días	mié 26/02/25	mar 11/03/25	496
498	1.2.3.1.3	Aprobación	1 día	mié 12/03/25	mié 12/03/25	497
499	1.2.3.1.4	Programa de Fuerza Operativa de la Fase 1	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	3
500	**1.2.3.2**	**Programación Construcción**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**	
501	**1.2.3.2.1**	**Programación**	**15 días**	**mié 14/05/25**	**mié 4/06/25**	
502	1.2.3.2.1.1	Elaboración	10 días	mié 14/05/25	mar 27/05/25	280FF-5
503	1.2.3.2.1.2	Revision - Mesa de Trabajo	4 días	mié 28/05/25	mar 3/06/25	502
504	1.2.3.2.1.3	Aprobación	1 día	mié 4/06/25	mié 4/06/25	503
505	**1.2.3.2.2**	**Entregables**	**35 días**	**mié 16/04/25**	**lun 9/06/25**	
506	1.2.3.2.2.1	Estructura desglosada del trabajo EDT	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
507	1.2.3.2.2.2	Programación de obra detallada	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25	504FF
508	1.2.3.2.2.3	Programa mensual de uso de Fuerza de trab	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
509	1.2.3.2.2.4	Programa de suministro de Materiales	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
510	1.2.3.2.2.5	Programa de subcontratos y compras	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
511	1.2.3.2.2.6	Programa de uso de equipo y maquinaria	10 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	504FF
512	1.2.3.2.2.7	Revision Mesa de trabajo - entregables	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25	506;507
513	1.2.3.2.2.8	Aprobación	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	512
514	1.2.3.2.2.9	Programa de Inversión mensual del Anticipo	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	58
515	1.2.3.2.2.10	Programa de Inversión mensual del proyect	10 días	mié 16/04/25	vie 2/05/25	58
516	1.2.3.2.2.11	Revision Mesa de trabajo - entregables	25 días	lun 5/05/25	lun 9/06/25	515
517	1.2.3.2.2.12	Aprobación	15 días	lun 19/05/25	lun 9/06/25	516FF
518	**1.2.4**	**BALANCE PRESUPUESTO (Nota solamente se puede hacer de Arquitectura y Estructura, porque el resto de diseños para la fecha establecida en el**	**35 días**	**mié 25/06/25**	**jue 14/08/25**	
519	1.2.4.1	Calculo de cantidades Arquitectonicas	30 días	mié 25/06/25	mié 6/08/25	186FC+
520	1.2.4.2	Calculo de cantidades Estructurales	22 días	mar 8/07/25	mié 6/08/25	519CC+

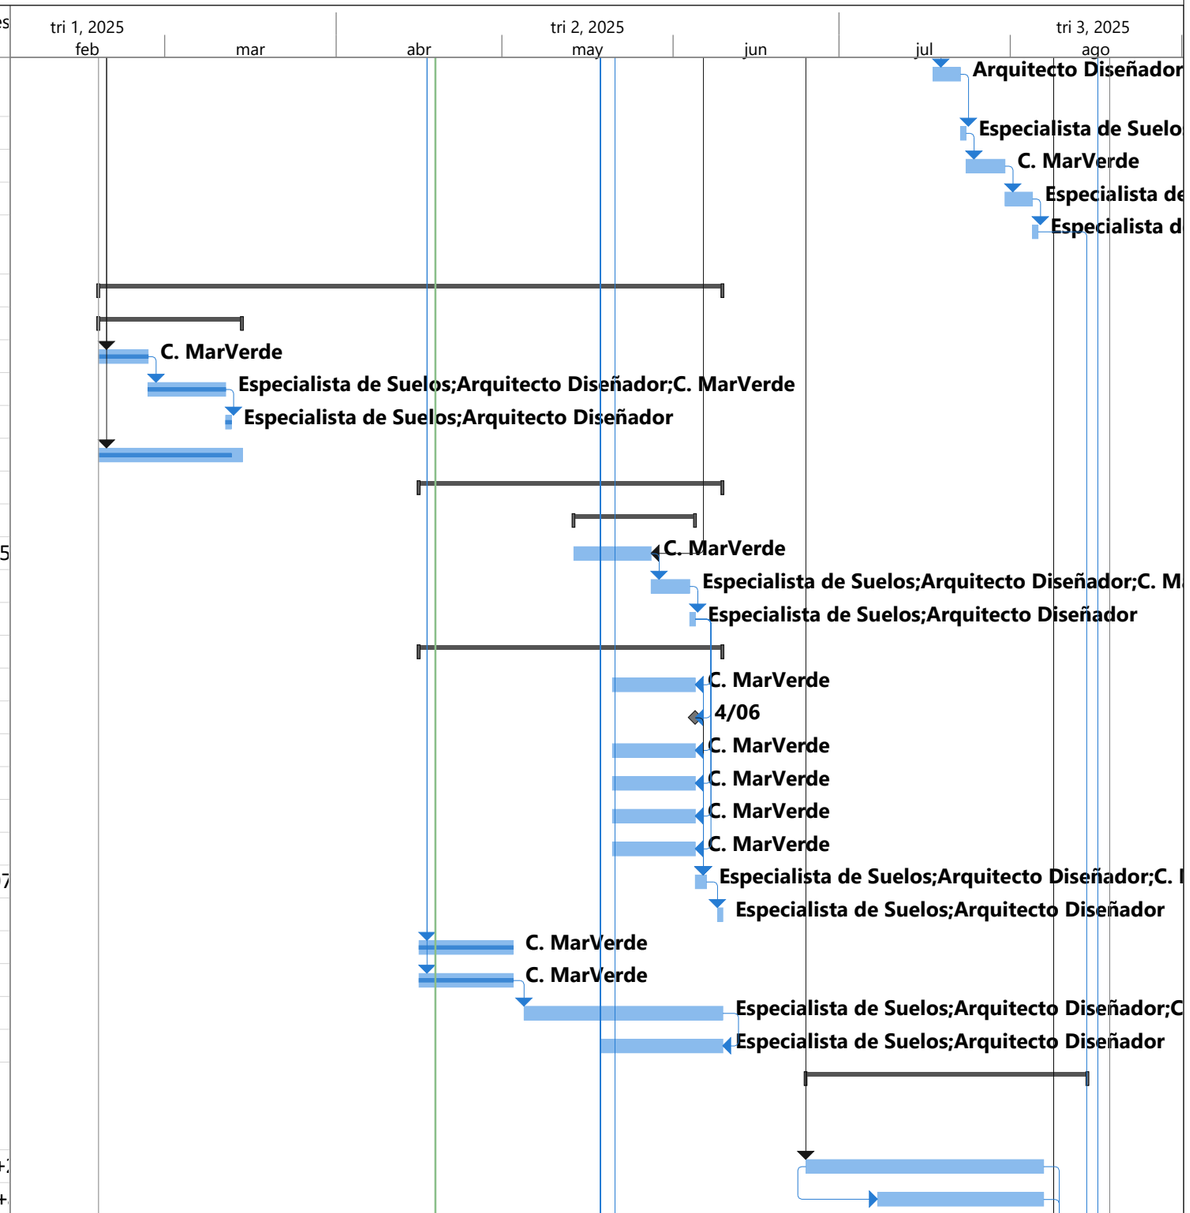


Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica

CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE (Acacias - Meta)

PROGRAMACION DE PRECONSTRUCCION

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predeces
521	1.2.4.3	Elaboración Balance	10 días	jue 24/07/25	mié 6/08/25	519FF;5
522	1.2.4.4	Revisión	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25	521
523	1.2.4.5	Aprobación	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25	522
524	**1.2.5**	**AJUSTE PRESUPUESTO INSTALACIONES TECNICAS**	**61 días**	**lun 19/05/25**	**lun 18/08/25**	
525	1.2.5.1	Calculo de cantidades Hidrosanitarias y RCI	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25	281FF+3
526	1.2.5.2	Calculo de cantidades Eléctricas	9 días	jue 31/07/25	mié 13/08/25	421FF+3
527	1.2.5.3	Calculo de cantidades Red de Comunicaciones y S	12 días	jue 24/07/25	lun 11/08/25	493FF+3
528	1.2.5.4	Elaboración Balance	12 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25	525FF;5
529	1.2.5.5	Revisión	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25	528
530	1.2.5.6	Aprobación	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25	529
531	**1.2.5.7**	**CONSTRUCCION**	**0 días**	**lun 19/05/25**	**lun 19/05/25**	
532	1.2.5.7.1	Inicio Construcción	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	**182;77;**

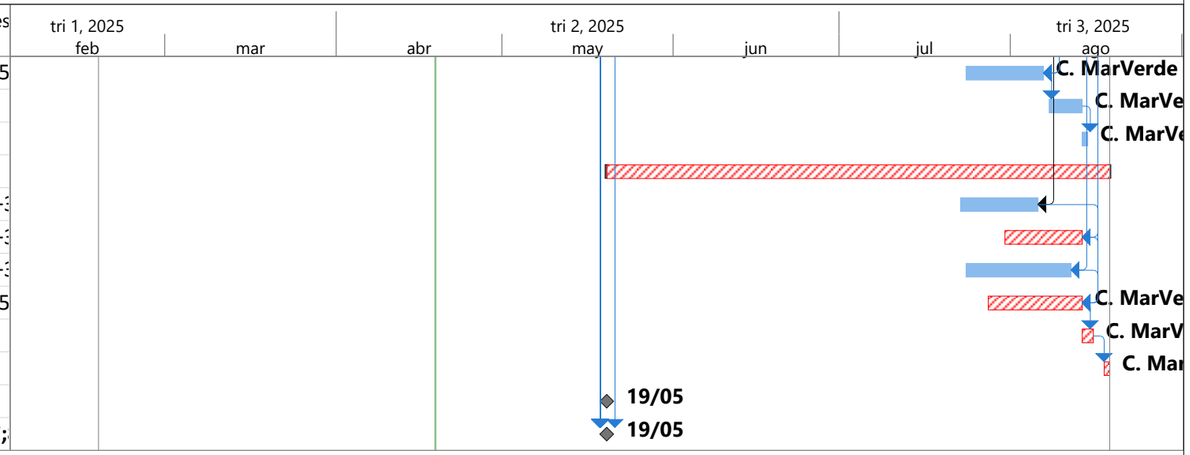

Proyecto: Programacion Unitari
Fecha: sáb 19/04/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Ruta Critica
