

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			CONTRATO 031 DE 2025			$ 6.166.726.353,72	447 días	jue 26/06/25	sáb 18/07/26	
2			INICIO			$ 0,00	0 días	jue 26/06/25	jue 26/06/25	
3			FASE II			$ 6.166.705.353,72	230 días	mar 4/11/25	sáb 18/07/26	
4		01	PRELIMINARES 0			$ 260.126.058,63	196 días	mar 4/11/25	jue 11/06/26	
5		01.01	DEMOLICIONES Y RETIROS 0			$ 64.411.255,04	183 días	mar 4/11/25	jue 28/05/26	
6		01.01.02	DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONC	m2	941,2	$ 51.042.455,00	50 días	jue 1/01/26	jue 26/02/26	677FC-66 días
7		01.01.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS	m2	4,65	$ 786.793,48	70 días	jue 1/01/26	vie 20/03/26	677FC-66 días
8		01.01.06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS	m2	5,74	$ 604.898,16	70 días	jue 1/01/26	vie 20/03/26	677FC-66 días
9		01.01.09	DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN L	m	4,98	$ 315.189,32	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
10		01.01.10	DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLU	m2	175,59	$ 11.661.919,08	65 días	lun 16/03/26	jue 28/05/26	677
11		01.02	DESMONTES 0			$ 174.873.219,50	183 días	mar 4/11/25	jue 28/05/26	
12		01.02.01	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, CRISTAL Y/O METALICAS - DIM=VARIABLES	M2	77,00	$ 2.127.093,85	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
13		01.02.02	DESMONTE DE VENTANAS INTERNAS Y EXTERNAS DIM=VARIABLES	M2	79,00	$ 2.200.947,75	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
14		01.02.04	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE	und	23,00	$ 749.853,47	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
15		01.02.05	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final	M	300,00	$ 2.533.391,34	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
16		01.02.06	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final	M	300,00	$ 1.638.867,15	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
17		01.02.07	Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"	und	35,00	$ 534.597,56	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
18		01.02.08	DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0	m2	1.147,91	$ 60.905.349,73	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
19		01.02.09	Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension	m	1.000,00	$ 10.650.384,40	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
20		01.02.10	DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	350,76	$ 38.349.901,63	65 días	lun 16/03/26	jue 28/05/26	677
21		01.02.11	DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE	m2	125,07	$ 13.396.083,48	65 días	lun 16/03/26	jue 28/05/26	677
22		01.02.12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE	m	60,90	$ 3.847.370,16	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
23		01.02.13	DESMONTE DE MESON DE ATENCION HASTA B=0.60MTS EXISTENTES	m	20,00	$ 1.060.148,22	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
24		01.02.14	DESMONTE DE MUEBLES FIJOS EXISTENTES INCLUYE MOBILIARIO	M2	65,00	$ 6.081.747,84	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
25		01.02.15	DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS,HIDRAULICOS,ELECTRICOS	und	60,00	$ 7.969.025,30	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
26		01.02.17	DESMONTE DE CIELO RASO 0	m2	374,10	$ 16.290.647,86	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
27		01.02.18	DESMONTE DE REJAS DE CARCELES O CALABOZOS 0	und	2,00	$ 213.617,68	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
28		01.02.19	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	und	4,00	$ 1.413.227,25	65 días	mié 11/02/26	vie 24/04/26	677FC-30 días
29		01.02.20	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final	und	300,00	$ 3.778.467,09	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
30		01.02.21	Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final	und	12,00	$ 1.132.497,74	65 días	mar 4/11/25	jue 15/01/26	2FC+117 días
31		01.04	TRABAJOS PRELIMINARES 0			$ 5.843.164,56	70 días	lun 16/03/26	mar 2/06/26	
32		01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA (INCLUYE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACION)	und	1,00	$ 687.427,23	3 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	677
33		01.04.03	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.	m2	444,16	$ 5.155.737,33	10 días	vie 22/05/26	mar 2/06/26	29FC-5 días;6FC-5 días;7FC-5 días;8FC-5 días;9FC-5 días;10FC-5 días;12FC-5 días;13FC-5 días;
34		01.07	CERRAMIENTO 0			$ 14.998.419,53	13 días	jue 28/05/26	jue 11/06/26	
35		01.07.05	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CERRAMIENTO DE OBRA EN LONA VERDE (COLUMNAS EN MADERA) H=2,10 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	217,56	$ 14.998.419,53	13 días	jue 28/05/26	jue 11/06/26	33FC-5 días
36		02	CIMENTACIÓN 0			$ 8.128.495,09	38 días	vie 5/06/26	sáb 18/07/26	
37		02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN 0			$ 1.292.547,84	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	
38		02.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN- INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m3	8,52	$ 1.292.547,84	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	35FC-5 días
39		02.06	LOSAS DE CIMENTACION 0			$ 2.195.409,49	15 días	mié 1/07/26	sáb 18/07/26	
40		02.06.11	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=10CM EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE ACERO	m2	6,07	$ 2.195.409,49	15 días	mié 1/07/26	sáb 18/07/26	44FC-3 días;45FC-3 días
41		02.07	SUMINISTROS CONCRETOS Y OTROS (ACTIVIDADADES DIFERENTES A ELEMENTOS ESTRUCTURALES) 0			$ 424.992,88	7 días	mié 17/06/26	jue 25/06/26	
42		02.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL	m3	0,61	$ 424.992,88	7 días	mié 17/06/26	jue 25/06/26	38;47
43		02.09	ACERO DE REFUERZO 0			$ 4.147.848,57	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	
44		02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	297,13	$ 2.953.094,46	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	42FC-3 días
45		02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	119,01	$ 1.194.754,11	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	42FC-3 días
46		02.11	GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS 0			$ 67.694,31	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	
47		02.11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 0	m2	6,07	$ 67.694,31	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	35FC-5 días
48		03	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			$ 41.597.615,58	47 días	jue 28/05/26	sáb 18/07/26	
49		03.01	EXCAVACIONES			$ 13.718.847,95	26 días	jue 28/05/26	jue 25/06/26	

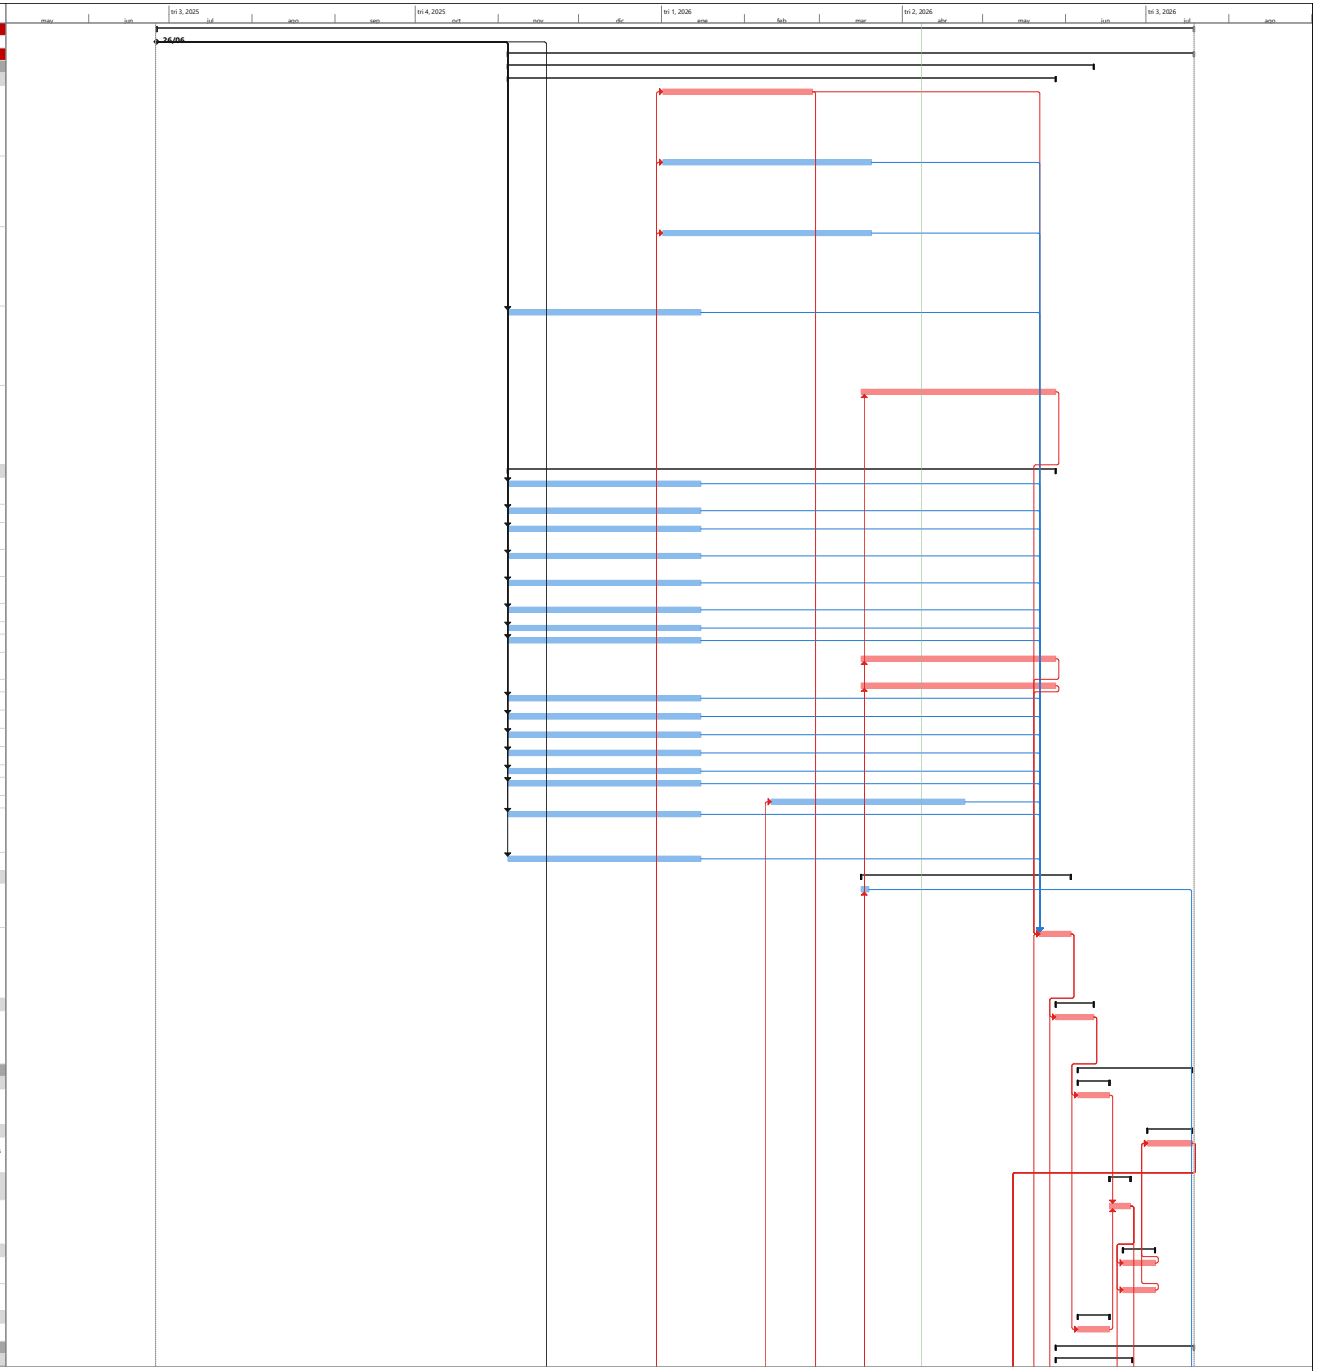


Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
50		03.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE TUBERIAS SEGÚN PLANOS HIDROSANITARIOS-INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m3	90,43	$ 13.718.847,95	26 días	jue 28/05/26	jue 25/06/26	33FC-5 días
51		**03.02**	**RELLENOS Y REEMPLAZOS**			**$ 7.075.111,27**	**10 días**	**vie 26/06/26**	**mar 7/07/26**	
52		03.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	m3	9,04	$ 3.566.020,68	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	50
53		03.02.06	SUMINISTRO Y EJECUCION DE RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	72,34	$ 3.509.090,59	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	50
54		**03.03**	**RETIROS**			**$ 2.495.381,24**	**10 días**	**vie 26/06/26**	**mar 7/07/26**	
55		03.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	m3	18,09	$ 2.495.381,24	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	50
56		**03.04**	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**			**$ 10.725.835,35**	**10 días**	**mar 7/07/26**	**sáb 18/07/26**	
57		03.04.07	SUMINISTRO Y EJECUCION DE NICHO MAMPOSTERIA PARA CAJILLA METALICA Y MEDIDOR TOTALIZ. 3/4" DIM=0,30x0,60x0,15 M. INCLUYE CAJILLA Y MEDIDOR.	und	1,00	$ 1.320.966,82	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	52;53;55
58		03.04.11	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M 0	und	7,00	$ 5.984.916,34	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	52;53;55
59		03.04.14	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M	und	4,00	$ 3.419.952,19	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	52;53;55
60		**03.06**	**ELEMENTOS PREFABRICADOS**			**$ 2.201.118,91**	**5 días**	**mar 14/07/26**	**sáb 18/07/26**	
61		03.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHARNELA 6"	und	2,00	$ 2.201.118,91	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
62		**03.08**	**CAÑUELAS, CANALETAS, CARCAMOS Y CUNETAS**			**$ 1.807.814,47**	**5 días**	**mar 14/07/26**	**sáb 18/07/26**	
63		03.08.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CÁRCAMO CON REJILLA B=0,10m x H=0,15m	m	2,40	$ 1.807.814,47	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
64		**03.10**	**OBRAS PARA CONEXIONES ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS**			**$ 3.573.506,39**	**5 días**	**mar 14/07/26**	**sáb 18/07/26**	
65		03.10.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 0	und	1,00	$ 1.360.972,68	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
66		03.10.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	und	1,00	$ 1.341.669,18	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
67		03.10.05	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CONEXIÓN A RED ACOMETIDA	und	1,00	$ 870.864,53	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
68		**04**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA 0**			**$ 227.170.152,94**	**51 días**	**jue 21/05/26**	**vie 17/07/26**	
69		**04.01**	**PRELIMINARES DE ESTRUCTURA 0**			**$ 12.869.664,04**	**30 días**	**vie 22/05/26**	**jue 25/06/26**	
70		04.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA 0	m2	1.244,00	$ 12.869.664,04	30 días	vie 22/05/26	jue 25/06/26	33CC
71		**04.02**	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 0**			**$ 10.965.912,54**	**10 días**	**jue 2/07/26**	**mar 14/07/26**	
72		04.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO CONCRETO PARA TANQUE 4000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y AC	m3	7,43	$ 10.965.912,54	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	80FC-3 días;81FC-3 días
73		**04.05**	**LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO 0**			**$ 17.476.279,34**	**15 días**	**mié 1/07/26**	**vie 17/07/26**	
74		04.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA 4000PSI TORTA E=12CM INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS H=0.75M Y H=0.5M - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y	m2	25,00	$ 15.063.904,47	15 días	mié 1/07/26	vie 17/07/26	80FC-5 días;81FC-5 días
75		04.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE SOBREANCHO EN CONCRETO EN PLACA EXISTENTE TIPO_1 4000PSI E=40CM - CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORI	m2	3,40	$ 2.412.374,87	15 días	mié 1/07/26	vie 17/07/26	80FC-5 días;81FC-5 días
76		**04.08**	**FOSOS EN CONCRETO 0**			**$ 8.458.438,51**	**10 días**	**jue 2/07/26**	**mar 14/07/26**	
77		04.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FOSO ASCENSOR EN CONCRETO TIPO_01 CONCRETO 4000 PSI. PUBLICOS Y PRIVADOS - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLU	m3	3,50	$ 4.934.089,13	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	80FC-3 días;81FC-3 días
78		04.08.11	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FOSO EYECTOR EN CONCRETO DE 4000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y	m3	2,50	$ 3.524.349,38	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	80FC-3 días;81FC-3 días
79		**04.10**	**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA 0**			**$ 26.125.545,43**	**13 días**	**lun 22/06/26**	**lun 6/07/26**	
80		04.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	1.912,50	$ 19.007.818,64	10 días	jue 25/06/26	lun 6/07/26	42FC-3 días;70
81		04.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA STANDAR INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	709,00	$ 7.117.726,79	10 días	lun 22/06/26	jue 2/07/26	42FC-3 días
82		**04.14**	**ANCLAJES 0**			**$ 7.726.869,33**	**30 días**	**mié 3/06/26**	**lun 6/07/26**	
83		04.14.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE ANCLAJE HASTA 3/4" POR PROCESO CONSTRUCTIVO INCLUYE REFUER2O Y EPOXICO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	und	250,00	$ 7.726.869,33	30 días	mié 3/06/26	lun 6/07/26	72FC-40 días;74FC-40 días;75FC-40 días;77FC-40
84		**04.17**	**CUBIERTA METALICA 0**			**$ 46.330.158,42**	**35 días**	**jue 21/05/26**	**mar 30/06/26**	
85		04.17.01	SUMINISTRO Y EJECUCION ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA Y TODO ELEMENTO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	kg	1.577,90	$ 46.330.158,42	35 días	jue 21/05/26	mar 30/06/26	72FC-51 días;74FC-51 días;75FC-51 días;77FC-51 días;78FC-51 días
86		**04.19**	**OTROS ELEMENTOS METALICOS 0**			**$ 97.217.285,33**	**10 días**	**lun 6/07/26**	**vie 17/07/26**	
87		04.19.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FOSO ASCENSOR METALICO TIPO_01 INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA Y TODO ELEMENTO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	kg	3.311,00	$ 97.217.285,33	10 días	lun 6/07/26	vie 17/07/26	72FC-10 días;74FC-10 días;75FC-10 días;77FC-10 días;78FC-10 días
88		**05**	**MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES 0**			**$ 194.777.349,44**	**94 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 18/07/26**	
89		**05.08**	**MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA 0**			**$ 43.714.739,17**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
90		05.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO BLOQUE ARCILLA X M2 N° 4 - PERFORACIÓN VERTICAL 0,33X0,115X0,23M DE ARCILLA INCLUYE PEGA DE 1 CM EN MORTERO 1:3, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	459,95	$ 39.493.396,00	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58 días;85FC-58 días;87FC-58 días
91		05.08.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO BLOQUE ARCILLA X ML N° 4 - PERFORACIÓN VERTICAL 0,33X0,115X0,23M DE ARCILLA INCLUYE PEGA DE 1 CM EN MORTERO 1:3, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECION Y FUNCIONAMIENTO.	m	77,86	$ 4.221.343,17	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	90CC
92		**05.10**	**OTRAS ACTIVIDADES EN MAMPOSTERIA 0**			**$ 2.930.232,69**	**51 días**	**lun 6/04/26**	**mar 2/06/26**	
93		05.10.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE REGATAS Y REMATES EN MUROS 0	m	177,50	$ 2.930.232,69	51 días	lun 6/04/26	mar 2/06/26	90FC-65 días;91FC-65
94		**05.11**	**MUROS EN DRY WALL Y FIBROCEMENTO 0**			**$ 60.816.446,68**	**53 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 18/07/26**	
95		05.11.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MUROS EN DRY WALL UNA CARA TIPO_01X M2 MASILLADO SIN ACABADO	m2	307,78	$ 38.927.343,10	53 días	jue 21/05/26	sáb 18/07/26	108FC+25 días
96		05.11.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MUROS EN DRY WALL UNA CARA TIPO_01X ML MASILLADO SIN ACABADO	m	232,55	$ 21.889.103,58	53 días	jue 21/05/26	sáb 18/07/26	108FC+25 días

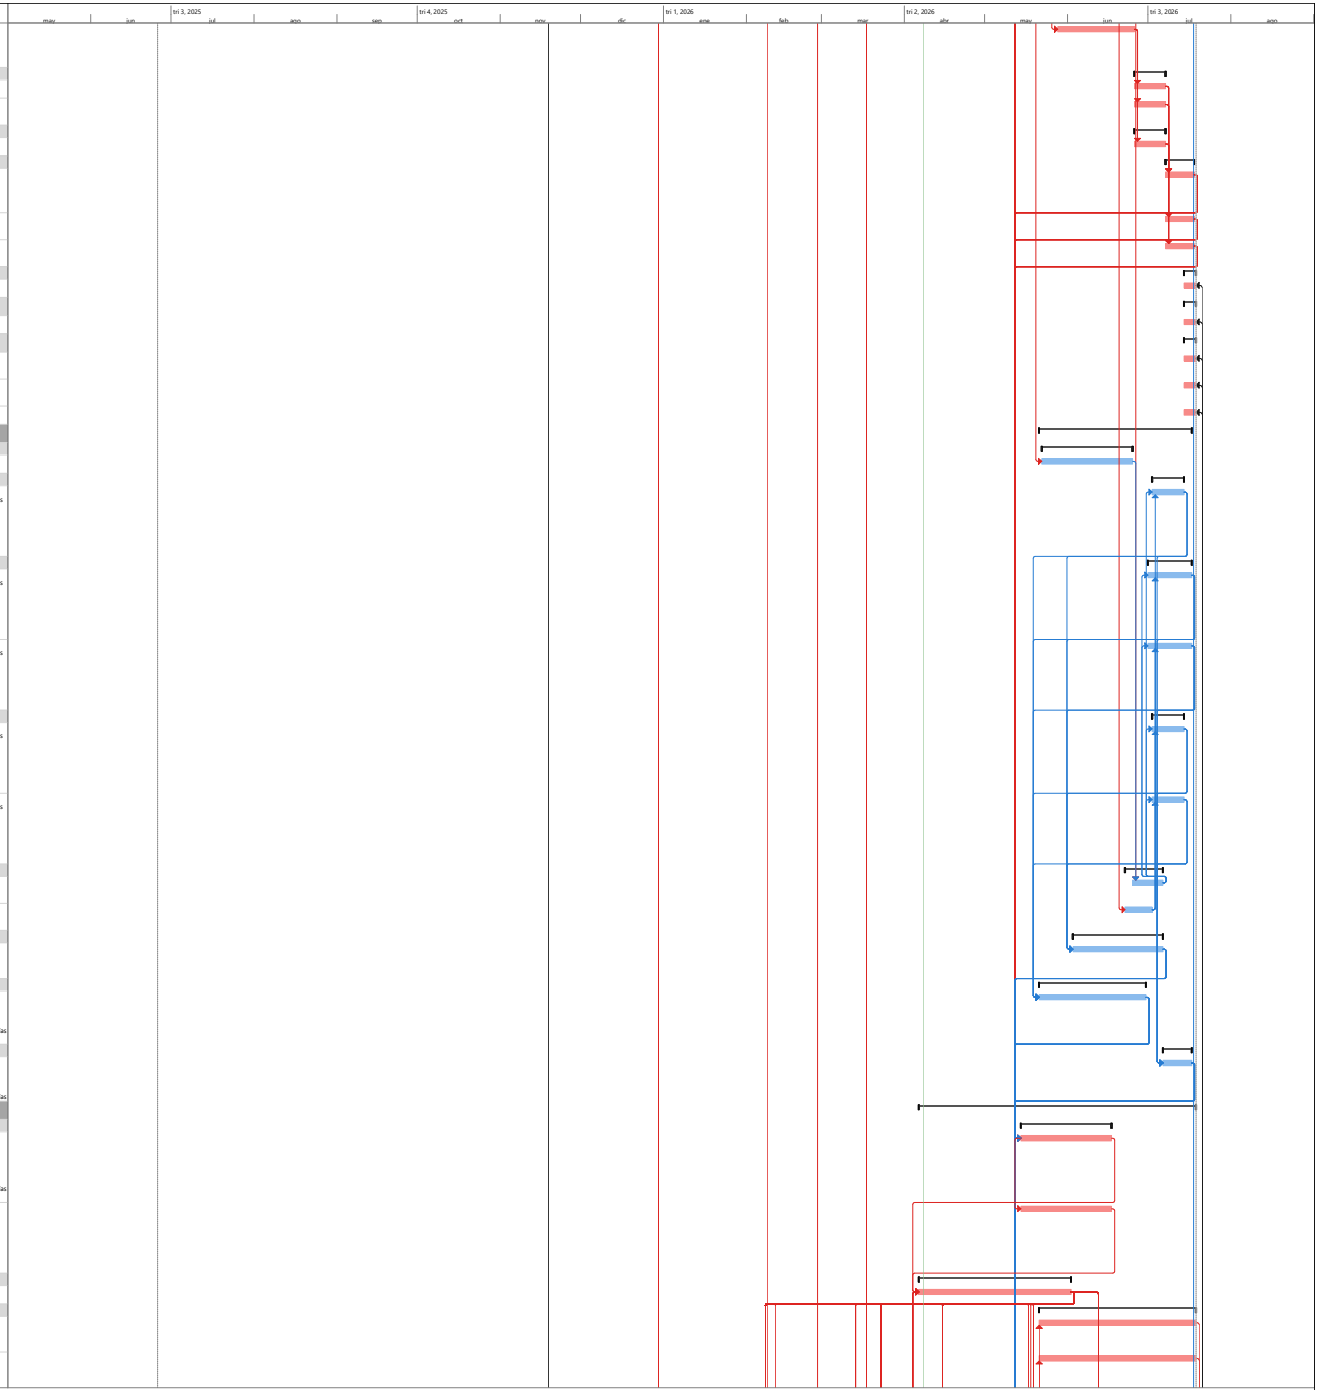


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
97		**05.12**	**ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIAS 0**			**$ 61.685.486,32**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
98		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	488,00	$ 39.505.420,92	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58
99		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	488,00	$ 5.027.226,72	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58
100		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	488,00	$ 14.485.051,16	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58
101		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	488,00	$ 2.667.787,52	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58
102		**05.13**	**ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MAMPOSTERIAS 0**			**$ 19.315.607,16**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
103		05.13.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE ANCLAJES EPOXICO 1/2" - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	688,00	$ 19.315.607,16	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58 días;57FC-58 días;58FC-58 días;59FC-58
104		**05.14**	**AISLANTES Y RECUBRIMIENTOS 0**			**$ 6.314.837,42**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
105		05.14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO CON LAMINA DE ICOPOR 0	m	524,59	$ 6.314.837,42	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	83FC-58 días;40FC-58
106		**06**	**PAÑETES**			**$ 71.172.622,29**	**77 días**	**mar 7/04/26**	**mié 1/07/26**	
107		**06.01**	**PAÑETES INTERIORES**			**$ 30.408.224,64**	**60 días**	**mar 7/04/26**	**vie 12/06/26**	
108		06.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR LISO MUROS X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	220,46	$ 8.237.519,10	15 días	mar 7/04/26	jue 23/04/26	120FC-50 días;121FC-50 días;122FC-50 días;123FC-50 días;124FC-50 días;125FC-50 días;126FC-50
109		06.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR LISO MUROS X ML MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	34,97	$ 930.299,80	60 días	mar 7/04/26	vie 12/06/26	108CC
110		06.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	414,15	$ 20.332.791,58	60 días	mar 7/04/26	vie 12/06/26	108CC
111		06.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	26,07	$ 907.614,16	60 días	mar 7/04/26	vie 12/06/26	108CC
112		**06.02**	**PAÑETES EXTERIORES**			**$ 37.215.303,12**	**30 días**	**vie 29/05/26**	**mié 1/07/26**	
113		06.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE EXTERIOR LISO MUROS X M2	m2	458,06	$ 35.174.117,29	30 días	vie 29/05/26	mié 1/07/26	120FC-33 días;121FC-33
114		06.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE EXTERIOR LISO MUROS X ML	m	37,66	$ 2.041.185,83	30 días	vie 29/05/26	mié 1/07/26	113CC
115		**06.04**	**PAÑETE OTROS ELEMENTOS**			**$ 3.549.094,53**	**60 días**	**mar 7/04/26**	**vie 12/06/26**	
116		06.04.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	63,34	$ 3.109.692,18	60 días	mar 7/04/26	vie 12/06/26	111CC
117		06.04.03	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FOSO ASCENSOR X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	8,95	$ 439.402,35	60 días	mar 7/04/26	vie 12/06/26	111CC
118		**08**	**INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS 0**			**$ 203.269.709,48**	**143 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 18/07/26**	
119		**08.01**	**ACOMETIDA O RED DE LLENADO DE TANQUES 0**			**$ 3.069.669,12**	**100 días**	**mar 10/02/26**	**mar 2/06/26**	
120		08.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3/4"	m	26,04	$ 550.114,54	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
121		08.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	11,00	$ 103.083,26	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
122		08.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	11,00	$ 103.083,26	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
123		08.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4"	und	1,00	$ 1.228.091,24	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
124		08.01.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA 3/4" 0	und	5,00	$ 359.785,07	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
125		08.01.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO 3/4" 0	und	1,00	$ 326.347,54	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
126		08.01.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DRESSER 3/4" 0	und	2,00	$ 112.269,16	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
127		08.01.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 3/4" 0	und	1,00	$ 134.571,13	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
128		08.01.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3/4" 0	und	1,00	$ 82.018,00	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
129		08.01.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3/4" 0	und	4,00	$ 70.305,92	100 días	mar 10/02/26	mar 2/06/26	93FC-100 días
130		**08.02**	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 0**			**$ 31.171.613,31**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
131		08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 3" 0	m	2,44	$ 523.701,48	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
132		08.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 2.1/2" 0	m	3,37	$ 584.512,37	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
133		08.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 2" 0	m	5,04	$ 519.915,84	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
134		08.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" RDE 21 0	m	7,95	$ 383.963,99	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
135		08.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 3" PVC SCH 80	und	6,00	$ 906.121,73	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
136		08.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 2.1/2" PVC SCH 80	und	6,00	$ 787.258,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
137		08.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80. 2" PVC SCH 80	und	16,00	$ 1.634.198,28	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
138		08.02.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC - P 1" PVC - P	und	6,00	$ 253.323,69	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
139		08.02.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 2.1/2" 0	und	1,00	$ 944.378,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
140		08.02.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 2" 0	und	1,00	$ 840.470,53	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
141		08.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 3" PVC SCH 80	und	6,00	$ 906.121,73	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
142		08.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 3" PVC SCH 80	und	6,00	$ 906.121,73	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
143		08.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3" 0	und	2,00	$ 2.103.384,00	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
144		08.02.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	2,00	$ 3.810.858,36	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
145		08.02.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	5,00	$ 6.909.488,36	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
146		08.02.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	1,00	$ 310.186,65	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días

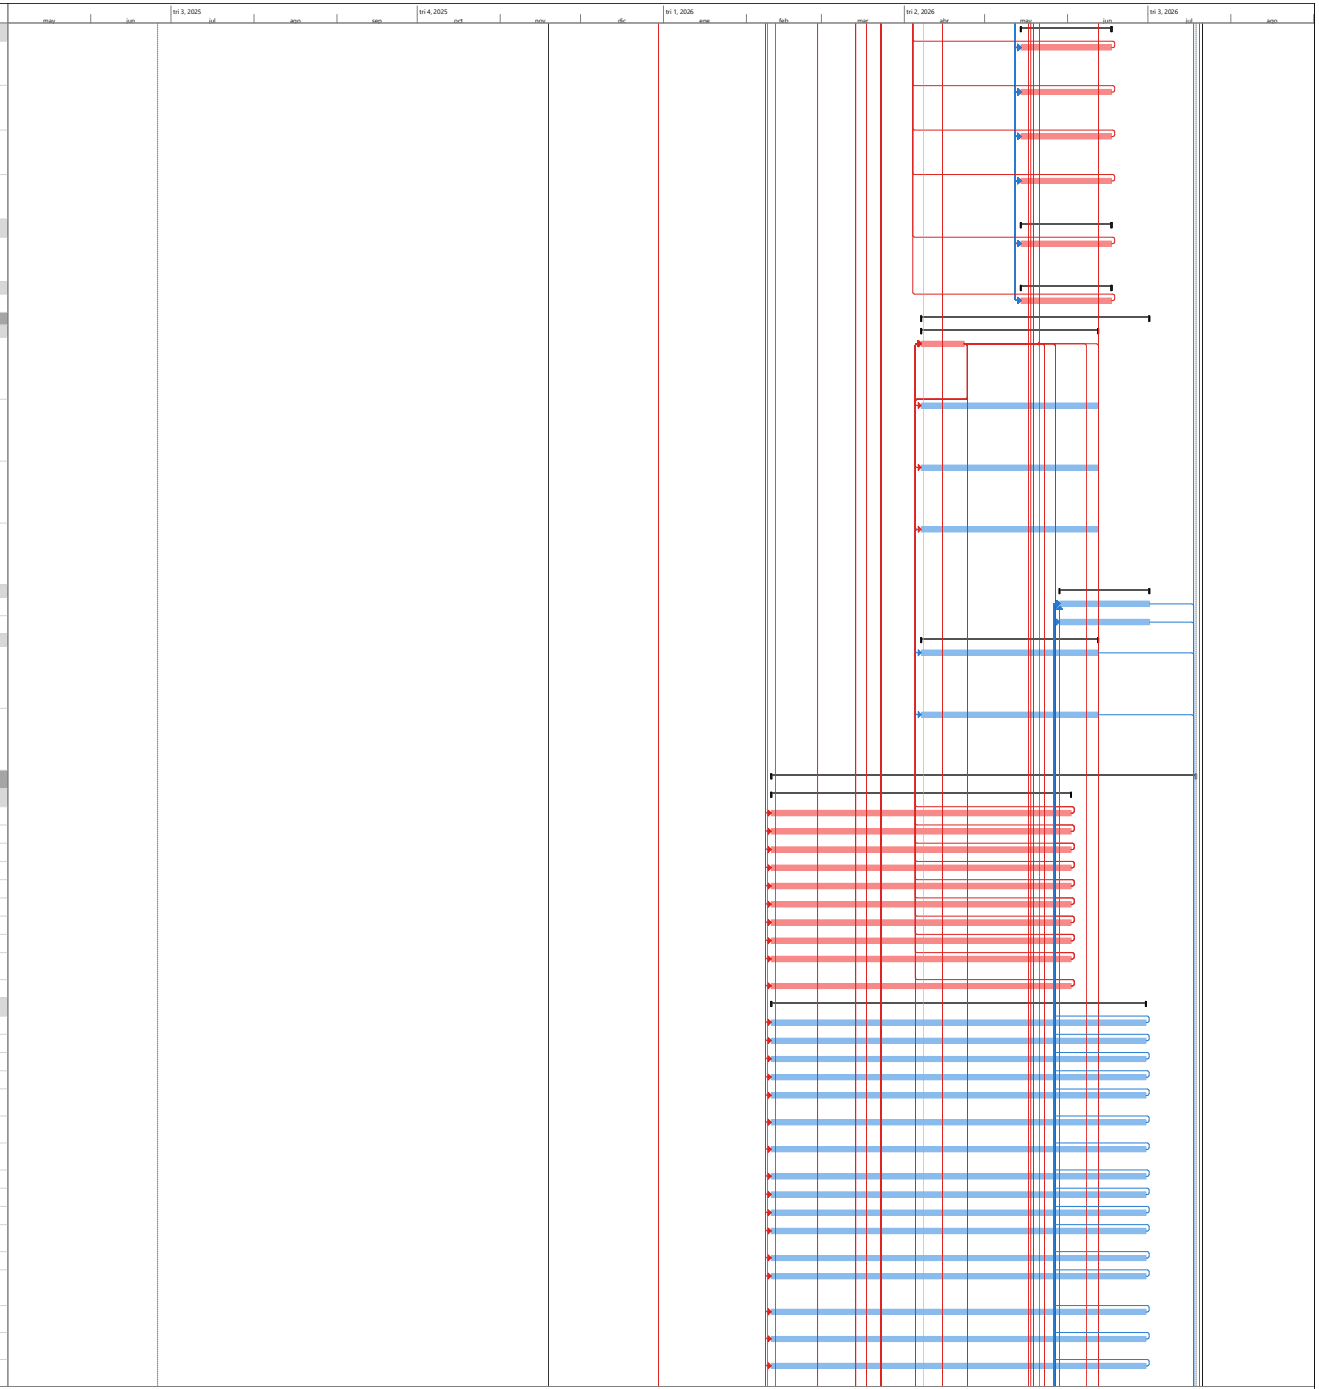

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
147		08.02.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	2,00	$ 610.610,89	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
148		08.02.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE BORRACHA 3" 0	und	2,00	$ 903.571,10	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
149		08.02.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2" 0	und	2,00	$ 701.592,14	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
150		08.02.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ALIVIO 2" 0	und	1,00	$ 2.094.275,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
151		08.02.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA CONCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓNSOLDADA - TIPO 2 3"x2"	und	2,00	$ 367.296,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
152		08.02.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓNSOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2"x2"	und	2,00	$ 367.296,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
153		08.02.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3" 0	und	2,00	$ 1.948.456,68	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
154		08.02.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2" 0	und	1,00	$ 515.532,14	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
155		08.02.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1" 0	und	1,00	$ 447.033,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
156		08.02.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2" 0	und	10,00	$ 479.614,76	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
157		08.02.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" 0	und	8,00	$ 287.411,10	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
158		08.02.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1" 0	und	4,00	$ 124.916,81	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
159		**08.05**	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 0**			**$ 17.607.814,47**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
160		08.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P RDE=21 2 1/2" 0	m	14,16	$ 1.482.692,26	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
161		08.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 2" 0	m	11,56	$ 622.866,86	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
162		08.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 1 1/2" 0	m	75,31	$ 2.782.277,13	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
163		08.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 1" 0	m	20,68	$ 361.432,40	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
164		08.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=11 3/4" 0	m	16,94	$ 342.392,15	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
165		08.05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=9 1/2" 0	m	113,71	$ 1.718.539,44	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
166		08.05.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2" 0	und	4,00	$ 290.165,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
167		08.05.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 2" 0	und	4,00	$ 134.022,91	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
168		08.05.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" 0	und	77,00	$ 1.671.769,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
169		08.05.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1" 0	und	13,00	$ 144.360,58	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
170		08.05.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 3/4" 0	und	9,00	$ 80.321,86	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
171		08.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1/2" 0	und	135,00	$ 913.306,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
172		08.05.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/2" 0	und	10,00	$ 2.354.447,90	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
173		08.05.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2" 0	und	15,00	$ 856.496,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
174		08.05.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" 0	und	1,00	$ 681.692,81	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
175		08.05.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1.1/2" 0	und	63,00	$ 1.344.380,68	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
176		08.05.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1" 0	und	24,00	$ 534.815,05	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
177		08.05.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3/4" 0	und	14,00	$ 180.310,13	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
178		08.05.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1/2" 0	und	93,00	$ 1.051.164,37	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
179		08.05.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 2.1/2" 0	und	1,00	$ 16.751,58	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
180		08.05.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 2" 0	und	2,00	$ 31.294,83	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
181		08.05.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 1/2" 0	und	1,00	$ 12.314,35	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
182		**08.08**	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES 0**			**$ 30.502.059,39**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
183		08.08.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	m	12,12	$ 1.134.916,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
184		08.08.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM 0	m	40,50	$ 1.537.263,18	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
185		08.08.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	und	3,00	$ 674.163,16	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
186		08.08.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 110MM 0	und	8,00	$ 816.491,72	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
187		08.08.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4" 0	m	83,39	$ 5.800.031,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
188		08.08.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3" 0	m	12,30	$ 612.798,87	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
189		08.08.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2" 0	m	37,03	$ 1.462.974,94	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
190		08.08.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 4"	m	25,47	$ 1.673.447,25	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
191		08.08.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 2" 0	m	23,82	$ 841.635,07	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
192		08.08.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 4" 0	und	104,00	$ 4.899.125,35	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
193		08.08.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 3" 0	und	22,00	$ 541.746,29	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
194		08.08.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 2" 0	und	116,00	$ 1.988.713,49	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
195		08.08.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 2" 0	und	14,00	$ 4.505.897,61	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
196		08.08.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4" 0	und	51,00	$ 2.323.631,79	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
197		08.08.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3" 0	und	10,00	$ 349.431,96	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
198		08.08.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" 0	und	31,00	$ 1.113.718,01	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
199		08.08.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 4" 0	und	14,00	$ 226.072,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
200		**08.10**	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS 0**			**$ 22.508.923,38**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
201		08.10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	m	41,47	$ 3.883.250,45	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
202		08.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM 0	m	5,24	$ 198.895,29	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
203		08.10.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	und	8,00	$ 1.797.768,41	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
204		08.10.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DIAM= 4" 0	m	132,82	$ 9.238.040,66	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
205		08.10.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DIAM= 3" 0	m	10,54	$ 525.113,83	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
206		08.10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4" 0	und	76,00	$ 3.580.130,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
207		08.10.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3" 0	und	10,00	$ 246.248,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
208		08.10.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 4" 0	und	15,00	$ 836.285,53	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
209		08.10.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFÓN 4" 0	und	5,00	$ 272.205,09	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
210		08.10.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4" 0	und	35,00	$ 1.594.649,27	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
211		08.10.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3" 0	und	3,00	$ 104.829,59	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
212		08.10.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DIAM= 4" 0	und	13,00	$ 196.891,84	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
213		08.10.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DIAM= 3" 0	und	2,00	$ 34.615,04	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
214		**08.11**	**RED GENERAL DE DESAGUES DE AIRE ACONDICIONADO 0**			**$ 8.403.192,82**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
215		08.11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=11 DIAM= 3/4" 0	m	174,24	$ 4.249.820,88	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días

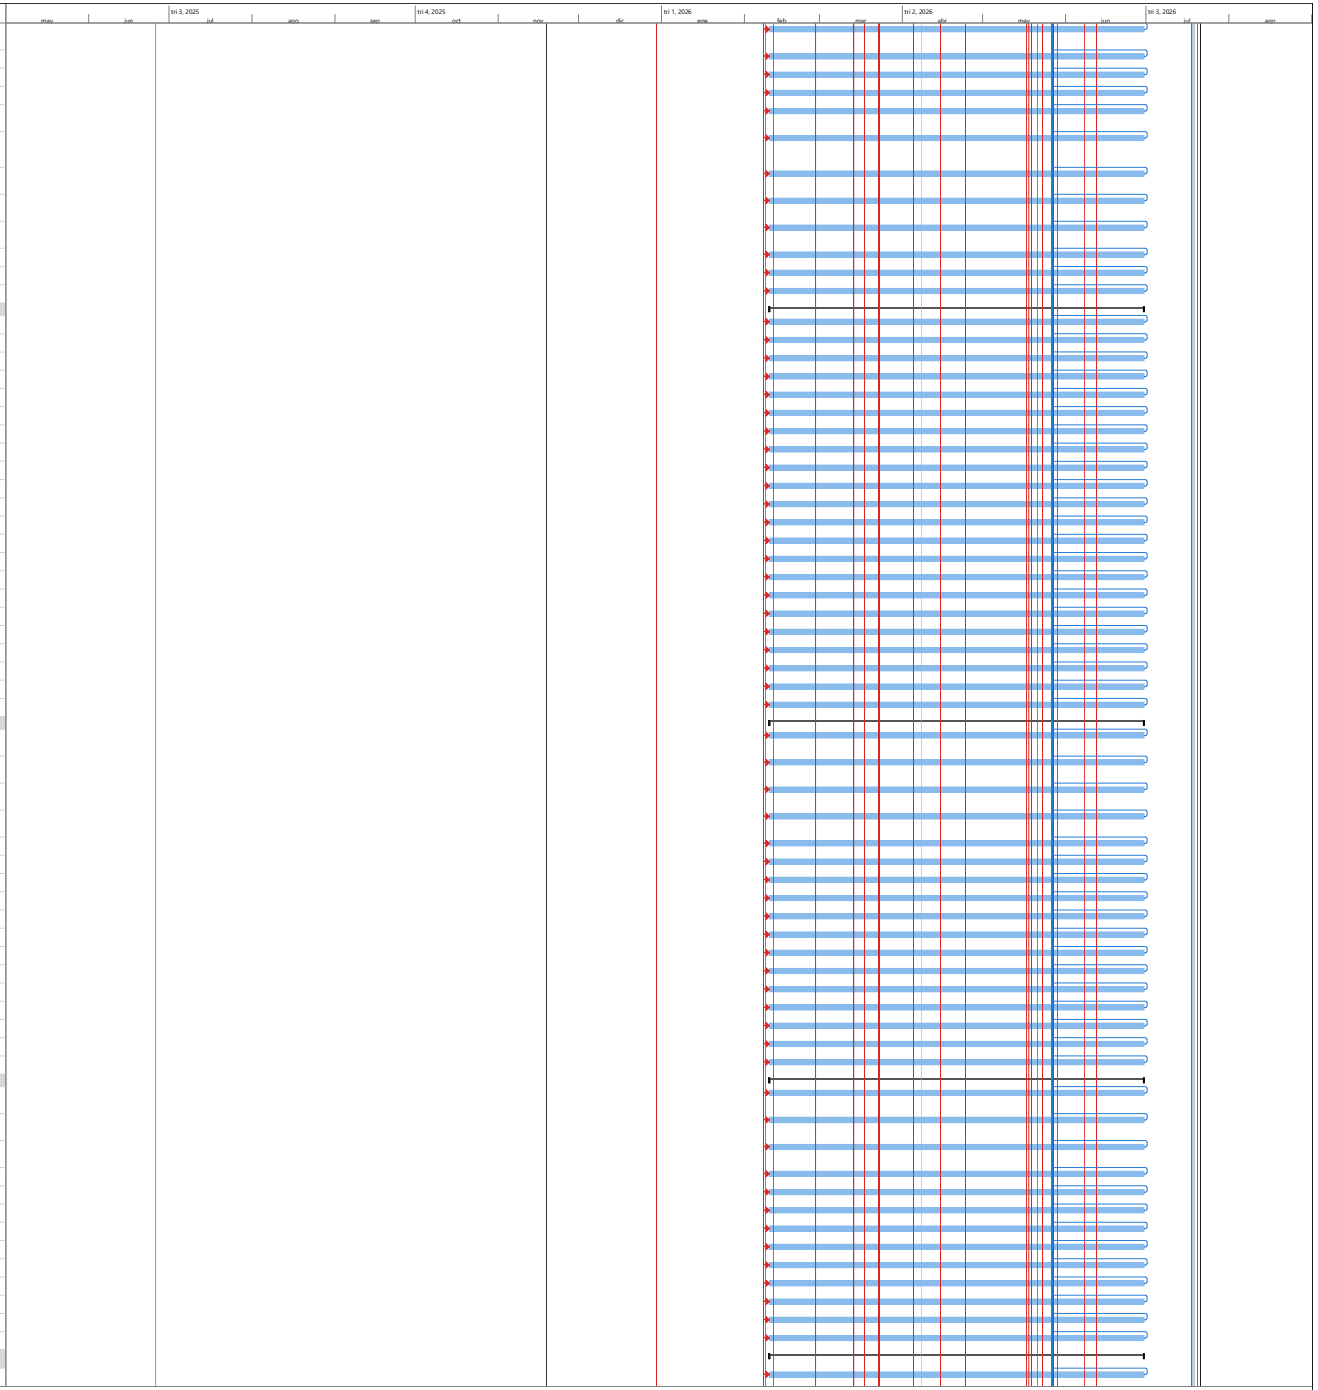

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
216		08.11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DIAM= 3/4" 0	und	198,00	$ 1.855.498,75	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
217		08.11.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3/4" 0	und	121,00	$ 2.126.754,10	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
218		08.11.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DIAM= 3/4" 0	und	10,00	$ 171.119,09	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
219		**08.12**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 0**			**$ 6.140.883,47**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
220		08.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAMANOS 1/2" 0	und	17,00	$ 2.130.564,62	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
221		08.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F DUCHA 1/2" 0	und	1,00	$ 125.327,33	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
222		08.12.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAPLATOS 1/2" 0	und	4,00	$ 501.309,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
223		08.12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F ORINAL 3/4" 0	und	3,00	$ 408.960,09	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
224		08.12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO DE TANQUE 1/2" 0	und	4,00	$ 503.481,61	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
225		08.12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO 1.1/2" 0	und	10,00	$ 1.841.888,49	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
226		08.12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LLAVE MANGUERA 1/2" 0	und	2,00	$ 251.740,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
227		08.12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F POCETA DE ASEO 1/2" 0	und	3,00	$ 377.611,21	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
228		**08.15**	**SALIDAS SANITARIAS 0**			**$ 10.884.463,79**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
229		08.15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIO 4" 0	und	10,00	$ 2.628.943,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
230		08.15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIO TANQUE 4" 0	und	4,00	$ 1.051.577,47	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
231		08.15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAVAMANOS 2" 0	und	11,00	$ 1.650.634,56	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
232		08.15.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DUCHA 2" 0	und	1,00	$ 150.057,69	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
233		08.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAVAPLATOS 2" 0	und	4,00	$ 600.230,75	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
234		08.15.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA POCETA ASEO 2" 0	und	3,00	$ 450.173,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
235		08.15.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ORINAL 2" 0	und	3,00	$ 450.173,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
236		08.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SIFON 2" 0	und	19,00	$ 2.851.096,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
237		08.15.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SIFON 4" 0	und	4,00	$ 1.051.577,47	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
238		**08.16**	**RED DE DECANGA POZO EYECTOR RED DE AGUAS RESIDUALES 0**			**$ 3.081.268,68**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
239		08.16.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 DIAM=1-1/2" 0	m	30,65	$ 1.132.343,57	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
240		08.16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P DIAM=1-1/2" 0	und	5,00	$ 108.556,45	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
241		08.16.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DIAM=1-1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT. 0	und	2,00	$ 618.581,94	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
242		08.16.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA SELLONITRILO DIAM=1-1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT. 0	und	2,00	$ 979.660,35	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
243		08.16.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN UNIVERSAL DIAM=1-1/2" PVC ROSCA NPT. 0	und	2,00	$ 177.865,02	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
244		08.16.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DIAM= 1-1/2" 0	und	3,00	$ 64.261,35	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
245		**08.18**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 0**			**$ 50.846.016,97**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
246		08.18.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C900 4" 0	m	24,41	$ 6.682.913,16	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
247		08.18.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 4" 0	m	7,25	$ 2.558.208,88	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
248		08.18.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 1" 0	m	5,54	$ 398.413,71	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
249		08.18.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC C900 4" 0	m	4,00	$ 4.646.748,82	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
250		08.18.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4" 0	und	5,00	$ 1.028.702,82	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
251		08.18.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2" 0	und	2,00	$ 122.399,63	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
252		08.18.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1" 0	und	2,00	$ 55.061,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
253		08.18.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X TUBO PVC 4" 0	und	5,00	$ 5.919.604,88	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
254		08.18.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD TUBO PVC X ACC PVC4" 0	und	10,00	$ 11.758.739,89	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
255		08.18.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING 4" 0	und	9,00	$ 570.291,02	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
256		08.18.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING 2 1/2" 0	und	5,00	$ 259.966,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
257		08.18.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1" 0	und	1,00	$ 639.911,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
258		08.18.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE 1" 0	und	1,00	$ 123.188,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
259		08.18.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO 0	und	1,00	$ 3.265.139,41	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
260		08.18.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA PARA BOMBEROS 2.1/2" 0	und	2,00	$ 3.038.890,81	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
261		08.18.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TUBERIA 0	m	12,79	$ 280.995,75	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
262		08.18.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LB 0	und	13,00	$ 1.620.304,90	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
263		08.18.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB 0	und	2,00	$ 1.051.737,04	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
264		08.18.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR K DE 10 LB 0	und	3,00	$ 1.388.817,33	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
265		08.18.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICIÓN PVC C900 A ACERO 4" 0	und	2,00	$ 2.345.689,25	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
266		08.18.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VIAS 0	und	2,00	$ 2.449.300,15	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
267		08.18.150	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM 4" 0	und	2,00	$ 640.992,02	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
268		**08.22**	**PRUEBAS DEL SISTEMA 0**			**$ 19.053.804,08**	**10 días**	**mié 8/07/26**	**sáb 18/07/26**	
269		08.22.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES DE PRESIÓN 0	und	18,00	$ 12.132.411,90	10 días	mié 8/07/26	sáb 18/07/26	678FF
270		08.22.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES A GRAVEDAD 0	und	15,00	$ 4.071.822,38	10 días	mié 8/07/26	sáb 18/07/26	678FF
271		08.22.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA PARA LAS REDES RCI 0	und	1,00	$ 159.630,94	10 días	mié 8/07/26	sáb 18/07/26	678FF
272		08.22.06	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES 0	und	1,00	$ 1.613.347,92	10 días	mié 8/07/26	sáb 18/07/26	678FF
273		08.22.07	SUMINISTRO Y EJECUCION DE DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0	gb	1,00	$ 1.076.590,94	10 días	mié 8/07/26	sáb 18/07/26	678FF
274		**09**	**INSTALACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV 0**			**$ 988.608.086,22**	**148 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 18/07/26**	
275		**09.01**	**DE TUBERIAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT 0**			**$ 16.658.341,40**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
276		09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3" 0	m	30,00	$ 1.754.031,83	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
277		09.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 2" 0	m	30,00	$ 1.592.886,21	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
278		09.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1.1/2" 0	m	120,00	$ 5.738.081,20	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
279		09.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1" 0	m	30,00	$ 989.304,38	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
280		09.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0	m	200,00	$ 6.584.037,78	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
281		**09.02**	**DE TUBERIAS ELÉCTRICAS EMT 0**			**$ 35.326.975,03**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
282		09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3" 0	m	60,00	$ 8.803.554,21	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
283		09.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 2" 0	m	5,00	$ 420.301,54	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
284		09.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 1.1/2" 0	m	30,00	$ 2.217.508,87	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días

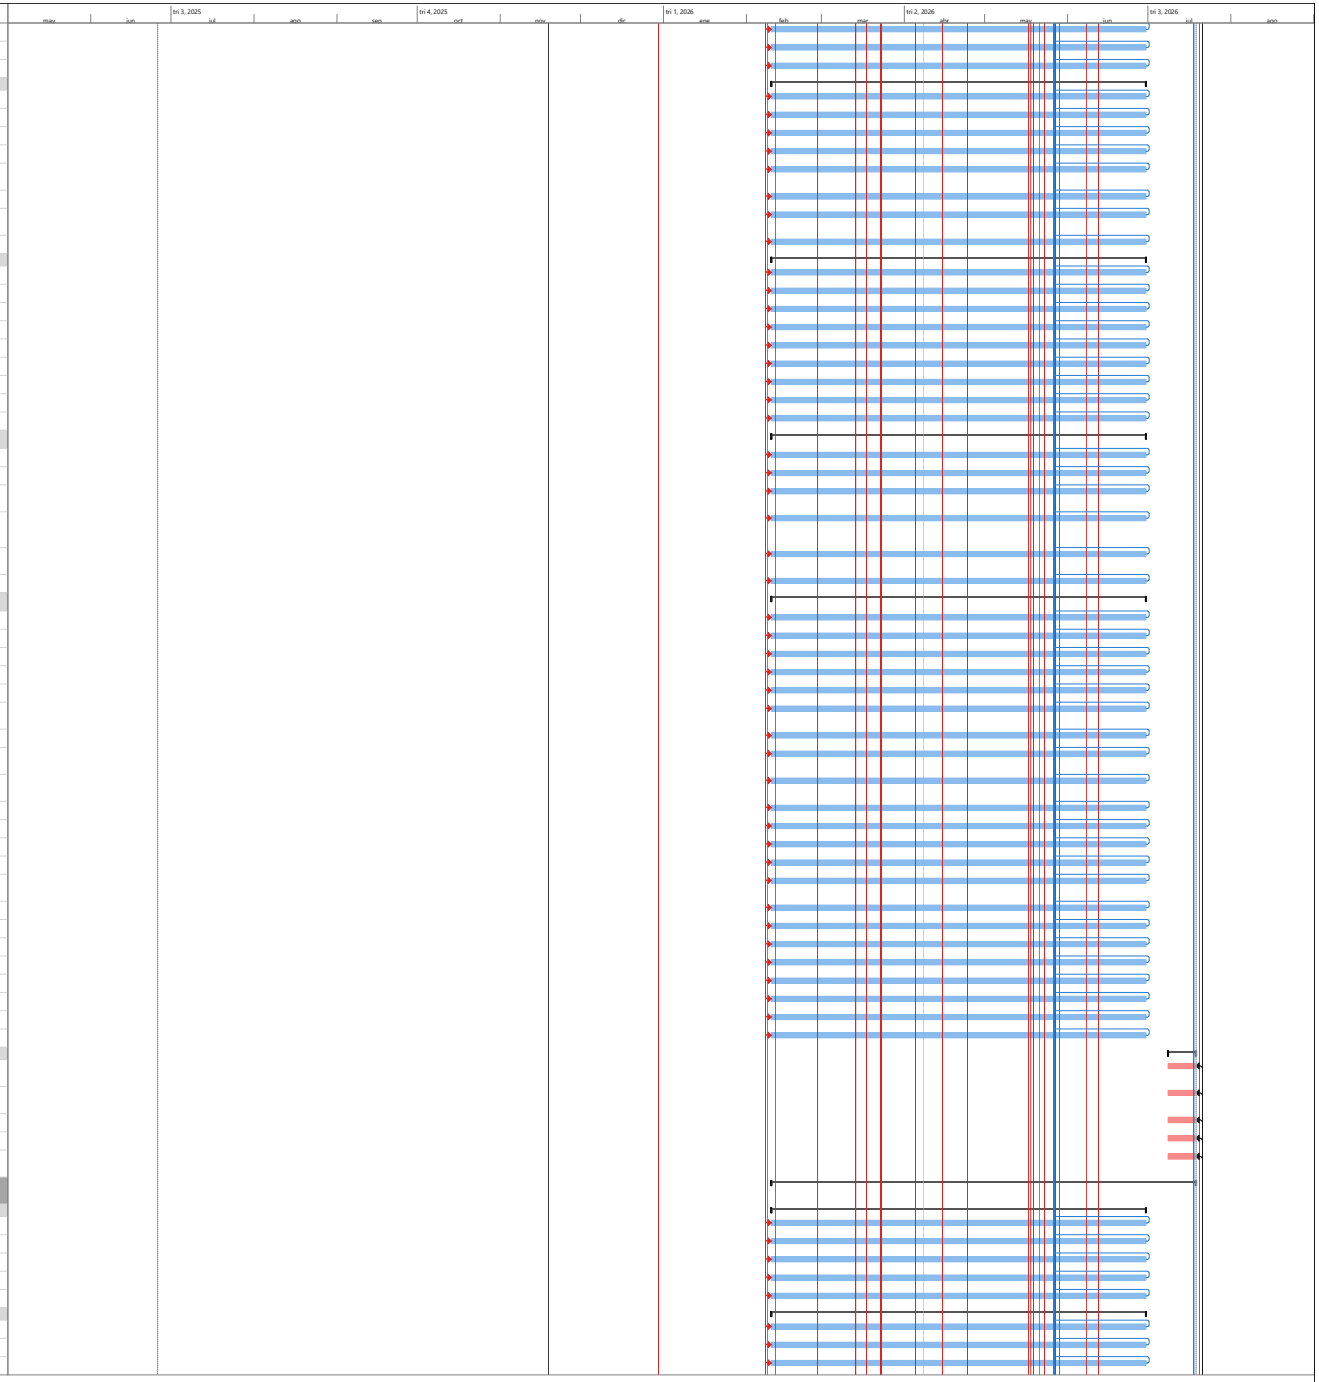

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
285		09.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 1" 0	m	30,00	$ 1.701.063,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
286		09.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0	m	750,00	$ 22.184.547,38	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
287		**09.03**	**DE TUBERIAS ELÉCTRICAS IMC 0**			**$ 11.211.678,71**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
288		09.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC Diam= 4" 0	m	20,00	$ 6.292.580,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
289		09.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC Diam= 3" 0	m	20,00	$ 4.919.098,04	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
290		**09.04**	**DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS 0**			**$ 55.436.602,05**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
291		09.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm 0	m	110,00	$ 12.539.296,22	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
292		09.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm 0	m	110,00	$ 29.763.204,43	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
293		09.04.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE POTENCIA PARA CANALETA DE 100X50 mm 0	und	200,00	$ 7.296.723,00	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
294		09.04.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL DE DATOS PARA CANALETA DE 100X50 mm 0	und	160,00	$ 5.837.378,40	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
295		**09.05**	**DE CAJAS ELECTRICAS 0**			**$ 15.244.782,12**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
296		09.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALCIA 60x60 CM 0	und	2,00	$ 620.077,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
297		09.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALCIA 30X30 CM 0	und	5,00	$ 484.048,13	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
298		09.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT 4X4 0	und	95,00	$ 4.282.976,93	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
299		09.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT 4X2 0	und	70,00	$ 4.953.303,84	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
300		09.05.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 5800 0	und	150,00	$ 955.909,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
301		09.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 0	und	200,00	$ 1.655.210,78	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
302		09.05.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL 0	und	250,00	$ 2.293.255,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
303		**09.06**	**DE CABLES ELECTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS 0**			**$ 276.347.599,81**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
304		09.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 0	m	5.200,00	$ 27.349.713,56	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
305		09.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 10 0	m	500,00	$ 4.096.202,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
306		09.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 6 0	m	80,00	$ 1.604.815,78	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
307		09.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 0	m	250,00	$ 8.200.126,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
308		09.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 0	m	90,00	$ 4.239.048,60	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
309		09.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 1/0 0	m	45,00	$ 3.813.753,89	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
310		09.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 250 0	m	640,00	$ 103.717.139,26	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
311		09.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 12 0	m	200,00	$ 914.728,52	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
312		09.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 10 0	m	180,00	$ 951.816,98	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
313		09.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 4 0	m	220,00	$ 6.016.257,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
314		09.06.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 1/0 0	m	80,00	$ 5.741.530,09	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
315		09.06.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0	m	25,00	$ 2.333.889,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
316		09.06.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CATEGORIA 6A FUTP DE 500 MHZ 0	m	9.500,00	$ 98.440.128,60	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
317		09.06.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS 0	und	5,00	$ 2.132.071,58	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
318		09.06.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 18AWG FPLR/2 CONDUCTORES, LISTADO UL	und	900,00	$ 6.796.376,28	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	93FC-100 días
319		**09.07**	**DE TABLEROS ELECTRICOS 0**			**$ 56.062.197,60**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
320		09.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 36 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR 0	und	4,00	$ 4.994.165,49	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
321		09.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 42 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR 0	und	2,00	$ 2.608.940,09	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
322		09.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	und	1,00	$ 14.900.255,83	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
323		09.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO T-BOMBAS 0	und	1,00	$ 9.465.888,18	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
324		09.07.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150KVA, INCLUYE COFRE METÁLICO EN LÁMINA COLD ROLED EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CONTACTORES, ENCLAVAMIENTO, BARRAIES, TARJETAS, RELÉS, TEMPORIZADORES, BREAKERS, SELECTORES, LÁMPARAS PILOTO Y DEMÁS ELEM	und	1,00	$ 24.092.948,01	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
325		**09.08**	**DE BREAKERS ELECTRICOS0**			**$ 9.648.947,14**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
326		09.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X20A0	und	120,00	$ 3.463.974,47	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
327		09.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X30A0	und	5,00	$ 268.987,84	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
328		09.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 2X20A0	und	5,00	$ 427.965,03	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
329		09.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 2X30A0	und	5,00	$ 534.945,03	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
330		09.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X50A 0	und	2,00	$ 748.149,61	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
331		09.08.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X60A 0	und	5,00	$ 1.948.006,27	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
332		09.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X70 0	und	1,00	$ 397.045,97	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
333		09.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X150A 0	und	1,00	$ 1.108.965,48	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
334		09.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X250A 0	und	1,00	$ 750.907,44	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
335		**09.09**	**DE TOMAS ELECTRICAS, INTERRUPTORES Y SENSORES 0**			**$ 43.355.680,30**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
336		09.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA MONOFASICA SYS NORMAL 0	und	230,00	$ 17.188.557,06	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
337		09.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA GFCI MONOFASICA 0	und	10,00	$ 1.220.882,03	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
338		09.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA REGULADA 0	und	120,00	$ 12.983.842,96	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
339		09.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA BIFASICA 0	und	5,00	$ 476.017,88	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
340		09.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 1 0	und	70,00	$ 8.010.000,19	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
341		09.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 0	und	40,00	$ 3.476.380,18	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
342		**09.10**	**DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 0**			**$ 27.474.735,90**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
343		09.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 PANEL REDONDO INCRUSTAR 18W	und	15,00	$ 1.189.829,13	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
344		09.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18W	und	10,00	$ 793.798,53	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
345		09.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 3 LUMINARIA LINEAL INCRUSTAR 120CM 40W	und	130,00	$ 10.341.798,65	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
346		09.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 4 LUMINARIA BALA MOON 8W	und	90,00	$ 7.170.014,83	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
347		09.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 5 LUMINARIA CON BATERIA DE EMERGENCIA	und	80,00	$ 6.382.509,24	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
348		09.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 6 REFLECTOR 50W	und	20,00	$ 1.596.785,52	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días

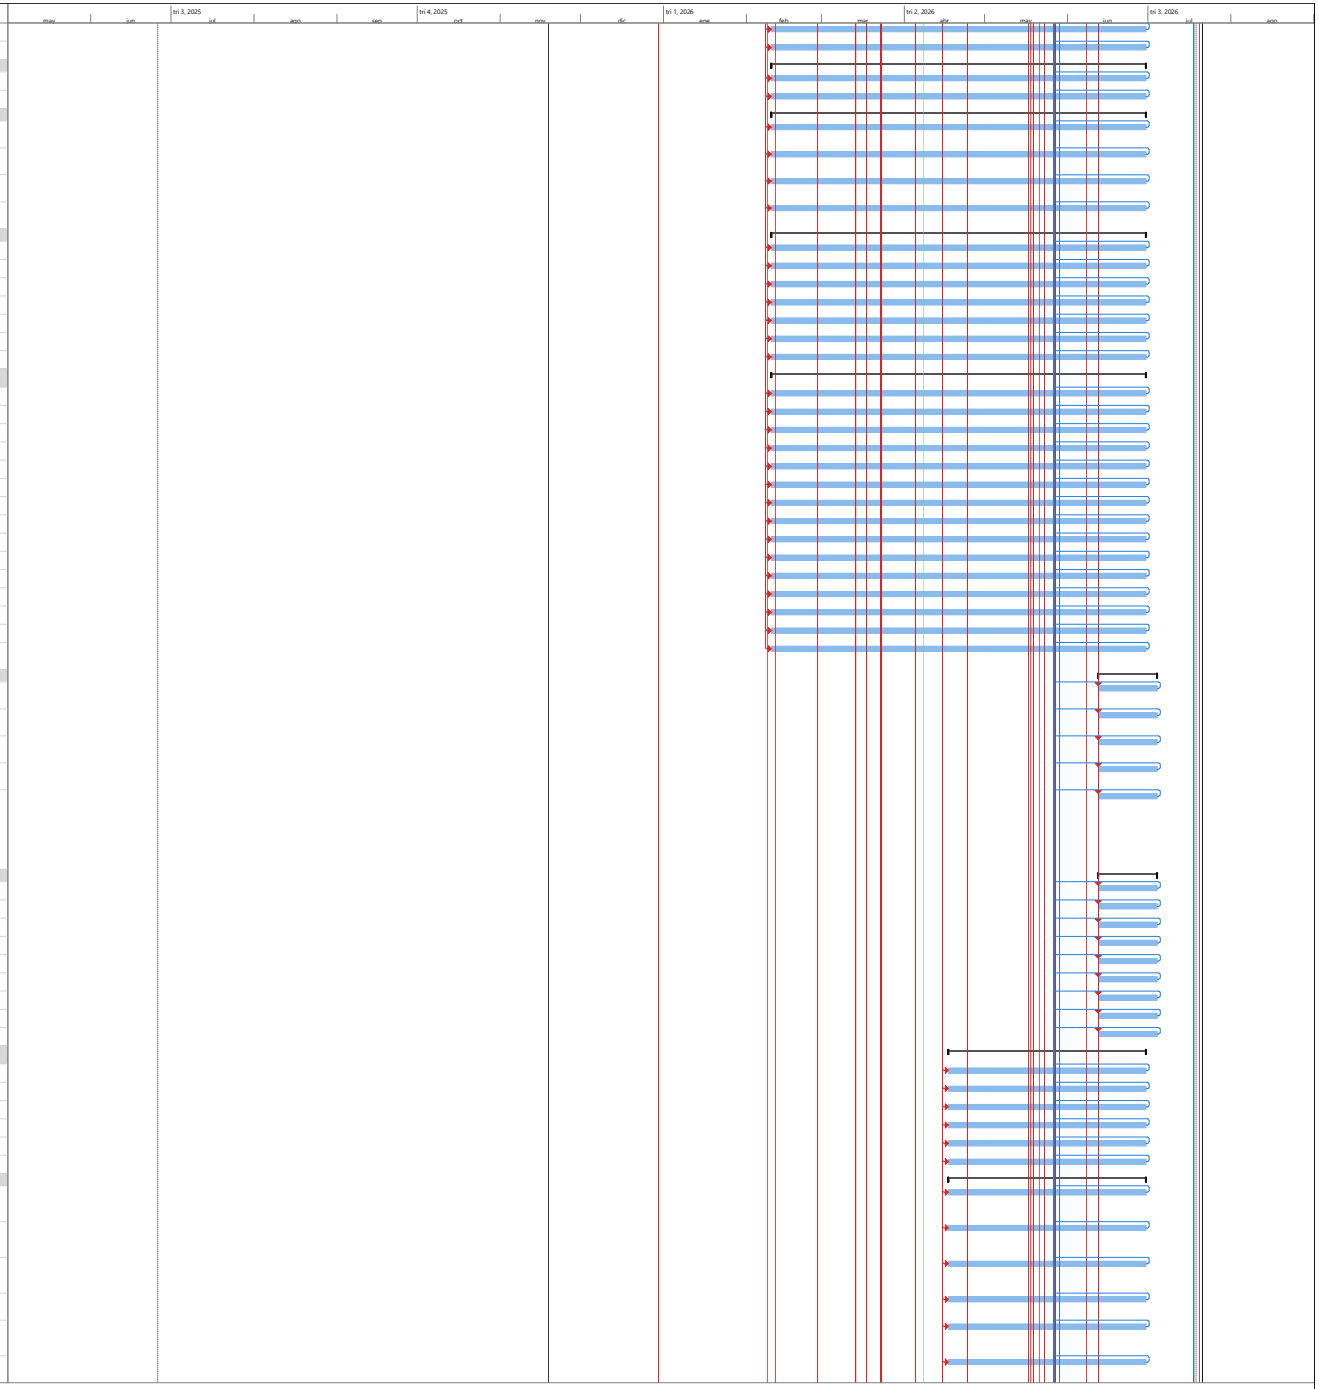

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
349		**09.11**	**DE VOZ Y DATOS 0**			**$ 267.285.334,92**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
350		09.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK TIPO 1 ABIERTO 42 UR	und	1,00	$ 6.833.400,39	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
351		09.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK TIPO 2 TIPO GABINETE 10 UR	und	5,00	$ 64.855.204,37	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
352		09.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT. 6A 0	und	190,00	$ 11.457.785,46	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
353		09.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE TIPO 1 SENCILLO	und	190,00	$ 7.686.447,80	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
354		09.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORE DE 2 MTS 0	und	380,00	$ 15.372.895,59	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
355		09.11.34	SWITCHES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CAT 6A CON 2 PUERTOS DE FIBRA DE 10 GBPS PARA UTILIZAR COMO UPLINKS A LOS SWITCHES DE CORE PUERTOS 10/100/1000 LAYER 2 (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA, PLANO DE VOZ Y DATOS) incluye todos los elementos necesarios par	und	5,00	$ 79.293.263,63	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
356		09.11.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE POE DE 24 PUERTOS CAT 6A 0	und	2,00	$ 21.005.088,08	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
357		09.11.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS 0	und	9,00	$ 6.054.426,95	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
358		09.11.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 10 METRO 0	m	5,00	$ 1.291.140,34	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
359		09.11.62	ACCESS POINT GESTIONADOS DE MANERA CENTRALIZADA	und	9,00	$ 16.032.799,90	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
360		09.11.63	Patch Core de fibra	und	8,00	$ 1.984.646,88	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
361		09.11.64	Bandeja de fibra	und	1,00	$ 608.297,04	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
362		09.11.66	Canaleta metalica 12x5 con división y tapa, incluye elementos de fijación	und	180,00	$ 24.133.621,77	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
363		09.11.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 1RU 0	und	9,00	$ 1.065.356,30	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
364		09.13.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR (MEDIDA SEMIDIRECTA) TIPO INTEMPERIE INCLUYE 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR	und	1,00	$ 7.924.689,02	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
365		09.13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS 0	und	1,00	$ 1.686.271,40	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	93FC-40 días
366		**09.14**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 0**			**$ 51.415.572,33**	**40 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 4/07/26**	
367		09.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCENDIOS	und	1,00	$ 15.537.724,32	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	93FC-10 días
368		09.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OPTICO 0	und	65,00	$ 21.178.880,07	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	93FC-10 días
369		09.14.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TERMICO 0	und	5,00	$ 1.333.698,12	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	93FC-10 días
370		09.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL 0	und	8,00	$ 7.863.545,83	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	93FC-10 días
371		09.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESIRENA0	und	8,00	$ 5.501.723,99	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	93FC-10 días
372		**09.15**	**CCTV0**			**$ 80.930.751,93**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
373		09.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DENVR0	und	1,00	$ 18.398.910,97	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
374		09.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA INTERIOR TIPO 1 MINI DOMO	und	30,00	$ 59.879.070,93	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
375		09.15.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE MONITOREO CCTV TIPO 1 INCLUYE UN PUESTO DE TRABAJO CON MONITOR	und	1,00	$ 2.652.750,03	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	93FC+10 días
376		**09.16**	**CONTROL DE ACCESOS 0**			**$ 9.869.109,98**	**125 días**	**sáb 14/02/26**	**vie 3/07/26**	
377		09.16.02	Tablero regulado tipo industrial de 30kva incluye bypass con flave selectora protecciones y distribucion para 26 circuitos	und	1,00	$ 9.869.109,98	125 días	sáb 14/02/26	vie 3/07/26	93FC-100 días
378		**09.18**	**CERTIFICACIONES 0**			**$ 32.339.797,00**	**5 días**	**mar 14/07/26**	**sáb 18/07/26**	
379		09.18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERTIFICACIÓN PUNTOS LOGICOS DE VOZ T DATOS 0	und	190,00	$ 6.601.797,00	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
380		09.18.04	CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 12.869.000,00	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
381		09.18.05	CERTIFICACION RETILAB	UND	1,00	$ 12.869.000,00	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26	678FF
382		**10**	**INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE ACONDICIONADO**			**$ 826.913.223,07**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
383		**10.06**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Cooling Only**			**$ 162.491.540,37**	**30 días**	**jue 23/04/26**	**mié 27/05/26**	
384		10.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >180 - <=200 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. 8410A, CAPACIDAD DE 192 MBH, 208/3/60. (incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 49.995.582,41	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
385		10.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >200 - <=220 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. 8410A, CAPACIDAD DE 216 MBH, 208/3/60. (incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 51.829.152,38	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
386		10.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >260 - <=280 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. 8410A, CAPACIDAD DE 264 MBH, 208/3/60. (incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 60.666.805,58	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
387		**10.14**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Unidades evaporadoras VRF tipo Cassette 4 vias**			**$ 174.841.390,75**	**30 días**	**jue 23/04/26**	**mié 27/05/26**	
388		10.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >7.000 - <= 9.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 9.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalacion	und	1,00	$ 4.334.705,16	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
389		10.14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >9.000 - <=12.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 12.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalacio	und	3,00	$ 13.814.738,95	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
390		10.14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >12.000 - <=15.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 15.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	2,00	$ 9.576.752,04	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
391		10.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >15.000 - <=18.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 18.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	7,00	$ 37.814.086,86	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
392		10.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >21.000 - <= 24.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 24.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalac	und	3,00	$ 17.533.770,56	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108

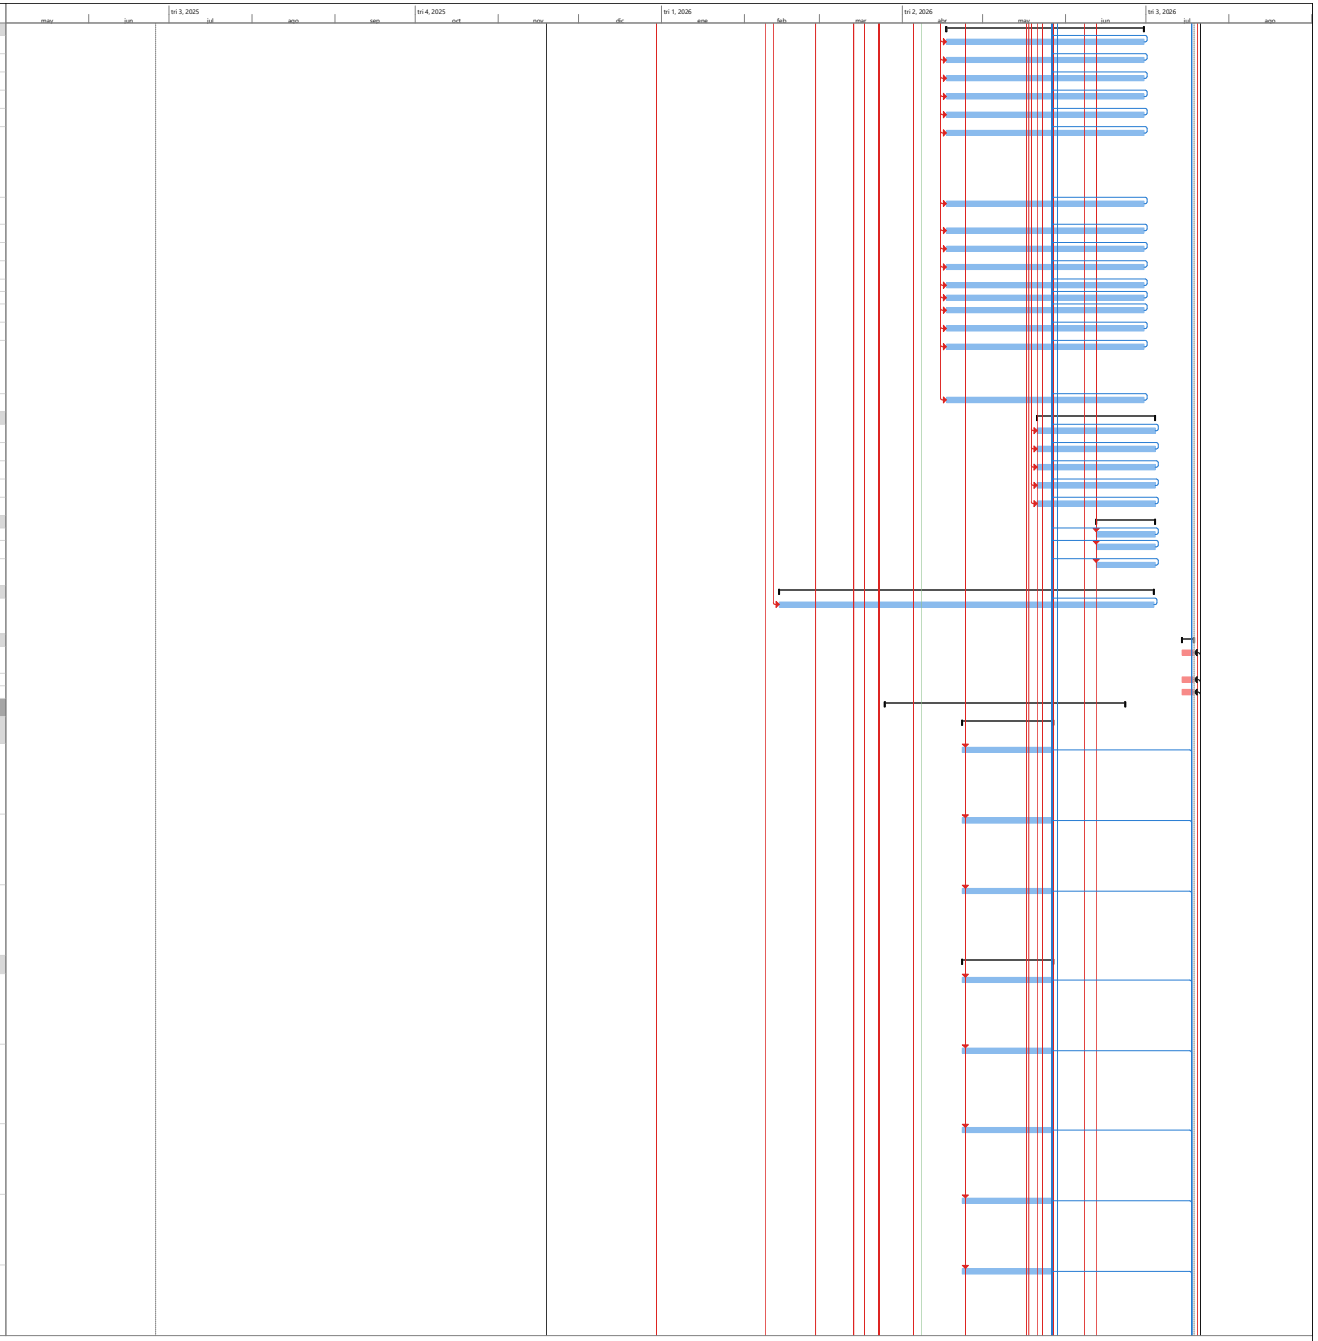


Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
393		10.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >24.000 - <=28.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 28.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	5,00	$ 31.292.652,90	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
394		10.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >30.000 - <=36.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 36.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	7,00	$ 44.891.890,15	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
395		10.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >42.000 - <=48.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V 48.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	2,00	$ 15.582.794,13	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
396		**10.21**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades minisplit independientes tipo FanCoil Desnudo**			**$ 23.546.205,97**	**30 días**	**jue 23/04/26**	**mié 27/05/26**	
397		10.21.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES FC >24.000 - <=36.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD SPLIT CON EVAPORADORA TIPO FANCOIL DESNUDO, 28.000 BTUH (Incluye: Unidad interior y exterior, tubería de cobre, soporteria antivibra	und	2,00	$ 23.546.205,97	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
398		**10.25**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo centrifugos.**			**$ 13.861.597,55**	**30 días**	**jue 23/04/26**	**mié 27/05/26**	
399		10.25.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO - TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HONGO DE DESCARGA VERTICAL - VE-01 (Incluye: Tranporte, bases antivibratorias, ubicacion en sitio, puesta en marcha y pruebas)	und	1,00	$ 13.861.597,55	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
400		**10.32**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo individual.**			**$ 4.987.220,09**	**30 días**	**jue 23/04/26**	**mié 27/05/26**	
401		10.32.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR individual - TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO AXIAL - VAX-01 (Incluye: Tranporte, instalacion, accesorios, pruebas)	und	3,00	$ 3.655.137,03	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
402		10.32.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR individual - TIPO 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO - CFP-02 (Incluye: Tranporte, instalacion, accesorios, pruebas)	und	1,00	$ 1.332.083,06	30 días	jue 23/04/26	mié 27/05/26	108
403		**10.36**	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos rectangulares**			**$ 69.541.862,53**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
404		10.36.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZA CALIBRE 24	m2	300,00	$ 56.655.772,50	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
405		10.36.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO, (PIRALI)	m2	80,00	$ 12.886.090,03	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
406		**10.37**	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos circulares**			**$ 46.701.137,72**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
407		10.37.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ducto circular (Lamina Galvanizaza Cal 16)	m2	170,00	$ 25.666.885,91	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
408		10.37.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ducto circular uniones (Lamina Galvanizaza Cal 16)	m2	130,00	$ 21.034.251,81	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
409		**10.40**	**ACCESORIOS SISTEMA DE DUCTOS, Dampers de balanceo**			**$ 2.313.184,73**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
410		10.40.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE BALANCEO	und	6,00	$ 2.313.184,73	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
411		**10.43**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 3 vías**			**$ 1.137.858,96**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
412		10.43.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER OB DS3V - TAMAÑO 1 15 X 15 PULGADAS	und	2,00	$ 1.137.858,96	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
413		**10.50**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de extracción aleta fija**			**$ 3.604.919,62**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
414		10.50.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - TAMAÑO 1 6 X 6 PULGADAS	und	17,00	$ 3.604.919,62	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
415		**10.52**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de retorno aleta fija**			**$ 1.254.287,38**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
416		10.52.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RET SIN DAMPER RRAF - TAMAÑO 1 16 X 16 PULGADAS	und	2,00	$ 1.254.287,38	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
417		**10.54**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas tipo louver**			**$ 7.019.783,41**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
418		10.54.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 1 6 X 6 PULGADAS	und	33,00	$ 7.019.783,41	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
419		**10.55**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Tubería de refrigerante Rígida**			**$ 81.418.642,04**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
420		10.55.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4"	m	81,00	$ 8.286.784,07	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
421		10.55.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8"	m	114,00	$ 10.426.731,48	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
422		10.55.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2"	m	99,00	$ 11.048.651,64	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
423		10.55.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8"	m	140,00	$ 18.452.241,39	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
424		10.55.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/4"	m	48,00	$ 7.040.063,66	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
425		10.55.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 7/8"	m	18,00	$ 3.248.084,12	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
426		10.55.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1 1/8"	m	92,00	$ 18.427.558,65	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
427		10.55.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1 3/8"	m	18,00	$ 4.488.527,03	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
428		**10.57**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Accesorios derivadores de cobre aislados (BRANCH).**			**$ 15.551.470,98**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
429		10.57.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE ACCESORIO DERIVADORES DE COBRE AISLADOS (BRANCH) 0	und	27,00	$ 15.551.470,98	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
430		**10.58**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Adicionales**			**$ 4.902.522,76**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
431		10.58.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Carricad de refrigerante adicional R410A	kg	40,00	$ 4.902.522,76	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC 61 días
432		**10.59**	**SISTEMA ELÉCTRICO, Tableros eléctricos**			**$ 10.587.251,66**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	

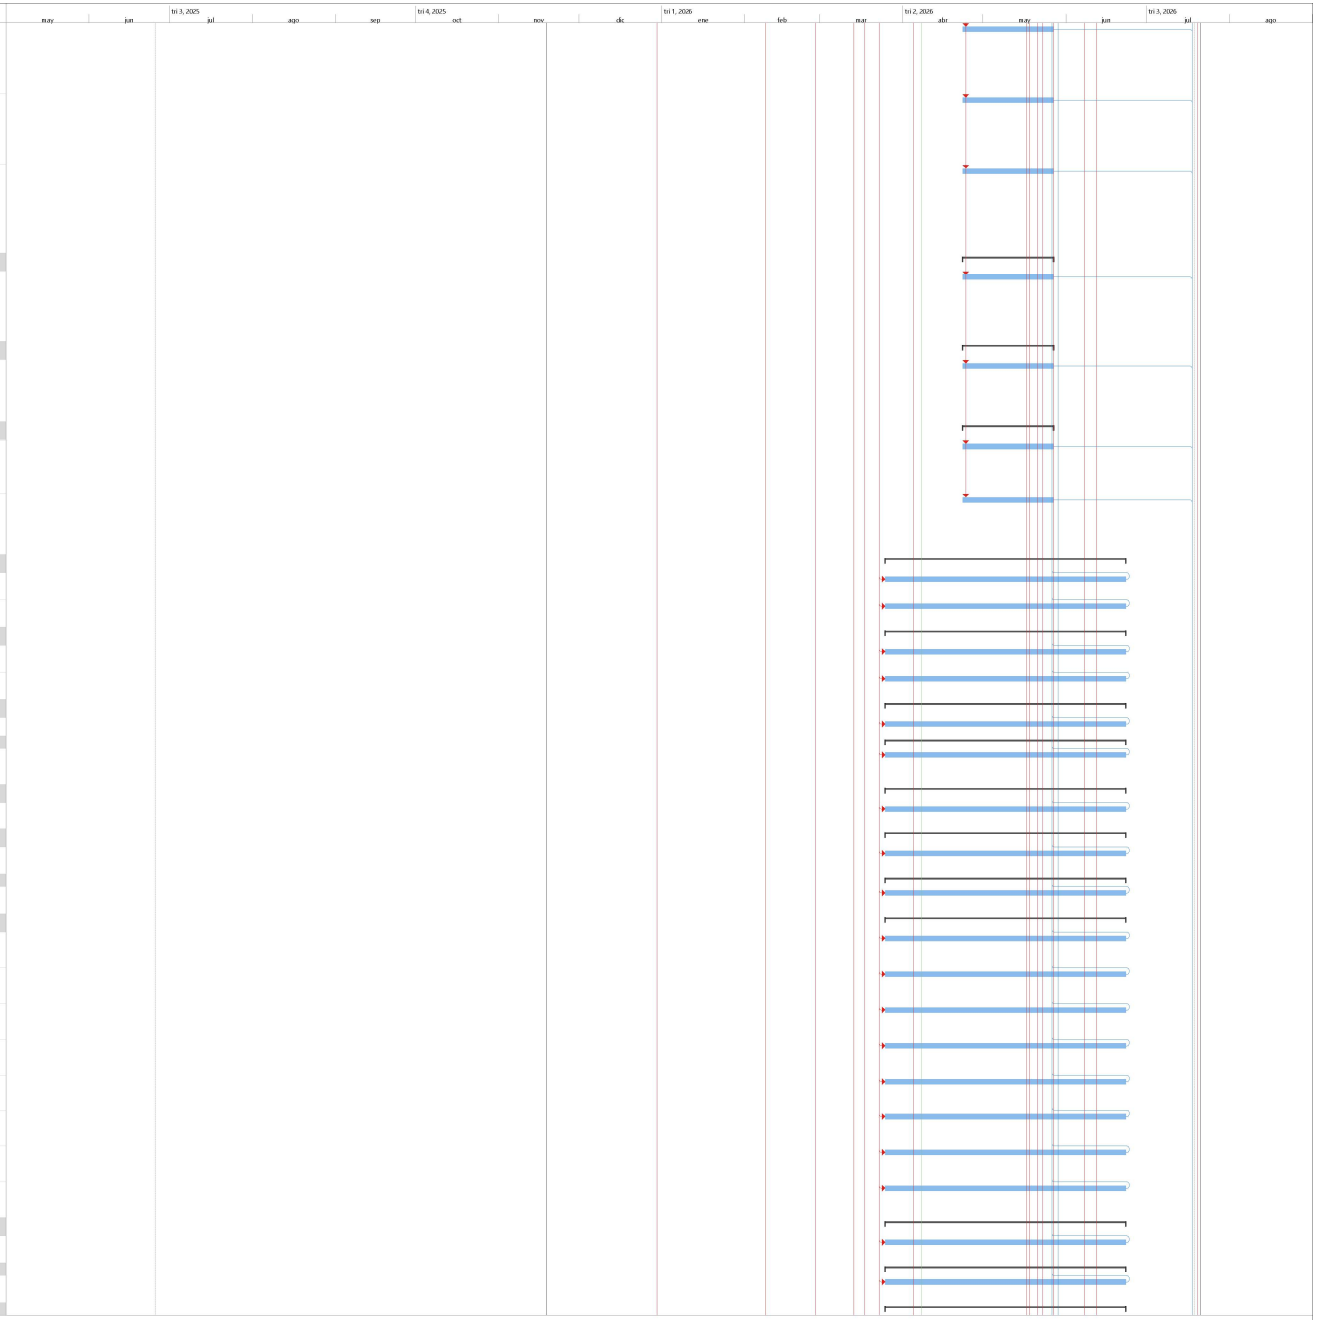


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
433		10.59.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS TAE-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TAE-01 (Incluye: Tablero para interiores con proteccion a la corrosion, soporteria, protecciones electricas, accesorios, instalacion y pruebas)	und	1,00	$ 6.059.331,33	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
434		10.59.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS TAE-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TAE-02 (Incluye: Tablero para interiores con proteccion a la corrosion, soporteria, protecciones electricas, accesorios, instalacion y pruebas)	und	1,00	$ 4.527.920,33	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
435		**10.61**	**SISTEMA DE CONTROL, tableros de control**			**$ 9.422.605,87**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
436		10.61.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Tablero de control TC-01	und	1,00	$ 9.422.605,87	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
437		**10.62**	**SISTEMA DE CONTROL, controladores**			**$ 42.080.478,22**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
438		10.62.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Control central VRF ++64 UI 0	und	1,00	$ 27.243.617,66	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
439		10.62.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Control Controlador de campo SUPERVISOR TIPO 1 0	und	1,00	$ 14.836.860,56	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
440		**10.63**	**SISTEMA DE CONTROL, Sensores - actuadores**			**$ 46.987.209,15**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
441		10.63.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Termostatos VRF independientes por área 0	und	30,00	$ 45.271.533,38	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
442		10.63.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Rele contactor	und	1,00	$ 940.584,91	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
443		10.63.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Dona de corriente	und	1,00	$ 775.090,86	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
444		**10.64**	**SISTEMA DE CONTROL, Otras actividades**			**$ 104.662.053,31**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
445		10.64.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Transformador tableros de control 0	und	1,00	$ 589.935,55	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
446		10.64.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control SENSORES (Incluye canalización y5Oporterla). (Incluye canalización y5Oporterla).	m	450,00	$ 32.019.873,66	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
447		10.64.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control COMUNICACION (Incluye canalización y5Oporterla). (Incluye canalización y5Oporterla).	m	750,00	$ 72.052.244,10	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	93FC-61 días
448		**11**	**SOBREPISOS Y ATINADOS INTERIORES**			**$ 60.209.767,63**	**72 días**	**lun 16/03/26**	**mié 3/06/26**	
449		**11.02**	**ALISTADOS DE PISOS**			**$ 52.072.853,28**	**20 días**	**lun 16/03/26**	**mar 7/04/26**	
450		11.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO LLANA MADERA MORTERO 1:3 E=0,04M	m2	910,38	$ 42.631.017,18	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	93FC-70 días
451		11.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL E=0,04M	m2	91,97	$ 6.411.591,69	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	93FC-70 días
452		11.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PASO ESCALERAS 0	m	51,40	$ 1.434.985,64	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	93FC-70 días
453		11.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PENDIENTADO E IMPERMEABILIZAOD PARA CUBIERTAS	m2	18,97	$ 1.595.258,77	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	93FC-70 días
454		**11.03**	**POYOS, BORDILLOS Y CARCAMOS FUNDIDOS**			**$ 8.136.914,35**	**14 días**	**mar 19/05/26**	**mié 3/06/26**	
455		11.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYO EN CONCRETO EN CONCRETO 2500 PSI PARA MUEBLES FIJOS H=0,15	m	40,78	$ 2.787.358,66	14 días	mar 19/05/26	mié 3/06/26	93FC-12 días
456		11.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 3000 PSI DIM= 0,10 X 0,15 M	m	77,72	$ 5.349.555,69	14 días	mar 19/05/26	mié 3/06/26	93FC-12 días
457		**12**	**ACABADOS DE PISOS**			**$ 337.593.712,74**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
458		**12.02**	**PISOS Y GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO**			**$ 18.198.211,52**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
459		12.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO TEMPO 0,60 X 0,60 M COLOR GRIS OSCURO, SIMILAR O EQUIVALENTE - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	91,97	$ 18.198.211,52	92 días	mar 7/04/26	sáb 18/07/26	108FC-15 días
460		**12.03**	**PISOS EN CONCRETO**			**$ 4.904.133,11**	**30 días**	**mié 20/05/26**	**mar 23/06/26**	
461		12.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO PARA ASEOS Y CUARTOS TÉCNICOS E=10CM	m2	27,58	$ 4.904.133,11	30 días	mié 20/05/26	mar 23/06/26	93FC-11 días
462		**12.05**	**PISOS EN GRANITO**			**$ 302.434.204,43**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
463		12.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA TERRAZO BH MAZZ 30X30-1- INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	905,88	$ 165.648.747,28	70 días	mar 7/04/26	mié 24/06/26	108FC-15 días
464		12.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO BH MAZZ - 30CM X 7CM, H=10CM, - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m	971,50	$ 82.657.366,56	70 días	mar 7/04/26	mié 24/06/26	108FC-15 días
465		12.05.19	Destronque, lijado, cristalizado y brillado de pisoGRANITO	m2	905,88	$ 54.128.190,59	92 días	mar 7/04/26	sáb 18/07/26	108FC-15 días
466		**12.13**	**CENEFAS**			**$ 3.617.298,11**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
467		12.13.41	CENEFA EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS OSCURO TIPO BOCAPUERTAS	m	56,01	$ 3.617.298,11	92 días	mar 7/04/26	sáb 18/07/26	108FC-15 días
468		**12.14**	**PIRLANES**			**$ 2.719.502,41**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
469		12.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN ALUMINIO PARA TAPAR JUNTAS DE TRANSICION PERFIL DE TRANSICIÓN O T - D= 4,5CM - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	44,88	$ 2.719.502,41	92 días	mar 7/04/26	sáb 18/07/26	108FC-15 días
470		**12.19**	**ACABADOS PARA ESCALERAS**			**$ 5.720.363,16**	**92 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 18/07/26**	
471		12.19.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA TERRAZO BH MAZZ 30X30-1 - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m	51,40	$ 5.720.363,16	92 días	mar 7/04/26	sáb 18/07/26	108FC-15 días
472		**13**	**CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS**			**$ 177.165.870,02**	**40 días**	**sáb 23/05/26**	**mar 7/07/26**	
473		**13.01**	**CUBIERTAS METALICAS**			**$ 7.959.706,69**	**30 días**	**sáb 23/05/26**	**jue 25/06/26**	
474		13.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26, PARA JUNTAS ENTRE TEJA TERMOACUSTICA Y ELEMENTOS DE CUBIERTA EXISTENTES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	93,09	$ 7.959.706,69	30 días	sáb 23/05/26	jue 25/06/26	108FC+27 días
475		**13.05**	**CUBIERTAS TERMOACUSTICAS**			**$ 105.378.476,51**	**30 días**	**sáb 23/05/26**	**jue 25/06/26**	
476		13.05.01	SUMINISTRO Y E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 3.8 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir	m2	289,52	$ 105.378.476,51	30 días	sáb 23/05/26	jue 25/06/26	108FC+27 días
477		**13.06**	**MARQUESINAS**			**$ 63.827.686,82**	**40 días**	**sáb 23/05/26**	**mar 7/07/26**	
478		13.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ARKOPAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	100,18	$ 63.827.686,82	40 días	sáb 23/05/26	mar 7/07/26	108FC+27 días
479		**14**	**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES**			**$ 14.818.052,93**	**35 días**	**lun 8/06/26**	**jue 16/07/26**	

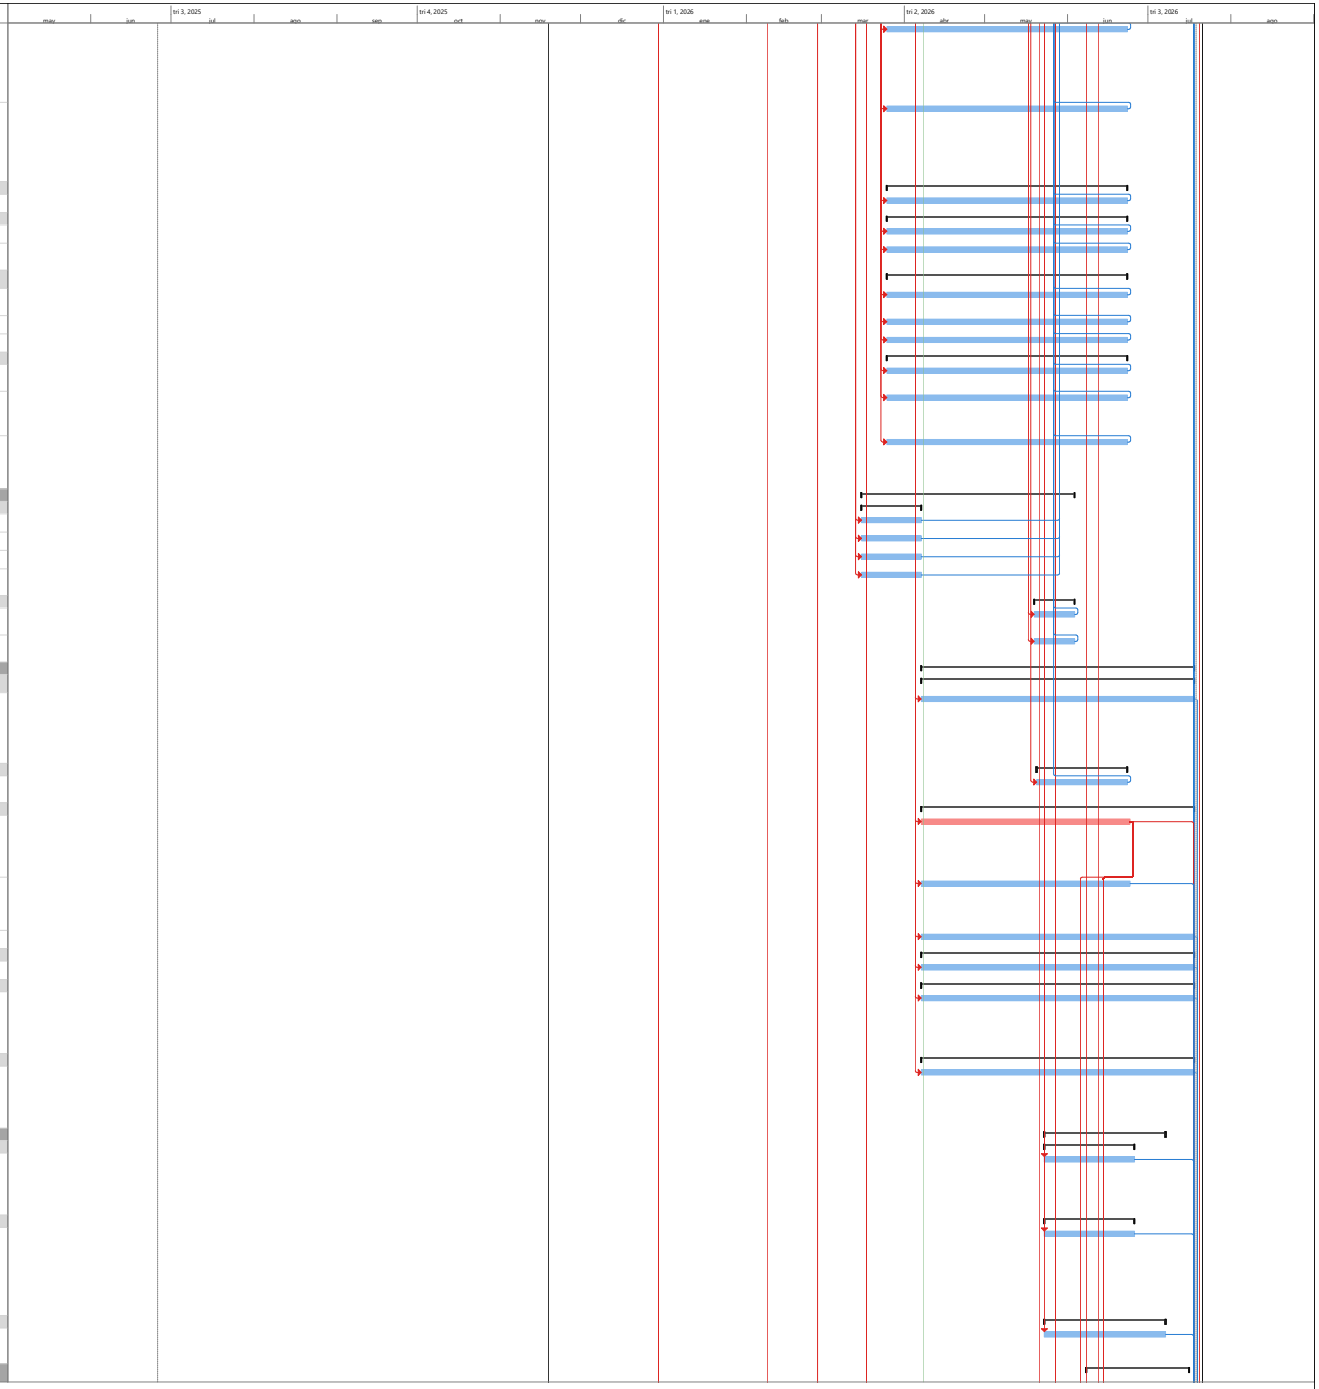


Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
480		**14.02**	**IMPERMEABILIZACIONES CON MEMBRANA**			**$ 14.818.052,93**	**35 días**	**lun 8/06/26**	**jue 16/07/26**	
481		14.02.01	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA Y VIGA CANAL	m2	131,91	$ 11.709.019,43	32 días	lun 8/06/26	lun 13/07/26	463FC-15 días
482		14.02.02	IMPERMEABILIZACION MEMBRANA EN PVC TANQUE	m2	13,58	$ 3.109.033,50	30 días	vie 12/06/26	jue 16/07/26	108FC+45 días
483		**15**	**METALISTERIA 0**			**$ 528.221.016,01**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
484		**15.01**	**PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 0**			**$ 66.021.954,01**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
485		15.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM (INCLUYE MARCO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	65,19	$ 66.021.954,01	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
486		**15.02**	**PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED 0**			**$ 48.636.568,61**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
487		15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CON PERSIANA INFERIOR (INCLUYE MARCO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	33,07	$ 27.960.335,76	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
488		15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA ENTAMBORADA CALIBRE 18 CON PERSIANA INFERIOR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	8,74	$ 6.925.359,38	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
489		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA ENTAMBORADA SENCILLA CON PERSIANA COMPLETA - (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	7,13	$ 6.910.077,87	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
490		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA INGRESO ZONA DE PARQUEADEROS - (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	6,21	$ 6.840.795,60	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
491		**15.06**	**VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 0**			**$ 330.171.063,75**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
492		15.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO FIJA EN VIDRIO CRUDO 3+3 (INCLUYEACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	39,63	$ 33.222.371,33	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
493		15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA EN VIDRIO CRUDO 3+3 (INCLUYEACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	263,98	$ 296.948.692,42	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
494		**15.10**	**BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS 0**			**$ 23.802.359,35**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
495		15.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	28,29	$ 23.802.359,35	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
496		**15.11**	**BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 0**			**$ 7.969.717,78**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
497		15.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	13,07	$ 7.969.717,78	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
498		**15.17**	**PERSIANAS EN ALUMINIO 0**			**$ 33.695.387,43**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
499		15.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO PARA VENTILACIÓN EN EL VACIO CENTRAL CON MARQUESINA (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	19,39	$ 21.601.330,20	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
500		15.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO PARA VENTILACIÓN EN EL VACIO CENTRAL CON MARQUESINA (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	ML	13,57	$ 12.094.057,23	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
501		**15.23**	**ACCESORIOS EN LAMINA 0**			**$ 17.923.965,08**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
502		15.23.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA ESCALERA TIPO GATO CON JAULA DE SEGURIDAD PARA INSPECCION DE CUBIERTAS - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.253.637,50	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
503		15.23.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES CERTIFICADOS EN CUBIERTA 0	und	16,00	$ 9.265.680,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
504		15.23.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO CON JAULA DE SEGURIDAD - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 7.081.774,67	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
505		15.23.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXOSTO PLANTA ELECTRICA 0	ml	1,00	$ 322.872,91	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
506		**16**	**CARPINTERIA EN MADERA 0**			**$ 123.165.274,06**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
507		**16.09**	**MUEBLES FIJOS 0**			**$ 51.202.289,24**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
508		16.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-1A - MUEBLE DE RECEPCIÓN SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	1,00	$ 14.202.498,65	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
509		16.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA COCINETA SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO DE800	und	3,00	$ 14.787.291,75	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
510		16.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-3A - MUEBLE PARA SALA AMIGA SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	1,00	$ 6.112.775,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
511		16.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-4A - VENTANILLA DE ATENCIÓN SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	7,00	$ 16.099.723,84	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
512		**16.10**	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES EN MADERA 0**			**$ 71.962.984,82**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
513		16.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MADERA TIPO PANEL WPC TIPO ARKOWOOD WALLPANEL EXT 3D. 220-24, 4 PASTILLAS, 24MM - 0,22MK2,90M COLOR TEKA CLARO CEPILLADO	m2	129,59	$ 71.962.984,82	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
514		**17**	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 0**			**$ 82.668.921,86**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
515		**17.01**	**ENCHAPESSOBRE MUROS 0**			**$ 82.668.921,86**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
516		17.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE BLANCO X M2 0,3X60,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	415,25	$ 79.794.401,80	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
517		17.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BLANCO X ML 0,30X0,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	21,37	$ 2.874.520,06	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
518		**18**	**CIELO RASOS 0**			**$ 134.652.982,87**	**30 días**	**mié 27/05/26**	**mar 30/06/26**	
519		**18.01**	**CIELO RASO EN YESO 0**			**$ 134.652.982,87**	**30 días**	**mié 27/05/26**	**mar 30/06/26**	
520		18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL MACLLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y T	m2	852,19	$ 101.291.863,97	30 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26	108FC+30 días

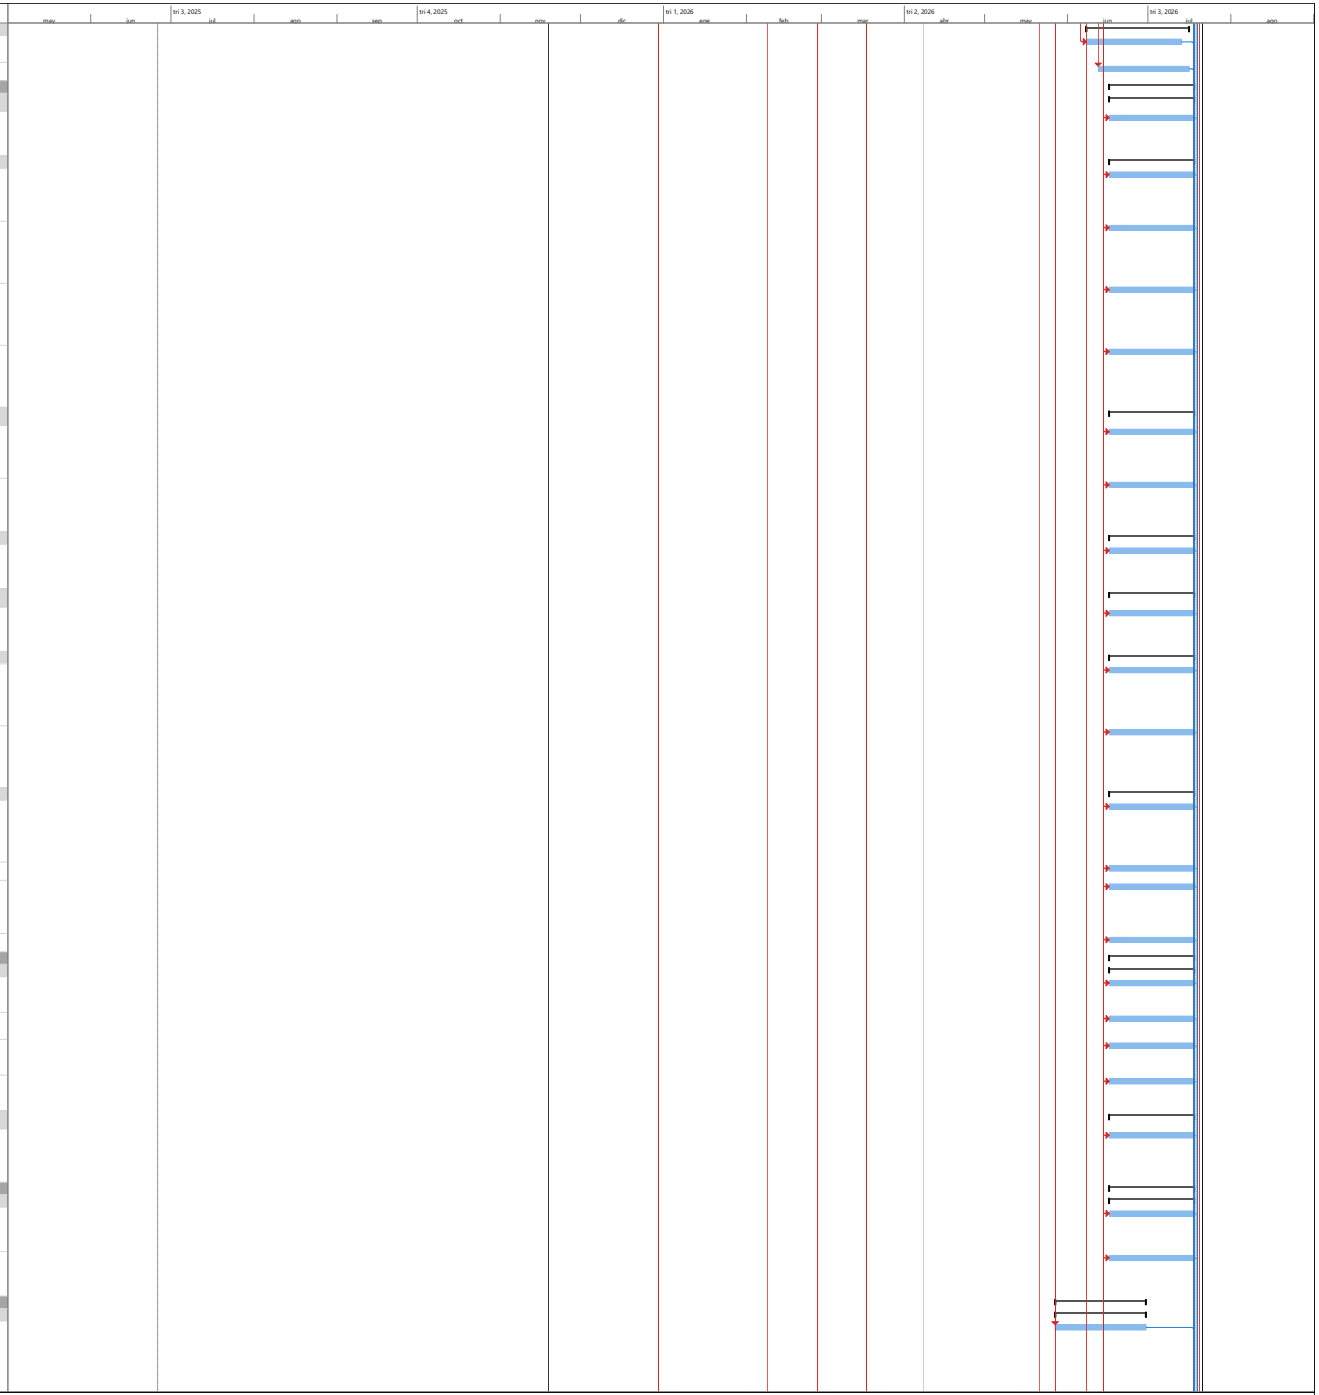


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
521		18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINERO EN DRYWALL (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	m	244,05	$ 18.855.069,08	30 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26	108FC+30 días
522		18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL R.H MACILLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS	m2	102,98	$ 14.506.049,82	30 días	mié 27/05/26	mar 30/06/26	108FC+30 días
523		**19**	**ILUMINACION 0**			**$ 100.920.589,74**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
524		**19.01**	**LAMPARAS DESOBREPONER 0**			**$ 1.643.268,35**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
525		19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18W	und	10,00	$ 1.643.268,35	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
526		**19.02**	**BALAS DE EMPOTRAR Y DE INCRUSTAR 0**			**$ 6.433.547,69**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
527		19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA INCRUSTAR 9W	und	90,00	$ 5.398.648,45	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
528		19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO INCRUSTAR 18W	und	15,00	$ 1.034.899,24	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
529		**19.04**	**LUMINARIAS LINEALES 0**			**$ 57.497.134,85**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
530		19.04.01	LUMINARIA LINEAL 120CM 40W	und	130,00	$ 57.497.134,85	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
531		**19.06**	**PROYECTORES Y REFLECTORES 0**			**$ 3.183.353,05**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
532		19.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 50W	und	20,00	$ 3.183.353,05	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
533		**19.10**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA 0**			**$ 32.163.285,80**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
534		19.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO APLIQUE DE TECHO CON BATERIA DE EMERGENCIA	und	70,00	$ 16.175.483,65	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
535		19.10.02	Suministro e instalacion de rotulo de emergencia incluye elementos de fijacion y todos sus elementos para su correcto funcionamiento	und	30,00	$ 6.470.147,13	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
536		19.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	und	50,00	$ 9.517.655,02	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
537		**20**	**DOTACION BAÑOS 0**			**$ 99.430.344,10**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
538		**20.01**	**SANITARIOS Y TAZAS 0**			**$ 29.598.950,94**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
539		20.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICÁ, ENTRADA POSTERIOR, CON ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	9,00	$ 15.398.147,14	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
540		20.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.553.903,44	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
541		20.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO	UND	13,00	$ 12.646.900,36	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
542		**20.02**	**LAVAMANOS 0**			**$ 27.540.963,63**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
543		20.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO AGUAJET PARA BAÑO ACCESIBLE	und	1,00	$ 905.608,26	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
544		20.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO GRANITO SILVER GRAY 20MM CON SALPICADERO INTEGRADO 0,25 M - DETALLE PLANO CAPITULO D-800 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	11,31	$ 26.635.355,37	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
545		**20.03**	**ORINALES 0**			**$ 4.698.630,19**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
546		20.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	3,00	$ 4.698.630,19	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
547		**20.05**	**COMBOS SANITARIOS 0**			**$ 5.017.875,33**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
548		20.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO : SANITARIO CON TAZA REDONDA, LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERIA Y ACCESORIOS - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 5.017.875,33	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
549		**20.06**	**GRIFERIAS Y LLAVES 0**			**$ 6.646.520,64**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
550		20.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	12,00	$ 6.106.345,65	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
551		20.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE DUCHA MONOCONTROL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 290.650,23	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
552		20.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	3,00	$ 249.524,76	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
553		**20.07**	**ACCESORIOS DE BAÑO 0**			**$ 24.248.853,37**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
554		20.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO TIPO INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	7,00	$ 3.677.314,18	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
555		20.07.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA PERCHA TIPO TORINO CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	11,00	$ 501.430,29	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
556		20.07.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO_1 TIPO FIJA 24 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 674.533,78	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
557		20.07.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO_2 TIPO PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 711.883,48	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
558		20.07.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON TIPO_1 DE EMPOTRAR A PARED EN ACERO INOXIDABLE	und	7,00	$ 4.205.768,08	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
559		20.07.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA PARA DUCHA ACABADO CROMADO	und	1,00	$ 81.218,83	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
560		20.07.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER TIPO_1 14,5 LTS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	14,00	$ 4.686.333,86	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
561		20.07.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS TIPO_1 ELÉCTRICO EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	7,00	$ 9.710.370,87	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
562		**20.08**	**REJILLAS DE BAÑOS 0**			**$ 658.885,08**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	

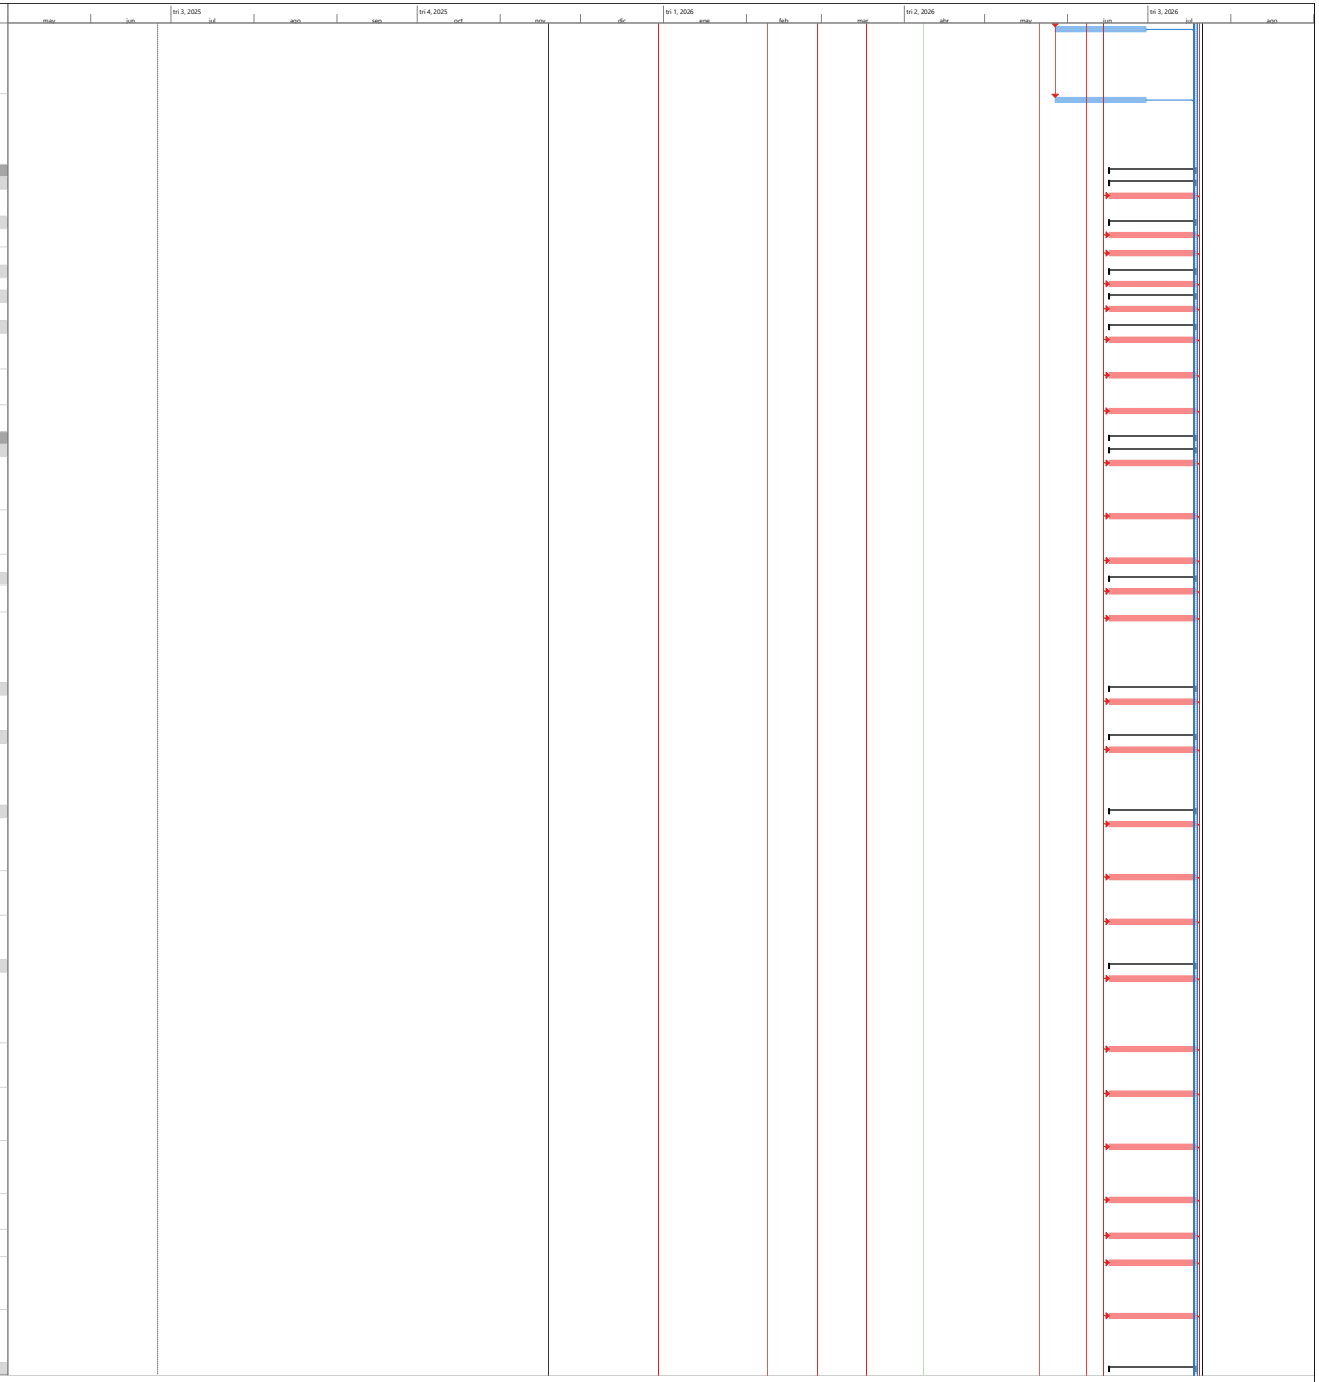

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
563		20.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA TUBERIA DE 2 PULGADAS - 4"x"4"x2"	und	14,00	$ 658.885,08	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
564		**20.09**	**TAPAS DE REGISTRO 0**			**$ 1.019.664,92**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
565		20.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM PLASTICA	und	18,00	$ 1.019.664,92	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
566		**21**	**DOTACION COCINAS 0**			**$ 5.846.654,37**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
567		**21.02**	**GRIFERIA COCINA 0**			**$ 2.521.973,96**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
568		21.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL TIPO KORAL COLOR CROMO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 2.521.973,96	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
569		**21.03**	**LAVAPLATOS 0**			**$ 3.324.680,41**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
570		21.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.70 M DE SOBREPONER (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 3.324.680,41	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
571		**22**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES 0**			**$ 101.017.148,96**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
572		**22.03**	**ESPEJOS CANTO PULIDO 0**			**$ 7.345.208,68**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
573		22.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO PARA BATERIAS SANITARIAS Y BAÑOS PRIVADOS (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	14,14	$ 7.049.354,36	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
574		22.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO CON INCLINACIÓN PARA BAÑO ACCESIBLE (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	0,54	$ 295.854,32	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
575		**22.04**	**BARANDAS EN VIDRIO 0**			**$ 49.529.435,06**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
576		22.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	43,75	$ 49.529.435,06	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
577		**22.07**	**DIVISIONES EN ACERO 0**			**$ 44.142.505,22**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
578		22.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA CABINAS SANITARIA Y DUCHA	m2	39,88	$ 44.142.505,22	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
579		**23**	**CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS 0**			**$ 26.114.588,14**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
580		**23.01**	**CERRADURAS DESOBREPONER 0**			**$ 6.530.631,43**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
581		23.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DESOBREPONER CERRADURA DE SOBREPONER SENCILLA VIDRIO MEDIA LUNA	und	25,00	$ 6.530.631,43	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
582		**23.05**	**CERRADURAS INSTITUCIONALES 0**			**$ 6.787.947,09**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
583		23.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL TIPO US26D INCLUYE MANIJA	und	25,00	$ 6.787.947,09	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
584		**23.10**	**CIERRAPUERTAS 0**			**$ 854.722,95**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
585		23.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS AEREO HIDRAULICO SERIE 3005	und	2,00	$ 854.722,95	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
586		**23.11**	**BARRAS ANTIPANICO 0**			**$ 2.420.365,49**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
587		23.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO DE EMPUJE TIPO ORLANDO DE 1 Y 2 PUNTOS - OPERACIÓN MECÁNICA. ACABADO DEL CUERPO COLOR NEGRO Y BARRA TIPO PUSH EN COLOR ROJO.	und	2,00	$ 2.420.365,49	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
588		**23.13**	**TOPES DE PUERTAS 0**			**$ 2.009.772,32**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
589		23.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA MEDIALUNA EN ACERO INOXIDABLE	und	52,00	$ 2.009.772,32	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
590		**23.17**	**MANIJAS DE PUERTAS 0**			**$ 7.511.148,86**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
591		23.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA ROMA TIRADOR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	und	25,00	$ 6.787.947,09	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
592		23.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA "ORION" PARA BARRA ANTIPÁNICO EN ZAMAKACABADO: NEGRO MATE	und	2,00	$ 723.201,77	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
593		**24**	**PINTURA 0**			**$ 224.554.517,74**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
594		**24.01**	**ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES 0**			**$ 140.647.848,56**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
595		24.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILOSOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 0	m2	400,12	$ 27.425.887,18	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
596		24.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILOSOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML 0	m	66,65	$ 3.377.096,43	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
597		24.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOSOBRE CIELO RASO (3 MANOS) X M2 PARA MUROS Y CIELORASOS EN DRYWALL	m2	1.841,16	$ 109.844.864,95	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
598		**24.02**	**PINTURA PLASTICA PARA INTERIORES 0**			**$ 22.761.889,45**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
599		24.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (3 MANOS) X M2 0	m2	108,66	$ 8.208.008,65	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
600		24.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (3 MANOS) X ML 0	m	260,66	$ 14.553.880,80	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
601		**24.03**	**PINTURA PLACAS INTERIORES 0**			**$ 3.166.037,97**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
602		24.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO BAJO PLACA ESCALERA (3 MANOS) X M2 0	m2	55,43	$ 3.166.037,97	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
603		**24.04**	**EXTERIOR 0**			**$ 57.978.741,76**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
604		24.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION SOBRE MUROS (3 MANOS) X M2 0	m2	1.091,62	$ 54.041.473,47	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
605		24.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION BAJO PLACAS (3 MANOS) X M2 0	m2	86,29	$ 3.937.268,29	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
606		**25**	**EQUIPOS 0**			**$ 470.202.061,68**	**38 días**	**lun 8/06/26**	**sáb 18/07/26**	
607		**25.01**	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS 0**			**$ 71.353.494,72**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
608		25.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESION TIPO 1 EQUIPO A PRESIÓN AGUA POTABLE IHM TIPO MONOBLOCK MODELO 20H-6.0TW ES O SIMILAR, Q= 5,80 l/s CDT= 38,70 mca, POT.=6,00 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENTE). CON VARIADOR DE VELOCIDAD. INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR (	und	1,00	$ 58.753.724,50	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
609		25.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO EYECTOR TIPO 1 EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES BARNES SUMERGIBLE NE 2 4-1.4-.110 TRITURADORA O SIMILAR, Q= 0,81l/s, CDT= 5,30mca, P=0,4 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENCIA). TABLERO DE CONTROL, SENSORES Y ACCESORIOS ESPECFI	und	1,00	$ 12.599.770,22	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
610		**25.02**	**EQUIPOS ELECTRICOS 0**			**$ 205.813.566,96**	**30 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
611		25.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA 150KVA, TIPO CABINADA. INCLUYE ADECUACIÓN DEL CUARTO, RAMPA REMOVIBLE, INSONORIZACIÓN Y DUCTO DE DESFOGUE	und	1,00	$ 145.586.883,75	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
612		25.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION UPS TRIFÁSICA - 20 KVA. INCLUYE CABLE FLEXIBLE PARA CONEXIÓN Y BYPASS	und	1,00	$ 60.226.683,21	30 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
613		**25.04**	**EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL 0**			**$ 193.035.000,00**	**36 días**	**lun 8/06/26**	**vie 17/07/26**	
614		25.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR_ 1 PRIVADOS - 3 PARADAS DE 1.0 M/S CAP 8 KG	und	1,00	$ 193.035.000,00	36 días	lun 8/06/26	vie 17/07/26	108FC+40 días
615		**27**	**SISTEMAS ESPECIALES 0**			**$ 85.837.123,89**	**52 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 18/07/26**	

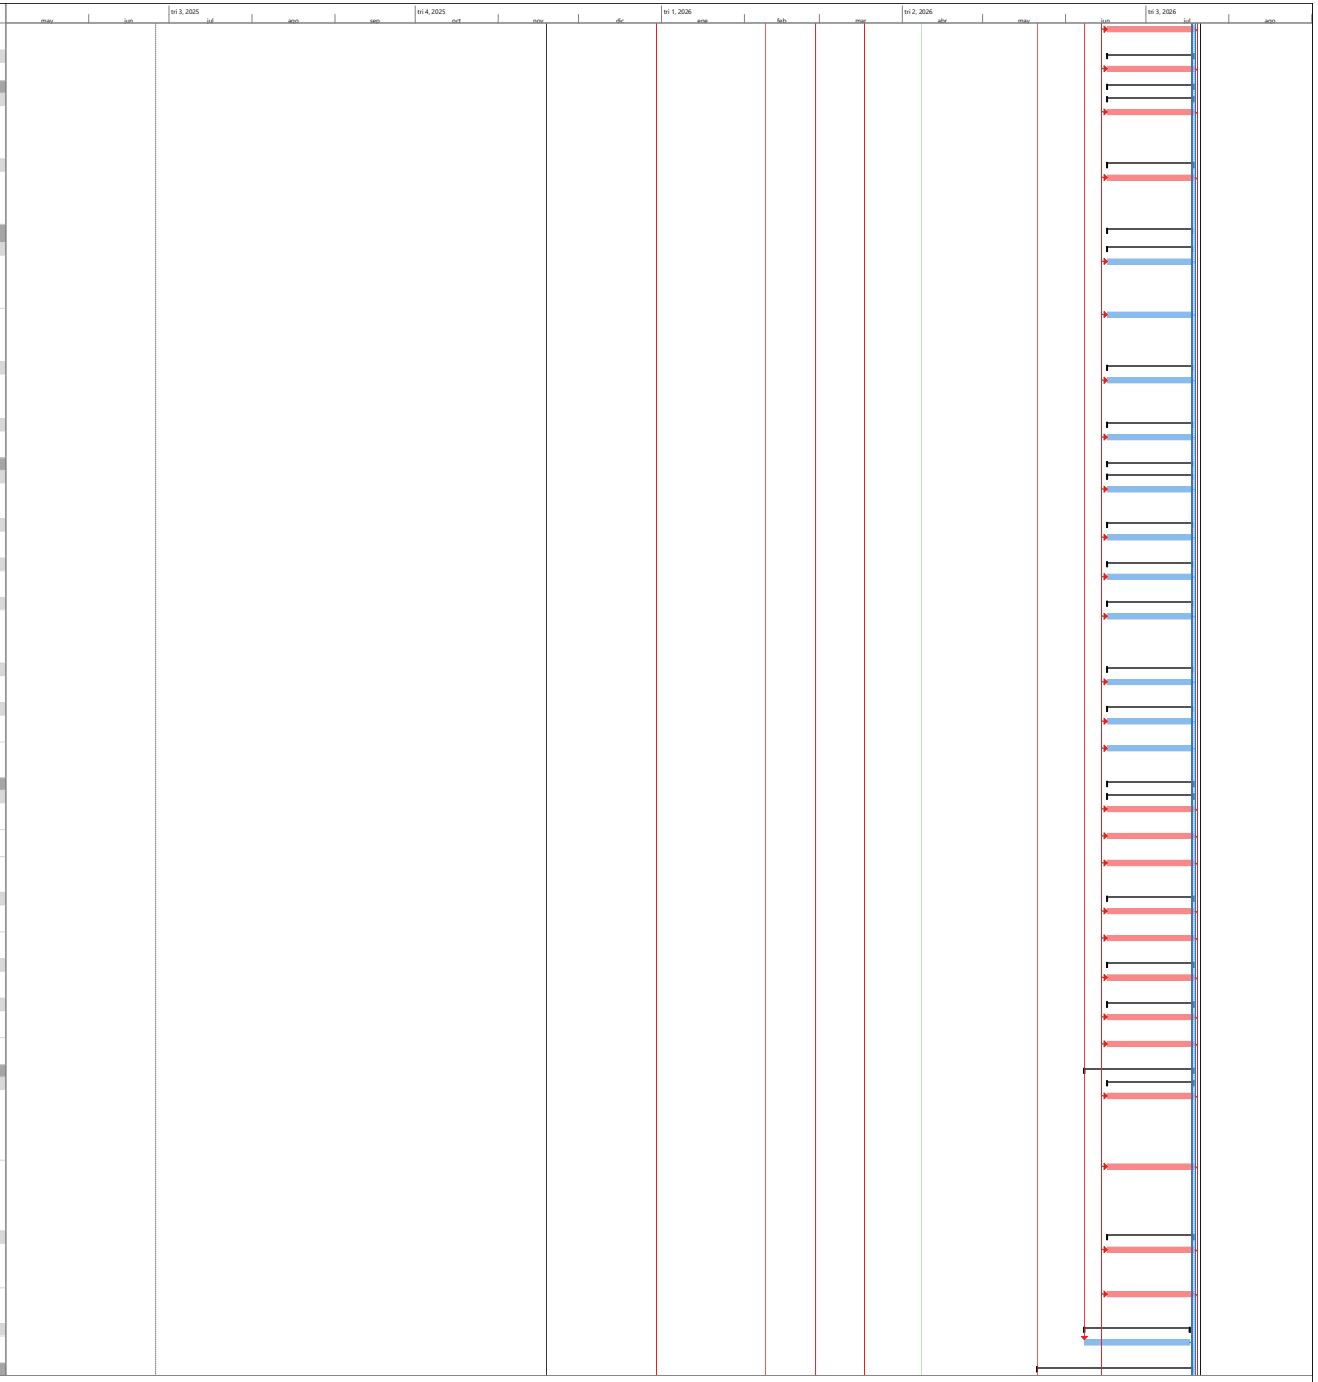

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
616		**27.01**	**AISLAMIENTO ACÚSTICO - SISTEMAS VERTICALES 0**			**$ 85.837.123,89**	**52 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 18/07/26**	
617		27.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO LIVIANO DOS CARAS EN LÁMINA DE CÁRTON YESO e= 1/2"; d=535 kg/m3 + LÁMINA EN FIBROCEMENTO e=10mm, RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO d=10 kg/m3; e=3,5" INCLUYE ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA DE 90mm, MASILLA Y ESTUCO. a TOTAL=15.	m2	337,59	$ 85.837.123,89	52 días	jue 21/05/26	sáb 18/07/26	108FC+25 días
618		**29**	**OBRAS EXTERIORES 0**			**$ 59.953.063,82**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
619		**29.03**	**PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO 0**			**$ 27.369.828,91**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
620		29.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR COBRIZO DIMENSIONES 0,20X0,10X0,08 M (TRAFICO VEHICULAR) INCLUYE ARENA DE NIVELACION ESPESOR = 4CM	m2	127,64	$ 26.047.680,44	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
621		29.03.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR COCOA DIMENSIONES 0,20X0,10X0,08 M (TRAFICO VEHICULAR) INCLUYE ARENA DE NIVELACION ESPESOR = 4CM	m2	7,13	$ 1.322.148,47	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
622		**29.14**	**CINTAS Y BORDILLOS 0**			**$ 8.735.826,90**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
623		29.14.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CINTA DE CONFINAMIENTO 10 CM ANCHO RESISTENCIA 175D PSI	m	124,66	$ 7.692.055,69	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
624		29.14.21	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO 0.20 M DE ANCHO RESISTENCIA 3000 PSI 0	m	5,37	$ 1.043.771,21	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
625		**29.31**	**CERRAMIENTOS 0**			**$ 3.370.024,02**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
626		29.31.02	CERRAMIENTO EN MALLA PARA PLANTA ELÉCTRICA, INCLUYE PUERTAS	m	13,29	$ 3.370.024,02	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
627		**29.32**	**RELLENOS PARA CONFORMACION DE TERRENO 0**			**$ 16.281.015,07**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
628		29.32.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG (ART 320)	m3	55,53	$ 16.281.015,07	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
629		**29.34**	**GEOTEXTIL 0**			**$ 4.196.368,92**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
630		29.34.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO TIPO 1 T2400 O SIMILAR	m2	148,24	$ 4.196.368,92	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
631		**30**	**ASEO Y LIMPIEZA 0**			**$ 120.131.134,39**	**128 días**	**jue 26/02/26**	**sáb 18/07/26**	
632		**30.02**	**ASEO EXTERIOR 0**			**$ 117.422.673,17**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
633		30.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO 0	m2	2.993,00	$ 117.422.673,17	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
634		**30.03**	**RETIRO DE ESCOMBROS 0**			**$ 2.708.461,22**	**128 días**	**jue 26/02/26**	**sáb 18/07/26**	
635		30.03.01	RETIRO DE ESCOMBROS 0	M3	16,00	$ 2.708.461,22	128 días	jue 26/02/26	sáb 18/07/26	6
636		**1**	**SEÑALIZACION Y DOTACION**			**$ 562.435.218,03**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
637		**28.02**	**SEÑALES INFORMATIVAS - INDICADOR DE PISO O NUMERACIÓN**			**$ 1.128.120,00**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
638		28.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL - INDICADOR DE PISO Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 15mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con chazo plásti	und	3,00	$ 1.128.120,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
639		**28.03**	**SEÑALES INFORMATIVAS - HORARIO**			**$ 328.440,00**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
640		28.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL - HORARIO ACCESO PRINCIPAL Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 15mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con chazo	und	1,00	$ 328.440,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
641		**28.11**	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR**			**$ 6.464.080,00**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
642		28.11.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR ESPACIOS DE SERVICIOS - Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro co	und	20,00	$ 3.712.800,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
643		28.11.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR ESPACIOS PRINCIPALES - Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con	und	17,00	$ 2.751.280,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
644		**28.12**	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCION)**			**$ 1.485.120,00**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
645		28.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE PRECAUCIÓN, RIESGO Y/O PROHIBICIÓN Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e in	und	8,00	$ 1.485.120,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
646		**28.18**	**SEÑALES REGLAMENTARIAS - EVACUACIÓN -CONDICIÓN SEGURA**			**$ 1.899.240,00**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
647		28.18.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL REGLAMENTARÍA (SALIDA DE EMERGENCIA, EVACU. DERECHA, EVACU. IZQUIERDA, BOTIQUÍN, BAJA ESCALERA IZQUIERDA, BAJA ESCALERA DERECHA) Fabricada en poliestireno calibre 100, con impresión fotoluminiscente laminada,	und	21,00	$ 1.899.240,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
648		**28.50**	**DOTACION**			**$ 551.130.218,03**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**sáb 18/07/26**	
649		28.50.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 1 A2 - MÓDULO ESTRADO JUEZ JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS (1 PUESTO)	und	4,00	$ 24.453.781,24	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
650		28.50.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 2 A3 - MÓDULO ESTRADO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	4,00	$ 24.453.214,80	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
651		28.50.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 3 B1 - ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	8,00	$ 13.900.437,60	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
652		28.50.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 4 B2 - ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	8,00	$ 16.141.845,44	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
653		28.50.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 5 B3 - MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m	und	4,00	$ 3.257.030,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
654		28.50.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 6 B4 - MESA REDONDA R= 0.50m	und	2,00	$ 2.214.780,40	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
655		28.50.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 7 B7 - MESA TIPO SALA DE JUNTAS DE 2,10m x 0,60m CON GROMMET	und	3,00	$ 11.546.243,94	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
656		28.50.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 8 B8 - MESA MULTIPROPOSITO APILABLE T	und	2,00	$ 4.006.146,90	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
657		28.50.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 9 C1A - TANDEM 5 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	10,00	$ 13.212.213,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
658		28.50.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C2- TANDEM 3 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	4,00	$ 3.636.544,80	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
659		28.50.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C3 - SILLA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS	und	7,00	$ 6.810.024,90	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días

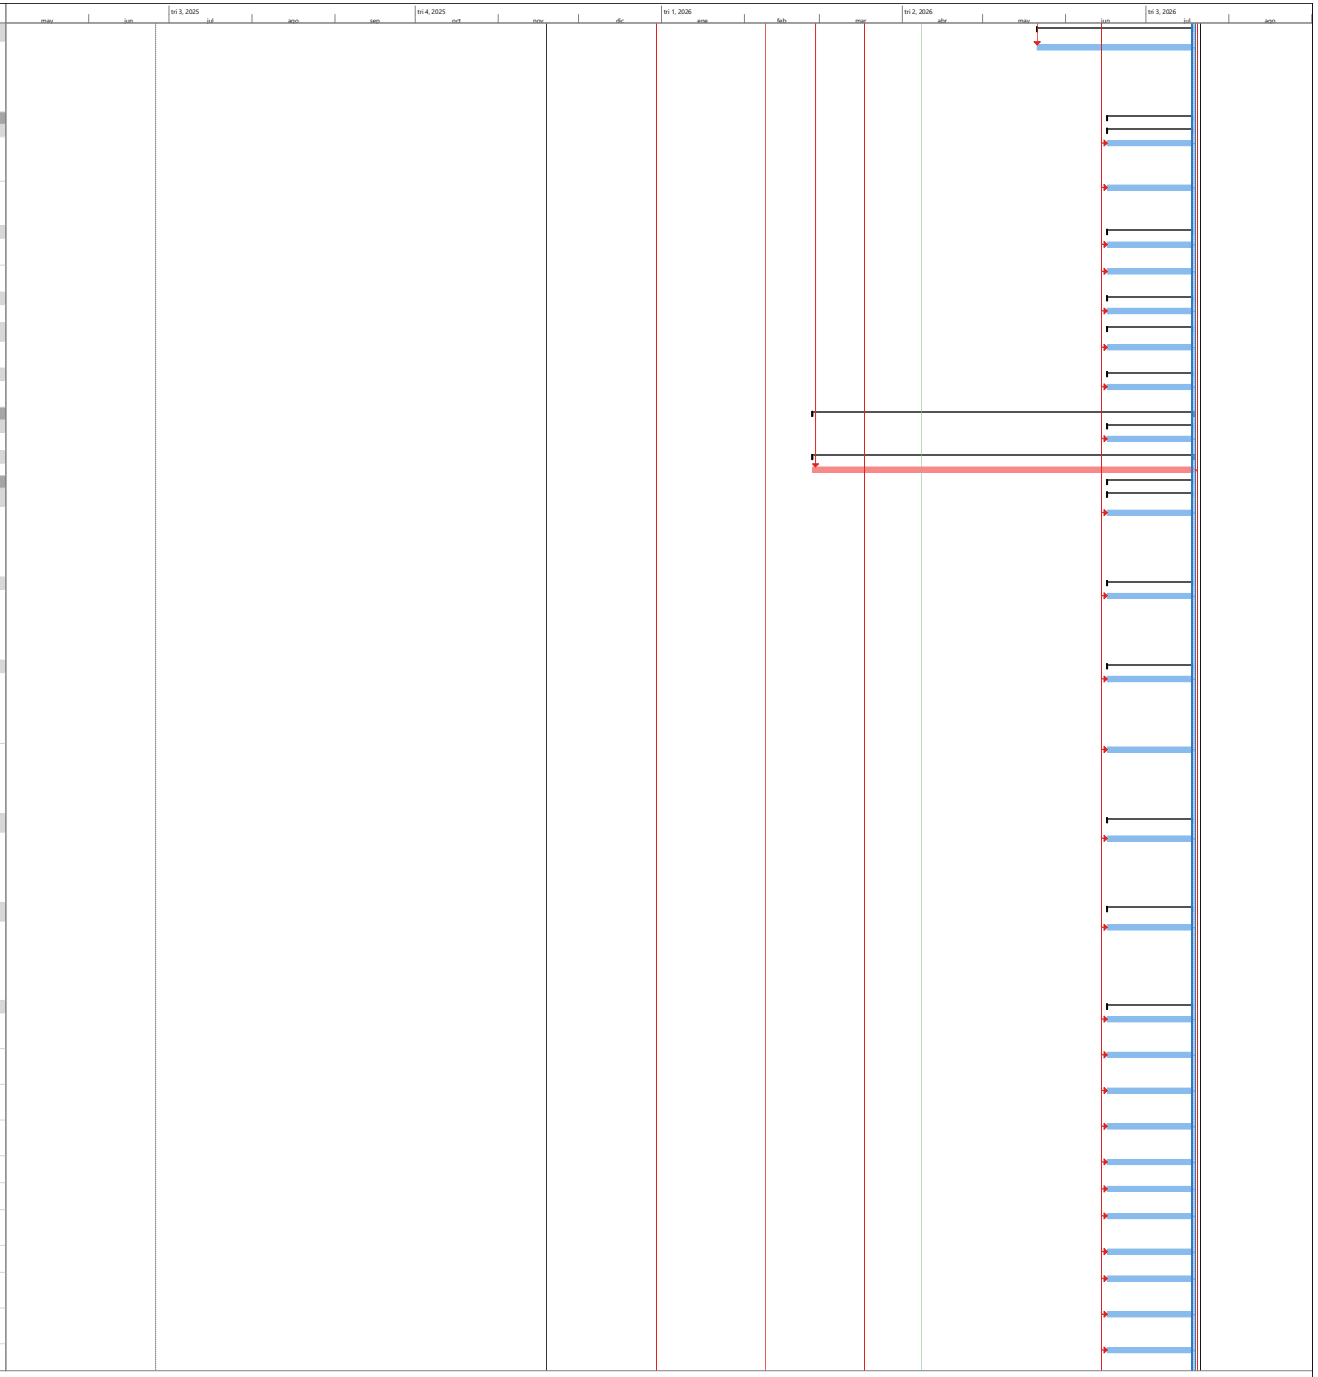

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
660		28.50.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C4 - SILLA ERGONOMICA TIPO OPERATIVA CON BRAZOS	und	97,00	$ 47.389.786,50	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
661		28.50.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C5 - SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS - PARA OFICINA	und	32,00	$ 8.598.578,24	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
662		28.50.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C7 - SILLA TIPO BARRA	und	6,00	$ 1.221.389,82	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
663		28.50.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C8 - SILLA CAFETERIA	und	8,00	$ 2.401.705,60	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
664		28.50.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C9 - SILLA POLTRONA - SENCILLA	und	3,00	$ 8.369.151,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
665		28.50.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C11 - BANCA EN MADERA	und	2,00	$ 2.973.810,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
666		28.50.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION D1 - PUESTO DE TRABAJO PARA MAGISTRADO	und	3,00	$ 17.830.115,10	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
667		28.50.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION D2 - PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO SECRETARIAL DE 1.50M X 1.50M - PARA OFICINA	und	58,00	$ 130.346.340,60	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
668		28.50.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E1 - MUEBLE - ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA - 0,90m X 0,50m	und	7,00	$ 13.109.545,75	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
669		28.50.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E3 - MUEBLE ARCHIVADOR SIN PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m	und	19,00	$ 21.955.214,40	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
670		28.50.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E6 - MUEBLE PALOMERA 1,30m x 1,00m x 0,40m	und	10,00	$ 15.959.447,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
671		28.50.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F1A - BIBLIOTECA PARA JUEZ de 2,15m x 0,50m PARA OFICINA	und	7,00	$ 23.255.194,20	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
672		28.50.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F4 - UNIDAD ARCHIVADOR RODANTE MANUAL	und	10,00	$ 117.253.080,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
673		28.50.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F10 - ESTANTE METÁLICO TIPO PESADO - PARA ARCHIVO	und	8,00	$ 5.080.966,80	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
674		28.50.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F11 - LOCKER METÁLICO - 16 puestos	und	1,00	$ 2.407.370,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
675		28.50.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION G1 - BARANDA DE SEPARACION PARTE PROCESAL SALA DE AUDIENCIAS	und	4,00	$ 9.346.260,00	29 días	mar 16/06/26	sáb 18/07/26	463FC-7 días
676		**2**	**TRAMITES**			**$ 30.000.000,00**	**105 días**	**mié 19/11/25**	**lun 16/03/26**	
677			LICENCIA DE CONTRUCCION	GBL	1,00	$ 30.000.000,00	105 días	mié 19/11/25	lun 16/03/26	2FC+130 días
678			FIN			$ 0,00	0 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	113;114;116;117

