Usuario Pago:
LGIRALDO
193

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00195

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SUMINISTRARTE SAS ,Id: 900931977

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA PARCIAL NRO 03 Y FINAL AL CONTRATO CD-013-2025 INCLUIDO EL OTROSÍ INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. FVE40
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,502,121.00 **Vlr Deducc.:** 1,869,374.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,632,747.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000019-08	TRANSFERENCIA1	SUMINISTRARTE SAS ,Id: 900931977	$13,632,747.00
				Total:	$13,632,747.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE IVA	15	$2,475,129	$371,269	INDUSTRIA Y COMERCIO PUERTO TRIUNF	1	$13,026,992	$130,270
ADULTO MAYOR PUERTO TRIUNFO	4	$13,026,992	$521,080	PRO CULTURA PUERTO TRIUNFO	2	$13,026,992	$260,540
PRO DEPORTE AÑO 2024 PTO TRIUNFO	2.5	$13,026,992	$325,675	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2	$13,026,992	$260,540
TOTAL Deducibles:			$1,869,374.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

Usuario Creó
LGIRALDO

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-193

Fecha/Estado
26/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 . CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** OTROSÍ NRO 02

PAGADO A: SUMINISTRARTE SAS, Id: 900931977

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA PARCIAL NRO 03 Y FINAL AL CONTRATO CD-013-2025 INCLUIDO EL OTROSÍ INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FVE40

Vlr Bruto: 15,502,121.00 **Vlr Deducc.:** 1,869,374.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,632,747.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025440	202543	01	02	2.4.5.02.09.04.01	CI-022-2025 PTO TRIUNFO. PAVIMENTO ARREBOLES	$10,583,557.00
-202529	202566	01	02	2.4.5.02.09.04.01	CI-022-2025 PTO TRIUNFO. PAVIMENTO ARREBOLES	$4,918,564.00

TOTAL: $15,502,121.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE IVA	15	$2,475,129	$371,269	INDUSTRIA Y COMERCIO PUERTO TRIUNF	1	$13,026,992	$130,270
ADULTO MAYOR PUERTO TRIUNFO	4	$13,026,992	$521,080	PRO CULTURA PUERTO TRIUNFO	2	$13,026,992	$260,540
PRO DEPORTE AÑO 2024 PTO TRIUNFO	2.5	$13,026,992	$325,675	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA	2	$13,026,992	$260,540

TOTAL Deducibles: $1,869,374.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

SUMINISTRARTE SAS
NIT: 900931977 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 17B # 34 - 26, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6017047103
Email. suministrartesas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101060667 válida desde 2025-11-04 hasta 2026-11-04 rango desde FVE34 hasta FVE500

Nombre/Razón Social:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT:	901537748
Dirección:	C R 17 40 ED LA MILAGROSA, PEÑOL, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3105469132
Email:	auxiliaradministrativo@eapelpenol.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consiganción bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FVE40

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	10:44:56-05:00
FECHA FIRMADO:	25/03/2026 10:44:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
25	03	2026	25	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	Servicios PAGO FINAL DEL CONTRATO No, CD-013 DE 2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LACONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.	WSD	1,00	$13.026.992,00	IVA	19%	$2.475.129,00	$0,00	$13.026.992,00

Notas:

Subtotal:	$13.026.992,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$2.475.129,00
Total:	$15.502.121,00

SON: (quince millones quinientos dos mil ciento veinteiuno pesos cero centavos)

CUFE: 9397cb6aea2be7f9795097791adacdcaeaca724d55f2ac5567e2bea3b9059cf8f81dd7187c3f8100a300a5205feb9d76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.026.992,47	19,00%	$2.475.129,00

Firma Digital: Bpx78pxeDYPxPbWyy5qkJ1rl4igK9y/MYeGRA/0e3LuivQBY37TZokeHUs8QbD48
D6nv7qCUzVnh8fNgb+kRI5mhXtcE2AAgRntAra3JNI62Ev+J5u0JY-A7fM77Egh
Eb6xn9bW592SAHZU/KrTwnS39lNMA6zArsr9VnoesaFCOxNa4e05Bm/89v4OaZ9c
M49u2u5r+pSajEx4zd85PcGCNmTaxDTqwH2140VuHMyjb1XXv-z5zIDoU393wgG7
HC+MtBpxoJxjygvadCjigzI-5l82yAdElvb3rUtTlkMw2xbMH58C60nbSP7KBdIO
zynro1G0FD0B0HrRuTTL3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOTRESYFINAL
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 33400001908

Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 10:18:49
Fecha de Generación: 06-04-2026

Fecha de envío del pago: 26-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2026

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,632,747.00	**Valor Registros Procesados:** $13,632,747.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03000002675	Ahorros	900931977	SUMINISTRARTE SAS	13,632,747.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-03-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIONES DIRECTAS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL

NO. DE CONTRATO	CD-013-2025
CONTRATISTA:	SUMINISTRARTE S.A.S.
NIT:	900.931.977-1
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($45.179.177)
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, SE FIJA EN TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 022 DE 2025, FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA Y LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.
FECHA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	**OTROSÍ NRO. 1 DEL 30 DE MAYO DE 2025:** • PRORROGA DE UN (1) MES. **SUSPENSIÓN NRO. 1 DEL 16 DE JUNIO DE 2025.** • SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR DOS (2) SEMANAS. **REANUDACIÓN NRO. 1 DEL 04 DE JULIO DE 2025.** **SUSPENSIÓN NRO. 2 DEL 18 DE JULIO DE 2025.** • SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR QUINCE (15) DIAS. **PRÓRROGA NRO.1 DE LA SUSPENSIÓN NRO 2. DEL 01 DE AGOSTO DE 2025.** • PRORROGA DE (3) SEMANAS.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

	REANUDACIÓN NRO. 2 Y OTROSÍ NRO.2 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025. • REANUDAR EL CONTRATO. • PRÓROGA DE UN (1) MES. • ADICIÓN ($10.583.557)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE OTROSÍ NO. 1:	02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN NO 1:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN NO 1:	04 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN NO 2:	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN NO 2:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN NO 2:	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DESPUÉS DE OTROSÍ NRO 2:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($55.762.734)
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato:

Como antecedente de este proceso, se tiene el Contrato Interadministrativo No. CI-022-2025, suscrito con el Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia el día 24 de enero de 2025, y cuyo objeto es *"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA".*

Por lo anterior, y de acuerdo con el alcance del contrato CD-013-2025, se verificó el cumplimento de cada una de las actividades de la interventoría, durante el periodo del 19 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025, así:

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio de Puerto Triunfo, corregimiento Puerto Perales, Área Rural

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

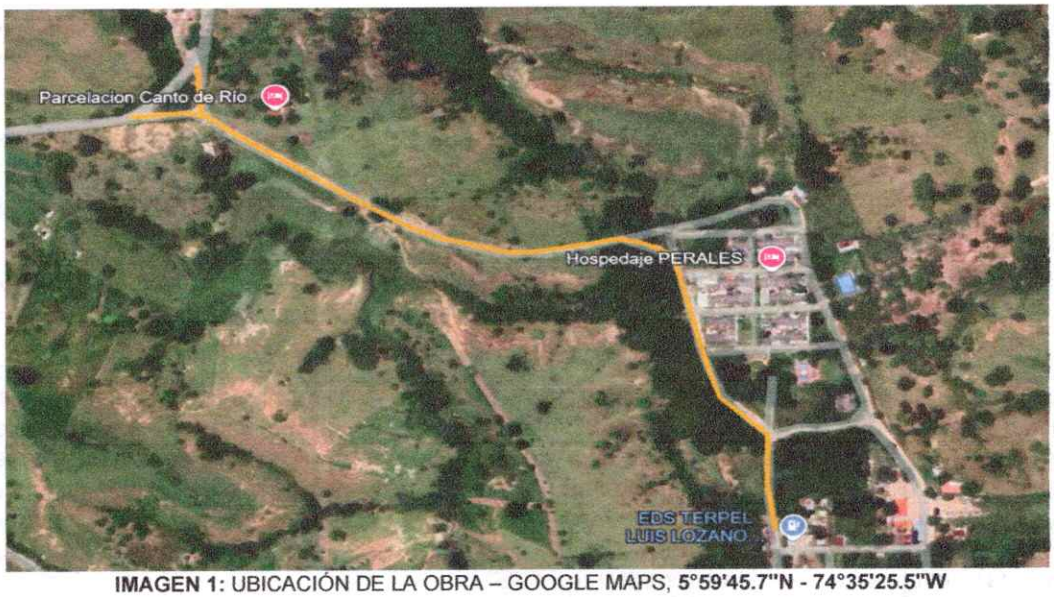


IMAGEN 1: UBICACIÓN DE LA OBRA – GOOGLE MAPS, **5°59'45.7"N - 74°35'25.5"W**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las principales actividades a ejecutar por parte del contratista, son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ESENCIALES:

1. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental con base en los procedimientos establecidos por el Municipio de Puerto Triunfo y las directrices de la E.A.E.P.
2. Verificar, evaluar y certificar de manera documentada que las actividades realizadas por el contratista de obra en el marco del contrato sobre el cual se va a realizar la interventoría, cumplan con la calidad, alcance, especificaciones técnicas, rendimientos, necesidades, y plazos establecidos por la E.A.E.P, para lo cual debe tener en cuenta: Conforme la oferta económica establecer, organizar y mantener un equipo de trabajo de interventoría con el perfil, tiempo de dedicación, el control y el rango, los compromisos, las tareas, las responsabilidades, las reglas y la autonomía claramente definidas, el cual debe: Investigar, analizar, priorizar, programar, definir, coordinar, revisar, verificar y asegurar que las actividades asociadas al objeto de la Interventoría.
3. Verificar la calidad de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato objeto de la interventoría y demás documentos inherentes al mismo y la correcta inversión de los recursos asignados, todo dentro de los plazos convenidos; para lo cual mediará entre el contratista y la entidad contratante, ejerciendo las funciones de intervención, control y vigilancia de manera coordinada y regulada entre las partes, teniendo en cuenta las políticas de la E.A.E.P y las instrucciones del Supervisor designado.
4. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio revisiones y observaciones sobre la documentación técnica del proyecto si a ello hubiere lugar.
5. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio de su contrato, la revisión integral a la documentación precontractual del proceso de adjudicación de la obra, revisando y conociendo las obligaciones contractuales derivadas de los estudios y documentos técnicos del

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

proceso, las respuestas a las observaciones dadas por la entidad, las adendas y demás documentos del proceso, soportes y pliego de condiciones definitivos, además de las obligaciones convenidas en el texto del contrato.
6. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio la revisión integral de la propuesta del contratista de obra, la cual deberá cumplir a cabalidad con el formato base de la entidad, de tal manera que se alcance el logro del cumplimiento de la especificación a plenitud y en todos sus aspectos, incluyendo todos los requisitos señalados.
7. Realizar durante el plazo contractual un seguimiento detallado a la programación de obra, velando por el estricto cumplimiento de esta e informando a la entidad sobre necesidades de ajustes debidamente motivadas, considerando la programación financiera de este proyecto.
8. El Interventor del Contrato es el delegado de la Empresa Autónoma, para lo cual le corresponde: verificar (i) La calidad de los trabajos y el acompañamiento social realizado, (ii) el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato objeto de la Interventoría y demás documentos inherentes al mismo, y (iii) la correcta inversión de los recursos asignados; todo dentro de los plazos convenidos; para lo cual mediará entre el contratista y la entidad contratante, ejerciendo las funciones de intervención, control y vigilancia de manera coordinada y regulada entre las partes, teniendo en cuenta las políticas de la entidad contratante.

ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES: Por tratarse de un contrato de interventoría, en donde intervienen diferentes factores como los señalados en el objeto contractual de este proceso, su alcance implica actividades técnicas, administrativas, financieras, socio-ambientales y legales que permitan vigilar y controlar permanentemente los recursos invertidos por el municipio de Puerto Triunfo, el contratista deberá tener en cuenta durante la ejecución del contrato, para esta interventoría se requiere personal con conocimientos suficientes para llevar a cabo la ejecución, el seguimiento y el control de las actividades propias del contrato de obra, para lo cual deberá conocer la normatividad vigente y las especificaciones técnicas de las actividades. De esta manera el contratista deberá cumplir como mínimo con los siguientes aspectos.

De orden técnico:

1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.
2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las calidades ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el pliego y el contrato, según las condiciones señaladas, y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes.
4. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.
5. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. Será parte integrante del presente estudio, el decreto Nº 004 del 02 de enero de 2017 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría como apoyo a la gestión administrativa del Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

De orden administrativo:

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

1. Realizar reuniones periódicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solución de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios en la programación de las actividades.
2. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato y de los términos establecidos en los contratos de personal.
3. Vigilar que se cumplan las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para cumplir con el objeto del Contrato.
4. Verificar el cumplimiento del contratista de la afiliación y pago de la seguridad social integral y aportes parafiscales en caso de que aplique, para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral del personal contratado por el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con estos requisitos, con los profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidación del contrato. El INTERVENTOR que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Empresa Autónoma de El Peñol, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar.
5. Dar cumplimiento a la aplicación de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo por la cual se definen los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST y riesgos laborales por parte del contratista.
6. Iniciar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión, recibo final y liquidación definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos.
7. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoría o dando traslado de las que no le competen a la Empresa Autónoma de El Peñol.
8. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.
9. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer, si es del caso, el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicación de sanciones a que hubiere lugar, todo con la debida antelación y sustentación.
10. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición las obras requeridas, notificando a la Empresa Autónoma de El Peñol los problemas que al respecto se detecten.
11. Realizar la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los productos entregados. Esta información será la base para que la Entidad formalice la liquidación del contrato conforme a la normatividad vigente.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

12. Elaborar los informes diarios, semanales, mensuales e informe final solicitados por la Empresa Autónoma o por el municipio de El Peñol, según formato de entidad.
13. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar a la Empresa Autónoma de El Peñol y/o Alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia.
14. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
15. Suscribir con el Contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad (incluye registro fotográfico), haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones, amueblamientos y registrar los cultivos que se encuentren adyacentes al proyecto (en caso de requerirse).
16. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, con los documentos originales de los contratos de obra y de interventoría.
17. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista de obra.
18. Informar oportunamente a la empresa sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas y sanciones, emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada.
19. Adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al contrato de obra.
20. Verificar que, durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato de obra.
21. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable.
22. Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
23. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato de obra, dentro de los términos señalados en el mismo.
24. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.
25. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías.
26. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

De orden Financiero-Contable:

1. Verificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato de obra.
2. Mantener actualizada la información sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista de obra.
3. El interventor será el intermediario entre el contratista de obra y la Empresa Autónoma y por su conducto se tramitarán todas las cuentas relativas al desarrollo del contrato, cuentas que serán previamente avaladas por la Gerente de la Entidad.
4. El interventor revisará y aprobará las actas de recibo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, verificando que la información financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la información adicional estén correctos.
5. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.
6. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
7. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
8. Participar conjuntamente con el contratista de obra, de la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos.
9. Realizar un control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico previo a la autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Empresa Autónoma, para ello, deberá revisar, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los costos directos, así como a los gastos de administración de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real; y así sujetar los pagos de las actas parciales y la liquidación del contrato a los ítems de los costos directos y componentes de los gastos de administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo, generando hasta el final del contrato el balance de los gastos de inversión de la administración para la totalidad del contrato de obra. En todo caso no podrán superar el valor total de la propuesta económica que soporta el contrato de obra. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Concejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
10. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.
11. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
12. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.
13. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

14. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

De orden jurídico:

1. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso para el cual se realizará la interventoría.
2. Verificar el cumplimiento al marco contractual.
3. Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos o autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato, en caso de ser necesarias.
4. Suscribir el acta de terminación, recibo definitivo y liquidación de la ejecución del contrato objeto de la interventoría.
5. Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto en ejecución, en caso de ser necesaria.
6. Informar y exponer oportunamente, los motivos por los cuales debe suspenderse, terminarse anticipadamente el contrato o prorrogarse y/o adicionarse el mismo, en caso de presentarse dicha situación.
7. Recomendar, viabilizar y documentar en caso de que sea requerido trámite sancionatorio por incumplimiento del contratista de obra.

Tabla No. 1 – Actividades a ejecutar.

3. ASPECTOS TECNICOS:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El día 15 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de Fijación y Aprobación de Ítems No Previstos No 01.

El día 16 de junio de 2025 se suscribió entre las partes el Acta No 02 de Suspensión No 01.

El día 04 de julio de 2025 se suscribió entre las partes el Acta No 03 de Reinicio No 01 quedando como nueva fecha de finalización del contrato interadministrativo el 12 de agosto de 2025.

El día 18 de julio de 2025 se suscribió entre las partes el Acta No 05 de Suspensión No 02.

El día 26 de agosto de 2025 se suscribió entre las partes el Acta No 06 de Reinicio No 02 quedando como nueva fecha de finalización del contrato interadministrativo el 16 de septiembre de 2025.

El día 27 de agosto de 2025 se suscribió entre las partes el Acta No 07 de Adición y Prórroga No 1, adicionando $ 166.590.098 al contrato, quedando un valor total de $ 1.103.701.433;

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

y prorrogando el contrato por término de un (01) mes más, quedando como fecha de finalización el 16 de octubre de 2025.

PERSONAL:

A continuación, se describe el desarrollo de la parte administrativa del contrato a la fecha de evaluación.

PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Héctor Milcíades Guerra Moncaleano	Director de interventoría
Henry Onemio Tobar López	Residente de interventoría
Yhara Lizceth Barajas Plazas	Residente ambiental y HSE

Tabla No. 1– Personal de la interventoría.

PERSONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Anngy Milena Uribe Ciro	Directora de Supervisión
Brahian Gómez Vallejo	Apoyo a la Supervisión

Tabla No. 2 – Personal de la Supervisión.

4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La supervisión realizo verificación de la afiliación del personal administrativo de interventoría y obra, la revisión del contrato y las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, se encuentran en el informe del contratista de interventoría.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

En el periodo se presenta el acta de avance No. 3 y final del contrato de interventoría por valor de QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/L ($15.502.121), correspondiente a un avance del 27.80% para un acumulado del 100.00% del contrato de interventoría.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Para hacer efectivas las acciones de prevención dentro del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Contratista ha realizado inspecciones de higiene y

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

seguridad, monitoreos ambientales a los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, controles y protecciones en higiene, seguridad y ergonomía ocupacional, controles a la demarcación y señalización, saneamiento básico ocupacional y ambiental, y cumplimiento de los requerimientos contractuales en cuanto al orden, la limpieza y el aseo de los lugares donde se desarrollan las obras.

Desde la supervisión e interventoría se verifica que en obra todo el personal cuente con los elementos de protección personal y que se utilicen adecuadamente los equipos y herramientas.

7. ASPECTOS SOCIALES Y/O COMUNITARIO

VISITAS PRELIMINARES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante la visita preliminar, así como en el seguimiento de las actividades diarias realizadas, la supervisión ha realizado el registro fotográfico de las áreas a intervenir e intervenidas. En los anexos del presente informe se pueden observar estas.

8. INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista en temas de documentación solicitada como pago de seguridad social y afiliaciones, cumple con la entrega oportuna de dicha documentación.

Al momento no se evidencia incumplimiento de las obligaciones del contratista.

9. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Se han cumplido con la presentación de las afiliaciones del personal administrativo y operativo por parte del contratista de obra y de interventoría.

10. AVANCE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD-013-2025		
1	VALOR INICIAL	$ 45.179.177,00
2	VALOR ADICIONAL	$ 10.583.557,00
3	VALOR TOTAL	$ 55.762.734,00
4	VALOR ACTA No 1	$ 29.899.878,00
5	PORCENTAJE DEL ACTA No 1 (4/3)	53,62%
6	VALOR ACTA No 2	$ 10.360.735,00
7	PORCENTAJE DEL ACTA No 2 (6/3)	18,58%
8	VALOR ACTA No 3 Y FINAL	$ 15.502.121,00
9	PORCENTAJE DEL ACTA No 3 Y FIINAL (8/3)	27,80%
10	VALOR ACUMULADO (4+6+8)	$ 55.762.734,00
11	PORCENTAJE ACUMULADO (10/3)	100,00%

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

12	VALOR RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (3-10)	$ 0,00
13	PORCENTAJE RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (12/3)	0,00%

Tabla No. 3 – Resumen financiero interventoría.

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los términos contractuales, tanto del contrato interadministrativo CI-022-2025, como del contrato objeto del presente informe, la EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL con Nit: 901.537.748-4, recibirá pagos a través de actas parciales, según aprobación del municipio, previa presentación del pago de los aportes a la seguridad social y de parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, cuenta de cobro, informe de actividades y visto bueno del supervisor designado por parte de la administración municipal de Puerto Triunfo-Antioquia, los trámites de pago serán adelantados, previa presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, la certificación del pago de aportes parafiscales y la planilla de pago de seguridad social.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO NRO 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	2025-00429 06/08/2025	$29.899.878
PAGO NRO 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	2025-00643 01/12/2025	$10.360.735
Total		$40.260.613

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron la expedición y aprobación de las pólizas, tanto iniciales como la actualización de Otrosí, y recibo final así:

Pólizas iniciales:



APROBACIÓN DE GARANTIAS

El Peñol. Antioquia. 26 de febrero de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas **DEL CONTRATO CD-013-2025**, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. ANTIOQUIA"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, **como requisito previo al acta de inicio del contrato** en mención, suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SUMINISTRARTE S.A.S.			
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO				
NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO	30-44-101062353			
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
NRO ANEXO SI APLICA	0			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/02/2025			
GARANTÍAS OTORGADAS				
1. CUMPLIMIENTO: igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**	
	$4.517.917.7	20/02/2025	20/11/2025	
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**	

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Esq. La Milagrosa - El Peñol
C. 310 546 91 32



LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	$2.258.958.85	20/02/2025	20/05/2030
3. CALIDAD DEL SERVICIO: cinco (05) años, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$9.035.835.4	20/05/2025*	20/05/2030*

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2. Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

Nota: La vigencia de la garantía de calidad del servicio, deberá ajustarse cuando se suscriba el acta de entrega y recibo final de las obras.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por:	Carlos Fernando Lora Rincón Abogado Contratista	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para su firma.

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Esq. La Milagrosa - El Peñol
C. 310 546 91 32

Pólizas actualizadas después del Acta de inicio y del Otrosí Nro. 1:



APROBACION DE GARANTIAS

El Peñol. Antioquia. 08 de agosto de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas **DEL CONTRATO CD-013-2025**, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. ANTIOQUIA"

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, **actualizando las mismas de acuerdo al acta de inicio y del otrosí No. 1 del contrato** en mención suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SUMINISTRARTE S.A.S.			
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO				
NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO	30-44-101062353			
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
NRO ANEXO SI APLICA	5			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/06/2025			
GARANTÍAS OTORGADAS				
1. CUMPLIMIENTO: igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**	
	$4.517.917.70	03/03/2025	02/01/2026	
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**	

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Esq. La Milagrosa - El Peñol
C. 310 546 91 32



LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	$2.258.958.85	03/03/2025	02/07/2030
3. CALIDAD DEL SERVICIO: cinco (05) años, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$9.035.835.4	02/06/2025*	02/06/2030*

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2. Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

Nota: La vigencia de la garantía de calidad del servicio, deberá ajustarse cuando se suscriba el acta de entrega y recibo final de las obras.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por:	Carlos Fernando Lora Rincón Abogado Contratista	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para su firma.

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Esq. La Milagrosa - El Peñol
C. 310 546 91 32

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Pólizas actualizadas después suspensión Nro. 1 y 2, Otrosí Nro. 2:



APROBACION DE GARANTIAS

El Peñol, Antioquia, 29 de septiembre de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que ayala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **DEL CONTRATO CD-013-2025**, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA."

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista **actualizando las mismas de acuerdo al acta de suspensión No. 1, a la reanudación No. 1, a la suspensión No. 2, al reinicio No. 2 y al otrosí 2 del contrato** en mención, suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SUMINISTRANTE S.A.S.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO:	30-44-101082364
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO ANEXO SI APLICA:	7
FECHA DE EXPEDICION:	24/09/2025

GARANTIAS OTORGADAS

	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. CUMPLIMIENTO: igual al plazo del contrato y seis (06) meses más y por el diez por ciento (10%) del valor del contrato.	$5.576.273,40	03/03/2025	30/03/2026
2. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES:	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:



LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	$2.788.136,70	03/03/2025	30/09/2030
3. CALIDAD DEL SERVICIO: cinco (05) años, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Valor asegurado: $11.152.546,80	Vigencia desde: 02/06/2025*	Vigencia hasta: 30/09/2030*

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

Nota: La vigencia de la garantía de calidad del servicio, deberá ajustarse cuando se suscriba el acta de entrega y recibo final de las obras.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario:	Nombre / Cargo:	Firma:
Contratista:		
Proyectó y/o:	Carla Tatiana Uribe Rendón Abogada Contratista	

Los actos firmados mediante este formato, se realizan en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, por lo tanto, la firma digital tiene la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita o presencial. El suscribiente se obliga a las disposiciones legales vigentes y por ello, bajo su entera responsabilidad es presentado para firma.

Pólizas actualizadas acta de entrega y recibo final:



APROBACIÓN DE GARANTÍAS

El Peñol, Antioquia, 05 de febrero de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que ayala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato **No. CD-013-2025**, cuyo objeto es *"realizar la interventoria técnica administrativa, legal y financiera al contrato IP 003 de 2025 para la construcción de pavimento rígido en el sector de arreboles al barrio horizontes del corregimiento de puerto perales en el municipio de Puerto Triunfo Antioquia"*

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, de conformidad **acta de entrega y recibo a satisfacción** del contrato en mención, suscrito entre las partes.

TOMADOR/AFIANZADO:	SUMINISTRANTE S.A.S.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. Y MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	
NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO:	30-44-101082353
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO ANEXO SI APLICA:	9
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29/01/2025

GARANTÍAS OTORGADAS

	Valor asegurado:	Vigencia desde:	Vigencia hasta:
1. CUMPLIMIENTO: Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más y por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	$5.576.273,40	03/03/2025	30/03/2026



2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: igual al plazo del contrato y tres (03) años más por el único por ciento (5%) del valor total del contrato.	$2.788.136,70	03/03/2025	30/09/2030
3. CALIDAD DEL SERVICIO: cinco (05) años más contados a partir del acta de recibo a satisfacción y veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	$11.152.546,80	12/11/2025	12/11/2030

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Funcionario:	Nombre - Cargo:	Firma:
Contratista:		
Proyectó y/o:	Carla Tatiana Uribe Rendón Abogada Contratista EAEP	

Los actos firmados mediante este formato, se realizan en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, por lo tanto, la firma digital tiene la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita o presencial. El suscribiente se obliga a las disposiciones legales vigentes y por ello, bajo su entera responsabilidad es presentado para firma.

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

Igualmente se aportó certificación del contratista de estar al día en el pago de la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses, planillas de seguridad social, relación de gastos, bitácora, informe de actividades ejecutadas, acta de avance, informe socio ambiental, paz y salvos, factura de cobro, acta de entrega y recibo final y demás documentos.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha
FVE40	$15.502.121	25/03/2026

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	29	29 de enero de 2025	01.2.4.5.02.09.04.01	CD-013-2025 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	$45.179.177
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	440	28 de agosto de 2025	01.2.4.5.02.09.04.01	CD-013-2025 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	$10.583.557
TOTAL					$55.762.734
RESERVA PRESUPUESTAL	66	20 de febrero de 2025	01.2.4.5.02.09.04.01	CD-013-2025 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	$45.179.177
RESERVA PRESUPUESTAL	435	28 de agosto de 2025	01.2.4.5.02.09.04.01	CD-013-2025 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL	$10.583.557

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

				BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	
TOTAL					$55.762.734

6. OTRAS OBSERVACIONES

No aplica.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 25 de marzo de 2026, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día veinticinco (25) de marzo de 2026.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - EAEP	
Revisado por	Brahian Gómez Vallejo Ingeniero Civil - EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ACTA DE COBRO 3 INTERVENTORIA

OBJETO

REALIZAR LA INTRERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRTIVA, LEGAL FINACIERA AL CONTRATO IP-003 DE 20205 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA

CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP NIT: 901537748-4	PERIODO DE ACTA	DEL 01/06/2025 AL 16/06/2025 Y DEL 4/07/2025 AL 15/07/2025			VALOR INICIAL	$ 45.178.177	ADICION			$ 10.583.557	VALOR FINAL	$ 55.762.734
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO PERALES	PLAZO INICIAL	3 MESES			PRORROGA N°1	1 MES	SUSPENSION 2			18/07/2025		
						SUSPENSION N°1	15 DIAS	REANUDACION 2			28/08/2025		
INTERVENTORÍA:	SUMINISTRARTE S.A.S. NIT: 900.831.977-1	CONTRATO	CD-03-2025			FECHA DE TERMINACION	20/07/2025	FECHA FINALIZACION OTRO SI 2			30/09/2025		

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PRESTACIONES	GASTOS	PLAZO	VALOR TOTAL	ADICION	VALOR TOTAL	ACTA N°1		ACTA N°2		ACTA N°3		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
										CANTIDAD (MES)	VR TOTAL	CANTIDAD (MES)	VR TOTAL	CANTIDAD (MES)	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1							$ 25.669.500												
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 6.000.000	$ 0	20%	3,00	$ 16.350.000	$ 5.664.806	$ 22.014.806	A	$ 17.113.000	A	$ 8.556.500		$ 8.893.745	A	$ 34.563.245	A	$ 0
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.000.000	$ 1.100.000	100%	3,00	$ 9.300.000	$ 3.100.000	$ 12.400.000	2,00	$ 6.200.000,00	1,00	$ 3.100.000,00	1,00	$ 3.100.000,00	4,00	$ 12.400.000,00	0,00	$ -
1,3	RESIDENTE AMBIENTAL Y HSEQ	1,00	$ 2.300.000	$ 0	50%	3,00	$ 3.450.000	$ 1.150.000	$ 4.600.000	2,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00	4,00	$ 4.600.000,00	0,00	$ -
2																			
2,1	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 16.350.000	$ 5.664.806	$ 22.014.806		$ 10.900.000,00		$ 5.450.000		$ 5.664.806		$ 22.014.806,00		$ -
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,57	1,57	1,57		1,57		1,57		1,57		1,57		1,57
2,3	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 25.669.500	$ 8.893.745	$ 34.563.245		$ 17.113.000,00		$ 8.556.500,00		$ 8.893.745,42		$ 34.563.245,00		$ -
3							$ 25.669.500	$ 8.893.745	$ 34.563.245		$ 17.113.000		$ 8.556.500		$ 8.893.745		$ 34.563.245		
3							$ 12.296.199			B	$ 8.012.948	B	$ 150.000		$ 4.133.247	B	$ 12.183.247	B	$ 0
3							$ 12.183.247		$ 12.183.247										
3,1	VEHICULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE COMBUSTIBLE.	1,00	$ 3.000.000			3,00	$ 9.000.000		$ 9.000.000	2,00	$ 6.000.000,00		$ -	1,00	$ 3.000.000,00	3,00	$ 9.000.000,00	0,00	$ -
3,2	OFICINA (ARRENDAMIENTO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1,00	$ 800.000			3,00	$ 2.400.000		$ 2.400.000	2,00	$ 1.600.000,00		$ -	1,00	$ 800.000,00	3,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ -
3,3	PAPELERÍA	1,00	$ 150.000			3,00	$ 450.000		$ 450.000	2,00	$ 300.000,00	1,00	$ 150.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -
3,4	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA.						$ 333.247		$ 333.247						$ 333.247		$ 333.247	0,00	
4							$ 112.948		$ 112.948		$ 0						$ 112.948		
4,1	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)						$ 112.948		$ 112.948		$ 112.947,94						$ 112.947,94		0
VALOR BÁSICO TOTAL							$ 37.965.695	$ 8.893.745	$ 46.859.440		$ 25.125.948		$ 8.706.500		$ 13.026.992		$ 46.859.440		$ 0
IVA						19%	$ 7.219.588	$ 1.689.812	$ 8.909.294		$ 4.779.930		$ 1.654.235		$ 2.475.129		$ 8.909.294		$ 0
TOTAL INTERVENTORÍA							$ 45.178.177	$ 10.583.557	$ 55.762.734		$ 29.899.878		$ 10.360.735		$ 15.502.121		$ 55.762.734		$ 0

VALOR PRESENTE ACTA N°3 : QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/C


RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
CONTRATISTA
RPL. SUMINISTRARTE S.A.S

ANGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P

SUMINISTRARTE

INFORME DE INTERVENTORÍA 3

DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2025

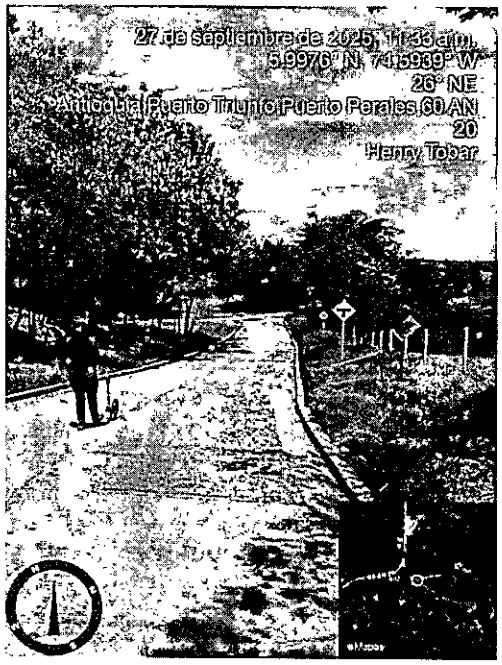

CONTRATO IP 003 -2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

Contratante: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

NIT: 800.105.497-0

Contratista: NIROSOF INGENIERIA

Y TRANSPORTE S.A.S NIT.

900599096-2

Objeto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

SUMINISTRARTE

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3
2 Generalidades 4
2.1 Localización del Proyecto 4
2.2 Información del contrato de Interventoría 5
2.3 Información del contrato de obra 5
3 procesos Administrativos 6
3.1 Vigencia de las garantías 6
a Presupuesto de obra 8
5 relación de correspondencia y bitácora 10
6 seguimiento de obra 11
6.1 Valor del contrato de obra 11
6.2 Pagos aprobados 11
7 Resultados De Ensayos Y Pruebas 11
10 Anexo presupuestal y legal al contrato 13
10.1 Modificaciones realizadas 13
11 Actividades ejecutadas y registro fotográfico 16
11.1 Actividades ejecutadas 16
11.2 Registro fotográfico 18
12 Estado del Tiempo 29
13 Avance de obra 30
13.1 Maquinaria y equipo de la obra 30
13.2 PERESONAL EN OBRA ACTIVO 30
13.3 PERSONAL DE INTERVENTORIA 31
13.2 Materiales de la obra 31
14 Seguridad industrial y aspectos sociales 31
14.1En relación con elementos de protección personal, ... 32
14.2 Aspectos ambientales, impacto urbano y seguridad industrial 32
14.3 Seguimiento y aprobación de materiales 33
16 Conclusiones, Recomendaciones y Observaciones 33
17 Anexos 33

1 INTRODUCCIÓN

La EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL bajo el contrato interadministrativo 022 de 2025 con el municipio de Puerto Triunfo y mediante proceso de contracción IP 003-2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA", suscribió el contrato adjudicado NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE S.A.S a un plazo de tres meses.

Y mediante el proceso de selección CD- 013 -2025, suscribe el contrato de interventoría, con SUMINISTRARTE SAS en la cual corresponde a: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"


Así mismo teniendo en cuenta los requerimientos del anexo técnico, el presente informe recopila las diferentes actividades ejecutadas por el contratista de OBRA y por la Interventoría durante los periodos comprendidos entre el 28 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

2 Generalidades

2.1 Localización del Proyecto

Las actividades descritas en el contrato se están realizando en el corregimiento de Puerto Perales municipio de Puerto Triunfo, localizado en la subregión del Magdalena Medio en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Puerto Nare, por el este con el departamento de Boyacá, por el sur con el municipio de Sonsón y por el oeste con los municipios de San Francisco y San Luis. Dista 180 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia.

Figura 1. Localización del proyecto.

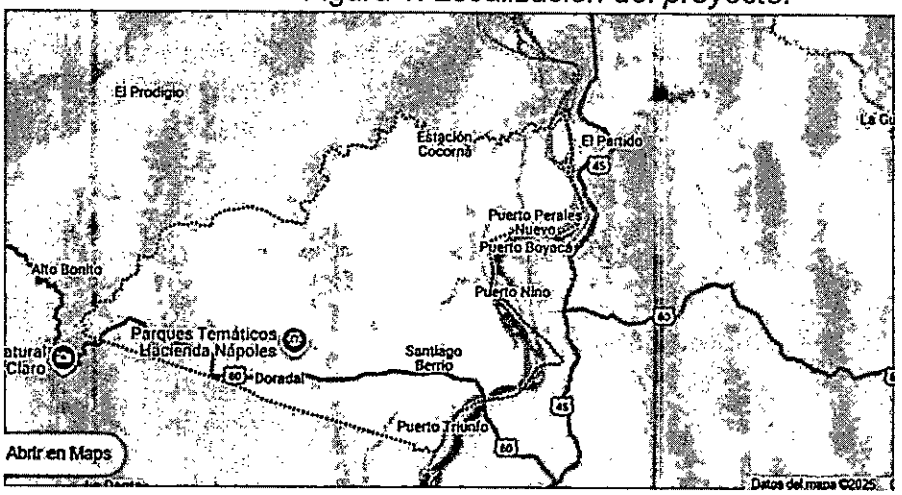

Se ubica al norte de la cabecera municipal y limita al norte con Puerto Nare, al sur y al oriente con el departamento de Boyacá, y al occidente con el corregimiento Estación Cocorná.

SUMINISTRARTE

2.2 Información del contrato de Interventoría

FIRMA INTERVENTORA:	SUMINISTRARTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANA CANDELARIA CUELLO MEJIA**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	tres (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRORROGA No 1	Por un (1) meses contados a partir de la fecha de terminación inicial
FECHA DE TERMINACION	02 de julio de 2025
SUSPENSION 1	DESDE EL 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 2	DEL 18 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REANUDACION 2	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION OTRO SI 2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($45.179.177)
VALOR ADICION:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C ($10.583.557)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($55.762.734)

2.3 Información del contrato de obra

FIRMA CONTRATISTA:	NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE S.A.S
NIT O CÉDULA:	900.599.096-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO DURANGO ZORA
CONTRATO DE OBRA No	IP-003-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	02 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

SUMINISTRARTE

PRORROGA N°1	UN (01) MES contado a partir de la terminación inicial
FECHA DE TERMINACION:	02 de julio de 2025
SUSPENSION 1	DESDE EL 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 2	DEL 18 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO N°2	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE REINICIO N°2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 864,858,536
VALOR ANTICIPO	$432.429.268 (50%)
VALOR ADICION	$ 151.193.668
VALOR TOTAL FINAL	$1.016.052.204

3 procesos Administrativos

3.1 Vigencia de las garantías

PÓLIZAS CONTRATISTA				VIGENCIA	
Riesgo	**Compañía aseguradora**	**No**	**Vr. Asegurado**	**Inicial**	**Final**
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	465-47-944 000012385	$ 86.485.853.60	17/02/2025 17/11/2025	17/02/2026 20/01/2026
Buen manejo del anticipo		465-47-944 000012385	$ 432.429.268	17/02/2025 17/05/2025	17/02/2025 20/01/2026
Prestaciones Sociales		465-47-944 000012385	$ 43.242.926.80	17/02/2025 17/05/2028	17/02/2025 02/07/2028
Estabilidad de la obra		465-47-944 000012385	$ 172.971.707.20	17/02/2025 5AÑOS	17/02/2025 20/07/2028
Responsabilidad Civil		465-74-994 000003686	$ 284.700.000	17/02/2025 17/05/2025 20/07/2025	02/07/2025 20/07/2025 30/09/2025
PÓLIZAS INTERVENTORÍA				**VIGENCIA**	
Riesgo	**Compañía aseguradora**	**No**	**Vr. Asegurado**	**Inicial**	**Final**

SUMINISTRARTE

Cumplimiento	Seguros DEL	30-44-101 062353	$ 4.517.917.70	20/02/2025 20/11/2025	03/05/2025 01/12/2025
Prestaciones Sociales		30-44-101 062353	$ 2.258.958.85	20/02/2025 20/05/2030	03/03/2025 31/05/2030
Calidad del servicio		30-44-101 062353	$ 9.035.835.40	20/05/2025 31/05/2030	31/05/02025 31/05/2030

Anexo 3 Pólizas

SUMINISTRARTE

a ***Presupuesto de obra***

expone a continuación el presupuesto de obra oficial

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	200.00	$ 17,195.00	$ 3,439,000.00
1.2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR	GLB	1.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	M3	200.00	$ 77,247.91	$ 15,449,583.00
2.2	CONFORMACION DE LA CALZADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	M2	6148.00	$ 20,511.06	$ 126,101,969.00
2.3	CONFORMACION DE LA CALZADA CONMATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Y su medida será en sitio ya compactado.	M2	200.00	$ 5,796.77	$ 1,159,354.00
3	PAVIMENTO BORDILLO Y CUNETAS				
3.1	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICOpara pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoria. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su Item respectivo.	M3	1160.00	$ 262,362.28	$ 304,340,243.00
3.2	SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoria. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su Item respectivo.	M3	62.96	$ 1,025,586.28	$ 64,575,014.00
3.3	Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	9740.00	$ 1,559.30	$ 15,187,582.00
3.4	Suministro, Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	565.00	$ 8,143.30	$ 4,600,965.00

SUMINISTRARTE

4	CONSTRUCCION DE COLECTOR CARRERA 19 desde C1 A C3				
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	76.64	$ 30,331.06	$ 2,324,621.00
4.2	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC_MN_OC03_02_	M2	174.39	$ 33,834.60	$ 5,900,416.00
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø182 / 200MM, INCLUYEINCLUYE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, ADHESIVO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	58.13	$ 69,823.15	$ 4,058,820.00
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø160 MM , INCLUYEINCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	30.00	$ 43,245.50	$ 1,297,365.00
4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNSILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 8" X 6"	UND	6.00	$ 128,821.79	$ 772,931.00
4.6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1	UND	6.00	$ 835,482.18	$ 5,012,893.00
4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN DE 1.20 M LONGITUD 1.00M PUESTO EN OBRA.	UN	2	$ 1,011,493.90	$ 2,022,988.00
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO CUELLO Y TAPA PREFABRICADOS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN	UN	2	$ 600,161.84	$ 1,200,324.00
4.9	CONSTRUCCIÓN DE MESA CON DIÁMETRO DE 1,60M Y 0,20M DE ESPESOR Y CAÑUELA CON UN DIÁMETRO DE 1,20M Y 0,20M DE ESPESOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DIÁMETRO DE 1,20 M, LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA CAÑUELA SERÁ EL 15% Y DEBE SER EN CONCRETO DE 21MPA ESMALTADA CON CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UN	2	$ 600,161.84	$ 1,200,324.00
4.10	LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	78.52	$ 122,449.60	$ 9,614,743.00
4.11	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	64.49	$ 8,568.00	$ 552,528.00
5	CONTENCIÓN DE TALUD				
5.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	225.00	$ 17,195.00	$ 3,868,875.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCL. MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 12,5 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	150.00	$ 390,912.00	$ 58,636,800.00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REF 2000	M2	120.00	$ 25,829.00	$ 3,099,480.00
6	ASEO				
6.1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA	UND	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 645,416,816.00
				ADMINISTRACIÓN (29%)	$ 187,170,877.00
				UTILIDAD (5%)	$ 32,270,841.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO (33%)	$ 219,441,718.00
				VALOR TOTAL OBRA	$ 864,858,536.00

SUMINISTRARTE

5 relación de correspondencia y bitácora

a. Correspondencia recibida física y correos.

FECHA DE RECIBO	FIRMANTE	ASUNTO
12/02/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Presentación de hojas de vida y plan de inversión de anticipo
15/022025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de cambio de residente de obra
21/04/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de aprobación de ítems no previstos y balance N°1
06/05/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de suspensión de obra
30/05/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de aprobación de prorroga
10/07/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de adición presupuestal
29/08/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de comité técnico aprobación de mayores y menores balance 2
05/08/2025	proyectopuertoperalesnirosof@gmail.com	Solicitud de prorroga a la suspensión

b. Correspondencia enviada física y correos

FECHA DE ENVIÓ	FIRMANTE	ASUNTO
10/03/2025	interventoriaperales@gmail.com	Visto bueno y aprobación anticipo y hojas de vida obra
16/03/2025	interventoriaperales@gmail.com	Aprobación de cambio de residente de obra
07/05/2025	interventoriaperales@gmail.com	Respuesta suspensión de
12/05/2025	interventoriaperales@gmail.com	Aprobación de ítems no previstos y balance N°1
30/05/2025	interventoriaperales@gmail.com	Aprobación de prorroga contrato de obra
30/05/2025	interventoriaperales@gmail.com	Solicitud de prorroga interventoría
11/07/2025	interventoriaperales@gmail.com	Aprobación de balance 2 y adición presupuestal
17/07/2025	interventoriaperales@gmail.com	Aprobación de prorroga a la suspensión
02/09/2025	interventoriaperales@gmail.com	Acta de comité técnico de obra

Anexo 4. Oficios
Anexo 5 bitácora

6 seguimiento de obra

6.1 Valor del contrato de obra.

A continuación, observaremos el valor contratado del proyecto:

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 645,416,818.00
ADMINISTRACIÓN	**29%**	$ 187,170,877.00
IMPREVISTOS	**0%**	0.00
UTILIDADES	**5%**	$ 32,270,841.00
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA **VALOR ADICION**		**$ 864.858.536,00** **$151.193.668**

6.2 Pagos aprobados

RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA		ACTA N0.1	ACTA N°2	ACTA N° 3
VALOR COSTO DIRECTO	**$ 645,416,818.00**	**$ 340.242.019**	**$ 225.635.824**	**$ 192.349.317**
ADMINISTRACIÓN	**$ 187,170,877.00**	**$ 98.670.185**	**$ 65.434.389**	**$ 55.781.302**
IMPREVISTOS	**0.00**		**0.00**	**0.00**
UTILIDADES	**$ 32,270,841.00**	**$ 17.012.101**	**$ 11.281.791**	**$ 9.617.466**
AMORTIZACION ANTICIPO, 50 % ACTA DE OBRA	**$ 432,429,268**	**$ 227.962.153**	**$ 151.176.002**	**$ 53.291.113**
VALOR TOTAL PAGADO ACTAS DE AVANCE		**$ 227.962.153**	**$ 151.176.002**	**$ 204.456.972**

7 Resultados De Ensayos Y Pruebas

A medida que ha avanzado el proyecto se han realizado los ensayos correspondientes, ensayo de concretos y densidades de campo

SUMINISTRARTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCARE S.A.S

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.
EMPRESA:	MINOBOP INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA (kN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	AREA (cm2)	PULGADAS	FECHA FUNDIDO (dd/mm/aa)	FECHA FALLADO (dd/mm/aa)	DIAS DE FALLADO (dd)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa)
1	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	139,8	2835,3	99%	99%	176,84	4,8"	25-ago.-25	08-sep.-25	14	3	28,8	
2	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	153,5	3232,8	114%	99%	176,84	4,8"	25-ago.-25	12-sep.-25	18	3	33,0	
3	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	230,2	4118,2	122%	99%	176,84	4,8"	25-ago.-25	26-sep.-25	32	3	36,0	28

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

Jara Valderrama

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCARE S.A.S

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
EMPRESA:	MINOBOP INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA (kN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	AREA (cm2)	PULGADAS	FECHA FUNDIDO (dd/mm/aa)	FECHA FALLADO (dd/mm/aa)	DIAS DE FALLADO (dd)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa)
1	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	153,4	2744,3	72%	99%	176,84	4,8"	03-sep.-25	10-sep.-25	7	3	32,5	
2	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	180,5	3229,1	85%	99%	176,84	4,8"	03-sep.-25	17-sep.-25	14	3	38,2	
3	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	201,4	3603,1	94%	99%	176,84	4,8"	03-sep.-25	01-oct.-25	28	3	34,0	34

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

Jara Valderrama

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCARE S.A.S

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
EMPRESA:	MINOBOP INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA (kN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	AREA (cm2)	PULGADAS	FECHA FUNDIDO (dd/mm/aa)	FECHA FALLADO (dd/mm/aa)	DIAS DE FALLADO (dd)	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa)
1	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	139,8	2835,3	99%	99%	176,84	4,8"	11-sep.-25	18-sep.-25	7	3	28,8	
2	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	179,1	3204,0	94%	99%	176,84	4,8"	11-sep.-25	25-sep.-25	14	3	32,8	
3	SUBIDA HACIA LA BOMBA	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	0,96	202,2	3617,2	103%	99%	176,84	4,8"	11-sep.-25	09-oct.-25	28	3	34,8	34


NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

Jara Valderrama

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

CONCARES S.A.S. Estudios Geotecnicos

SUMINISTRARTE

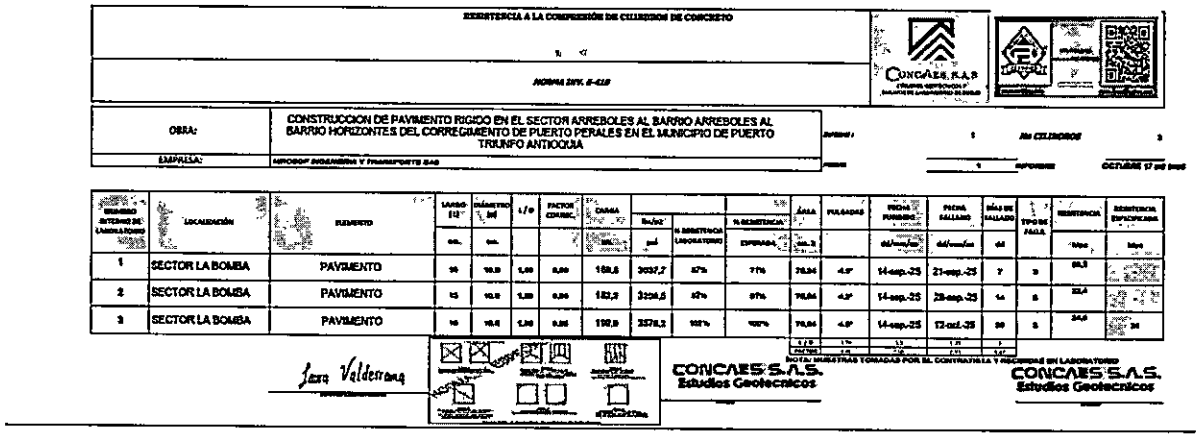

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


NORMA INVE. E-410

CONCAES S.A.S.

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA																					
EMPRESA:																						
1	SECTOR LA BOMBA	PAVIMENTO																				
2	SECTOR LA BOMBA	PAVIMENTO																				
3	SECTOR LA BOMBA	PAVIMENTO																				

CONCAES S.A.S. Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S. Estudios Geotecnicos

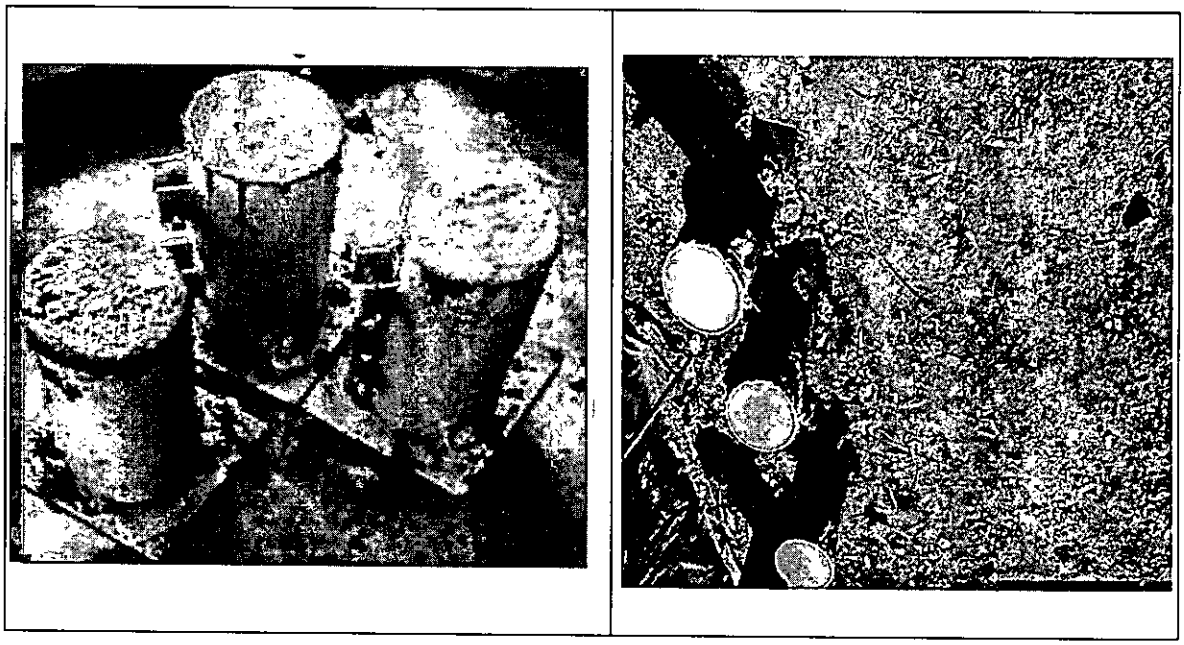

Anexo 8. Resultados de cilindros

10 Anexo presupuestal y legal al contrato

10.1 Modificaciones realizadas:

Se realizo balance 3 de las mayores y menores cantidades a ejecutar en los ítems contractuales, y considerando los cambios que se han realizado durante la ejecución del proyecto, de mayores y menores cantidades y de ítems no previstos.

SUMINISTRARTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTA ANTERIOR	VALOR ACTA ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	VALOR ACTUAL	MAYORES CANTIDAD	MAYORES VALOR	MENORES CANTIDAD	MENORES VALOR	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	PRELIMINARES														
1.1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	200,00	$ 17.195	$ 3.439.000	150,00	$ 2.579.250	352,50	$ 6.061.238	118,50	$ 2.037.606			502,50	$ 8.640.488
1.2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR	glb	1,00	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1,00	$ 9.000.000	0,00	$ 0					1,00	$ 9.000.000
2	TERRAPLENES Y SUBBASE														
2.1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medicia será en sitio ya compactado.	m3	200,00	$ 77.247,91	$ 15.449.583	99,47	$ 7.683.828	189,00	$ 14.599.856	107,73	$ 13.111.288			288,47	$ 22.283.684
2.2	CONFORMACION DE LA CALZADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensaye del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla a material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactada.	m2	6148,00	$ 20.511,06	$ 126.101.969	0,00	$ 0	0,00	$ 0					0,00	$ 0
2.3	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensaye del Próctor modificado., Y su medida será en sitio ya compactada.	m2	200,00	$ 6.794,77	$ 1.359.354	1002,00	$ 5.808.364	666,00	$ 3.860.649					1668,00	$ 9.669.012
3	PAVIMENTO, BORDILLO Y CUNETAS														
3.1	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICOpara pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	1.160,00	$ 262.362,28	$ 304.340.243	739,08	$ 193.906.713	181,92	$ 47.728.946					921,00	$ 241.635.659
3.2	SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	62,96	$ 1.025.566,28	$ 64.578.014	62,55	$ 64.150.422	61,90	$ 63.481.534			1,63	$ 1.672.014	124,45	$ 127.631.956
3.3	Corte, figurado e instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas, y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	9.740,00	$ 1.559,30	$ 15.187.582	9729,76	$ 15.171.614	0,00	$ 0			10,24	$ 15.968	9729,76	$ 15.171.614
3.4	Suministro, Corte, figurado e instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas, y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	865,00	$ 8.143,30	$ 4.600.965	1169,53	$ 9.523.841	3.633,11	$ 29.585.468	464	$ 3.780.207			4802,64	$ 39.109.310
4	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOR CARRERA [illegible]														
4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	74,64	$ 30.331,06	$ 2.264.621	74,64	$ 2.263.835	253,18	$ 7.679.280	72,64	$ 2.202.909			327,82	$ 9.943.115
4.2	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO. SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC_MN_OC03_02_	m2	174,39	$ 33.834,60	$ 5.900.416	171,60	$ 5.806.018	0,00	$ 0			2,79	$ 94.399	171,60	$ 5.806.018

SUMINISTRARTE

4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø182 / 200MM, INCLUYEINCLUYE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, ADHESIVO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	58,13	$ 69.823,15	$ 4.058.820	58,13	$ 4.058.820	0,00	$ 0					58,13	$ 4.058.820
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø160 MM , INCLUYEINCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	30,00	$ 43.245,50	$ 1.297.365	30,00	$ 1.297.365	6,00	$ 259.473	6,00	$ 259.473			36,00	$ 1.556.838
4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNSILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 8" X 6"	Und	6,00	$ 128.821,79	$ 772.931	6,00	$ 772.931	0,00	$ 0					6,00	$ 772.931
4,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1	Und	6,00	$ 835.482,18	$ 5.012.893	0,00	$ 0	6,00	$ 5.012.893					6,00	$ 5.012.893
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN DE 1.20 M LONGITUD 1.00M, PUESTO EN OBRA.	Und	2,00	$ 1.011.493,90	$ 2.022.988	2,00	$ 2.022.988	0,00	$ 0					2,00	$ 2.022.988
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO CUELLO Y TAPA PREFABRICADOS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN	Und	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.324	2,00	$ 1.200.324	0,00	$ 0					2,00	$ 1.200.324
4,9	CONSTRUCCIÓN DE MESA CON DIÁMETRO DE 1,60M Y 0,20M DE ESPESOR Y CAÑUELA CON UN DIÁMETRO DE 1,20M Y 0,20M DE ESPESOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DIÁMETRO DE 1,20 M, LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA CAÑUELA SERÁ EL 15% Y DEBE SER EN CONCRETO DE 21MPA ESMALTADA CON CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Und	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.324	2,00	$ 1.200.324	0,00	$ 0					2,00	$ 1.200.324
4,10	LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" SUMINISTRO, EXTENDIDO Y PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	m3	78,52	$ 122.450	$ 9.614.743	12,74	$ 1.560.498	0,00	$ 0			-65,78	-$ 8.054.246	12,74	$ 1.560.498
4,11	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	64,49	$ 8.568	$ 552.528	0,00	$ 0	171,26	$ 1.467.345	106,77	$ 914.817			171,26	$ 1.467.345
5	CONVENIOS PRIVADOS														
5,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	225,00	$ 17.195	$ 3.868.875	55,26	$ 950.173	0,00	$ 0			-0,40	-$ 6.878	55,26	$ 950.173
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCL. MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 12,5 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	150,00	$ 390.912	$ 58.636.800	76,00	$ 29.709.312	0,00	$ 0					76,00	$ 29.709.312
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REF 2000	m2	120,00	$ 25.829	$ 3.099.480	144,00	$ 3.719.376	0,00	$ 0					144,00	$ 3.719.376
6	ASEO														
6,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA	Und	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 2.000.000					1,00	$ 2.000.000
7	NO PREVISTOS														
7,1	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA)	ml	1.734,40	$ 75.067		1600,00	$ 120.107.200	85,50	$ 6.418.229	85,50	$ 6.418.229			1685,50	$ 126.525.429
7,2	INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA PARA ESTABILIZAR TALÚD EN PUNTO CRÍTICO, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, SEMILLAS PARA REVEGETACIÓN, TIERRA ORGÁNICA	m2	120,00	$ 55.610		0,00	$ 0	56,42	$ 3.137.516			-43,58	-$ 2.423.654	56,42	$ 3.137.516
7,3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y POCETA	Glb	1,00	$ 1.006.111		1,00	$ 1.006.111	0,00	$ 0					1,00	$ 1.006.111
7,4	CONFORMACION DE LA CALZADA	m2	4.000,00	$ 3.213		5022,00	$ 16.135.686	0,00	$ 0					5022,00	$ 16.135.686
7,5	Suministro e instalación de material de subbase granular, compactado mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de lo mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactada	m3	600,00	$ 131.434		504,00	$ 66.242.852	-10,50	-$ 1.380.059					493,50	$ 64.862.793
7,6	CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE CAUDAL EN CONCRETO	ml	2,45	$ 357.324		0,00	$ 0	6,82	$ 2.436.950			-2,18	-$ 1.493.417	6,82	$ 2.436.950

	$ TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 345.819.516	$ 345.817.343	$ 175.545.517	$ 28.313.051	-$ 28.352.765	$ 791.330.160
% ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 107.179.877	$ 164.104.674	$ 84.791.362			$ 319.866.874
% IMPREVISTOS	8,00%	$ 33.373.841	$ 28.273.572	$ 9.417.444			$ 37.111.350
VALOR TOTAL DE OBRA		$ 464.869.526	$ 738.376.510	$ 269.744.094			$ 1.148.308.384
ANTICIPO	30,00%	$ 432.419.258					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	30,00%	$ 227.745.183					
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°1		$ 227.942.183					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	30,00%	$ 181.176.002					
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°2		$ 181.176.002					
ADICIÓN AL PRESUPUESTO		$ 181.198.668					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON LA ADICIÓN		$ 1.011.052.206					
VALOR ACTA PARCIAL N°1 + ACTA PARCIAL N°2 SIN AMORTIZACIÓN		$ 750.574.518					
TOTAL CON AMORTIZACION DEL VALOR CONTRACTUAL		$ 106.582.226					
VALOR A COBRAR ACTA N°3 CON AMORTIZACIÓN DE VALOR CONTRACTUAL	30,00%	$ 63.291.113					
VALOR TOTAL A COBRAR ACTA FINAL N°3		$ 181.168.888					

SUMINISTRARTE

11 Actividades ejecutadas y registro fotográfico

11.1 Actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACTA ANTERIOR VALOR	MAYORES CANTIDAD	MAYORES VALOR	MENORES CANTIDAD	MENORES VALOR	COTIZADO (ADJUDICADO) CANTIDAD	COTIZADO (ADJUDICADO) VALOR
1	PRELIMINARES												
1.1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	200,00	$ 17.195	$ 3.439.000	352,50	$ 6.061.238	118,50	$ 2.037.808			502,50	$ 8.640.488
1.2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR	glb	1,00	$ 9.000.000	$ 9.000.000	0,00	$ 0					1,00	$ 9.000.000
2	SUBRASANTE Y SUBBASE												
2.1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	200,00	$ 77.247,91	$ 15.449.583	189,00	$ 14.599.856	99,73	$ 7.711.268			288,47	$ 22.283.684
2.2	CONFORMACION DE LA CALZADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m2	6148,00	$ 20.511,06	$ 126.101.969	0,00	$ 0					0,00	$ 0
2.3	CONFORMACION DE LA CALZADA CONMATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Y su medida será en sitio ya compactado.	m2	200,00	$ 5.796,77	$ 1.159.354	666,00	$ 3.860.649					1668,00	$ 9.669.012
3	PAVIMENTO, BORDILLO Y CUNETAS												
3.1	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICOpara pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	1.160,00	$ 262.362,28	$ 304.340.243	181,92	$ 47.728.946					921,00	$ 241.635.659
3.2	SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la Interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa , vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	62,96	$ 1.025.586,28	$ 64.575.014	61,90	$ 63.481.534			11,83	$ 12.127.514	124,45	$ 127.631.956
3.3	Corte, figurado e instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	9.740,00	$ 1.559,30	$ 15.187.582	0,00	$ 0			10,24	$ 15.968	9729,76	$ 15.171.614
3.4	Suministro, Corte, figurado e instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	565,00	$ 8.143,30	$ 4.600.965	3.633,11	$ 29.585.468	45,54	$ 370.807			4802,64	$ 39.109.310

SUMINISTRARTE

4	CONSTRUCCION DE COLECTOR CARRERA 19 desde C1 A C3												
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	76,64	$ 30.331,06	$ 2.324.621	253,18	$ 7.679.280	72,54	$ 2.200.808			327,82	$ 9.943.115
4,2	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA. SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC_MN_OC03_02_	m2	174,39	$ 33.834,60	$ 5.900.416	0,00	$ 0			-2,79	-$ 94.399	171,60	$ 5.806.018
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø182 / 200MM. INCLUYEINCLUYE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, ADHESIVO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	58,13	$ 69.823,15	$ 4.058.820	0,00	$ 0					58,13	$ 4.058.820
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø160 MM , INCLUYEINCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	30,00	$ 43.245,50	$ 1.297.365	6,00	$ 259.473	6,00	$ 259.473			36,00	$ 1.556.838
4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNSILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 8" X 6"	Und	6,00	$ 128.821,79	$ 772.931	0,00	$ 0					6,00	$ 772.931
4,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1	Und	6,00	$ 835.482,16	$ 5.012.893	6,00	$ 5.012.893					6,00	$ 5.012.893
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN DE 1.20 M LONGITUD 1.00M PUESTO EN OBRA.	Und	2,00	$ 1.011.493,90	$ 2.022.988	0,00	$ 0					2,00	$ 2.022.988
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO CUELLO Y TAPA PREFABRICADOS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN	Und	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.324	0,00	$ 0					2,00	$ 1.200.324
4,9	CONSTRUCCIÓN DE MESA CON DIÁMETRO DE 1,60M Y 0.20M DE ESPESOR Y CAÑUELA CON UN DIÁMETRO DE 1,20M Y 0,20M DE ESPESOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DIÁMETRO DE 1.20 M. LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA CAÑUELA SERÁ EL 15% Y DEBE SER EN CONCRETO DE 21MPA ESMALTADA CON CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	Und	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.324	0,00	$ 0					2,00	$ 1.200.324
4,10	LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	m3	78,52	$ 122.450	$ 9.614.743	0,00	$ 0			-65,78	-$ 8.054.245	12,74	$ 1.560.498
4,11	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	64,49	$ 8.568	$ 552.528	171,26	$ 1.467.345	106,77	$ 914.817			171,26	$ 1.467.345
5	CONTENCIÓN DE TALUD												
5,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	m3	225,00	$ 17.195	$ 3.868.875	0,00	$ 0			-0,49	-$ 8.428	55,26	$ 950.173
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCL. MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 12.5 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	150,00	$ 390.912	$ 58.636.800	0,00	$ 0					76,00	$ 29.709.312
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REF 2000	m2	120,00	$ 25.829	$ 3.099.480	0,00	$ 0					144,00	$ 3.719.376
6	ASEO												
6,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA	Und	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1,00	$ 2.000.000					1,00	$ 2.000.000

SUMINISTRARTE

7	NO PREVISTOS											
7.1	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA)	ml	1.734,40	$ 75.067		85,50	$ 6.418.229	85,50	$ 6.418.229			1685,50	$ 126.525.429
7.2	INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA PARA ESTABILIZAR TALÚD EN PUNTO CRÍTICO, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, SEMILLAS PARA REVEGETACIÓN, TIERRA ORGÁNICA	m2	120,00	$ 55.610		56,42	$ 3.137.516			-43,58	-$ 2.423.684	56,42	$ 3.137.516
7.3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y POCETA	Glb	1,00	$ 1.006.111		0,00	$ 0					1,00	$ 1.006.111
7.4	CONFORMACION DE LA CALZADA	m2	6.000,00	$ 3.213		0,00	$ 0					5022,00	$ 16.135.686
7.5	Suministro e instalación de material de subbase granular, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado	m3	600,00	$ 131.434		-10,50	-$ 1.380.059					493,50	$ 64.862.793
7.6	CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE CAUDAL EN CONCRETO	ml	2,45	$ 357.324		6,82	$ 2.436.950			-4,18	-$ 1.493.614	6,82	$ 2.436.950

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 645.416.818		$ 192.349.317	$ 25.313.029	-$ 25.332.150	$ 758.227.160
% ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 187.170.877		$ 55.781.302			$ 219.885.876
% UTILIDADES	5,00%	$ 32.270.841		$ 9.617.466			$ 37.911.358
VALOR TOTAL DE OBRA		$ 864.858.536		$ 257.748.084			$ 1.016.024.394
ANTICIPO	50,00%	$ 432.429.268					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	50,00%	$ 227.962.153					
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°1		$ 227.962.153					
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	50,00%	$ 151.176.002					
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL N°2		$ 151.176.002					
ADICIÓN AL PRESUPUESTO		$ 151.193.668					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO CON ADICIÓN		$ 1.016.052.204					
VALOR ACTA PARCIAL N°1 + ACTA PARCIAL N°2 SIN AMORTIZACIÓN		$ 758.276.310					
TOTAL CON AMORTIZACION DEL VALOR CONTRACTUAL		$ 106.582.226					
VALOR A COBRAR ACTA N°3 CON AMORTIZACIÓN DE VALOR CONTRACTUAL	50,00%	$ 53.291.113					
VALOR TOTAL A COBRAR ACTA FINAL N°3		$ 151.165.858					

11.2 Registro fotográfico

1. Preliminares.

ITEM 1.1 EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

Excavación para remplazos y mejoramiento de la subrasante

SUMINISTRARTE




SUMINISTRARTE

ITEM 2.1 MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente máximo 50 cm, Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.




ITEM 2.3 CONFORMACION DE LA CALZADA CONMATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Y su medida será en sitio ya compactado.

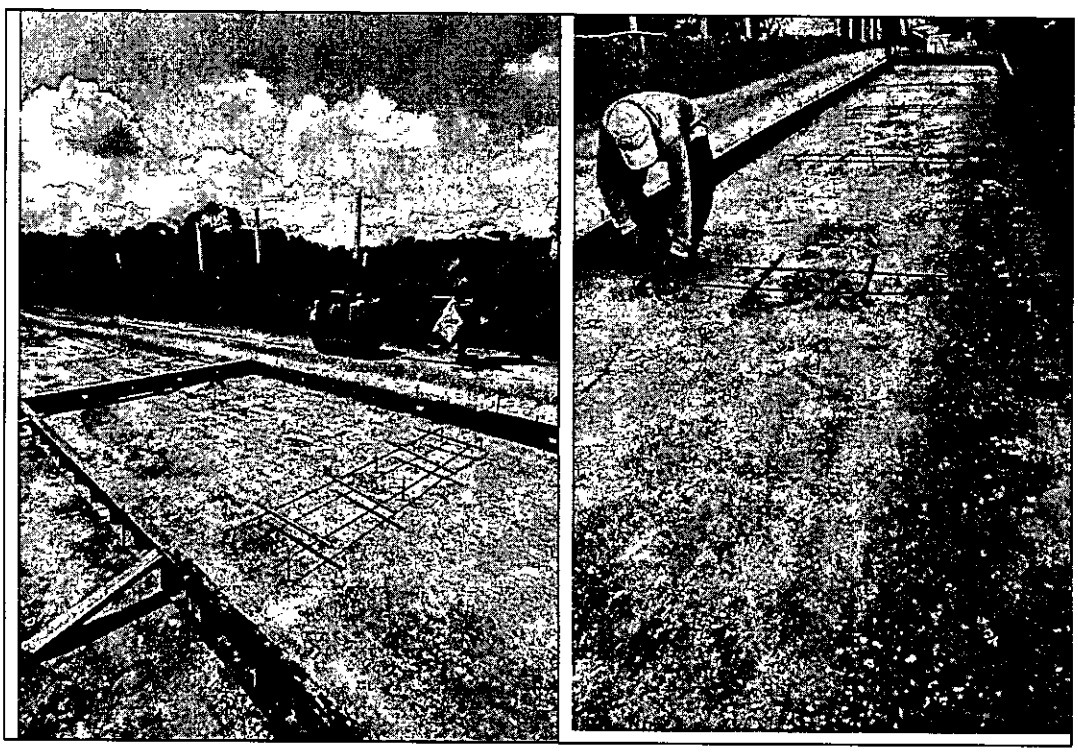


ITEM 3.1 PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.


SUMINISTRARTE

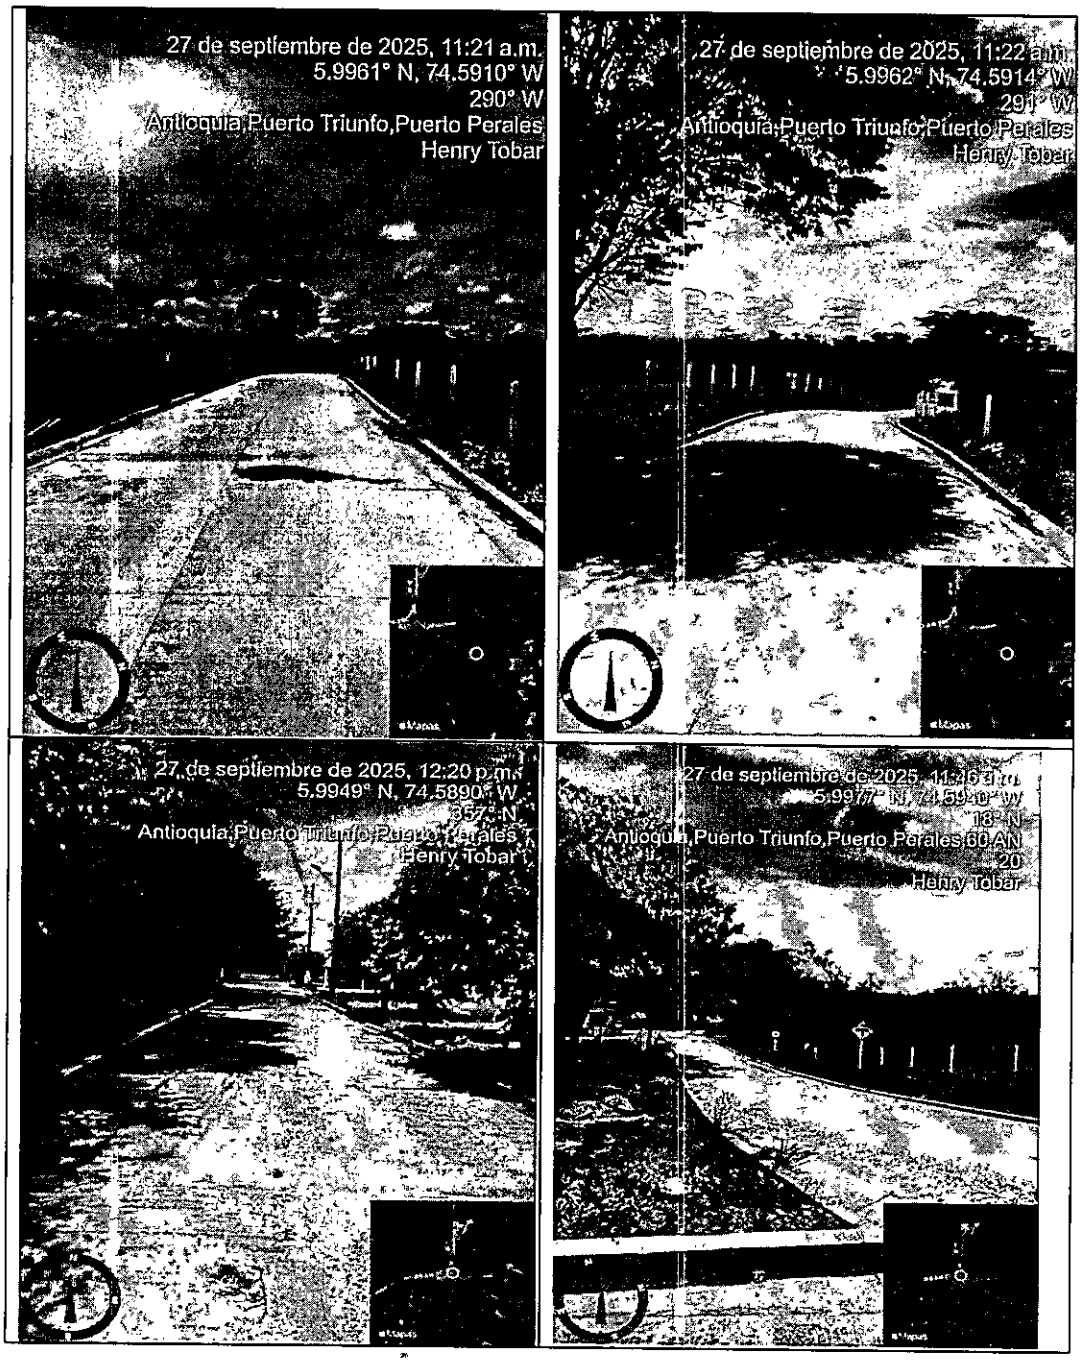



ITEM 3.2 SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.

SUMINISTRARTE

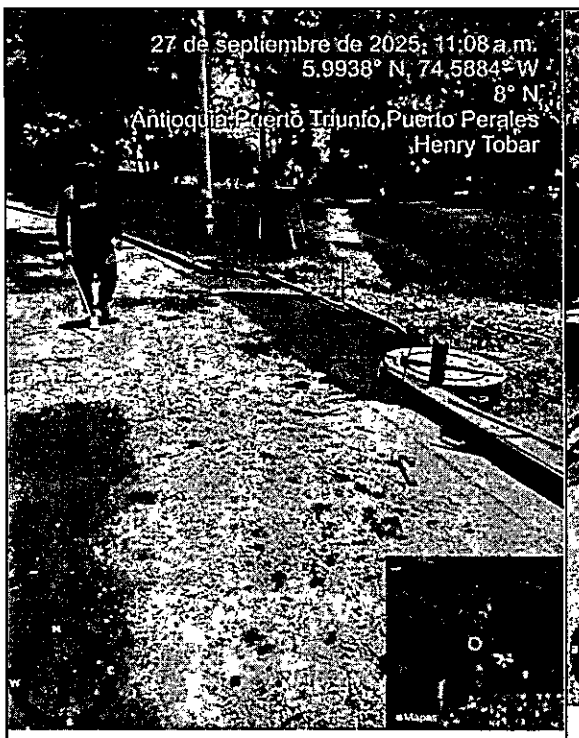

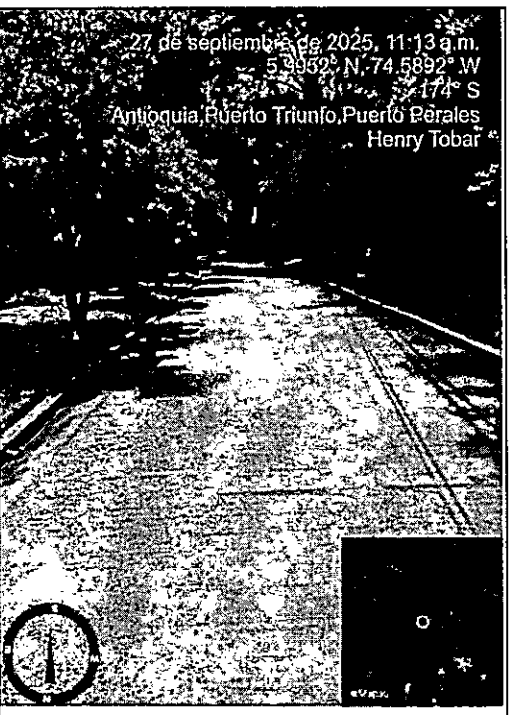


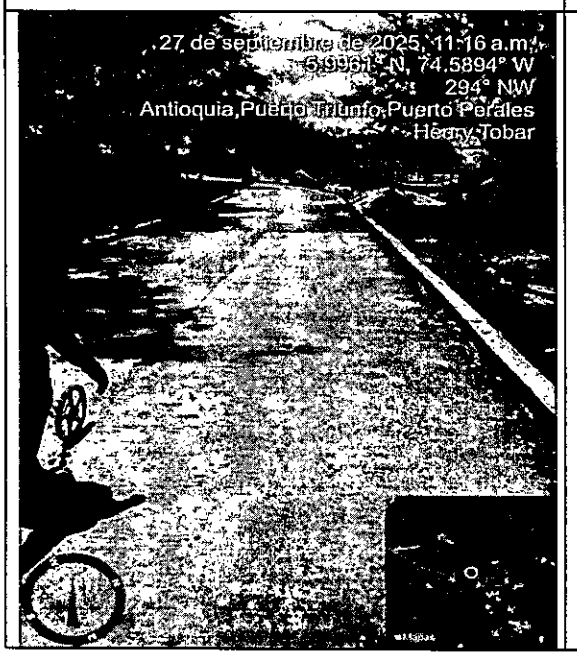

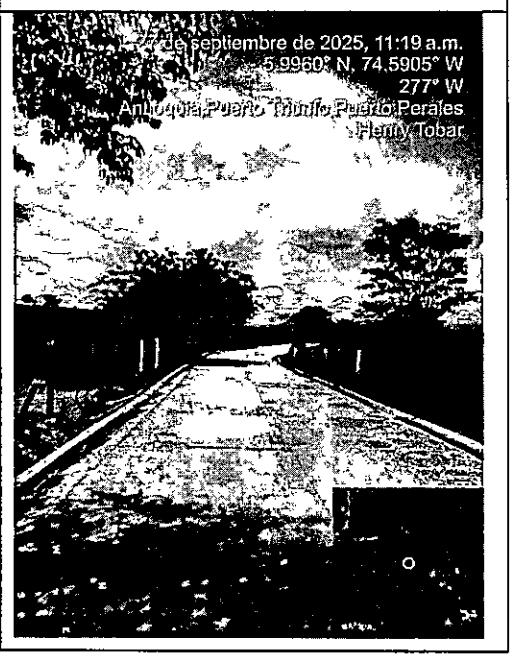

SUMINISTRARTE


ITEM 3.4 Suministro, Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

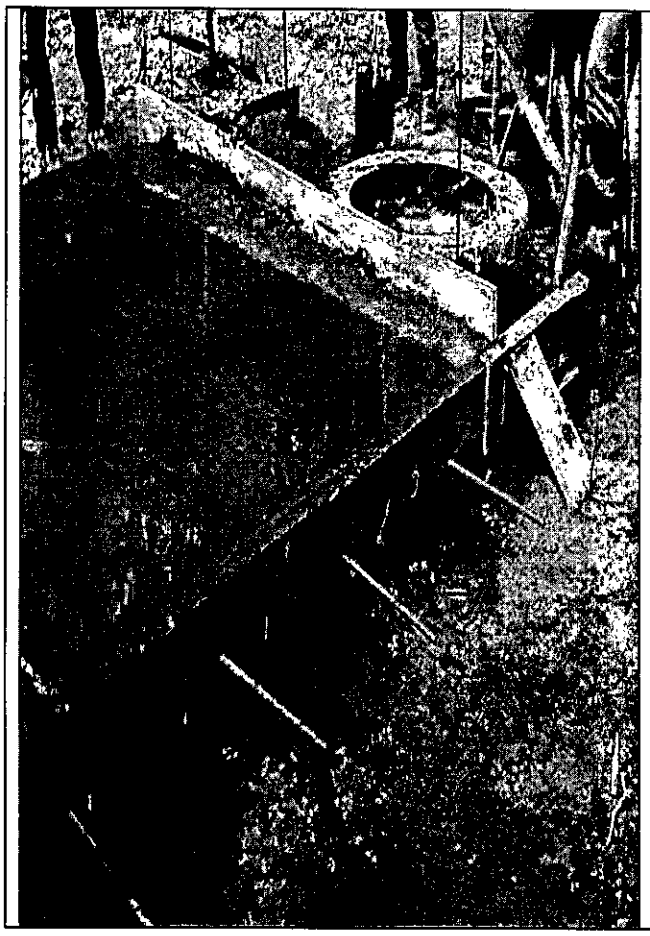




SUMINISTRARTE

ÍTEM 4.1 excavación manual en material común de 0-2 metros de profundidad (inc. retiro de sobrantes)
Excavación para cunetas

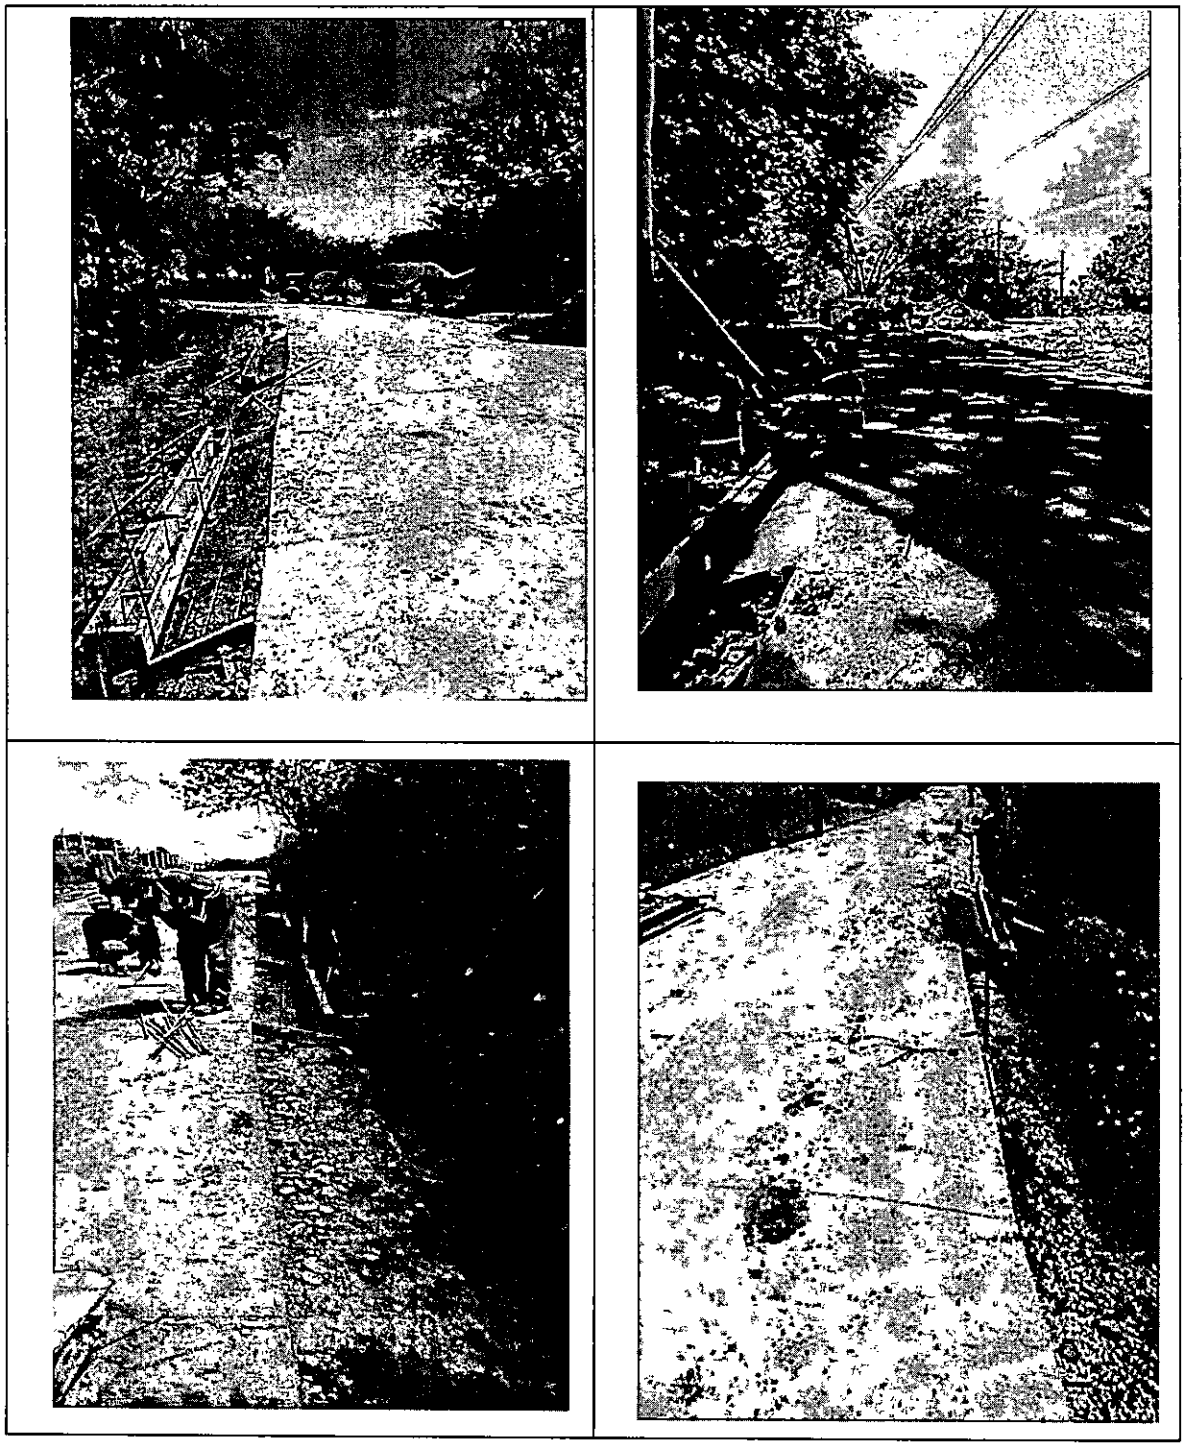


SUMINISTRARTE

ITEM 4.4 suministro, transporte e instalación de tubería pvc-alcantarillado o similar unión caucho ø160 mm , incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

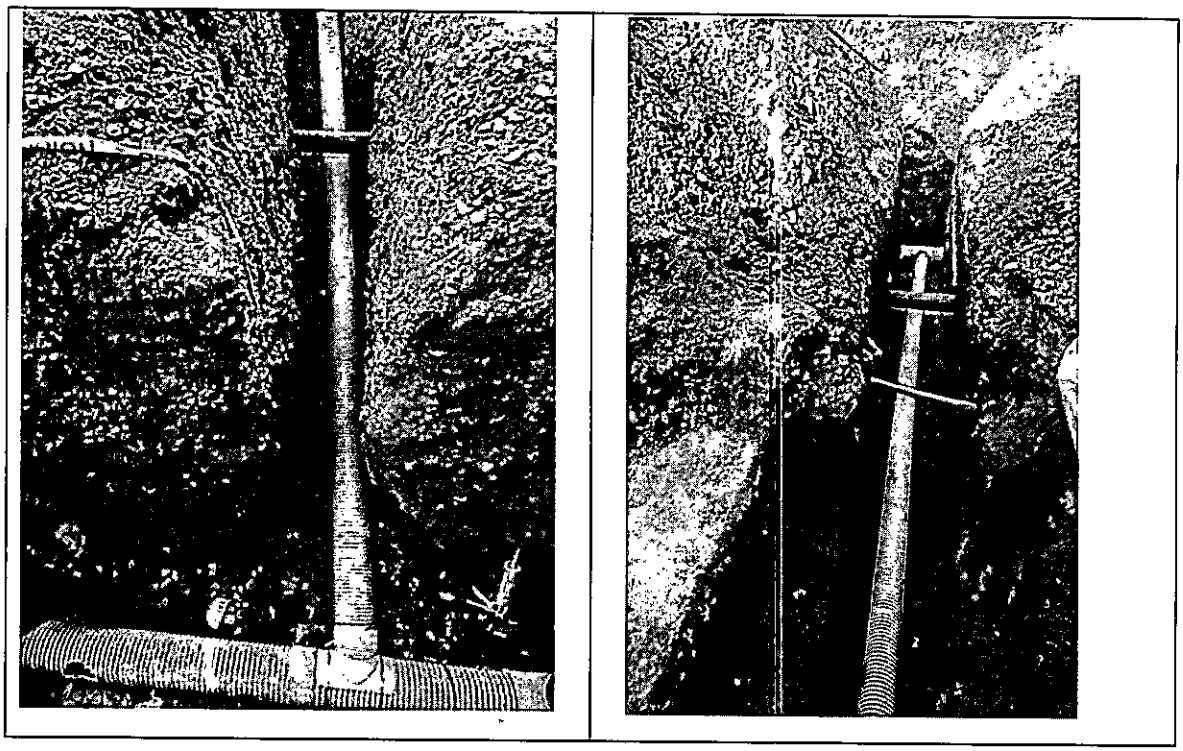

ITEM 4.6 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1

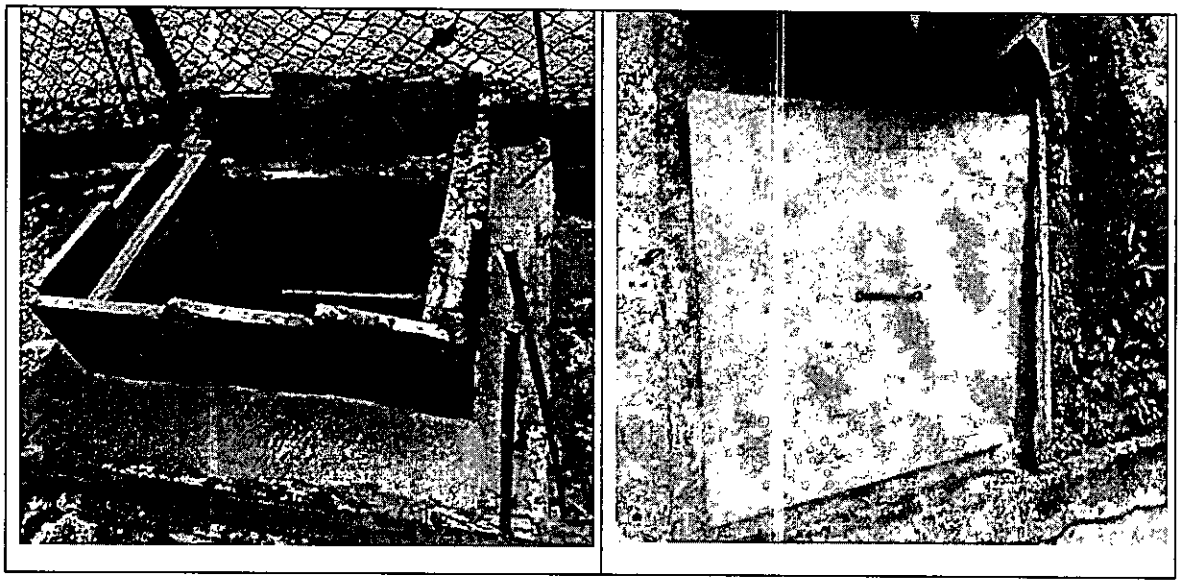


SUMINISTRARTE

ITEM 4.11 LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN



ITEM 6.1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA

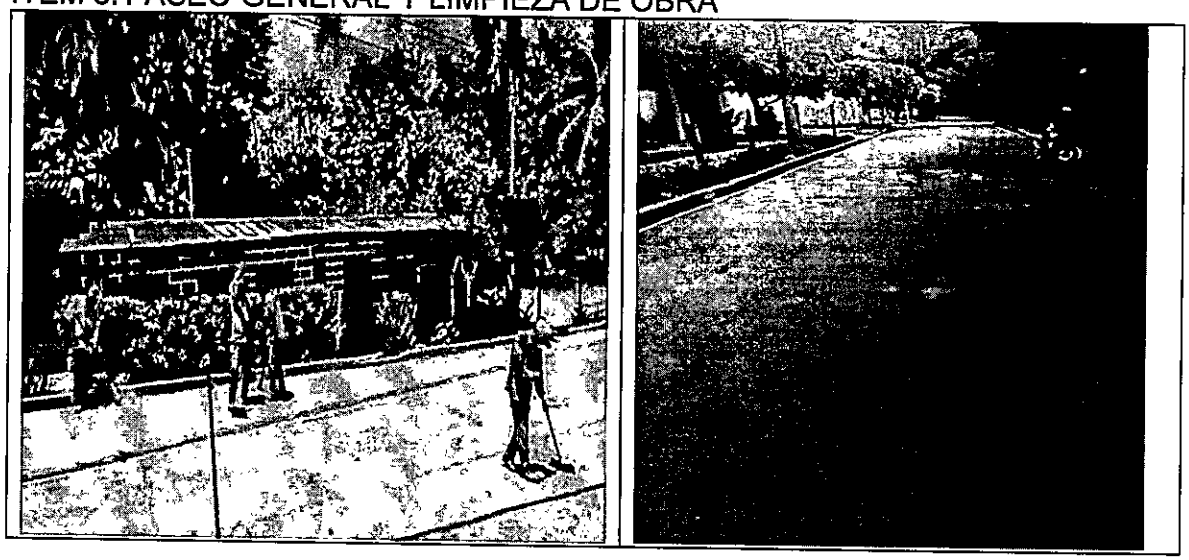


ITEM NO PREVISTOS


ITEM 7.1 mano de obra para la construcción de cuneta en concreto de 3000 psi y suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 6mm (material del concreto suministrado por la alcaldía).



ITEM 7.2 instalación de madera rolliza para estabilizar talúd en punto crítico, incluye geotextil no tejido, semillas para revegetación, tierra orgánica

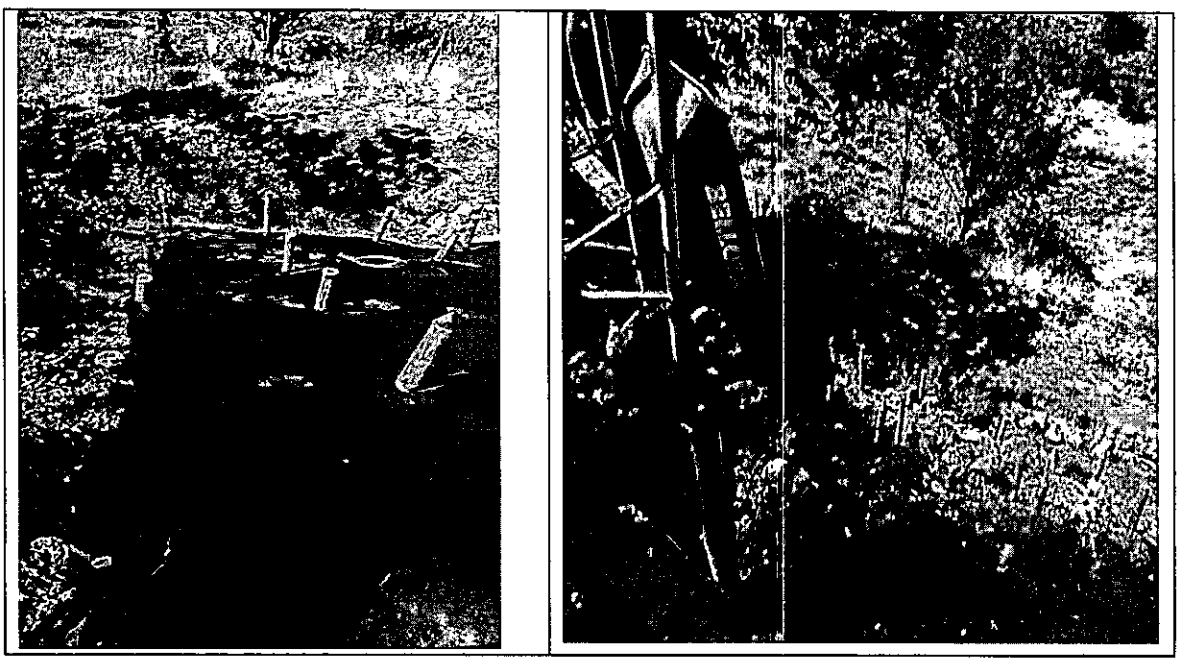


TEM 7.6 CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE CAUDAL EN CONCRETO

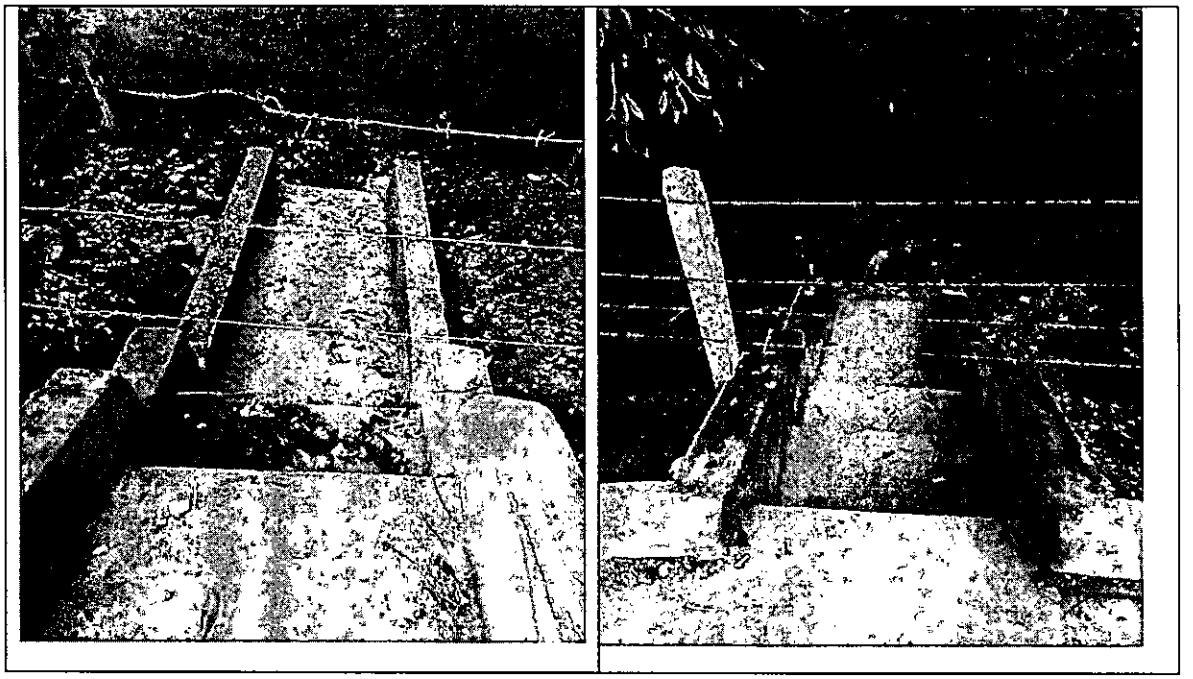

12 Estado del Tiempo

Se registra el estado del tiempo desde la apertura de la bitácora hasta el corte del presente informe, el estado del clima se tomó diariamente observando los boletines del clima de IDEAM.

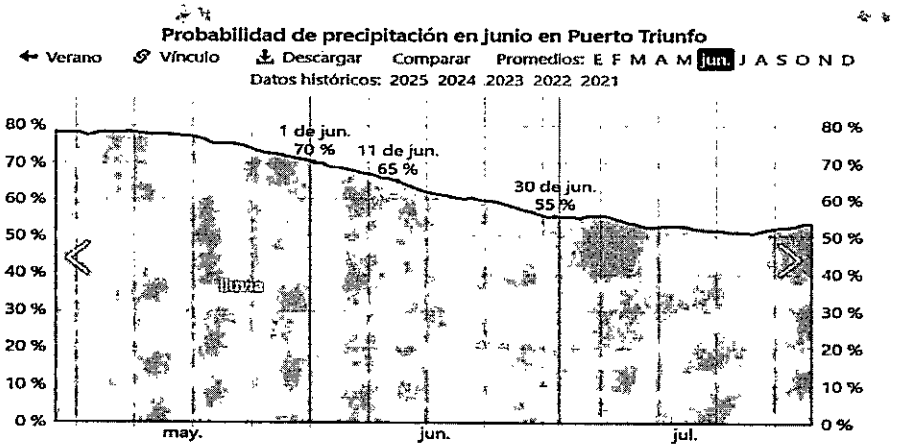

El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las cantidades ínfimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovió y nevó el mismo día).

SUMINISTRARTE

13 Avance de obra

Según lo programado en el cronograma de actividades la obra tiene un avance del 100 % a la fecha del corte 30 de septiembre de 2025

13.1 Maquinaria y equipo de la obra

Se relaciona la maquinaria y equipo utilizado en la obra.

Descripción	Cantidad
Carmix de 1.8 m3	1
Mezcladora de concreto	1
Vibrador de concreto	2
Retroexcavadora	1
Volquetas	1
motocarro	1
Planta eléctrica	1
Vibro compactador	1
Minicargador	1
Demoledor eléctrico	1

13.2 PERESONAL EN OBRA ACTIVO

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	SERGIO AMAURY DURANGO ZORA	98.505.041	DIRECTOR DE OBRA	SURA	PORVENIR	SURA
2	DAYANA MELISA CAMACHO MARIN	1.007.511.967	RESIDENTE DE OBRA	SURA	COLPENSIONES	SURA
3	TIANA MARIA RUA GUEVARA	1.036.662.847	RESIDENTE AMBIENTAL	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES	SURA
4	CATHERIN ANDREA PEREZ OSPINA	1.036.133.459	RESIDENTE SST	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
5	JOSE MANUEL AMAYA AGUDELO	71.481.028	MAESTRO DE OBRA	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA
6	JOSE GABRIEL BUSTOS MORALES	10.189.913	OFICIAL	FAMISANAR	SAVIA SALUD	SURA
7	JUAN ANDRES BALMACEA GIL	1.001.444.025	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
8	WILSON MANUEL BASILIO ESQUIVEL	1.005.439.071	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
9	JOHN JAIRO GONZALEZ COLORADO	1.036.222.804	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
10	RUBEN ALEXIS MUNOZ HERRERA	1.039.684.516	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	COLFONDOS	SURA

11	HECTOR ANTONIO GARCIA	14.324.156	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
12	LUIS FERNANDO MESA	1.007.568.699	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
13	ORNELA RAMIREZ RENTERIA	1.036.222.015	AYUDANTE	SURA	PORVENIR	SURA
14	JUAN CAMILO MORALES	1.073.320.098	AYUDANTE	SURA	PORVENIR	SURA
15	YULDER ARLEM MARTINEZ GIRALDO	1.036.132.511	TOPOGRAFO	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA

13.3 PERSONAL DE INTERVENTORIA

1	GUERRA MONCALEANO HECTOR	93.200.589	DIRECTOR	ALINZA SALUD		SURA
2	TOBAR LOPEZ HENRY	129744435	RESIDENTE	SURA	COLPENSIONES	SURA
3	BARAJAS PLAZAS YHARA	1049635578	SOCIOAMBIENTAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA

Anexo 12. Planillas de seguridad social

13.2 Materiales de la obra

A continuación, se relacionan los materiales utilizados para la ejecución de la obra.

- Cemento ALION (Portland tipo 1)
- Gravilla seleccionada y Arena de concreto (Gradación conforme a Diseño de Mezcla)
- Material seleccionado para afirmado
- Subbase granular
- Acero de refuerzo corrugado de 60.000 psi

14 Seguridad industrial y aspectos sociales

En Este aspecto se ha dispuesto en el sitio de la obra en cada uno de los frentes un botiquín dotado de todos los elementos necesarios para ofrecer los primeros auxilios al personal, en caso de emergencia así:

Material para limpieza y protección de los tejidos: Gasa pre cortada, apósitos para hemorragias y sangrados, apósitos para los ojos, esparadrapo antialérgico (micropore) y transparente para sujetar gasa, esparadrapo de tela para vendajes y curitas de diferentes tamaños para cubrir heridas leves.

Soluciones para limpieza y desinfección: Isodine espuma e isodine desinfección, agua destilada y sulfato para quemaduras.

Material para inmovilizar: Vendas elásticas, Vendas triangulares

Material de apoyo: Termómetro oral, linterna, tijera, guantes desechables, tapa bocas y Camilla.

14.1En relación con elementos de protección personal,

el contratista ha entregado a cada uno de los trabajadores para su uso obligatorio los siguientes elementos:

Casco de seguridad para protección de la cabeza

Guantes de cuero y lona para protección de manos

Gafas para protección de los ojos

Tapa oídos

14.2 Aspectos ambientales, impacto urbano y seguridad industrial

Durante toda la etapa constructiva se ha realizado el respectivo chequeo por parte de la Interventoría, del cumplimiento por parte del Contratista de todos los lineamientos establecido en las distintas normas vigentes para este tipo de contratos, además de constantes chequeos con respecto a toda la parte ambiental y tratando de generar el menor impacto posible, tanto al medio ambiente como a la comunidad, así mismo se revisó constantemente las emisiones de material particulado, vertimientos, manejo de desechos y residuos sólidos y todo lo concernientes para que las actividades desarrolladas estén en armonía con el medio ambiente.

14.3 Seguimiento y aprobación de materiales

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Certificados de calidad del cemento	X		Suministrado por la alcaldía de puerto triunfo

16 Conclusiones, Recomendaciones y Observaciones

- La firma interventora Certifica y Avala que las obras se están realizaron bajo los diseños aprobados por el municipio de Puerto Triunfo – Antioquia y todas las especificaciones técnicas propias del proyecto acorde a la verificación en sitio por parte de la interventoría.

- Los materiales que están siendo utilizados por el contratista de obra son de primera calidad y verificados por la interventoría del proyecto para estricto cumplimiento de los estándares de calidad y especificaciones técnicas del contrato.

- A la fecha se tiene 100% de avance de obra,

17 Anexos

Anexo 1 Pólizas de obra e interventoría
Anexo 2. Oficios
Anexo 3 Bitácora
Anexo 4. Resultados de cilindros
Anexo 5. Informes socio ambiental y HSE
Anexo 6. Planillas de seguridad social obra e interventoría
Anexo 7 Acta n°3 de avance de obra

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, en el Municipio de Puerto Triunfo a los 30 días del mes de septiembre de 2025

ING. HENRY TOBAR LOPEZ
Residente de interventoría

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA:	CD-013-2025 OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
EMPRESA:	SUMINISTRARTE SAS NIT 900931977-1

INFORME : 1 No CILINDROS 3

HOJA No 1 INFORME: 10/06/2025

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA KN.	lbs/p2 psi	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA cm. 2	PULGADAS in.2	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa
1	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	318,3	2531,0	72%	70%	176,71	27,4	12-may.-25	19-may.-25	7	3	17,5	
2	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	410,8	3267,0	93%	90%	176,71	27,4	12-may.-25	26-may.-25	14	3	22,5	
3	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	456,2	3628,1	104%	100%	176,71	27,4	12-may.-25	09-jun.-25	28	3	25,0	24
											L / D	1,75	1,5	1,25	1			
											FACTOR	0,98	0,96	0,93				



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

Laura Valderrama
Laboratorista

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos
REVISO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos
APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO


OBRA:	CD-013-2025 OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
EMPRESA:	*SUMINISTRARTE SAS NIT 900931977-1*

INFORME : 1 *No CILINDROS* 3

HOJA No 1 *INFORME:* *4/10/2025*

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	311,8	2479,3	71%	70%	176,71	27,4	05-sep.-25	12-sep.-25	7	3	17,1	-
2	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	402,2	3198,0	91%	90%	176,71	27,4	05-sep.-25	19-sep.-25	14	3	22,0	-
3	ENTRADA PUERTO PERALES - ARREBOLES-HORIZONTES	PAVIMENTO	30	15,0	2,00	1	448,0	3562,3	102%	100%	176,71	27,4	05-sep.-25	03-oct.-25	28	3	24,6	24
											L / D	1,75	1,5	1,25	1			
											FACTOR	0,98	0,96	0,93				

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO




Laura Valderrama
Laboratorista

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos
REVISO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos
APROBO

SUMINISTRARTE

INFORME SOCIOAMBIENTAL 3
PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENMTORIA CD-013 DE 2025

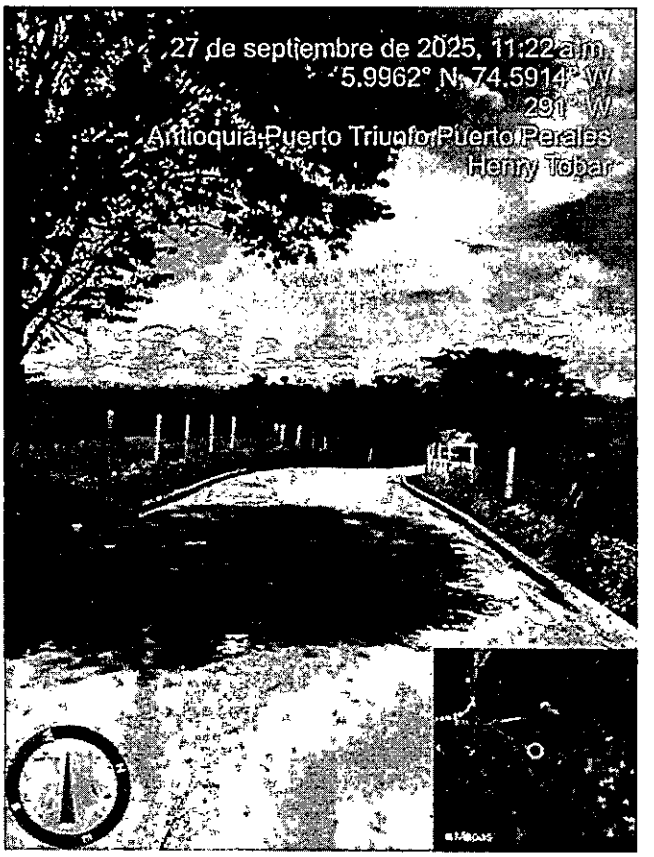

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, DMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA

SUMINISTRARTE

Contenido

1. 1. INTRODUCCIÓN....3
2. Generalidades....3
2.1 Localización del Proyecto....3
2.2 Información del contrato de Interventoría....4
2.3 Información del contrato de obra....5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
4. BENEFIARIOS....6
4,1 BENEFICIARIOS DIRECTOS....6
4.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:....6
5. INFORMACIÓN ECOLOGICA Y ECONOMICA....7
5.1 ECOLOGÍA....7
5.2 ECONOMÍA....7
6. 6 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 7
61 Impacto ambiental....7
6.2 Impacto social....8
6.3 Impacto económico....8
7 PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL....8
7.1 Desarrollo de aplicación de la gestión ambiental....8
7.1.1 Capacitación ambiental a nivel operativo....8
7.2 Programa de actividades constructivas....9
7.2.1 Proyecto manejo integral de materiales de construcción....9
7.2.2 Proyecto señalización frentes de obras....10
8. COMPONENTE AMBIENTAL....11
8.1 AGUAS SUPERFICIALES PARA FINES CONSTRUCTIVOS....11
8.2 APROVECHAMIENTO FORESTAL....11
8.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....11
8.4 RESIDUOS SOLIDOS....12
8.5 SUSTANCIAS QUÍMICA....12
8.6 PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA....13
8.7 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO....13
9. COMPONENTE SOCIAL....14
9.1 PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEOS....14
9.1.1 PERSONAL ACTIVO CONTRATADO DE OBRA....14
9.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA....14
9.2.2 Valla informativa....15

1. 1. INTRODUCCIÓN

La EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL bajo el contrato interadministrativo 022 de 2025 con el municipio de Puerto Triunfo y mediante proceso de contracción IP 003-2025, Y mediante el proceso de selección CD- 013 -2025, suscribe el contrato de interventoría, con SUMINISTRARTE SAS en la cual corresponde a: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

El presente informe socioambiental I tiene como finalidad evaluar y documentar los posibles impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto de construcción de pavimento rígido, contemplando las condiciones del entorno natural, social y económico en el área de influencia directa e indirecta. Todo esto con el objetivo de garantizar una adecuada gestión ambiental durante las fases del proyecto.

2. Generalidades

2.1 Localización del Proyecto

Las actividades descritas en el contrato se están realizando en el corregimiento de Puerto Perales municipio de Puerto Triunfo, localizado en la subregión del Magdalena Medio en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Puerto Nare, por el este con el departamento de Boyacá, por el sur con el municipio de Sonsón y por el oeste con los municipios de San Francisco y San Luis. Dista 180 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia.

SUMINISTRARTE

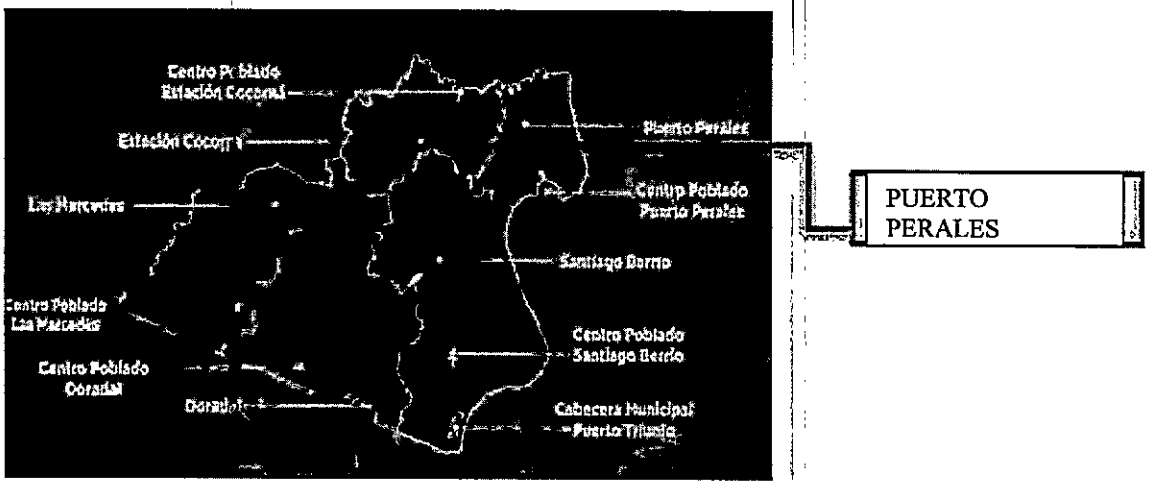


Figura 1. Localización del proyecto.

2.2 *Información del contrato de Interventoría*

FIRMA INTERVENTORA:	SUMINISTRARTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANA CANDELARIA CUELLO MEJIA**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	tres (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRORROGA No 1	Por un (1) meses contados a partir de la fecha de terminación inicial
FECHA DE TERMINACION	02 de julio de 2025
SUSPENSION 1	DESDE EL 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 2	DEL 18 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REANUDACION 2	28 DE AGOSGTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION OTRO SI 2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($45.179.177)

VALOR ADICION:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C ($10.583.557)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($55.762.734)

2.3 Información del contrato de obra

FIRMA CONTRATISTA:	NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE S.A.S
NIT O CÉDULA:	900.599.096-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO DURANGO ZORA
CONTRATO DE OBRA No	IP-003-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	02 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRORROGA N°1	UN (01) MES contado a partir de la terminación inicial
FECHA DE TERMINACION:	02 de julio de 2025
SUSPENSION 1	DESDE EL 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 2	DEL 18 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO N°2	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE REINICIO N°2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 864,858,536
VALOR ANTICIPO	$432.429.268 (50%)
VALOR ADICION	$ 151.193.668
VALOR TOTAL FINAL	$1.016.052.204

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de pavimento rígido sobre un tramo vial determinado, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y durabilidad de la vía. Esta intervención busca reemplazar o complementar estructuras existentes en mal estado o caminos sin pavimentar, optimizando la conectividad y facilitando el acceso a zonas urbanas, rurales, comerciales y/o industriales.

La obra contempla la ejecución de actividades de preparación del terreno, excavación, nivelación, construcción de la estructura de pavimento en concreto hidráulico, conformación de cunetas, bordillos, construcción de alcantarillado, muros en gaviones, obras no previstas. Adicionalmente, en el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y social, incluyendo medidas de manejo ambiental durante su ejecución, control de emisiones y residuos, así como planes de seguridad industrial y señalización temporal para mitigar impactos sobre la comunidad y el entorno.

4. BENEFIARIOS

4,1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

- Los principales beneficiarios de este proyecto serán los habitantes del corregimiento de Puerto Perales y sus veredas cercanas, así como los comerciantes, transportadores, estudiantes y peatones que hacen uso cotidiano de la vía intervenida ya que:

- Mejora las condiciones de movilidad, reduciendo el tiempo y costos de transporte.
- Disminuye la generación de polvo y lodo, lo que mejora la salud y calidad de vida.
- Potencia la valorización de predios y la actividad económica local.

4.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

- Habitantes de otros corregimientos o municipios cercanos que utilizan la vía para transitar hacia centros urbanos, mercados, hospitales o instituciones educativas.

- Empresas de transporte público y de carga, que se ven favorecidas en una ruta más eficiente, segura y menos costosa en mantenimiento vehicular.

5. INFORMACIÓN ECOLOGICA Y ECONOMICA

5.1 ECOLOGÍA

El municipio de Puerto Triunfo está rodeado por el Río Magdalena.

Específicamente, el corregimiento Puerto Perales se encuentra ubicado en la marguen izquierda del rio Magdalena con gran variedad de fauna silvestre.

5.2 ECONOMÍA

Entre los renglones económicos de esta región hallamos la ganadería, la agricultura (con cultivos de limón, yuca, maíz y plátano), y la extracción de mármol y cemento y materiales pétreos de rio para la construcción.

6. 6 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

A continuación, se muestra la descripción del alcance de los impactos ambientales que se pueden generar durante la ejecución de la obra.

61 Impacto ambiental

- Alteración del suelo: la remoción de la capa vegetal y la excavación del terreno provocan una modificación directa en la estructura del suelo, reduciendo su permeabilidad natural y capacidad de regeneración.
- Generación de residuos y escombros: durante la fase constructiva se generan materiales de desecho como empaques, residuos plásticos, que deben ser gestionados adecuadamente para evitar contaminación.
- Emisión de polvo y material particulado: las actividades de excavación, transporte de materiales y tránsito de maquinaria generan partículas que pueden afectar la calidad del aire y la salud de la población cercana.
- Ruido y vibraciones: la operación de maquinaria pesada y equipos de compactación produce niveles de ruido superiores a los limites recomendados, afectando el entorno sonoro y la fauna local.

6.2 Impacto social

- Interferencia en la movilidad local: durante la construcción, es frecuente que se generen desvíos y cierres temporales, afectando a los residentes y usuarios habituales de la vía.
- Percepción de incomodidad por parte de la comunidad: el polvo, el ruido y las interrupciones pueden generar molestias y resistencia temporal por parte de la población.
- Generación de empleo temporal: positivo, ya que se vinculan personas del área de influencia directa en labores de construcción.

6.3 Impacto económico

- Valorización de predios e incentivos a la inversión: Una vez finalizada la obra, se espera un incremento en el valor de las propiedades cercanas y una mayor atracción de inversiones productivas o comerciales.

7 PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

Las medias de manejo que a continuación se presentan son el resultado del análisis de la identificación de impactos ambientales descrito en el ítem anterior; estas medidas tienen como objetivo la mitigación, control y prevención de la contaminación ambiental que se derive de las actividades de construcción.

7.1 Desarrollo de aplicación de la gestión ambiental

Desde la empresa contratista y con supervisión de la interventoría se trazó un cronograma de concientización ambiental a través de una capacitación a nivel operativo desde el cual se promueve la cultura de responsabilidad ambiental entre los trabajadores de la construcción y su contribución en la minimización de impactos ambientales negativos generados por el proyecto.

7.1.1 Capacitación ambiental a nivel operativo

Como parte del compromiso ambiental, se realizó una capacitación ambiental a nivel operativo donde se incentivó las prácticas de construcción sostenible para reducir el uso de recursos naturales limitando esto a lo estrictamente necesario.

Se sensibilizó sobre el manejo seguro de residuos sólidos segregando, almacenamiento temporal y finalmente disponiendo adecuadamente de estos para evitar contaminaciones en el aire, suelo y agua.

Se incentivó a preservar el paisaje natural a través de la mínima alteración del entorno y minimizar los ruidos generados por las tareas llevadas a cabo en cada uno de los sitios.

Finalmente se estableció el seguimiento ambiental por parte de la empresa contratista para garantizar a largo plazo el cumplimiento de la información proporcionada en la capacitación.


7.2 Programa de actividades constructivas

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas de la señalización y los manejos de residuos generados en las actividades realizadas.

7.2.1 Proyecto manejo integral de materiales de construcción


Se presentan imágenes correspondientes al almacenamiento de materiales de construcción y señalización de acuerdo con el SGA para los materiales que lo necesitan.




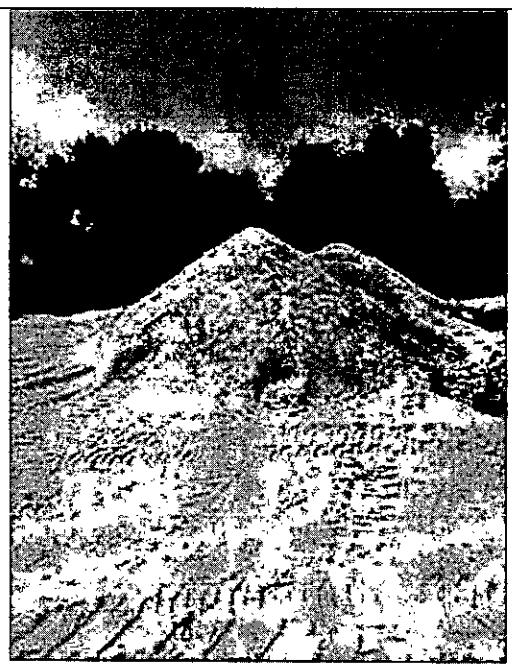

7.2.2 Proyecto señalización frentes de obras

Se muestran las siguientes imágenes de la señalización de los frentes de obra.

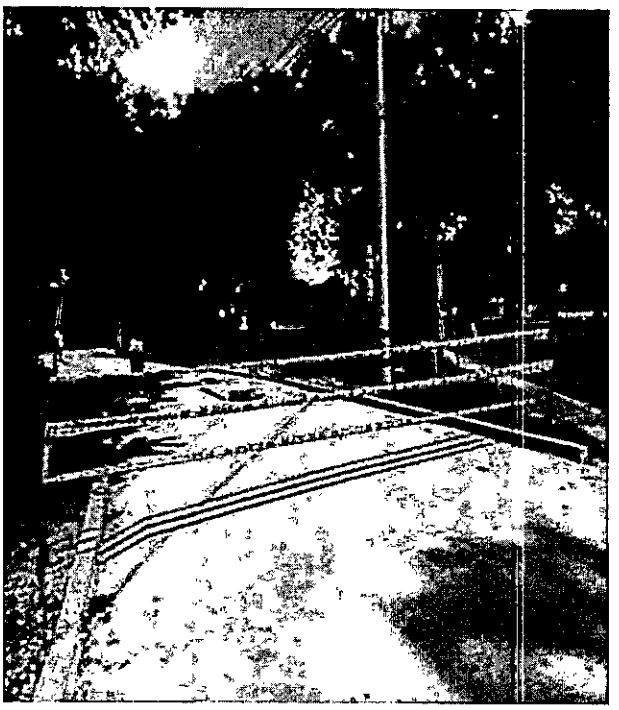

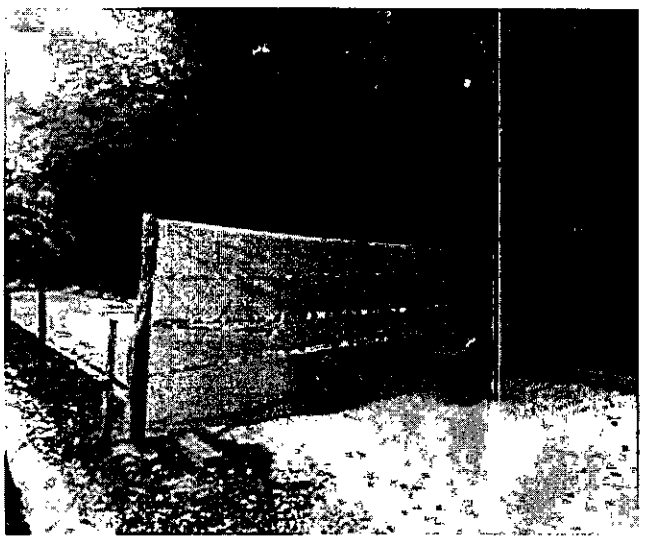

8. COMPONENTE AMBIENTAL

8.1 AGUAS SUPERFICIALES PARA FINES CONSTRUCTIVOS

El agua se utilizará para la producción de concretos y para todas las actividades que se presenten.

Se utilizará el agua de una vivienda aledaña al proyecto como contribución al desarrollo y avance del proyect0.

8.2 APROVECHAMIENTO FORESTAL

No se requiere tramitar permiso de aprovechamiento forestal, porque el proyecto que se está ejecutando no se afecta ningún recurso forestal.

8.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales e insumos estimados en el seguimiento son aquellos que por su utilización o inadecuado almacenamiento pueden incidir negativamente en el medio ambiente por lo cual se inspeccionan las siguientes premisas:

a) Contaminación por material particulado: En los sitios de construcción y almacenamiento de materiales de las obras, se realiza limpieza del material sobrante y durante las actividades se utiliza el material necesario para evitar contaminación por dispersión de material particulado.

b) Preservación: Los materiales que son controlados a través de un adecuado acopio y tapándolos con plástico para evitar su dispersión y sacando las cantidades necesarias para las actividades que se vayan a realizar.

Se controlan las actividades que generan polvo con los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra.

- Arena
- Cemento

8.4 RESIDUOS SOLIDOS


La producción de residuos sólidos que se generan por el proyecto corresponde a los provenientes de los frentes de obra; su composición y volumen de generación dependen de las actividades desarrolladas de acuerdo con la etapa constructiva. Los tipos de residuos que se generarán son los siguientes:

- Cintas de señalización: la demanda de este material en el frente de obra es constante, pero su generación es baja, ya que es un material reutilizable y solo se dispone cuando ya es completamente inutilizable.
- Residuos derivados de las actividades humanas: las generaciones de envolturas de alimentos (plásticos, vidrios, entre otros), material orgánico (residuos sobrantes de alimentos).
- Bolsas de cemento: los empaques generalmente de papel cartón. Su generación se presenta en la fase de construcción de obras, tal como los de vaciado de concreto.

8.5 SUSTANCIAS QUÍMICA

Corresponden a residuos provenientes de productos químicos tales como envases de insumos utilizados, aceites, lubricantes, cementos, entre otros. Se clasificará como material peligroso o de manejo especial, cualquier tipo de residuo impregnado con estas sustancias.

Las sustancias químicas al ser de un impacto antrópico y ambiental bajo se abarca de dos maneras. a) Implementación del sistema SGA (Sistema global armonizado)





8.6 PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

Al ser un proyecto de construcción de pavimentación en zonas urbanas ya existentes, la vegetación y fauna no predominan en el lugar de ejecución por ende no presentara un impacto significativo.

8.7 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

El programa de orden y aseo se inicia desde la construcción; eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, acondicionando los medios para guardar y localizar el material, evitando ensuciar y limpiando enseguida, promoviendo los comportamientos seguros. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo. Como tal requieren de unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y de la participación responsable de todos.

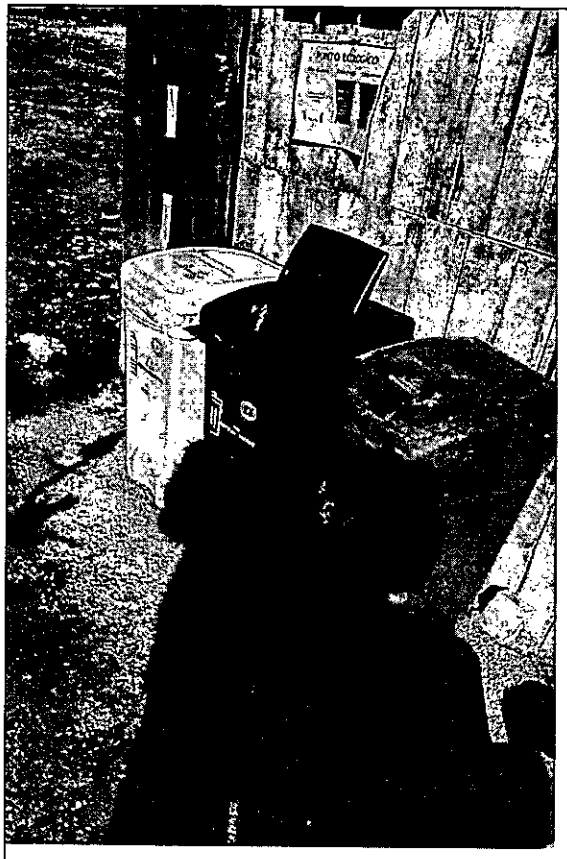

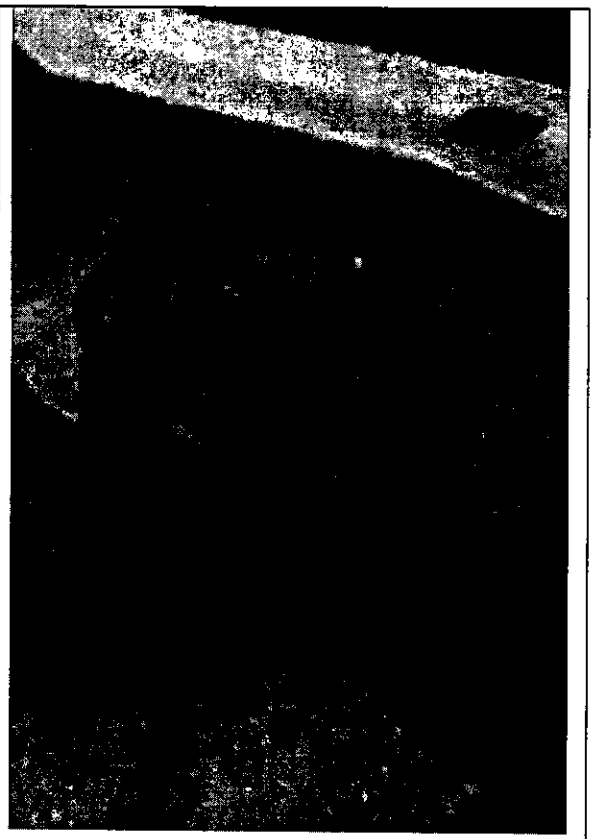

9. COMPONENTE SOCIAL

9.1 PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEOS

Una vez realizada la selección del personal de la obra, todas las personas contratadas en la obra se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social, para la EPS se tienen afiliados a Savia Salud, Nueva EPS, Sura EPS, salud Total; ARL Sura; Fondo de Pensiones Colpensiones, Porvenir y Colfondos.

9.1.1 PERSONAL ACTIVO CONTRATADO DE OBRA


ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	SERGIO AMAURY DURANGO ZORA	98.505.041	DIRECTOR DE OBRA	SURA	PORVENIR	SURA
2	DAYANA MELISA CAMACHO MARIN	1.007.511.967	RESIDENTE DE OBRA	SURA	COLPENSIONES	SURA
3	TIANA MARIA RUA GUEVARA	1.036.662.847	RESIDENTE AMBIENTAL	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES	SURA
4	CATHERIN ANDREA PEREZ OSPINA	1.036.133.459	RESIDENTE SST	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
5	JOSE MANUEL AMAYA AGUDELO	71.481.028	MAESTRO DE OBRA	NUEVA E.P.S.	PORVENIR	SURA
6	JOSE GABRIEL BUSTOS MORALES	10.189.913	OFICIAL	FAMISANAR	SAVIA SALUD	SURA
7	JUAN ANDRES BALMACEA GIL	1.001.444.025	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
8	WILSON MANUEL BASILIO ESQUIVEL	1.005.439.071	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
9	JOHN JAIRO GONZALEZ COLORADO	1.036.222.804	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
10	RUBEN ALEXIS MUÑOZ HERRERA	1.039.684.516	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	COLFONDOS	SURA
11	HECTOR ANTONIO GARCIA	14.324.156	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
12	LUIS FERNANDO MESA	1.007.568.699	AYUDANTE	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA
13	ORNELA RAMIREZ RENTERIA	1.036.222.015	AYUDANTE	SURA	PORVENIR	SURA
14	JUAN CAMILO MORALES	1.073.320.098	AYUDANTE	SURA	PORVENIR	SURA
15	YULDER ARLEM MARTINEZ GIRALDO	1.036.132.511	TOPOGRAFO	NUEVA E.P.S	PORVENIR	SURA

9.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA

1	GUERRA MONCALEANO HECTOR	93.200.589	DIRECTOR	ALINZA SALUD		SURA
2	TOBAR LOPEZ HENRY	129744435	RESIDENTE	SURA	COLPENSIONES	SURA
3	BARAJAS PLAZAS YHARA	1049635578	SOCIOAMBIENTAL	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA

9.2.2 Valla informativa

Se realizó la instalación de una valla informativa justo al lado de lo que es la bomba Terpel ubicada en el barrio horizontes

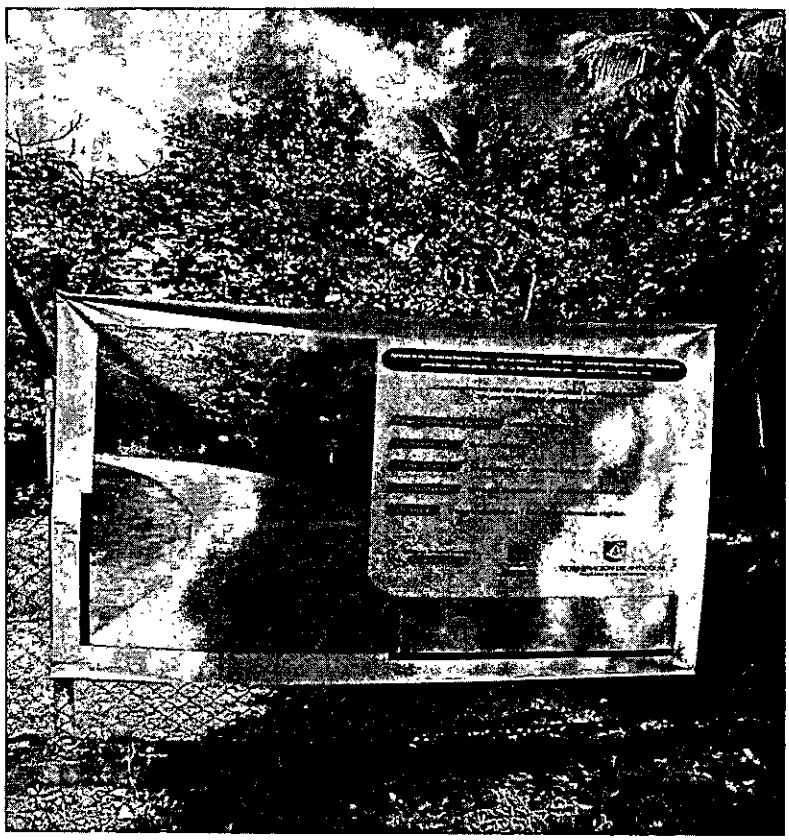

ELABORÓ INFORME:

YHARA LIZCETH BARAJAS PLAZAS
RESIDENTE SOCIOAMBIENTAL HSEQ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900931977
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRARTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARBOSA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 #14-64	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	274 - PUERTO PERALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6004470559	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		106			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32456970

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 341.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 242.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 584.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 60.800
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 60.800
8000887022	EPS010	CÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 85.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 206.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 206.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 206.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 359.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 359.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.273.200**
VALOR MORA:	**$ 84.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.357.400**

Bancolombia



Comprobante en línea

3 Feb 2026 09:48:15

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 32456970

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
3 Feb 2026 09:48:15

Referencia 2
NI

Número de factura
6004470559

Referencia 3
900931977

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$1.357.400

Número de comprobante
TR0947296970

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 6882

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900931977
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRARTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 #14-64	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	274 - PUERTO PERALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6004469178	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		139			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32471291

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 34.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 24.800
		SUBTOTAL:	2	**$ 59.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 6.200
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 6.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 8.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 21.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 21.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 21.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 37.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 37.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 127.600**
VALOR MORA:	**$ 11.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 138.800**

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$138.800,00

3 feb, 2026--9:53:51 AM

Producto o servicio	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisa SOI ACH
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *2415
Código de confirmación (CUS)	32471291
IP	190.61.45.3

Volver al comercio

Imprimir comprobante

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	900931977
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRARTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO.	BARBOSA	DEPARTAMENTO.	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 #14-64	TELÉFONO.	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN.	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	274 - PUERTO PERALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5004469178	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			139				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			32471291

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 32.000	$ 2.800	$ 34.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 22.800	$ 2.000	$ 24.800
SUBTOTALES:										$ 54.800	$ 4.800	$ 59.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 500	$ 0	$ 5.700	$ 500	$ 0	$ 6.200
EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 8.000	$ 700	$ 0	$ 8.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 500	$ 0	$ 5.700	$ 500	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:													$ 19.400	$ 1.700	$ 0	$ 21.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.000		$ 34.000	$ 3.000	$ 0	$ 37.000
SUBTOTALES:										$ 34.000	$ 3.000	$ 0	$ 37.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 19.400	$ 1.700	$ 21.100
SUBTOTALES:			$ 19.400	$ 1.700	$ 21.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU														
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900931977
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTRARTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARBOSA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 #14-84	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	274 - PUERTO PERALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004470559	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			106				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			32456970

TOTAL APORTES A PENSIÓN:

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 0	$ 227.800	$ 15.100	$ 242.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 0	$ 320.000	$ 21.100	$ 341.100
SUBTOTALES:										$ 547.800	$ 36.200	$ 584.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 80.000	$ 5.300	$ 0	$ 85.300
EPS001	EPS001 ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 57.000	$ 3.800	$ 0	$ 60.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 57.000	$ 3.800	$ 0	$ 60.800
SUBTOTALES:													$ 194.000	$ 12.900	$ 0	$ 206.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES:

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 337.400	$ 337.400	$ 22.300	$ 0	$ 359.700
SUBTOTALES:									$ 337.400	$ 22.300	$ 0	$ 359.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 194.000	$ 12.800	$ 206.800
SUBTOTALES:			$ 194.000	$ 12.800	$ 206.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN																		

SUMINISTRARTE

SUMINISTRARTE SAS
NIT: 900.931.977-1

CERTIFICACIÓN:

Yo, RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.633.173, en calidad de Representante Legal de **SUMINISTRARTE SAS** identificada con NIT. **900.931.977-1** certificamos que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales exigidos por la ley de los últimos seis (6) meses y se encuentra a paz y salvo por el pago de salarios y prestaciones sociales.

Dada en Barbosa a los dieciseis (16) dias del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

Andres Peña

RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
Representante Legal

Barbosa Santander
3174274109

SUMINISTRARTE

COMPROBANTE DE SALARIO

CONTRATO A TERMINO FIJO DEDICACIÓN 20%

NOMBRE: HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO **CEDULA :** 93.200.589

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **CONTRATO :** CONTRATO No. CD-013 DE 2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

DESDE	28-ago-2025	**HASTA**	30-sep-2025
SALARIO BASICO DIARIO :	$ 43.333	**DIAS ORDIN. TRABAJADOS :**	34
VALOR HORA	$ 5.417		

	%	CANT	VALOR	TOTALES
DIA ORDINARIO DIURNO TRABAJADO:	100%	34	$ 43.333	$ 1.473.333
DIA ORDINARIO NOCTURNO TRABAJADO:	135%	0	$ 58.500	$ -
DIA FESTIVO DIURNO	175%	0	$ 75.833	$ -
HORA DIURNA FESTIVA	175%	0	$ 9.479	$ -
HORA NOCTURNA FESTIVA	210%	0	$ 11.375	$ -
DIA FESTIVO NOCTURNO:	210%	0	$ 91.000	$ -
HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA	125%	0	$ 6.771	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA	175%	0	$ 9.479	$ -
HORA FESTIVA DIURNA:	175%	0	$ 9.479	$ -
HORA EXTRA FESTIVA DIURNA:	200%	0	$ 10.833	$ -
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA:	250%	0	$ 13.542	$ -
HORA CON RECARGO NOCTURNO	35%	0	$ 1.896	$ -
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	$ 2.940	$ -
SUBTOTAL SALARIOS PAGADOS				**$ 1.473.333**
PRESTACIONES SOCIALES				
PRIMA ANUAL		0,00%		$ -
CESANTÍA ANUAL		0,00%		$ -
INTERÉS A LAS CESANTÍAS		0,00%		$ -
VACACIONES ANUALES		0,00%		$ -
DOTACIÓN		0,00%		$ -
EPP		0,00%		$ -
TOTAL FACTOR SALARIAL				**$ -**
TOTAL NETO A PAGAR				**$ 1.473.333**

PAZ Y SALVO: HAGO CONSTAR QUE DURANTE ESTA QUINCENA, ME CUBRIERON EL PAGO DE LOS SALARIOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y HORAS EXTRAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY.

RECIBI CONFORME :

HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO
C.C. 93.200.589

LA EMPRESA :

RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
SUMINISTRARTE S.A.S.
NIT. 900.931.977-1

SUMINISTRARTE

COMPROBANTE DE SALARIO

CONTRATO A TERMINO FIJO DEDICACIÓN 50%

NOMBRE: YAHARA LIZCETH BARAJAS PLAZAS **CEDULA :** 1.049.635.578

CARGO: RESIDENTE AMBIENTAL Y HSEQ **CONTRATO :** CONTRATO No. CD-013 DE 2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

DESDE 28-ago-2025 **HASTA** 30-sep-2025

SALARIO BASICO DIARIO : $ 38.333 **DIAS ORDIN. TRABAJADOS :** 34

VALOR HORA $ 4.792

	%	CANT	VALOR	TOTALES
DIA ORDINARIO DIURNO TRABAJADO:	100%	34	$ 38.333	$ 1.303.333
DIA ORDINARIO NOCTURNO TRABAJADO:	135%	0	$ 51.750	$ -
DIA FESTIVO DIURNO	175%	0	$ 67.083	$ -
HORA DIURNA FESTIVA	175%	0	$ 8.385	$ -
HORA NOCTURNA FESTIVA	210%	0	$ 10.063	$ -
DIA FESTIVO NOCTURNO:	210%	0	$ 80.500	$ -
HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA	125%	0	$ 5.990	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA	175%	0	$ 8.385	$ -
HORA FESTIVA DIURNA:	175%	0	$ 8.385	$ -
HORA EXTRA FESTIVA DIURNA:	200%	0	$ 9.583	$ -
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA:	250%	0	$ 11.979	$ -
HORA CON RECARGO NOCTURNO	35%	0	$ 1.677	$ -
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	$ 2.940	$ -
SUBTOTAL SALARIOS PAGADOS				**$ 1.303.333**
PRESTACIONES SOCIALES				
PRIMA ANUAL		0,00%		$ -
CESANTÍA ANUAL		0,00%		$ -
INTERÉS A LAS CESANTÍAS		0,00%		$ -
VACACIONES ANUALES		0,00%		$ -
DOTACIÓN		0,00%		$ -
EPP		0,00%		$ -
TOTAL FACTOR SALARIAL				**$ -**
TOTAL NETO A PAGAR				**$ 1.303.333**

PAZ Y SALVO: HAGO CONSTAR QUE DURANTE ESTA QUINCENA, ME CUBRIERON EL PAGO DE LOS SALARIOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y HORAS EXTRAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY.

RECIBI CONFORME :

YAHARA LIZCETH BARAJAS PLAZAS
C.C. 1.049.635.578

LA EMPRESA :

Andres Peña.

RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
SUMINISTRARTE S.A.S.
NIT. 900.931.977-1

SUMINISTRARTE

COMPROBANTE DE SALARIO

CONTRATO A TERMINO FIJO DEDICACIÓN 100%

NOMBRE: HENRY ONEMIO TOBAR LOPEZ **CEDULA :** 12.974.435

CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **CONTRATO :** CONTRATO No. CD-013 DE 2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

DESDE 26-ago-2025 **HASTA** 30-sep-2025

SALARIO BASICO DIARIO : $ 83.333 **DIAS ORDIN. TRABAJADOS :** 34

VALOR HORA $ 10.417

	%	CANT	VALOR	TOTALES
DIA ORDINARIO DIURNO TRABAJADO:	100%	34	$ 83.333	$ 2.833.333
DIA ORDINARIO NOCTURNO TRABAJADO:	135%	0	$ 112.500	$ -
DIA FESTIVO DIURNO	175%	0	$ 145.833	$ -
HORA DIURNA FESTIVA	175%	0	$ 18.229	$ -
HORA NOCTURNA FESTIVA	210%	0	$ 21.875	$ -
DIA FESTIVO NOCTURNO:	210%	0	$ 175.000	$ -
HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA	125%	0	$ 13.021	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA	175%	0	$ 18.229	$ -
HORA FESTIVA DIURNA:	175%	0	$ 18.229	$ -
HORA EXTRA FESTIVA DIURNA:	200%	0	$ 20.833	$ -
HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA:	250%	0	$ 26.042	$ -
HORA CON RECARGO NOCTURNO	35%	0	$ 3.646	$ -
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		0	$ 2.940	$ -
SUBTOTAL SALARIOS PAGADOS				**$ 2.833.333**
PRESTACIONES SOCIALES				
PRIMA ANUAL		8,33%		$ 236.017
CESANTÍA ANUAL		8,33%		$ 236.017
INTERÉS A LAS CESANTÍAS		1,00%		$ 28.333
VACACIONES ANUALES		4,17%		$ 118.150
DOTACIÓN		1,50%		$ 42.500
EPP		1,00%		$ 28.333
TOTAL FACTOR SALARIAL				**$ 472.033**
TOTAL NETO A PAGAR				**$ 3.305.367**

PAZ Y SALVO: HAGO CONSTAR QUE DURANTE ESTA QUINCENA, ME CUBRIERON EL PAGO DE LOS SALARIOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y HORAS EXTRAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY.

RECIBI CONFORME :

HENRY ONEMIO TOBAR LOPEZ
C.C. 12.974.435

LA EMPRESA :

Andres Peña.

RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
UNION TEMPORAL INTERDORADAL
NIT. 901.682.925-1

SOLUCIONES Y SERVICIOS

M&C

CUENTA DE COBRO No. 6

SUMINISTRARTE SAS

900.931.977-1

DEBE A

MARIANA LUCIA COFLES HERNANDEZ

C.C 1.002.581.331 de Medellín

La Suma de: OCHOCIENTOS MIL PESOS (800.000,00) M/CTE

Por concepto de: Alquiler de oficina, y enseres de oficina (equipo computo – escritorio, entre otros).

Tiempo de alquiler a cobrar: 01 MESES del 28 de Agosto de 2025 al 30 de Septiembre de 2025

Sin otro particular, Se firma el presente cobro el día 06 de octubre de 2025.

MARIANA LUCIA COFLES HERNANDEZ
C.C 1.002.581.331 de Medellín

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14783367575

(415)7707212489984(8020) 000001478336757 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 0 2 5 8 1 3 3 1 | 6. DV 3 | 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 2 5 8 1 3 3 1	2 0 2 1 0 3 1 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COFLES	HERNANDEZ	MARIANA	LUCIA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal
CL 21 C # 41 182 AP 301

42. Correo electrónico marianaluciacofles@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1 3 1 3 7 6 1 8 4 7 9 | 45. Teléfono 2 4 6 1 4 7 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 9 0 1 0 1	4 7 1 9	2 0 1 9 0 1 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Exportadores		

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | Para uso exclusivo de la DIAN | 61. Fecha 2021-09-01 07:23:17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre COFLES HERNANDEZ MARIANA LUCIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

YENIS CADENA MORENO NIT 1096228985-1

CUENTA DE COBRO N° 10

Octubre 05 de 2025

SUMINISTRARTE S.A.S.
NIT 900.931.977-1

CL 17 B 34 26
Tel: 317 427 4109

Debe a:

YENIS CADENA MORENO
CC. 1.096.223.469

La suma de:

TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) MCTE

Por concepto de:

Alquiler de vehiculo tipo camioneta para el desarrollo del contrato CD-013-2025 desde la fecha 28 de Agosto de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Atentamente,

Yenis Cadena Moreno
YENIS CADENA MORENO
CC. 1.096.228.985 de Barrancabermeja - STD

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14958855693

(415)7707212489984(8020) 000001495885569 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 6 2 2 8 9 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 6 2 2 8 9 8 5	2 0 1 2 0 8 2 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CADENA	MORENO	YENIS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 50 35 114

42. Correo electrónico yenisc.moreno@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 4 0 5 2 1 3	3 1 4 7 6 6 5 8 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 6	7 4 9 0	2 0 1 4 0 1 1 0	7 7 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 24 / 13 : 44: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADENA MORENO YENIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONCAES S.A.S
NIT. 901.684.868-9
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

CUENTA DE COBRO No. 001-2025

SUMINISTRARTE SAS.
NIT Nº 900931977-1

Debe a:

CONCAES
NIT 901.684.868

La suma de:
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 340.000,00) M/CTE.

Por concepto de:

ENSAYOS A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO (INC. TRANSPORTE AL SITIO) PARA EL CONTRATO "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

Atentamente,

CONCAES S.A.S

Natalia Ochoa

C.c 1102721222

Carrera 3 # 16 - 46 Barrio Caracolí
Cel. 318 204 8813 - 315 299 56 50
concaes.sas@gmail.com
Puerto Boyacá (Boyacá)

PAZ Y SALVO LABORAL

Nosotros como trabajadores de la empresa **SUMINISTRARTE S.A.S.**, identificada con NIT 900.931.977-1, por medio del presente documento dejamos constancia que:

Que, una vez verificados los registros contables, laborales y de seguridad social de la empresa, se certifica que a la fecha se encuentra **a paz y salvo por todo concepto laboral** con sus trabajadores y extrabajadores, incluyendo el pago de:

- Salarios
- Prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones)
- Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales)
- Aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar)
- Liquidaciones definitivas de contrato, cuando corresponda

En consecuencia, se deja constancia de que **NO** existen obligaciones pendientes por concepto de acreencias laborales exigibles a cargo de la empresa a la fecha de expedición del presente documento.

El presente paz y salvo se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Dado en Puerto Triunfo, Antioquia, a los 16 días del mes de febrero del 2026.

HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO
C.C. 93.200.589

YAHARA LIZZETH BARAJAS PLAZAS
C.C. 1.049.635.578

HENRY ONEMIO TOBAR LOPEZ
C.C. 12.974.435

PAZ Y SALVO DE PROVEEDOR

Yo, MARIANA LUCIA COFLES HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.002.581.331, en calidad de proveedor, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa SUMINISTRARTE S.A.S., identificada con NIT 900.931.977-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones económicas derivadas del siguiente servicio:

Concepto: Alquiler de oficina para el desarrollo del contrato CD-013-2025.

Declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los pagos acordados por el servicio prestado y que, en consecuencia, no existe saldo pendiente, reclamación judicial o extrajudicial, ni derecho alguno por exigir a la empresa por este concepto.

El presente paz y salvo se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que estime pertinentes.

MARIANA LUCIA COFLES HERNANDEZ
C.C. No. 1.002.581.331 de Medellín
Proveedor

PAZ Y SALVO DE PROVEEDOR

Yo, YENIS CADENA MORENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.228.985, en calidad de proveedor, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa SUMINISTRARTE S.A.S., identificada con NIT 900.931.977-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones económicas derivadas del siguiente servicio:

Concepto: Alquiler de vehículo tipo camioneta para el desarrollo del contrato CD-013-2025.

Declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los pagos acordados por el servicio prestado y que, en consecuencia, no existe saldo pendiente, reclamación judicial o extrajudicial, ni derecho alguno por exigir a la empresa por este concepto.

El presente paz y salvo se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que estime pertinentes.

Yenis Cadena Moreno
YENIS CADENA MORENO
C.C. No. 1.096.228.985 de Barrancabermeja
Proveedor

CONCAES S.A.S
NIT. 901.684.868-9
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

La empresa CONCAES SAS identificada con NIT 901.684.869-9 certifica que la empresa **SUMINISTRARTE SAS.** se encuentra a paz y salvo en todo concepto, por la prestación del servicio de ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETOS para el contrato con Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA". Por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 340.000,00).

Se expide a solicitud del interesado en el mes de febrero del año 2026.

Atentamente,

CONCAES S.A.S

Natalia Ochoa
C.c 1102721222

Carrera 3 # 16 - 46 Barrio Caracolí
Cel. 318 204 8813 - 315 299 56 50
concaes.sas@gmail.com Puerto Boyacá (Boyacá)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	12	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O.RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SUMINISTRARTE SAS	NIT: 900.931.977-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 B NRO. 34 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	NIT: 901.537.748-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	PENOL, ANTIOQUIA	3104491096

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA
GARANTIZAR EL PAGO DELOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DELCONTRATO CD-013-2025 RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOUQIA.

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL EAEP NIT 901.537.748-4 Y MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO NIT 890.986.906.4

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2025	30/03/2026	$5,576,273.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2025	30/09/2030	$2,788,136.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	12/11/2025	12/11/2030	$11,152,546.80	$11,152,546.80

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION
DE CONFOMRIDAD CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 12 /11/2025 SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO, LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******19,516,956.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ATENAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	143752	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA; POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101062353

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

Andres Peña

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	12	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SUMINISTRARTE SAS		NIT: 900.931.977-1
DIRECCIÓN: CL 17 B NRO. 34 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL		NIT: 901.537.748-4
DIRECCIÓN: CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	CIUDAD: PENOL, ANTIOQUIA	TELÉFONO 3104491096

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | efecty | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | GanGana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********19,516,956.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ATENAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	143752	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	12	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SUMINISTRARTE SAS			NIT: 900.931.977-1
DIRECCIÓN: CL 17 B NRO. 34 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL			NIT: 901.537.748-4
DIRECCIÓN: CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	**CIUDAD:** PEÑOL, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	3104491096

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101062353

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	30	09	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SUMINISTRARTE SAS		NIT: 900.931.977-1
DIRECCIÓN: CL 17 B NRO. 34 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL		NIT: 901.537.748-4
DIRECCIÓN: CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	CIUDAD: PENOL, ANTIOQUIA	TELÉFONO 3104491096

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA
GARANTIZAR EL PAGO DELOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DELCONTRATO -CD-013-2025 RELACIONADO CON REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOUQIA.

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL EAEP NIT 901.537.748-4 Y MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO NIT 890.986.906.4

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2025	30/03/2026	$5,576,273.40	$5,576,273.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2025	30/09/2030	$2,788,136.70	$2,788,136.70
CALIDAD DEL SERVICIO	12/11/2025	30/09/2030	$11,152,546.80	

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION
DE CONFORMIDAD CON EL ACCTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 12 /11 /2025 SE ACTUALIZA LA VIGENCIA INICIAL PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO, LOS DEMAS TERMINO SCONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******19,516,956.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ATENAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	143752	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA; POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR; PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707.- VILLAVICENCIO

30-44-101062353

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	30	09	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SUMINISTRARTE SAS		NIT: 900.931.977-1	
DIRECCIÓN: CL 17 B NRO. 34 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL		NIT: 901.537.748-4	
DIRECCIÓN: CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	CIUDAD: PENOL, ANTIOQUIA	TELÉFONO	3104491096

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | efecty | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******19,516,956.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ATENAS AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	143752	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101062353	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	01	2026	03	03	2025	00:00	30	09	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTRARTE SAS		NIT: 900.931.977-1
DIRECCIÓN:	CL 17 B NRO. 34 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 4208863

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL		NIT: 901.537.748-4
DIRECCIÓN:	CR 17 # 40 ED LA MILAGROSA EL PEÑOL	**CIUDAD:** PEÑOL, ANTIOQUIA	**TELÉFONO** 3104491096

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101062353

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143752B

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD 013 DE 2025

El día doce (12) de noviembre del año 2025, en la oficina Empresa Autónoma de El Peñol, se reunieron **ANNGY MILENA URIBE CIRO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.276.133 en calidad de Representante Legal y Supervisora de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP con NIT 901.537.748-4, y **SUMINISTRARTE S.A.S**, con NIT 900.931.977-1, representada legalmente por el señor **RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.633.173, en calidad de interventor; con el fin de recibir los primeros y entregar los segundos, los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objetos del Contrato de Interventoría CD 013 de 2025 suscrito entre la EAEP y el Contratista.

CONSIDERACIONES

1. Que, entre la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P y el Municipio de Puerto Triunfo se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 022 de 2025, que tiene por objeto: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA".

2. Que, para cumplir con el Contrato Interadministrativo, la Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP suscribió el Contrato de Interventoría CD 013 de 2025 con la empresa SUMINISTRARTE **S.A.S:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD 013 DE 2025	
CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA:	SUMINISTRARTE S.A.S NIT: 900.931.977-1
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 003 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD-013-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD 013 DE 2025	
	PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 1:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 2:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 1:	02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN No 1:	04 DE JULIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No 1:	20 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN No 2:	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No 2:	30 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 2:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($45.179.177)
VALOR ADICIONAL OTROSÍ No 2:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($10.583.557)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENT AY DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($55.762.734).

3. Que, las condiciones iniciales son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
1							
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 6.000.000	$ 0	20%	3,00	$ 3.600.000

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol,
310 545 91 32

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	$ 2.000.000	$ 1.100.000	100%	3,00	$ 9.300.000
1,3	RESIDENTE AMBIENTAL Y HSEQ	1,00	$ 2.300.000	$ 0	50%	3,00	$ 3.450.000
	SUBTOTAL PERSONAL						$ 16.350.000
	FACTOR MULTIPLICADOR						1,57
	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 25.669.500
2							
2,1	VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE COMBUSTIBLE.	1,00	$ 3.000.000			3,00	$ 9.000.000
2,2	OFICINA. (ARRENDAMIENTO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1,00	$ 800.000			3,00	$ 2.400.000
2,3	PAPELERÍA	1,00	$ 150.000			3,00	$ 450.000
2,4	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA.						$ 333.247
3							
3,1	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)						$ 112.948
VALOR BÁSICO TOTAL							$ 37.965.695
IVA						19%	$ 7.213.482
TOTAL INTERVENTORÍA							$ 45.179.177

4. Que, se presentaron modificaciones al presupuesto oficial, quedando de la siguiente manera:

		CONDICIONES INICIALES						ADICIÓN No 1			VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	
1											
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 6.000.000	$ 0	20%	3	$ 3.600.000	24%	1	$ 1.414.806	$ 5.014.806
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 2.000.000	$ 1.100.000	100%	3	$ 9.300.000	100%	1	$ 3.100.000	$ 12.400.000

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD-013-2025

			CONDICIONES INICIALES					ADICIÓN No 1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1,3	RESIDENTE AMBIENTAL Y HSEQ	1	$ 2.300.000	$ 0	50%	3	$ 3.450.000	50%	1	$ 1.150.000	$ 4.600.000
	SUBTOTAL PERSONAL						$ 16.350.000			$ 5.664.806	$ 22.014.806
	FACTOR MULTIPLICADOR						1,57			1,57	1,57
	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 25.669.500			$ 8.893.745	$ 34.563.245
2											
2,1	VEHICULO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2000 CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) TARIFA DE ALQUILER TIEMPO COMPLETO, INCLUYE COMBUSTIBLE	1	$ 3.000.000			3	$ 9.000.000				$ 9.000.000
2,2	OFICINA (ARRENDAMIENTO, INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA, ENERGIA, E INTERNET)	1	$ 800.000			3	$ 2.400.000				$ 2.400.000
2,3	PAPELERIA	1	$ 150.000			3	$ 450.000				$ 450.000
2,4	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LIMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA.						$ 333.247				$ 333.247
3											
3,1	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)						$ 112.948				$ 112.948
VALOR BÁSICO TOTAL							$ 37.965.695			$ 8.893.745	$ 46.859.440
IVA						19%	$ 7.213.482			$ 1.689.812	$ 8.903.294
TOTAL INTERVENTORÍA							$ 45.179.177			$ 10.583.557	$ 55.762.734

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

5. Que, los trabajos, obras, bienes y/o servicios recibidos y entregados a satisfacción corresponden a los estipulados en el anterior considerando, sin que se haya presentado alguna otra modificación.

6. Que, los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios han sido verificados y recibidos a entera satisfacción por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol, dentro del plazo pactado y se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

7. Que, el Contratista de Interventoría desarrollada por la empresa SUMINISTRARTE S.A.S, dio cumplimiento integral a los componentes administrativo, técnico, legal y financiero, asegurando el adecuado seguimiento, control y verificación del contrato de obra objeto de su supervisión.

8. Que, el contrato finalizó el 30 de septiembre de 2025; sin embargo, debido a la revisión de la sabana de cantidades y al proceso de recibo final, así como la presentación de documentos legales, financieros y técnicos por parte del contratista, el Acta de Entrega y Recibo Final se suscribe en la fecha del presente documento.

9. Que el Contratista de Interventoría SUMINISTRARTE S.A.S, deberá actualizar, suscribir y remitir las garantías en virtud de la presente Acta de Entrega y Recibo Final, y de conformidad con lo establecido en el contrato CD 013 de 2025.

10. Que, una vez se entreguen las garantías actualizadas y estas sean aprobadas, se podrá adelantar el trámite de liquidación del contrato, y posteriormente se procederá con el pago del saldo pendiente correspondiente al pago final.

11. Que, el siguiente es el resumen financiero del contrato suscrito para el cumplimiento de las acciones encomendadas:

RESUMEN FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.179.177,00
2	VALOR ADICIONAL	$ 10.583.557,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1+2)	$ 55.762.734,00
4	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 1 (Pagado)	$ 29.899.878,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CD-013-2025

	RESUMEN FINANCIERO	
5	PORCENTAJE DEL ACTA No 1 (4/3)	53,62%
6	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 2 (Pendiente de pago)	$ 10.360.735,00
7	PORCENTAJE DEL ACTA No 2 (6/3)	18,58%
8	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 3 Y FINAL (Pendiente de pago)	$ 15.502.121,00
9	PORCENTAJE DEL ACTA No 3 Y FINAL (8/3)	27,80%
10	VALOR ACUMULADO (4+6+8)	$ 55.762.734,00
11	PORCENTAJE ACUMULADO (6/1)	100,00%
12	VALOR RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (3-10)	$ 0,00
13	PORCENTAJE RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (12/3)	0,00%

En consecuencia, y en vista de lo anterior habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos para la ejecución del Contrato de Interventoría CD-013 de 2025, se recibe a entera a satisfacción por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP.

Verificado lo anterior, en consecuencia, firman las personas que intervienen el doce (12) de noviembre de 2025.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Andres Peña.
SUMINISTRARTE S.A.S
Representante legal
SUMINISTRARTE S.A.S
Contratista de Interventoría

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Brahian Gómez Vallejo Ingeniero Civil – EAEP	Brahian Gómez
Revisado por	Carlos Luna Rincón Abogado – Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA IP 003 DE 2025

El día doce (12) de noviembre del año 2025, en las oficinas de la Empresa Autónoma de El Peñol, se reunieron **ANNGY MILENA URIBE CIRO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.276.133, en calidad de Representante Legal y Supervisora de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP con NIT 901.537.748-4, el señor **SERGIO AMAURY DURANGO ZORA** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 98.505.041, quien actúa en nombre y representación de la empresa **NIROSOF INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.A.S,** identificada con NIT 900.599.096-2, en calidad de contratista de obra; y el señor **RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.633.173, quien actúa en nombre y presentación de la empresa **SUMINISTRARTE S.A.S**, con NIT 900.931.977-1, en calidad de Interventor; con el fin de recibir los primeros y entregar los segundos, los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objetos del Contrato de Obra IP-003 de 2025 suscrito entre la EAEP y el Contratista.

CONSIDERACIONES

1. Que, entre la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P y el Municipio de Puerto Triunfo se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 022 de 2025, que tiene por objeto: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA".

2. Que, para cumplir con el Contrato Interadministrativo, la Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP suscribió el Contrato de Obra IP 003 de 2025 con la empresa NIROSOF INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.A.S:

CONTRATO DE OBRA IP 003 DE 2025	
CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA:	NIROSOF INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.A.S NIT: 900.599.096-2
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 2:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 3:	UN (01) MES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA IP-003-2025

CONTRATO DE OBRA IP 003 DE 2025	
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 2:	02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN No 1:	04 DE JULIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No 1:	20 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN No 2:	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No 2:	30 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No 3:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($864.858.536)
VALOR ADICIONAL OTROSÍ No 3:	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($151.193.668)
VALOR TOTAL:	MIL DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($1.016.052.204)

3. Que, las condiciones iniciales son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	200	$ 17.195,00	$ 3.439.000,00
1,2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR	GLB	1	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
2,0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**				
2,1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM. PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta. Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	M3	200	$ 77.247,91	$ 15.449.583,00
2,2	CONFORMACION DE LA CALZADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE	M2	6148	$ 20.511,06	$ 126.101.969,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 10 - Local 191
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 540 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	SUBBASE GRANULAR, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.				
2,3	CONFORMACION DE LA CALZADA CONMATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Y su medida será en sitio ya compactado.	M2	200	$ 5.796,77	$ 1.159.354,00
3,0	**PAVIMENTO, BORDILLO Y CUNETAS**				
3,1	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	M3	1160	$ 262.362,28	$ 304.340.243,00
3,2	SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	M3	62,96	$ 1.025.586,28	$ 64.575.014,00
3,3	Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	9740	$ 1.559,30	$ 15.187.582,00
3,4	Suministro, Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	565	$ 8.143,30	$ 4.600.965,00
4,0	**CONSTRUCCION DE COLECTOR CARRERA 19 desde C1 A C3**				
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	76,64	$ 30.331,06	$ 2.324.621,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4,2	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC_MN_OC03_02	M2	174,39	$ 33.834,60	$ 5.900.416,00
4,3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø182 / 200MM; INCLUYEINCLUYE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, ADHESIVO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	58,13	$ 69.823,15	$ 4.058.820,00
4,4	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø160 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	30	$ 43.245,50	$ 1.297.365,00
4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNSILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 8" X 6"	UND	6	$ 128.821,79	$ 772.931,00
4,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1	UND	6	$ 835.482,18	$ 5.012.893,00
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN DE 1.20 M LONGITUD 1.00M PUESTO EN OBRA.	UN.	2	$ 1.011.493,90	$ 2.022.988,00
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO CUELLO Y TAPA PREFABRICADOS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN	UN	2	$ 600.161,84	$ 1.200.324,00
4,9	CONSTRUCCIÓN DE MESA CON DIÁMETRO DE 1,60M Y 0,20M DE ESPESOR Y CAÑUELA CON UN DIÁMETRO DE 1,20M Y 0,20M DE ESPESOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DIÁMETRO DE 1,20 M, LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA CAÑUELA SERÁ EL 15% Y DEBE SER EN CONCRETO DE 21MPA ESMALTADA CON CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	UN	2	$ 600.161,84	$ 1.200.324,00
4,10	LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA, EN	M3	78,52	$ 122.449,61	$ 9.614.743,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA				
4,11	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	64,49	$ 8.568,00	$ 552.528,00
5,0	**CONTENCION DE TALUD**				
5,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	225	$ 17.195,00	$ 3.868.875,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCL. MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL 12,5 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	150	$ 390.912,00	$ 58.636.800,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REE 2000	M2	120	$ 25.829,00	$ 3.099.480,00
6,0	ASEO				
6,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 645.416.818,00
				ADMINISTRACIÓN (29%)	$ 187.170.877,00
				UTILIDAD (5%)	$ 32.270.841,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO (34%)	$ 219.441.718,00
				VALOR TOTAL OBRA	$ 864.858.536,00

4. Que, se presentaron modificaciones al presupuesto oficial, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				$ 17.640.487,50
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	502,50	$ 17.195,00	$ 8.640.487,50
1,2	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR	GLB	1,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
2,0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**				$ 31.952.696,37
2,1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	M3	288,47	$ 77.247,91	$ 22.283.684,01
2,2	CONFORMACION DE LA CALZADA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	M2	0,00	$ 20.511,06	$ 0,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 540 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2,3	CONFORMACION DE LA CALZADA CONMATERIAL SUMINISTRADO POR ECOPETROL compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Y su medida será en sitio ya compactado.	M2	1668,00	$ 5.796,77	$ 9.669.012,36
3,0	**PAVIMENTO, BORDILLO Y CUNETAS**				**$ 423.548.538,11**
3,1	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	M3	921,00	$ 262.362,28	$ 241.635.658,59
3,2	SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa Incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye, transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	M3	124,45	$ 1.025.586,28	$ 127.631.956,06
3,3	Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	9729,76	$ 1.559,30	$ 15.171.613,73
3,4	Suministro, Corte, figurado e Instalación de ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa-60000 PSI, para pasadores y dovelas. y acero para cunetas y bordillo. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	4802,64	$ 8.143,30	$ 39.109.309,73
4,0	**CONSTRUCCION DE COLECTOR CARRERA 19 desde C1 A C3**				**$ 34.602.092,51**
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	327,82	$ 30.331,06	$ 9.943.115,06
4,2	CONSTRUCCIÓN DE ENTIBADO TEMPORAL EN TABLÓN DE MADERA (6 USOS), BAJO	M2	171,60	$ 33.834,60	$ 5.806.017,70

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 540 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA, EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTES EN LOS SITIOS DONDE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA Y SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO, SU FORMA DE PAGO SE HARÁ POR EL ÁREA QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON LA TIERRA, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES EPM NC MN OC03 02				
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø182 / 200MM, INCLUYEINCLUYE ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE, ADHESIVO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	58,13	$ 69.823,15	$ 4.058.819,94
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO O SIMILAR UNIÓN CAUCHO Ø160 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	36,00	$ 43.245,50	$ 1,556.838,00
4,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNSILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 8" X 6"	UND	6,00	$ 128.821,79	$ 772.930,74
4,6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO 1	UND	6,00	$ 835.482,18	$ 5.012.893,10
4,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN DE 1.20 M LONGITUD 1.00M PUESTO EN OBRA.	UN	2,00	$ 1.011.493,90	$ 2.022.987,80
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO CUELLO Y TAPA PREFABRICADOS PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN.	UN	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.323,68
4,9	CONSTRUCCIÓN DE MESA CON DIÁMETRO DE 1,60M Y 0,20M DE ESPESOR Y CAÑUELA CON UN DIÁMETRO DE 1,20M Y 0,20M DE ESPESOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DIÁMETRO DE 1,20 M, LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA CAÑUELA SERÁ EL 15% Y DEBE SER EN CONCRETO DE 21MPA ESMALTADA CON CEMENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EEPP DE MEDELLÍN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS	UN	2,00	$ 600.161,84	$ 1.200.323,68

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA IP-003-2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	MATERIALES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.				
4,10	LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA	M3	12,74	$ 122.449,61	$ 1.560.497,83
4,11	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.	M3	171,26	$ 8.568,00	$ 1.467.344,97
5,0	**CONTENCIÓN DE TALUD**				**$ 34.378.861,35**
5,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	55,26	$ 17.195,00	$ 950.173,35
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN GAVIONES INCL. MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12,5 (INCLUYE TRANSPORTE).	M3	76,00	$ 390.912,00	$ 29.709.312,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO REF 2000	M2	144,00	$ 25.829,00	$ 3.719.376,00
6,0	**ASEO**				**$ 2.000.000**
6,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA	UND	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
7,0	**NO PREVISTOS**				**$ 214.104.483,89**
7,1	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA)	M	1685,50	$ 75.067	$ 126.525.428,50
7,2	INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA PARA ESTABILIZAR TALUD EN PUNTO CRÍTICO, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, SEMILLAS PARA REVEGETACIÓN, TIERRA ORGÁNICA	M2	56,42	$ 55.610	$ 3.137.516,20
7,3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y POCETA	UNIDAD	1,00	$ 1.006.111	$ 1.006.111,00
7,4	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA	M2	5022,00	$ 3.213	$ 16.135.686,00
7,5	Suministro e instalación de material de subbase granular, compactada mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla o material tipo sub base, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado	M3	493,50	$ 131.434	$ 64.862.792,51
7,6	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA DE CAUDAL EN CONCRETO	M	6,82	$ 357.324	$ 2.436.949,68
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 758.227.160,00**
				ADMINISTRACIÓN (29%)	$ 219.885.876,00
				UTILIDAD (5%)	$ 37.911.358,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO (34%)	$ 257.797.234,00
				VALOR TOTAL OBRA	**$ 1.016.024.394,00**

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Poñol
310.546 91 32

5. Que, los trabajos, obras, bienes y/o servicios recibidos y entregados a satisfacción corresponden a los estipulados en el anterior considerando, sin que se haya presentado alguna otra modificación.

6. Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios han sido verificados y recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría SUMINISTRARTE S.A.S y la Empresa Autónoma de El Peñol, dentro del plazo pactado y se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

7. Que, el contrato finalizó el 30 de septiembre de 2025; sin embargo, debido a la revisión de la sabana de cantidades y al proceso de recibo final, así como la presentación de documentos legales, financieros y técnicos por parte del contratista, el Acta de Entrega y Recibo Final se suscribe en la fecha del presente documento.

8. Que el Contratista de Obra NIROSOF INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.A.S, deberá actualizar, suscribir y remitir las garantías en virtud de la presente Acta de Entrega y Recibo Final, y de conformidad con lo establecido en el contrato IP 003 de 2025.

9. Que, una vez se entreguen las garantías actualizadas y estas sean aprobadas, se podrá adelantar el trámite de liquidación del contrato, y posteriormente se procederá con el pago del saldo pendiente correspondiente al pago final.

10. Que, el siguiente es el resumen financiero del contrato suscrito para el cumplimiento de las acciones encomendadas:

RESUMEN FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 864.858.536,00
2	VALOR ADICIONAL	$ 151.193.668,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1+2)	$ 1.016.052.204,00
4	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 1 (Pagado)	$ 455.924.305,00
5	PORCENTAJE DEL ACTA No 1 (4/3)	44,87%
6	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 2 (Pendiente de pago)	$ 302.352.004,00
7	PORCENTAJE DEL ACTA No 2 (6/3)	29,76%
8	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA No 3 Y FINAL (Pendiente de pago)	$ 257.748.085,00
9	PORCENTAJE DEL ACTA No 3 Y FINAL (8/3)	25,36%
10	VALOR ACUMULADO (4+6+8)	$ 1.016.024.394,00

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 -40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA IP-003-2025

	RESUMEN FINANCIERO	
11	PORCENTAJE ACUMULADO (10/3)	99,99%
12	VALOR RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (3-10)	$ 27.810,00
13	PORCENTAJE RESTANTE A FAVOR DEL MUNICIPIO (12/3)	0,01%

En consecuencia, y en vista de lo anterior habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos para la ejecución del Contrato de Obra IP 003 de 2025, se recibe a entera a satisfacción por parte de la interventoría SUMINISTRARTE S.A.S, y la Empresa Autónoma de El Peñol.

Verificado lo anterior, en consecuencia, firman las personas que intervienen el doce (12) de noviembre de 2025.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

Andres Peña

SUMINISTRARTE S.A.S
Representante legal
SUMINISTRARTE S.A.S
Interventoría

SERGIO AMAURY DURANGO ZORA
Representante legal
NIROSOF INGENIERÍA Y TRANSPORTE S.A.S
Contratista de obra

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Brahian Gómez Vallejo Ingeniero Civil – EAEP	Brahian Gomez
Revisado por	Carlos Luna Rincón Abogado – Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4650800065

PÓLIZA No: 465 - 47 - 994000012385 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	24	11	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	25	11	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.599.096-2**

DIRECCIÓN: CL 48 3 55 CIUDAD: PUERTO NARE, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6048347140

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

BENEFICIARIO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	17/02/2025	31/03/2026	101,605,220.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/02/2025	31/03/2026	508,026,102.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/02/2025	30/09/2028	50,802,610.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	203,210,440.80

BENEFICIARIOS
NIT 901537748 - EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. IP 003 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL : MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON NIT. 890.983.906-4

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
AMER CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	11141	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/we_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000465080006

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780609FD7A5E

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 824 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000012385** ANEXO: 8

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.599.096-2**

ASEGURADO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

BENEFICIARIO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

TEXTO ITEM 1

NOTA; CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA VIGENCIA DEL AMPARO DE ANTICIPO.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.
- FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2025.

NOTA;: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN OTRO SI NRO. 02 AL CONTRATO FECHA 08 DE MAYO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 025.
- REANUDACIÓN NO. 1 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN:
- SUSPENSIÓN NO. 2 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025.
- PRORROGA NRO. 1 A LA SUSPENSION NRO. 2 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN REANUDACION NRO. 2 Y OTRO SI NRO. 3 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DEL VALOR ASEGURADO DE LAS GARANTIAS SEGUN REANUDACION NRO. 2 Y OTRO SI NRO. 3 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DELCONTRATO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
- FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

Great Place to Work Los Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4650800073

PÓLIZA No: 465 -74 - 994000003686 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO** COD. AGE: 465 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
24	11	2025		17	02	2025	23:59	30	09	2025	23:59	225	25	11	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIAS
	17	02	2025	23:59		30	09	2025	23:59		225
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.599.096-2**

DIRECCIÓN: CL 48 3 55 CIUDAD: PUERTO NARE, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6048347140

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

DIRECCIÓN: CARRERA 19 NR 04 20 CIUDAD: **PEÑOL, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 6048515855

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL NIT : 901537748

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: PUERTO TRIUNFO

DIRECCION: CALLE 0 NO. -

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE CONTRATO NO. IP 003 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA.

COBERTURA BÁSICA SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015.
1.1 AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
1.2 AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
1.3 AMPARO VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.
1.4 AMPARO PATRONAL.
1.5 AMPARO GASTOS MÉDICOS.
1.6 AMPARO GASTOS DE DEFENSA.
1.7 AMPARO PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
1.8 AMPARO DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AMER CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	11141	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000485080007

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADE25780609FD7A5A CLIENTE AGUIZA 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS ASEGURANDOTE BUCARAMANGA CENTRO COD. AGENCIA: 465 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000003686** ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.599.096-2**

ASEGURADO: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.537.748-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BÁSICO.
TODAS LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA DEL AMPARO BÁSICO, CUYO VALOR SERÁ EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL : MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON NIT. 890.983.906-4

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2025.
- FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2025.

NOTA;: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN OTRO SI NRO. 02 AL CONTRATO FECHA 08 DE MAYO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN VIGENCIAS SEGÚN:
- SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 025.
- REANUDACIÓN NO. 1 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN:
- SUSPENSIÓN NO. 2 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025.
- PRORROGA NRO. 1 A LA SUSPENSION NRO. 2 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN REANUDACION NRO. 2 Y OTRO SI NRO. 3 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2025.

NOTA: CON EL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DELCONTRATO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
- FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000003686 **ANEXO:** 7 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS **IDENTIFICACION:** 900.599.096-2

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	CALLE 0 NO. -	PUERTO TRIUNFO	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

NIROSOF
Ingeniería y transportes

Viernes 29 de agosto 2025 **CO-003-2025 OF 0017**

Señores:

SUMINISTRARTE SAS- INTERVENTORIA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA IP003-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE COMITÉ PARA REVISIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIGNIFICATIVAS

Por medio del presente, me permito solicitar formalmente la realización de un comité técnico con el fin de revisar y analizar las variaciones significativas presentadas en las cantidades de obra ejecutadas en el proyecto.

Durante la ejecución de las actividades, se han identificado variaciones referentes al balance contractual, específicamente:

CANTIDADES MAYORES:

1. ITEM 2.1. MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta incluye el suministro, transporte, la compactación de esta y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Cuya cantidad incrementa debido a que durante la operación de conformación del terreno se identificó una condición de este con una incidencia bastante significativa en cuanto a aumento de fallos y zonas degradadas del terreno a intervenir. Estas zonas presentan cavidades, material orgánico suelto, asentamientos, lo que hace indispensable la ejecución de esta actividad de material de recebo para asegurar la estabilidad y uniformidad de la subrasante.

NIROSOF
Ingeniería y transportes

2. ITEM 7.1. MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA). Durante la fase de ejecución de esta actividad se proyectó el 80% del total del tramo previsto. Esta decisión se tomó priorizando las zonas consideradas criticas para el manejo de aguas, adicional de la disponibilidad presupuestal existente. Sin embargo, durante el desarrollo y avance progresivo en campo, se identificaron condiciones adicionales que no habían sido contempladas, pues en varios de los sectores que no se tuvieron en cuenta al momento de la proyección, al momento de tener ya la calzada fundida, se evidenció acumulación de agua, situación que exigió la construcción de cunetas adicionales para garantizar el adecuado drenaje y la protección tanto de la calzada como las áreas aledañas.

CANTIDADES MENORES:

3. ITEM 3.2. SUMINISTRO, PREPARACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Esta actividad presenta una menor cantidad, ya que inicialmente se contemplaba en este ítem la cantidad a ejecutar de cunetas, la cual fue desglosada en el ítem 7.1. decisión que se tomó debido a que inicialmente era un tramo de 2.000 metros de cuneta, pero se adicionó otro tramo de 236 metros de cuneta.

4. ITEM 4.10. LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA. Esta actividad presenta una menor cantidad debido a que durante la ejecución de instalación de tubería y conformación de entresuelos en piedra, se identificaron condiciones reales de obra que permitieron reducir el volumen inicialmente proyectado para este ítem.

NIROSOF
Ingeniería y Transportes

Por lo anterior y dado que estas variaciones pueden impactar en el presupuesto y programación, es necesario contar con la evaluación de todas las partes, para documentar y tomar decisiones correspondientes.

Agradezco se pueda programar este comité en la fecha más próxima posible y confirmar el día y la hora asignados.

Quedo atenta a cualquier información.

Atentamente,

Melisa Camacho

RESIDENTE DE OBRA

SUMINISTRARTE	Código:
	Versión: 01-2025
NIT. 900931977 1	Página 1 de 3

CONTRATO	No. IP 003 DE 2025 COMITÉ No.06	FECHA COMITÉ 02 septiembre de 2025

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL EAEP

CONTRATISTA: NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS

INTERVENTORIA: SUMINISTRARTE S.A.S.

OBJETO: " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
ING SERGIO DURANGO		DIRECTO DE OBRA	
ING. NICOLAS CERVERA	1.152.472.243	SUPERVISOR MPIO	
ING. MELISA		RESIDENTE DE OBRA	Melisa Camacho
ING.HENRY TOBAR LOPEZ	12974435	RESIDENTE INTERVENTORIA	
ING HECTOR GUERRA MONCALEANO	93.200.589	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

ORDEN DEL DÍA

1. **Alcance real del proyecto balance de obra y cronograma final**
2. **Informe de avance de actividades realizadas.**
3. **Entrega de acta 3 final e informes correspondientes**

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 8:00 am Se da inicio a la reunión en obra con presencia del Ing. Nicolas Cervera, como supervisor del contrato por parte de la alcaldía municipal de Puerto Triunfo, el Ing. Sergio Durango director de obra y la ingeniera Melisa, con el fin de revisar las obras ejecutadas y las faltantes con el fin de corroborar el alcance real del proyecto y las actividades pendientes por ejecutar para cumplir con el balance 2 y el objeto contractual pactado.

Se realiza recorrido de todo el proyecto realizando las medidas en campo.
Se verifica que existen ítems con cantidades mayores al balance 2 ejecutadas tales como:

- EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES), debido a la ejecución de remplazos y mejoramiento de fallos en la subrasante.
- MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Material necesario para garantizar la calidad de pavimento.
- MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA) se requirió mayor cantidad de cunetas para el manejo del agua de escorrentía que se presenta en el tramo pavimentado.

Así mismo, se verifica que existen ítems con cantidades menores significativas al balance 2 ejecutadas, tales como:

- SUMINISTRO, PREPARACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Debido al desglose de cunetas de este item al item 7.1.
- LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA. Se puedo reducir el volumen inicialmente proyectado debido a las condiciones reales identificadas en campo.

Así mismo se evidencia que hay actividades con menor ejecución por lo que se realizara un balance de mayores y menores para cumplir con el alcance actual del proyecto de pavimentar 1.118 mts lineales llegando a la estación de gasolina.

Compromisos y solicitudes:

1. El ing Sergio entregará el balance de la obra con mayores y menores para verificar el alcance del proyecto y cronograma de actividades para cumplir con el plazo pactado.
2. La ing Melisa se compromete a entregar el acta 3 final con las cantidades medidas en obra y el informe de ejecución final con la bitácora de obra.
3. La interventoría solicita los ensayos de resistencia del concreto y las densidades de campo del tramo ejecutado.

Se da por terminado el comité de obra siendo las 12: 00 M y se firma por los que intervinieron.

SUMINISTRARTE NIT. 900931977 1	Código: Versión: 01-2025 Página 1 de 3

CONTRATO	No. IP 003 DE 2025 COMITÉ No.06	FECHA COMITÉ 02 septiembre de 2025

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL EAEP

CONTRATISTA: NIROSOF INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS

INTERVENTORIA: SUMINISTRARTE S.A.S.

OBJETO: " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE ARREBOLES AL BARRIO HORIZONTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA"

ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
ING SERGIO DURANGO		DIRECTO DE OBRA	
ING. NICOLAS CERVERA	1.152.472.243	SUPERVISOR MPIO	
ING. MELISA		RESIDENTE DE OBRA	Melisa Camacho
ING.HENRY TOBAR LOPEZ	12974435	RESIDENTE INTERVENTORIA	
ING HECTOR GUERRA MONCALEANO	93.200.589	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

ORDEN DEL DÍA

1. **Alcance real del proyecto balance de obra y cronograma final**
2. **Informe de avance de actividades realizadas.**
3. **Entrega de acta 3 final e informes correspondientes**

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 8:00 am Se da inicio a la reunión en obra con presencia del Ing. Nicolas Cervera, como supervisor del contrato por parte de la alcaldía municipal de Puerto Triunfo, el Ing. Sergio Durango director de obra y la ingeniera Melisa, con el fin de revisar las obras ejecutadas y las faltantes con el fin de corroborar el alcance real del proyecto y las actividades pendientes por ejecutar para cumplir con el balance 2 y el objeto contractual pactado.

Se realiza recorrido de todo el proyecto realizando las medidas en campo.
Se verifica que existen ítems con cantidades mayores al balance 2 ejecutadas tales como:

- EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD (INC. RETIRO DE SOBRANTES), debido a la ejecución de remplazos y mejoramiento de fallos en la subrasante.
- MATERIAL DE MEJORAMIENTO (RECEBO) ESPESOR MAXIMO DE 50 CM PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN FALLOS compactados mecánicamente hasta Incluye el suministro, transporte, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. Material necesario para garantizar la calidad de pavimento.
- MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM (MATERIAL DEL CONCRETO SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA) se requirió mayor cantidad de cunetas para el manejo del agua de escorrentía que se presenta en el tramo pavimentado.

Así mismo, se verifica que existen ítems con cantidades menores significativas al balance 2 ejecutadas, tales como:

- SUMINISTRO, PREPARACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO para pavimento, cunetas y bordillos de 24 Mpa incluye construcción de juntas, sellado de juntas. Con diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye transporte y colocación del concreto, instalación de formaleta completa, vibrado, protección y curado del concreto. Y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. Debido al desglose de cunetas de este item al item 7.1.
- LLENO CON GRAVA DE RIO 3/4" (SUMINISTRO, EXTENDIDO) PARA BASE DE BRECHA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y/O COMPLEMENTO DE ENTRESUELOS EN PIEDRA. Se puedo reducir el volumen inicialmente proyectado debido a las condiciones reales identificadas en campo.

Así mismo se evidencia que hay actividades con menor ejecución por lo que se realizara un balance de mayores y menores para cumplir con el alcance actual del proyecto de pavimentar 1.118 mts lineales llegando a la estación de gasolina.

Compromisos y solicitudes:

1. El ing Sergio entregará el balance de la obra con mayores y menores para verificar el alcance del proyecto y cronograma de actividades para cumplir con el plazo pactado.
2. La ing Melisa se compromete a entregar el acta 3 final con las cantidades medidas en obra y el informe de ejecución final con la bitácora de obra.
3. La interventoría solicita los ensayos de resistencia del concreto y las densidades de campo del tramo ejecutado.

Se da por terminado el comité de obra siendo las 12: 00 M y se firma por los que intervinieron.

Para cunetas.
Se realiza conformación y compactación con Sublastre granular.
Se realiza encofrado con formaletas metálicas.
Se realiza puesta de hierro.
Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para bóveda.
NOTA: Debido a que por parte del Municipio se está realizando la gestión de una adición presupuestal derivada de obras no previstas y mayores cantidades de obra, se suspende temporalmente la obra por un lapso de 15 días.

Melisa Camacho — Interventoría.
Contratista

Fecha: Jueves 23 de agosto 2018
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
9 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Director de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cadal
6 palas
4 palines
3 pulidores
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial

1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora
Maquinaria
1 bob cat
1 bonitin
1 Camion
Actividades ejecutadas
Se reinician actividades
Se realiza excavación para cimientos
Se da inicio a excavación para tubería de 8" de alcantarillado
Se continua encofrado con formaletas metálicas para viga
Se realiza puesta de hierro
Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para viga

Melisa Camacho
Contratista

Viernes 29 de agosto 2014
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cadal
6 palas
1 palinar
3 palustres

2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora

Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
1 Ramix

Actividades ejecutadas
- Se realiza excavación y nivelado de cunetas
- Se finaliza excavación e instalación de tubería 6" para alcantarillado.
- Se realiza encofrado en formaletas metálicas
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para vía.

Melisa Camacho
Contratista

Independencia

Fecha: Sábado 30 de agosto 2014
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST = 1 Residente ambiental

Herramienta y equipo:
3 Cudal
6 Palas
4 Palines
3 Palustres
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora

Maquinaria:
1 bob cat
1 benitin
1 Camix

Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y vaciado de cunetas
Se realiza excavación para tubería de 6" domiciliarias

Melisa Camacho
Contratista

Intervención

Fecha: Lunes 01 de Septiembre 2021
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Maestro de obra

1 Residente de obra
1 Residente SST

Herramienta y equipo:
3 cedal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
3 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora

Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
1 camix

Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de cimientos
- Se continua excavación para tubería 6" " domiciliarias
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para viga

Melisa Lozada
Contratista

Interventoría

Fecha: Martes 02 de Septiembre 2021

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

1 Oficial

7 Ayudantes

1 Maestro de obra

1 Residente de obra

1 Residente SST

Herramienta y equipo:

3 codal

6 Palas

4 Palines

3 palustres

2 Macetas

2 Martillos

2 Alicates

1 Serrucho

1 Extensión

1 Radial

1 Pulidora

1 Planta eléctrica

1 Cortadora de pavimento

1 Vibrador de concreto

1 Trompeadora

Maquinaria:

1 bob cat

1 bentin

1 Camión

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cunetas.
- Se continua excavación para tubería de domiciliarias
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierros
- Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para vía

Nelly Ramacho

Contratista

Interventoría

Fecha: Miércoles 03 de septiembre 2025

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

1 oficial

3 Ayudantes

1 Maestro de obra

1 Residente de obra – 1 Director de obra

1 Residente SST – 1 Residente ambiental

Herramienta y equipo:

3 cordel

6 palos

4 palines

3 polvitos

2 Macetas

2 Martillos

2 Alicates

1 Serrucho

1 Extensión

1 Radial

1 Pulidora

1 Planta eléctrica

1 Pisotadora de pavimento

1 Vibrador de concreto

1 Tronzadora

Maquinaria:

1 Retro cat

1 Berritin

1 Camión

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cuneta
- Se continua excavación fibra 6" para domiciliarias
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3500 psi para sección vial.

Melisa Camacho
R. Contratista

Intervenciones

Fecha: Jueves 04 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: lluvia
Personal en obra:
1 Oficial
1 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cadal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Vibrador de concreto
1 Trompo
Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
1 Camión
Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y vaciado de cimientos
Se realiza puesta de tubería 6" para domiciliarias

- Se realiza encofrado con formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3500psi para losa.

Melissa Camacho
Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 05 de septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Directa de obra.
1 Residente SST

Herramienta y equipo:
3 codal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Fumigadora

Maquinaria:
1 bobcat
1 berlin

1 Cuadrilla

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cunetas.
- Se finaliza puesta de tubería 6" para domiciliarias.
- Se realiza lleno y compactación de excavación de tubería para alcantarillado
- Se realiza encofrado de formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3000psi para vía.

Melisa Camacho

Contratista: Interventoría

Fecha: Sábado 06 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Lluvia

Personal en obra:

1 Oficial
3 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST

Herramienta y equipo:

3 codal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 Macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Exterión
1 Radial
1 Pulidora
1 planta eléctrica

1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora
Maquinaria:
1 bob cat.
1 bentin
1 Ca-mix
Actividades ejecutadas:
- Se realizo excavación y vaciado de cunetas
- Se realizo excavación para cajas registro.
- Se realizo encofrado con formaletas metálicas y
- Se realizo puesta de hierro.
- Se realizo vaciado de concreto 3500psi para vía

Melisa Ramírez
Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 08 de Septiembre 2025.
Estado de tiempo:
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST - 1 Residente ambiental
Herramienta y equipo:
3 codal
6 palas
4 paliner
3 pulustres
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho

1 Extensión
1 Radial
1 pulidora
1 planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Troncadora

Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
1 Camix

Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de anclajes
- Se realiza excavación para cajas de registros
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas
- Se realiza puesta de hierro
- Se realiza vaciado de concreto 3000psi para viga

Mesa de Comando de la Interventoría
Contratista

Fecha: Martes 09 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST

Herramienta y equipo:
3 cuñas
6 Palas
4 palines
3 palustres

2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extension
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Ironfadora
Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
1 Cavmix
Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de concreto
- Se realiza vaciado de piso para cajas de registro de la cara 1, 2 y 3.
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3700 psi para viga.

Melisa Camacho
Contratista

Interventoría

Fecha: Miércoles 10 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST

Herramienta y equipo:

3 cudal

6 palas

4 palines

3 pulustres

2 macetas

2 martillos

2 Alicates

1 Serrucho

1 Extensión

1 Radial

1 Pulidora

1 Planta eléctrica

1 Cortadora de pavimento

1 Vibrador de concreto

1 Trontadora

Maquinaria:

1 bob cat

1 bentin

1 camioneta

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cunetas
- Se realiza vaciado de piso para cajas de casas 4, 5 y 6.
- Se realiza encofrado y vaciado de pared para caja de registro de casas 1, 2 y 3.
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas
- Se realiza prueba de chiemo
- Se realiza vaciado de concreto para viga

Nelio Sanchez

Contratista

Inteventoría

Fecha: Jueves 11 de Septiembre 2014

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

1 Oficial
2 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Director de obra
1 Residente SST - 1 Residente ambiental

Herramienta y equipo:

3 cucha
6 palas
4 palines
3 palustres
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Tronzadora

Maquinaria:

1 Kodo cat
1 bonitin
1 carmix

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cimientos
- Se realiza encofrado y vaciado de Pareder para cajas de registro de cajas 4, 5 y 6.
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas
- Se realiza puerta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3000 PSI para viga

Melisa Camacho
Contratista — Interventoría

Fecha: Viernes 12 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
1 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Director de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 vadal
6 palas
4 palines
3 pulsters
2 marcetas
2 marfiles
2 Azicates
1 Semicho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Formaleta
Maquinaria:
1 bob cat
2 bentin
1 camión
Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y vaciado de cimientos.
Se realiza encofrado de formaletas metálicas
Se realiza puesta de hierro

Se realiza vaciado de concreto 3000 psi para viga

Melisa Caraballo
Contratista — Interventoría

Fecha: Sábado 13 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Lluvia
Personal en obra:
1 Oficial
7 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 codal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora
Maquinaria:
1 bob cat
1 bomba
1 Camión
Actividades ejecutadas:

- Se realizo excavación y vaciado de cunetas.
- Se realizo encofrado con formaletas metálicas.
- Se realiza puesta de hierro.
- Se realiza vaciado de concreto 3000psi para viga.

Melisa Camacho
Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 15 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
6 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cudal
6 palas
4 palines
3 palustres
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento
1 Vibrador de concreto
1 Trompadora
Maquinaria:
1 bob cat

1 Kenitin
2 Caimito

Actividades ejecutadas:

- Se realiza vaciado de tapas para cajas de registro de las casas 1 y 2.
- Se realiza encofrado con formaletas metálicas
- Se realiza puesta de hierro.
- Se finaliza vaciado de concreto de 3000psi para la

Maira Sancho
Contratista

Interventoría

Fecha: Martes 16 de Septiembre 2015
Estado del tiempo: Nublado
Personal en obra:
1 Oficial
6 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST - 1 Residente ambiental
Herramienta y equipo:
3 cocla
6 palas
4 picos
3 polisher
2 Macetas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Radial
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Cortadora de pavimento

1 Vibrador de concreto
1 Trompadora
Maquinaria:
1 pala cat
1 bentin.
Actividades ejecutadas:
- Se realiza Excavación y vaciado de cunetas.
- Se realiza Vaciado de tapas para cajas de registro de las cajas 3 y 4.

Melisa Camacho
Contratista

Interventoría.

Fecha: Miércoles 12 de Septiembre 2018
Estado del tiempo: Nublado
Personal en obra:
1 Oficial
6 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 codal
6 palas
4 paliner
3 palustre
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Vibradora

Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de cunetas
- Se finaliza vaciado de tapas para caja de registro de las casas 5 y 6.

Melisa Lagracha
Contratista

Interventoría

Fecha: Jueves 18 de Septiembre 2017
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
6 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cocal
4 palas
4 palines
3 picos
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Pistola
1 Planta eléctrica
1 Vibradora
Maquinaria:
1 bob cat

1 bonitin.

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavación y vaciado de cunetas.

Melisa Camacho

Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 19 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

4 Oficiales

5 Ayudantes

1 Maestro de obra

1 Residente de obra - 1 Director de Obra

1 Residente SST

Herramienta y equipo:

3 picas

4 palas

4 palines

3 palustres

2 macetas

2 martillos

2 Alicates

1 Serrucho

1 Extensión

1 Pulidora

1 Planta eléctrica

1 Transformadora

Maquinaria

1 back cat

1 bonitin

Actividades ejecutadas

- Se realiza excavación y vaciado de cunetas.

Melisa Laprada
Contratista

Interventoría

Fecha: Sábado 10 de Septiembre 2022
Estado del tiempo: Lluvia
Personal en obra:
1 Oficial
5 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST - 1 Residente ambiental
Herramienta y equipo:
3 costal
4 palas
4 palines
3 palustres
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Pulidora
1 planta eléctrica
1 Trompadora
Maquinaria:
1 bailarín
1 hoe cat
Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de cimientos

Melisa Laprada
Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 22 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Lluvia
Personal en obra:
1 Oficial
1 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Directa de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 codal
4 polar
4 palines
3 palustres
2 Macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Plomos
1 Planta eléctrica
1 Trompadora
Maquinaria:
1 bob cat
1 bentifin
Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y voladas de cunetas

Melisa Camacho
Residente

Fecha: Martes 23 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial

5 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cobal
1 palas:
1 paliner
3 palustres
2 macetas
2 martillos
1 Alicates
1 Sondeo
1 Extensión
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Taladradora
Maquinaria:
1 Vib. cat
1 bevitin
Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y vaciado de cunetas.

Melisa Conrado
Contratista: Interventoría

Fecha: Miércoles 24 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
5 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST - 1 Residente ambiental

Herramienta y equipo:
3 codal
4 palas
4 palines
3 pulsitres
2 Marcelas
2 Martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Tronzadora
Maquinaria:
1 Mini cat
1 Bentin
Actividades ejecutadas:
- Se realiza excavación y vaciado de cimentación

Nelio Camacho
Contratista

Fecha: Jueves 25 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
5 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 codal
4 Palas
4 palines

3 palustres
2 macetas
2 martillos
2 Alicates
1 Serrucho
1 Extensión
1 Pulidora
1 Planta eléctrica
1 Transpaleta
Maquinaria:
1 bobcat
1 bonitin
Actividades ejecutadas:
Se realiza excavación y vaciado de cunetas.

Meliza Camacho
Contratistas de obras e ingeniería - Interventoría

Fecha: Viernes 26 de Septiembre 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
1 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra - 1 Director de Obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 cadal
1 palas
1 palinar
3 palustres
2 macetas
2 martillos
2 Alicates

1 Serucho
1 Extensión
1 pulidora
1 planta eléctrica
1 Temperatura
Maquinaria:
1 bob cat
1 bentin
Actividades ejecutadas:
- Se realizo excavación y vaciado de trincheras

Meliza Lemacha
Contratista

Inspección

Fecha: Sábado 24 de septiembre 2022
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
5 Ayudantes
1 Maestro de obra
1 Residente de obra
1 Residente SST
Herramienta y equipo:
3 codal
4 palar
1 palines
3 palustres
2 maceta
2 cinchillos
2 Alicates
1 Serucho
1 Extensión
1 Pulidora
1 planta eléctrica

1 Trompadora

Maquinaria:

1 bob cat

1 bentin

Actividades ejecutadas:

- Se finalizan actividades con vaciado de cunetas

Melisa Ramacho — Interventoría

Contratista

Fecha: Lunes 29 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Soleado

personal en obra:

1 Oficial

5 Ayudantes

1 Maestro de obra

1 Residente de obra — 1 Director de Obra

1 Residente SST — 1 Residente ambiental

Herramienta y equipo:

3 escobas

2 hidrolavadoras

Actividades ejecutadas:

Se realizan aseos en vía.

Melisa Ramacho — Interventoría

Contratista

Fecha: Martes 30 de Septiembre 2025

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra:

1 Oficial

5 Ayudantes

1 Maestro de obra
1 Residente de Obra
1 Residente SST.
Herramienta y equipo:
4 escobas
2 hidrolavadoras.
Actividades ejecutadas:
- Se realiza aseo en vía.

Melisa Camacho
Contratista

Interventoría

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141202038258

(415)7707212489984(8020) 000014120203825 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 1 9 7 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTRARTE SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barbosa 0 7 7

41. Dirección principal
CR 7 14 64 ED TORRE DEL TRAPICHE AP 1001

42. Correo electrónico suministrartesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 2 7 4 1 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 2 0 0 1 0 1	4 9 2 1	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5 1

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA DE LA ROSA RODOLFO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202038258

(415)7707212489984(8020) 000014120203825 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 1 9 7 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 6 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil	0 2 6 4 7 9 8 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 1 2 8
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141202038258

(415)7707212489984(8020) 000014120203825 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 1 9 7 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 3 3 1 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	DE LA ROSA	RODOLFO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 9 3 1 9 7 7	1	SUMINISTRARTE SAS

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO
