CLM.287.25-202
Responder a este número

Bogotá D.C., 01 de abril de 2026

Señores:
CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Atn. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
Representante Legal
consorcioestudiosmpccl@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO No: ICCU- 257 DE 2025 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

ASUNTO: **CLM.287.25.202** Aprobación de los Informes de Consultoría correspondientes a los meses 5 al 10 del contrato de la referencia.

Respetados,

Por medio del presente oficio, se comunica la **aprobación de los Mensuales,**

- **Informe mensual No. 5 (Periodo 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025)**
- **Informe Mensual No. 6 (Periodo 20 de octubre al 19 de noviembre de 2025).**
- **Informe Mensual No. 7 (Periodo 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2025).**
- **Informe Mensual No. 8 (Periodo 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026).**
- **Informe Mensual No. 9 (Periodo 20 de enero al 19 de febrero de 2026).**
- **Informe Mensual No. 10 (Periodo 20 de febrero al 19 de marzo de 2026).**

Lo anterior, en el marco del Contrato No. ICCU-CTO-257-2025, suscrito para la ejecución de estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en los oficios No. OF-MPCCL-257-2026-017, OF-MPCCL-257-2026-019 y OF-MPCCL-257-2026-053..

En consecuencia, se solicita realizar el cargue de los informes correspondientes a los meses 5 al 10 en la plataforma SECOP II, así como continuar con la ejecución de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los cronogramas reprogramados y la calidad de los productos entregables.

Cordialmente,

PAULA FERNANDA MORALES SANCHEZ
Directora de Interventoría
CONSORCIO LITORAL-MC

c.c. Ing. Jhon William Ardila Bacca – Apoyo Supervisión ICCU

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL CONSULTORÍA	FECHA	12/03/2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 257 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No. 8

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL

DUITAMA, BOYACA
ENERO DE 2026

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL CONSULTORÍA	FECHA	12/03/2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Consultoria No.	**257**	**Contratista:**	**Consorcio estudios MPCCL**
Contrato de Interventoría No.	**287**	**Interventoría:**	**CONSORCIO LITORAL MC**


Objeto Contrato de Consultoria:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONUO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

INFORME MENSUAL No.	**8**	**MES O PERIODO:**	DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Consultoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
3	Información Contrato de		
3.1	Información general contrato		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
4	Reportes ejecución mensual contrato de		
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO	

		SEMANAL INTERVENTORÍA	
5	Conclusiones y recomendaciones		
6	Anexos		
6.1	Registro fotográfico del avance de las obras.		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____
Nombre: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
DIRECTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Tarjeta Profesional: 01196-0427

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

1 Introducción

Tibacuy es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Sumapaz. Se encuentra a aproximadamente 74 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas de viaje en automóvil. Este municipio es conocido por su clima templado y su entorno natural, ideal para la agricultura y el ecoturismo. Situado en la Cordillera Oriental, Tibacuy tiene una altitud de aproximadamente 1,600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural. La economía de Tibacuy se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía.

Viotá es un municipio ubicado en la región del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Se encuentra a unos 97 kilómetros al sur de Bogotá y es conocido por su belleza natural y su rica historia. El municipio de Viotá se extiende sobre una superficie de 208 km² y se encuentra a una altitud media de 567 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido, lo que favorece una gran diversidad de flora y fauna. Viotá limita con los municipios de Apulo, Anapoima, El Colegio, Granada, Tocaima, Silvania y Tibacuy.

La economía de Viotá se basa principalmente en el sector agropecuario. Los cultivos más importantes incluyen café, plátano, naranja, maíz, yuca, cebolla, tomate, cilantro, maracuyá, guama, papaya y aguacate. En los últimos años, el mango ha ganado importancia como producto frutal destacado. Además, la avicultura, la porcicultura y la apicultura son actividades comunes en la región. La piscicultura también se ha desarrollado para satisfacer las necesidades locales y comerciales.

El Colegio es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama. Se encuentra a aproximadamente 55 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 30 minutos de viaje en automóvil. Este municipio es conocido por su clima cálido y su entorno natural, siendo un destino popular para el ecoturismo y el descanso. Situado en la región del Tequendama, El Colegio tiene una altitud de aproximadamente 1,490 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural. La economía de El Colegio se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. La ganadería y la avicultura también son actividades económicas importantes. Además, el turismo ecológico ha cobrado relevancia en los últimos años, atrayendo a visitantes interesados en la naturaleza y las actividades al aire libre.

San Antonio del Tequendama es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama. Se encuentra a aproximadamente 70 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 1 hora y 40 minutos de viaje en automóvil. Este municipio es conocido por su clima templado y sus impresionantes paisajes naturales, incluyendo el famoso Salto del Tequendama. Situado en la Cordillera Oriental, San Antonio del Tequendama tiene una altitud de aproximadamente 1,600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, siendo el más destacado el río Bogotá que forma la cascada del Salto del Tequendama. La economía de San Antonio del Tequendama se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de café, maíz y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

El objeto del presente contrato de consultoría es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS” y comprende los municipios de Tibacuy (Cumaca), Viotá (San Gabriel), El Colegio (La Victoria) y San Antonio del Tequendama (El Pin).

Tibacuy pertenece a la provincia del Sumapaz, mientras que Viotá, El Colegio y San Antonio del Tequendama pertenecen a la provincia del Tequendama.


En el presente documento se presenta el informe mensual de consultoría No 8 del contrato 257 de 2025 “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS”

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en la vía que conecta el casco urbano de la Inspección Cumaca (Municipio de Tibacuy) con el sector El Pin (Municipio de San Antonio del Tequendama), con una longitud aproximada de 41,3 km divididos en 9 tramos a intervenir de la siguiente manera:

Ilustración 1. Ubicación tramo Cumaca – El Pin

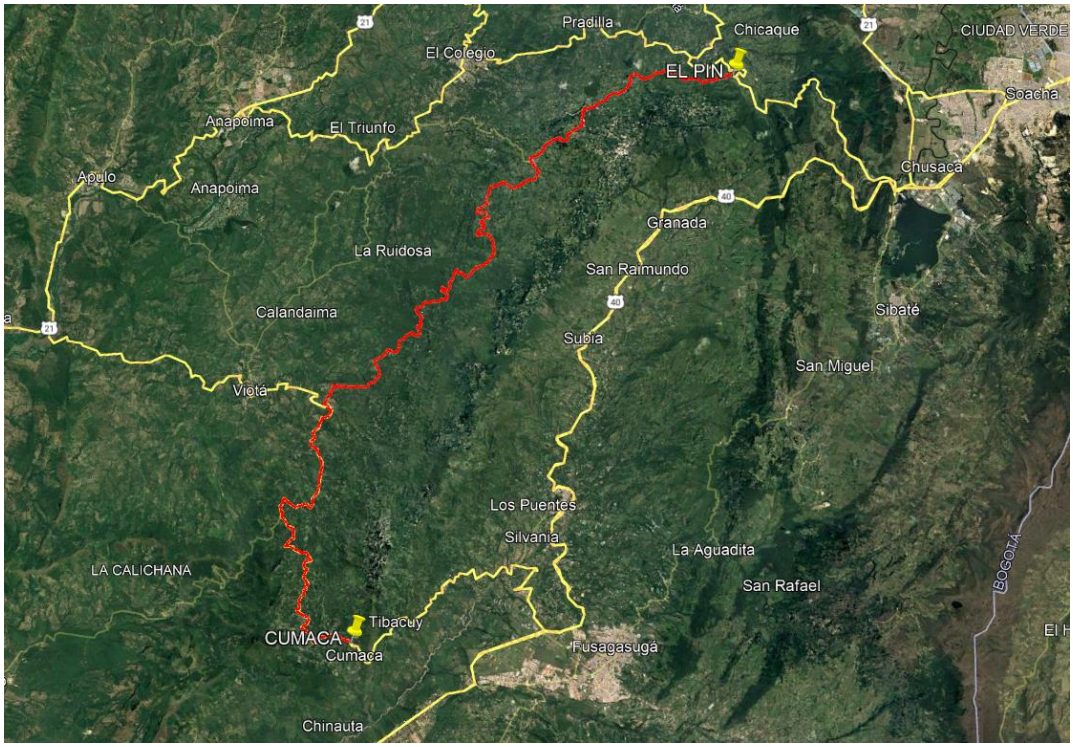


Fuente: Anexo técnico – Google Earth

- Del PR 0+000 al PR 6+675 Cumaca – Palestina

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 0+000	4°20'16"N	74°28'14"W
PR 6+675	4°21'40"N	74°29'25"W

Ilustración 2. Localización Cumaca - Palestina - PR 0+000 al PR 6+675

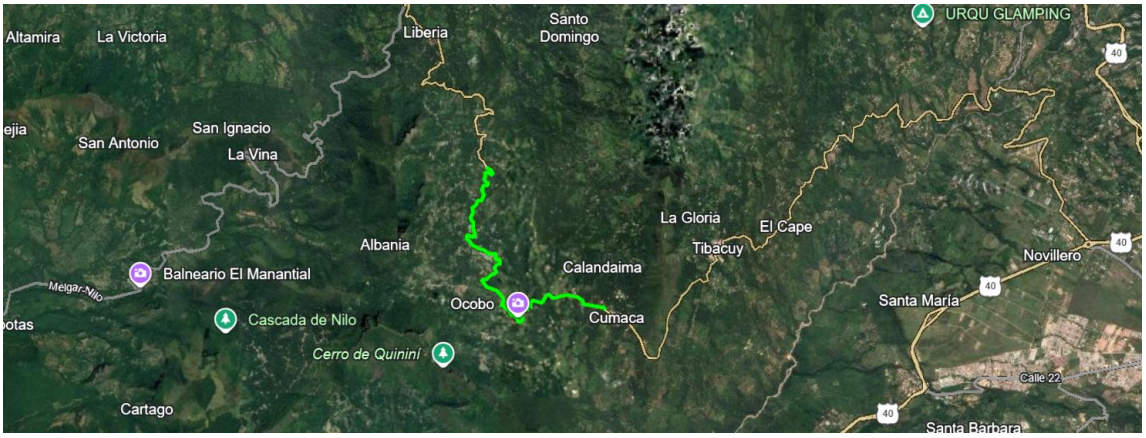

Fuente: Google Earth

- Del PR13+341 al PR13+639 Tramo 1 y tramo 2

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR13+341	4°23'27"N	74°30'16"W
PR13+639	4°23'34"N	74°30'12"W

Ilustración 3. Localización Tramo 1 y tramo 2 - PR13+341 al PR13+639



Fuente: Google Earth

- Del PR 13+896 al PR13+933 Tramo 2 y tramo 3

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 13+896	4°23'38"N	74°30'09"W
PR13+933	4°23'37"N	74°30'08"W

Ilustración 4. Localización Tramo 2 y tramo 3 - PR 13+896 al PR13+933




Fuente: Google Earth

- Del PR 15+351 al PR15+921 Tramo 3 y tramo 4

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 15+351	4°23'29"N	74°29'33"W
PR15+921	4°23'42"N	74°29'28"W

Ilustración 5. Localización Tramo 3 y tramo 4 - PR 15+351 al PR15+921

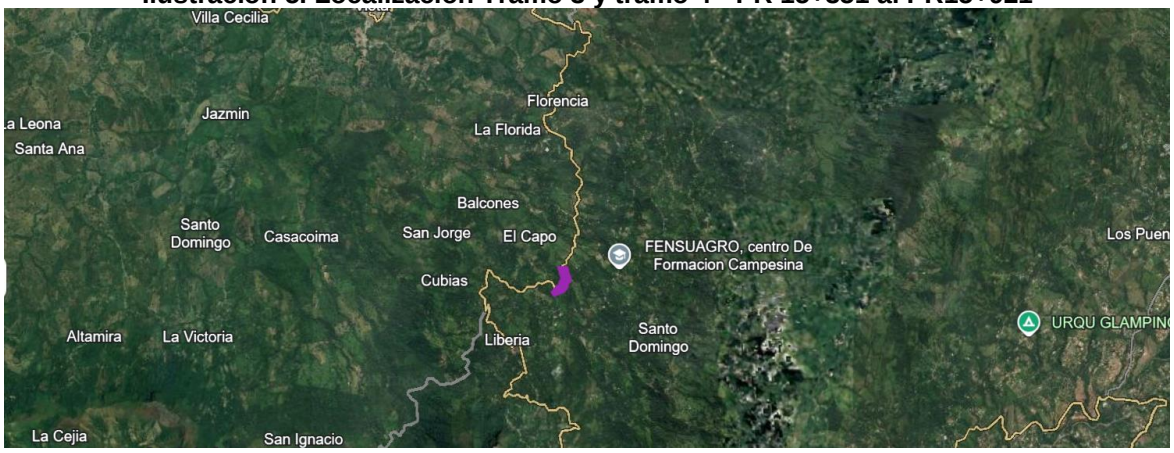

Fuente: Google Earth

- Del PR 16+180 al PR20+843 Tramo 4 y Sector A

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 16+180	4°23'48"N	74°29'23"W
PR20+843	4°25'42"N	74°29'20"W

Ilustración 6. Localización Tramo 4 y Sector A- PR 16+180 al PR20+843




Fuente: Google Earth

- Del PR 21+945 al PR24+769 El cruce – Cacería

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 21+945	4°26'01"N	74°29'20"W
PR24+769	4°26'33"N	74°28'34"W

Ilustración 7. Localización El cruce – Cacería Ceilán - PR 21+945 al PR24+769

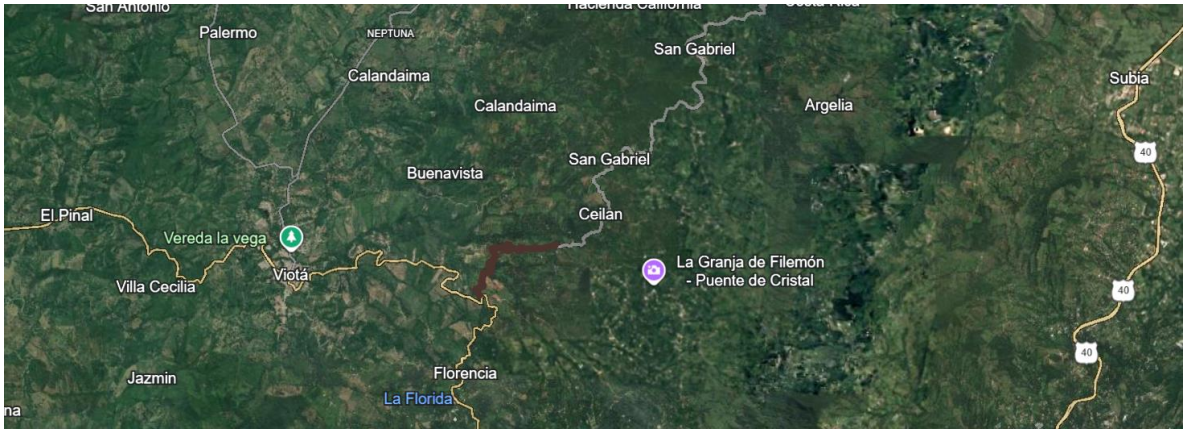

Fuente: Google Earth

- Del PR 24+891 al PR31+220 Caserío Ceilán - San Gabriel

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 24+891	4°26'34"N	74°28'30"W
PR31+220	4°28'24"N	74°27'08"W

Ilustración 8. Localización Tramo Caserío Ceilán - San Gabriel - PR 24+891 al PR31+220



Fuente: Google Earth

- Del PR 32+796 al PR45.796 San Gabriel - La Victoria

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 32+796	4°28'49"N	74°26'48"W
PR45.796	4°31'45"N	74°25'04"W

Ilustración 9. Localización Tramo San Gabriel - La Victoria - PR 32+796 al PR45+796



Fuente: Google Earth

- Del PR 54+128 al PR61+030 La Victoria – El Pin

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD	LONGITUD
PR 54+128	4°33'52"N	74°23'16"W
PR61+030	4°34'44"N	74°20'32"W

Ilustración 10. Localización Tramo La Victoria – El Pin - PR 54+128 al PR61+030



Fuente: Google Earth

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios

El área de influencia comprende los municipios de Tibacuy (Cumaca), Viotá (San Gabriel), El Colegio (La Victoria) y San Antonio del Tequendama (El Pin). Tibacuy pertenece a la provincia del Sumapaz, mientras que Viotá, El Colegio y San Antonio del Tequendama pertenecen a la provincia del Tequendama La vía comienza en Cumaca en el municipio de Tibacuy, pasa por el sector rural de los municipios de Viotá, El Colegio y finaliza en el sector El Pin en el municipio de San Antonio del Tequendama.

Las soluciones viales para la vía desde el casco urbano de la inspección Cumaca (municipio de Tibacuy) al sector El Pin (municipio de San Antonio del Tequendama) garantizan una mejor conectividad vial, optimizando el acceso a los centros poblados de estos municipios y reduciendo tiempos de desplazamiento, lo que beneficiará a la economía de la región que es en su mayoría agrícola, una mejora en la infraestructura facilitará un acceso más rápido y seguro tanto a los residentes de la zona como a los visitantes o usuarios de la vía, fortalecerá las zonas turísticas cercanas, incrementando el flujo de turistas y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico local.

2.3 Estado inicial de la vía

TRAMO 1







VEREDA
INSPECCIÓN
BATEAS
CUMACA



TRAMO 2

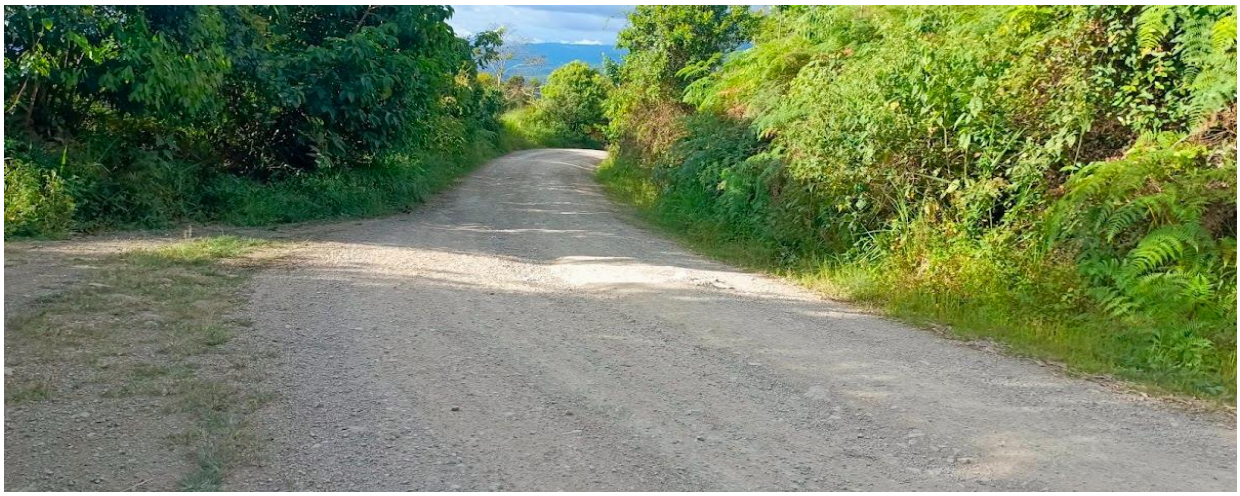






TRAMO 3





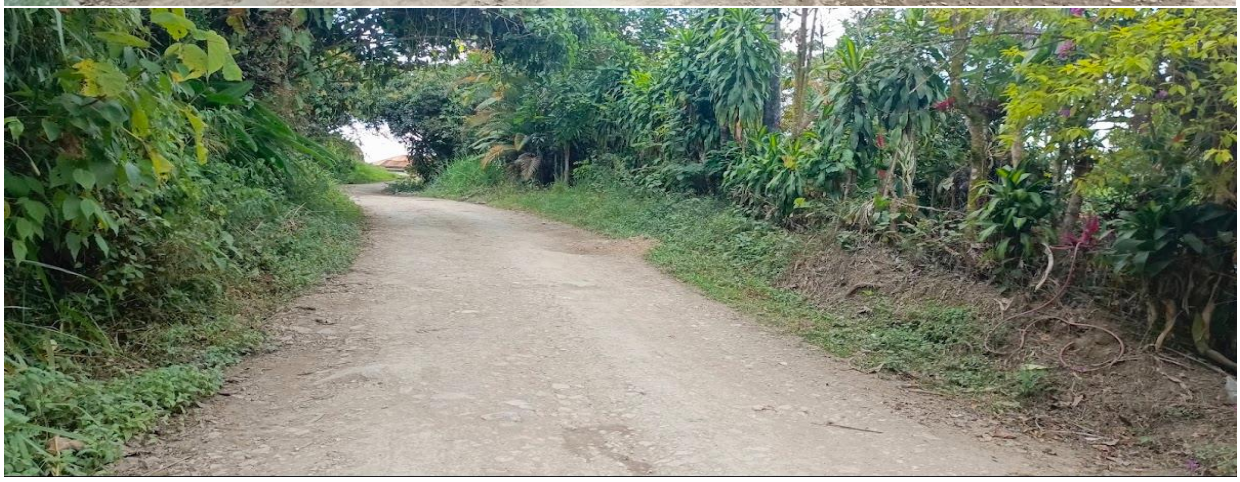

TRAMO 4









TRAMO 5










TRAMO 6

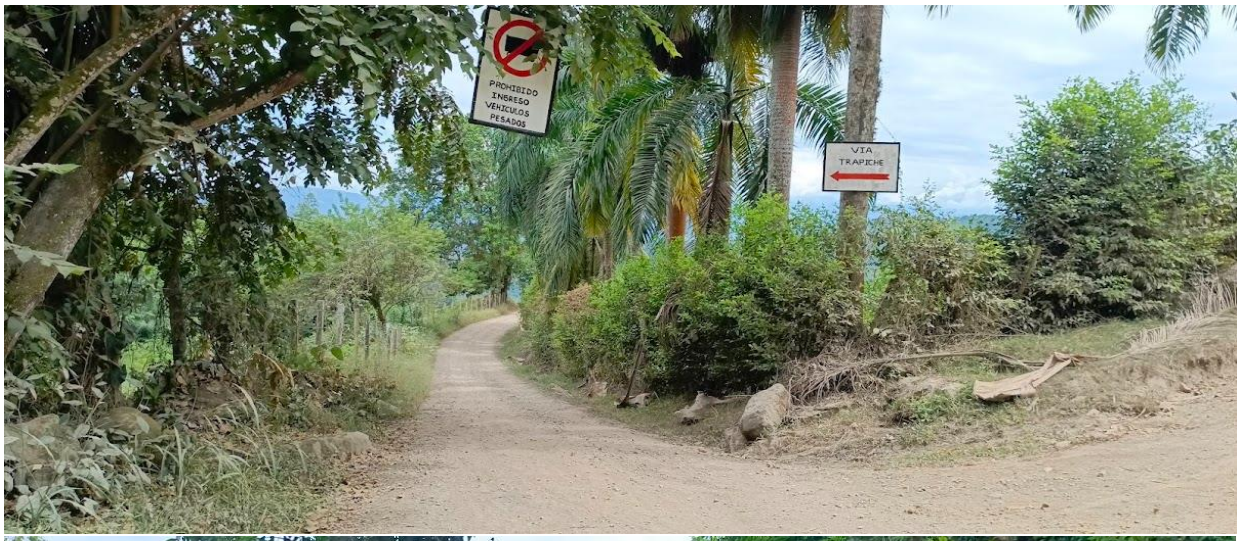












REL 444

TRAMO 7

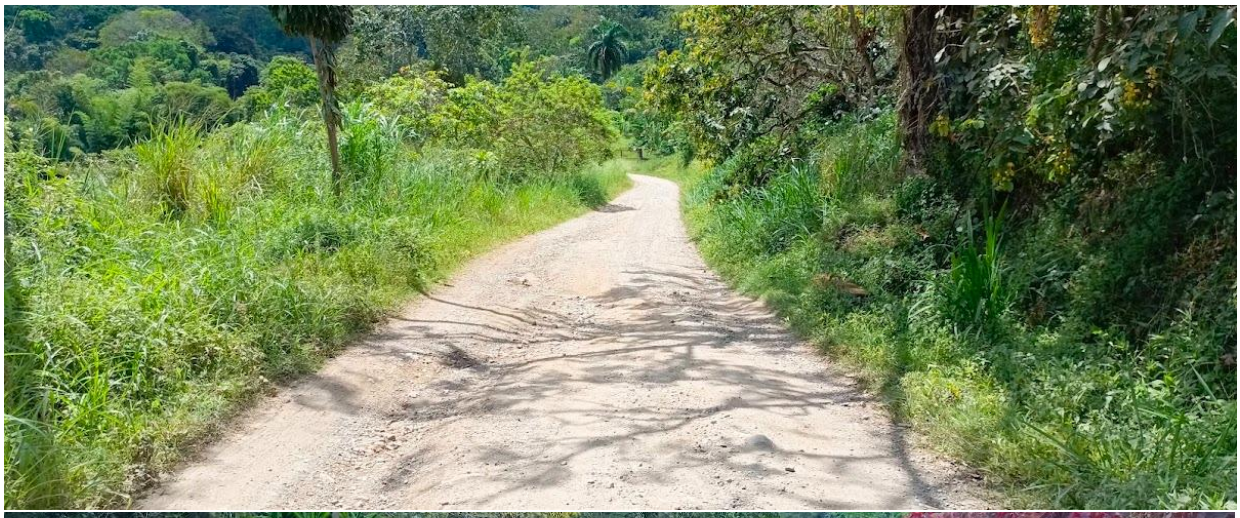

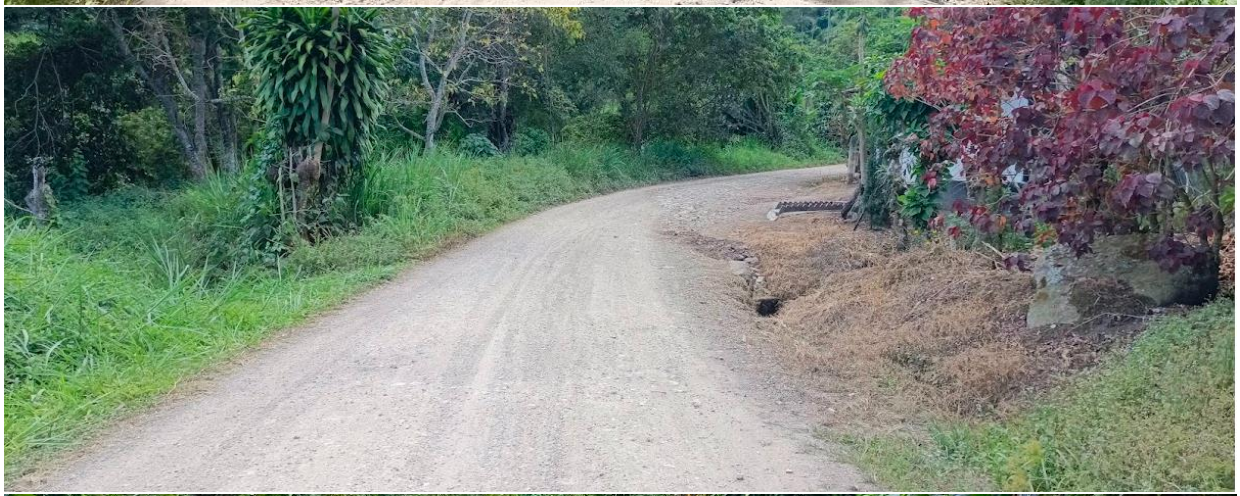









TRAMO 8












30

TRAMO 9













3 Información Contrato de consultoría

3.1 Información general contrato de consultoría

Entidad contratante:	Gobernación de Cundinamarca
Dirección:	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU
Contratista de interventoría:	litoral consulting s.a.s – consultores y constructores s.a.s
NIT:	901.499.379
Representante Legal:	JORGE BELTRAN CATUMBA
No. Contrato:	287 de 2025
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización inicial	20 de enero de 2026
Prórroga 1	Hasta el 19 de marzo de 2026
Fecha finalización final	19 de marzo de 2026
Consultor:	**CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL**
NIT:	901.918.715-7
Representante Legal:	Cristian López
No. Contrato:	257 de 2025
Objeto:	“Estudios y diseños para la vía desde el casco urbano de la inspección Cumaca (municipio de Tibacuy) al sector el pin (municipio de San Antonio del Tequendama) y vía circunvalar en el municipio de agua de dios”.
Fecha inicio:	20 de mayo de 2025
Fecha finalización inicial	20 de enero de 2026
Prórroga 1	Hasta el 19 de marzo de 2026
Fecha finalización final	19 de marzo de 2026
Valor inicial del contrato consultoría:	**$ 3.060.617.700,00**

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo comprendido para el presente informe entre el 20 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 20265 se realizaron las siguientes actividades:

- Procesamiento de información levantada topográficamente
- Elaboración de informes mensuales y semanales
- Visitas de trabajo social
- Remisión Acta de Costos No.2 Cto de Consultoría.
- Remisión Acta de Costos No.3 Cto de Consultoría.

4 Reportes ejecución mensual contrato de consultoría

4.1 Informe semanal

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 32 Del: martes, 23 de diciembre de 2025 Al: lunes, 29 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 194 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,21%	100,00%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 4.535.350,00	$ 2.160.958.373,26
Avance Técnico Programado (%)	0,21%	100,00%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	5,40%	90,66%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 116.691.752,09	$ 1.697.740.834,28
Avance Técnico Ejecutado (%)	5,40%	90,66%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	7136874
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Visitas de trabajo social

*Elaboración de informes mensuales y semanales

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 32 Del: martes, 23 de diciembre de 2025 Al: lunes, 29 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 194 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Elaboración de informes mensuales y semanales

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa con el procesamiento de la información levantada.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 33 Del: martes, 30 de diciembre de 2025 Al: lunes, 5 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 200 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,21%	100,00%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 4.535.350,00	$ 2.160.958.373,26
Avance Técnico Programado (%)	0,21%	100,00%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	1,20%	91,86%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 25.931.500,46	$ 1.723.672.334,75
Avance Técnico Ejecutado (%)	1,20%	91,86%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	7136874
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Visitas de trabajo social

*Elaboración de informes mensuales y semanales

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 33 Del: martes, 30 de diciembre de 2025 Al: lunes, 5 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 200 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Elaboración de informes mensuales y semanales

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa con el procesamiento de la información levantada.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 34 Del: martes, 6 de enero de 2026 Al: lunes, 12 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 206 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,21%	100,00%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 4.535.350,00	$ 2.160.958.373,26
Avance Técnico Programado (%)	0,21%	100,00%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	2,00%	93,86%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 43.219.167,44	$ 1.766.891.502,19
Avance Técnico Ejecutado (%)	2,00%	93,86%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	7136874
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Visitas de trabajo social

*Elaboración de informes mensuales y semanales

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 34 Del: martes, 6 de enero de 2026 Al: lunes, 12 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 206 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Elaboración de informes mensuales y semanales

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa con el procesamiento de la información levantada.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 35 Del: martes, 13 de enero de 2026 Al: lunes, 19 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 206 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA) Y VÍA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Programado (%)	0,21%	100,00%
Valor Avance Financiero Programado:	$ 4.535.350,00	$ 2.160.958.373,26
Avance Técnico Programado (%)	0,21%	100,00%

	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Financiero Ejecutado (%)	1,10%	94,96%
Valor Avance Financiero Ejecutado:	$ 23.770.542,09	$ 1.766.891.502,19
Avance Técnico Ejecutado (%)	1,10%	94,96%

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

Consultor:	CONSORCIO ESTUDIOS MPCCL
Contrato No.	257 de 2025
Valor Inicial:	$ 3.060.617.700
Valor Final:	$ 3.060.617.700
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Fecha Iniciación:	20 DE MAYO DE 2025
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	20 DE ENERO DE 2026
Fecha de Vencimiento Final:	20 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO LITORAL MC
Contrato No.	287 de 2025
Valor Inicial:	
Valor Final:	
Plazo Inicial:	7136874
Fecha Iniciación:	
Prórroga:	
Suspensión:	
Reanudación:	
Fecha de Vencimiento Inicial:	
Fecha de Vencimiento Final:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Visitas de trabajo social

*Elaboración de informes mensuales y semanales

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** **DIRECCIÓN GENERAL** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **INFORME SEMANAL DE CONSULTORIA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FECHA			
ALCANCE:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN CUMACA (MUNICIPIO DE TIBACUY) AL SECTOR EL PIN (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA)	CONTRATO No:	257 de 2025		

Semana Número: 35 Del: martes, 13 de enero de 2026 Al: lunes, 19 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 206 Días

Supervisor de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Gestor Técnico de Contrato: JHON WILLIAM ARDILA BACCA

ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL

INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Elaboración de informes mensuales y semanales

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa con el procesamiento de la información levantada.

OBSERVACIONES

Sin obsevaciones

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Firma

Nombre: **PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA**

MAT: CPITVC 01196-0427 CND

5 Conclusiones y recomendaciones

Durante el periodo correspondiente a este mes se llevaron a cabo actividades técnicas, sociales y administrativas, se hicieron entregas de avances de cada uno de los volúmenes correspondientes y se atendieron a las observaciones hechas por parte de la interventoría.

6 Anexos

6.1 Registro fotográfico del avance de las obras.








PELIGRO NO PASE

