Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 09 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8140726-IBG_CON-1 con referencia: 06 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8140726-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-09
REFERENCIA: 06 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-02-27	9	102	8.171	35,0	425,2	530,3	52,0	148,6	2-Cónica y dividida	
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-02-27	9	102	8.171	35,0	463,1	578,2	56,7	162,0	2-Cónica y dividida	
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-02-27	9	102	8.171	35,0	450,5	561,9	55,1	157,4	2-Cónica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-02-27	7	102	8.171	35,0	465,8	581,2	57,0	162,9	2-Cónica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-02-27	7	102	8.171	35,0	515,7	643,4	63,1	180,3	2-Cónica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-02-27	7	102	8.171	35,0	497,8	621,0	60,9	174,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 09 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8140926-IBG_CON-1 con referencia: 07 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8140926-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-09
REFERENCIA: 07 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	102	8.171	35.0	365.7	456.8	44.8	128.0	2-Cónica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	102	8.171	35.0	370.1	461.9	45.3	129.4	2-Cónica y dividida	
543764	9	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	102	8.171	35.0	390.9	487.4	47.8	136.6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales consituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 09 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8160126-IBG_CON-1 con referencia: 08 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8160126-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-09
REFERENCIA: 08 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-678	2	No Especificado	Concreto	PILOTE (113-32)	2026-02-05	2026-02-06	2026-03-05	28	102	8.171	35.0	434.1	541.5	53.1	151.7	2-Conica y dividida	
RT-678	2	No Especificado	Concreto	PILOTE (113-32)	2026-02-05	2026-02-06	2026-03-05	28	102	8.171	35.0	491.1	612.9	60.1	171.7	2-Cónica y dividida	
RT-678	2	No Especificado	Concreto	PILOTE (113-32)	2026-02-05	2026-02-06	2026-03-05	28	102	8.171	35.0	464.5	579.2	56.8	162.3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales consituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 10 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8196726-IBG_CON-1 con referencia: 09 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8196726-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-10
REFERENCIA: 09 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-02-27	10	102	8.171	35.0	341.0	475.2	41.7	119.1	2-Conica y dividida	
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-02-27	10	102	8.171	35.0	387.7	483.3	47.4	135.4	2-Cónica y dividida	
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-02-27	10	102	8.171	35.0	391.6	488.4	47.9	136.9	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales consituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales consituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 10 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8203126-IBG_CON-1 con referencia: 10 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8203126-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-10
REFERENCIA: 10 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543762	3	No Especificado	Concreto	PILOTE (110)	2026-02-09	2026-02-17	2026-03-09	28	102	8.171	35.0	477.0	595.5	58.4	166.9	2-Cónica y dividida	
543762	3	No Especificado	Concreto	PILOTE (110)	2026-02-09	2026-02-17	2026-03-09	28	102	8.171	35.0	505.8	631.2	61.9	176.9	2-Cónica y dividida	
543762	3	No Especificado	Concreto	PILOTE (110)	2026-02-09	2026-02-17	2026-03-09	28	102	8.171	35.0	465.2	580.2	56.9	162.6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 12 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8279226-IBG_CON-1 con referencia: 11 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8279226-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-12
REFERENCIA: 11 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-09	11	102	8.171	35.0	377.2	471.1	46.2	132.0	2-Cónica y dividida	
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-09	11	102	8.171	35.0	373.3	466.0	45.7	130.6	2-Cónica y dividida	
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-09	11	102	8.171	35.0	369.3	460.9	45.2	129.1	2-Cónica y dividida	
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-09	10	102	8.171	35.0	353.2	440.5	43.2	123.4	2-Cónica y dividida	
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-09	10	102	8.171	35.0	323.7	403.8	39.6	113.1	2-Cónica y dividida	
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-09	10	102	8.171	35.0	450.6	561.9	55.1	157.4	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673 2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 17 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8451626-IBG_CON-1 con referencia: 12 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8451626-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-17
REFERENCIA: 12 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-17	28	102	8.171	35.0	483.6	603.7	59.2	169.1	2-Conica y dividida	
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-17	28	102	8.171	35.0	541.1	675.1	66.2	189.1	2-Conica y dividida	
543764	6	No Especificado	Concreto	PILOTE (108)	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-17	28	102	8.171	35.0	493.7	615.9	60.4	172.6	2-Conica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 17 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8490326-IBG_CON-1 con referencia: 13 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8490326-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-17
REFERENCIA: 13 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543762	4	No Especificado	Concreto	PILOTE 111	2026-02-13	2026-02-17	2026-03-13	28	102	8.171	35.0	412.4	515.9	50.5	144.3	2-Conica y dividida	
543762	4	No Especificado	Concreto	PILOTE 111	2026-02-13	2026-02-17	2026-03-13	28	102	8.171	35.0	420.6	525.2	51.5	147.1	3-Columnar	
543762	4	No Especificado	Concreto	PILOTE 111	2026-02-13	2026-02-17	2026-03-13	28	102	8.171	35.0	425.7	531.3	52.1	148.9	2-Conica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 20 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8601726-IBG_CON-1 con referencia: 14 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8601726-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-20
REFERENCIA: 14 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543762	5	No Especificado	Concreto	PILOTE 100	2026-02-16	2026-02-17	2026-03-16	28	102	8171	35.0	350.3	437.5	42.9	122.6	2-Conica y dividida	
543762	5	No Especificado	Concreto	PILOTE 109	2026-02-16	2026-02-17	2026-03-16	28	102	8171	35.0	347.8	434.4	42.6	121.7	2-Conica y dividida	
543762	5	No Especificado	Concreto	PILOTE 109	2026-02-16	2026-02-17	2026-03-16	28	102	8171	35.0	272.4	339.6	33.3	95.1	2-Conica y dividida	Bajo a los 28 días

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 24 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8661726-IBG_CON-1 con referencia: 15 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8661726-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-24
REFERENCIA: 15 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-18	28	102	8.171	35.0	412.2	513.9	50.4	144.0	2-Conica y dividida	
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-18	28	102	8.171	35.0	482.5	601.6	59.0	168.6	2-Conica y dividida	
543764	7	No Especificado	Concreto	PILOTE (107)	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-18	28	102	8.171	35.0	483.4	603.7	59.2	169.1	2-Conica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 25 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8730226-IBG_CON-1 con referencia: 16 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

Nº DE INFORME: DCP1-8730226-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-25
REFERENCIA: 16 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro Nº	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-20	28	102	8171	35.0	479.9	598.6	58.7	167.7	2-Conica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-20	28	102	8171	35.0	446.3	556.8	54.6	156.0	2-Cónica y dividida	
543764	8	No Especificado	Concreto	PILOTE (96)	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-20	28	102	8171	35.0	492.8	614.9	60.3	172.3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentre incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 25 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8732426-IBG_CON-1 con referencia: 17 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8732426-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-25
REFERENCIA: 17 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543764	9	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-23	28	102	8.171	35.0	381,9	476,2	46,7	133.4	2-Conica y dividida	
543764	9	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-23	28	102	8.171	35.0	371,7	464.0	45,5	130.0	2-Cónica y dividida	
543764	9	No Especificado	Concreto	PILOTE (97)	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-23	28	102	8.171	35.0	373,3	466.0	45,7	130.6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensaya NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensaya NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 26 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8791426-IBG_CON-1 con referencia: 18 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

Nº DE INFORME: DCP1-8791426-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26
REFERENCIA: 18 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro Nº	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543768	13	No Especificado	Concreto	PILOTE (51)	2026-03-11	2026-03-20	2026-03-21	10	102	8.171	35.0	427.8	534.3	52.4	149.7	2-Cónica y dividida	
543768	13	No Especificado	Concreto	PILOTE (51)	2026-03-11	2026-03-20	2026-03-21	10	102	8.171	35.0	394.8	492.5	48.3	138.0	2-Cónica y dividida	
543768	13	No Especificado	Concreto	PILOTE (51)	2026-03-11	2026-03-20	2026-03-21	10	102	8.171	35.0	394.1	491.5	48.2	137.7	2-Cónica y dividida	
543768	14	No Especificado	Concreto	PILOTE (45)	2026-03-13	2026-03-20	2026-03-21	8	102	8.171	35.0	427.2	533.3	52.3	149.4	2-Cónica y dividida	
543768	14	No Especificado	Concreto	PILOTE (45)	2026-03-13	2026-03-20	2026-03-21	8	102	8.171	35.0	402.5	502.7	49.3	140.9	2-Cónica y dividida	
543768	14	No Especificado	Concreto	PILOTE (45)	2026-03-13	2026-03-20	2026-03-21	8	102	8.171	35.0	443.4	553.7	54.3	155.1	2-Cónica y dividida	
543768	15	No Especificado	Concreto	PILOTE (46)	2026-03-14	2026-03-20	2026-03-21	7	102	8.171	35.0	390.1	486.4	47.7	136.3	2-Cónica y dividida	
543768	15	No Especificado	Concreto	PILOTE (46)	2026-03-14	2026-03-20	2026-03-21	7	102	8.171	35.0	359.9	448.7	44.0	125.7	2-Cónica y dividida	
543768	15	No Especificado	Concreto	PILOTE (46)	2026-03-14	2026-03-20	2026-03-21	7	102	8.171	35.0	373.5	466.0	45.7	130.6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 26 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8794826-IBG_CON-1 con referencia: 19 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8794826-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26
REFERENCIA: 19 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543768	16	No Especificado	Concreto	PILOTE (44)	2026-03-16	2026-03-20	2026-03-24	8	102	8.171	35,0	344,3	429,3	42,1	120,3	2-Conica y dividida	
543768	16	No Especificado	Concreto	PILOTE (44)	2026-03-16	2026-03-20	2026-03-24	8	102	8.171	35,0	343,7	429,3	42,1	120,3	2-Cónica y dividida	
543768	16	No Especificado	Concreto	PILOTE (44)	2026-03-16	2026-03-20	2026-03-24	8	102	8.171	35,0	349,2	435,4	42,7	122,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 26 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8796426-IBG_CON-1 con referencia: 20 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8796426-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26
REFERENCIA: 20 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543768	17	No Especificado	Concreto	PILOTE (43)	2026-03-19	2026-03-20	2026-03-26	7	102	8171	35.0	375.4	468.1	45.9	131.1	2-Conica y dividida	
543768	17	No Especificado	Concreto	PILOTE (43)	2026-03-19	2026-03-20	2026-03-26	7	102	8171	35.0	360.4	449.7	44.1	126.0	2-Cónica y dividida	
543768	17	No Especificado	Concreto	PILOTE (43)	2026-03-19	2026-03-20	2026-03-26	7	102	8171	35.0	334.8	418.1	41.0	117.1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 30 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8893026-IBG_CON-1 con referencia: 21 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8893026-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-30
REFERENCIA: 21 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-26	28	102	8.171	35.0	416.8	520.1	51.0	145.7	2-Cónica y dividida	
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-26	28	102	8.171	35.0	415.0	518.0	50.8	145.1	2-Cónica y dividida	
543766	10	No Especificado	Concreto	PILOTE (49)	2026-02-26	2026-03-07	2026-03-26	28	102	8.171	35.0	414.3	517.0	50.7	144.9	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 30 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8908826-IBG_CON-1 con referencia: 22 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8908826-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-30
REFERENCIA: 22 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kg/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-27	28	102	8,171	35.0	363.5	453.8	44.5	127.1	2-Cónica y dividida	
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-27	28	102	8,171	35.0	400.8	499.7	48.0	140.0	2-Cónica y dividida	
543766	11	No Especificado	Concreto	PILOTE (50-52)	2026-02-27	2026-03-07	2026-03-27	28	102	8,171	35.0	391.7	488.4	47.9	136.9	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Ibagué 31 de Marzo de 2026

Estimado (a)
CRISTIAN SANCHEZ

CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBRA: ORDENADOR VIAL BOMBEROS

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8963026-IBG_CON-1 con referencia: 23 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

- Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

John Fernando Naranjo Forero
JEFE DE SUCURSAL IBAGUÉ
concrelab.ibague@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

Nº DE INFORME: DCP1-8963026-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO VIAL ARMENIA
***OBRA:** ORDENADOR VIAL BOMBEROS
***DIRIGIDO A:** CRISTIAN SANCHEZ
***DIRECCIÓN:** SECTOR BOMBEROS ARMENIA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-31
REFERENCIA: 23 - 27795
DIGITÓ: YENY PAOLA VARGAS TORRES
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101.972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14.224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10.1972

Orden de Trabajo	* Cilindro Nº	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Area (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-678	1	No Especificado	Concreto	PILOTE (115-30)	2026-02-04	2026-02-06	2026-03-04	28	102	8.171	35.0	360.7	449.7	44.1	126.0	2-Conica y dividida	
RT-678	1	No Especificado	Concreto	PILOTE (115-30)	2026-02-04	2026-02-06	2026-03-04	28	102	8.171	35.0	361.1	450.7	44.2	126.3	2-Cónica y dividida	
RT-678	1	No Especificado	Concreto	PILOTE (115-30)	2026-02-04	2026-02-06	2026-03-04	28	102	8.171	35.0	354.6	442.6	43.4	124.0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El metodo de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6, no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

ANEXO 8

INFORME DE GESTIÓN SST

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.8
ORDENADOR VIAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 2025-002

PERIODO Nº 8: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026

OBJETO: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL ARMENIA

INTERVENTORÍA:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR:
WILLIAM ANDRES SUAREZ HERRERA

ARMENIA, QUINDÍO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA 9
4.1 Número de trabajadores activos en el periodo -horas hombre trabajadas 11
5. CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL 14
5.1 Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes. 15
5.2 Matriz legal SST. 16
5.3 Inducción y reinducción del personal 18
.4 Política de seguridad y salud en el trabajo 19
6.1 Entrenamientos específicos 22
6.2 Actividades de promoción y prevención 22
6.3 Plan de emergencias 22
7. ENTREGA Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 24
8. INSPECCIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO 26
9. INDICADORES DE GESTION SST 27
9.1 incidentes y accidentes de trabajo 27
9.2 Cumplimiento de cronograma SG-SST 29
10. COMITES Y PARTICIPACION EN SST 30
11. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31
12. SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA 32
13. ASISTENCIA COMITÉS, REUNIONES Y RECORRIDOS 34
14. EVIDENCIAS Y SOPORTES 35
15. ORDEN Y ASEO 36
16. TRABAJO EN ALTURA 38
17. SANEAMIENTO BÁSICO 39
17. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 39
18. ANEXOS 40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Descripción de la versión 5
Tabla 2 información del contrato de obra 8
Tabla 3 personal Consorcio Vial Armenia Administrativo 9
Tabla 4 personal Consorcio Vial Armenia conductores 10
Tabla 5 personal Consorcio vial Armenia/ Bomberos 10
Tabla 6 Personal Pilotes 11
Tabla 6 Horas trabajadas consorcio vial Armenia 12
Tabla 7 consolidado de personal pilotes 14
Tabla 8 consolidado de personal 14
Tabla 9 Afiliaciones personal general 15
Tabla 10 Ausentismo oficina 16
Tabla 11 Ausentismo ordenador 16
Tabla 12 Matriz legal 17
Tabla 14 Inducción colcimes 18
Tabla 15 Charlas ordenador 21
Tabla 16 Entrega de EPP 24
Tabla 17 Inspecciones ordenador 26
Tabla 18 Indicadores 27
Tabla 19 Relación accidentes 28
..... 31
Tabla 20 Exámenes médicos 31
Tabla 21 Señalización de obra ordenador 32
Tabla 22 ATS ordenador 36

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 localización general del proyecto 6
Imagen 2 Localización de intervención ordenador vial 7
Imagen 3 planillas de seguridad 15
Imagen 4 inducción 18
Imagen 5 cartelera informativa 19

Imagen 6 Charlas y visitas ordenador 21
Imagen 7 pausas activas 22
Imagen 8 Equipos de emergencia 23
Imagen 9 Entrega de EPP 25
Imagen 10 inspecciones 26
Imagen 11 evidencia fotográfica de inspecciones 27
Imagen 12 evidencia fotográfica reporte accidente 28
Imagen 12 capacitaciones ARL 30
Imagen 13 cocola y copasst 31
Imagen 14 Señalización y demarcación 34
Imagen 14 Comités 34
Imagen 15 visitas y documentación 35
Imagen 16 ats 36
Imagen 17 orden y aseo 38
Imagen 18 Trabajo en alturas 38
Imagen 19 Saneamiento básico 39

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato de Obra Pública y en atención a los compromisos de ejecución de las actividades dentro del marco del contrato No. **2025-002** cuyo objeto es **"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**, se presenta el siguiente informe mensual de obra N°8 correspondiente al periodo del 01 al 31 marzo del 2026

Este informe describe el proceso de la ejecución de las actividades realizadas en la malla vial **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"** y del ordenador vial **"CONSTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE"**.

La salud ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de las empresas, realizando un seguimiento permanente a las actividades mensuales en factores de seguridad industrial y salud en el trabajo, para reflejar el control de las labores técnicas, y así ejecutar las debidas correcciones para una mejor implementación.

Los peligros, los riesgos, representan una probabilidad de sufrir un accidente o contraer una enfermedad. Por ello, saber reconocer los riesgos es la base de nuestro desarrollo de vida. Los accidentes de trabajo en general varían en función a la frecuencia, a la gravedad y a las consecuencias, pero de cualquier forma dejan consecuencias. Lo mismo se puede decir de las enfermedades laborales, que se presentan cada vez con mayor frecuencia.

Lo expuesto lleva como consecuencia directa a comprender la importancia de la Seguridad y la Higiene en el trabajo. Si esperamos que se produzcan los accidentes para evitar futuros estaremos siempre detrás del problema, no quiere decir que esto no deba hacerse, por supuesto que hay que corregir las condiciones que llevan a producir accidentes con la finalidad que no se repitan, pero es también fundamental que analicemos los riesgos antes que produzcan accidentes.

Tabla 1 Descripción de la versión

COMPONENTE SST		
CONTRATISTA	**INTERVENTORÍA**	**SUPERVISOR**
SST	SST	Supervisor del contrato
Jennifer López Prada	Juan David silva Giraldo	William Andrés Suarez herrera

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26´00´´ de latitud Norte y 75°41´00´´ de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Está localizado en la Cordillera Central, y limita por el Norte con el departamento de Risaralda, Noroeste con Valle del Cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Tolima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Tolima.

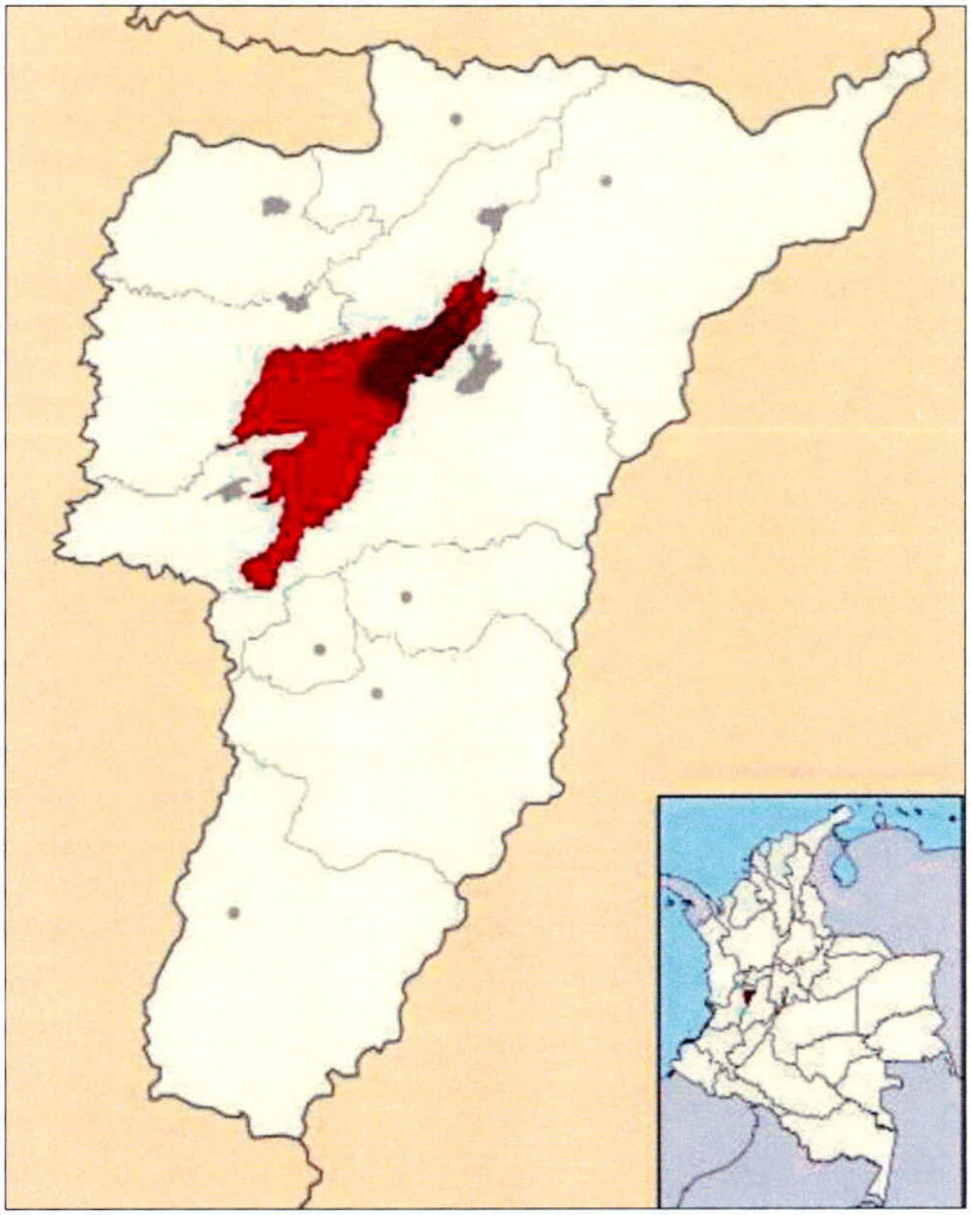


Imagen 1 localización general del proyecto

El proyecto de construcción del ordenador vial se llevará a cabo en el sector de Bomberos, localizado en la zona norte de la ciudad de Armenia. Esta ubicación resulta estratégica, ya que constituye un punto de alta convergencia vehicular y de conexión con corredores viales principales, lo que permitirá optimizar la movilidad, mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor eficiencia en el flujo de transporte en esta área de la ciudad.

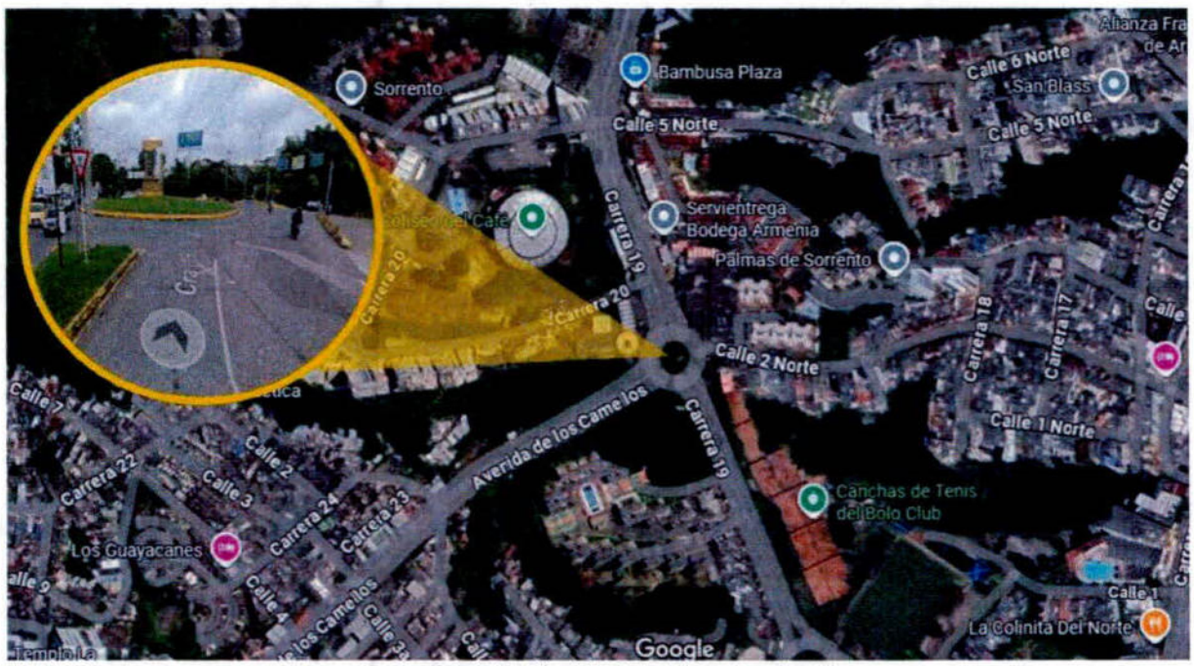


Imagen 2 Localización de intervención ordenador vial

2.2 Características del proyecto.

Se realizará la intervención del ordenador vial en el cual intersecan la carrera 19, la avenida de los camellos y la calle 2 Norte, que comprende actividades como:

- ✓ Estudios y diseños
- ✓ Redes Húmedas y secas
- ✓ Pilotes
- ✓ Excavaciones varias, manuales y mecánicas
- ✓ Muros
- ✓ Vías en pavimento rígido en MR-45
- ✓ Puentes
- ✓ Urbanismo
- ✓ Señalización, seguridad vial y semaforización
- ✓ Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- ✓ Plan de manejo de tránsito
- ✓ Predial
- ✓ Estudios complementarios y ajustes a diseños
- ✓ Prueba de carga
- ✓ Arqueología

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 información del contrato de obra

ENTIDAD:	ALCALDIÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES SUAREZ HERRERA
CONTRATO DE OBRA No:	2025-002
INTERVENTORÍA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ARMENIA
OBJETO:	"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
PLAZO TOTAL:	VEINTICUATRO (24) MESES.
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2027
VALOR TOTAL (INCLUYE AIU):	$ 58.705.426.478
COMPONENTE PRINCIPAL No.1:	"CONTRUCCIÓN ORDENADOR VIAL DE LA AVENIDA 14 DE OCTUBRE CON LA CALLE 2 NORTE"
VALOR COMPONENTE No.1:	$ 40.909.593.286
COMPONENTE PRINCIPAL No.2:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"
VALOR COMPONENTE No.2:	$ $ 17.795.833.192
PLAZO COPONENTE No.2:	DOCE-(12)-MESES

4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA.

De conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Obra No. 2025-002, cuyo objeto es "Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia", se cuenta con el personal mínimo dispuesto para el desarrollo de la gestión administrativa y operativa del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del personal administrativo, profesional y técnico vigente durante el mes correspondiente, garantizando el cumplimiento de las actividades programadas y el adecuado avance de la obra.

Tabla 3 personal Consorcio Vial Armenia Administrativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Moscoso Castiblanco Eddy Bladimir Alfonso	79684672	Representante legal	26/09/2025	
2	López Molina Jair Jesús	16075564	Director de obra	1/07/2025	
3	Suarez Hincapié Víctor Raúl	9738025	Topógrafo general	1/07/2025	
4	Arcos Salazar Karol Tatiana	1004214050	Auxiliar de Ingeniería	1/07/2025	
5	Álvarez Soto Alejandra	1010080382	Aux administrativa	7/07/2025	
6	López Prada Jennifer	1094897575	sst ordenador	3/07/2025	
7	Moncada Velásquez Maryury	1094945078	Servicios Generales	15/07/2025	
8	Madrid Sierra John Alexander	1094952510	contador junior	4/08/2025	
9	Molina Potes Claudia Fernanda	38872143	Profesional social ov	5/08/2025	
10	Sánchez Correa Cristian Alejandro	1094905803	ing. De calidad y programación	21/08/2025	
11	Calseron Ayala Brayan Fernando	1010165915	Director malla vial	28/10/2025	
12	Luis Guillermo Melo Jiménez	1094265993	Ing. Ambiental	03/09/2025	
13	Neira Agudelo María Alejandra	1114400986	Sst malla vial	23-09-2025	
14	Garzón Farith Javier	7555471	Aux social	16/10/2025	
15	Castrillón Gutiérrez Keiver de Jesús	1039702185	aux social	21/10/2025	
16	Quiceno Duran Maria Alejandra	1094887217	aux administrativa	28/10/2025	
17	Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	05-01-2026	
18	Valencia Bautista Laurra Johanna	1094894265	profesional social	19/01/2026	
19	Salgado Chinchilla Alexander	1110556668	Inspector malla vial	13/02/2026	
	ASESORES				
20	Pérez Carreño July	41958921	Vías y transporte	06-08-2025	
21	García Pulgarín Joel	19334597	Arqueólogo	06-08-2025	
22	Morales Guevara Martha Elena	32796352	Geóloga	06-08-2025	
23	Edgar Fernando Franco Mejia	79940008	Estructuras	06-08-2025	

Tabla 4 personal Consorcio Vial Armenia conductores

OTROS CONSORCIO VIAL ARMENIA					
1	Ospina Franco Adolfo León	18413059	Conductor	22/08/2025	
2	Esplnosa Jose Felipe	7562040	Conductor	2/10/2025	
3	Aguirre Jhon Edier	9772413	Conductor	2/10/2025	05-03-2026
4	Espinosa Delgado Freddy Alejandro	9732355	Conductor	28/10/2025	

Tabla 5 personal Consorcio vial Armenia/ Bomberos

FRENTE DE OBRA ORDENADOR VIAL (BOMBEROS)					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Henao Muñoz Juan Camilo	1010050314	Aux Topografía	1/07/2025	
2	Sabogal Arias Jhon Henry	18393885	Inspector de obra	29/08/2025	
3	González Jaiver David	1005254133	Operario	24/09/2025	
4	Mora Arango Jarol Stytwan	1005253759	Ayudante de obra	28/10/2025	
5	Hernández Hernando	1097390666	Ayudante	1/10/2025	
6	Álzate Cardona Lis Carina	1094946765	Reguladora vial	1/10/2025	
7	Murillo Cortecero Felix Alberto	73555948	Paletera	1/10/2025	
8	Hernández Suazo Carlos Alberto	13993136	Oficial de obra	6/10/2025	
9	Rengifo Pérez Jhon Jairo	14896028	Ayudante	9/10/2025	
10	Castillo Blanco Edward Robinson	18399413	Oficial de obra	21/10/2025	
11	Erazo Gallego María Lupe	41921588	Paletera	14/08/2025	
12	Cifuentes Paulo Cesar	9726935	Ayudante de obra	28/10/2025	03-03-2026
13	Valencia Garces Gilberto	10388461	Ayudante	25/09/2025	24-03-2026
14	Parra Mena Franklin	80751244	Oficial de obra	6/11/2025	
15	Hurtado Murillo Isnaldo Santo	82383420	Oficial de obra	6/11/2025	
16	Hurtado Mosquera Jesus Aurelio	11803999	Maestro	6/11/2025	
17	Hurtado Parra Cristian Camilo	1033800167	Oficial de obra	6/11/2025	
18	Asencio Canchila Robert Agusto	92553518	Oficial de obra	12/11/2025	
19	Luis Fernando Restrepo	89000785	Ayudante	13/11/2025	
20	Guzmán Legro Sara	1010039336	Paletera	13/11/2025	
21	Palomeque Garcia Jhon Jairo	1077439845	Oficial de obra	13/11/2025	
22	Avendaño Valencia Adrian Alonso	76029658	Ayudante	19/11/2025	
23	Ortiz Uyasan Luis Emilio	13860726	Oficial de obra	19/11/2025	
24	Buelvas Perez Jose Miguel	1069493482	Oficial de obra	13/11/2025	
25	Pineda Torres Kender Guy	1067971174	Oficial de obra	13/11/2025	
26	Osorio Cortes Carlos Andres	1094960010	Aux sst ordenador	6/12/2025	
27	Guarnizo Avila Francisco Javier	1069175764	Ayudante	6/12/2025	
28	Chilito Delgado Pedro Antonio	9729567	Ayudante de obra	28/10/2025	
29	Marco Tulio Bernal	7545995	Maestro	10/12/2025	
30	Romaña Ibarguen Juan David	1077424300	Oficial	6/01/2026	
31	Hurtado Mosquera Jesus Orlando	11636197	Oficial	6/01/2026	
32	Marín Jiménez Katherine	1094911891	Paletera	13/01/2026	
33	Espinosa Manrique Sebastián	1020718352	Operador	13/01/2026	

34	Sepulveda Eugenio de Jesús	18403069	Oficial	13/01/2026	
35	Ramírez Julián Andrés	10973900196	Ayudante	13/01/2026	03-03-2026
36	Martínez Valencia Jorge David	1045424150	Ayudante	13/01/2026	
37	Pinilla Villa Pedro Alfonso	14801714	Ayudante	13/01/2026	
38	Arango Álzate Albeiro	18395688	Ayudante	19/01/2026	
39	Chacón Julián Andrés	18396453	Auxiliar de Almacen	19/01/2026	
40	Fandiño De los Rios Luis Gabriel	80002307	Oficial	21/01/2026	
41	Valencia Adriana Yineth	1094900332	Paletera	2/02/2026	
42	Sanchez Cortes Laura Camila	1005093395	Paletera	2/02/2026	
43	Moreno Pinto Robert Alexander	4377490	Ayudante	2/02/2026	
44	Gonzalez Guzman Brayder Orlando	1094942885	Ayudante	2/02/2026	
45	Salazar Cardona Cristian Andres	1094915188	Ayudante de obra	9/02/2026	17-03-2026
46	Macias Aya Andres David	1082802655	Ayudante de obra	9/02/2026	
47	Parra Cabrera Jhonny Esneider	1005094437	Ayudante de obra	9/02/2026	
48	Quintero Patiño Jorge Mario	1094887415	Ayudante de obra	9/02/2026	
49	Ladino Bañol Omar Augusto	1094889158	Ayudante de obra	9/02/2026	
50	Gonzalez Sabogal Michael Andres	9729351	Oficial de obra	9/02/2026	
51	Henao Ospina Andres Felipe	1004918454	Ayudante de obra	9/02/2026	
52	Jimenez Quintero Nelson	9725338	Ayudante de obra	9/02/2026	09-03-2026
53	De Jesus Padilla Alexander Miguel	1063076213	Oficial	20/01/2026	
54	Ayala Pernet Danilo Antonio	73087453	Oficial	7/01/2026	
55	Zuñiga Correa William	7518089	Oficial de obra	29/09/2025	
56	Torres Duque Luis Anibal	18491867	Regulador Vial	19/08/2025	

Tabla 6 Personal Pilotes

PERSONAL SUBCONTRATISTA PILOTES (ORDENADOR VIAL)					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Cruz Carvajal Esmeralda	1123534011	sst	9/12/2025	
2	García Castañeda Jurgen Alexander	1.002.955.143	Operario	9/12/2025	07-03-2026
3	Cortes Rueda Vicente	1095807232	Ayudante piloteadora	11/12/2025	
4	Pedraza Julio Jhon Alexander	1143465661	Ing residente	13/01/2026	
5	García Castañeda Diego Armando	1002955144	Operario	22/01/2026	07-03-2026
6	Aragon Castillo Roger Enrique	92534180	operador	9/03/2026	
7	Barrera Ruben Dario	79603814	soldador	9/03/2026	

4.1 Número de trabajadores activos en el periodo -horas hombre trabajadas

Durante el periodo evaluado se llevó un registro del personal activo en las diferentes actividades ejecutadas, así como el total de horas hombre trabajadas, con el fin de evidenciar la participación de la mano de obra y el tiempo efectivo destinado al desarrollo de las labores programadas. Esta información permite medir la productividad, el cumplimiento de la programación y el control del recurso humano asignado al proyecto.

Tabla 6 Horas trabajadas consorcio vial Armenia

PERSONAL CONSROCIO VIAL ARMENIA OFICINA / ORDENADOR					
#	NOMBRE	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	TOTAL HORAS	HORAS EXTRAS
1	Moscoso Castiblanco Eddy Bladimir Alfonso	79684672	Representante legal	8	
2	López Molina Jair Jesús	16075564	Director de obra	8	
3	Suarez Hincapié Víctor Raúl	9738025	Topógrafo general	8	
4	Arcos Salazar Karol Tatiana	1004214050	Auxiliar de Ingeniería	8	
5	Álvarez Soto Alejandra	1010080382	Aux administrativa	8	
6	López Prada Jennifer	1094897575	sst ordenador	8	
7	Moncada Velásquez Maryury	1094945078	Servicios Generales	8	
8	Madrid Sierra John Alexander	1094952510	contador junior		
9	Molina Potes Claudia Fernanda	38872143	Profesional social ov	8	
10	Sánchez Correa Cristian Alejandro	1094905803	ing. De calidad y programación	8	
11	Calseron Ayala Brayan Fernando	1010165915	Director malla vial	8	
12	Luis Guillermo Melo Jiménez	1094265993	Ing. Ambiental	8	
13	Neira Agudelo María Alejandra	1114400986	Sst malla vial	8	
14	Garzón Farith Javier	7555471	Aux social	8	
15	Castrillón Gutiérrez Keiver de Jesús	1039702185	aux social	8	
16	Quiceno Duran María Alejandra	1094887217	aux administrativa	8	
17	Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	8	18
18	Valencia Bautista Laurra Johanna	1094894265	profesional social	8	
19	Salgado Chinchilla Alexander	1110556668	Inspector malla vial	8	
ORDENADOR VIAL					
1	Henao Muñoz Juan Camilo	1010050314	Aux Topografía	8	7
2	Sabogal Arias Jhon Henry	18393885	Inspector de obra	8	35
3	González Jaiver David	1005254133	Operario	8	4
4	Mora Arango Jarol Stytwan	1005253759	Ayudante de obra	8	23
5	Hernández Hernando	1097390666	Ayudante	8	5
6	Álzate Cardona Lis Carina	1094946765	Reguladora vial	8	25
7	Murillo Cortecero Felix Alberto	73555948	Paletera	8	17
8	Hernández Suazo Carlos Alberto	13993136	Oficial de obra	8	5
9	Rengifo Pérez Jhon Jairo	14896028	Ayudante	8	2
10	Castillo Blanco Edward Robinson	18399413	Oficial de obra	8	6
11	Erazo Gallego María Lupe	41921588	Paletera	8	9
12	Cifuentes Paulo Cesar	9726935	Ayudante de obra	8	
13	Valencia Garces Gilberto	10388461	Ayudante	8	17

14	Parra Mena Franklin	80751244	Oficial de obra	8	
15	Hurtado Murillo Isnaldo Santo	82383420	Oficial de obra	8	
16	Hurtado Mosquera Jesus Aurelio	11803999	Maestro	8	
17	Hurtado Parra Cristian Camilo	1033800167	Oficial de obra	8	
18	Asencio Canchila Robert Agusto	92553518	Oficial de obra	8	
19	Luis Fernando Restrepo	89000785	Ayudante	8	9
20	Guzmán Legro Sara	1010039336	Paletera	8	14
21	Palomeque Garcia Jhon Jairo	1077439845	Oficial de obra	8	
22	Avendaño Valencia Adrian Alonso	76029658	Ayudante	8	
23	Ortiz Uyasan Luis Emilio	13860726	Oficial de obra	8	
24	Buelvas Perez Jose Miguel	1069493482	Oficial de obra	8	
25	Pineda Torres Kender Guy	1067971174	Oficial de obra	8	
26	Osorio Cortes Carlos Andres	1094960010	Aux sst ordenador	8	17
27	Guarnizo Avila Francisco Javier	1069175764	Ayudante	8	
28	Chilito Delgado Pedro Antonio	9729567	Ayudante de obra	8	19
29	Marco Tulio Bernal	7545995	Maestro	8	
30	Romaña Ibarguen Juan David	1077424300	Oficial	8	
31	Hurtado Mosquera Jesus Orlando	11636197	Oficial	8	
32	Marin Jimenez Katherine	1094911891	Paletera	8	16
33	Espinosa Manrique Sebastian	1020718352	Operador	8	5
34	Sepulveda Eugenio de jesus	18403069	Oficial	8	4
35	Ramirez Julian Andres	10973900196	Ayudante	8	
36	Martinez Valencia Jorge David	1045424150	Ayudante	8	3
37	Pinilla Villa Pedro Alfonso	14801714	Ayudante	8	
38	Arango Alzate Albeiro	18395688	Ayudante	8	19
39	Chacon Julian Andres	18396453	Auxiliar de Almacen	8	9
40	Fandiño De los Rios Luis Gabriel	80002307	Oficial	8	
41	Valencia Adriana Yineth	1094900332	Paletera	8	11
42	Sanchez Cortes Laura Camila	1005093395	Paletera	8	10
43	Moreno Pinto Robert Alexander	4377490	Ayudante	8	1
44	Gonzalez Guzman Brayder Orlando	1094942885	Ayudante	8	4
45	Salazar Cardona Cristian Andres	1094915188	Ayudante de obra	8	
46	Macias Aya Andres David	1082802655	Ayudante de obra	8	7
47	Parra Cabrera Jhonny Esneider	1005094437	Ayudante de obra	8	7
48	Quintero Patiño Jorge Mario	1094887415	Ayudante de obra	8	7
49	Ladino Bañol Omar Augusto	1094889158	Ayudante de obra	8	7
50	Gonzalez Sabogal Michael Andres	9729351	Oficial de obra	8	7
51	Henao Ospina Andres Felipe	1004918454	Ayudante de obra	8	5
52	Jimenez Quintero Nelson	9725338	Ayudante de obra	8	

53	De Jesus Padilla Alexander Miguel	1063076213	Oficial	8	7
54	Ayala Pernet Danilo Antonio	73087453	Oficial	8	7
55	Zuñiga Correa William	7518089	Oficial de obra	8	2
56	Torres Duque Luis Anibal	18491867	Regulador Vial	8	28
	HORAS TRABAJADAS			448	398
	TOTAL, HORAS TRABAJADAS			17.782	

Tabla 7 consolidado de personal pilotes

PERSONAL SUBCONTRATISTA COLCIMES (PILOTES)					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	TOTAL HORAS	HORAS EXTRAS
1	Cruz Carvajal Esmeralda	1123534011	sst	8	
2	García Castañeda Jurgen Alexander	1.002.955.143	Operario	8	
3	Cortes Rueda Vicente	1095807232	Ayudante piloteadora	8	
4	Pedraza Julio Jhon Alexander	1143465661	Ing residente	8	
5	García Castañeda Diego Armando	1002955144	Operario	8	
6	Aragon Castillo Roger Enrique	92534180	operador	8	
7	Barrera Ruben Dario	79603814	soldador	8	
	HORAS TRABAJADAS			56	
	TOTAL, HORAS TRABAJADAS			9.408	

Tabla 8 consolidado de personal

CONSOLIDADO DE PERSONAL MES DE MARZO 2026 DE HORAS EXTRAS			
#	DESCRIPCION DEL PERSONAL	ORDENADOR	COLCIMES
1	ACTIVOS	52	5
2	RETIRADOS	6	2
3	TOTAL, PERSONAL EN EL MES	58	7
4	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	17.782	9.408

5. CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL

El registro del personal vinculado al proyecto se relaciona a continuación, detallando la respectiva afiliación a la Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar (CCF). Esta información permite verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social integral y la adecuada protección de los trabajadores durante la ejecución del contrato.

A continuación, se anexa en formato de imagen el soporte correspondiente a la relación del personal vinculado tanto por el Consorcio como por el subcontratista COLCIMES, incluyendo la información detallada sobre su afiliación a la Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar (CCF), con el fin de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral.

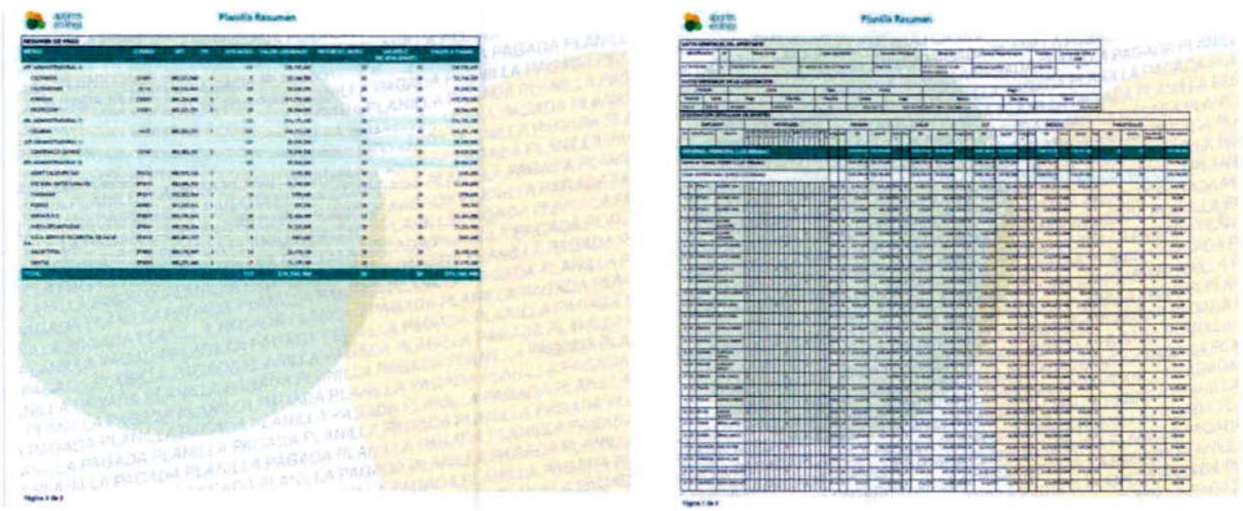


Imagen 3 planillas de seguridad

Tabla 9 Afiliaciones personal general

CONSOLIDADO DE PERSONAL MES DE MARZO 2026			
#	DESCRIPCION DEL PERSONAL	CONSORCIO VIAL ARMENIA	COLCIMES
1	ACTIVOS	128	7
2	RETIRADOS	13	0
3	TOTAL, PERSONAL EN EL MES	137	7

5.1 Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes.

En el presente informe se verifica la información relacionada con las licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes; sin embargo, No obstante, a continuación, se presenta la información detallada por cada frente de trabajo, la cual se anexa en los cuadros siguientes para facilitar su revisión y verificación.

Tabla 10 Ausentismo oficina

Causas de ausentismo mes de marzo 2026 oficina				
#	Motivo		# Ausentismo	# Días
1	EG	Enfermedad General	0	0
2	MA	Maternidad	0	0
3	LP	Paternidad	0	0
4	LC	Licencia por calamidad	0	0
5	AT	Accidentes Laborales	0	0
6	EL	Enfermedad Laboral	0	0
TOTAL			**0**	**0**

Tabla 11 Ausentismo ordenador

Causas de ausentismo ORDENADOR VIAL marzo				
#	Motivo		# Ausentismo	# Días
1	EG	Enfermedad General	2	5
2	MA	Maternidad	0	0
3	LP	Paternidad	0	0
4	LC	Licencia por calamidad	1	3
5	AT	Accidentes Laborales	1	1
6	EL	Enfermedad Laboral	0	0
TOTAL			**4**	**9**

5.2 Matriz legal SST.

Se anexa al presente informe la matriz legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la cual contiene la normatividad vigente aplicable, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y facilitar su seguimiento y control dentro del Sistema de Gestión de SST.

Tabla 12 Matriz legal

MATRIZ LEGAL SST	
NOMBRE LEY, DECRETO O RESOLUCIÓN	**TEMA**
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial
Resolución 2413 de 1979	Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción
Decreto 614 de 1984	Se determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país
Resolución 2013 de 1986	Comité Paritario Salud Ocupacional
Ley 100 de 1993	Sistema General de la Seguridad Social
Resolución 1016 de 1989	Reglamenta los programas de salud ocupacional en las empresas. Determina la obligatoriedad legal y la ejecución permanente de los programas
Decreto 1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Resolución 1075 de 1992	Campaña de control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo
Ley 1010 de 2006	Acoso laboral
Resolución 1401 de 2007	Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1956 de 2008	Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco
Ley 1335 de 2009	Prevención y consumo de tabaco
Decreto 2566 de 2009	Tabla de Enfermedades Profesionales
Resolución 652 de 2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Circular 0038	Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.
Decreto 1443 de 2014	Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Resolución 0312 de 2019	Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Decreto 0728 de 2025	Promoción de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Resolución 1843 de 2025	Por la cual se regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3461 de 2025	Por la cual se derogan las resoluciones 652 y 1356 de 2012 por las cuales se establecen lineamientos para la conformación y

	funcionamiento del comité de convivencia laboral, en entidades publicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

5.3 Inducción y reinducción del personal

Durante el mes de marzo del 2026 se realizaron los registros de inducción y reinducción del personal vinculado al proyecto, mediante los cuales se garantiza que cada trabajador se le dé a conocer:

- Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Políticas
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
- Seguridad Social
- Factores de riesgo
- Plan de Emergencia (Brigadas de emergencia)
- Accidentes/incidentes de trabajo
- Uso de dotación y ropa de trabajo
- Uso de EPP

Tabla 14 Inducción colcimes

N° DE PERSONAL CONTRATADAS EN EL MES/N° DE PERSONAS CON INDUCCIÓN *100 SUBCONTRATISTA COLCIMES				
Periodo	Total, de personas que necesitan inducción	N° de personas que recibieron inducción	Metas de inducción	% de cobertura con inducción
MARZO	2	2	100	100



Imagen 4 inducción

.4 Política de seguridad y salud en el trabajo.

El consorcio vial cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cual se establecen los lineamientos para garantizar ambientes laborales seguros, prevenir accidentes y enfermedades laborales, dar cumplimiento a la normatividad vigente y fomentar la cultura del autocuidado en todos los niveles del proyecto.

La cartelera informativa es un mecanismo de comunicación interna que permite mantener visibles las políticas institucionales, los números de emergencia y otra información de interés para todos los trabajadores. A través de este medio se facilita el acceso oportuno a lineamientos, recomendaciones y avisos importantes, fortaleciendo la cultura organizacional, la prevención de riesgos y el conocimiento permanente de aspectos clave para el desarrollo seguro de las actividades.



Imagen 5 cartelera informativa

6. CAPACITACION, FORMACION Y PREVENCION

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio de las labores en obra, con el fin de reforzar las medidas preventivas y promover la cultura del autocuidado entre los trabajadores.

Relación de Charlas de seguridad realizadas. ORDENADOR				
#	**Fecha**	**# charlas**	**Tema de la charla de seguridad**	**# Asistente**
1	02/03/2026	1	Autocuidado capacitación ARL	46

Relación de Charlas de seguridad realizadas. ORDENADOR				
2	03/03/2026	1	Medidas preventivas de seguridad vial enfocado en el trabajo en vias ARL	48
3	04/03/2026	1	Socialización política de acoso sexual	47
4	05/03/2026	1	Orden y aseo	50
5	06/03/2026	1	Diferencia entre enfermedad general y enfermedad laboral	42
6	07/03/2026	1	Comunicación asertiva	36
7	09/03/2026	1	Compromiso y responsabilidad laboral	47
8	10/03/2026	1	Sentido de pertenencia	47
9	11/03/2026	1	Orden y aseo en obra	43
10	12/03/2026	1	Capacitación con la caja de compensación familiar	47
11	13/03/2026	1	Importancia de las pausas activas	40
12	14/03/2026	1	Actos y condiciones inseguras	39
13	16/03/2026	1	Lección aprendida accidente de trabajo	50
14	17/03/2026	1	Señalización vial	47
15	18/03/2026	1	Identificación de peligros en los frentes de trabajo	48
16	19/03/2026	1	Uso adecuado de los elementos de protección personal	39
17	20/03/2026	1	Sistemas y medios de prevención	48
19	24/03/2026	1	Trabajo en equipo	42
20	25/03/2026	1	Orden y aseo en los puntos de trabajo	42
21	26/03/2026	1	Política de sustancia psicoactivas	40
22	27/03/2026	1	Capacitación con ARL	41
23	28/03/2026	1	Capacitación ARL COCOLA	4
24	28/03/2026	1	Respeto entre compañeros consumo de sustancias psicoactivas	46

Tabla 15 Charlas ordenador



Imagen 6 Charlas y visitas ordenador

6.1 Entrenamientos específicos

Durante el mes de marzo no se realizaron entrenamientos específicos en el área de seguridad y salud en el trabajo

6.2 Actividades de promoción y prevención

Durante el mes de marzo se iniciaron las actividades de pausas activas dirigidas a los trabajadores que desempeñan labores en ordenador y oficina. En este proceso, se les informó sobre la importancia de realizar estas pausas para prevenir molestias musculares, reducir la fatiga visual y mejorar el bienestar general. Asimismo, se brindaron orientaciones claras sobre los horarios recomendados para su ejecución, promoviendo su incorporación como un hábito dentro de la jornada laboral.

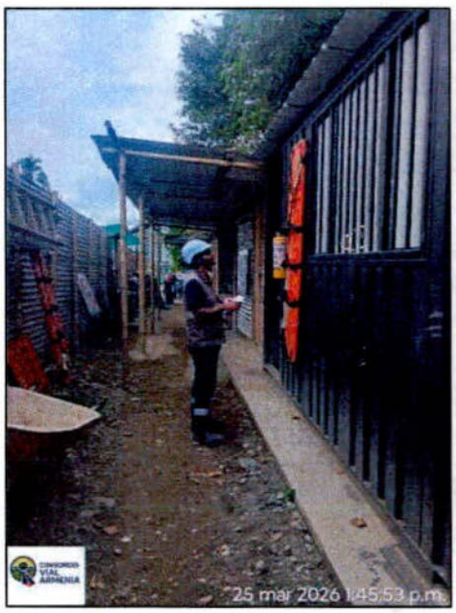



Imagen 7 pausas activas

6.3 Plan de emergencias

A la fecha, el Consorcio Vial Armenia cuenta con un plan de prevención y preparación ante emergencias implementado en el campamento de obra. Durante el mes de marzo se llevó a cabo la actualización del personal que conforma la brigada de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad, fortaleciendo así las condiciones de seguridad y la capacidad de atención en situaciones de riesgo.

Inventario de equipos de emergencia ORDENADOR VIAL y OFINICA			
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción de equipo de emergencia	Total
1	Ordenador vial - Campamento	Extintor ABC 20 libras	2
2	Ordenador vial - Campamento	Camilla rígida plástica	2
3	Ordenador vial - Campamento	Botiquín primeros auxilios	1



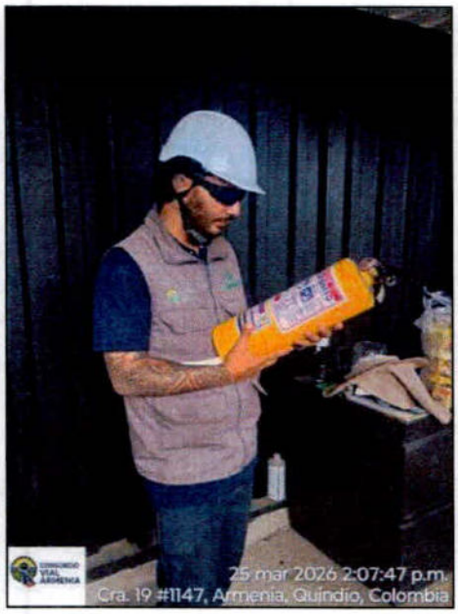





Se realizó convocatoria para la conformación de la brigada de emergencia, mediante la cual fueron designados como representantes Jarol Sttiwan Mora y María Lupe Erazo, quienes estarán encargados de liderar y ejecutar las acciones de atención ante posibles situaciones de emergencia, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la seguridad dentro del entorno laboral.

Imagen 8 Equipos de emergencia

7. ENTREGA Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

En el mes de marzo se llevó a cabo la entrega y reposición de los elementos de protección personal al personal del Consorcio Vial Armenia, garantizando el cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se verificó que el subcontratista de pilotes efectuara la respectiva reposición de dichos elementos a sus trabajadores, asegurando así la protección y el adecuado desarrollo de las actividades en campo.

Tabla 16 Entrega de EPP

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
DESCRIPCIÓN EPP	ENTREGA INICIAL AGOSTO		TOTAL, ACUMULADO
	ENTREGA	REPOSICIÓN	
CASCO	0	0	0
GAFAS	0	15	15
GUANTES-NITRILO-	0	20	20
GUANTES VAQUETA	0	30	30
GUANTES CAUCHO	0	2	2
PROTECTOR AUDITIVO	0	0	0
PROTECTOR AUDITIVO COPA	0	1	1
CARPA – IMPERMEABLE	0	0	0
CHALECO REFLECTIVO	0	5	5
CHALECO INSTITUCIONAL	0	1	1
CAMISA MANGA LARGA	0	0	0
PANTALON	0	0	0
POLAINAS PARA SOLDADRO	0	0	0
PROTETOR RESPIRATORIO NORMAL	0	0	0
BOTAS PUNTERA CUERO	0	0	0
RODILLERAS	0	0	0
BOTAS DE CAUCHO	0	0	0
PAVAS PARA CASCO	0	1	1
TOTAL	**0**	**75**	**75**















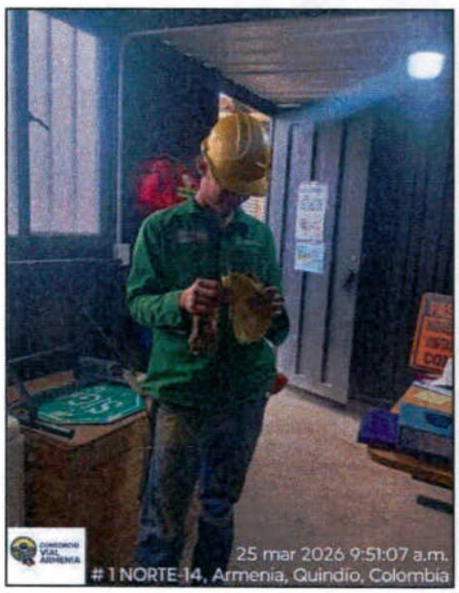






Imagen 9 Entrega de EPP

8. INSPECCIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO

Durante el periodo se llevaron a cabo inspecciones a las condiciones de trabajo, identificando actos y condiciones inseguras que fueron objeto de seguimiento y aplicación de medidas correctivas. Asimismo, se efectuó el control del estado de cierre de las acciones implementadas, garantizando la mitigación de los riesgos detectados. De igual forma, se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría, con el fin de fortalecer las prácticas de seguridad y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

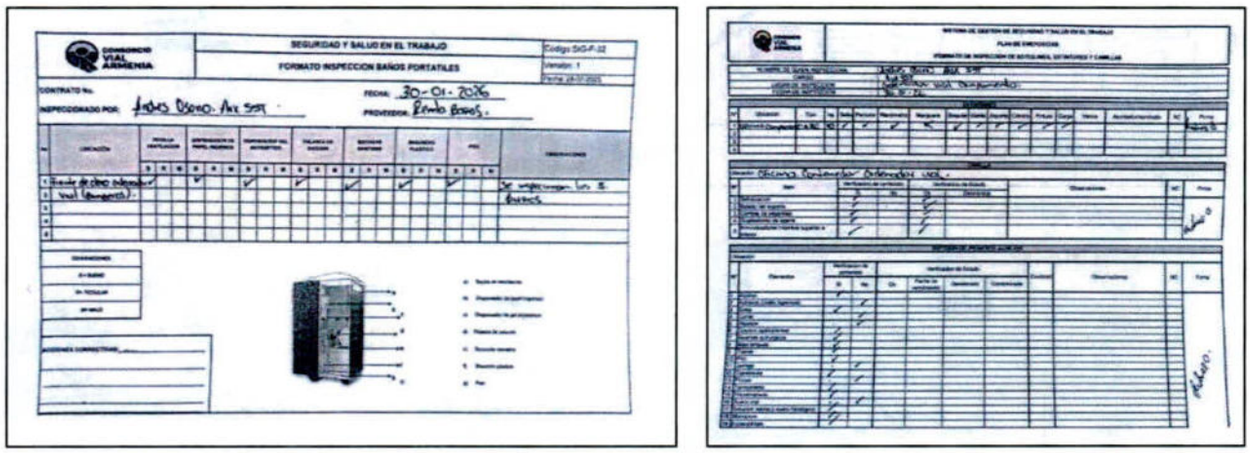


Imagen 10 inspecciones

Tabla 17 Inspecciones ordenador

Relación de Inspecciones realizadas en el mes. ORDENADOR VIAL				
#	**Fecha**	**Descripción de la Inspecciones realizada**	**Consorcio Vial Armenia.**	**Total**
1	25/03/2026	Inspección de Camilla	1	1
2	25/03/2026	Inspección Extintores	1	1
3	25/03/2026	Inspección Botiquín	1	1
4	25/03/2026	Inspección áreas locativas	1	1
5	25/03/2026	Inspección de baños	1	1

Las inspecciones planeadas se realizan de manera mensual con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, identificar posibles riesgos y asegurar el correcto funcionamiento de las actividades, contribuyendo así a la mejora continua y al mantenimiento de condiciones seguras y eficientes.



Imagen 11 evidencia fotográfica de inspecciones

9. INDICADORES DE GESTION SST

Con el fin de dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se monitorean de forma periódica los siguientes indicadores:

9.1 incidentes y accidentes de trabajo

Tabla 18 Indicadores


PROGRAMA	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Accidente de Trabajo.	**IF (INDICDE FRECUENCIA) =** No. De casos reportados en el periodo X K / (HHT) Horas Hombre trabajadas en el mismo periodo. * HHT = No. Trabajadores periodo x No. Horas trabajadas/semana x No. Semanas periodo. * Constante K = 1000	0.05
		IS (INDICE SEVERIDAD) =No. Días perdidos o cargados durante el último periodo K / (HHT) Horas Hombre trabajadas en el mismo periodo.	0.05
		ILI (Índice De Lesión Incapacitante) = Índice Frecuencia x Índice Severidad / 1000 **ILI = 0*0 /1000 = 0**	0.025


		IDP= (Índice Medio De Días Perdidos Por Lesiones) = Total días perdidos o cargados por causa de lesiones durante el período / Total de casos con tiempo perdido. **IDP= 0/0 =0**	0
		TA (TASA) = N° AT / N° Promedio de trabajadores. **TA= 0 /0 = 0**	0

En el mes de marzo se presentó un accidente laboral de carácter leve con el trabajador Hernando Hernández, quien durante el desarrollo de sus funciones se clavó una puntilla en el pie. De manera oportuna, el trabajador fue remitido para valoración y atención médica, donde recibió el tratamiento correspondiente. Como resultado de la evaluación, se le otorgó un día de incapacidad para su recuperación, tras lo cual pudo reintegrarse a sus labores habituales.

Tabla 19 Relación accidentes

Mes marzo	Personal Directo del Consorcio vial Armenia			Personal Subcontratistas			Accidentalidad en General		
	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.
Accidentes	1	0	1	0	0	0	0		0

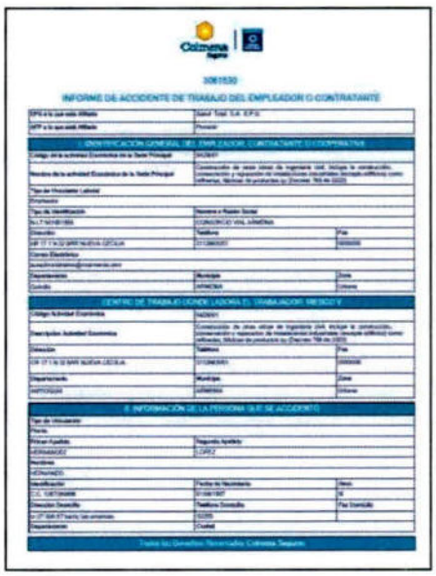

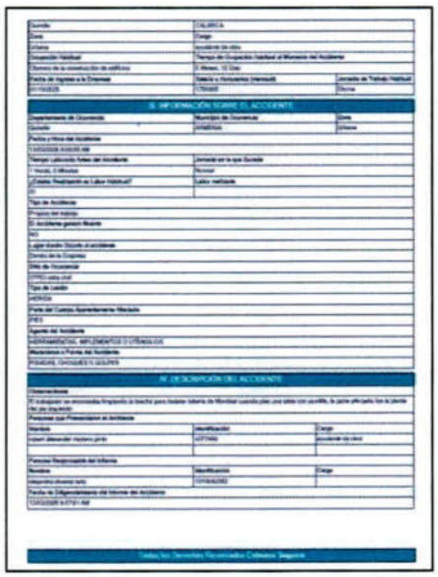



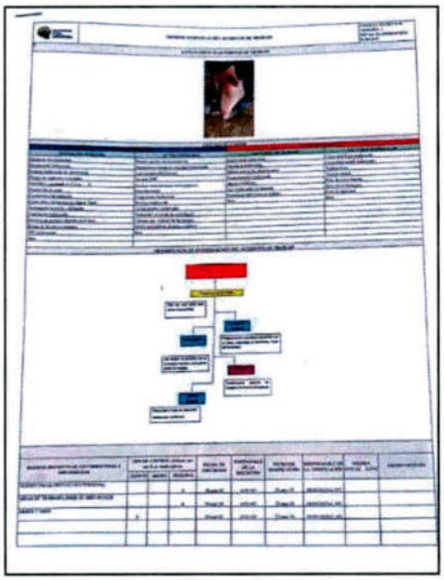


Imagen 12 evidencia fotográfica reporte accidente

9.2 Cumplimiento de cronograma SG-SST

En el mes de marzo se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones en un 60%, evidenciando el compromiso con el fortalecimiento de la cultura preventiva y la mejora continua en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por medio de la ARL se destinaron las horas necesarias para el acompañamiento del personal en el desarrollo de las capacitaciones programadas, garantizando así el cumplimiento del cronograma del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Este apoyo permitió fortalecer los conocimientos de los colaboradores, promover prácticas seguras y asegurar la ejecución oportuna de las actividades planificadas en materia de prevención de riesgos laborales.

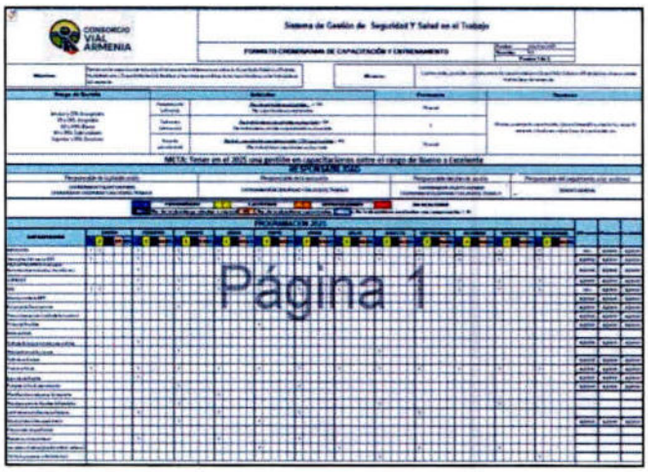

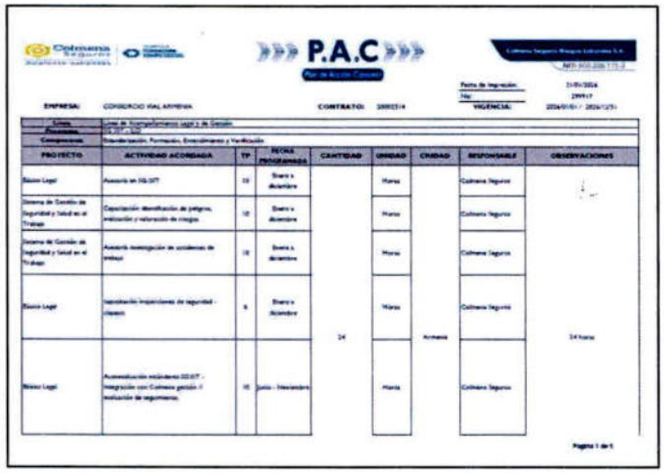

En el mes de marzo se llevaron a cabo tres capacitaciones en compañía de la ARL Colmena, dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido para el año 2026. El día 02 de marzo se realizó una capacitación en autocuidado, el 03 de marzo se abordaron las medidas preventivas en seguridad vial, y el 26 de marzo se desarrolló la capacitación sobre el Comité de Convivencia Laboral. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer la cultura de prevención y el bienestar de los trabajadores dentro de la organización.



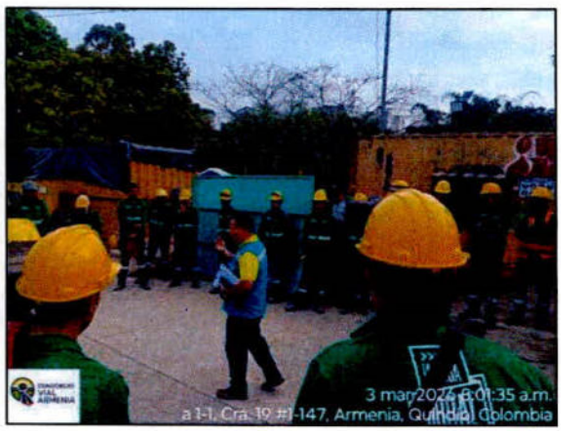




Imagen 12 capacitaciones ARL

10. COMITES Y PARTICIPACION EN SST

COMITÉ	CARGO	NOMBRE
COCOLA	Titulares	Félix Alberto Murillo cortecero
	Titulares	Sara Guzmán legro
	Suplente	Jarol Stywan Mora
	Suplente	Albeiro Arango Alzate
COPASST	Titular	Hernando Hernández
	Titular	Michael Andrés Gonzáles
	Suplente	Cristian Andrés Salazar
	Suplente	Pedro Antonio Chilito

El día 26 de marzo se realizó una capacitación dirigida al Comité de Convivencia Laboral, en la cual la capacitadora de la ARL brindó orientación sobre los diferentes tipos de acoso laboral, así como los procedimientos adecuados para su manejo. Durante la jornada se explicó cómo debe llevarse a cabo el acompañamiento a los trabajadores, la ruta de atención a seguir en estos casos y otros lineamientos clave para garantizar un adecuado abordaje de las situaciones, promoviendo un ambiente laboral respetuoso y libre de acoso.



Imagen 13 cocola y copasst

11. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Durante el mes de marzo, se realizaron exámenes médicos ocupacionales a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a laborar en el consorcio, con el propósito de evaluar su estado de salud y verificar su aptitud física y mental para el desempeño de las funciones asignadas. Estos exámenes fueron efectuados por profesionales médicos competentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de salud ocupacional vigente.

Exámenes médicos ocupacionales mes de marzo	Cant
Numero de Exámenes de ingreso Consorcio Vial Armenia	0
Numero de exámenes periódicos Consorcio Vial Armenia	0
Numero de exámenes de egreso (carta) Consorcio Vial Armenia	5
Numero de Exámenes de ingreso Subcontratista Colcimes	2

Tabla 20 Exámenes médicos

12. SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA

Durante el mes de marzo, se realizaron diversas correcciones y adecuaciones en la señalización y demarcación de las zonas de trabajo, con el objetivo de mejorar la seguridad y organización en las áreas operativas. Estas acciones fueron lideradas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual procura constantemente mantener estas condiciones en óptimo estado y en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Cabe resaltar que las observaciones realizadas por la interventoría en relación con estos aspectos han sido atendidas y corregidas oportunamente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos en el proyecto.

Tabla 21 Señalización de obra ordenador

SEÑALIZACIÓN PMT ORDENADOR		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Señalizadores móviles	9	Se realiza instalación de señales verticales y delimitadores verticales correspondientes al plan de manejo de tránsito entregado y aprobado para el tramo de intervención de del ordenador
Delineadores	225	
Señales verticales	15	
Cinta de señalización	250 rollos	
Regulador vial	2	
SEÑALIZACIÓN ADICIONAL		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Barricadas plásticas	150	Presentes en Obra adicional al PMT - tramo ordenador
Paleteros	6	
Lona	25rollos	Información vias alternas
Pasa calle	6	






24/3/2026 4:51 p. m.
Armenia
Altitud:1519.9msnm
Velocidad:0.4km/h
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 48


20/3/2026 9:08 a. m.
Armenia
Altitud:1525.4msnm
Velocidad:0.0km/h
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 26


17/3/2026 2:44 p. m.
237° SW
Armenia
Altitud:1528.8msnm
Velocidad:2.6km/h
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 14


17/3/2026 12:03 p. m.
22° N
Armenia
Altitud:1517.5msnm
Velocidad:2.2km/h
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 13


17 mar 2026 1:54:54 a.m.
tenario Carrera 6 #1-45 Local 4, Armenia, Quindío, Colombia


17 mar 2026 12:15:28 a.m.
teq Unidad 3, Cl. 19 Nte. #15-49, Armenia, Quindío, Colombia



Imagen 14 Señalización y demarcación

13. ASISTENCIA COMITÉS, REUNIONES Y RECORRIDOS

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo dos reuniones del Comité SISOMAS, en las cuales se trataron temas relevantes del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre los puntos abordados se destacan la revisión y mejoras en la señalización de las áreas de trabajo, la verificación de los documentos requeridos para el ingreso del personal y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), cumplimiento del PMT, dotación entre otros.
En cada comité se establecieron compromisos específicos para los responsables de cada área, los cuales han sido gestionados y se encuentran en proceso de cumplimiento o ya han sido ejecutados, con el fin de garantizar condiciones seguras y conforme a la normativa vigente.



Imagen 14 Comités

14. EVIDENCIAS Y SOPORTES

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Estas incluyeron charlas de sensibilización, entrega de elementos de protección personal (EPP) y el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
Dichas actividades fueron realizadas tanto por el contratista, a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como por el subcontratista COLCIMES, en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de SST.
Los registros y evidencias de estas actividades se encuentran anexos al presente informe para su revisión y verificación.











Imagen 15 visitas y documentación

Tabla 22 ATS ordenador

Análisis de Trabajo Seguro – ATS. ORDENADOR			
#	**Ubicación/Tramo/PR**	**Descripción Análisis de Trabajo Seguro - ATS**	**Consorcio Vial Armenia**
1	Ordenador vial	Regulación vial y peatonal en vía.	4
2	Ordenador vial	Armado de acero transporte de castillos	4
3	Ordenador vial	Excavación para instalación de tubería eléctrica	4
4	Ordenador vial	operador bobcat	
Total			**12**

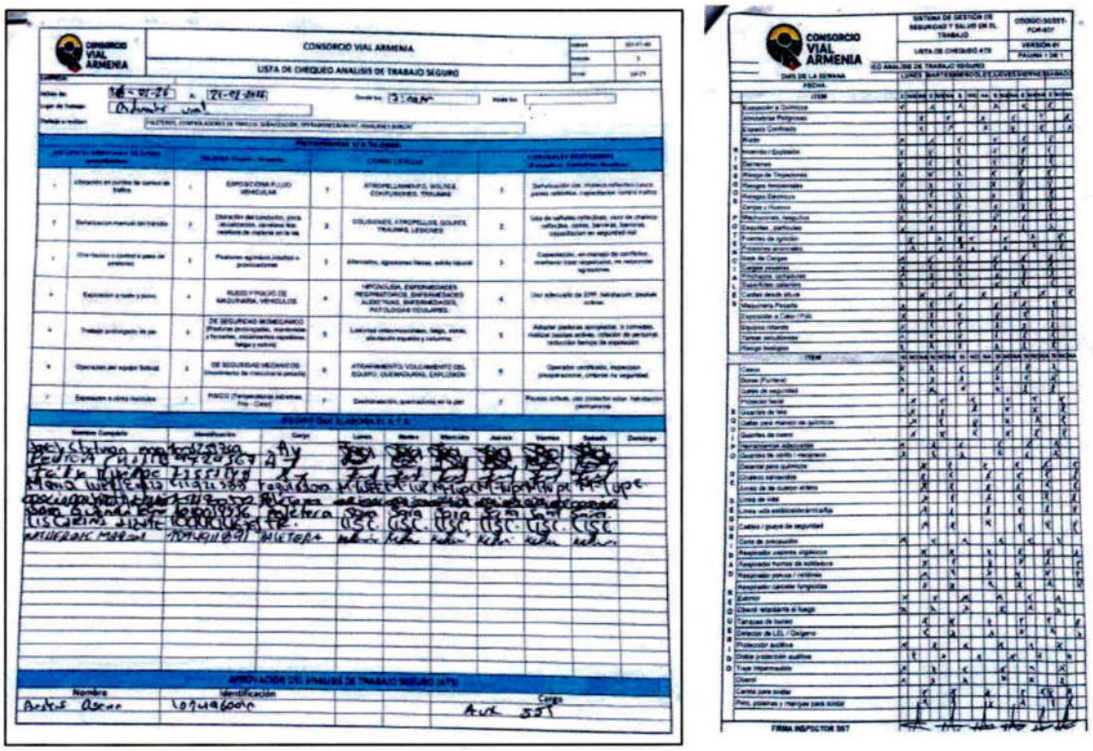


Imagen 16 ats

15. ORDEN Y ASEO

Durante el transcurso del mes de marzo, se han llevado a cabo acciones orientadas a mantener el orden y la limpieza tanto en el campamento como en los distintos frentes de trabajo. Estas labores se han realizado con la participación activa del personal, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de los espacios comunes y áreas operativas.

Se ha hecho énfasis en la importancia del aseo y el orden como parte fundamental de un ambiente laboral seguro y eficiente, logrando mejoras visibles en la organización de materiales, limpieza de zonas comunes y disposición adecuada de residuos.


23 mar 2026 9:30:29 a.m.
Cra. 19 #2n42, Armenia, Quindío, Colombia


23 mar 2026 9:49:23 a.m.
Cl. 2 Nte. #18-209, Armenia, Quindío, Colombia


18 mar 2026 6:24:54 p.m.
Cl. 2 Nte. #18-209, Armenia, Quindío, Colombia


3 mar 2026 9:50:59 a.m.
Cl. 2 Nte. #18-209, Armenia, Quindío, Colombia


24/3/2026 4:56 p. m.
Armenia
Altitud:1521.2msnm
Velocidad:2.7km/h
Ordenador vial bomberos
Número de índice: 49


OBRA!



Imagen 17 orden y aseo

16. TRABAJO EN ALTURA

Durante el mes de marzo se realizaron trabajos en altura, cumpliendo con los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal auxiliar SST verificó previamente el estado de los elementos de protección individual (EPI), asegurando que se encontraran en óptimas condiciones para su uso. Asimismo, se diligenció el permiso de trabajo en alturas correspondiente antes del inicio de las labores, garantizando el cumplimiento de las medidas de prevención y control del riesgo.

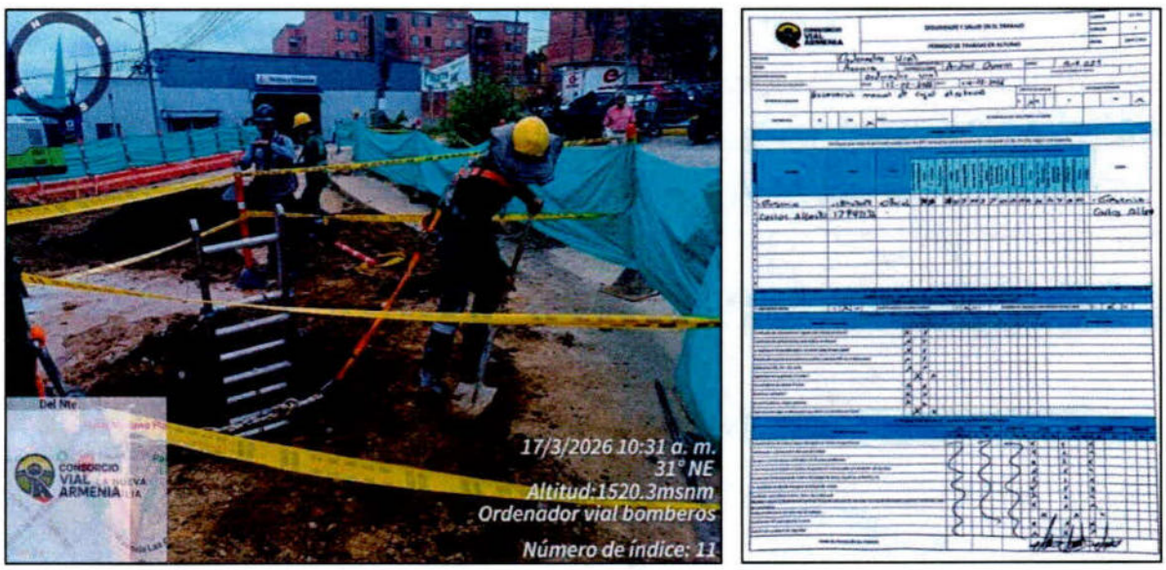


Imagen 18 Trabajo en alturas

17. SANEAMIENTO BÁSICO

En el campamento de obra se cuenta con condiciones adecuadas de saneamiento básico para el bienestar de los trabajadores. Se dispone de agua potable para el consumo y las labores diarias, así como de áreas organizadas y señalizadas que incluyen parqueadero, zona de almacenamiento de materiales, oficina administrativa, vestier para los trabajadores y zona de comedor. Estos espacios se mantienen en condiciones de orden y limpieza, garantizando un ambiente seguro y saludable dentro del proyecto.

De manera diaria se realiza la entrega de hidratación al personal, con el fin de promover su bienestar y prevenir afectaciones en la salud derivadas de las condiciones laborales. Esta actividad contribuye a mantener adecuados niveles de hidratación durante la jornada de trabajo, favoreciendo el rendimiento y la seguridad de los trabajadores.



Imagen 19 Saneamiento básico

17. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo han permitido mantener un control adecuado de los riesgos presentes en la obra, evidenciando una gestión preventiva organizada y efectiva.

- Se observa una mejora progresiva en el comportamiento seguro de los trabajadores, reflejada en el cumplimiento de las normas y el uso adecuado de los elementos de protección personal.

- La supervisión permanente en los frentes de trabajo ha fortalecido la identificación temprana de actos y condiciones inseguras, contribuyendo a minimizar la probabilidad de accidentes laborales.

18. ANEXOS:

1. Listado del personal activo administrativo y ordenador vial
2. Soporte de charlas
3. Inspecciones
4. Control de señalización en obra
5. Soportes ATS, preoperacionales
6. Planilla de seguridad social febrero
7. Informe PMT, ordenador
8. Informe subcontratista COLCIMES
9. Soportes de incapacidades del mes de marzo
10. Soportes de paz y salvos personal retirado.
11. Soporte de accidente de trabajo

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: SST-FI-48

Estándar E1.1.4 - E1.1.5

FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS

Fecha:	Julio 28 de 2025
Versión:	
Pagina	1 de 1

NOMBRE	CEDULA		FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ARLCOLMEN	EPS	FP	CCF	OBSERVACIONES
Henao Muñoz Juan Camilo	1010050314	Aux Topografia	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Sabogal Arias Jhon Henry	18393885	Inspector de obra	29/08/2025		Clase (V)	EPS Sanitas	Colpensiones	Comfenalco	
Gonzalez Jalver David	1005254133	Operario	24/09/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Hernandez Hernando	1097390666	Ayudante	1/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Alzate Cardona Lis Carina	1094946765	Reguladora vial	1/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Murillo Cortecero Felix Alberto	73555948	Ayudante	1/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Hernadez Suazo Carlos Alberto	13993136	Oficial de obra	6/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Renjifo Perez Jhon Jairo	14896028	Ayudante	9/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Castillo Blanco Edward Robinson	18399413	Oficial de obra	21/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Erazo Gallego Maria Lupe	41921588	Paletera	14/08/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Daza Muñoz Alvaro	18397902	Almacenista	2/10/2025		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Chilito Delgado Pedro Antonio	9729567	Ayudante de obra	28/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Proteccion	Comfenalco	
Mora Arango Jarol Stytwan	1005253759	Ayudante de obra	28/10/2025		Clase (V)	Asmet Salud	Porvenir	Comfenalco	
Hurtado Murillo Isnaldo Santo	82383420	Oficial de obra	6/11/2025		Clase (V)	famisanar	Colpensiones	Comfenalco	
Hurtado Mosquera Jesus Aurelio	11803999	Maestro	6/11/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colfondos	Comfenalco	
Hurtado Parra Cristian Camilo	1033800167	Oficial de obra	6/11/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Porvenir	Comfenalco	
Asencio Canchila Robert Agusto	92553518	Oficial de obra	12/11/2025		Clase (V)	famisanar	Porvenir	Comfenalco	
Luis Fernando Restrepo	89000785	Ayudante	13/11/2025		Clase (V)	Salud total	Porvenir	comfenalco	
Guzman Legro Sara	1010039336	Paletera	13/11/2025		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
Avendaño Valencia Adrian Alonso	76029658	Ayudante	19/11/2025		Clase (V)	SOS	Proteccion	Comfenalco	
Ortiz Uyasan Luis Emilio	13860726	Oficial de obra	19/11/2025		Clase (V)	famisanar		Comfenalco	
Buelvas Perez Jose Miguel	1069493482	Oficial de obra	13/11/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Pineda Torres Kender Guy	1067971174	Oficial de obra	13/11/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Osorio Cortes Carlos Andres	1094960010	Aux sst ordenador	6/12/2025		Clase (V)	Salud total	Porvenir	Comfenalco	
Guarnizo Avila Francisco Javier	1069175764	Ayudante	6/12/2025		Clase (V)	Sanitas	Proteccion	Comfenalco	
Marco Tulio Bernal	7545995	Maestro	10/12/2025		Clase (V)	Sura	Porvenir	Comfenalco	
					ene-26				
Romaña Ibarguen Juan David	1077424300	Oficial	6/01/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Hurtado Mosquera Jesus Orlando	11636197	Oficial	6/01/2026		Clase (V)	Famisanar	Colfondos	Comfenalco	
Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	5/01/2026		Clase (V)	Salud total	Colfondos	Comfenalco	
Marin Jimenez Katherine	1094911891	Paletera	13/01/2026		Clase (V)	Salud total	Porvenir	Comfenalco	
Espinosa Manrique Sebastian	1020718352	Operador	13/01/2026		Clase (V)	Famisanar	Porvenir	Comfenalco	
Sepulveda Eugenio de jesus	18403069	Oficial	13/01/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Martinez Valencia Jorge David	1045424150	Ayudante	13/01/2026		Clase (V)	sos	Porvenir	Comfenalco	
Pinilla Villa Pedro Alfonso	14801714	Ayudante	13/01/2026		Clase (V)	Nueva eps	Colpensiones	Comfenalco	
Arango Alzate Albeiro	18395688	Ayudante	19/01/2026		Clase (V)	Salud total	Proteccion	Comfenalco	
Chacon Julian Andres	18396453	Auxiliar de Almacen	19/01/2026		Clase (V)	Nueva eps	Proteccion	Comfenalco	
Fandiño De los Rios Luis Gabriel	80002307	Oficial	21/01/2026		Clase (V)	Salud total	Colpensiones	Comfenalco	
					feb-26				
Valencia Adriana Yineth	1094900332	Paletera	2/02/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Sanchez Cortes Laura Camila	1005093395	Paletera	2/02/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Moreno Pinto Robert Alexander	4377490	Ayudante	2/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Gonzalez Guzman Brayder Orlando	1094942885	Ayudante	2/02/2026		Clase (V)	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco	
Macias Aya Andres David	1082802655	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sanitas	Proteccion	Comfenalco	
Parra Cabrera Jhonny Esneider	1005094437	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Porvenir	Comfenalco	
Quintero Patiño Jorge Mario	1094887415	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
Ladino Bañol Omar Augusto	1094889158	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Salud total	Porvenir	Comfenalco	
Gonzalez Sabogal Michael Andres	9729351	Oficial de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
Henao Ospina Andres Felipe	1004918454	Ayudante de obra	9/02/2026		Clase (V)	Sura	Proteccion	Comfenalco	
De Jesus Padilla Alexander Miguel	1063076213	Oficial	20/01/2026		Clase (V)	Famisanar	Porvenir		
Ayala Pernet Danilo Antonio	73087453	Oficial	7/01/2026		Clase (V)	Famisanar			ya es pensionado presenta soporte
Torres Duque Luis Anibal	18491867	Regulador Vial	19/08/2025		Clase (V)	EPS Sura	Colpensiones	Comfenalco	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								
	FORMATO N°:				SST-FI-48				
	Estándar E1.1.4 - E1.1.5								
	FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS							Fecha:	Julio 28 de 2025
								Versión:	
								Pagina	1 de 1

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ARLCOLME	EPS	FP	CCF	OBSERVACIONES
Lopez Molina Jair Jesus	16075564	Director de obra	1/07/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Suarez Hincapie Victor Raul	9738025	Topografo general	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Proteccion	Comfenalco	
Alvarez Soto Alejandra	1010080382	Aux administrativa	7/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Arcos Salazar Karol Tatiana	1004214050	Auxiliar de Ingenieria	1/07/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Lopez Prada Jennifer	109489757	sst ordendor	3/07/2025		Clase (V)	EPS Sanitas	Colpensiones	Comfenalco	
Moncada Velasquez Maryury	1094945078	Servicios Generales	15/07/2025		Clase (I)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	No aplica para entrega de EPP
Madrid Sierra John Alexander	1094952510	contador junior	4/08/2025		Clase (I)	EPS Sanitas	Proteccion	Comfenalco	No aplica para entrega de EPP
Molina Potes Claudia Fernanda	38872143	Profesional social ov	5/08/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Proteccion	Comfenalco	
Sanchez Correa Cristian Alejandro	1094905803	g. De calidad y programacio	21/08/2025		Clase (V)	EPS Sura	Colpensiones	Comfenalco	
Calseron Ayala Brayan Fernando	1010165915	Director malla vial	28/10/2025		Clase (V)	Sura	porvenir		
Luis Guillermo Melo Jiménez	1094265993	Ing. Ambiental	3/09/2025		Clase (V)			compensar	Pensionado fuerzas militares salud fuerzas militares
Cuero Carabali Dirseu	9731257	Topografo	4/09/2025		Clase (V)	Occidental de Salud	Proteccion	Comfenalco	
Neira Agudelo Maria Alejandra	1114400986	SST malla vial	23/09/2025		Clase (V)	Nueva EPS	porvenir	Comfenalco	
Moscoso Castiblanco Eddy Bladimir Alfonso	79684672	Representante legal-	26/09/2025						
Garzon Farith Javier	7555471	Aux social	16/10/2025		Clase (V)	Salud Total EPS	Colpensiones	Comfenalco	
Castrillon Gutierrez Keiver de Jesus	1039702185	aux social	21/10/2025		Clase (V)	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco	
Quiceno Duran Maria Alejandra	1094887217	aux administrativa	28/10/2025		Clase (V)	SOS	Proteccion	Comfenalco	
Valencia Bautista Laura Johanna	1094894265	profesional social	19/01/2026		Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	
Gallego Rubio Ivan Alexander	89000902	Ing residente	5/01/2026		Clase (V)	Salud total	Colfondos	Comfenalco	
Salgado Chinchilla Alexander	1110556668	Inspector malla vial	13/02/2026	0	Clase (V)	Sanitas	Porvenir	Comfenalco	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	16	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Lección aprendida
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	[illegible]	80.75[illegible]	[illegible]	3203974[illegible]	
2	[illegible]	7308[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Alcivo Arango	1839568	AY		
4	Alexander de Jesus	1063076213	OP		
5	William Uniq.	7.518.089	Oficial	3225540 65	
6	Orlando Hurtado	11636197	Oficial	3215483[illegible]	
7	Pedro Abel Nieto	4729.367	AY		
8	Javier Avila	1069775764	AY	3102835604	
9	Jhon J. Renjifo	1489602[illegible]	AyL	310728054[illegible]	
10	Sebastian Espinosa	1007[illegible]35C	OP	3022[illegible]3C4	
11	Douglas Rios Valencia	1010001664	Aux Topografico	3145271451	
13	Jorge Styluan Mora A.	1005[illegible]759.	AY	—	
15	Andres Felipe Arango	1004[illegible]454	ay	—	
16	Jorge mario Quintero V	1094[illegible]405	Ayudante	3[illegible]7[illegible]574	
17	Rafael Giraldez	1094[illegible]7[illegible]5	Ayudante	3[illegible]514[illegible]	
18	Jhonny Parra	1005[illegible]1[illegible]37	AY	3008[illegible]221	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3225[illegible]1[illegible]	
20	Michael A. Gonzalez	9774351	OF	—	
21	Jorge David Martinez	1045424150	OP		
22	Juan Arango	18346453	Almacen	—	
23	Eugenio [illegible]	18403060	OP	—	
24	Hernando Hernandez	1097390666	AY	3225546011	
25	Pedro Alfonso	1[illegible]801[illegible]	AYU		
26	Felix Henriquez	738539[illegible]	OP	—	
27	Robert Mejia	4[illegible]74[illegible]	AY		
28	Robert Asprilla	9[illegible]518	Oficial	3144[illegible]5419	
29	Luis M.Z	1380[illegible]	Oficial	3115[illegible]582	
30	Ismaldo Hurtado	8238[illegible]20	Of. Hierro	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	16	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Leccion aprendida
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	—	Juan David Romaña
2	Eduar D Castillo	18.394.443	oficial	—	
3	Luis Fernando R	1.000.765	AY		
4	Carlos Alberto Suazo	13993126.	—	3147141011	Carlos Alberto
5	JHON JAIRO	1.144.198.145	OF	—	
6	David Romaña	1077424300	OF	—	David
7	Adrian Duque	7602650	AY	—	Adrian
8	Luis Gabriel	80002307	oficial	— — — —	Gabriel
9	Kenda Acuña	1057977774	Oficial	3045637068	Kenda
10	Andres David M.	1082862655	AX	— — —	Andres M.
11	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
13	Juan Camilo Henao M.	1010050314	Aux Topo	—	
15	Marcos Bernal	7515995	maestro	—	
16	Henry Sabogal A	18.393.885	Inspector		
17	Mario Lupe Evan	11921339	contratista	—	Mario Lupe Evan
18	KATHERINE MORAN JIMENEZ	1094911891	PALETERA	—	Katherine Moran
19	Sara Guzman Tejeo	1010039356	Paletera	3135712433	Sara Guzman
20	LUIS GUSTAVO ORTIZ.	1004946765	AP.	— —	LUIS C.
21	Laura Camila Sanchez Cortes	1005093395	Paletera		Laura Camila S.
22	[illegible]	[illegible]	Paletera		[illegible]
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio	Ordenador Vial.	17	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Señalización Vial
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	LUIS FERNANDO R	1094[illegible]795	AY		
2	Alberto arango	18385688	AY		
3	Marcos Benny	7515998	mensajero	—	
4	Edwin [illegible]	18,349,413	oficial	—	
5	[illegible]	4377490	AY		
6	Robert Acevedo	92553518	OF. Horno	3144185149	
7	Ronaldo Hurtado	82383420	OF. HERRERO	3143202879	[illegible]
8	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	
9	William Zuñiga P.	7.518.089.	oficial	3205594066.	
10	Jhon J - Rengifo	1484602	Ay		
11	FRANKLIN [illegible]	80751211	colocador	3203 [illegible]	
13	Jorge Mario Quintero P.	1094884485	auxiliar	3187677390	
15	Andres Felipe Henao	1004918454	ay	—	
16	[illegible]	1094889158	AY	3145 [illegible]	
17	[illegible]	73067457	oficial	321 [illegible]	
18	[illegible]	7094947095	AY		
19	Alexander Lopez	7067076213	OF	3232403897	
20	SHONJAIRO	1014279845	OP		
21	Andres David M.	1088[illegible]555	AYU	3237811591	Andres
22	Felix Murillo C	73555948	AY	—	
23	Juan Chacon	1039164573	Auxiliar Almacen	—	
24	Pedro Alfonso	7478071414	Ayu		
25	Cristian Morado	1033800167	Oficial	3134243165	
26	Juan Camilo Henao V.	1010080314	Aux Topografo	—	
27	Anibal Torres Duque	1848481867	R. Vial	—	
28	Sebastian Espinosa	1020718355	O P	—	[illegible]
29	Hernando Hernandez	1097390666	Ay	3122354611	
30	Luis Gabriel Londoño	80002307	Oficial	3017285483	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
FORMATO:	SST-FI-47	
Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindío.	Ordenador vial.	17	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Señalización Vial
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Adrian Mauricio Valencia	7602965S	AY	3146248278	
2	Michael A. Gonzalez	9729351	OP	—	
3	JHONY Parra	1005099457	AY	—	
4	Luis Ortiz	13860726	OF	3153332582	
5	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	3215984	
6	Jorge David Martinez	1045424150	AY.		Jorge Martinez
7	Wagner Sabogal G.	18'393.885	Inspector		
8	Jayid Ayla R	1069775764	AY	3165855604	
9	Maria LUPE Erazo	41921588	Coordinadora	—	M-LUPE ERAZO
10	KATHERIN MARIN JIMENEZ	1094491891	PALETERA	—	Katherin Marin
11	Jarol Styuan mora	1005259959	AY	—	
13	KATHERINE MARIN JIMENEZ	1094491891	PALETERA	—	Katherine Mar
15	Sara Guzman Tejero	1010093936	Peatona	3157122733	
16	LIS CATRIN Patt C.	1004046765.	t.	—	LIS C.
17	Laura Camila Sanchez Cortez	1005093345	Paletera		Laura Camila S.
18	[illegible]	[illegible]	Paletera		[illegible]
19	Sebastian Espinosa	1020748756	CP	—	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio.	Ordenador Vial.	18	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion - Reinducción		Cual? Identificación de Peligros en las frentes de trabajo
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Eugenio sepulveda	18403069	Of		Eugenio
2	Pedro Hernandez	14801714	Ayd		Pedro
3	Eduardo Lopez	18,399,473	Oficial		
4	Jovel Avila	1069775764	Ay	3162835604	
5	Hernando Hernandez	1097390666	Ay	3225546044	
6	carlos Alberto Soto	13993136	-	3147141011	carlos Alberto
7	ROBERT MORENO	4377790	AY		
8	William Viñoles C.	7.598.089.	Oficial	3775700	
9	Frankli Imperial	94742120	oficial		
10	Luis Ortiz	13860726	Oficial	3115577542	
11	Alexander de Jesus	1063076713	of.	3237902097	
13	Carlos Ayala	73064053	Of		
15	Sebastian Espinosa	1088718355	of	3226209570	Sebastian
16	Alcero arango	18095688	Ay		
17	Brayder gonzalez	1094941885	Ay	3104514517	
18	Robert Acevedo	9755135180	Of. Herrero	3144758446	
19	Ronaldo Hurtado	87383420	OF. Herrero	3145602879	
20	Juan David Romaña	1077424300	oficial	3225103372	Juan David Romaño
21	JHON JAIRO	1071499845	Of.		
22	Luis Fernando		Ay		
23	Luis Gabriel Fandiño	80009307	Oficial	------	Gabriel
24	Jorge David Martinez	1045424450	Ay.		Jorge Martinez
25	Julian Andres Chinchon	1834453	Almacen	--	
26	Felix Murillo C	73559948	Of	—	
27	Andres David M.	1082802655	Ay	———	Andres Pacich
28	Jhonny Parra	1005041137	Ay	— —	
29	Jhon J. Rengifo	14896021	Ay		
30	Jorge Mario Quintero Portilla	1144884415	Ayudante	3184677394	Jorge Mario Q P

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo

CONSORCIO VIAL ARMENIA

FORMATO: SST-FI-47

Estándar E1.2.1

Fecha: Julio 28 de 2025
Versión: 001
Pagina 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio	Ordenador Vial.	18	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Identificacion de Peligros en las Frentes de trabajo
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Pedro A Cristo	9729567	Ay		
2	Michael A. Gonzalez	9729351	OF		
3	Juan Camilo Henao Muñoz	1010050314	Aux Topografo		
4	Yerol Stiwan Mora	1002537589	Ay		
5	Omar A. Ladino B	7091989198	AY	3225767210	
6	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	3215618396	
7	Marcos Bernal	7545995	nuestro	—	
8	Nancy Saboyal A.	18.393.885	Inspector		
9	Yender Torres	7069977774	Oficial	3045637063	
10	Sara Guzman Negro	1010039336	Paletera	3135718033	
11	LIS CTRIA + 1322 TE.	1004046765	t.	—	LIS C.
13	Cristian Hurtado	1033800167	OFICIAL	3134243165	
15	Arley [illegible]	76029658	Ay	3142240573	Arley
16	Julian Felipe [illegible]	1004918454	ay	—	
17	Alvaro arango	18395688	AY		
18	Laura camila sanchez cortez	1005093395	Paletera		Laura Camilo S:
19	[illegible]	1094900370	Paletera		
20	Sebastian Espinosa	1020719235	OP	—	Sebastian
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	19	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Uso adecuado de los elementos de Protección Personal
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Fernando	89.000 [illegible]	AY		Luis Fred R
2	Alvaro arango	18395688	AY		
3	Marcos Bonul	7545948	maestro	—	
4	Brayder ramirez	1099911985	Ay		
5	Edward Rust. 16	18,399,413	oficial	—	
6	Isnaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
7	Juan David Romaña	1077424300	oficial	3225103072	Juan David Romaña
8	Robert Asencio	9125535 18	Of. Herrero	3447189749	
9	JULIAN ALVARES CHACON	1836 6483	ALMACEN		
10	ROBERT MORENO	4377990	AY		
11	Carlos Alberto Suoto	13993136		3147141011	carlos alberto.
13	Alexander de Jesus	1067076213	OF	3232903897	
15	JHON JAIRO	1074739845	OF	—	
16	FRANKLIN Paramo	800-75 [illegible]	OFICIAL	3208407 [illegible]	
17	Luis Ortiz	13860726	OFICIAL	2153582	
18	sebastian espinosa	1020716252	OP	3022222274	sebastian
19	Pedro Alfonso	1480171 [illegible]	Ayu		pedro
20	Luis Gabriel Fandiño	80002307	OFICIAL	3017285483	Gabriel
21	Daniel Mejia	1204761153	Oficial	[illegible]	
22	Felix Murillo C	73555948	AY	—	
23	Jhon J. Portilla	14896028	Ay		
24	William Zuñiga C.	4.518.089	Oficial	7275590066	
25	Hernando Hernandez	1097390666	Ay	3225546111	
26	Orlando Hurtado	11636147	OFICIAL	3215483961	
27	Jhonn A. Indulo	1094 [illegible]	Of	3225 [illegible]	
28	Andres David H.	1082802625	AY	3223871591	Andres
29	Andres Felipe Arenas	1094918454	AY	—	
30	Juan Camilo Hernandez	1010050314	Aux Topografo	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Ural	19	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Uso adecuado de elementos de Protección Personal
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Othony Parra	1005094137	Ay	3008622216	
2	Javier Avila	1069775764	Ay	3102855644	
3	Adrian Bedoya Valencia	7602658	Ay	3146665578	
4	Jorge mario Quintero R.	1094988413	Ay Jefe	3187677594	
5	Michael A. Gonzalez	9779351	OF	—	
6	Yeyder Pineda	1067977774	Operario	3015639063	
7	Jhon Bairo Perez	1094893225	Oficial	3136321777	
8	Jhon stiman Muñoz	1005253739	Ay	—	
9	Pedro A Chavez	97209567	Ay	—	
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordoñez Vial	29	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Sistemas y medidas de Prevención
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Sara Guzman Lesso	1010039936	Paletera	3135+12437	
2	Pedro A Castillo	94724567	Ay		
3	JULIAN AMONES CHACON	18346453	ALMACEN		
4		1094900332	Paletera		
5	Maria LOPE Erazo	41921588	cordinadora		Ma LOPE E.
6	THOMY Acarra	1025094151	AY		
7					
8	Alexander Lopez	1094076254	Of		
9	William 20N06 C.	7.518.089.	Oficial		
10	Roberto Marroquin	4377480	Ay		
11	Dario Ayala	73087453	oficial		
13	Jhon Stytwan Mora	1005258789	AY		
15	Hernando Hernandez	1097390666	Ay		
16	Carlos Alberto Suaza	13090336.		3147741008	Carlos Alberto.
17	Andres Felipe Osorio	1094918454	AY		
18	Alberto arango	18345688			
19	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA		Katherine Marin.
20	Jhon J. Rengifo	14696028	Ay		
21	Sebastian Espinosa	1020718356	OP		Sebastian
22	Juan Camilo Herrera V.	1010050314	Aux. Topogra		
23	Laura camilo sanchez cortez	1005093795	Paletera		Laura camila
24	JAVIER AVILA	1069775764	AY		
25	pedro Alfonso	1128017144	AY		Pedro
26	Brayan Gonzalez	1094948805	Ayc	3105514512	
27	Jorge David Martinez	1045424150	Ay		Jorge Martinez
28	Marcos Bermudez	75145495	maestro		
29	Jorge mario Quintero P.	1094887415	Ayudante	3187673814	Jorge mario Q P
30	Omar Ao Ladino	1094888758	AY	3005904168	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador vial	20	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Sistemas y medidas de prevención
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Mishael A. Gonzalez	9729351	OF	—	
2	CRISTIAN DAVEC	1094946765	T.	—	
3	Ismaldo Hurtado	82380420	OF. HERRAD	3143202874	
4	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David Romaña
5	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	oficial	3184743165	
6	Orlando Hurtado	11636197	Oficial	3215483	
7	[illegible]	80 75[illegible]	oficial	3203407	
8	[illegible]	13810726	OF	3165	
9	[illegible]	76029658	AY	3182	
10	[illegible]	1071[illegible]	OF	—	
11	[illegible]	[illegible]307	oficial	3017285	
13	[illegible]	[illegible]	AY	—	
15	[illegible]	1064[illegible]	oficial	3043639063	
16	Robert Bonilla	9755[illegible]	OF. Herrad	3144[illegible]	
17	Andres David Mej	1082802655	AYU	3223871591	Andres
18	Edwar D. Castillo	18,314,913	oficial	—	
19	Felipe Murillo C	73558948	AY	—	
20	Jose Bedoya Perez	1066[illegible]782	OFI		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
FORMATO:	SST.FI.47	
Estándar E.1.2.1	Fecha	Julio 29 de 2025
	Versión	001
	Página 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	09	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Compromiso y responsabilidad laboral
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Andres Felipe Osorio	1004918454	operador		
2	Felix Mendez	73555948	AY	3022227574	Sebastian
3	Sebastian Espinosa M	1020918352	R. Vial	3244954196	
4	Anibal James Duque	18491861		3104515118	
5	Jhoyner Gutierrez	1054519317	AY		
6	Albeiro Arango	18395680	AY		
7	Cristian A. Salazar	1094915880	AY - plant		
8	Edwin Fernando Bolaños	18,344,473	oficial		
9	Andres David Macias	1082806655	Ayudante		Andres Macias
10	Hernando Hernandez	1094390666	AY	3225546011	
11	Jorge Stiven Mora	1005253759	AY		
13	Danilo Ayala	73087453	Ayudante	3212715594	
15	Alejandro de Jesus	1064076213	of. Herrero	3232903847	
16	Robert Arteaga	1005353518		3144258948	
17	Pedro Chinchilla	94719567	AY	3100043434	
18	Adrian Alejandro Valencia	76029659	AY	3165260972	
19	Javier AVILA	1069775764	AY	3102835604	
20	Douglas Rios Valencia	1010001664	Aux topografia	3145274454	
21	Robert MORENO	4377490	AY		
22	[illegible]	[illegible]	AY		
23	Luis Ortiz	13860726	Oficial	3155232482	
24	Marcos Bernal	7545995	maestro		
25	Fredy Rendon	2679777745	especial	3045037063	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3202907776	
27	SHON JAIRO	1011139811	OF		
28	Juan Camilo Hurtado H.	1000058314	Aux Topografi		
29	Ismaldo Hurtado	92353420	OF. Herrero		
30	Ryan David Romaña	1077424300	Ficial		Juan David Romaña

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
FORMATO:	SST-FI-47	
Estándar E.1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha	Julio 28 de 2025
	Versión	001
	Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	09	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Compromiso y responsabilidad laboral
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Gabriel Londiño	80002307	Ofic.01	3017285983	Gabriel
2	Orlando Hurtado	11636147	OFICIA	3915485	
3	Jhon J. Reyes	14896024	Ay.		
4	Willia Zuluaga P.	7.518089	Ofic 1	3225794.66	
5	Jhonny Parra	1005091137	AY	3009622091	
6	Pedro Arteaga	14801744	Ayu		Jorge Martinez
7	Jorge Martinez	1045424150			
8	Oscar A. Ladino	1094889758	AX	3225967744	
9	Jorge Mauricio Quintero P.	1094884961	M	3189677994	Jorge mauricio
10	Eugenio Septulveda	18110569	OF.		Eugenio.
11	Carlos Alberto Suarez	13993136.		3147141101	carlos Alberto
13	Michael A. Gonzalez	9724341	OF		
15	Maria Lupe Erazo	41971538	coordinadora	3136795276	M. Lupe E.
16	Katherin Marin	1094911841	Paletera		Katherin Marin
17	Luis Guillermo Ortiz	1094946160	Recuperadora		Luis Guillermo.
18	Jessica Valentina Valencia	1094900322	Paletera		Jessica Valentina Valencia
19	Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletera		Laura Camila.
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI47
	Estándar E1 2 1	
		Fecha: Julio 28 de 2025
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	10	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Sentido de Pertenencia
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hanny Sabogal	18.393.885	Inspector		
2	LUIS Fernando	9[illegible]0785	AY		
3	Alberto arango	18395688	AY		
4	[illegible]	1094[illegible]320	Paletero		
5	Laura camila sanchez Cortes	1005093345	Paletero		Laura Camila Sanchez
6	Eugenio sepulveda	18403069	Oficial		Eugenio
7	MARCOS Bernal	7545945	Mecanico	—	
8	ROBERT MORENO	9377446	AY Ayudante	—	
9	Cristian A. Salazar	1094918188			
10	Jhon J. Ronjito	1489[illegible]	Ayu		
11	Luis Ortiz	13860776	Oficial	3157[illegible]	
12	Luis Gabriel	3017885983	oficial	- - - -	Gabriel
13	[illegible]				
14	JHON JAIRO	1017439845	Oficial		
15	[illegible]	1063076213	Of	3232403897	
16	Alexandra de Jesus	66.751[illegible]	oficial	3203[illegible]7774	
17	[illegible]	1077424300	oficial	3225103374	
18	[illegible]			3147141110	CARLOS ALBERTO
19	CARLOS [illegible]	13993126	oficial	—	
20	Edwar R Portillo	18,344,413		3148240[illegible]	
21	[illegible]	76029658	AY	- -	
22	[illegible]	73087453	Oficial	3102835[illegible]	
23	JOVIEL AVILA	1064[illegible]7564	AY	3184[illegible]977	
24	[illegible]	18346453	Auxiliar de Almacen	3225[illegible]055	
25	WILLIAN ZUÑIGA C.	7.518.089.	oficial	3223871591	
26	Andres David M.	1082802655	Ayudante	3225767[illegible]	Andres Mendez
27	[illegible]	7094[illegible]958	AY	3244459146	
28	[illegible]	16441861	Aux Ud	—	
29	[illegible]	1005[illegible]759	AY	—	
30	Michael A Gonzalez	9729351	OF		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI 47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Página 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	10	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	1	Sentido de Peatonería
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Pedro Alfonso	1480171[illegible]	AYC	3225546011	
2	Hernando Hernandez	1097320166	AY	3187677394	
3	Jorge mario Quintero P.	1094987417	AY		
4	[illegible]	1004884454	ay		
5	Orlando Ortiz	11636147	Oficial	3215483961	
6	Felix Murillo C	73555948	AY		
7	Jorge David Martinez	1045424150	AY.		
8	Juan Camilo Henao V.	1010050314	Aux Topografia		
9	[illegible]	1067927774	oficial	3045637063	
10	Pedro Antonio Cristo	6472056[illegible]	AY		
11	Brayan [illegible]	1044941905	AY	3104515[illegible]	
12	[illegible]	41197158	Coordinadora.	— — —	M- LUPE EVAD
13	Maria LUPE Evazo				
14	Sara Guzman Legro	1010039336	Paletera	31357.2433	Sara Guzman L.
15	Laura Camila Sanchez Cortes	1005093395	Paletera	— — —	laura. Camila S.
16	[illegible]	1094911891	PALETERA	— —	[illegible]
17	LIS GRANJERATE.	1094946965	PEGUERO	—	LIS GRAN. C.
18	Maria LUPE Evazo	41012188	coordinadora	— — —	M- LUPE EVAD
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
FORMATO:	SST-FI-47	
Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	11	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Orden y Aseo
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Carlos Andres Mora	73087615	oficial	3772774599	
2	Alexander de Jesus	1063076213	OF	5232403497	
3	carlos alberto suarez	13993136		3147141611	carlos alberto
4	Hernando Hernandez	1077390666	AY	3225546011	
5	Eugenio Espinosa	18403069	OF		Eugenio
6	Oscar Moreno	4377490	AX		
7	Marcos Bernal	7545998	nuestro	—	
8	Fernando Aguirre	2667977774	Oficial	3d1563f063	
9	William Zuñiga C.	7.518.084	Oficial	3225576665	
10	Javier Avila	1069775764	AY	3102835664	
11	Alberto Arango C	18395698	AY		
13	Jhon J. Rodriguez	14896020	AY		
15	sebastian espinosa	1088218255	OF	3e5e227744	Sebastian
16	Julian Chacon	18316453	AR. ARMACOL	3128488877	
17	Edwards Castillo	18,394,413	oficial	3155 —	
18	Brayder gonzalez	1014449806	AY	3049141417	
19	Sandra Lacino	1089689156	AY	3225963716	
20	Felix Murillo C	73555948	OF	—	
21	Jarol stytwan mora	1005757594	AY	—	
22	Anibal Tovar Diaz	18741861	R. Vial	3244459296	
23	Luis Ortiz	13860726	Oficial	3165372568	
24	David Bonagiu	1774243000	Oficial	—	
25	Luis Fred R	[illegible]	AY	—	Luis Fred R
26	Pedro Alfonso	1A0171H	AUX	—	
27	Camila Herrera V.	1050050514	Aux Topografe	—	
28	Pedro [illegible]	9824956	AY	—	
29	Jhonny Parra	1005094137	AY	—	
30	Michael A. Gonzalez	4729351	OF	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
FORMATO:	SST-FI-47	
Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindío	Gidenador Mal.	11	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Orden y aseo.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Orlando Hurtado	11636147	OFICIAL	3215487316	
2	Andres David M.	1082862655	Ayudante	— — —	Andres Madera
3	Jorge Mario Quintero Rotavo	1094884415	Ayudante	3187677394	Jorge mario Q P
4	Andres Felipe Grajales	1004918454	ayudante		
5	Jorge David Martinez	1015424150	Ay.		Jorge Martinez
6	Filberto valencia	10280461	ay	— —	
7	LUIS CARLOS PATIÑO	1004446765	+	— —	LUIS C
8	Sara Guaman Legro	1010039536	Paletera	3135712433	Sara Guaman Legro
9	Maria LUPE Erazo	41921193.	coordinadora.	— — —	MARIA LUPE ERAZO
10	KATHERIN MARIN	1094911891	PALETERA	—	Katherine Marin
11	Douglas Rios Valencia	1010006164	Ayudante	—	
13	ANGIE [illegible]	760[illegible]850	AY	3[illegible]82[illegible]	ANGIE
15	Luis Gabriel Fandiño	80002307	OFICIAL	3017285988	Gabriel
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Quebradanegra Vial	12	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	x	Capacitación Confirmalo, beneficios de los Trabajadores afiliados
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Henry Gaboogal	18.393.885	Inspector		
2	LUIS [illegible]	[illegible]	AY		LUIS [illegible]
3	[illegible]	1094900332	Paletera		[illegible]
4	Alberto arcingo	18395688	AY		
5	Laura Camila sanchez	1005093395	Paletera		laura Camila.
6	Marcos Bernal	7511595	nuestro	—	
7	Edwin R [illegible]	18.344.413	oficial	—	
8	Jhon [illegible]	1.5.46021	Ay		
9	Julian Andres Orozco	18.346453	Alcalde	—	
10	Robert Moreno	4377490	AY		
11	Carlos Alberto Suarez	13903736.	—	3147141011	Carlos Alberto
13	Eugenio Sepulveda.	18403069	Oficial	3116768759	Eugenio. Sepulveda
15	Sebastian Espinosa	1.020740.352	OP	3022227574	Sebastian
16	Luis Ortiz	13820726	Oficial	3115332582	
17	JHON JAIRO	1014439845	Of.	-	
18	Alexander de Jesus	1063076217	of	3232903847	
19	Brayan Gonzalez	1004994185	Ay	3045145117	
20	Pablo Arturo	73087455	oficial	3177318	
21	Pedro Alfonso	1143[illegible]1714	Ayu		Pedro
22	[illegible] Parra	1005001432	Ay	3[illegible]86720	
23	William Zuñiga C.	1518.89.	Oficial	3275574606	
24	Andres David M.	1082806655	Ayudante	— —	Andres Mejia
25	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	oficial	3134243165	
26	Felix Murillo	73555946	Ay	—	
27	Jose [illegible] Perez	1064492482	Of.	/ —	
28	[illegible]	1067977779	Oficial	3045637465	
29	Anibal Tovar Ospe	16741861	Oficial	3244459296	
30	Javier AVILA	1069775764	AY	3102835609	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenanza Vial	12	07	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Capacitación Comfenalco, beneficios de las Trabajadoras afiliadas
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hernando Hernandez	109-390666	Ay	3225546011	
2	Jorge Mario Quintero				
3	Michael A Gonzalez	4784351	OF	—	
4	Compañía de Lavado	1074089758	AP	3225907148	
5	David Romaña	1077424300	OF	—	
6	Juan Camilo Herao U.	1010050314	Aux Topograf	—	
7	Dayras Rios Valencia	1010006064	Aux topogra	—	
8	Jorge David Martinez	1045424150	OA.		Jorge Martinez
9	Andres Felipe Hoyos A.	1094918454	AY	—	
10	KATHERIN MARIN	1094911841	BALETERA	—	Katherine Marin
11	Maria Lupe Erazo	41071588	coordinadora	— " —	M. Lupe Erazo.
13	Sara Guzman Negro	1010039336	palctera	3135712435	Sara Guzman
15	Orlando Hurtado	11636197	oficial	3215418391	
16	LISGRINA ARBATE	1004494615	TRANSITO	— o —	LISGRINA
17	LAURA (UIJAN	1[illegible]4567	AY	—	
18	Luis Gabriel Fonseca	80098307	oficial	3017159833	Fonseca
19	[illegible]	76029658	AY	3169260087	
20	Jarol stytwan Mora	1005537359	AY	—	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador vial	13	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Importancia de las pausas activas
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Nancy Pabogal	18'393.885	Inspector		
2	Sara Guzman Lequ	1010039336	paletera		
3	LUIS PAEZ	89000[illegible]	AY		
4	Alberto Cardozo	18395	AY		
5	Robert Atencio	9773519	Of. Herrero	3146778444	
6	Marcos Bernal	754.995	Maestro	—	
7	María Lupe Evaro	41971330	contabada	—	M. Lupe E.
8	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
9	Juan David Romaña	1077424300	OFICIA	3225103372	Juan David Romaña
10	ROBERT MORENO	4377440	AY		
11	Edwin Trujillo	18,371,413	oficial	—	
13	JUAN ANDRES CHACON	18596453	Aux ALMACEN	—	
15	FRANKLIN Hernandez	80075124	OFICIAL	3203907796	
16	carlos Alberto Suarez	8179313 6.	—	3147146 11	carlos Alberto
17	Luis Gabriel Londoño	80009307	OFICIAL	3019685983	Gabriel
18	SHON SAIRO	1014398445	oficial	3115663884	
19	Sebastian Espinosa	1020718352	OP	3022229574	Sebastian.
20	Johny Parra	1007091957	AY	3008622710	
21	Willy Triana	215,18089	oficial	3225574016	
22	Eugenio Sepulveda	18403069	Oficial	—	
23	Alexander de Jesus	7061076277	OF	3232905197	
24	[illegible]	76029658	AY	3140263838	
25	David [illegible]	73047457	oficial	3127154534	
26	pedro Alfonso	1.089.01.714	AUX	—	
27	Jard styuan mora	1005753759	AY		
28	Javier Avila	1064775764	AY	3107855664	
29	Hernando Hernandez	1097390666	AY	3225546011	
30	Andres Felipe [illegible]	1004918454	oy	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: SST-FI-47

Estándar E1.2.1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador vial			

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Importancia de las pausas activas.
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitacion y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Orlando Hurtado	11636197	Oficial	3215418346	
2	Michael A. Gonzalez	9729351	Of.	—	
3	Jorge mario Quintero P.	1094883418	Ayudante	3127672794	
4	Rafael David M.	1082802655	Ayudante	3223871591	Andres Macia
5	Andres Tuto Duque	1544911667	R. Vial	3244459246	
6	Jorge David Martinez	1045424150	Ayudante		Jorge Martinez
7	Fabio Munoz COC	73555944	S7	—	
8	Luis Ortiz	13860726	Oficial	3115332582	
9	Rinder Jaramillo	1067977774	Oficial	3045637063	
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador vial	14	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Actos y Condiciones adversas Inseguras
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Henry Sabogal	18'393.885	Inspector		
2	Angel Tomas Duque	1549163	R. Vial		
3	LUIS FERNANDO	[illegible]	AY		
4	Alberto arango	19395088	AY		
5	Brayder GUTIERREZ	1094944280	AY	3164514517.	
6	Marlos Bernal	7545990	Mecanico	—	
7	Eugenio Sepulveda.	18403069	Of	—	Eugenio.
8	Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletera		laura Camila
9	[illegible]	1094900372	Paletera	—	[illegible]
10	Jhon J. Portillo	14546020	AY		
11	JHON JAIRO	1114494845	OF	—	
13	ROBERT MURCIA	4377494	AY		
15	[illegible]	14801714	AYU	—	
16	Edwin Leon Pino	18,349,413	oficial		
17	FRANKLIN Payranpino	80.751.244	oficial	3203407194	
18	Wellington Cano C.	7.518.089.	oficial	3235446066	
19	Alexander D. Jesus	1063076213	OF	3232903877	
20	Carlos Alberto Jurado	13993136.	—	3147141011	Carlos Alberto
21	Carlos Arboleda	73042453	oficial	321221	
22	JULIAN A. CHACON	18346453	ALMACEN	—	
23	Adrian Mendez Blanco	76029658	AY	3102408974	ADM
24	David Rojas	1077626200	OFICIAL	—	David
25	sebastian espinosa	1020718356	OP	3022277771	sebastian
26	Orlando Hurtado	11636147	OFICIAL	3215487390	
27	Luis Gabriel Fandiño	80002307	OFICIAL	3017885941	Gabriel
28	[illegible]	1386072	[illegible]	3153[illegible]	
29	Felipe Murillo C	73555[illegible]	AY	—	
30	Jarol Styuan Mora	1005553759	AY	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osmin	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador vial	14	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Actos y condiciones inseguras.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Jhonny Bo. Lozano	1028689758	AF	3225767746	
2	Michael A. Coney/er	4729 351	OF	—	
3	Jorgemario Quintero N.	1094885415	AG	3187677794	Jorgemario Q
4	Johyo David Martinez	1045424150	Top.		Johyo Martinez
5	Juan Camilo Henao M.	1088050314	Aux Topograf	—	
6	Sara Gutman legio	1010003933	Palaferia	3135716	Sara Gutman
7	María lupe Erazo	41971588	coordinadora	—	Mª lupe Erazo
8	[illegible]	1094911991	[illegible]	—	[illegible]
9	[illegible]	2067977774	Oficial	3045677066	[illegible]
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andres Osorio	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI.47	
	Estándar E1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador vial	23	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Trabajo en equipo
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Robert Moreno	4574440	Ay		
2	Jaid Stefan Mora	1005153759	Ay	—	
3	Alberto Arango	18395688	Ay		
4	Eugenio Sepulveda	18403069	Ot	—	Eugenio.
5	Laura camila Sanchez	1005093345	Paletera		Laura Camila
6	Sergio David Gonzalez A.	1005154139	operario	—	
7	Jairo A. Cano	87124364	Ay	—	
8	Erica Mendoza Valencia	7602658	Ay		
9	Luis Gabriel Landinez	80082307	Oficial	3014285983	Gabriel
10	Julian Andres Charo	18396453	Auxiliar Almacen	—	
11	Yhoany Saboyal	18'393.885	Inspector	—	
13	Gilberto Valencia	10388461	Ayudante	—	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	24	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Orden y Aseo en los Frentes de trabajo, Antes, Durante y Después
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Jhonny Zabogal	18.393.885	Inspectos		
2	Luis Fernando	89000[illegible]	AY		
3	Alberto arango	18386088	AY		
4	Marcos Beltrán	7545995	Maestro	—	
5	Christian Espinosa	4020740352	OP	3222223574	
6	Edwin Rodriguez	18,344,413	oficial	—	
7	Ismaldo Hurtado	82382420	OF. Herrero	3143202874	
8	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David Romaña
9	Robert Atencio	92[illegible]	OF. Herrero	3144228140	
10	Julian Andres Chacon	18396453	AUXILIAR ALMACEN		
11	Frankelimperence	800-751[illegible]	cofer	3226[illegible]	
13	carlos Alberto Sierra	13993136	— —	3147141010	carlos Alberto
15	Alexander de Jesus	1063076213	OF	1063076213	
16	JHON JAIRO	1017439845	OF	—	
17	Luis Ortiz	13860776	OF	3115237582	
18	ROBERT MORENO	4377440	AY		
19	Oficial	1004741497	Oficial	3212214444	
20	Brenda quenda	1069477779	operario	3045637067	
21	Andres David M.	1088[illegible]2535	Ayudante	3223871591	Andres Mario
22	Jhonny Parra	1007091057	AY	— — —	
23	Jon Bustos P.	1069[illegible]	OF		
24	Yarel steiwan Mora	1007253758	AY		
25	Felipe Angel C	7355594[illegible]	AY		
26	Pedro [illegible]	4714567	AY		
27	Adrian Mendoza Valencia	7602[illegible]658	AY	3168248[illegible]	
28	Jaime [illegible]	1065[illegible]4133	operador	—	
29	Eugenio Sepulveda	18403069	Ote	—	
30	Pedro Alfonso	1[illegible]801741	AYU		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador vial	24	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Orden y Aseo en los Frentes de Trabajo. Antes, durante y después
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	William Vivas C.	7'518.089	Oficial	7775576	
2	Armando Hernandez G	1097390666	Ay	3225546011	
3	Jhon Jairo Bonilla	14846024	Ay		
4	Jorge mario Quintero Patiño	1094884415	Aydante	3187677514	
5	Sandra A. Zuluaga	1094889758	Ay	3225762145	
6	JAVIER AVILA	1069775764	AY	3102835604	
7	Luis Gabriel Fandiño	80009307	oficial	3017885	
8	Orlando Hurtado	11626197	OFICIAL	3195483961	
9	Brayder Contreras	1094944885	Ay	3104514517	
10	Juan Camilo Hoyos M.	1010050314	Aux topograf	—	
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osmin	Firma

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Quimbaya Vial	25	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Política de consumo de sustancias
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		Psicoactivas y tabaco.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Henry Pabon al	18'393.885	Inspector		
2	LUIS Fernando	69 000 705	AY		
3	Alcira arango	41595683	AY		
4	María Lupe Erazo	41921588	controladora	—	M: Lupe Erazo.
5	Willy Zuñiga C.	7.518.089	oficial	3225574066	
6	Robert Moreno	4377490	AY		
7	Marcos Bernal	75459495	celador	—	
8	Sebastian Espinosa	1020719352	OP	3022227574	Sebastian
9	Carlos Alberto Sierra	13997176	— —	3147141011	Carlos Alberto
10	Juan Camilo Henao H.	1088508114	Aux Topografo	—	
11	Adrian Nuñez Mora	7602865	AY	3149240377	Adrian
13	JHON JAIRO	1014398845	OF	—	
15	David	1077244300	OF		David
16	Thomas Parra	1005091497	AY	— —	
17	Hernando Hernandez	1097390666	AY	3225546011	
18	Jose Styfwan Mora	1005753759	AY	— —	
19	Pedro A Cantillo	94129364	AY	—	
20	Frank Kenny Muñoz	80751244	coordinador	3202340	
21	Brayan Montaño	1094441888	AY	3104516154	
22	Felix Murillo C	73555981	OF	—	
23	Jonier Avila	1064175764	AY	3102835604	
24	Jose David Martinez	1045424150	AY		Jorge Gutierrez
25	Edwin R. Martinez	18.344.473	Auxiliar	—	
26	Andres David M.	1082802655	Ayudante	— — —	Andres Mateo
27	Oswaldo Hurtado	11136197	OFICIAL	3215418390	
28	Michael A. Gonzalez	9729351	OF	—	
29	Alexander de Jesus	1063076213	OF	3232903097	
30	OMAR A. Lucumi	1094682458	AY	3245[illegible]	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	25	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Politica de Consumo de sustancias
Charla de seguridad	x	Psicoactivas y tabaco
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Julian Andres Chacon	1836455	ALMACEN	—	
2	Luis Gabriel Fandiño	80002307	Oficial	3017EBS983	Gabriel
3	Jorge mario Quintero Perez	94468715	Ayudante	3189677394	Jorge Mario Q
4	Odin Ayala	1308724153	Oficial	3213 [illegible]	
5	Luis Ortiz	13860726	OC	3115332582	
6	Pedro Alfonso	1.18017[illegible]	Ayu		Pedro
7	Eugenio sepulveda	18403069	OP		Eugen.
8	Sara Guzman legro	1010039336	Paletera	3135712455	
9	Jhon Rojas	1489602[illegible]	Ay		
10	Katherine Sanjuan	1094911891	PALETERA	—	Katherine
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Andres Osorio	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio	Ordenador vial.	26	03	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Definicion de acoso laboral.
Charla de seguridad		Modalidades de acoso laboral
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		Debido proceso en atencion de quejas.
Seminario / Taller / Curso		marco normativo
Capacitación y Entrenamiento en SST		ley 1010 del año 2006 - Resolucion 3461. de 2025
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Angel Sthyfanny Mora	1005753759	Ay	3122063435	
2	Sara Guzman Legro	1010039336	Paletera	3135712433	Sara Guzman Legro
3	Felix Revilloc	73555948	Ay	3162774865	
4	Jennifer Lopez	1044847575	SST	1044847575	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jenny Adriana Perez	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: SST-FI-47

Estándar E1.2.1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenador Vial	26	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Prevención de la violencia en el entorno del trabajo - Actividad de reconocimiento de conductas asociadas al Acoso laboral, acoso sexual, VBG y discriminación como estrategia de prevención de dichas conductas
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Harry Zabaleta	18'393.885	Inspector	—	
2	[illegible]	[illegible]	AY		
3	Alvaro Arango	18396688	AY		
4	Marcos Bernal	7545995	Logistico	—	
5	María Lupe Erazo G.	41921588	contratista	—	Mª Lupe Erazo.
6	[illegible]	1044911891	PALETERA	—	
7	Eugenia Sepulveda	1840369	OFA	—	
8	[illegible]	1094941887	AY		
9	Juan Camilo Hernandez	1010010314	Auxtopografia	—	
10	[illegible]	18,394,413	oficios	—	
11	Carlos Ribeiro Suarez	13997176	--	3147141141	[illegible]
12	JULIAN ANDRES CHACON	18396453	ALMACEN	—	
13	ROBERT [illegible]	43-77440	AY	—	
14	Ronaldo Hurtado	82383420	OF. HERRERO	3143202879	[illegible]
15	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David Romaña
16	Robert Arcucio	9275375[illegible]	OF. Herrero	3144[illegible]	[illegible]
17	Adrian Alejandro Rivera	76029650	AY	3163249222	Adrian
18	William ZUÑIGA	9.518089	oficial	3225540664	[illegible]
19	Alexander de Jesus	1067076243	OF	3232903897	[illegible]
20	SHON SALAZAR	1014398445	OF.	—	—
21	Sebastian Espinosa	1020918252	OP	----	[illegible]
22	JHonny Parra	1004[illegible]	AG	---	
23	Fernando Hernandez	1091390666	AY	3225546011	[illegible]
24	Luis Ortiz	1386076	OF	3115227581	[illegible]
25	Pedro Alfaro	1[illegible]	AYS		[illegible]
26	Jorge David Martinez	1045424150	[illegible]		Jorge Martinez
27	Edgar Javier [illegible]	73555948	A.T		[illegible]
28	Pedro A[illegible]o	94-221561	AY	—	[illegible]

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Andres Garcia	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Prevención de la violencia en el entorno laboral. - Actividad de reconocimiento de conductas de Acoso Laboral, Acoso sexual, VBG y Discriminación como estrategia para la prevención de dichas conductas
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	[illegible]	80751 [illegible]	oficial	3203407776	
2	Cristian Camilo Hurtado	1033800167	Oficial	3B4743165	
3	[illegible]	2 059997774	oficial	3045679069	
4	Andres David M.	1082802655	AY	— —	Andres M.
5	[illegible] A. LADINO	1094887758	AY	— —	
6	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	3215C8396	
7	Luis Gabriel Fandiño	8000E307	Oficial	3017285983	Oficial
8	Javier AVILA	1069775761	AY	3102835604	
9	[illegible]	7305 7453	oficial	3212116899	
10	Jorge Luis Quiceno Pelaez	1094887418	Ayudante	3184677394	Jorge Luis
11	Michael A. Gonzalez	9729351	OF	—	
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia - Quindio.	Ordenador vial.	28	03	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Respeto entre compañeros. Consumo de sustancias psicoactivas.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitacion especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Maria lupe Evato	cedula	4611588	—	M: lupe Evato
2	[illegible]	[illegible]	A y		
3	Alberto arango	18395688	A y		
4	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
5	Juan David Remaña	1077424300	Oficial	3225103392	Juan David Remaña
6	Robert Arcila	92553518	Of. Hierro	3144459544	
7	Marcos T [illegible]	7345945	nuestro	—	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	ROBERT MORENO	4377490	Pala Tarea	—	
10	Edwin D [illegible]	18,377.843	Of. col	—	
11	Julian andres [illegible]	18346453	ALMACEN	—	
13	JHON JAIRO	1071139845	Of	—	
15	carlos Alberto Suzza	12493122	---	3147101601	carlos Alberto
16	Alexander de Jesus	7063076713		3232705897	
17	[illegible]	73087453	Ofi	3217319459	
18	Luis Gabriel Fandiño	80002307	Oficial	3174859183	
19	FRANKLIN [illegible]	80-751244	Oficial	3203407774	
20	Luis Ortiz	13860726	Of	3153732582	
21	[illegible]	18[illegible]669	[illegible]		
22	William Zuñiga C.	7.518.089	Oficial	3275544406	
23	Pedro Alfonso	14801744	A y		Pedro
24	Jhon Ramiro	14896026	A y		
25	Felix Murillo	73955940	A y		
26	JHONNY parra	1005091103[illegible]	A y	—	
27	Omar A. Lacino	1094889758	A y	3[illegible]	
28	Javier Avila	1069775764	A y	3102855604	
29	Pedro A Chaves	97945[illegible]	A y	—	
30	Sebastian Espinosa	1020710352	OP	3022[illegible]579	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jennifer lopez.	Jlopez.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO: SST-FI 47

Estándar E1.2.1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia Quindio.	Ocdenador Vial.	28	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA	
Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación especifica al cargo	
Otra	

TEMAS TRATADOS

Cual? Respeto entre compañeros. Consumo de sustancias psicoactivas.

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hernando Hernandez	1097390666	Ay	3225546011	
2	Brenda [illegible]	2067977779	[illegible]	3045632063	
3	[illegible]	1094946460	[illegible]	3136321355	
4	Michael A. Cortez Lopez	9729351	OF	—	
5	[illegible]	1005254137	[illegible]	—	
6	[illegible]	1094947885	Ay	—	
7	Yarel Stiven Mora	1005755759	Ay	—	
8	[illegible]	76029658	Ay	3146269	
9	Orlando Hurtado	11636147	Oficial	3915492	
10	Andres David M.	1052582655	Ay	—	Andres M.
11	[illegible]	1094984454	Ay	—	
12	Jorge David Martinez	1045424180	Ay		Jorge Martinez
13	Juan Camilo Henao Muñoz	1010050314	Aux Topografo	—	
14	Jorge mario Quintero Patiño	1094887413	Ayudante	3187677594	
15	KATHERINE MORAN	1094911 88	ELECTRICA	—	
16	Harry Zabaleta A	12'393 885	Inspector		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jennifer Lopez.	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDADS Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	SST-PTA
		VERSION	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	28/07/2025

PROYECTO:	Ordenador Vial				
CIUDAD:	Armenia	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Andres Osorio	CARGO:	Aux SST
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Glorieta Gala hasta Supermercado Olimpica			ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO:	DESDE 02-03-2026	HASTA 07-03-2026			

ACTIVIDAD A REALIZAR		PUNTOS DE ANCLAJE				ACTIVIDAD RUTINARIA			
	Trabajo en cajas electricas	SI	X	NO		SI		NO	X
CONTRATISTA	SI		NO	X	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR			

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), según corresponda

TRABAJADOR	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.4272/2021																			FIRMA
				Casco dieelectrico con barbuquejo 4	Gafas	P. Auditiva	Respiradores	Botas con puntera de acero	Guantes	Anclaje 5000lb	Anclaje 3600 lb	Arnés de cuerpo entero	Linea de vida Horizontal	Linea de vida Vertical	Mosquetones	Descendadores	Freno	Eslinga en Y sin absoredor	Eslinga en Y con absoredor	Eslinga de posicionamiento con	Eslinga de posicionamiento sin	Poleas	OTROS	
1	Michael Gonzalez	972935!	OF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	NA	SI	SI	NA	NA	NA	NA	NA	SI	NA	NA	NA		
2	Omar Andres	7094889750	AF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	NA	SI	SI	NO	NA	NA	NO	NA	SI	NA	NA	NA		
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

Certifico a la empresa que me encuentro en condiciones físicas, psicológicas para desarrollar la actividad y me comprometo a utilizar los elementos de protección personal que me suministraron y así mismo certifico con firma que recibido inducción y capacitación sobre el trabajo en alturas, las medidas de prevención y protección.

II. LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CUENTAN CON :

7 SEGURIDAD SOCIAL	SI	X	NO		CERTIFICADO DE ALTURAS VIGENTE	SI	X	NO		EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	SI	X	NO	

III. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X														
Certificado de aptitud medica para trabajo en alturas?	X		X														
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X														
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X														
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al dia	X		X														
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		X		X													
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X														
Durmio lo suficiente?	X		X														
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X														
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?Cual?	X		X														

IV. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			X			X			X			X			X					
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			X			X			X			X			X					
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			X			X			X			X			X					
Inspeccion formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			X			X			X			X			X					
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			X			X			X			X			X					
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			X			X			X			X			X					
Medidas colectivas (Delimitacion del area, lineas de advertencia, baranda, manejo de desniveles y orificios, control de caida de materiales)	X			X			X			X			X			X					
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con ATS para ejecutar la tarea.	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con ayudante de seguridad.	X			X			X			X			X			X					
FIRMA DE VALIDACIÓN DEL PERMISO																					

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como Persona que supervisa la actividad: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	Nombre De La Persona Que Supervisa La Actividad	
03-08-2026	8:00 am	5:00 pm	Cédula De La Persona Que Supervisa La Actividad	
07-08-2026			Firma Responsable del Trabajo Quien Ejecuta la Actividad	
Nº Nº COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Nombre Coordinador		Carlos Andres Osorio Cortes	
	Cedula Coordinador		1094960910	
	Firma Coordinador			

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA SE OBSERVA EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS ITEM ANTERIORMENTE SEÑALADOS, EL PERMISO SERA CANECELADO Y SE SUSPENDERÁ LA TAREA.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL TRABAJO				COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X			El area queda limpia y sin residuos	X		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	X			Se han presentado accidentes Y/o incidentes			
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	X			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros.				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

ATS

Para este trabajo se requiere permiso de:

TRABAJO DE ALTURA		TRABAJO EN CALIENTE		ESPACIO CONFINADO	
ENERGIAS PELIGROSAS		¿OTRO, CUAL?			

	NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Michael A. Gonzalez	9729351	OF.	
2	Omar A. Lagino	1094088758	AY	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Manuales	X	Palas, Picas, barras.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Que tal alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.20 m
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes, linea de vida, eslinga, señalización
¿Cuales son los elementos de proteccion peronal requeridos para la actividad?	Casco, tapabocas, Gafas, Guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren para la actividad?	2
¿Que materiales y recursos van a utilizarse para la actividad?	Alura Formaleta
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Caida de objetos.

Pasos detallados	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Entrada y salida en la casa excavada	Caida de alturas Caida de objetos Resbalones	Golpes, contusiones lesiones, traumas Fracturas	Uso de EPI y EPP adecuado, orden limpia y despejada, señalizacion
Instalacion de Acero para las paredes de las casas	Machucones, cruzones Pinchazos, caida de objetos, resbalones	Golpes, Contusiones lesiones, traumas, Fracturas, cortes aplastamiento	Uso de EPI y EPP adecuados, orden y aseo trabajo en equipo
Formaleta para casas excavadas	Caida de altura riesgo locativo atrapamiento	Golpes, contusiones lesiones, Aplastamiento traumas, fracturas	Uso adecuado de EPP orden y aseo, señalizacion Trabajo en equipo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un accidente?	SI ☐	No ☐	
Si la respuesta es SI, deténgase y no proceda con la actividad, proceda analizar los posibles peligros paso a paso hasta reducir o eliminar los riesgos presentados en la actividad teniendo controles preventivos.			
Si la respuesta es NO, continúe con la actividad con precaución, implemente los controles establecidos y brinde el acompañamiento y recomendaciones necesarias para la actividad salvaguardando la vida de todos los colaboradores.			
¿Es seguro proceder ahora con la actividad con los controles requeridos?			
SI, proceda con la actividad ☐		NO, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisón ☐	
NOMBRE COMPLETO (EMISOR DEL ATS)		CEDULA	FIRMA
Cesar Andres Osorio		1094960010	
NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO		CEDULA	FIRMA

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDADS Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	SST-PTA
		VERSION	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	28/01/2025

PROYECTO:	Ordenador vial				
CIUDAD:	Armenia	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Andres Osorio	CARGO:	Aux SST
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Ordenador vial			ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO:	DESDE 8:00Am	HASTA	5:00 pm		

ACTIVIDAD A REALIZAR		PUNTOS DE ANCLAJE				ACTIVIDAD RUTINARIA			
	Excavación de zapatas, vigas y muros de concreto	SI		NO	X	SI		NO	X

CONTRATISTA						Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	
	SI		NO	X	CUAL?		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), según corresponda

TRABAJADOR	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS (CERTIFICADO RES.4272/2021)																	FIRMA
				Casco dieléctrico con barbiquejo 4	Gafas	P. Auditivo	Respiradores	Botas con puntera de acero	Guantes	Anclaje 5000lb	Anclaje 3600 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descendedores	Freno	Eslinga en Y sin absorvedor	Eslinga en Y con absorvedor	Eslinga de posicionamiento con Eslinga de posicionamiento sin	Poleas	OTROS	
1	Michael Corrales	9720351	OF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	NO	NA	NA	
2	Cesar Ladino	1089088166	AF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SI	NO	NA	NA	
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							

Certifico a la empresa que me encuentro en condiciones físicas, psicológicas para desarrollar la actividad y me comprometo a utilizar los elementos de protección personal que me suministraron y así mismo certifico con firma que recibido inducción y capacitación sobre al trabajo en alturas, las medidas de prevención y protección.

II. LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CUENTAN CON :

7 SEGURIDAD SOCIAL	SI	X	NO		CERTIFICADO DE ALTURAS VIGENTE	SI	X	NO		EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	SI	X	NO	

III. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Tr empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X		X												
Certificado de aptitud medica para trabajo en alturas?	X		X		X												
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X		X												
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X		X												
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al dia	X		X		X												
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		X		X		X											
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X														
Durmio lo suficiente?	X		X		X												
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X		X												
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?Cual?	X		X		X												

IV. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional .	X			X			X			X			X								
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			X			X			X			X								
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			X			X			X			X								
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			X			X			X			X								
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			X			X			X			X								
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			X			X			X			X								
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			X			X			X			X								
Medidas colectivas (Delimitación del área, líneas de advertencia, baranda, manejo de desniveles y orificios, control de caida de materiales)	X			X			X			X			X								
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			X			X			X			X								
Cuenta con ATS para ejecutar la tarea.	X			X			X			X			X								
Cuenta con ayudante de seguridad.	X			X			X			X			X								
FIRMA DE VALIDACIÓN DEL PERMISO																					

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como Persona que supervisa la actividad: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA		
16-03-2026	2 8:01 AM	5:00 PM	Nombre De La Persona Que Supervisa La Actividad	Andres Osorio
21-03-2026	8:00 AM	5:00 PM	Cedula De La Persona Que Supervisa La Actividad	1094960810
			Firma Responsable del Trabajo Quien Ejecuta la Actividad	
VB DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Nombre Coordinador		Carlos Andres Osorio	
	Cedula Coordinador		1094960810	
	Firma Coordinador			

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA SE OBSERVA EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS ITEM ANTERIORMENTE SEÑALADOS, EL PERMISO SERA CANECELADO Y SE SUSPENDERÁ LA TAREA.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL TRABAJO				COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
l trabajo ha sido terminado				El area queda limpia y sin residuos			
l sitio y el equipo quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes Y/o incidentes			
ntrego el area limpia y libre de residuos de maetriales				El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
tros:				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

ATS

Para este trabajo se requiere permiso de:

ABAJO DE ALTURA	X	TRABAJO EN CALIENTE		ESPACIO CONFINADO			
PELIGROSAS		¿OTRO, CUAL?					

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	FIRMA
Michael Andres Gonzalez	9724351	OF	
Zulma Ay Lacayo	1094988758	AY	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Manuales	X	Pala, barra, pica,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Que tal alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.40 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	linea de vida, arnes, eslinga
¿Cuáles son los elementos de proteccion personal requeridos para la actividad?	casco, guantes, gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren para la actividad?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse para la actividad?	Alambre, Alambre
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si, por eso se delimita el area
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	caida de objetos

Pasos detallados	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Ingreso al area de trabajo	Caida, resbalones Caida de objetos	Golpes contusiones, traumas, raspones	Uso de linea de vida, arnes, certificacion en alturas, Escalera certificada para ingreso
Instalacion de acero dentro de las casas	Caida, derrumbe, resbalones, caida de objetos Atrapamiento	aplastamiento, golpes traumas, raspones contusiones, lesiones	Uso adecuado de EPP arnes, lineas de vida, Escalera, trabajo en equipo, pausas activas

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un accidente? Si [ ] No [X]

Si la respuesta es SI, deténgase y no proceda con la actividad, proceda analizar los posibles peligros paso a paso hasta reducir o eliminar los riesgos presentados en la actividad teniendo controles preventivos.

Si la respuesta es NO, continúe con la actividad con precaución, implemente los controles establecidos y brinde el acompañamiento y recomendaciones necesarias para la actividad salvaguardando la vida de todos los colaboradores

¿Es seguro proceder ahora con la actividad con los controles requeridos?

SI, proceda con la actividad [X] NO, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión [ ]

NOMBRE COMPLETO (EMISOR DEL ATS)	CEDULA	FIRMA
Carlos Andres Oswin Cortes	1094960070	
NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO	**CEDULA**	**FIRMA**
Juan Alexander Castrillo Rubio	83000502.	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDADS Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	SST-PTA
		VERSION	1
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	FECHA	28/07/2025

PROYECTO:	Ordenadores Viales				
CIUDAD:	Armenia	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	Andres Osorio	CARGO:	Aux SST
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Niza Bulevar			ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO:	DESDE 09-03-2026	HASTA	14-03-2026		

ACTIVIDAD A REALIZAR		PUNTOS DE ANCLAJE				ACTIVIDAD RUTINARIA			
	Instalación de arcaya y Fachaleta en rejas	SI	X	NO		SI		NO	X
CONTRATISTA	SI		NO	X	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR			2

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), según corresponda

TRABAJADOR	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.4272/2021																			FIRMA
				Casco dieléctrico con barbuquejo 4	Gafas	P. Auditiva	Respiradores	Botas con puntera de ASEO	Guantes	Anclaje 5000lb	Anclaje 3600 lb	Arnés de cuerpo entero	Línea de vida Horizontal	Línea de vida Vertical	Mosquetones	Descendedores	Freno	Eslinga en Y sin absoredor	Eslinga en Y con absoredor	Eslinga de posicionamiento con	Eslinga de posicionamiento sin	Polas	OTROS	
1	Michael G.	.972351	OF.	SI	SI	SI	NA	SI	SI	NA	NA	SI	SI	NA	NA	NA	NA	SI	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Omar A.	1094909150	AT	SI	SI	SI	NO SI	SI	NA	NO	NO	SI	SI	NA	NA	NO	NO	SI	NA	NO	NO	NA	NA	
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

Certifico a la empresa que me encuento en condiciones físicas, psicológicas para desarrollar la actividad y me comprometo a utilizar los elementos de protección personal que me suministraron y así mismo certifico con firma que recibido inducción y capacitación sobre el trabajo en alturas, las medidas de prevención y protección.

II. LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CUENTAN CON :

7 SEGURIDAD SOCIAL	SI	X	NO		CERTIFICADO DE ALTURAS VIGENTE	SI	X	NO		EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	SI	X	NO	

III. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X														
Certificado de aptitud medica para trabajo en alturas?	X		X														
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X														
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X														
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al dia	X		X														
Ingirio licor en las ultimas 24 horas ?		X		X													
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X														
Durmio lo suficiente?	X		X														
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X														
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ?Cual?		X		X													

IV. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			X			X			X											
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			X			X			X											
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			X			X			X											
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			X			X			X											
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			X			X			X											
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			X			X			X											
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			X			X			X											
Medidas colectivas (Delimitación del área, líneas de advertencia, baranda, manejo de desniveles y orificios, control de caida de materiales)	X			X			X			X											
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			X			X			X											
Cuenta con ATS para ejecutar la tarea.	X			X			X			X											
Cuenta con ayudante de seguridad.	X			X			X			X											
FIRMA DE VALIDACIÓN DEL PERMISO																					

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como Persona que supervisa la actividad: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	Nombre De La Persona Que Supervisa La Actividad	Andres Osorio
09-03-2026	7:00 AM	5:00 PM	Cedula De La Persona Que Supervisa La Actividad	1014960010
14-03-2026	8:00 AM	12:00 PM	Firma Responsable del Trabajo Quien Ejecuta la Actividad	
V° B° COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			Nombre Coordinador	Carlos Andres Osorio
			Cedula Coordinador	1014960010
			Firma Coordinador	

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA SE OBSERVA EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS ITEM ANTERIORMENTE SEÑALADOS, EL PERMISO SERA CANECELADO Y SE SUSPENDERÁ LA TAREA

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL TRABAJO				COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE/	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X			El area queda limpia y sin residuos	X		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	X			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		X	
Entrego el area limpia y libre de residuos de maetriales	X			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	X		
Otros:				Otros:			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

ATS

Para este trabajo se requiere permiso de:

TRABAJO DE ALTURA		TRABAJO EN CALIENTE		ESPACIO CONFINADO	
ENERGIAS PELIGROSAS		¿OTRO, CUAL?			

	NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Michael F. Gonzalez	97293911	OF	
2	Omar A. Salina	1019888150	AY	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Manuales	X	Palo, pica, barra,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Que tal alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.50 mts profundidad
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Eslinga, Arnes, linea de vida
¿Cuáles son los elementos de proteccion peronal requeridos para la actividad?	Casco, Guantes, Gafas.
¿Cuántos trabajadores se requieren para la actividad?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse para la actividad?	Acero - alambre
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si, las osn se delimita el area
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	caida de objetos.

Pasos detallados	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Ingreso al area de Trabajo	resbalones, caidas, caida de objetos	Golpes, traumas, Cortes, contusiones	Uso adecuado de EPP estipulado para ingreso Almacenamiento, orden y aseo
instalación de cableado y almacenamiento	resbalones, caidas, caida de objetos almacenamiento	Golpes, traumas Cortes, machucones Contusiones	Uso adecuado de EPP Escalera para ingreso trabajo en equipo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un accidente? SI [ ] NO [x]

Si la respuesta es SI, deténgase y no proceda con la actividad, proceda analizar los posibles peligros paso a paso hasta reducir o eliminar los riesgos presentados en la actividad teniendo controles preventivos.

Si la respuesta es NO, continúe con la actividad con precaución, implemente los controles establecidos y brinde el acompañamiento y recomendaciones necesarias para la actividad salvaguardando la vida de todos los colaboradores.

¿Es seguro proceder ahora con la actividad con los controles requeridos?

SI, proceda con la actividad [x]	NO, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisón [ ]	
NOMBRE COMPLETO (EMISOR DEL ATS)	CEDULA	FIRMA
Carlos Andres Osorio	1094960010	
NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO	CEDULA	FIRMA
Ivan Gallego	89000902	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO

VERSIÓN 01

AÑO	MES	DIA
2026	03	09

Número consecutivo

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 8:00 Am
Valido del día: 09-03-2026
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

Hora finalización: 5:00 Pm
Hasta el día: 14-03-2026

PERMISO CONCEDIDO A: Vinculado [ ] Contratista [ ]
Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Luis Díaz		1	Nelson Domingo Velasco	
2	Michael Camacho		2	Javier Avila	
3	Luis Gabriel		3	Jorge mario Ortega Pabon	
4	Omar Lozano		4	Hugo David Martinez	

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador		No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Carlos Andres Osorio			1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato:
Lugar especifico donde se realiza el trabajo:

Descripción del trabajo	Corte de acero Soldadura.

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	X	Caídas/Golpes	X	Vapor Tóxico	X	Gases	X
Incendio	X	Quemaduras	X	Alta temperatura	X	Derrames	X
Explosión	X	Izajes	X	Electricidad	X	Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	X	SI		N/A	Guantes de Seguridad	X	SI	N/A
Gafas de Seguridad	X	SI		N/A	Protección Respiratoria	X	SI	N/A
Protección Auditiva	X	SI		N/A	Calzado de Seguridad	X	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	X	SI		N/A	Otro ¿Cuál?	X	SI	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN

	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	X		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	X		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	X		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	X		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	X		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	X		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignífugos o se ha mojado para evitar generación de llamas?	X		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	X		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	X		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	X		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	X		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo maniobre?	X		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	X		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	X		
Existen otros permisos de trabajo asociados. Caliente Ⓧ Alturas ○ Consecutivo:			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	FORMATO
		VERSIÓN 01

AÑO	MES	DÍA
2026	03	02

Número consecutivo

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE LA LABOR

Acepto este permiso, acepto las obligaciones de las condiciones arriba mencionadas asociadas a este procedimiento, acepto la responsabilidad como persona directa a cargo del trabajo. Asegurare que los controles de riesgo se pongan en práctica.	Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados	El trabajo descrito arriba ha sido revisado en el sitio y se aseguraron las condiciones para desarrollar la labor. De acuerdo a esta verificación autorizo la ejecución del trabajo.
Nombre: [illegible]	Nombre: Carlos Andres Osorio	Nombre: [illegible]
Nro. C.C. 13860726	Nro. C.C. 1074960010	Nro. C.C. 89000302
Responsable de la Ejecución del Trabajo	Personal PSS	Jefe de área

CANCELACIÓN DEL TRABAJO

Motivos de cancelación de la labor		Nombre: _____ Cargo _____ Firma: _____

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO
El área de trabajo y áreas adyacentes han sido inspeccionadas después de finalizado el trabajo y todos los peligros asegurados. La zona de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de orden y aseo. Se encuentra ausente de chispas o materiales incandescentes.	X	

Nombre: Andres Osorio	Cargo: Aux SST	Firma: [illegible]

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO

VERSIÓN 01

AÑO	MES	DIA
2026	03	09

Número consecutivo

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 8:00 AM
Valido del día: 09-03-2026
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

Hora finalización: 5:00 pm
Hasta el día: 14-03-2026

PERMISO CONCEDIDO A: Vinculado ☐ Contratista ☐
Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Javier Díaz		1	Nelson Sandoval Valencia	
2	Michael Camacho		2	Javier Ruiz	
3	Luis Gabriel		3	Jorge Mario Gutiérrez Pabón	
4	Omar Ramírez		4	Hoyo David Martínez	

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Carlos Andres Osorio		1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato:
Lugar especifico donde se realiza el trabajo:

Descripción del trabajo	Corte de acero Soldadura.

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	X	Caídas/Golpes	X	Vapor Tóxico		Gases	X
Incendio	X	Quemaduras	X	Alta temperatura		Derrames	X
Explosión		Izajes		Electricidad		Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	✓	SI		N/A	Guantes de Seguridad	✓	SI	N/A
Gafas de Seguridad	X	SI		N/A	Protección Respiratoria	X	SI	N/A
Protección Auditiva	✓	SI		N/A	Calzado de Seguridad	✓	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	✓	SI		N/A	Otro ¿Cuál?	X	SI	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN

	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	✓		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	✓		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	X		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	✓		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	X		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	X		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignífugos o se ha mojado para evitar generación de llamas?	✓		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	X		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	✓		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	✓		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	X		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo maniobre?	X		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	✓		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	X		
Existen otros permisos de trabajo asociados. Caliente ⊗ Alturas ○ Consecutivo:			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	FORMATO
		VERSIÓN 01

AÑO	MES	DÍA
2026	03	02

Número consecutivo

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE LA LABOR

Acepto este permiso, acepto las obligaciones de las condiciones arriba mencionadas asociadas a este procedimiento, acepto la responsabilidad como persona directa a cargo del trabajo. Aseguraré que los controles de riesgo se pongan en práctica.	Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados	El trabajo descrito arriba ha sido revisado en el sitio y se aseguraron las condiciones para desarrollar la labor. De acuerdo a esta verificación autorizo la ejecución del trabajo.
Nombre: [illegible]	Nombre: Carlos Andres Osorio	Nombre: [illegible]
Nro. C.C. 13860726	Nro. C.C. 1074960040	Nro. C.C. 89000302
Responsable de la Ejecución del Trabajo	Personal PSS	Jefe de área

CANCELACIÓN DEL TRABAJO

Motivos de cancelación de la labor		Nombre: _____ Cargo _____ Firma: _____

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO
El área de trabajo y áreas adyacentes han sido inspeccionadas después de finalizado el trabajo y todos los peligros asegurados. La zona de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de orden y aseo. Se encuentra ausente de chispas o materiales incandescentes.	X	

Nombre: Andres Osorio	Cargo: Aux SST	Firma:

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO

VERSIÓN 01

AÑO	MES	DIA
2026	03	09

Número consecutivo

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 8:00 AM
Valido del dia: 09-03-2026
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

Hora finalización: 5:00 pm
Hasta el dia: 14-03-2026

PERMISO CONCEDIDO A: Vinculado [ ] Contratista [ ]
Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Luis Díaz		1	Javier Bedoya Valencia	
2	Michael Camacho		2	Javier Julian	
3	Luis Gabriel		3	Jhonatan Quintero Valencia	
4	Oscar Lujan		4	Hoyo David Martinez	

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Carlos Andres Osorio		1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato:
Lugar especifico donde se realiza el trabajo:

Descripción del trabajo	Corte de acero Soldadura.

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	X	Caídas/Golpes	X	Vapor Tóxico		Gases	X
Incendio	X	Quemaduras	X	Alta temperatura		Derrames	X
Explosión		Izajes		Electricidad		Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	X	SI		N/A	Guantes de Seguridad	X	SI	N/A
Gafas de Seguridad	X	SI		N/A	Protección Respiratoria	X	SI	N/A
Protección Auditiva	X	SI		N/A	Calzado de Seguridad	X	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	X	SI		N/A	Otro ¿Cuál?	X	SI	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	X		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	X		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	X		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	X		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	X		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	X		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignífugos o se ha mojado para evitar generación de llamas?	X		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	X		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	X		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	X		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	X		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo maniobre?	X		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	X		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	X		
Existen otros permisos de trabajo asociados. Caliente (X) Alturas ( ) Consecutivo:			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	FORMATO VERSIÓN 01

AÑO	MES	DÍA
2026	03	02

Número consecutivo

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE LA LABOR

Acepto este permiso, acepto las obligaciones de las condiciones arriba mencionadas asociadas a este procedimiento, acepto la responsabilidad como persona directa a cargo del trabajo. Aseguraré que los controles de riesgo se pongan en práctica.	Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados	El trabajo descrito arriba ha sido revisado en el sitio y se aseguraron las condiciones para desarrollar la labor. De acuerdo a esta verificación autorizo la ejecución del trabajo.
Nombre: [illegible] Nro. C.C. 13860726	Nombre: Carlos Andres Osorio Nro. C.C. 1074960010	Nombre: [illegible] Nro. C.C. 89000302
Responsable de la Ejecución del Trabajo	Personal PSS	Jefe de área

CANCELACIÓN DEL TRABAJO

Motivos de cancelación de la labor		Nombre: _____ Cargo _____ Firma: _____

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO
El área de trabajo y áreas adyacentes han sido inspeccionadas después de finalizado el trabajo y todos los peligros asegurados. La zona de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de orden y aseo. Se encuentra ausente de chispas o materialcs incandescentes.	X	

Nombre: Andres Osorio	Cargo: Aux SST	Firma: [illegible]

FIRMA DEL COLABORADOR | RESPONSABLE SGSST

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO

VERSIÓN 01

AÑO	MES	DÍA
2026	03	02

Número consecutivo

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 8:00Am
Hora finalización: 5:00Pm
Valido del día: 02-03-2026
Hasta el día: 07-03-2026
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

PERMISO CONCEDIDO A: Vinculado [X] Contratista [ ]
Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Luis Gabriel Fandiño	Gabriel	1	Omar A Ludeño	
2	Luis Ortiz		2		
3			3		
4	Pedro A Chisiño		4		

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Carlos Andres Osorio		1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato:
Lugar especifico donde se realiza el trabajo: Ordenador vial

Descripción del trabajo	Corte de acero • manejo de pulidora • manejo de soldador

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	[ ]	Caídas/Golpes	[X]	Vapor Tóxico	[X]	Gases	[X]
Incendio	[X]	Quemaduras	[X]	Alta temperatura	[X]	Derrames	[X]
Explosión	[X]	Izajes	[X]	Electricidad	[X]	Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	X	SI		N/A	Guantes de Seguridad	X	SI		N/A
Gafas de Seguridad	X	SI		N/A	Protección Respiratoria	X	SI		N/A
Protección Auditiva	X	SI		N/A	Calzado de Seguridad	X	SI		N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	X	SI		N/A	Otro ¿Cuál?		SI		N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN

	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	X		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	X		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	X		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	X		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	X		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	X		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignífugos o se ha mojado para evitar generación de llamas?	X		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	X		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	X		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	X		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	X		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo maniobre?	X		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	X		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	X		
Existen otros permisos de trabajo asociados. Caliente ⊗ Alturas ○ Consecutivo:			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE	FORMATO VERSIÓN 01

AÑO	MES	DÍA
2026	13	02

Número consecutivo

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE LA LABOR

Acepto este permiso, acepto las obligaciones de las condiciones arriba mencionadas asociadas a este procedimiento, acepto la responsabilidad como persona directa a cargo del trabajo. Aseguraré que los controles de riesgo se pongan en práctica.	Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados	El trabajo descrito arriba ha sido revisado en el sitio y se aseguraron las condiciones para desarrollar la labor. De acuerdo a esta verificación autorizo la ejecución del trabajo
Nombre: [illegible] Nro. C.C. 13860726	Nombre: [illegible] Nro. C.C. 1094960010	Nombre: [illegible] Abogado Nro. C.C. 18.393.885
Responsable de la Ejecución del Trabajo	Personal PSS	Jefe de área

CANCELACIÓN DEL TRABAJO

Motivos de cancelación de la labor		Nombre: _____ Cargo _____ Firma: _____

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO
El área de trabajo y áreas adyacentes han sido inspeccionadas después de finalizado el trabajo y todos los peligros asegurados. La zona de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de orden y aseo. Se encuentra ausente de chispas o materiales incandescentes.		

Nombre: Andres Osorio	Cargo: Aux SST	Firma: [illegible]

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**
FECHA DE INICIO	**6 DE AGOSTO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**5 DE AGOSTO DE 2027**

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				***SI***	***NO***
SPO-01. TRABAJOS EN LA VIA		***Bueno***	***60 mt***	x	
SPO-02. MAQUINARIA EN LA VIA		***Bueno***	***20 mt***	x	
SPO- 03. MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		***Bueno***	***20 mt***	x	
SPO- 03. ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		***Bueno***	***40 mt***	X	
SPO- 04. ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		***Bueno***	***40 mt***	X	
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01. VIA CERRADA		***N/A***	***N/A***		
SRO-02. DESVIO		***N/A***	***N/A***		
SR0-03. PASO UNO A UNO		***N/A***	***40mt***	x	
3. SEÑALES INFORMATIVAS					
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		***Bueno***	100m	x	
SIO-02. INICIO DE OBRA		***Bueno***	1m	x	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		***Bueno***	200m	x	

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 2 de 2

				CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***	***SI***	***NO***
SIO-03. FIN DE OBRA		***N/A***	***N/A***		
SIO-04. CARRIL CERRADO (Derecho, centro, izquierdo)		***N/A***	***N/A***		
SIO-05. DESVIO		***N/A***	***N/A***		
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***		
Conos		**Bueno**	**Móvil**	x	
Delineadores tubulares		**Bueno**	**Móvil**	x	
Canecas		**N/A**	**N/A**		
Barreras Plasticas Flexibles		**Bueno**	**Móvil**	x	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Reja Portatil Peatonal		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		**N/A**	**N/A**	x	
Reflectores		**N/A**	**N/A**	x	
Luces de Indentificacion de Peligro		**N/A**	**N/A**		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		**N/A**	**N/A**		
Luces de Advertencia en Barricadas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Señales de Mensaje Luminoso		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS MANUALES		**N/A**	**N/A**		
Banderas y Paletas (Banderero)		**Bueno**	**Móvil**	x	
Linterna		**N/A**	**N/A**	x	
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de malla vial tramo bomberos, donde se adelanta ejecución de obra					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 16 de marzo del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 02-03-2026 A: 07-03-2026 Desde las: 7:00 Am Hasta las: 5:00 Pm

Lugar de Trabajo: Ordenadora vial

Trabajo a realizar: Instalación de tubería, Formaleta de cajas, Armado de acero

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caídas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caídas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Ingreso a excavación manual de cajas y brechas para instalación de tubería electrica	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caídas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Excavación de cajas y brechas con herramienta de mano	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Circulación del Personal de obra en lugares donde existe almacenamiento y acopio de materiales	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Exposición a clima inestable	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 02-03-2026 A: 07-03-2026 Desde las: 7:00 Am Hasta las: 5:00 PM

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial

Trabajo a realizar: instalación de tubería, formatto de cajas, Armado de acero

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
ROBERT MORENO	4377490	AY	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	
Hernando Hernandez	1097390666	AY							
Andres Felipe Hoyos	1049184544	AY							
Andres David M.	1082802655	AY	Andres M.	Andres M.	Andres M.	Andres M.	Andres M.	Andres M.	
Cesar A. Lacino	1084889758	AY							
Jorge manuel Carrillo Rojano	1044884015	AY	Jorge manuel	Jorge manuel	Jorge manuel	Jorge manuel	Jorge manuel	Jorge manuel	
[illegible]	[illegible]	AY							
Michael A. Gonzalez	9729351	OF							
Jhonny parra	1005091137	AY							
Jorge David Martinez	1045.424.150	Ayu.							
Ricardo gonzalez	1044992985	AY							
Eugenio sepulveda	18403869	OF	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	
Alberto arango	19395688	AY							
Edward R. Castillo B	18.399.713	oficial							
Cristian A. Salazar	1094915188	Ayudante	Cristian S.	Cristian S.	Cristian S.	Cristian S.	Cristian S.	Cristian S.	
Javier AVILA	1069775764	AY	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
Marcos Acosta	7515998	maestro							
William ZUÑIGA C.	7.518.089	oficial							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Andres Ospina	1094960010			Aux SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-037
	LISTA DE CHEQUEO ATS	VERSIÓN 01
		PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
FECHA																			
	ITEM	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Químicos																		
	Atmósferas Peligrosas																		
	Espacio Confinado																		
	Ruido																		
	Incendio / Explosión																		
	Derrames																		
	Riesgo de Tropezones																		
	Riesgos Ambientales																		
	Riesgos Eléctricos																		
	Zanjas y Huecos																		
	Machucones, rasguños																		
	Esquirlas , particulas																		
	Fuentes de Ignición																		
	Presiones anormales																		
	Izaje de Cargas																		
	Cargas pesadas																		
	Pinchazos, cortaduras																		
	Superficies calientes																		
	Caídas desde altura																		
	Maquinaria Pesada																		
	Exposición a Calor / Frio																		
	Equipos rotando																		
	Tareas simultáneas																		
	Riesgo biológico																		

	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco																		
	Botas (Puntera)																		
	Gafas de seguridad																		
	Protector facial																		
	Guantes de tela																		
	Gafas para manejo de químicos																		
	Guantes de cuero																		
	Herramientas adecuadas																		
	Guantes de nitrillo / neopreno																		
	Delantal para químicos																		
	Chaleco salvavidas																		
	Arnés de de cuerpo entero																		
	Doble línea vida/Amortiguador																		
	Línea vida estática/dinámica/fija																		
	Cables / guaya de seguridad																		
	Cinta de precaución																		
	Respirador vapores orgánicos																		
	Respirador humos de soldadura																		
	Respirador polvos / neblinas																		
	Respirador canister fungicidas																		
	Extintor																		
	Oberol retardante al fuego																		
	Tanques de buceo																		
	Detector de LEL / Oxigeno																		
	Protección auditiva																		
	Doble protección auditiva																		
	Traje impermeable																		
	Oberol																		
	Careta para soldar																		
	Peto, polainas y mangas para soldar																		

FIRMA INSPECTOR SST	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 02-03-2026 A: 07-03-2026 Desde las: 7:00am Hasta las: 3:00 pm

Lugar de Trabajo: Ordenador vial

Trabajo a realizar: PALETEROS, CONTROLADORES DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN, OPERADORES BOBCAT, AUXILIARES BOBCAT

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proactivos, Reactivos)	
1	Ubicación en puntos de control de trafico	1	EXPOSICIONA FLUJO VEHICULAR	1	ATROPELLAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, TRAUMAS	1	Señalización vial, chaleco reflectivo casco, paleta refelctiva, capacitacion control trafico
2	Señalizacion manual del tránsito	2	Distración del conductor, poca visualizacion, carretera lisa, residuos de material en la via	2	COLISIONES, ATROPELLOS, GOLPES, TRAUMAS, LESIONES	2	Uso de señales reflectivas, usos de chaleco reflectivo, conos, barreras, barreras, capacitacion en seguridad vial
3	Orientación y control a paso de peatones	3	Peatones agresivos,insultos o provocaciones	3	Altercados, agresiones fisicas, estrés laboral	3	Capacitación, en manejo de conflictos , mantener trato respetuoso, no responder agresiones
4	Exposicion a ruido y polvo	4	RUIDO Y POLVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS	4	HIPOACUSIA, ENFERMEDADES RESPIRATORIOS, ENFERMEDADES AUDICTIVAS, ENFERMEDADES, PATOLOGIAS OCULARES.	4	Uso adecuado de EPP, hidratacion, pausas activas
5	Trabajo prolongado de pie	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos, fatiga y estres)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Operación del equipo Bobcat	6	DE SEGURIDAD MECANICOS (movimiento de maquinaria pesada)	6	ATRAPAMIENTO, VOLCAMIENTO DEL EQUIPO, QUEMADURAS, EXPLOSIÓN	6	Operador certificado, inspeccion preoperacional, cinturon de seguridad.
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Sebastian Espinosa	1026718352	OP	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	
Katherin Munoz	1094911891	PALETERA	Katherin	Katherin	Katherin	Katherin	Katherin	Katherin	
[illegible]	[illegible]	Paletera	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
LIS CRISTE.	1094961465	AR.	USC.	USC.	USC.	USC.	USC.	USC.	
Gilberto Valencia	7688462	OV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletera	Laura C.	Laura C	Laura C	Laura C	Laura C	Laura C.	
Yoldi Stefanny Mora	1005253791	Ay	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Juan J. Renjifo T.	14896028	Ay.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
M. Lupe Erato Calupu	41928533	control obbra.	M. Lupe	M. Lupe	M. Lupe	M. Lupe	M. Lupe	M. Lupe	
Felix Murillo C	73555948	BZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Andres Tunis Duque	1144941867	R. Ult	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Andres Osorio	1094960010			Aux SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 02-03-2026 A: 07-03-2026 Desde las: 7:00 am Hasta las: 3:00 pm

Lugar de Trabajo: Ordenadora vial

Trabajo a realizar: PALETEROS, CONTROLADORES DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN, OPERADORES BOBCAT, AUXILIARES BOBCAT

Herramientas y/o Equipos:

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)
1	Ubicación en puntos de control de trafico	1	EXPOSICIONA FLUJO VEHICULAR	1	ATROPELLAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, TRAUMAS	1	Señalización vial, chaleco reflectivo,casco paleta refelctiva, capacitacion control trafic
2	Señalizacion manual del tránsito	2	Distración del conductor, poca visualizacion, carretera lisa, residuos de material en la via	2	COLISIONES, ATROPELLOS, GOLPES, TRAUMAS, LESIONES	2	Uso de señales reflectivas, usos de chaleco reflectivo, conos, barreras, barreras, capacitacion en seguridad vial.
3	Orientación y control a paso de peatones	3	Peatones agresivos,insultos o provocaciones	3	Altercados, agresiones fisicas, estrés laboral	3	Capacitación, en manejo de conflictos , mantener trato respetuoso, no responder agresiones
4	Exposicion a ruido y polvo	4	RUIDO Y POLVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS	4	HIPOACUSIA, ENFERMEDADES RESPIRATORIOS, ENFERMEDADES AUDICTIVAS, ENFERMEDADES, PATOLOGIAS OCULARES.	4	Uso adecuado de EPP, hidratacion, pausas activas
5	Trabajo prolongado de pie	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos, fatiga y estres)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de persona reducción tiempo de exposición.
6	Operación del equipo Bobcat	6	DE SEGURIDAD MECANICOS (movimiento de maquinaria pesada)	6	ATRAPAMIENTO, VOLCAMIENTO DEL EQUIPO, QUEMADURAS, EXPLOSIÓN	6	Operador certificado, inspeccion preoperacional, cinturon de seguridad.
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Sebastian Espinosa	1026418.357	OP	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian	sebastian	
[illegible]	1094911891	PALETERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Paletera	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1094916165	AR.	USC.	USC.	USC.	USC.	USC.	USC.	
Dario Valencia	1088461	CAY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletera	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	
[illegible]	1007537591	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1089602811	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
M'LUPE Erazo Calvo	41921599	controladora.	M'LUPE	M'LUPE	M'LUPE	M'LUPE	M'LUPE	M'LUPE	
[illegible]	73555948	AY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	1094941869	AUX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación	Cargo
Andres Osorio	1094960010	Aux SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:SGSST-FOR-037
	LISTA DE CHEQUEO ATS	VERSIÓN 01
		PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	FECHA																		
	ITEM	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Quimicos			x			x			x			x			x			x
	Atmósferas Peligrosas			x			x			x			x			x			x
	Espacio Confinado			x			x			x			x			x			x
	Ruido	x			x			x			x			x			x		
	Incendio / Explosión	x			x			x			x			x			x		
	Derrames	x			x			x			x			x			x		
	Riesgo de Tropezones	x			x			x			x			x			x		
	Riesgos Ambientales	x			x			x			x			x			x		
	Riesgos Eléctricos	x			x			x			x			x			x		
	Zanjas y Huecos	x			x			x			x			x			x		
	Machucones, rasguños	x			x			x			x			x			x		
	Esquirlas , particulas	x			x			x			x			x			x		
	Fuentes de Ignición	x			x			x			x			x			x		
	Presiones anormales		x			x			x			x			x			x	
	Izaje de Cargas		x			x			x			x			x			x	
	Cargas pesadas		x			x			x			x			x			x	
	Pinchazos, cortaduras	x			x			x			x			x			x		
	Superficies calientes		x			x			x			x			x			x	
	Caidas desde altura		x			x			x			x			x			x	
	Maquinaria Pesada	x			x			x			x			x			x		
	Exposición a Calor / Frio	x			x			x			x			x			x		
	Equipos rotando	x			x			x			x			x			x		
	Tareas simultáneas	x			x			x			x			x			x		
	Riesgo biológico	x			x			x			x			x			x		
	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco	x			x			x			x			x			x		
	Botas (Puntera)	x			x			x			x			x			x		
	Gafas de seguridad	x			x			x			x			x			x		
	Protector facial	x			x			x			x			x			x		
	Guantes de tela		x			x			x			x			x			x	
	Gafas para manejo de quimicos			x			x			x			x			x			x
	Guantes de cuero		x			x			x			x			x			x	
	Herramientas adecuadas	x			x			x			x			x			x		
	Guantes de nitrillo / neopreno	x			x			x			x			x			x		
	Delantal para quimicos			x			x			x			x			x			x
	Chaleco salvavidas			x			x			x			x			x			x
	Arnés de de cuerpo entero			x			x			x			x			x			x
	Linea de vida			x			x			x			x			x			x
	Línea vida estática/dinámica/fija			x			x			x			x			x			x
	Cables / guaya de seguridad			x			x			x			x			x			x
	Cinta de precaución	x			x			x			x			x			x		
	Respirador vapores orgánicos		x			x			x			x			x			x	
	Respirador humos de soldadura		x			x			x			x			x			x	
	Respirador polvos / neblinas	x			x			x			x			x			x		
	Respirador canister fungicidas		x			x			x			x			x			x	
	Extintor		x			x			x			x			x			x	
	Oberol retardante al fuego		x			x			x			x			x			x	
	Tanques de buceo			x			x			x			x			x			x
	Detector de LEL / Oxigeno			x			x			x			x			x			x
	Protección auditiva	x			x			x			x			x			x		
	Doble protección auditiva		x			x			x			x			x			x	
	Traje impermeable	x			x			x			x			x			x		
	Oberol	x			x			x			x			x			x		
	Careta para soldar			x			x			x			x			x			x
	Peto, polainas y mangas para soldar			x			x			x			x			x			x
	FIRMA INSPECTOR SST																		
	OBSERVACIONES																		

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 02-03-2026 A: 07-03-2026 Desde las: 6:00 Am Hasta las: 5:00 Pm

Lugar de Trabajo: Orlando Vial

Trabajo a realizar: ARMADO DE ACERO, TRASLAPO DE CASTILLOS PARA PILOTES, SOLDADURA Y CORTE DE ACERO

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos vía)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Traslapo de castillos de acero para pilotes	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Armado de castillos de acero	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Circulación del personal de obra en lugares donde existe alamacenamiento y acopio de materiales.	6	DE SEGURIDAD MECANICOS (Uso de herramienta energizada)	6	Cortes, quemaduras, amputaciones, proyeccion de particulas	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de equipos y herramientas, señalización y delimitación del area de trabajo
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Luis Emilio Ortiz V	13860726	Oficial							
JHON [illegible]	1019139[illegible]	Oficial							
Ismaldo Hurtado	8238220	OF. Herrero							
Robert Arcila	9233519	Of Fundido							
Dario Mejia	73067453	Oficial							
Alexander de Jesus	1063076277	Of							
Frank Mauricio Ramirez	8023[illegible]	Oficial							
JHON JAIR	1[illegible]	Ofi							
David Ramirez	1077[illegible]	Ofi							
Nestor gutierrez	1067997174	oficial							
Arley Alvarez	76029658	Ay							
Orlando Hurtado	11636197	Oficial							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación	Cargo
Andres Osorio	1041[illegible]	AUX SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:SGSST-FOR-037
	LISTA DE CHEQUEO ATS	VERSIÓN 01
		PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
FECHA																			
	ITEM	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Químicos	X			X			X			X			X	/		X		
	Atmósferas Peligrosas	X			X			X			X			V			X		
	Espacio Confinado			X			X			X			X			X			X
	Ruido	X			X			X			X			X			P		
	Incendio / Explosión	X			X			X			X			X			X		
	Derrames	X			X			X			X			X			X		
	Riesgo de Tropezones	X			X			X			X			X			X		
	Riesgos Ambientales	X			X			X			X			X			X		
	Riesgos Eléctricos	X			X			X			X			X			X		
	Zanjas y Huecos	X			X			X			X			X			X		
	Machucones, rasguños	X			X			X			X			X			X		
	Esquirlas , partículas	V			X			X			X			X			X		
	Fuentes de Ignición	X			X			X			X			X			X		
	Presiones anormales	X			X			X			X			X			X		
	Izaje de Cargas	X			X			X			X			X			X		
	Cargas pesadas	X			X			X			X			X			X		
	Pinchazos, cortaduras	X			X			X			X			X			X		
	Superficies calientes	X			X			X			X			X			X		
	Caídas desde altura	X			X			X			X			X			X		
	Maquinaria Pesada	X			X			X			X			X			X		
	Exposición a Calor / Frio	X			X			X			X			X			X		
	Equipos rotando	X			X			X			X			X			X		
	Tareas simultáneas	X			X			X			X			X			X		
	Riesgo biológico	X			X			X			X			X			X		
	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco	X			X			X			X			X			V		
	Botas (Puntera)	X			X			X			X			X			X		
	Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X		
	Protector facial	X			X			X			X			X			X		
	Guantes de tela		X			X			X			X			X			X	
	Gafas para manejo de químicos			X			X			X			X			X			X
	Guantes de cuero	X			X			X			X			X			X		
	Herramientas adecuadas	X			X			X			X			X			X		
	Guantes de nitrillo / neopreno	X			X			X			X			X			X		
	Delantal para químicos			X			X			X			X			X			X
	Chaleco salvavidas			X			X			X			X			X			X
	Arnés de de cuerpo entero			X			X			X			X			X			X
	Linea de vida			X			X			X			X			X			X
	Línea vida estática/dinámica/fija			X			X			X			X			X			X
	Cables / guaya de seguridad			X			X			X			X			X			X
	Cinta de precaución	X			X			X			X			X			X		
	Respirador vapores orgánicos		X			X			X			X			X			X	
	Respirador humos de soldadura	X			X			X			X			X			X		
	Respirador polvos / neblinas		X			X			X			X			X			X	
	Respirador canister fungicidas		X			X			X			X			X			X	
	Extintor	X			X			X			X			X			X		
	Oberol retardante al fuego	X			X			X			X			X			X		
	Tanques de buceo			X			X			X			X			X			X
	Detector de LEL / Oxígeno			X			X			X			X			X			X
	Protección auditiva	X			X			X			X			X			X		
	Doble protección auditiva		X			X			X			X			X			X	
	Traje impermeable		X			X			X			X			X			X	
	Oberol	X			X			X			X			X			X		
	Careta para soldar	X			X			X			X			X			X		
	Peto, polainas y mangas para soldar	X			X			X			X			X			X		
FIRMA INSPECTOR SST																			
OBSERVACIONES																			
