CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

INFORME MENSUAL DE OBRA No.4
CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025.

OBJETO DEL CONTRATO
"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025
LA VEGA – CUNDINAMRCA
16 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 – 5 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

CONTENIDO

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO 6
2.1. GENERALIDADES 6
2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 6
2.3. ORGANIGRAMA OBRA 7
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9
4.1. ACTAS ADMINISTRATIVAS 9
4.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 9
4.3. CORRESPONDENCIA 14
5. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 19
6. CONTROL DE POLIZAS 20
7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 21
7.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL 21
7.2. BALANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 21
7.3. PAGOS EFECTUADOS 21
8. ASPECTOS TECNICOS 22
8.1. ALCANCE DEL CONTRATO 22
8.1.1. Condiciones iniciales 22
8.1.2. Condiciones actualizadas balance mayores y menores convenio ICCU 780- 2024 24
.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO, PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 28
9. AVANCE DE OBRA 30
1. EXCAVACIONES Y RELLENOS 30
2. ESTRUCTRURA DE VIA 30
10. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS 32
11. ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES 33

12. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 33
13. PERSONAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 34
14. EQUIPO DE OBRA 35
15. CONTROL DEL CLIMA 36
16. CONCLUSIONES 37
17. ANEXOS 39

INTRODUCCIÓN

El Municipio de la Vega (Cundinamarca) adelanto la selección del contratista a través del proceso de contratación No. SAMC-004-2025, con el fin de escoger la mejor propuesta, la cual se adjudicó a las más favorable para la entidad, además de acreditar todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, mediante resolución número 075 de 2025 del 5 de marzo de 2025, a el CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025, identificado con NIT 901.924.708-1 y representado legalmente por MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA, identificado con C.C. No. 1.019.068.674 de Bogotá, con el cual suscribe el contrato de obra No. 141 de 2025, celebrado entre el Municipio de la Vega/Cundinamarca y el CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA", con acta de inicio a partir del 16 de junio de 2025, por un valor de 323.024.782,21, con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses. El 25 de agosto de 2025 se firma acta de modificación No 1 por un monto de $ 74,497,340.00 para un valor actualizado del contrato de $ 397,522,122.21.


El presente informe abarca los periodos comprendidos entre el 16 de septiembre al 10 de octubre de 2025 y el 5 de noviembre al 10 de noviembre de 2025, en el cual se describen las actividades ejecutadas en campo, junto con sus componentes, los inconvenientes presentados y las soluciones implementadas.

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO



La Vega, Cundinamarca, es un municipio ubicado en la provincia de Gualivá, aproximadamente a 60 kilómetros al noroeste de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra a una altura de 1.230 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 22°C.

La vía se encuentra ubicada dentro del casco urbano del municipio el tramo comprendido entre la Carrera 3 y las calles 23 y 30, en las coordenadas 5°00'25.2"N 74°20'38.7"W

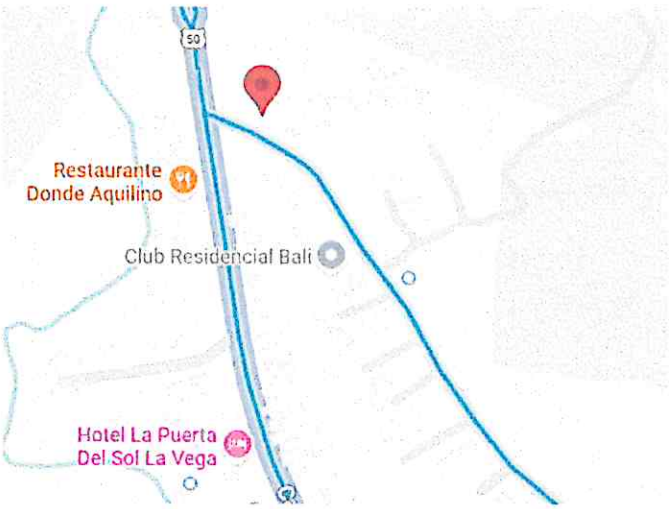

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1. GENERALIDADES

En el presente informe de obra con referencia No. 3, correspondiente al periodo comprendido entre en 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025, mediante un resumen general de la ejecución del contrato No. 141 de 2025, con el respectivo avance de obra, dejando constancia de las actividades ejecutadas y la descripción de cada una de ellas, además la explicación de los inconvenientes presentados que afectan el desarrollo de la obra y sus observaciones pertinentes, conclusiones y recomendaciones correspondiente al periodo de ejecución.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato No. 141-2025 consiste en el mejoramiento de la vía de la carrera 3 entre calle 23 y calle 30 sector barrio centenario etapa 2 mediante la pavimentación en concreto hidráulico.

Al finalizar la ejecución del proyecto se debe entregar en pleno funcionamiento la vía con su respectiva demarcación, teniendo en cuenta cada una de las cantidades presupuestadas para su ejecución dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos para construcción de este tipo de infraestructuras.

Se debe garantizar la conformidad de la comunidad y beneficiarios del proyecto esto con el fin de garantizar la estabilidad de la obra y satisfacción de los trabajos realizados.

2.3. ORGANIGRAMA OBRA

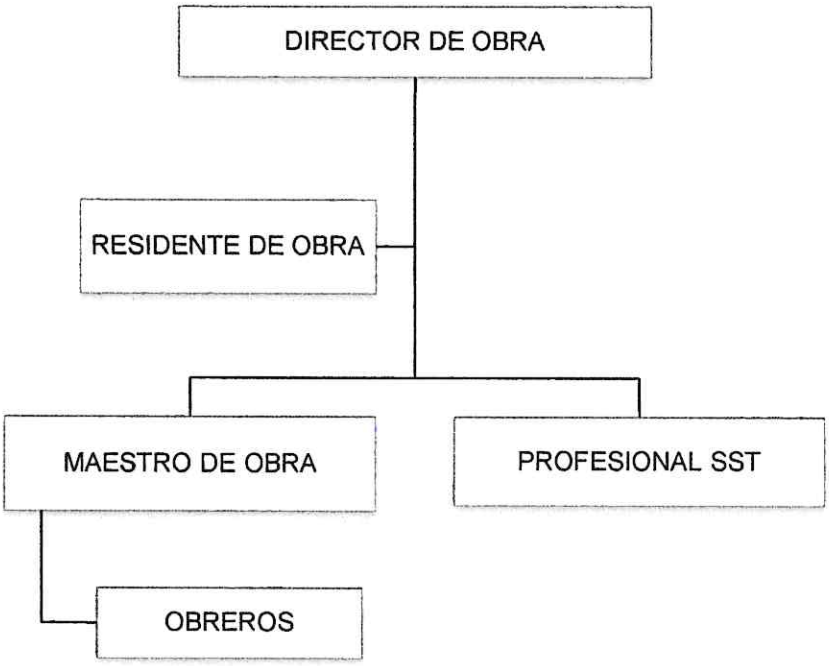


Gráfico 1 Organigrama general de obra.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra:

CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT. 901.055.683-5
CONTRATISTA	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 NIT: 901.924.708-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA C. C. No. 1.019.068.674 DE BOGOTÁ D.C
INTERVENTORÍA	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVLES SAS NIT: 900.446.649-9
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID LORENA GÓMEZ HERNANDEZ C.C. 1.069.100.571 DE NEMOCON CUNDINAMARCA
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA"

CONTRATO No	141 DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS. ($323.024.782,21)
DURACION	CUATRO (4) MESES
ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIÓN VALOR DEL CONTRATO	23.06%
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVEN SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 74,497,340.00) M/CTE
FECHA DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No 1	25 DE AGOSTO DE 2025
CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No 1	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTE DOS PESOS CON VEINTE UN CENTAVOS ($ 397,522,122.21) M/CTE
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	10 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 1	VEINTISÉIS (26) DÍAS
FECHA DE REINICIO No 1	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN A LA FECHA:	97.28%
VALOR DE EJECUCIÓN A LA FECHA:	$ 386.706.929,57

Tabla 1 Ficha técnica contrato de obra.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. ACTAS ADMINISTRATIVAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del corte se han generado por parte del contratista las siguientes actas al contrato de obra:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN Y ADICCIÓN No 1	25 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No 1	10 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No 1	5 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tabla 2 Tabla de actas administrativas.

4.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

No.	TIPO DE ACTA	FECHA	CONVOCADA	DESCRIPCION
1	COMITÉ	04/06/2025	INTERVENTORIA	• Se realizó la socialización de los canales de comunicación y los horarios establecidos. • Tiempo de entrega de compromisos. Documentación inicial (hojas de vida, maquinaria, programación de obra y pólizas). • Socialización de balance inicial.
2	COMITÉ	25/06/2025	INTERVENTORIA	• Envió de subsanaciones a las observaciones del cronograma de obra. • Socialización de balance de obra para conocer el alcance físico.
3	COMITÉ	02/07/2025	INTERVENTORIA	• Cárcamo de protección tubería sanitaria. • Espacio público frente al conjunto. • Inspección de red existente • Entrega del diseño de la vía para su revisión.

				• Entrega de documentación previa inicial faltante. • Ejecución de activades de obra. • Valla informativa.
4	COMITÉ	09/07/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 3, información de ensayos y certificados de calidad material granular. • Fecha para entrega de documentación para la adición No 1. • Ejecución de actividades de obra. • Materiales para instalación del filtro. • Niveles para descarga del filtro • Implantación de la vía para definir límites con la vía nacional.
5	COMITÉ	16/07/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 4, entrega de documentación solicitud de adicción. • Ejecución de actividades de obra. • Fallo en la subrasante del K0+595 al K0+625 • Aprobación por parte de la interventoría para intervención y mejoramiento del fallo. • Aprobación de la valla informativa para su instalación.
6	COMITÉ	23/07/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 5, entrega de documentación solicitud de adicción. • Socialización de observaciones documentos adicción. • Ejecución de actividades de obra.
7	COMITÉ	30/07/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 6. • Entrega de documentos adicción ajustados y aval modificatorio por parte de la interventoría. • Ejecución de actividades de obra.

8	COMITÉ	06/08/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 7. • Actividades de profundización paso eléctrico condominio Mirador de San Juan. • Entrega de documentos físicos de solicitud de adicción. • Ejecución de actividades de obra.
9	COMITÉ	13/08/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 8. • Entrega de informe mensual. • Ejecución de actividades de obra.
10	COMITÉ	27/08/2025	INTERVENTORIA	• Entrega de compromisos según acta de comité No 9 • El contratista comunica que esta a la espera de la maquinaria para realizar el cereo de la base para continuar con la fundición de las losas. • La interventoría solicita que, una vez finalizada la actividad, se coordine el desplazamiento del equipo de topografía para realizar las verificaciones pertinentes. • Solicitud de toma de densidades por parte del contratista. • Remisión de certificados de calidad. • Porcentaje de ejecución programado 44.46%, ejecutado 45.33% actualizado al modificatorio. • La interventoría solicita la modulación de las losas de concreto. • La interventoría señala al contratista la posibilidad que presente un acta parcial No 1 de acuerdo a lo solicitado por la supervisión.
11	COMITÉ	10/09/2025	INTERVENTORIA	• Lectura del acta de comité No 10 y entrega de compromisos. • Fecha de entrega informe No 2.

				• Entrega del informe mensual No1 por parte de la interventoría a la supervisión. • Entrega de acta de comité No 6 por parte de la interventoría al contratista de obra. • La supervisión solicita a la interventoría la copia de informes de interventoría correspondientes al contrato del centenario. • Entrega de la bitácora al contratista en la fecha pactada. • se comunica por parte del contratista de obra que las pólizas del modificatorio ya se encuentran entregadas a contratación, subidas al secop y aprobadas por la entidad. • Los certificados pendientes se entrgaran en el informe mensual No 2. • Fecha de entrega de las observaciones de la modulación de las losas • Avance de obra cuenta con un porcentaje programado del 60.24% versus un porcentaje ejecutado del 51.73% lo que se cuenta con un atraso del 8.51%. • La supervisión solicita al contratista de obra la protección de la base granular de acuerdo con la fecha de inicio de instalación de concreto.
12	COMITÉ	24/09/2025	INTERVENTORIA	• Lectura del acta de comité No 11 y entrega de compromisos. • El contratista informa que realizo el envió de la nodulación ajustada conforme a las observaciones realizadas por parte de la interventoría. • Si la interventoría genera observaciones propone realizar un comité virtual para socializar y subsanar

				para continuar con el vaciado de concreto. • El contratista informa que iniciará el proceso para la presentación del acta de terminación, para lo cual solicita que se remita el checklist correspondiente. • Se revisa el porcentaje de ejecución programado frente al ejecutado; a la fecha se registra un 69 % de ejecución frente a un 89 % programado para el mismo periodo
13	COMITÉ	01/10/2025	INTERVENTORIA	• Lectura del acta de comité No 12 y entrega de compromisos. • La interventoría informa que el día 26 de septiembre de 2025 comunicó al contratista las observaciones a la revisión de la modulación presentada, en la cual el ingeniero especialista de la interventoría solicitó que se dilatara la placa donde se encuentran los pozos, con el fin de que esta no quedara con una dimensión superior a 5 metros. • El contratista informa que se encuentra en la elaboración de la cuenta de cobro No. 1, correspondiente al 90 %, y que el día 6 de octubre realizará la presentación de la documentación para su revisión, aval y trámite correspondiente. • Se revisa el porcentaje de ejecución programado frente al ejecutado; a la fecha se registra un 79 % de ejecución frente a un 97 % programado para el mismo periodo, indicando que el porcentaje de atraso existente se nivelará una vez finalizado el vaciado de concreto. • La interventoría solicita al contratista la entrega del informe mensual No. 3, debido a que es necesario para los cobros parciales;

				este debe estar debidamente avalado por la interventoría y aprobado por la supervisión. • La interventoría recomienda al contratista de obra que en el informe mensual No. 4 se adjunten todos los resultados de laboratorio de los concretos.
14	COMITÉ	09/10/2025	INTERVENTORIA	• Lectura del acta de comité No 13 y entrega de compromisos. • El contratista de obra ya culminó el vaciado de concreto; a la fecha se encuentra pendiente la señalización horizontal, la cual se realizará 21 días después del vaciado, de acuerdo con la recomendación de la ficha técnica para garantizar su durabilidad. • Envío de la documentación para el trámite de la cuenta parcial No. 1, para revisión por parte de la interventoría. • Actas de vecindad de cierre.

Tabla 3 Actas de comité de obra.

4.3. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del presente informe, además se anexa copia de dicha correspondencia.

4.3.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
06/06/2025	OCVC. 141-2025-001	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	Solicitud de formatos
09/06/2025	OCVC. 141-2025-002	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de hojas de vida y disponibilidad de maquinaria
09/06/2025	OCVC. 141-2025-003	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de pólizas

11/06/2025	OCVC. 141-2025-004	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de balance de mayores y menores, programación de obra
16/06/2025	OCVC. 141-2025-005	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de documentación previa. Documentos técnicos Documentos financieros Documentos SG SST
27/06/2025	OCVC. 141-2025-006	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Subsanación de observaciones documentación previa
03/07/2025	OCVC. 141-2025-007	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Concepto técnico del filtro
08/07/2025	OCVC. 141-2025-008	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de documentación mina y solicitud de comité de obra en sitio
15/07/2025	OCVC. 141-2025-009	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Reponte de condición desfavorable de subrasante del K0+595 al K0+625
22/07/2025	OCVC. 141-2025-010	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Solicitud de modificación No. 1 y adición No. 1.
28/07/2025	OCVC. 141-2025-011	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Respuesta al oficio OCT 179-2025-141-014 – Observaciones a la modificación y adición No. 1.
19/08/2025	OCVC. 141-2025-012	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega Informe Mensual No 1.
28/08/2025	OCVC. 141-2025-013	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Pólizas Modificatoria y Adicción No 1
02/09/2025	OCVC. 141-2025-014	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Solicitud de toma de densidades y revisión de niveles para liberación de base
02/09/2025	OCVC. 141-2025-015	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de modulación de placas.
06/09/2025	OCVC. 141-2025-016	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Programación toma de densidades.
09/09/2025	OCVC. 141-2025-017	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Respuesta a observaciones oficio oct 179-2025-141-023 – informe mensual No. 1
10/09/2025	OCVC. 141-2025-018	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de resultados de densidades para liberación de base

15

11/09/2025	OCVC. 141-2025-019	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega de certificados de calidad de materiales utilizados en obra
12/09/2025	OCVC. 141-2025-020	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Respuesta al oficio oct 179-2025-141-027 – observaciones modulación de placas.
12/09/2025	OCVC. 141-2025-021	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega informe mensual No. 2.
23/09/2025	OCVC. 141-2025-022	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Observaciones sobre modulación de losas.
03/10/2025	OCVC. 141-2025-023	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Entrega informe técnico No 3.
09/10/2025	OCVC. 141-2025-024	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Solicitud Suspensión No 1.
09/10/2025	OCVC. 141-2025-025	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Solicitud Parcial No 1.
24/10/2025	OCVC. 141-2025-026	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Justificación técnica y memorial de responsabilidad.
24/10/2025	OCVC. 141-2025-027	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Esquema señalización.
04/11/2025	OCVC. 141-2025-028	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	solicitud reinicio No 1.
04/11/2025	OCVC. 141-2025-029	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Ejecución demarcación.

Tabla 4 Correspondencia enviada.

4.3.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CONSECUTIVO	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
10/05/2025	OCT 179-2025-141-001	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	Entrega Correo Oficial Interventoría - Supervisión
30/05/2025	OCT 179-2025-141-002	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CONSORCIO VIA	Citación Reunión Presencial - Contratista Supervisión

			CENTENARIO 2025	
03/06/2025	OCT 179-2025-141-003	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud de información inicial para el desarrollo del contrato de obra No. 141-2025
04/06/2025	OCT 179-2025-141-004	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones Balance Obra
05/06/2025	OCT 179-2025-141-005	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra No 1 – Citación al próximo comité de obra No 2
12/06/2025	OCT 179-2025-141-006	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Aval y entrega de hojas de vida y disponibilidad de maquinaria
18/06/2025	OCT 179-2025-141-007	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones Documentación Inicial
24/06/2025	OCT 179-2025-141-008	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Citación Comité No. 02
25/06/2025	OCT 179-2025-141-009	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 02
25/06/2025		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 - AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	Solicitud Valla Convenio Interadministrativo No. 780-2024
03/07/2025	OCT 179-2025-141-010	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 03
10/07/2025	OCT 179-2025-141-011	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 04
24/07/2025	OCT 179-2025-141-012	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No.05 y compromisos Comité No.06.
25/07/2025	OCT 179-2025-141-013	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud entrega informe mensual No 1.
25/07/2025	OCT 179-2025-141-014	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones modificatorio y adición y respuesta OCVC. 141-2025-010.
30/07/2025	OCT 179-2025-141-015	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Aval modificatorio adición y no previsto.

02/08/2025	OCT 179-2025-141-016	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 07.
06/08/2025	OCT 179-2025-141-017	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud esquema de cárcamo de protección alcantarilla de 36 pulgadas.
08/08/2025	OCT 179-2025-141-018	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega compromisos Comité No.8.
08/08/2025	OCT 179-2025-141-019	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega listado documentos liquidación.
16/08/2025	OCT 179-2025-141-020	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 08 - 09 y compromisos Comité No.9
16/08/2025	OCT 179-2025-141-021	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud cumplimiento de compromisos Comité No.8 y 9.
29/08/2025	OCT 179-2025-141-022	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 06 y 10 - y compromisos Comité No.10
29/08/2025	OCT 179-2025-141-023	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones informe mensual No.1.
02/09/2025	OCT 179-2025-141-024	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud cumplimiento de compromisos y obligaciones.
02/09/2025	OCT 179-2025-141-025	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Toma de densidades y revisión topográfica Rta OCVC. 141-2025-014
04/09/2025	OCT 179-2025-141-026	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Resultado Toma de densidades.
05/09/2025	OCT 179-2025-141-027	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones modulación placas.
12/09/2025	OCT 179-2025-141-028	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega Acta Comité No. 11
15/09/2025	OCT 179-2025-141-029	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Observaciones modulación placas Rta OCVC. 141-2025-020
23/09/2025	OCT 179-2025-141-032	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Citación comité de obra No.12.

26/09/2025	OCT 179-2025-141-034	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega acta comité No. 12.
27/09/2025	OCT 179-2025-141-035	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Aval modulación de placas.
30/09/2025	OCT 179-2025-141-036	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Citación comité de obra No.13.
04/10/2025	OCT 179-2025-141-037	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega acta comité No. 13.
10/10/2025	OCT 179-2025-141-042	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Entrega acta comité No. 14.
17/10/2025	OCT 179-2025-141-043	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Reporte ejecución actividades y observación modulación.
22/10/2025	OCT 179-2025-141-044	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Solicitud esquema señalización - Contratista Supervisión.
31/10/2025	OCT 179-2025-141-045	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Aval esquema señalización.
04/11/2025	OCT 179-2025-141-046	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES SAS	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Aval solicitud de reinicio No 1.

Tabla 5 Correspondencia recibida.

5. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

La relación de trabajadores directos del proyecto se relaciona en el informe mensual SST anexo a este informe y el personal administrativo profesional y técnico a cargo de la ejecución se relaciona a continuación:

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	DEDICACION
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	1	10%
RESIDENTE DE OBRA	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO	1	100%
MAESTRO	SERVANDO MONSALVE MANRIQUE	1	100%

Tabla 6 Personal de obra profesional.

6. CONTROL DE POLIZAS

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101063306	16/06/2025	17/02/2026	$32.307.478,22
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			16/06/2025	17/10/2028	$16.153.739,11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			16/06/2025	17/10/2030	$64.614.956,44
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101251133	16/06/2025	16/10/2025	$284,700,000.00

Tabla 7 Póliza de obra según firma acta de inicio.

POLIZAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN Y ADICCIÓN No 1.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101063306	16/06/2025	17/02/2026	$39,752,212.22
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			16/06/2025	17/10/2028	$19,876,106.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			16/06/2025	17/10/2030	$79,504,424.44
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101251133	16/06/2025	16/10/2025	$284,700,000.00

Tabla 8 Póliza de obra según firma acta modificación y adicción No 1.

POLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No 1.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101063306	16/06/2025	10/03/2026	$39,752,212.22
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			16/06/2025	10/11/2028	$19,876,106.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			16/06/2025	17/10/2030	$79,504,424.44
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101251133	16/06/2025	10/11/2025	$284,700,000.00

Tabla 9 Póliza de obra según firma acta suspensión y reinicio No 1.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL

Para el contrato de obra No. 141 de 2025, no se estipuló la entrega de recursos por concepto de anticipo.

7.2. BALANCE FINANCIERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO

Para el contrato de obra No. 141 de 2025, no se estableció la entrega de recursos en calidad de anticipo, por ende, no aplica y no se requiere el manejo del mismo.

7.3. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha, se efectúo el pago que corresponde al acta parcial No. 1del contrato de obra 141 de 2025.

8. ASPECTOS TECNICOS

8.1. ALCANCE DEL CONTRATO

8.1.1. Condiciones iniciales

CANTIDADES CONTRACTUALES							
ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNDIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES							
1,1	201.4.2.3 INVIAS - 2022		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDO / ASFALTICO	M2	531,58	$ 18.000,00	$ 9.568.440,00
						SUBTOTAL PRELIMINARES	**$ 9.568.440,00**
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2,1	210.1.1 INVIAS - 2022	ICCU V. 2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	36,34	$ 15.000,00	$ 545.100,00
2,2	600.1.2.1 INVIAS - 2022	ICCU V. 2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	397,28	$ 35.000,00	$ 13.904.800,00
2,3	210-07	ICCU V. 2.10	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRODE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	68,84	$ 108.000,00	$ 7.434.720,00
2,4	600 INVIAS 2022	ICCU V. 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,74	$ 80.000,00	$ 2.299.200,00
2,5	610 - 2022	ICCU C. 16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,19	$ 38.000,00	$ 463.220,00
						SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS	**$ 24.647.040,00**
3. ESTRUCTRURA DE VIA							
3,1	321-11 IDU	ICCU V. 3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	154,88	$ 184.000,00	$ 28.497.920,00
3,2	330-INVIAS 2022	ICCU V. 3.2	BASE GRANULAR	M3	137,65	$ 265.000,00	$ 36.477.250,00
3,3	673 - 2022	ICCU V. 4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	734,22	$ 16.896,00	$ 12.405.361,12
3,4	673 - 2022	ICCU V. 4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	189,52	$ 13.471,00	$ 2.553.023,92
3,5	673.1 - 2022	ICCU V. 4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17,79	$ 209.448,00	$ 3.726.079,92
3,6	663 - 2022		TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	94,26	$ 84.000,00	$ 7.917.840,00
3,7	5010 INVIAS 2022		CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-42, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	117,23	$ 1.204.000,00	$ 141.144.920,00
3,8	640 INVIAS 2022	ICCU V. 4.52	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 4200 Mpa	KG	648,69	$ 10.000,00	$ 6.486.900,00
3,9	EC - 301 EAAB	ICCU U. 4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	4,00	$ 271.000,00	$ 1.084.000,00

3,10	EC - 302 EAAB	ICCU U. 4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UND	4,00	$ 3.874.000,00	$ 15.496.000,00
3,11	672 - 2022	ICCU U. 5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	94,26	$ 176.200,00	$ 16.608.612,00
3,12	630.4	ICCU V. 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	3,51	$ 1.008.000,00	$ 3.538.080,00
3,13	672 - 2022	ICCU U. 5.13	SARDINEL FUNDIDO IN SITU H=0.20 M E=0.15 M CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	94,26	$ 52.360,00	$ 4.935.453,60
3,14	672 - 2022		BAJO RAMPA PREFABRICADO A-85.	ML	29,05	$ 95.693,00	$ 2.779.881,65
3,15	672 - 2022	ICCU U. 6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80.	ML	25,54	$ 125.000,00	$ 3.192.500,00
3,16	700 - 2022	ICCU V. 5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	280,78	$ 7.000,00	$ 1.965.460,00
						SUBTOTAL ESTRUCTURA DE VIA	**$ 288.809.302,21**
						VALOR TOTAL	**$ 323.024.782,21**

Tabla 10 Condiciones iniciales.

8.1.2. Condiciones actualizadas balance mayores y menores convenio ICCU 780- 2024

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION	UND	CAN. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE MAYORES Y MENORES		CANT.	VALOR TOTAL
								CANT.	V. TOTAL		
1. PRELIMINARES											
1	1.1	201.4.2.3 INVIAS - 2022	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDO / ASFALTICO	M2	531.58	$ 18,000.00	$ 9,568,440.00	56.34	$ 1,014,120.00	587.92	$ 10,582,560.00
									SUBTOTAL PRELIMINARES		**$ 10,582,560.00**
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS											
2	2.1	210.1.1 INVIAS - 2022ICCU V. 2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	36.34	$ 15,000.00	$ 545,100.00	-36.34	-$ 545,100.00	0.00	$ -
3	2.2	600.1.2.1 INVIAS - 2022ICCU V. 2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	397.28	$ 35,000.00	$ 13,904,800.00	45.24	$ 1,583,400.00	442.52	$ 15,488,200.00
4	2.3	210-07ICCU V. 2.10	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRODE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	68.84	$ 108,000.00	$ 7,434,720.00	-68.84	-$ 7,434,720.00	0.00	$ -
5	2.4	600 INVIAS 2022ICCU V. 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28.74	$ 80,000.00	$ 2,299,200.00	19.62	$ 1,569,600.00	48.36	$ 3,868,800.00
6	2.5	610 - 2022ICCU C. 16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12.19	$ 38,000.00	$ - 463,220.00	4.74	$ 180,120.00	16.93	$ 643,340.00
									SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS		**$ 20,000,340.00**
3. ESTRUCTRURA DE VIA											
7	3.1	321-11 IDUICCU V. 3.22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	154.88	$ 184,000.00	$ 28,497,920.00	15.62	$ 2,874,080.00	170.50	$ 31,372,000.00
8	3.2	330-INVIAS 2022ICCU V. 3.2	BASE GRANULAR	M3	137.65	$ 265,000.00	$ 36,477,250.00	32.64	$ 8,649,600.00	170.29	$ 45,126,850.00
9	3.3	673 - 2022ICCU V. 4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	0.00	734.22	$ 16,896.00	$ 12,405,381.12	-73.59	-$ 1,243,376.64	660.63	$ 11,162,004.48
10	3.4	673 - 2022ICCU V. 4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	189.52	$ 13,471.00	$ 2,553,023.92	-79.12	-$ 1,065,825.52	110.40	$ 1,487,198.40
11	3.5	673.1 - 2022ICCU V. 4.22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17.79	$ 209,448.00	$ 3,726,079.92	-8.96	-$ 1,876,654.08	8.83	$ 1,849,425.84

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

12	3.6	663 - 2022	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	94.26	$ 84,000.00	$ 7,917,840.00	-39.06	-$ 3,281,040.00	55.20	$ 4,636,800.00
13	3.7	5010 INVIAS 2022	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-42, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	117.23	$ 1,204,000.00	$ 141,144,920.00	14.78	$ 17,795,120.00	132.01	$ 158,940,040.00
14	3.8	640 INVIAS 2022ICCU V. 4.52	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 4200 Mpa	KG	648.69	$ 10,000.00	$ 6,486,900.00	-269.772	-$ 2,697,721.68	378.92	$ 3,789,178.32
15	3.9	EC - 301 EAABICCU U. 4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	4.00	$ 271,000.00	$ 1,084,000.00	-2.00	-$ 542,000.00	2.00	$ 542,000.00
16	3.1	EC - 302 EAABICCU U. 4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UND	4.00	$ 3,874,000.00	$ 15,496,000.00	-4.00	-$ 15,496,000.00	0.00	$ -
17	3.11	672 - 2022ICCU U. 5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	94.26	$ 176,200.00	$ 16,608,612.00	55.36	$ 9,754,432.00	149.62	$ 26,363,044.00
18	3.12	630.4ICCU V. 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	3.51	$ 1,008,000.00	$ 3,538,080.00	-3.51	-$ 3,538,080.00	0.00	$ -
19	3.13	672 - 2022ICCU U. 5.13	SARDINEL FUNDIDO EN SITU H=0.20 M E=0.15 M CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	94.26	$ 52,360.00	$ 4,935,453.60	-94.26	-$ 4,935,453.60	0.00	$ -
20	3.14	672 - 2022	BAJO RAMPA PREFABRICADO A-85.	ML	29.05	$ 95,693.00	$ 2,779,881.65	2.64	$ 252,629.52	31.69	$ 3,032,511.17
21	3.15	672 - 2022ICCU U. 6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80.	ML	25.54	$ 125,000.00	$ 3,192,500.00	-8.79	-$ 1,098,750.00	16.75	$ 2,093,750.00
22	3.16	700 - 2022ICCU V. 5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	280.78	$ 7,000.00	$ 1,965,460.00	11.66	$ 81,620.00	292.44	$ 2,047,080.00
										SUBTOTAL ESTRUCTURA DE VIA	**$ 292,441,882.21**
VALOR TOTAL							**$ 323,024,782.21**				**$ 323,024,782.21**

Tabla 11 Condiciones actualizadas balance mayores y menores convenio ICCU 780- 2024.

8.1.3. Recursos adición alcaldía municipio de la vega

RECURSOS ADICION ALCADIA MUNICIPIO DE LA VEGA												
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ITEM PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CAN. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ADICION		CANT.	V. TOTAL
									CANT.	V. TOTAL		
1	1.1	201.4.2.3 INVIAS - 2022	1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDO / ASFALTICO	M2	0.00	$ 18,000.00	$ -	60.99	$ 1,097,820.00	60.99	$ 1,097,820.00
2	2.1	210.1.1 INVIAS - 2022ICCU V. 2.1	2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	0.00	$ 15,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
3	2.2	600.1.2.1 INVIAS - 2022ICCU V. 2.9	2.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 35,000.00	$ -	118.15	$ 4,135,250.00	118.15	$ 4,135,250.00
4	2.3	210-07ICCU V. 2.10	2.3	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRODE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 108,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5	2.4	600 INVIAS 2022ICCU V. 2.13	2.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ 80,000.00	$ -	1.08	$ 86,400.00	1.08	$ 86,400.00
6	2.5	610 - 2022ICCU C. 16.7	2.5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0.00	$ 38,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
7	3.1	321-11 IDUICCU V. 3.22	3.1	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	0.00	$ 184,000.00	$ -	88.88	$ 16,353,920.00	88.88	$ 16,353,920.00
8	3.2	330-INVIAS 2022ICCU V. 3.2	3.2	BASE GRANULAR	M3	0.00	$ 265,000.00	$ -	18.30	$ 4,849,500.00	18.30	$ 4,849,500.00
9	3.3	673 - 2022ICCU V. 4.46	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	0.00	0.00	$ 16,896.00	$ -	82.38	$ 1,391,892.48	82.38	$ 1,391,892.48
10	3.4	673 - 2022ICCU V. 4.40	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0.00	$ 13,471.00	$ -		$ -	0.00	$ -
11	3.5	673.1 - 2022ICCU V. 4.22	3.5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0.00	$ 209,448.00	$ -		$ -	0.00	$ -
12	3.6	663 - 2022	3.6	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	0.00	$ 84,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
13	3.7	5010 INVIAS 2022	3.7	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-42, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	0.00	$ 1,204,000.00	$ -	12.97	$ 15,615,880.00	12.97	$ 15,615,880.00
14	3.8	640 INVIAS 2022ICCU V. 4.52	3.8	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 4200 Mpa	KG	0.00	$ 10,000.00	$ -	139.318	$ 1,393,182.60	139.32	$ 1,393,182.60
15	3.9	EC - 301 EAABICCU U. 4.13	3.9	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	0.00	$ 271,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

16	3.1	EC - 302 EAABICCU U. 4.9	3.1	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UND	0.00	$ 3,874,000.00	$ -		$ -	0.00	$ -
17	3.11	672 - 2022ICCU U. 5.15	3.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	0.00	$ 176,200.00	$ -	5.43	$ 956,766.00	5.43	$ 956,766.00
18	3.12	630.4ICCU V. 4.6	3.12	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	0.00	$ 1,008,000.00	$ -	14.05	$ 14,162,400.00	14.05	$ 14,162,400.00
19	3.13	672 - 2022ICCU U. 5.13	3.13	SARDINEL FUNDIDO EN SITU H=0.20 M E=0.15 M CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	0.00	$ 52,360.00	$ -		$ -	0.00	$ -
20	3.14	672 - 2022	3.14	BAJO RAMPA PREFABRICADO A-85.	ML	0.00	$ 95,693.00	$ -		$ -	0.00	$ -
21	3.15	672 - 2022ICCU U. 6.8	3.15	BORDILLO PREFABRICADO A-80.	ML	0.00	$ 125,000.00	$ -	3.92	$ 490,000.00	3.92	$ 490,000.00
22	3.16	700 - 2022ICCU V. 5.1	3.16	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	0.00	$ 7,000.00	$ -	1,581.00	$ 11,067,000.00	1581.00	$ 11,067,000.00
ITEMS NO PREVISTOS												
23	NP-1	ICCU U. 4.3	NP-1	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	0.00	1,448,664.46	$ -	2.00	$ 2,897,328.92	2.00	$ 2,897,328.92
VALOR TOTAL								**$ 323,024,782.21**		**$ 74,497,340.00**		**$ 397,522,122.21**

Tabla 12 Recursos adición alcaldía municipio de la Vega.

.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO, PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

MES	RECURSOS SEGÚN PROGRAMACION	%	RECURSOS EJECUTADOS	%	RECURSOS PROGRAMADOS ACUMULADO	%	RECURSOS EJECUTADO ACUMULADO	%
1	$ 72,793,750.83	18.31%	$ 38,271,128.44	9.63%	$ 72,793,750.83	18.31%	$ 38,271,128.44	9.63%
2	$ 69,688,135.16	17.53%	$ 110,449,878.17	27.78%	$ 142,481,885.99	35.84%	$ 148,721,006.61	37.41%
3	$ 149,193,323.72	37.53%	$ 99,644,998.18	25.07%	$ 291,675,209.71	73.37%	$ 248,366,004.79	62.48%
4	$ 105,846,912.50	26.63%	$ 138,340,924.78	34.80%	$ 397,522,122.21	100%	$ 386,706,929.57	97.28%

Tabla 13 Balance Financiero, programado vs ejecutado.

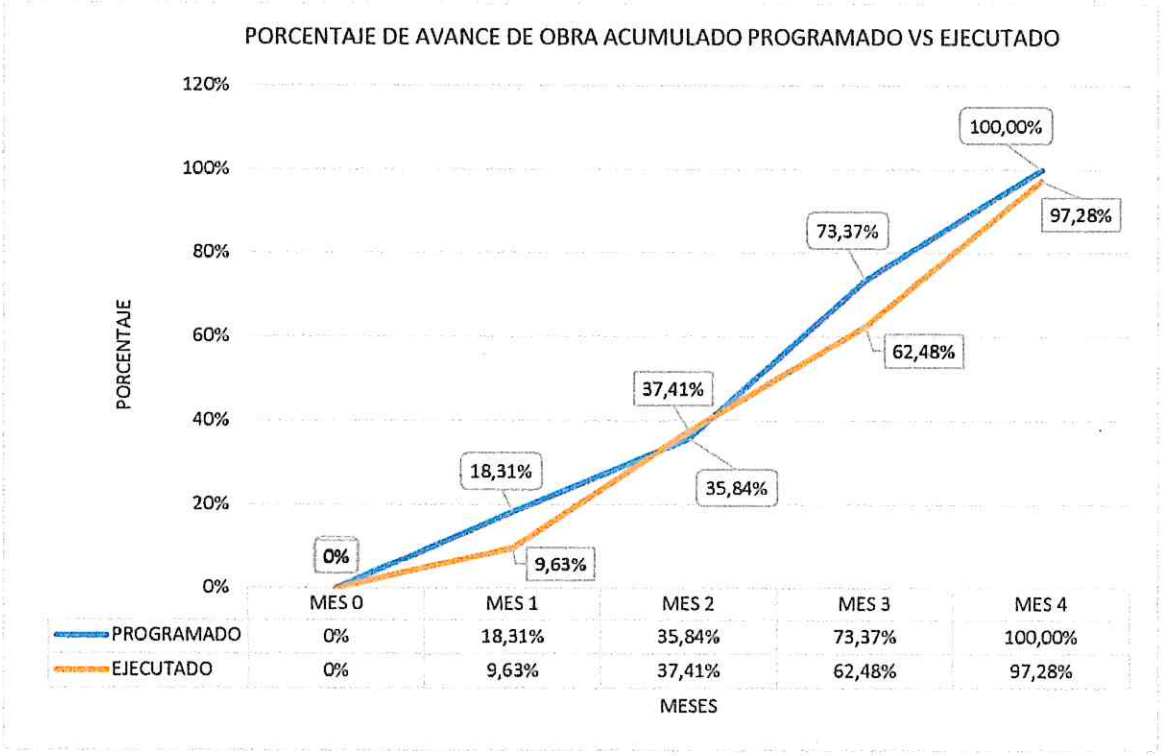


Gráfico 2 Porcentaje de avance de obra acumulado programado vs ejecutado.

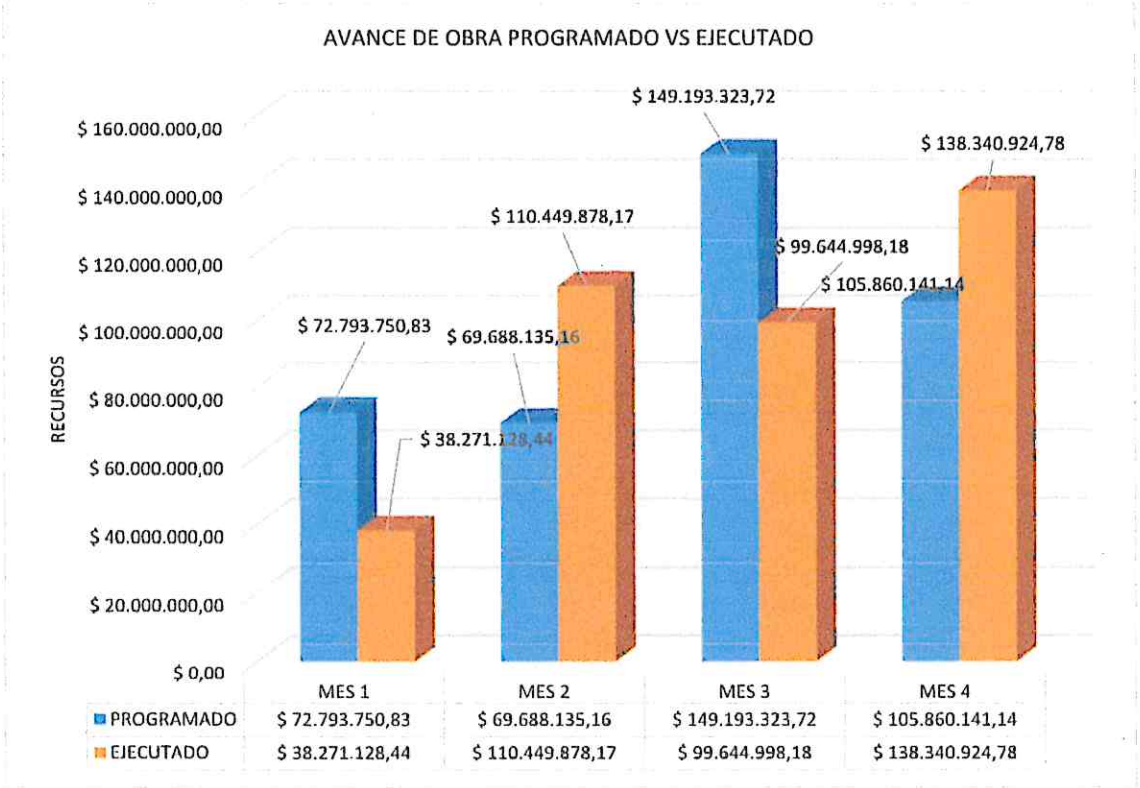


Gráfico 3 Avance de ejecución del contrato.

De acuerdo con los gráficos 1 y 2, correspondientes al avance de ejecución del contrato durante los periodos comprendidos entre el 16 de septiembre al 10 de octubre de 2025 y el 5 de noviembre al 10 de noviembre de 2025, se había estimado un progreso del 26.63%, equivalente a $105,846,912.50. No obstante, la ejecución alcanzó el 34.80%, correspondiente a $138,340,924.78. Este resultado refleja un avance adicional del 8.17%, lo que representa una diferencia positiva de $ 32,494,012.28 respecto a lo programado.

A la fecha, se registra un avance acumulado del 97.28% con un valor ejecutado de $386,706,929.57, quedando un saldo a favor del municipio de $10,815,192.64 que equivale al 2.72%.

9. AVANCE DE OBRA

A continuación, se muestra la descripción y registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante este periodo:

1. EXCAVACIONES Y RELLENOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD MODIF. No 1	PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUCION ACUMULADA
2.5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	16.93	16.93	12.89	12.91	25.80	100%





Para el confinamiento de los sardinales se utilizó material de relleno proveniente de la excavación.

2. ESTRUCTRURA DE VIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD MODIF. No 1	PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUCION ACUMULADA
3.7	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-42, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	132.01	144.98	38.50	89.87	127.37	88.54%





Se llevó a cabo la instalación de concreto MR, el cual fue vaciado y extendido conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El proceso incluyó la preparación y limpieza de la superficie de apoyo, la colocación del concreto en capas, compactación y acabado requerido.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD MODIF. No 1	PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUCION ACUMULADA
3.8	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 4200 Mpa	KG	378.92	518.24	180.16	800.64	980.80	100%





Se utilizó acero de refuerzo de 1/2" en las losas irregulares, con el fin de garantizar la estabilidad estructural.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD MODIF. No 1	PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUCION ACUMULADA
3.16	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	280.78	1873.44	0.00	1857.60	1857.60	99.15%





Se realizó la instalación de tres (3) líneas de demarcación horizontal mediante la aplicación de pintura en frío, correspondientes a dos (2) líneas de color blanco y una (1) línea de color amarillo, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

10. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

El presente informe tiene como propósito registrar las actividades ejecutadas durante los periodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre de 2025, así como del 5 al 10 de noviembre de 2025. Durante estos periodos se realizaron labores de vaciado de concreto MR, figurado de acero de refuerzo de 1/2", instalación de líneas de demarcación y relleno con material proveniente de excavación para el confinamiento de sardineles.

Durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Se continuó con la actividad de instalación de concreto tipo MR, el cual fue vaciado, extendido, nivelado y compactado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el adecuado espesor, alineación y acabado superficial requeridos para su correcto desempeño.

Se utilizo acero de refuerzo de 1/2" en las losas irregulares, posteriormente se realizó el vaciado del concreto tipo MR en estas zonas, se verificó la correcta disposición del refuerzo conforme a los planos aprobados.

Una vez finalizado el vaciado del concreto se realizó el corte y la limpieza de las juntas de dilatación, dejándolas en condiciones óptimas para la posterior instalación del cordón de poliuretano y la aplicación del sellador de juntas.

Se utilizó material proveniente de la excavación para el confinamiento de los sardineles y el relleno de las zonas peatonales.

Para la instalación de la demarcación horizontal, se solicitó una suspensión por un periodo de veintiséis (26) días, debido a que la ficha técnica de la pintura utilizada

recomienda su aplicación únicamente sobre pavimentos nuevos en concreto rígido después de cumplidos los veintiocho (28) días de curado, con el fin de garantizar su adecuada adherencia y durabilidad. Una vez cumplido el tiempo de curado, se procedió a la instalación de la demarcación, conformada por tres (3) líneas: dos (2) de color blanco para delimitar los bordes externos de los carriles y una (1) de color amarillo para la separación de los carriles.

11. ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES

Durante la ejecución de las actividades descritas, se dio cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a las disposiciones legales establecidas en el contrato de obra, garantizando el desarrollo de las labores de manera responsable y sostenible.

En materia ambiental, se implementaron las medidas de manejo definidas por el contrato para el acopio temporal y disposición final de los materiales sobrantes y producto de demolición en el lugar designado por el municipio. Asimismo, se evitó la afectación de cuerpos de agua y zonas verdes aledañas, empleando barreras físicas y controles para mitigar el arrastre de sedimentos y materiales particulados.

Se realizaron controles para minimizar la emisión de polvo y material particulado mediante riego periódico en las zonas de trabajo, así como el mantenimiento preventivo de la maquinaria para reducir las emisiones contaminantes. Igualmente, se controló la generación de ruido, limitando el uso de equipos de alta potencia a horarios permitidos y garantizando el bienestar de la comunidad vecina.

12. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales granulares serán suministrados por la mina INCOMINERÍA, la cual cuenta con los respectivos permisos ambientales y título minero vigentes. Dispone de los certificados de calidad de la base granular y del rajón requeridos para el

proyecto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el diseño.

El geotextil T-2400 utilizado en la obra cumple con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, como elemento de separación. El cemento empleado en la preparación del concreto de 3.000 psi, así como los sardineles prefabricados tipo A-10 y A-85, cuentan con sus respectivos certificados de calidad, los cuales respaldan el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la correcta ejecución de la obra. Se anexan los certificados de calidad y las fichas técnicas correspondientes a todos los materiales mencionados, con el fin de respaldar su conformidad y asegurar su adecuado desempeño durante la vida útil de la infraestructura.

Los concretos tipo MR fueron suministrados por la empresa POLIMIX, garantizando el cumplimiento de las características técnicas exigidas para un concreto MR conforme a la especificación INVÍAS. Durante el suministro y la colocación se realizó el control de calidad correspondiente, incluyendo la verificación de asentamiento y la toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio, con el fin de comprobar el cumplimiento de la resistencia a flexión y demás parámetros técnicos requeridos.

13. PERSONAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre, se contó en la obra con el personal mínimo requerido según lo establecido en el contrato, conformado por el director, residente de obra y maestro, además de la mano de obra no calificada necesaria para el desarrollo de las actividades. Todo el personal vinculado al proyecto estuvo debidamente afiliado a los sistemas de riesgos laborales (ARL), salud (EPS) y pensión (FSP), garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social.

Se elaboró y presentó el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se describen las acciones implementadas, las medidas preventivas y correctivas

adoptadas, así como la gestión desarrollada en obra para velar por el bienestar y la integridad de todos los trabajadores durante el periodo señalado.

PLANILLA SEPTIEMBRE			
CARGO	**NOMBRE**	**CEDULA**	**PLANILLA**
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	1.070.960.963	1084532584
RESIDENTE DE OBRA	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO	1.020.797.397	1084532584
MAESTRO	SERVANDO MONSALVE MANRIQUE	79.244.156	9491277754
TOPOGRAFO	LEONARDO OSPINA TOVAR	1.121.914.547	1084532584
AYUDANTE	JOSE IVAN LEON URREGO	11.447.549	1084532584
AYUDANTE	JORGE ALEXANDER CASTIBLANCO LOPEZ	3.059.476	1084532584

Tabla 14 Resumen planilla de pago obra septiembre.

PLANILLA OCTUBRE			
CARGO	**NOMBRE**	**CEDULA**	**PLANILLA**
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	1.070.960.963	1081366253
RESIDENTE DE OBRA	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO	1.020.797.397	1081366253
MAESTRO	SERVANDO MONSALVE MANRIQUE	79.244.156	9492683620
TOPOGRAFO	LEONARDO OSPINA TOVAR	1.121.914.547	1081366253
AYUDANTE	JOSE IVAN LEON URREGO	11.447.549	1081366253
AYUDANTE	JORGE ALEXANDER CASTIBLANCO LOPEZ	3.059.476	1081366253

Tabla 15 Resumen planilla de pago obra octubre.

PLANILLA NOVIEMBRE			
CARGO	**NOMBRE**	**CEDULA**	**PLANILLA**
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	1.070.960.963	1081367410
RESIDENTE DE OBRA	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO	1.020.797.397	1081367410
MAESTRO	SERVANDO MONSALVE MANRIQUE	79.244.156	9494168516
TOPOGRAFO	LEONARDO OSPINA TOVAR	1.121.914.547	1081367410
AYUDANTE	JOSE IVAN LEON URREGO	11.447.549	1081367410
AYUDANTE	JORGE ALEXANDER CASTIBLANCO LOPEZ	3.059.476	1081367410

Tabla 16 Resumen planilla de pago obra noviembre.

14. EQUIPO DE OBRA

En la tabla que se presenta a continuación, se establece de forma general el equipo y la maquinaria utilizados para llevar a cabo las actividades correspondientes al contrato.

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD
Retroexcavadora	Rellenos zonas peatonales y sardineles.
Vibro de concreto	Concreto MR
Cortadora de concreto	Juntas de dilatación
Pulidora	Corte de acero

15. CONTROL DEL CLIMA

AGOSTO – SEPTIEMBRE 2025																														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SOLEADO	✓	O	✓	✓				✓	O		✓				✓	O	✓	✓		✓	✓	✓	O		✓		✓	X		O	✓
NUBLADO					✓	✓						✓	✓	✓					X					✓		X			✓		
PRE/CIÓN. BAJA							X			X																					
PRE/CIÓN MEDIA																															
PRE/CIÓN ALTA																															

✓Todo el día X Medio día O Fuera de horario laboral

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2025																															
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SOLEADO		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓					
NUBLADO	X						X								X			X					X								
PRE/CIÓN. BAJA																															
PRE/CIÓN MEDIA																															
PRE/CIÓN ALTA																															

✓Todo el día X Medio día O Fuera de horario laboral

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

NOVIEMBRE																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO					✓	✓	✓	✓	O	✓																				
NUBLADO																														
PRE/CIÓN. BAJA																														
PRE/CIÓN MEDIA																														
PRE/CIÓN ALTA																														

✓Todo el día X Medio día O Fuera de horario laboral

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

37

16. CONCLUSIONES

durante los periodos comprendidos entre el 16 de septiembre al 10 de octubre de 2025 y el 5 de noviembre al 10 de noviembre de 2025, se evidencia un avance superior del 8.17% respecto a lo programado, equivalente a $ 32,494,012.28. Refleja una ejecución del 34.80% frente a un 26.63% proyectado. No obstante, al corte del presente informe, el avance acumulado alcanza el 97.28%, con un valor ejecutado de $386,706,929.57, quedando un saldo a favor del municipio que corresponde al 2.72%, equivalente a $10,815,192.64.

Durante el período evaluado se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas, destacándose el vaciado de concreto MR, figurado de acero de refuerzo de 1/2", instalación de líneas de demarcación y relleno con material proveniente de excavación, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto y la normativa aplicable.

El concreto tipo MR suministrado por la empresa POLIMIX cumplió con las características exigidas por la especificación INVÍAS, garantizando la resistencia, durabilidad y desempeño estructural del pavimento, respaldado mediante los respectivos controles de calidad y ensayos de laboratorio.

La instalación de acero de refuerzo figurado de 1/2" en las losas irregulares permitió mejorar el comportamiento estructural del pavimento, asegurando una adecuada distribución de esfuerzos y control de fisuración en zonas con geometrías especiales.

La instalación de la demarcación vial se realizó respetando los tiempos de curado del pavimento, atendiendo las recomendaciones de la ficha técnica de la pintura utilizada, lo cual garantiza la adherencia, durabilidad y correcta visibilidad de las líneas de demarcación.

En términos generales, las actividades ejecutadas durante el período reportado presentan un adecuado nivel de calidad técnica, cumplimiento normativo y coherencia con el cronograma establecido, aportando al avance satisfactorio del proyecto.

Firma:

ING. MARIO FERNANDO RUBIANO
R.L. CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025
Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

17. ANEXOS

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

ACTAS ADMINISTRATIVAS

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 600073475-1

1131

ACTA DE SUSPENSION
CONTRATO DE OBRA No.141-2025

CONTRATO DE OBRA	No. 141 del 2025
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 NIT. 901.924.708-1 R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA C.C. No. 1.019.068.674 DE BOGOTÁ D.C
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
DURACIÓN:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (323.024.782,21) M/CTE incluido IVA
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR:	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS

MODIFICATORIOS, ADICIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

MODICATORIO	SI
FECHA DE MODIFICATORIO	25 DE AGOSTO DE 2025
ADICION EN VALOR:	SI
VALOR ADICION CONTRATO:	$ 74.497.340,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 397.522.122,21
FECHA DE LA ADICION:	25 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	NO APLICA
TIEMPO DE PRORROGA	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	26 DIAS CALANDARIO
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSION:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los diez (10) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca la arquitecta LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO como Secretaria de Planeación e Infraestructura y supervisor del Municipio, el doctor LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ como Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, la señora INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía 1.069.100.571 de Nemocón, representante Legal de AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS identificado con NIT 900.446.649-9 en condición de Interventor y el señor MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.068.674 de Bogotá, representante legal de CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 identificado con NIT No. 901.924.708-1 en condición de contratista, con el fin de dejar constancia de la suspensión del contrato de obra No. C-OBRA-No. 141-2025, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

- Que se recibe solicitud y aval de suspensión por parte de la interventoría con el numero de radicado N°20251105850 de fecha 09 de octubre de 2025
- Que la interventoría en su comunicado CTO.179-2025-141-041 de fecha 09 de octubre de 2025 indica lo siguiente

Según las especificaciones técnicas del fabricante del material de demarcación y conforme a las buenas prácticas constructivas establecidas en la normativa vigente, es indispensable respetar un periodo mínimo de 28 dias de curado del concreto antes de proceder con la aplicación de pintura. Este tiempo es necesario para permitir que el concreto alcance un nivel adecuado de resistencia y estabilidad, reduciendo el riesgo de desprendimiento prematuro de la capa de pintura y garantizando asi un desempeño óptimo del producto durante su vida útil.

La aplicación prematura del producto sobre una superficie que no ha completado su proceso de curado podría afectar negativamente la adherencia del mismo, comprometiendo la calidad de la señalización vial y generando posibles sobrecostos por intervenciones correctivas a corto plazo

- Que, a la fecha, se encuentran ejecutadas y terminadas todas las actividades del objeto contractual relacionadas con la instalación de concreto MR y la estructura de la vía.
- Que, actualmente, la única actividad pendiente corresponde a la instalación de la demarcación horizontal.
- Que, de acuerdo con la ficha técnica de la pintura acrílica base solvente a utilizar, se recomienda que en concretos nuevos se cumpla un período mínimo de 28 días de fraguado antes de proceder con la aplicación de la señalización.
- Que, en tal sentido, resulta técnicamente inviable ejecutar la demarcación de inmediato, pues ello podría afectar la calidad, durabilidad y vida útil de la pintura y del concreto mismo.
- Que se solicita por parte del contratista e interventoría un término de suspensión de 26 días calendario a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas y proceder a culminar los trabajos de demarcación horizontal una vez transcurra el tiempo de fraguado establecido.

Por los considerandos anteriores se procede a suspender el contrato por el tiempo solicitado.

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de octubre de 2025.

ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

DR. LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

Lorena Gomez

AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS R.L. INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Interventor

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025
R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
Contratista

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ACTA DE REINICIO
CONTRATO DE OBRA No.141-2025

CONTRATO DE OBRA	No. 141 del 2025
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 NIT. 901.924.708-1 R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA C.C. No. 1.019.068.674 DE BOGOTÁ D.C
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
DURACIÓN:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (323.024.782,21) M/CTE incluido IVA
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR:	AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS

MODIFICATORIOS, ADICIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

MODICATORIO	SI
FECHA DE MODIFICATORIO	25 DE AGOSTO DE 2025
ADICION EN VALOR:	SI
VALOR ADICION CONTRATO:	$ 74.497.340,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 397.522.122,21
FECHA DE LA ADICION:	25 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	NO APLICA
TIEMPO DE PRORROGA	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	26 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSION:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca la arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** como Secretaria de Planeación e Infraestructura y supervisor del Municipio, el doctor **LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ** como

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT. 800073475-1

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, la señora **INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía 1.069.100.571 de Nemocón, representante Legal de **AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS** identificado con NIT 900.446.649-9 en condición de Interventor y el señor **MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.068.674 de Bogotá, representante legal de **CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025** identificado con NIT No. 901.924.708-1 en condición de contratista, con el fin de dejar constancia del reinicio del contrato de obra No. C-OBRA-No. 141-2025

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

DR. LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS R.L. INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Interventor

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025
R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
Contratista

ACTAS DE COMITÉ

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] OBRA [ ]

ACTA No. 12.	FECHA: 24 - Septiembre 2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-141-2025	
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ÍTEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega Informe Mensual 2.	12-09-2025	12 -Sep	Cta Obra.
2	Entrega Informe mensual 3.	22-09-2025	Sin Cumplir.	Cta Obra.
3	Entrega Informe mensual 1.	15-09-2025	16-09-2025	Interventoria.
4	Entrega Certificado materiales	10-09-2025	11-09-2025	Cta Obra.
5	Entrega Modificacion Ajustada	10-09-2025	11-09-2025	Cta Obra
6	Comite Seguimiento.	17-09-2025.	24-Sep-2025	Todas las partes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- Lectura acta Anterior.
- Avance de Obra.
- Proposiciones y Varios.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
ROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 12:00 am se da inicio al comite nº 12. Se inicia el comite de seguimiento y control en el cual hacen presencia las partes contratista de Obra. Supervision e Interventoria.

Lectura Acta Anterior
Se realiza lectura y verificacion de cumplimiento de compromisos para lo cual estos se cumplieron excepto la entrega del informe mensual No 3.

Avance de obra.
- Modulacion de Obra: El
El contratista informa que realizo el envio el dia de ayer la modolacion ajustada conforme a las observaciones realizadas por parte de la interventoria.

la interventoria realizara su respectiva revision Para lo cual emitira el concepto de observaciones y/o aval.

De acuerdo a que si de generan observaciones la interventoria propone realizacion comite virtual para socializar y asi vez subsanadas y de esta forma que el contratista pueda continua con la ejecucion de todas en concreto.

Acta de Terminacion.
El contratista informa que inicia el proceso para presentar el acta de terminacion para lo cual solicita que se remita el check list. la interventoria realizara su respectivo envio.

47

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
ROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

- Programado vs ejecutado.
A la fecha se presenta un 89% de Programado vs el 69% de ejecución.
El contratista informa que realizara la revisión de avance para presentar el acta al 90%

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ÍTEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Observaciones modulacion.	25-09-25	Interventoria.
2	Envio lista de Chequeo	25-09-25	Interventoria
3	Entrega Informe mensual 03.	30-9-2035	Contratista de Obra
4	Comite de Seguimiento	1-Oct-25	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	David Rodriguez Buitrago	Firma
En representación de	Cons. Via centenario 2025	
Correo electrónico	davidrgb24@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Leonardo Ospina Tovar	Firma
En representación de	Consorcio Via centenario	
Correo electrónico	Consorciovia centenario 2025@gmail.com	
Teléfono	312 468 8830	
Nombre	Olga Tellez.	Firma
En representación de	Agricambiental SAS - Interventoria	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Edwing H Albana L.	Firma
En representación de	Secretaria Planeacion	
Correo electrónico	Supervisorvialavega@gmail.com	
Teléfono	3132637700	
Nombre	Laura Galindo	Firma
En representación de	Interventoria. Agroambiental	
Correo electrónico	ourcambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] OBRA [ ]

ACTA No. 13	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-141-2025	
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ÍTEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	OBSERVACIONES MODULACIÓN	25/09/2025	26/09/2025	Interventoría
2	ENVIÓ LISTA DE CHEQUEO	25/09/2025	8/08/2025	Interventoría
3	ENTREGA INFORME MENSUAL 03	30/09/2025	Sin cumplir	Contratista de obra
4	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	1/10/2025	1/10/2025	Todas las partes
5				
6				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
LECTURA ACTA ANTERIOR
AVANCE DE OBRA
PROPOSICIONES Y VARIOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 11:09 am del 10 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 141 2025, en presencia de los profesionales del Contratista de Obra e interventoría

1. Lectura data anterior y verificación compromisos

Ing. Fredy Martínez Interventoría realiza lectura del acta de comité No.12 del 24 de septiembre de 2025 donde se dejaron los compromisos correspondientes.

Se aclara que de los compromisos pactados se encuentra pendiente la entrega del informe mensual 3 por el contratista de obra para lo cual la fecha inicial propuesta estaba para el 22 de septiembre de 2025, donde solicita nuevamente que esta fecha se prorrogue hasta el 02 de octubre de 2025.

2. MODULACIÓN Y REFUERZO DE LOSAS IRREGULARES.

La interventoría informa que el día 26 de septiembre de 2025, se comunico con el contratista de obra con el fin de informar las observaciones a la versión de modulación y refuerzo presentada, donde el especialista de la interventoría Ing Diego Aragón solicito que se dilatara la placa donde se encuentran los pozos con el fin de que esta no quedara con una dimensión superior a los 5 mt según establece la norma, para lo cual el día 27 de septiembre el contratista de obra realizo el envió de la información ajustada, para lo cual el mismo día la interventoría remitió el respectivo aval.

La supervisión solicita que en obra en las fundiciones se debe de contar con la presencia del personal de interventoría, y recomienda que se garanticen los espaciamientos, nivelaciones de las tapas de los pozos.

2. CUENTA DE COBRO

El contratista de obra informa que se encuentra en la elaboración de la cuenta de cobro No,1 correspondiente al 90%, el contratista de obra manifiesta que para el día 6 de octubre realizara su presentación a la interventoría para su aval y tramite correspondiente.

La supervision solicita que se remita inicialmente el acta parcial en medio digital con el fin de revisar cantidades, formulacion y formatos y de esta forma avanzar de forma mas diligente.

3. PROGRAMADO Y EJECUTADO

A la fecha el contratista de obra se encuentra en la ejecución de actividad de figurado y armado de parrillas en acero de refuerzo para las placas de losas irregulares, de acuerdo al aval de modulación entregado por parte de la interventoría.

de acuerdo a lo informado por el contratista de obra el día de mañana jueves 02 de octubre retomara actividades de fundición de losas de concreto para minimizar el atraso, para lo cual únicamente una vez ejecutada esta actividad quedaría pendiente lo correspondiente a la instalación de la señalización.

La interventoría informa que a la fecha se tiene un Ejecutado del 79% en relación a un programado del 97%, donde el porcentaje de atraso existente se nivelara una vez se culmine con la fundición de las losas de concreto en MR.

ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

Teniendo en cuenta la finalización de ejecución de las actividades constructivas las cuales están previstas para finalizar la presente semana, quedando pendiente la instalación de la señalización, se organizara conjuntamente para iniciar con el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, indicando que a la fecha no se ha recibido.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

LISTA DE CHEQUEO

La interventoría informa que el día 08 de agosto de 2025 se remitió al contratista de la lista de chequeo, para lo cual se remitirá a la supervisión para revisión y de esta forma evitar cualquier reproceso en relación al tramite de cuentas.


INFORME MENSUAL No 3

La interventoría solicita que se realice la entrega de forma urgente teniendo en cuenta los periodos, y la necesidad de estos para el tramite de cuentas parciales, ya que estos deben de estar debidamente avalado por parte de la interventoría y aprobado por parte de la supervisión.

INFORME MENSUAL 4 - TERMINACIÓN

la interventoría recomienda al contratista de obra que en el informe mensual se deberá de adjuntar todos los resultados de laboratorio de los concretos.



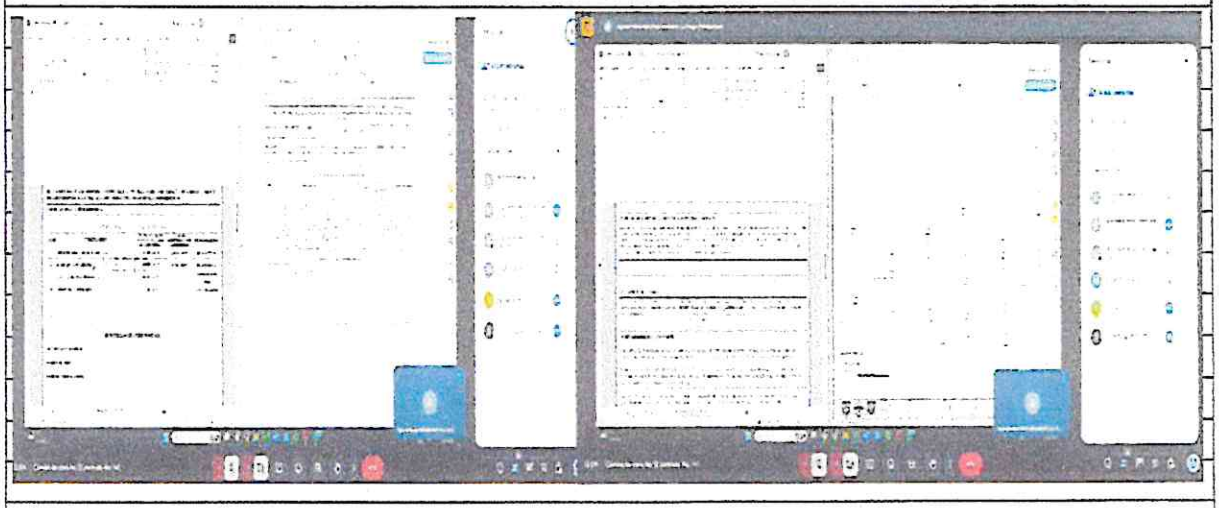

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ÍTEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Presentación informe mensual No.3	2/10/2025	Contratista
2	Programación de comité y seguimiento	8/10/2025	Todas las partes
3	Inicio levantamiento actas de vecindad de cierre	7/10/2025	Contratista de obra e interventoría
4	Presentación de laboratorios de concretos premezclado	Una vez se cumplan los 28 días	Contratista de Obra
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

54

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	David Rodriguez	Firma
En representación de	Consorcio Vía centenario 2025	
Correo electrónico	cgcorcioccentenario2025@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Leonardo Ospina Tovar	Firma
En representación de	Consorcio vía centenario 2025	
Correo electrónico	cgcorcioccentenario2025@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Roció Galindo Castro	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Edwin H Aldana	Firma
En representación de	Apoyo a la supervision alcaldia	
Correo electrónico	supervisionalcaldialavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] OBRA [ ]

ACTA No. 14	**FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-141-2025	
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ÍTEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Presentación informe mensual No.3	2/10/2025	4/10/2025	Contratista
2	Programación de comité y seguimiento	8/10/2025	9/08/2025	Todas las partes
3	Inicio levantamiento actas de vecindad de cierre	7/10/2025	Sin Iniciar	Contratista de obra e
4	Presentación de laboratorios de concretos premezclado	Una vez se cumplan los 28 días	1/10/2025	Contratista de Obra
5				
6				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
LECTURA ACTA ANTERIOR
EJECUCION ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
PROPOSICIONES Y VARIOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 11:12 am am del 09 de octubre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 141-2025, en presencia de los profesionales del Contratista de Obra e interventoría

1. Lectura data anterior y verificación compromisos

Ing. Fredy Martínez Interventoría realiza lectura del acta de comité No.13 del 09 de octubre de 2025 donde se dejaron los compromisos correspondientes.
Se aclara que de los compromisos pactados se encuentra pendiente el inicio del levantamiento de as actas de vecindad de cierre.

2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES.

De acuerdo a que el contratista de obra ya culmino con las actividades de concreto, a la fecha se encuentra pendiente unicamente la instalacion de la señalizacion en pintura, para lo cual, se menciona en comite que, esta actividad como ya se habia mencionado con anterioridad se debe de ejecutar 21 dias despues de finbalizada la fundicion de concretos de acuerdo a recomendacion de la ficha tecnica, ya que es con el fin de garantizar su durabilidad y garantia, por lo anterior, el contratista manifiesta que realizara la evaluacion para contemplar una suspension al contrato y de esta forma cumplir con las actividades en el plazo contractual.

La viabilidad de una suspension es viable por las partes involucradas de acuerdo al desarrollo del comité, sin embargo la supervision reitera que en caso de presentar una solicitud de suspension de acuerdo a los plazos contractuales a mas tardar se podra el dia de mañana 10 de octubre de 2025.

2. CUENTA DE COBRO


El contratista manifiesta que el dia de hoy realizara el envio de la documentacion para el tramite de la cuenta parcial No,1, para revision de la interventoria, sin embargo consulta si la solicitud de suspension puede afectar la solicitud y tramite de pago del acta parcial No,1

La supervision informa que para que no se vean afectados los tramites de actas estas se deben de radicar debidamente avaladas por la interventoria con antelacion a la solicitud de suspension, recordando que los tramites se tramitan en secop 2 en horario laboral.

Asi mismo la supervision informa que el dia de hoy 09 de octubre de 2025, remitio a la supervision el check list revisado para los tramites de las cuentas y liquidacion del contrato.

ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

Teniendo en cuenta la finalización de ejecución de las actividades constructivas las cuales estén previstas para finalizar la presente semana, quedando pendiente la instalación de la señalización, se reorganizara conjuntamente para iniciar con el levantamiento de las actas de vecindad de cierre.

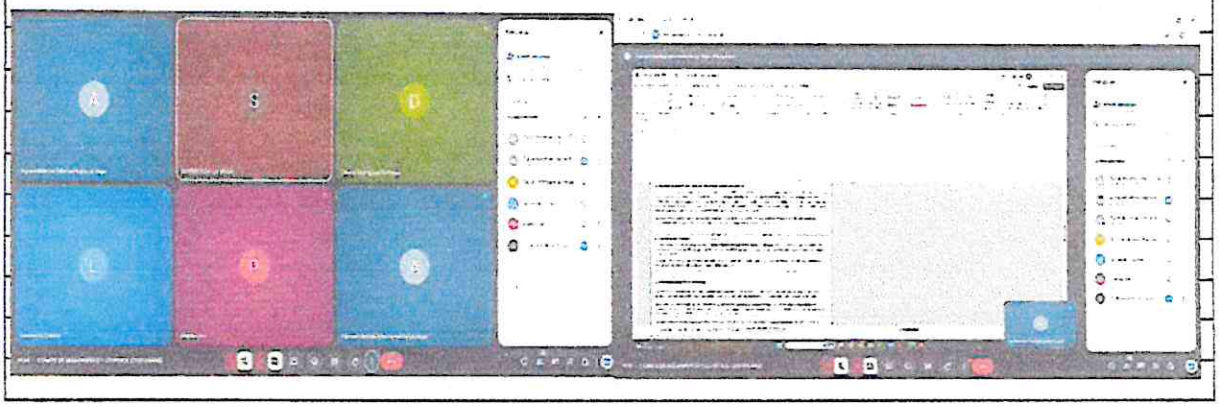

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ÍTEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Presentación acta parcial	9/10/2025	Contratista
2	Inicio levantamiento actas de vecindad de cierre	Reprogramar	Contratista de obra e interventoría
3	Presentación de laboratorios de concretos premezclado	Una vez se cumplan los 28 días	Contratista de Obra
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	David Rodriguez	Firma
En representación de	Consorcio Vía centenario 2025	
Correo electrónico	cconsorciocentenario2025@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Leonardo Ospina Tovar	Firma
En representación de	Consorcio vía centenario 2025	
Correo electrónico	cconsorciocentenario2025@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Roció Galindo Castro	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martínez	Firma
En representación de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo electrónico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Edwin H Aldana	Firma
En representación de	Apoyo a la supervision alcaldia	
Correo electrónico	supervisionalcaldialavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Teléfono		
Correo electrónico		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 23 de septiembre de 2025 OCVC. 141-2025-022

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO NO. OCT 179-2025-141-029 – OBSERVACIONES SOBRE MODULACIÓN DE LOSAS

Cordial saludo,

En atención al Oficio No. OCT 179-2025-141-029, mediante el cual la Interventoría presenta observaciones a la modulación de losas de pavimento rígido, me permito dar respuesta a las mismas:

1. Respecto al refuerzo en losas irregulares
Tras la revisión de la modulación, se ha efectuado la verificación de dimensiones de las losas y se ajustó la localización del refuerzo únicamente a aquellas losas que, por su geometría, exceden las dimensiones regulares de diseño (3.00 m de largo por 2.75 m de ancho). De esta forma, se ha eliminado la propuesta de refuerzo en losas que no lo requieren y se ha mantenido únicamente en aquellas que presentan sobreancho o variaciones que justifican el uso de parrilla de acero, garantizando la estabilidad y desempeño de la estructura.

2. Respecto a la precisión en dimensiones de placas no irregulares
Se ha actualizado la modulación de manera que cada losa quede definida con sus dimensiones exactas. Con ello se establece de manera adecuada el planteamiento de las juntas de dilatación, asegurando la correcta diferenciación entre losas

regulares e irregulares, lo cual facilita la verificación técnica y la planeación constructiva.

Con estas correcciones, la modulación queda ajustada en concordancia con los lineamientos del Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto del INVIAS y las especificaciones de proyecto.

Adjunto se remite la modulación actualizada para su revisión y aprobación.
Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025
Anexo MODULACION PLACAS - VIA CENTENARIO

Versión 2 / Mayo 2020

PINTUTRÁFICO ACRÍLICA BASE SOLVENTE

Ideal para la demarcación y señalización de carreteras, calles, autopistas, parqueaderos, bodegas e industrias en general.

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durables y rápido secamiento.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Pintura diseñada según la norma NTC 1360.
La correcta aplicación, con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744.

USOS

Demarcación y señalización de carreteras, calles, autopistas, parqueaderos, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de pavimento y concreto principalmente. Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente retención de color
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Buena adherencia para repinte
- ✓ No contiene pigmento a base de cromo y plomo
- ✓ Retención de Microesferas
- ✓ Alta durabilidad y Adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Sólidos por volumen	50	52	%
Densidad	5.40	5.52	kg/gal
Viscosidad (ASTM 562)	80	90	KU
Método de Aplicación	Brocha, rodillo, equipo airless		
No Pick Up (ASTM-D711-98)	6	12	Minutos
Rendimiento (metros cuadrados a 12 mils secos)	6.2		m^2/gal
Rendimiento (metros lineales, 12 cm y 9 mils secos)	71		m/gal
Estabilidad al almacenamiento (entre 5 y 35 °C)	12		Meses

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Asegurar que la superficie está seca y libre de polvo, grasa y suciedad.
Remover pintura anterior en caso de que tenga mala adherencia.
El proceso de señalización no se debe realizar cuando se prevean o se presenten lluvias. Realizar imprimación para concreto nuevo debido a álcalis y porosidad.
Homogenizar antes de su uso. El producto tiene viscosidad de aplicación, no se recomienda dilución excepto en situaciones de alta temperatura, diluyendo máximo en un 2% con los solventes 21121 o 21204.
La limpieza de los equipos se realiza con thinner 21219 o ajustador 21126.
Solo se pueden aplicar sobre pavimentos rígidos o flexibles que lleven mínimo 28 días de construidos, en caso contrario realice una señalización temporal, sin esferas, de bajo espesor de película (máximo 7 mils húmedos), luego proceda con la aplicación de la capa completa del recubrimiento. En concretos, para obtener mejores niveles de adherencia se recomienda imprimar con 13759, a un espesor de 5 mils húmedos. La durabilidad dependerá del tipo y estado de pavimento, volumen y tipo de tráfico, geometría de la vía, la preparación de superficie y la aplicación. En zonas de canteras, derrumbes y construcciones donde se tiene arena continuamente, la durabilidad será afectada.

ADICIÓN DE MICROESFERAS

- ✓ Para sembrado de microesferas se recomienda adicionar inmediatamente después de la aplicación la referencia 13716 o 13704.
- ✓ Se recomienda sembrar entre 300 y 400 gramos de microesferas por metro cuadrado aplicado

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

TEMPERATURA AMBIENTAL		TEMPERATURA DEL SUSTRATO	HUMEDAD RELATIVA
Mínima	7 °C	7 °C A 48 °C	30 % a 85 %
Máxima	35 °C		

NOTA:

Evitar aplicar por debajo de 7 °C temperatura ambiente y siempre el sustrato 3 grados por encima del punto de rocío.

PRESENTACIONES

Cuñete – 5 Galones.
Tambor – 50 Galones.

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Blanco 13722	10015687 Caneca 5 galones
	10017277 Tambor 50 Galones
Amarillo 13723	10015688 Caneca 5 galones
	10017277 Tambor 50 Galones

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 3 de octubre de 2025 OCVC. 141-2025-023

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL NO. 3

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo establecido en el contrato y dentro de los plazos acordados, me permito remitir para su conocimiento y revisión el Informe Mensual No. 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2025.
Se anexa el documento respectivo, el cual incluye el avance de obra, registro fotográfico y análisis de actividades.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025
Anexo Informe Mensual No. 3

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 9 de octubre de 2025

OCVC. 141-2025-024

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No 1.

Cordial saludo,

Por medio del presente, de manera atenta y respetuosa, solicitamos la suspensión No. 1 del contrato en referencia a partir del 10 de octubre de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2025.

El motivo de esta solicitud corresponde a la necesidad de garantizar el tiempo adecuado de curado del concreto, con el fin de poder ejecutar en condiciones óptimas la actividad de demarcación horizontal. De acuerdo con las recomendaciones técnicas del fabricante de la pintura a emplear, se requiere un periodo mínimo de 28 días de curado antes de realizar la aplicación, asegurando así la correcta adherencia y durabilidad del producto.

Agradecemos su atención y gestión para formalizar esta suspensión, la cual permitirá mantener la calidad y durabilidad de las obras ejecutadas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Quedamos atentos a su aprobación y al trámite correspondiente.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025
Anexo Ficha Técnica Pintura Demarcación

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 9 de octubre de 2025 OCVC. 141-2025-025

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: SOLICITUD DE COBRO PARCIAL No 1.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar el Cobro Parcial No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 y el 9 de octubre de 2025, por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($357.786.849,57).

Este valor corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo indicado, alcanzando un avance físico y financiero del 90% del contrato.

Agradezco su atención y la gestión correspondiente para el trámite y legalización de este cobro.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 04 de noviembre de 2025 OCVC. 141-2025-028

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Solicitud de reinicio de contrato

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado, nos permitimos solicitar de manera respetuosa el reinicio del Contrato de Obra No. 141 de 2025, el cual se encuentra suspendido mediante el Acta de Suspensión No. 1.

La presente solicitud se formula en atención a que las causas que originaron la suspensión del contrato han sido subsanadas en su totalidad, razón por la cual se considera procedente la reanudación de las actividades contractuales, conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato y en la normatividad vigente.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 04 de noviembre de 2025 OCVC. 141-2025-029

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

Referencia: CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

ASUNTO: Aviso de ejecución y solicitud de apoyo logístico – Demarcación en frío, Contrato No. 141 de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado, nos permitimos informar que el día 05 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo las actividades de demarcación en frío de la vía, de conformidad con lo establecido en el presupuesto del Contrato de Obra No. 141 de 2025.

Las labores de demarcación se ejecutarán de acuerdo con la propuesta técnica de demarcación remitida a la interventoría mediante Oficio No. OCVC.141-2025-026 del 24 de octubre de 2025, la cual fue presentada para su respectiva revisión y aprobación.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a ejecutar, es indispensable que la vía se encuentre completamente seca y libre de tránsito vehicular o de cualquier elemento que pueda interferir con la correcta aplicación del material de demarcación.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la interventoría adelantar las gestiones pertinentes ante la administración municipal, con el fin de garantizar que, durante el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m., no se presente circulación vehicular ni se desarrollen actividades de mantenimiento que impliquen el uso de agua sobre el tramo de vía a intervenir.

Por nuestra parte, se realizarán las actividades de limpieza y barrido previas, así como la instalación de la señalización necesaria para el cierre temporal de la vía. No obstante, se solicita el apoyo de la interventoría y de la administración municipal

para gestionar e informar oportunamente a la comunidad sobre las restricciones de tránsito establecidas para dicho periodo.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o instrucción adicional.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901041661-9

La Vega – 23 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-141-032

Alcaldía Municipal De La Veg2
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciovíacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoria No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 12 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 141-2025 (VIA URBANA – BARRIO CENTENARIO)
Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 12 al contratista de obra y supervisión, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 12

Día	24 de septiembre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	11:00 am

Fuente: Agroambiental SAS

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez.
INGRID LORENA GÓMEZ HERNÁNDEZ
Representante legal

La Vega – 26 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-141-034

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciovíacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12 Y COMPROMISOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 13 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 141-2025 (VÍA URBANA – BARRIO CENTENARIO)

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra del acta correspondiente al comité de obra No. 12 con fecha del día 24 de septiembre de 2025.

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 012**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 12 con fecha del día 24 de septiembre de 2025.

2. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 12**

Como resultado del comité llevado a cabo el 10 de septiembre de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 24 de septiembre de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Observaciones Modulacion.	25-09-25	Interventoria.
2	Envio lista de Chequeo	25-09-25	Interventoria
3	Entrega Informe mensual 03.	30-9-2025	Contratista de obra
4	Comite de Seguimiento	1-oct-25	

Fuente: Acta de comité de obra No.12 del 24 de septiembre de 2025

3. CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No.13

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 13, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 13

Dia	Miércoles, 01 de octubre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	11:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 12 de fecha 24 de septiembre de 2025

Total, de folios cinco (05) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo aqroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901166719-9

La Vega – 27 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-141-035

Señores
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorcioviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA DE LA MODULACIÓN DE PLACAS Y REFUERZO PLACAS IRREGULARES EN LA VÍA

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista mediante correo electrónico el dia 27 de septiembre de 2025 esta se avala.

Se informa que el día 26 de septiembre de 2025 se comunicaron al Consorcio Vias Centenario las observaciones realizadas por el especialista. En atención a ello, el contratista procedió a elaborar los ajustes correspondientes, lo que permitió avalar la modulación y el refuerzo propuestos.

Por lo anterior, se remite el presente informe a la supervisión del proyecto y se otorga el aval al contratista de obra. Asimismo, se recomienda y solicita respetuosamente al municipio de La Vega, a través de su equipo de supervisión, realizar la verificación correspondiente y, de ser procedente, emitir la aprobación respectiva.

Se anexa al presente comunicado

- Modulación general de placas de vía en pdf y dwg
- Modulación placas irregulares
- Refuerzo de modulación placas irregulares

Total, folios: tres (03) Folios y un plano en dwg

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900413619-9

La Vega – 30 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-141-036

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoria No. 179-2025
Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vias e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: CITACIÓN AL PROXIMO COMITÉ DE OBRA No. 13 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 141-2025 (VIA URBANA – BARRIO CENTENARIO)

Cordial saludo,

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales y con el fin de validar y realizar el seguimiento a las actividades del contrato de obra C-OBRA-141-2025, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoria, se permite citar al contratista de obra CONSORCIO VÍA CENTENARIO 2025 al comité de obra No. 13 el cual se realizará de manera virtual teniendo en cuenta lo siguiente:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 13

Dia	01 de octubre de 2025
Lugar:	Link Google Meet
Hora:	11:00 am

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

La Vega – 04 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-037

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciovíacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13 Y COMPROMISOS DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025, Y CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 14 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 141-2025 (VÍA URBANA – BARRIO CENTENARIO)

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra del acta correspondiente al comité de obra No. 13 con fecha del día 01 de octubre de 2025

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 13**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 13 con fecha del día 01 de octubre de 2025

2. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 13**

Como resultado del comité llevado a cabo el 01 de octubre de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 01 de octubre de 2025

ÍTEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Presentación informe mensual No.8	2/10/2025	Contratista
2	Programación de comité y seguimiento	3/10/2025	Todas las partes
3	Inicio levantamiento actas de vecindad de cierre	7/10/2025	Contratista de obra e interventoría
4	Presentación de laboratorios de concretos premezclado	Una vez se cumplan los 28 días	Contratista de Obra

***Fuente:** Acta de comité de obra No.13 del 01 de octubre de 2025*

3. CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No.14

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 14, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 14

Dia	Miércoles, 08 de octubre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	11:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 13 de fecha 01 de octubre de 2025

Total, de folios cinco (05) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo acroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

La Vega – 10 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-042

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciovíacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14 Y COMPROMISOS DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2025, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 141-2025 (VÍA URBANA – BARRIO CENTENARIO)

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra del acta correspondiente al comité de obra No. 14 con fecha del día 09 de octubre de 2025

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 14**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 14 con fecha del día 09 de octubre de 2025

2. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 14**

Como resultado del comité llevado a cabo el 09 de octubre de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 09 de octubre de 2025

ÍTEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Presentación acta parcial	9/10/2025	Contratista
2	Inicio levantamiento actas de vecindad de cierre	Reprogramar	Contratista de obra e Interventoría
3	Presentación de laboratorios de concretos premezclado	Una vez se cumplan los 28 días	Contratista de Obra

Fuente: Acta de comité de obra No.14 del 09 de octubre de 2025

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 14 de fecha 09 de octubre de 2025

Total, de folios cuatro (04) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

La Vega – 17 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-043

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorciovíacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA DE REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN PERIODO DE SUSPENSIÓN Y ENTREGA DE OBSERVACIONES A MODULACIÓN EJECUTADA EN CAMPO

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría entrega a la supervisión del proyecto y contratista de obra el reporte de ejecución de actividades en periodo de suspensión, así como las observaciones relacionadas con la modulación ejecutada en campo

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN PERIODO DE SUSPENSIÓN

Es de manifestar que las actividades que se ejecuten en periodo de suspensión son de entera responsabilidad del contratista de obra, tanto en su planeación como en su ejecución. Cualquier situación relacionada con la calidad, prácticas constructivas inadecuadas que se realicen serán atribuibles únicamente al contratista de obra, en la medida que, durante dicho periodo, la Interventoría no tiene competencia ni responsabilidad para verificar, controlar o supervisar las actividades realizadas.

Cabe recordar que, mediante el comunicado CTO.179-2025-141-041 del 09 de octubre se emitió el aval a la solicitud de suspensión al contrato de obra No. 141 de 2025 aclarando expresamente que en dicho periodo de suspensión no se ejecutarán labores físicas de obra.

OBSERVACIONES MODULACIÓN EJECUTADA EN CAMPO

Respecto al diseño de modulación de placas, avalado mediante el oficio CTO.179-2025-141-035 del 27 de septiembre de 2025, se evidencia que la ejecución en campo no se ejecutó de acuerdo a la avalada por la interventoría. Por lo cual se solicita al contratista de obra llevar a cabo las acciones que correspondan frente a ello para realizar las correcciones pertinentes.

RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo mencionado se recomienda al contratista de obra que las actividades sean ejecutadas dentro del periodo aprobado, se recuerda que durante los periodos de suspensión del contrato no deben realizarse actividades físicas en campo.

SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA

Se solicita ajustar la modulación en periodo contractual con el fin de que la Interventoria verifique que los procesos de mejora se realicen adecuadamente.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901156619-9

La Vega – 22 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-044

Señores
Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorcioviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: SOLICITUD ENTREGA ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Respetuoso saludo,

En cumplimiento al contrato en referencia y a nuestras obligaciones contractuales que nos competen en calidad de Interventoría, se solicita al contratista de Obra Consorcio Via Centenario 2025, realizar la entrega del esquema de señalización vial para el contrato de obra 141 de 2025.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra suspendido desde el día 10 de octubre en razón al tiempo adecuado de curado del concreto, con el fin de ejecutar las actividades de demarcación horizontal. En ese sentido, se requiere contar con el esquema de señalización y demarcación horizontal con el fin de realizar la respectiva revisión técnica para su aval por parte de esta interventoría y aprobación por parte de la supervisión y así evitar contratiempos en la reactivación de las actividades.

Por lo anterior, se solicita al contratista presentar, a la mayor brevedad posible, el esquema de señalización vial donde se verifique la señalización horizontal y vertical a instalar.

Quedamos atentos a la entrega de la documentación solicitada, con el fin de emitir observaciones y/o aval por parte de esta interventoría. Lo anterior permitirá asegurar que se retomen las labores en sitio de forma adecuada.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

Con copia
Alcaldia Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901133610-9

La Vega – 31 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-045

Señores
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorcioviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN – RESPUESTA A COMUNICADO OCVC. 141-2025-027

Respetuoso saludo,

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista mediante comunicado OCVC. 141-2025-027 de fecha 24 de octubre de 2025 mediante correo electrónico esta se avala.

Por lo anterior, se remite el presente informe a la supervisión del proyecto y se otorga el aval al contratista de obra. Asimismo, se recomienda y solicita respetuosamente al municipio de La Vega, a través de su equipo de supervisión, realizar la verificación correspondiente y, de ser procedente, emitir la aprobación respectiva.

Se anexa al presente comunicado

- Comunicado OCVC. 141-2025-027 del 24 de octubre de 2025 con asunto "Esquema señalización vial"

Total, folios: tres (03) Folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez.
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

48

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901116611-9

La Vega – 04 de noviembre de 2025

CTO.179-2025-141-046

Señores
Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorcioviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el CONSORCIO VÍA CENTENARIO en calidad de contratista de obra, mediante el comunicado OCVC. 141-2025-028 de fecha de 04 de noviembre de 2025, con asunto "Solicitud de reinicio de contrato", el cual indica:

> *"Por medio del presente comunicado, nos permitimos solicitar de manera respetuosa el reinicio del Contrato de Obra No. 141 de 2025, el cual se encuentra suspendido mediante el Acta de Suspensión No. 1.*
> *La presente solicitud se formula en atención a que las causas que originaron la suspensión del contrato han sido subsanadas en su totalidad, razón por la cual se considera procedente la reanudación de las actividades contractuales, conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato y en la normatividad vigente."*

CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA

Con lo anteriormente mencionado, la Interventoría AVALA y solicita a la supervisión del contrato realizar el trámite administrativo y jurídico a la solicitud de reinicio del contrato de obra No. 141-2025 a partir del 05 de noviembre de 2025. Teniendo en cuenta que las causas que conllevaron a la suspensión No.1 ya fueron superadas.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Anexos al presente comunicado:

- Oficio OVCV. 141-2025-028 en un (01) folios

Atentamente

Lorena Gomez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101465256	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	17	10	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025		NIT: 901.924.708-1
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 12 - 41	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900258711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 6018458922
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA C-OBRA-No. 141-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGUN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.

NOTA: LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACRA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2025	10/03/2026	$39,752,212.22	$39,752,212.22
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/06/2025	10/11/2028	$19,876,106.11	$19,876,106.11
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$79,504,424.44	$79,504,424.44

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA No.141-2025 , SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******13,148.00	$ *******4,000.00	$ ******3,258.00	$ **********20,406.00	$ ******139,132,742.77	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES	102106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101465256

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101465256	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	17	10	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	NIT: 901.924.708-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 12 - 41	SOACHA, CUNDINAMARCA	3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	LA VEGA, CUNDINAMARCA	6018458922

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******13,148.00	$ *******4,000.00	$ *******3,258.00	$ **********20,406.00	$ ******139,132,742.77	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES	102106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100514037785 6 (3900) 000000020406 (96) 20260616

REFERENCIA PAGO:
1100514037785-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101465256	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	17	10	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025			NIT: 901.924.708-1
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 12 - 41	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA		**TELÉFONO:** 3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 8000734751 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900258711-1			NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	**CIUDAD:** LA VEGA, CUNDINAMARCA		**TELÉFONO:** 8018458922

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INTERCONDI SAS	901199491-6	90.00
PRORUSSI CONSTRUCCIONES SAS	901055683-5	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101465256

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101465256, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

21-44-101465256

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

93

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101251133	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	10	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	NIT: 901.924.708-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 12 - 41	SOACHA, CUNDINAMARCA	3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900258711-1	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	LA VEGA, CUNDINAMARCA	6018458922

BENEFICIARIO: 800073475 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONCESIONES DE LA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA C-OBRA-No. 141-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGUN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS / ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA / EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**16/06/2025**	**10/11/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA No.141-2025 , SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,500.00	$ *******3,000.00	$ ******11,685.00	$ **********73,185.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES	102106	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101251133

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101251133	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	10	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025		NIT: 901.924.708-1
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 12 - 41	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900268711-1		NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD: LA VEGA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 6018456922
BENEFICIARIO:		

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · PSE · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

SUPERINTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,500.00	$ *******3,000.00	$ ******11,685.00	$ ***********73,185.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES	102106	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11005140377895 (3900) 000000073185 (96) 20260616

REFERENCIA PAGO: 1100514037789-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101251133	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2025	16	06	2025	00:00	10	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025			NIT: 901.924.708-1
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 12 - 41	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3157814100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU NIT 900258711-1			NIT: 800.073.475-1
DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 19 - 71 PARQUE PRINCIPAL	**CIUDAD:** LA VEGA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	6018458922

BENEFICIARIO: 800073475 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT 800073475-1 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INTERCONDI SAS	901199491-6	90.00
PRORUSSI CONSTRUCCIONES SAS	901055683-5	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101251133

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1152

ALCALDÍA DE
LA VEGA
OFICINA DE CONTRATACIÓN

RESOLUCIÓN Nº. 290 DE 2025
(noviembre 07)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA"

La jefe de la oficina de contratación de La Vega Cundinamarca en uso de la facultades y competencias desconcentradas por el señor Alcalde Municipal mediante decreto No.015 de febrero 01 de 2024, para realizar la aprobación de las garantías contractuales.

CONSIDERANDO

1. Que el municipio de la Vega Cundinamarca, suscribió el CONTRATO DE OBRA N° 141-2025 el 13 de marzo de 2025, que se describe a continuación:

CONTRATO DE OBRA	C-OBRA-141-2025			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 NIT. No. 901924708-1 R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA C.C. No. 1.019.068.674 DE BOGOTÁ D.C			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA			
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (323.024.782,21) M/CTE incluido IVA			
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES			
	INICIO	FINALIZACION	TERMINO	VALOR
ACTA DE INICIO	16/06/2025	15/10/2025	4 MESES	$323.024.782.21
MODIFICATORIO ADICIÓN N° 1	25/08/2025			$ 74.497.340
ACTA DE REINICIO	05/11/2025	10/11/2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$397.522.122.21

2. Que el dia 05 del mes noviembre de 2025 se suscribió entre las partes el Acta de Reinicio del C-OBRA-141-2025 de acuerdo a la obligación contractual el contratista aportó, las garantias de Cumplimiento 21-44-101465256 anexo 5 expedido el 07 de noviembre del 2025 y Responsabilidad civil extracontractual 21-40-101251133 anexo 3 expedido el 07 noviembre del 2025, con los siguientes amparos:

AMPAROS	COBERTURA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	COBERTURA APORTADA POR EL CONTRATISTA	VALOR SOLICITADO POR LA ENTIDAD	VALOR ASEGURADO POR EL CONTRATISTA	CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO GENERALES: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigencia por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.	Del 16/06/2025 Al 16/02/2026	Del 16/06/2025 Al 10/03/2026	$39.752.212.22	$39.752.212.22	CUMPLE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras..	Del 15/10/2025 Al 15/10/2030	Del 15/10/2025 Al 17/10/2030	$79.504.424.44	$79.504.424.44	CUMPLE

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Del 16/06/2025 Al 16/10/2028	Del 16/06/2025 Al 10/11/2028	$19.876.106.11	$19.876.106.11	CUMPLE
		VALOR TOTAL ASEGURADO	$139.132.742.77	$139.132.742.77	CUMPLE

AMPARO	COBERTURA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	COBERTURA APORTADA POR EL CONTRATISTA	VALOR SOLCITADO POR LA ENTIDAD	VALOR ASEGURADO POR EL CONTRATISTA	CUMPLE/NO CUMPLE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por el valor de 200 SMLMV, y el término de duración del contrato.	Del 16/06/2025 al 16/10/2025	Del 16/06/2025 al 16/10/2025	$ 284.700.000	$ 284.700.000	CUMPLE
		VALOR TOTAL ASEGURADO	$284.700.000	$284.700.000	CUMPLE

De acuerdo al anáilis realizado:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el anexo 5 de la de garantia de Cumplimiento 21-44-101465256, expedido el 07 de noviembre de 2025 por SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificado con NIT. 860.009.578-6, asegurado beneficiario Municipio de la Vega Cundinamarca identificado con NIT. 800.073.475-1 y/o Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU indentificado con NIT.900258711-1, valor total asegurado es la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($139.132.742.77) M/CTE.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el anexo 3 de la de garantia de responsabilidad civil 21-40-101251133, expedido el 07 de noviembre de 2025 por SEGUROS DEL ESATADO S.A., identificado con NIT. 860.009.578-6, asegurado beneficiario Municipio de la Vega Cundinamarca identificado con NIT. 800.073.475-1 y/o Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU indentificado con NIT.900258711-1, valor total asegurado es la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($284.700.000) M/CTE.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE

Dada en la Alcaldia Municipal de La Vega Cundinamarca, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2025

LIA MARIORY MORA MARIN
Jefe de Oficina de Contratación
según delegación de facultades realizada mediante
Decreto No.015 de febrero 01 de 2024.

Aprobó: Yeison Fabian Bohórquez Gómez/Profesional jurídico oficina de contratación
Revisó: Viki Trinidad Camargo/Profesional Universitario VTC
Proyectó: Diana Mahecha Garzón/Auxiliar Administrativo DM

1153

ALCALDÍA DE
LA VEGA
OFICINA DE CONTRATACIÓN

MEMORANDO

MUNICIPIO DE LA VEGA
Alcaldía Municipal

FECHA: noviembre 07 de 2025

PARA: **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura

DE: **LIA MARIORY MORA MARIN**
Jefe de la Oficina de Contratación

ASUNTO: Me permito remitir los siguientes documentos del C-OBRA-141-2025, para su conocimiento y fines pertinentes:

- Anexo 5 y 3 de pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil, actualizadas con Acta de Reinicio,
- Aprobación de pólizas

Cordialmente,

LIA MARIORY MORA MARIN
Jefe de Oficina de Contratación
según delegación de facultades realizada mediante
Decreto No.015 de febrero 01 de 2024.

Aprobó: Yeison Fabian Bohórquez Gómez/Profesional juridico oficina de contratación
Revisó: Viki Trinidad Camargo/Profesional Universitario VTC
Proyectó: Diana Mahecha Garzón/Auxiliar Administrativo DM

a9

SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025-08	2025-09	1743564296	9491277754	E	2025/09/18	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$681,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,423,500	$227,800	EPS009	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$198,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901056602	5	PRORUSH CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 113 55 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6261170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1742564296	5491277754	E	2025/09/10	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	1	$57.000	$0	$0	$57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

2025/09/01 02:51 PM

162

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-12, 09:23:03 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084532584

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 21/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025		
Documento	NI901924708	**Dirección**	CR 8 SUR #12 - 41 SOACHA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1111111
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RUBIANO SIERRA MARIO FERNANDO	**Identificación**	CC 1019068674
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019068674	MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA	01	00															0	21	21	21	(230501) PORVENIR	$ 996.450	$ 159.500	(EPS005) COMPENSAR EPS	$ 996.450	$ 39.900	6,960	$ 996.450	$ 69.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 1020797397	DAVID RICARDO HUERTAS QUITRAGO	01	00															0	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1070930963	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	01	00															0	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1122914587	LEONARDO OSPINA TOVAR	01	00															0	15	15	15	(230501) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS008) EPS SANITAS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 11447549	JOSE IVAN LEON USREGO	01	00															0	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) FAMISANAR EPS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 3059476	JORGE ALEXANDER CASTIBLANCO LOPEZ	01	00															0	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) FAMISANAR EPS	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.316.700	$ 5.316.700	$ 5.316.700	$ 5.316.700	$ 850.700	$ 212.600	$ 410.400	$ 228.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.652.100	$ 19.100	$ 1.671.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

103

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053683	5	SOCIEDAD CONTROLIC COMEX SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 113 55 67	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6261170	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1868885712	949268362	E	2025/10/21	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$881,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
1	CC	1[illegible]	[illegible]	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1[illegible]	[illegible]	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS009	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0

2025/10/21 04:09 PM

104

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901055683	5	PRORUSSI CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 113 55 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6261170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1868885712	949268362O	E	2025/10/21	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

2025/10/21 04:09 PM

105

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-18, 03:20:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081366253

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 18/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025		
Documento	NI901924708	**Dirección**	CR 8 SUR #12 - 41 SOACHA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1111111
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	RUBIANO SIERRA MARIO FERNANDO	**Identificación**	CC 1019068674
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias ARP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	Total
CC 1019068674	MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA	01	00																0	21	21	21	21	(230901) PORVENIR	$ 996.450	$ 139.500	(EPS008) COMFENSAR EPS	$ 996.450	$ 91.500	4,560	$ 996.450	$ 69.400	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 996.450	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700
CC 1020789369	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,560	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.700
CC 1070088963	CARLOS ANDRES RAMIREZ PALACIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS008) COMFENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,560	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.700
CC 1121914547	LEONARDO OSPINA TOVAR	01	00																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 711.750	$ 28.500	4,560	$ 711.750	$ 49.600	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 11467373	JOSE IVAN LEON URREGO	01	00																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(EPS010) FAMISANAR EPS	$ 711.750	$ 28.500	4,560	$ 711.750	$ 49.600	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 3209476	JORGE ALEXANDER CASTIBLANCO LOPEZ	01	00																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS010) FAMISANAR EPS	$ 711.750	$ 28.500	4,560	$ 711.750	$ 49.600	(CCF 22) COLSUBSIDIO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.319.700	$ 5.319.700	$ 5.319.700	$ 5.319.700	$ 850.000	$ 1.216.400	$ 1.416.400	$ 1.216.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.682.800	$ 0	$ 5.682.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

106

LABORATORIOS

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

PAVILES S.A.S. SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS	**RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO.** **METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ** NORMA INV E 414 / 2007	2018 - 01 - C F - 059 REVISIÓN 1

OBRA: CONVENIO IOCU 768 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA (CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30) **FECHA:** 2025-10-20

SECTOR: BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 **ORDEN DE TRABAJO:** 083 - 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 **CODIGO:** 099 - 088

MUESTRA: 1 **IDENTIFICACIÓN:** 083 - 001 /001 **FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-09-22

DESCRIPCION: CONCRETO MR 42 **CONCRETERA**

ORDEN DE TRABAJO	MUESTRA	FECHAS		EDAD Días	LUZ ENTRE APOYOS (L)	ANCHO PROMEDIO (b)	ALTURA PROMEDIO (d)	N	MODULO DE ROTURA		RESISTENCIA
		Toma	Rotura		mm	mm	mm		kgf/cm2	Mpa	Nominal
0083	002	2025-09-22	2025-10-20	28	490	152	152	32100	45,7	4,48	MR 42

OBSERVACIONES:

JEFE DE LABORATORIO _____ REVISÓ _____

KILOMETRO 13 AUTOPISTA MEDELLIN TEL 8289042 Cel 311 2239556
Email: pavilesc@hotmail.com

V6

PAVILES S.A.S. SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA INV E 410 / 2007	2018 - 01 - C F - 058 REVISIÓN 1

OBRA: CONVENIO ICCU 788 2024 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA (CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30) **FECHA:** 2025-10-20

SECTOR: BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 **ORDEN DE TRABAJO:** 083 - 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 **CODIGO:** 099 - 088

MUESTRA: 1 **IDENTIFICACIÓN:** **FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-09-22

DESCRIPCIÓN:

Codigo No	Muestra No	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Días	Diametro cm	Area cm2	P	RESISTENCIA kg/cm2	Mpa	PSI	Especificada (Kg/cm2)	% Especificada	F.F
0001	C 1	2025-09-22	2025-10-20	28	15,4	186,3	81373	436,9	42,9	6241	420	104,0	2

Cono Fig. 1 — C. y Vert. Fig. 2 — C. y corte Fig. 3 — Corte Fig. 4 — Vertical Fig. 5 — Otro Fig. 6

P = Carga máxima aplicada, en kilogramos fuerza
F.F. = Figura de falla

Jefe de Laboratorio

Reviso

OBSERVACIONES:

KILOMETRO 13 AUTOPISTA MEDELLIN TEL 6269042 Cel 311 2239556
Email: paviles@hotmail.com

109

POLIMIX
COLOMBIA
NIT 830.106.474-5

Polimix Concreto Colombia SAS
Cel. 3175014855
Planta: Mosquera

icontec ISO 9001
SC764-1

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

Obra: MEJORAMIENTO SEGUN CONVENIO ICCU 780-2024

Dimensión Probeta: 10*20 cm Fecha: 22/10/2025

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NB 588)

f'c: 350,0 (Kg/cm2) 42MR285C Asent: 5,0" ± 1"

Cemento: ALION Aditivo: GCP

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Porcentaje %	Elemento	Tipo De Falla
1383155	421	15/9/2025	22-sep-25	7	317,3	90,6%	PISOS	3
			13-oct-25	28	513,8	146,8%		3
1383169	187	16/9/2025	23-sep-25	7	365,1	104,3%	PISOS	3
			14-oct-25	28	541,1	154,6%		4
1383209	187	18/9/2025	25-sep-25	7	337,3	96,4%	PISOS	3
			16-oct-25	28	513,4	146,7%		4
1383233	161	22/9/2025	29-sep-25	7	413,6	118,2%	PISOS	3
			20-oct-25	28	528,4	151,0%		3

Julian Caro Tel: 317 501 48 55

Firma

1/2

POLIMIX
COLOMBIA
NIT 830.106.474-5

Polimix Concreto Colombia SAS
Cel. 3175014855
Planta: Mosquera

SC764-1

CERTIFICADO DE ROTURA DE CILINDROS

Cliente: CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

Obra: MEJORAMIENTO SEGUN CONVENIO ICCU 780-2024

Dimensión Probeta: 10*20 cm Fecha: 22/10/2025

Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto (NB 586)

f'c: 350,0 (Kg/cm2) 42MR285C Asent: 5,0" ± 1"

Cemento: ALION Aditivo: GCP

Comp. Entrega	Mixer	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad (días)	Resistencia (Kg/cm2)	Porcentaje %	Elemento	Tipo De Falla
1383306	161	2/10/2025	9-oct-25 2-oct-25	7	385,6	110,2%	PLACA	2
1383348	161	7/10/2025	14-oct-25 7-oct-25	7	383,2	109,5%	PLACA	3

Julian Caro Tel: 317 501 48 55

Firma

BITÁCORA

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail:
consorcioviacentenario2025@gmail.com

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 16 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	92	DIAS PENDIENTES	31

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	✓	
RESIDENTE	1					GAFAS	✓	
MAESTRO						GUANTES	✓	
OFICIAL	1					BOTAS SEG.	✓	
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Nivel	1	X.				
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado para concreto MR	ML	K0+590 al K0+620	X	
Vaciado de concreto MR	M³	K0+590 al K0+620		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	✓			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
	✓				
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
		X			

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, cundinamarca 15 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 am continuando con el encofrado y la colocación de los parillas de los pasadores conforme a la modulación localizada por la topografia. Se verifican los niveles de la rasante mediante nivel topografico. Hacia las 9:30 a.m se da inicio al vaciado del concreto MR de acuerdo con las especificaciones de diseño, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+590 y K0+620 correspondiente al carril izquierdo.

Personal Interventoria : 1 Residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 129 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 16 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	9 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	93	DIAS PENDIENTES	30.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	Y	
RESIDENTE	1					GAFAS	✓	
MAESTRO	1					GUANTES	✓	
OFICIAL						BOTAS SEG.	✓	
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					ALCOHOL		
TOPOGRAFO	1	Nivel	1	X				
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Desencofrado	ML	K0+550 AL K0+620	✓	
Encofrado para concreto MR	ML	K0+550 al K1+645	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	✓	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI ✓	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	✓	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO ✓	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO ✓

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega Cundinamarca 16 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 9:00 am con el desencofrado del concreto MR vaciado el dia anterior, en el carril izquierdo Se continua con el encofrado Sobre el carril izquierdo hasta llegar a la abscisa K0+645 colocando las parrillas de los pasadores. Sobre el carril derecho Se colocan las parillas de los pasadores desde la abscisa K0+590 al K0+602.

Sobre las 10:00 am se dá inicio al vaciado del concreto en el carril derecho y posteriomente Se continua sobre el carril izquierdo siguiendo los especificaciones establecidas en los diseños.

Personal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 17 de Septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0.

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	94	DIAS PENDIENTES	29.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	✓	
RESIDENTE	1					GAFAS	✓	
MAESTRO	1					GUANTES	✓	
OFICIAL						BOTAS SEG.	✓	
OPERARIO	1	cortadora	1	X		CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion, nivel	1	X				
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Desencofrado	ML	Pot 590 al Pot 695.	x	
Corte de juntas de dilatacion	ML	Pot 590 al Pot 695.	x	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca 17 de Septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 am desencofrando el concreto vaciado del dia anterior. se realiza el replanteo de las juntas de dilatación mediante estacion total, se bimbra las lineas guias realizar los cortes de las mismas. El corte se realiza mediante cortadora de pavimento siguiendo las especificaciones establecidas en los diseños

Peisonal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 18 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	95	DIAS PENDIENTES	28

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	✓	
RESIDENTE						GAFAS	✓	
MAESTRO	1					GUANTES	✓	
OFICIAL						BOTAS SEG	✓	
OPERARIO	1	Cortadora	1	X		CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion, nivel	1	X.				
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado para concreto MR		FOT645 al FOT652.		
Corte de Juntas de dilatacion		FOT620 al FOT645		
Vaciado de concreto MR.		FOT602 al FOT652.		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

la vega Cundinamarca 18 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 am Se continia con el corte de las Juntas de dilatación mediante cortadora de pavimento. Se realiza el encofrado sobre el carril derecho. desde las abscisa K0+645 al K0+652. Se colocan las parrillas de los pasadores desde la abscisa K0+602 al K0+652.

A las 10:00 am se da inicio al vaciado del concreto en el carril derecho desde las abcisas K0+602 al K0+652. siguiendo las especificaciones establecidas en los diseños

Personal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Lauro Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 19 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	96	DIAS PENDIENTES	27.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	X	
RESIDENTE	1					GAFAS	X	
MAESTRO	1					GUANTES	X	
OFICIAL						BOTAS SEG.	X	
OPERARIO	1	cortadora	1	X		CHALECO		
AYUDANTE	2.					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion	1	X				
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Descapotado	ML	K0+695 al K0+652	X	
Corte Juntas de dilatación	ML	K0+602 al K0+652	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Lauro Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca 19 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 am. Se realiza el replanteo de las juntas de dilatacion mediante estación total, se cimbra las lineas guias para realizar los cortes se utiliza cortadora de pavimento
No se presenta lluvias

Personal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 20 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 3

PLAZO ACTUAL	4 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS	97	DIAS PENDIENTES	26

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion	1	X				
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado para concreto MR	ML	Lote 52 al LO 1-669	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega cundinamarca 20 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 am. Se realiza el encofrado desde las abscisas k0+652 al k0+669 sobre el carril derecho. Se suspenden las actividades de encofrado por lluvias. desde las 9:00 am hasta la 11:40 am

Personal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 22 de Septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS	99	DIAS PENDIENTES	24

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.	X	
RESIDENTE	1					GAFAS	X	
MAESTRO	1					GUANTES	X	
OFICIAL						BOTAS SEG.	X	
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion	1	X				
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado para concreto M	ML	K0+652 al K0+667		
Vaciado de Concreto MR	M3	K0+645 al K0+667		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega Cundinamarca 22 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana, retomando el encofrado que habia sido suspendido el dia 20 de septiembre debido a las lluvias y realizando la colocación de las parrillas de los pesadores. Hacia las 9:00 de la mañana se da inicio con el vaciado del concreto en el carril derecho hasta la abscisa K0+669, continuando de igual manera con el carril izquierdo hasta la abscisa K0+659, conforme a las especificaciones de diseño.

Personal Interventoria : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 23 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:
PLAZO ACTUAL: 4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS: 100
	DIAS PENDIENTES: 23.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA			-			CASCO SEG.	✓	
RESIDENTE	1					GAFAS	✓	
MAESTRO	1					GUANTES	✓	
OFICIAL						BOTAS SEG.	✓	
OPERARIO	1	Cortadora	1	X		CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1	Estacion	1					
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI ✓	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI ✓	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI ✓	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO ✓
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO ✓	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO ✓

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

127

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca 23 de Septiembre de 2025

Se inician labores a las 9:00 de la mañana, realizando el replanteo de las Juntas de dilatación mediante estación total. Posteriormente, se cimbran las líneas guías para la ejecución de los cortes, los cuales se ejecutan con cortadora de pavimento, conforme a las especificaciones de diseño

Personal Interventoría : 1 residente

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 24 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	101	DIAS PENDIENTES	22.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Rellenos	M3	Kotsgo AI Kotgo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, Cundinamarca. 24 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana Se realizan labores de limpieza y relleno con material proveniente de excavación en la zona peatonal para confinar el Sardinel.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 25 de septiembre 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	9 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	102	DIAS PENDIENTES	21

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega Cundinamarca. 25 de septiembre de 2025

No se realizan labores en campo, a la espera de la aprobación y aval por parte de la interventoria de la modulación de las losas irregulares, mientras se adelantan los actos administrativos correspondientes

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 26 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	103	DIAS PENDIENTES	20

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, cundinamarca 26 de septiembre de 2025

No se realizan labores en campo a la espera de la aprobación y aval por parte de la interventoria de la modulacion de las losas irregulares, se adelantan actos administrativos correspondientes.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 27 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	104	DIAS PENDIENTES	19.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 27 de septiembre de 2025

No se realizan labores en campo, a la espera de la aprobacion de la modulación de las losas irregulares.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 29 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS	106	DIAS PENDIENTES	17.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

137

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 29 de septiembre de 2025

Se inician labores a la 7:00 de la mañana una vez la interventoría aprueba la modulación de las losas irregulares se da inicio al armado y figurado del acero de las losas irregulares

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 30 de septiembre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	107	DIAS PENDIENTES	16.

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Figurado y armado de acero	Kg	K0+670 AL K0+682.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	X			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
	X				X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
		X			X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 30 de septiembre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana, se continua con el armado y figurado del acero de las losas irregulares tambien se da inicio al encofrado. y nivelado de los pozos Frente a la porteria de condominio mirador de San Juan.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE:
FECHA: 1 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	108	DIAS PENDIENTES	15

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Vaciado de concreto MR	M3	F-0665 al F-0682.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 1 de octubre de 2025

Se inician labores a la 7:00 de la mañana. Se da inicio al Vaciado del concreto tipo MR en las losas irregulares, desde el K0+665 al K0+682, carril derecho, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño.

42

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 2 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	107	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Corte Juntas de dilatacion	M		X	
retiro de Formaleta				

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 2 de octubre de 2025

Se inician labores a la 7:00 de la mañana, realizando el retiro del encofrado posteriormente, se procede a la localización y cimbra de las juntas de dilatación, para realizar el corte con cortadora de concreto.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 129 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Golindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 4 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	111	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						ARNES		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		

C: Conforme		FIRMA	Laura Golindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, Cundinamarca, 4 de octubre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana se continúa con la figurado de acero de las losas irregulares y posteriormente se instala el bordillo para confinamiento.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 3 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	110	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE						GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

147

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, cundinamarca, 3 de Octubre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana, se continua con el corte y figurado de acero de las losas irregulares en el carril izquierdo del K0+665 al K0+682.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 6 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	113	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL	1					BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					ARNES		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Vaciado de concreto MR	M3			

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	✓	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	✗	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	✗	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	✗	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	✗

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

19

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, cundinamarca, 6 de octubre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana. Se da inicio al vaciado de concreto tipo MR en las losas irregulares desde el k0+665 al k0+682, carril dzquierdo, compliendo con las especificaciones establecidad en el diseño

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 7 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	114	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
			X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La vega, Cundinamarca, 7 de octubre de 2025

Se inician labores a las 7:00 de la mañana, se realiza el retiro del encofrado, posteriormente se localiza y cimbra las juntas de dilatacion para realizar el corte mediante cortadora de concreto.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 8 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	115.	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL	1					BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

15

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

Ba vega, Cundinamarca, 8 de octubre de 2025

Se inician labores a la 7:00 de la mañana. Se realizan actividades de limpieza para dar incion a la instalacion del cordon. de poliuretano y sellado de juntas.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Golindo	RESIDENTE: David Rodriguez.
FECHA: 9 de octubre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS	116.	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL	1					BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme		FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme		DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega Cundinamarca, 9 de octubre de 2025

Se inician labores a la 7:00 de la mañana se continuán con las actividades de limpizza para instalación del cordon de poliuretano y sellado de juntas

Se solicita suspención por 26 días calendario para el curado del concreto para la instalacion de la demarcación.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodiguez
FECHA: 5 de noviembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0.

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS	117.	DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO	1					GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2					Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 5 de noviembre de 2025

Una vez terminado los 26 dias de curado del concreto se continua con la instalación de cordo de poliuretano y el sellado de juntas

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780-2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
RESIDENTE: Laura Galindo	RESIDENTE: David Rodriguez
FECHA: 6 noviembre de 2025	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	4 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						CASCO SEG.		
RESIDENTE	1					GAFAS		
MAESTRO						GUANTES		
OFICIAL						BOTAS SEG.		
OPERARIO						CHALECO		
AYUDANTE	2.					Alcohol		
TOPOGRAFO								
RESIDENTE SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NC

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	Laura Galindo FIRMA
NC: No Conforme	DAVID RICARDO RODRIGUEZ	INTERVENTORÍA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

54

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

FORMATO LIBRO DE BITACORA DE OBRA

La Vega, Cundinamarca, 6 de noviembre de 2025

Se inician labores de limpieza para la demarcación con pintura en Frio desde el K0+063 al K0+682 tres lineas continuas, dos en color blanco y una en color amarillo.

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO UCC 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA".



CONSORCIO VÍA CENTENARIO 2025

NIT: 901.924.708-1
R.L. ING. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
CONTRATISTA

INFORME MENSUAL PMA
16 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 – 5 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

1. TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. TABLA DE CONTENIDO 2

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVO 4

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 5

3.1 PROYECTO 1: RESPUESTA A REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES 5

3.2 PROYECTO 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA OBRA 5

3.3.PROYECTO 3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 6

4.1 PROYECTO 1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7

4.2 PROYECTO 2: MANEJO DE EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 7

4.3 PROYECTO 3. EXPLOTACIÓN FUENTES DE MATERIALES 8

4.4 PROYECTO 4. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 8

4.5 PROYECTO 5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 9

4.6 PROYECTO 6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 10

4.7 PROYECTO 7. CONTROL AIRE Y RUIDÒ 12

4.8 PROYECTO 8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 13

4. PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HIDRICO 13

5.1 PROYECTO 1. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE ESCORRENTÍA 13

5.2 PROYECTO 2. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 14

5. PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 14

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

6.1 PROYECTO 1. RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 14

6. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES 14

7.1 PROYECTO 1: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE SITIOS DE ACOPIO. 14

7.2 PROYECTO 2. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15

7. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL 15

8.1 PROYECTO 1. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 15

8.2 PROYECTO 4. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 16

8. PROGRAMA 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 16

9.1 PROYECTO 1. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recopila las actividades ejecutadas durante los períodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025, en cumplimiento de los programas establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO UCC 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA".

Su objetivo es evidenciar las acciones desarrolladas para minimizar, prevenir, mitigar, controlar y proteger los posibles impactos ambientales derivados de la ejecución de las obras. con el fin de minimizar, prevenir, mitigar, controlar y proteger los posibles impactos derivados del desarrollo de las actividades.

2. OBJETIVO

Elaborar el informe mensual de ejecución correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante los períodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025, describiendo las actividades realizadas para la implementación y seguimiento de las medidas ambientales en el tramo intervenido del proyecto vial.

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 PROYECTO 1: RESPUESTA A REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES

Durante los periodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025 se realiza la revisión del buzón de PQRS por parte de la profesional social e inspector SST en la cual indican que no se solicitaron quejas, inquietudes ni reclamos por parte de la comunidad. Así mismo el Consorcio Vía Centenario 2025 ha señalizado y demarcado cada uno de los tramos que actualmente se encuentran en ejecución, velando por la seguridad y salud de todos los trabajadores y de la comunidad.

De igual manera, el residente ambiental y el profesional social se han encargado de hacerle seguimiento a las actividades establecidas en el PMA con el fin de darle el debido cumplimiento.

3.2 PROYECTO 2: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA OBRA

Durante este periodo se realizaron charlas a los trabajadores los días lunes, miércoles y viernes dirigidas por la Inspectora HSE donde se les refuerza todo lo relacionado a la parte ambiental de la obra y de Seguridad y Salud en el trabajo. ***(Capítulo Gestión SST. Anexo 14. Registro asistencia charlas HSE).*** Los temas de las charlas ambientales son generalmente sobre manejo adecuado de residuos sólidos en la obra y el uso adecuado de los recursos ambientales utilizados en el desarrollo de las actividades y las de SST sobre uso adecuado y mantenimiento de EPP, señalización, entre otros los cuales formen a los trabajadores en el trabajo seguro.

Durante este periodo se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad establecidas en el PMA. Entre las principales actividades realizadas se destaca la reposición y entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal operativo y de apoyo en obra.

Esta reposición se realizó con el fin de mantener la integridad física de los trabajadores y asegurar el adecuado desarrollo de las actividades en campo, considerando el desgaste natural de algunos elementos por uso continuo y las condiciones ambientales propias del proyecto. Asimismo, esta acción hace parte del compromiso de la empresa con la prevención de incidentes, el control de riesgos laborales y la sostenibilidad ambiental, al garantizar el uso de elementos en óptimo estado que cumplan con las normas de seguridad industrial.

3.3. PROYECTO 3. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Se llevó a cabo la gestión correspondiente ante la CAR Cundinamarca, entidad que certifica que INCOMINERÍA S.A.S., titular de la concesión minera EDH-131, cuenta con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado y vigente hasta el 10 de julio de 2036, para la explotación de arcillas y materiales de construcción.

Luego de la revisión del expediente N.° 28324, se confirma que la empresa no presenta sanciones, medidas preventivas ni procesos sancionatorios vigentes. En consecuencia, no existen restricciones que limiten el desarrollo normal de las operaciones mineras dentro del área autorizada

4.1 PROYECTO 1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

EL transporte del concreto se realiza en mixer de concreto con capacidad de 7 y 10 m3 respectivamente. En el momento del cargue del material no se excede la capacidad de la carga lo cual evita demoras en el recorrido por aumento del peso. Se han establecido normas para el transporte, ingreso del material a la obra e instalación para evitar y minimizar impactos ambientales y de SST, entre estas se tienen: el material debe transportarse totalmente cubierto con el fin de evitar la dispersión de partículas suspendidas en la atmósfera en el transcurso de la cantera a la obra, control de velocidad al ingresar a la obra, certificación tecno mecánica de los vehículos vigente, uso de elementos de protección a conductores y señalización.

los períodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025 fue necesario la adquisición de materiales como: varilla, para esto se cuenta con lugar de almacenamiento temporal, este lugar está cubierto.

4.2 PROYECTO 2: MANEJO DE EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS

No se cuenta con planos de interferencia con otras redes, pero se está llevando a cabo con el asesoramiento por parte de la empresa de servicios públicos de municipio de La Vega por medio de un fontanero y de una ingeniera a cargo, encargados de brindarles la información del paso de las tuberías.

La instalación de la tubería se hace tan pronto se excava y así mismo se hace el relleno tan pronto se instala la tubería, se tiene la directriz de instalar todo el mismo día.

4.3 PROYECTO 3. EXPLOTACIÓN FUENTES DE MATERIALES

La CAR Cundinamarca certifica que INCOMINERIA S.A.S., titular de la concesión minera EDH–131, cuenta con un Plan de Manejo Ambiental aprobado vigente hasta el 10 de julio de 2036 para la explotación de arcillas y materiales de construcción. Tras la revisión del expediente 28324, se confirma que la empresa no tiene sanciones, medidas preventivas ni procesos sancionatorios vigentes. Por lo tanto, no existen restricciones que impidan el normal desarrollo de sus operaciones mineras en la zona autorizada. **(Anexo Certificación ambiental).**

4.4 PROYECTO 4. SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

En el periodo del presente informe se señalizo el tramo intervenido utilizando:

- Colombinas o delineadores tubulares
- 1 valla fija de información
- Maletines o barreras plásticas
- Señaléticas (control velocidad, maquinaria en la vía, senderos peatonales, entrada y salida de volquetas, inicio de obra, no pase)
- Malla tejida con cinta de peligro para protección y cerramiento alrededor del tramo

La señalización se realiza a diario, lo instala cada frente de trabajo teniendo en cuenta las actividades a realizar. La correcta instalación de la señalización es verificada por el inspector HSE y la profesional SST con el fin de cumplir con lo establecido en el PMT.



La entrada y salida de volquetas y maquinaria se regula por medio de barreras plásticas o maletines y señal de entrada y salida de volquetas. Cabe aclarar que solo se está laborando en horario diurno. Cuando se termina la jornada laboral se deja encerrado el tramo intervenido con cinta de peligro, colombinas y en los extremos maletines.

Las volquetas y maquinaria utilizadas en obra cuentan con alarma, pito y sistema de luces para indicar cuando dan reversa o como señal de precaución de la máquina trabajando.

Se está indicando mediante señales que la velocidad máxima permitida alrededor y en la obra es de 30 km/h, estas señales son reflectivas, esto aplica para las volquetas y maquinaria.

Se tienen señalizados los senderos peatonales cumpliendo con lo establecido de un ancho mínimo de 1 metro, en lo posible se trata de mantener despejado para no impedir la movilidad de la comunidad.

La señalización se deja instalada las 24 horas del día, con el fin de prevenir el acceso a los tramos intervenidos y cuidar así de los trabajadores y comunidad en general.

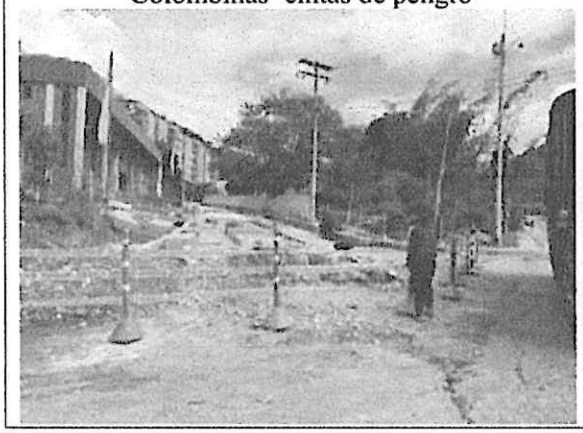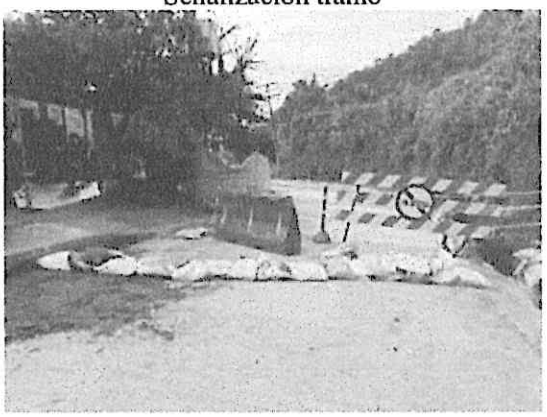Valla fija informativa 	Señalización tramo 
Colombinas- cintas de peligro 	Señalización tramo 

4.5 PROYECTO 5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

Durante este periodo no se desarrollaron las actividades de demolición, retiro de material ni excavación manual ni mecánica, por lo tanto, no se generan escombros y no fue necesario el uso del lote para la disposición de material resultante de la obra.


4.6 PROYECTO 6. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

En la obra se generan residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD). Entre los residuos ordinarios generados se tienen los empaques de los alimentos por parte de los trabajadores y algunos empaques y cajas de materiales utilizados en obra y de RCD se tienen principalmente residuos de demolición, excavación o mezclas sobrantes. Teniendo en cuenta lo establecido en el PMA se está realizando manejo adecuado a cada tipo de residuo.

Los residuos ordinarios generados como los empaques de algunos materiales utilizados en obra, envolturas de alimentos, botellas plásticas, papel de oficina y demás son recolectados y se disponen en el punto ecológico ubicado en la oficina del consorcio para su almacenamiento temporal para la posterior disposición final. Este punto ecológico consta de tres canecas una de color verde (residuos orgánicos), una blanca (residuos aprovechables) y una negra (residuos no aprovechables) según lo establece la Resolución 2184 de 2019.

La disposición final de los residuos sólidos ordinarios que se generan en la obra se realiza por parte de la unidad de servicios públicos del municipio de La Vega- Cundinamarca. ***(Anexo 13. Certificado disposición final residuos sólidos ordinarios).***

Se realizan charlas los días lunes, miércoles y viernes al personal de la obra en al cual se les refuerza el uso del punto ecológico, la clasificación en la fuente, el orden y aseo en el área de trabajo, la importancia del uso de las tres R para el ambiente y que disposición final se le está dando a los residuos generados en obra.

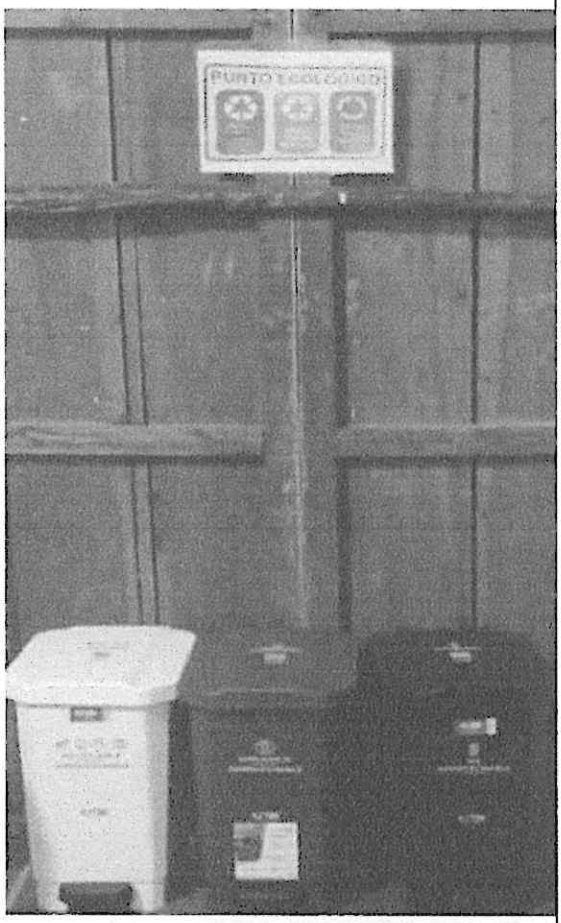Ilustración 10: Punto ecológico	*Ilustración 11: Recolección de residuos en la obra*
	
Fuente: Propia	***Fuente: Propia***

Recolección residuos sólidos en la obra



Fuente: Propia

4.7 PROYECTO 7. CONTROL AIRE Y RUIDO

Se ha realizado el suministro de protectores auditivos de inserción o de copa según el tipo de actividad que realicen cada uno de los operadores de la maquinaria, con el fin de ayudar a reducir la intensidad del ruido de los equipos y maquinarias utilizadas, evitando enfermedades laborales.

De igual manera, se restringió a los operadores el uso de bocinas de todos los vehículos que se encuentran vinculados a la obra y se les exige control de velocidad a 30km/h a los conductores de las volquetas por medio del Inspector Siso y a los conductores.

Se han realizado charlas recalcándoles a los trabajadores la importancia del uso correcto de elementos de protección personal. (Anexo ***11. Registro diario de asistencia a charlas de seguridad).***

Teniendo en cuenta que, en el desarrollo de las diferentes actividades de la obra, se requiere el uso de equipos y herramientas, se realiza inspección diaria de estas con el fin de verificar que su estado se encuentre en óptimas condiciones para su operación.

La inspección preoperacional la realiza el inspector SST con acompañamiento del operador de cada equipo y herramienta.

El registro de las inspecciones de seguridad de los equipos y herramientas se puede evidenciar en el (***Anexo 8. Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas***).

Es importante tener en cuenta que para efectuar actividades de demolición el tramo se encuentra cerrado en su totalidad y se ha acordonado con lona para controla la generación de material particulado.

4.8 PROYECTO 8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Se dispone de la mano de obra necesaria para la limpieza diaria por parte de los trabajadores del área operativa y se recogen los residuos sólidos especiales generados en obra: se tienen empaques de cemento, cintas de peligro, residuos de empaque de comida y botellas plásticas principalmente. Los cuales se están recolectando en bolsas negras, verdes y blancas. Así mismo y se almacenan de forma temporal en la oficina hasta que son acopiados para su disposición final por parte de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de La Vega.

4. PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HIDRICO

5.1 PROYECTO 1. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y DE ESCORRENTÍA

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2025, no fue necesario el uso del carrotanque para la humectación de la vía, debido a que las condiciones climáticas correspondieron a la temporada de lluvias, lo cual contribuyó al control de la dispersión del material particulado. No obstante, la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de La Vega continúa siendo la entidad encargada del suministro de agua requerido para el desarrollo de las diferentes actividades en la obra.

Tampoco fue necesario el uso de equipos de extracción de agua, ya que las precipitaciones no fueron de gran intensidad, evitando el estancamiento de agua en las zanjas. Además, las características del suelo han favorecido la adecuada absorción del agua.

Del mismo modo, los trabajadores suspenden sus actividades en caso de lluvias con el fin de preservar su seguridad y bienestar.

5.2 PROYECTO 2. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria se realiza en sitios autorizados por la alcaldía del municipio de La Vega por un profesional idóneo le haga el mantenimiento correspondiente. En este mes no se ha generado ningún derrame accidental

5. PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

6.1 PROYECTO 1. RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Para este periodo no hubo áreas intervenidas o afectadas por el proyecto, debido a que no están afectando áreas verdes, de igual manera no se está haciendo uso de plaguicidas para control de insectos, plagas y roedores por que no hubo frecuencia de los mismos.

6. PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

7.1 PROYECTO 1: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE SITIOS DE ACOPIO.

Para el almacenamiento de materiales construcción como el cemento se está colocando plástico para

la protección del material con el suelo.

No se cuenta con acopio temporal, ya que a medida que ingresa el material se va instalando, se tiene la directriz de instalar todo el mismo día por lo tanto no es necesario cubrir el material.

7.2 PROYECTO 2. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

La maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto es por parte de la alcaldía del municipio de La Vega y esta se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos. Las volquetas se solicita vigencia de documentos al iniciar actividad y se recomienda a los conductores mantenimiento preventivo para evitar algún tipo de accidente.

Para las actividades realizadas en el periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre se utilizó: Vibrocompactador, minicargador y (2) volquetas, antes de comenzar actividades se realizan inspecciones preoperacionales a la maquinaria a diario y se registra en un formato de la empresa en forma de talonario, este tiene logo, código, numeración. ***(Ver Anexo 6 Formato inspección preoperacional maquinaria).***

Las volquetas cuentan con los equipos de prevención y seguridad reglamentados donde el inspector en SST se encarga de realizar la inspección. De igual manera se encuentran totalmente cubiertas en el momento del transporte de material y carpada para así evitar la emisión de material particulado.

7. PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL

8.1 PROYECTO 1. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El consorcio cuenta con la oficina para la atención al público presencial la cual queda ubicada en carera 8° # 12-41 en el área urbana del municipio de La Vega. También se cuenta con el correo electrónico consorcioviacentenario2025@gmail.com, el número celular 3157814100 y un buzón de PQRS instalado en la alcaldía municipal de La Vega. Se hace revisión del buzón de PQR´S en la cual se evidencia que para este periodo no se recibe ninguna solicitud.

8.2 PROYECTO 4. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

En este periodo no se contrató ninguna persona adicional del área de influencia del proyecto. A continuación, se muestra actualizado el Listado de personal vinculado a la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO UCC 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA".

Tabla 1: Lista de empleados laborando actualmente con el consorcio vía Centenario 2025.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	MUNICIPIO DE PROCEDENCIA	CARGO
David Ricardo Rodríguez Buitrago	Tunja- Boyacá	Residente de obra
Mario Fernando Rubiano Sierra	Bogotá- Cundinamarca	Rep. Legal
María Paula Monsalve Moreno	Tunja- Boyacá	Especialista SST
Leonardo Ospina Tovar	La primavera- Vichada	Topógrafo
Carlos Andrés Ramírez Palacios	Ubala- Cundinamarca	Oficial
José Iván Lean Urrego	Bogotá- Cundinamarca	Oficial

Fuente: Propia


8. PROGRAMA 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9.1 PROYECTO 1. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En durante los períodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025 se implementaron actividades de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) contempladas en el sistema de gestión SST de la empresa. Las actividades desarrolladas se pueden contemplar en el numeral en el informe mensual de SST del presente informe.

MARIA PAULA MONSALVE MORENO
ESPECIALISTA HQSE
CONSORCIO VÍA CENTENARIO 2025
Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO UCC 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA- CUNDINAMARCA".

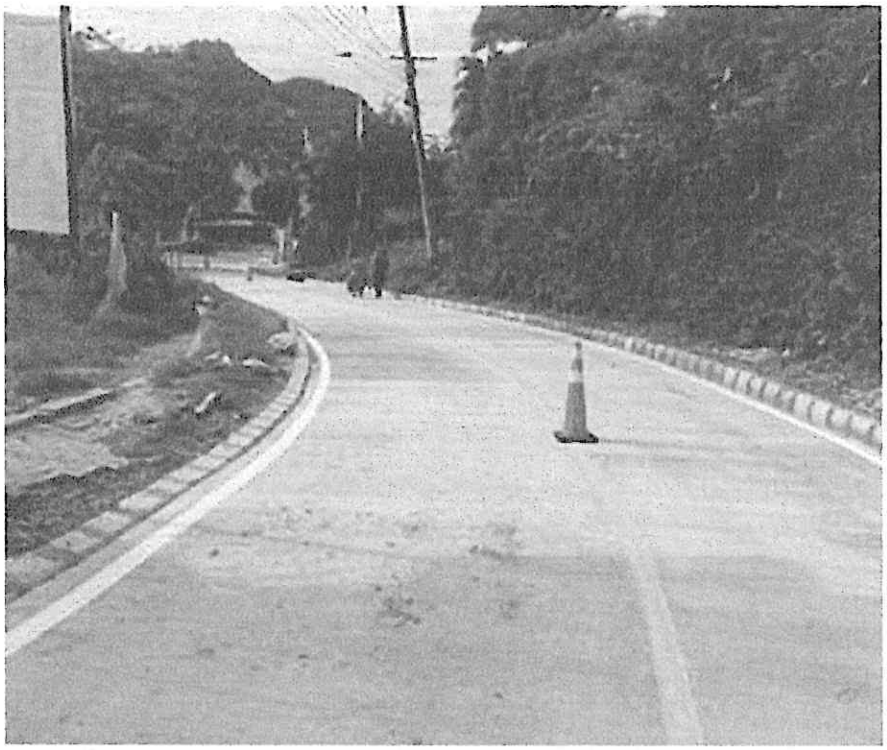

CONSORCIO VÍA CENTENARIO 2025

NIT: 901.924.708-1

R.L MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA

CONTRATISTA

INFORME MENSUAL SST
16 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 – 5 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100 e-mail: consorciovíacentenario2025@gmail.com

177

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRA 4
3.1. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRA 4
3.2.1.1 INGRESO PERSONAL 4
4. EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO 5
5. INDUCCIONES HSE 5
6. DOTACIÓN/EPP 5
6.1. INSPECCIONES MAQUINARIA 6
6.2. INSPECCIONES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7
6.3. INSPECCIONES ELEMENTOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 8
6.4. INSPECCIONES TRABAJO SEGURO 9
7. MEDEVAC 10
8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10
9. BIENESTAR TRABAJADORES 12
9.1. PUNTO DE HIDRATACIÓN 12
10. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES/CHARLAS HSE 13
10.1. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 13
10.2. CHARLAS HSE 14
11. PERMISOS DE TRABAJO 15
12. COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 15
12.1. REUNIÓN MENSUAL COPASST Y CCL 15
15.2 ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 17
13. SEÑALIZACIÓN 18
14. INDICADORES DE GESTIÓN 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recopila las actividades ejecutadas durante los períodos comprendidos entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre, y del 5 al 10 de noviembre de 2025, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), desarrolladas en la obra "Mejoramiento de la Carrera 3 entre Calle 23 y Calle 30, sector Barrio Centenario, Etapa 2, según Convenio UCC 780-2024 del Municipio de La Vega – Cundinamarca."

Este documento tiene como propósito evidenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación nacional vigente en materia de SST, así como los lineamientos internos del sistema implementado en la empresa y en el proyecto de obra.

Las actividades programadas para el mes se encuentran detalladas en el Anexo 1. Plan Anual de Trabajo, y se presentan junto con sus respectivas evidencias, demostrando el desarrollo efectivo de las acciones previstas para el periodo reportado.

2. OBJETIVO

Elaborar el informe mensual de ejecución de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondientes al mes de agosto y septiembre de 2025, describiendo las acciones implementadas y los resultados obtenidos en materia de SST dentro del tramo intervenido de la obra.

3. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRA

3.1. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRA

3.2.1.1 INGRESO PERSONAL

En el periodo comprendido desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre del presente año, para el desarrollo de las actividades de la obra no fue necesario el ingreso de nuevo personal en el periodo del presente informe.

Los certificados de las afiliaciones del personal anteriormente mencionado se encuentran en el **(Anexo 2. Soporte afiliaciones Personal Ingreso)**, también se encuentra en medio físico en el archivo ubicado en la oficina adaptada para el personal administrativo en la carpeta denominada "Documentos personal de obra Consorcio Vía Centenario 2025".

Tabla 1: Listado personal activo septiembre-octubre

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	ARL	EPS	AFP
ADMINISTRATIVO					
David Ricardo Rodríguez Buitrago	Residente de Obra	1020797397	Sura	Sanitas	Porvenir
Mario Fernando Rubiano Sierra	Representante Legal	1019068674	Sura	Compensar	Porvenir
María Paula Monsalve Moreno	Especialista SST	1049649280	Positiva	Sanitas	Colpensiones
OPERATIVA					
Leonardo Ospina Tobar	Topógrafo	1121914547	Sura	Sanitas	Porvenir
Carlos Andrés Ramírez Palacios	Director de obra	1070960963	Sura	Compensar	Porvenir
Jose Ivan Leon Urrego	Ayudante	11447549	Sura	Famisanar	Colpensiones
Jorge Alexander Castilblanco	Ayudante	3059476	Sura	Famisanar	Protección

Fuente: *Elaboración propia*

La vigencia de la seguridad social del personal de obra se verifica cada mes mediante las planillas de pago corroborando que corresponda al período correcto. Las planillas de pago se pueden verificar en el ***Anexo 2. Planillas seguridad social obra mes de septiembre y octubre.***

4. EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO

Durante el periodo comprendido entre los meses de agosto y septiembre no fue necesario realizar exámenes ocupacionales de ingreso, dado que no se presentaron ingresos de nuevo personal en este tiempo. En caso de efectuarse futuras vinculaciones, se procederá con la realización de los exámenes médicos ocupacionales correspondientes, conforme a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Vía Centenario 2025.

5. INDUCCIONES HSE

Durante el mes de agosto-septiembre no se realizaron inducciones ni reinducciones, debido a que no se presentaron ingresos de nuevos trabajadores durante este periodo. En caso de realizarse nuevas vinculaciones, se llevará a cabo el proceso de inducción correspondiente conforme al programa de inducción y reinducción del Consorcio Vía Centenario 2025.

6. DOTACIÓN/EPP

Durante el mes de agosto-septiembre se llevó a cabo la entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación al personal del área operativa y de maquinaria, en cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo. Esta actividad quedó registrada en el formato "Entrega y reposición de dotación y elementos de protección personal" (Anexo 5. Entrega de dotación y EPP – agosto-septiembre).

Los elementos de protección entregados al personal del área de maquinaria y operativa fueron los siguientes:

- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Gafas claras
- ✓ Guantes tela-nitrilo
- ✓ Guantes tipo vaqueta
- ✓ Protector auditivo tipo inserción
- ✓ Protector respiratorio

Es importante resaltar que durante el periodo también se realizaron reemplazos y/o cambios de EPP a los trabajadores por las siguientes causas:

- Deterioro por uso o vejez
- Daño de los elementos
- Deficiencias que afectaban la protección
- Adecuación a la actividad ejecutada

Para el mantenimiento de algunos EPP como el casco y las botas los trabajadores realizan lavado constante, ya que debido a la actividad permanece sucio y esto podría generar alguna alergia o reacción negativa hacia la salud.

+INSPECCIONES DE SEGURIDAD

6.1. INSPECCIONES MAQUINARIA

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de diferentes actividades para el mejoramiento de la vía se requiere del uso de maquinaria, en el mes de agosto se realizaron inspecciones preoperacionales de seguridad para comprobar su funcionamiento y por ende prevenir algún tipo de accidente generado por alguna falla. Con las inspecciones se realizaron charlas al operador de temas de SST recalcando se eviten los actos inseguros, el exceso de confianza y el obligatorio cumplimiento las normas de seguridad vial. Cabe mencionar que la maquinaria utilizada en obra en el periodo comprendido desde 16 de septiembre al 10 de octubre de 2025 – 5 de noviembre al 10 de noviembre de 2025, durante este periodo no utilizo maquinaria.

El registro de las inspecciones de seguridad de la maquinaria realizadas en el mes de agosto-septiembre se puede evidenciar en el ***Anexo 7. Inspecciones preoperacionales de maquinaria.***

6.2. INSPECCIONES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de las diferentes actividades de la obra se requiere el uso de equipos y herramientas se realiza inspección diaria de estas con el fin de verificar que su estado se encuentre en óptimas condiciones para su operación y no se genere ningún accidente de trabajo ocasionado por el estado de la herramienta.
Los equipos y herramientas utilizadas en obra en el periodo del presente informe fueron:


Tabla 3: Listado maquinaria utilizada en obra

DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OPERADOR
Pulidora	Oficiales y ayudantes de obra
Trompo mezclador	Oficiales y ayudantes de obra
Estación de topografía y mira	Topógrafo y auxiliar
Herramientas manuales (palas, picas, carretillas, flexómetro, palustre, puntero, segueta, serrucho, masetas, baldes, entre otras)	Oficiales y ayudantes de obra


Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

La inspección preoperacional la realiza el inspector HSE con acompañamiento del operador de cada equipo y herramienta y/o con la profesional SST de la obra.

Figura 10. Registro fotográfico Inspección preoperacional equipos y herramientas

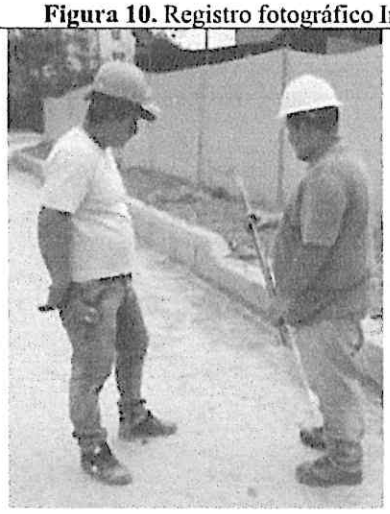

Inspección preoperacional

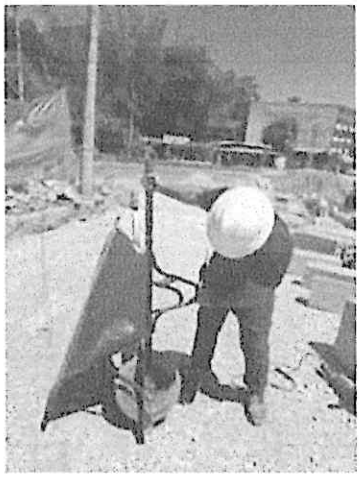

Inspección preoperacional

El registro de las inspecciones de seguridad de los equipos y herramientas manuales utilizadas se puede evidenciar en el ***Anexo 6. Inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas***.

6.3. INSPECCIONES ELEMENTOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Con el fin de verificar el estado de los elementos de emergencia para el caso de cualquier eventualidad se realizan inspecciones mensuales del botiquín, camilla y extintor. Las inspecciones realizadas en el mes de agosto-septiembre a los elementos de emergencia se les verifica si han sido utilizados, fechas de vencimiento, estado del contenido, entre otros. La inspección preoperacional la realiza el inspector HSE junto con el operario. Se realiza inspección de elementos de emergencia de la oficina y de cada una de las máquinas que operan en obra.

El registro de las inspecciones de seguridad de los equipos y herramientas del periodo del presente informe se puede evidenciar en el ***Anexo 7. Inspecciones preoperacionales elementos atención de emergencia.***

Figura 15. Registro fotográfico Inspección preoperacional elementos atención de emergencias

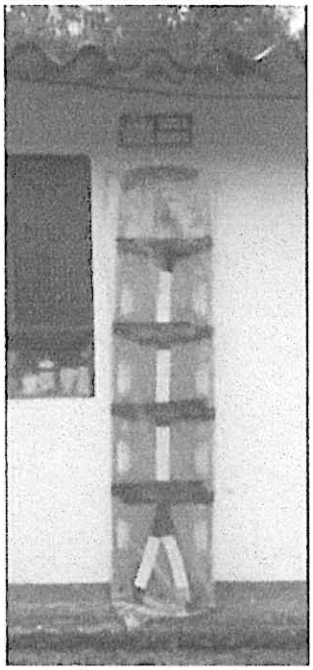
Ilustración 16: Inspección camilla	*Ilustración 17: Inspección extintor*
	
Fuente: Propia	***Fuente: Propia***

Ilustración 20: Inspección de camilla e inmobilizador






Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

6.4. INSPECCIONES TRABAJO SEGURO

En el mes de agosto-septiembre se realizaron inspecciones en cada una de las áreas de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento por parte de los trabajadores de las normas de seguridad como lo son: el uso adecuado de la dotación y EPP, operación adecuada de las herramientas y equipos, orden y aseo del área de trabajo, trabajo seguro y señalización adecuada.

Figura 8. Registro fotográfico Inspección trabajo seguro

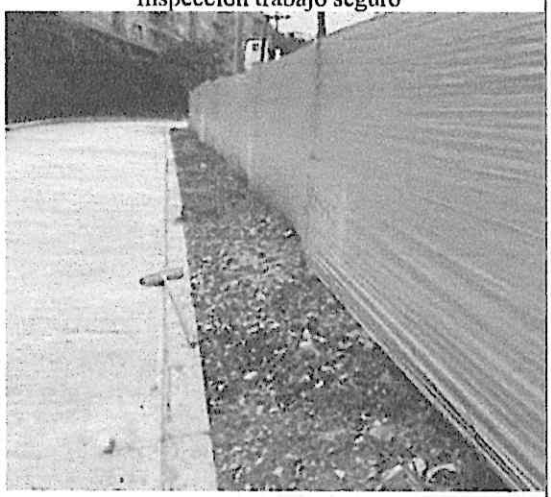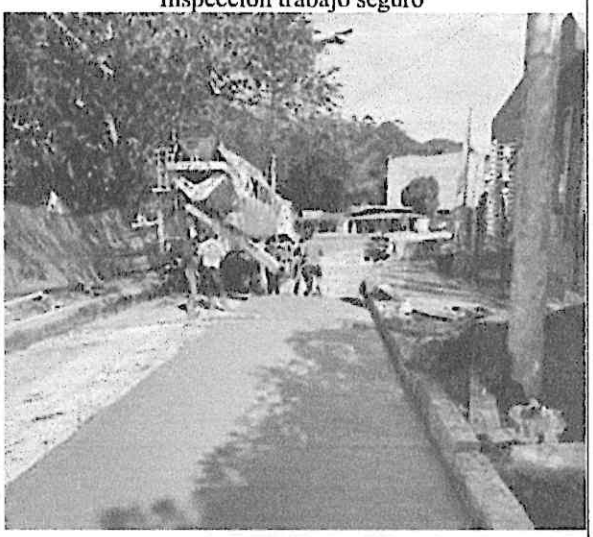Inspección trabajo seguro	Inspección trabajo seguro
	

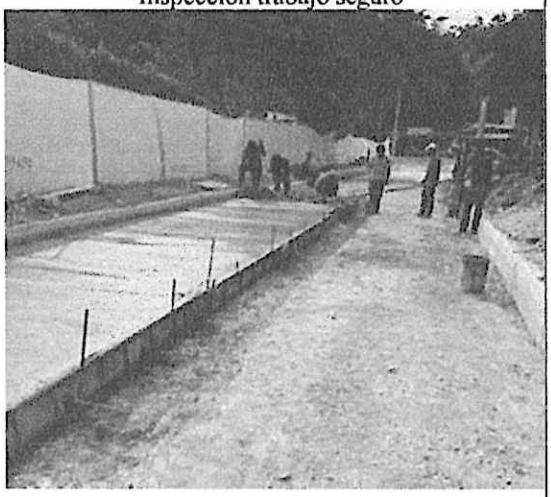Inspección trabajo seguro	Inspección trabajo seguro
	

7. MEDEVAC

Se cuenta con un formato Medevac (FT-SST-054) el cual contiene la información de cada trabajador del consorcio dependientes y contratistas que se encuentran en la obra, en caso de que se presente una emergencia. La información con la que cuenta este formato es: nombre, número de cedula, cargo, grupo sanguíneo, numero de celular, información entrenamiento primeros auxilios, datos de un contacto en caso de emergencia, medicamentos que consume, entre otros.

El formato Medevac permite clasificar la información y establecer su atención y también registrar la emergencia con el fin de establecer su atención y también registrar la emergencia con el fin de establecer indicadores de primeros auxilios. Este registro se puede observar en ***Anexo 8. Medevac.***

8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS


En la obra se generan residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD). Entre los residuos ordinarios generados se tienen los empaques de los alimentos por parte de los trabajadores y algunos empaques y cajas de materiales utilizados en obra y de RCD se tienen principalmente residuos de demolición o mezclas sobrantes. Teniendo en cuenta lo establecido en el PM se está realizando manejo adecuado a cada tipo de residuo.

Los residuos ordinarios generados como los empaques de algunos materiales utilizados en obra y envolturas de alimentos, botellas y demás son recolectados y se disponen temporalmente en el punto ecológico ubicado en la oficina del consorcio. Este punto ecológico consta de tres canecas una de color verde (residuos orgánicos), una blanca (residuos aprovechables) y una negra (residuos no aprovechables) según lo establece la Resolución 2184 de 2019. La disposición final de los residuos sólidos ordinarios que se generan en la obra se realiza por parte de la unidad de servicios públicos del municipio de La Vega- Cundinamarca. A continuación, se evidencia mediante registro fotográfico la recolección de residuos en la obra, el uso del punto ecológico y la disposición de RCD en predio autorizado.

Figura 19. Registro fotográfico Manejo Residuos sólidos en obra




Recolección residuos sólidos en la obra

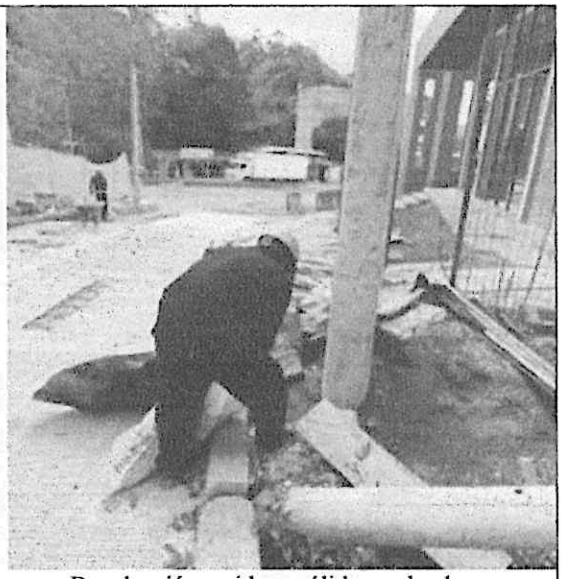

Recolección residuos sólidos en la obra

Uso punto ecológico

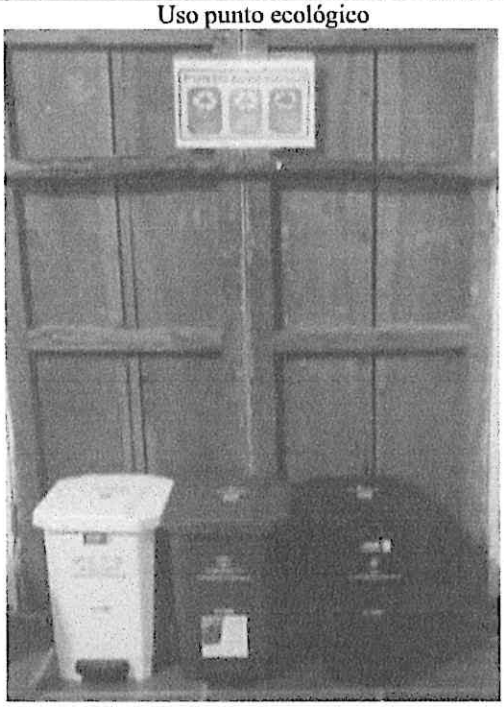

Uso punto ecológico

Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

9. BIENESTAR TRABAJADORES

9.1. PUNTO DE HIDRATACIÓN

Se cuenta con punto de hidratación, teniendo en cuenta el tipo de actividades que se desarrollan y el clima del municipio, puesto que los trabajadores están expuestos al calor durante el transcurso del día.

Esto con el fin de implementar medidas para minimizar la sensación térmica y evitar al máximo riesgos a la salud y que las personas padezcan estrés por calor, velando por la salud y bienestar de los trabajadores.

El punto de hidratación se encuentra en la oficina del consorcio debidamente señalizados, en donde se les recarga en botellas plásticas en horas de la mañana y a medio día o cuando consideren necesario.

Se les recalca en las charlas diarias la importancia de hidratarse debidamente.

Figura 11. Registro fotográfico punto de hidratación



Punto de hidratación

Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

10. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES/CHARLAS HSE

10.1. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Teniendo en cuenta lo establecido en el cronograma de capacitaciones (***Anexo 3. Cronograma de capacitaciones*** **Consorcio Vía Centenario 2025***)* en el mes de agosto- septiembre se realizaron las siguientes:

- COPASST y CCL: Esta fue realizada y orientada por el inspector HSE, tuvo una duración de 2 horas.
- Capacitación prevenir accidentes o enfermedades de tipo laboral: Orientada por el inspector HSE, tuvo una duración de 1 hora. De igual manera se les hizo una actividad sobre la identificación de plabras de SST a través de una sopa de letras



El registro de asistencia a las capacitaciones de puede evidenciar en el ***Anexo 9. Registro capacitaciones y charlas SST.***

10.2. CHARLAS HSE

En el mes de agosto- septiembre se realizaron charlas los días lunes, miércoles y viernes en temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, estas charlas tuvieron una duración de diez (10) minutos y se desarrollaron al inicio de la jornada laboral, asistió todo el personal y fueron dirigidas por el inspector HSE.

Los temas tratados en las charlas en el periodo del presente informe se relacionan y soportan mediante registro fotográfico y registro de asistencia ***(Anexo 9. Registro capacitaciones y charlas SST)***

Figura 12. Registro fotográfico charlas HSE

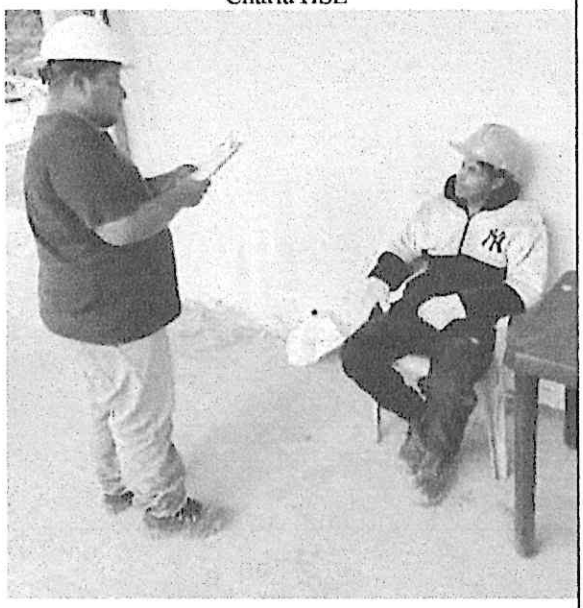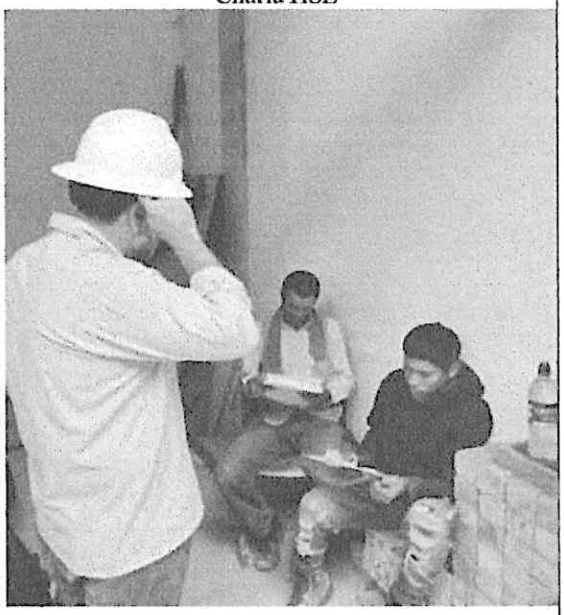Charla HSE	Charla HSE
	

Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

Se realizó actividad en la cual se le pedía a los trabajadores que participaran en el juego de la sopa de letras identificando palabras en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto con el fin de evaluar si tienen claro el concepto de cada uno.

11. PERMISOS DE TRABAJO

En las actividades que se realizaron en el mes de agosto-septiembre solo se requirieron Análisis de trabajo seguro, no se necesitó ningún otro permiso adicional. Este permiso es un análisis completo del paso a paso de la actividad realizado por el profesional de SST, donde se evidencia que recursos son necesarios para desarrollarla, que peligros conlleva, que consecuencias tienen y qué acciones se desarrollan para prevenir un accidente de trabajo.

Las actividades realizadas en el mes de agosto-septiembre fueron las siguientes:

- Levantamiento topográfico
- Suministro e instalación de sardinel
- Instalación de concreto

Los permisos de trabajo se pueden evidenciar en el ***Anexo 16. Permisos de trabajo agosto-septiembre.***

12. COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

12.1. REUNIÓN MENSUAL COPASST Y CCL

Se realizó reunión de comités, en el lugar de reunión de los trabajadores, asistieron todos los miembros y se trataron los siguientes temas:

COPASST:

- Capacitaciones SST en el mes
- Cantidad de charlas de SST en el mes
- Seguimiento objetivos y metas
- Actividades de seguimiento plan anual de trabajo 2025
- Actividades de seguimiento a los programas de vigilancia epidemiológica PVE
- Inspecciones de seguridad
- Actos y condiciones inseguras reportados
- Seguimiento al ausentismo laboral
- Actividades de promoción participación y consulta
- Seguimiento e investigación a los accidentes laborales. Revisión de indicadores, incidencia, prevalencia.

- Inducciones y reinducción que se hayan realizado al mes.
- Personal de ingreso y egreso
- Seguimiento a la programación de exámenes laborales y seguimiento a las recomendaciones
- Seguimiento a las enfermedades laborales
- Seguimiento a la entrega de dotación
- Normatividad legal del mes

CONVIVENCIA LABORAL:

- Capacitaciones relacionadas a la mejora de ambiente laboral
- Charlas relacionadas a convivencia laboral
- Campañas relacionadas a la convivencia laboral
- Casos por discriminación
- Casos por aislamiento laboral
- Casos respecto a tareas asignadas
- Casos por rebajar funciones del trabajador
- Casos de culpabilizar al trabajador
- Casos por falta de respeto e insultos
- Casos de difamación personal o laboral
- Seguimiento a casos activos
- Seguimiento a las recomendaciones de informe de batería de riesgo psicosocial
- Actividades de convivencia
- Pausas activas lúdicas

Los temas mencionados anteriormente serán los que se tratarán en las reuniones mensuales.

PAL


15.2 ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En caso de presentarse una emergencia se disponen de los siguientes elementos para la atención inmediata:

- Camilla
- Botiquín
- Inmovilizador de cuello
- Extintor

Todos se encuentra en buenas condiciones y señalizados, en lugares visibles y de fácil acceso.

Figura 13. Registro fotográfico elementos atención de emergencias

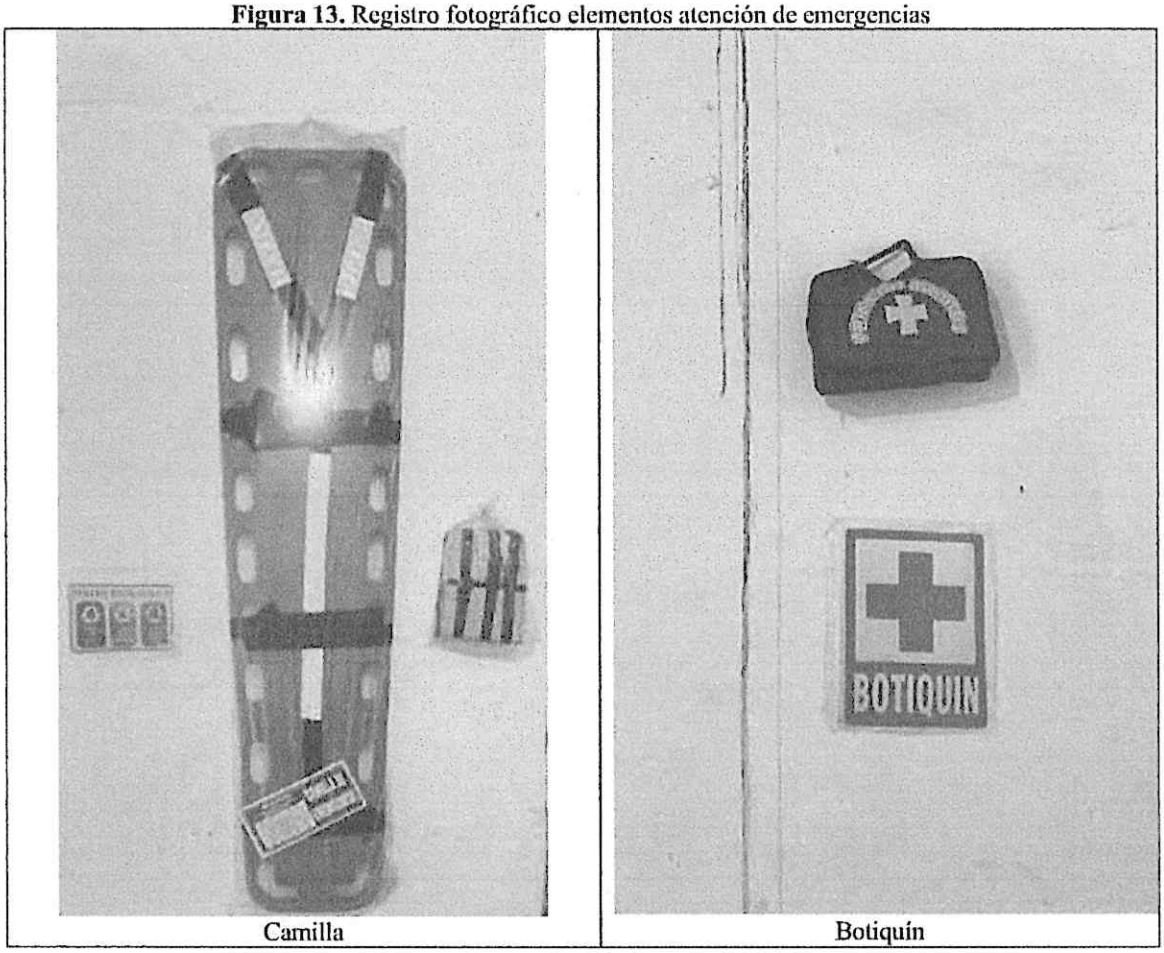

Camilla | Botiquín

Fuente: Consorcio Vía Centenario 2025

13. SEÑALIZACIÓN



En el periodo del presente informe se señalizó los tramos intervenidos utilizando:

- Colombinas
- 1 valla fija
- Maletines o barreras plásticas
- Señaléticas (control velocidad, desvío, senderos peatonales, entrada y salida de volquetas, inicio de obra, final de obra, no pase)
- Cinta de peligro alrededor de los tramos

La señalización se realiza a diario, lo instala cada frente de trabajo teniendo en cuenta las actividades a realizar. La correcta instalación de la señalización es verificada por el inspector HSE y la profesional SST con el fin de cumplir con lo establecido.

En cuanto a la señalización utilizada en caso de presentarse una emergencia se cuenta con punto de encuentro, salidas de emergencia y la instalada en cada elemento de atención.

Figura 12. Registro fotográfico señalización obra

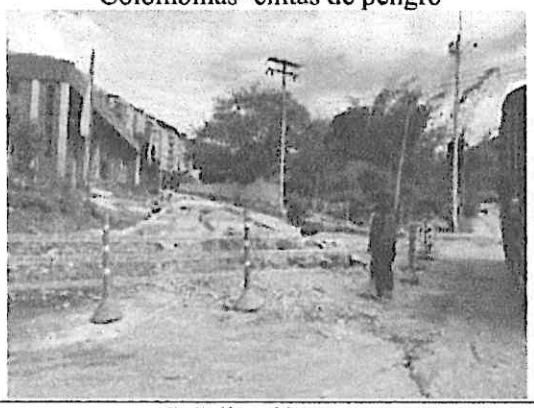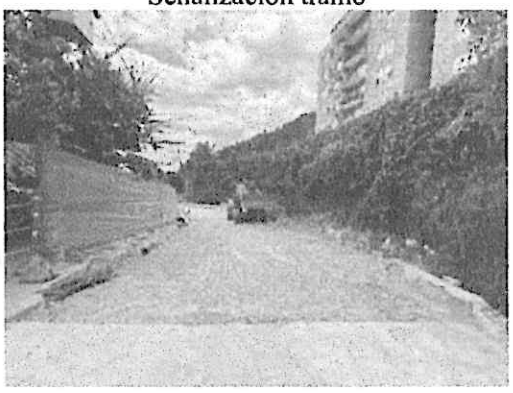Valla fija informativa	Señalización tramo
	
Colombinas- cintas de peligro	Señalización tramo
	
Señalización tramo	Señalización tramo

Fuente: *Consorcio Vía Centenario 2025*

14. INDICADORES DE GESTIÓN

Se realiza evaluación de los indicadores mínimos de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo resultados satisfactorios debido a que no hubo ninguna eventualidad en el mes de septiembre, octubre y noviembre. La evaluación de los indicadores se puede observar en el ***Anexo 11. Indicadores Mínimos Res 0312- 19.***

MARIA PAULA MONSALVE MORENO
PROFESIONAL HQSE
CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-057
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA	**Fecha:** Junio 11 de 2025	
	Versión: 001	
	Página **1** de **1**	

Fecha de la inspección: Septiembre - Octubre 2025

Ubicación del Botiquín	Interior Campamento				Ubicación de la camilla						
Marqué con una X según las condiciones observadas:											
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI		NO	X	Localizado en lugar visible?	SI	X	NO			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	+	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X	NO			
Fecha de recepción de elementos del botiquín					El material del botiquín es:		Lona			Metálico	

INSPECCIÓN BOTIQUÍN

	Descripción del elemento	B	R	M	No se tiene	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	X					
2	Manual uso de botiquín				X		
3	Collar cervical	X				1 Und.	
4	Guantes de látex/nitrilo	X				1 caja	
5	Suero fisiológico	X				1 Und	
6	Gasa estéril	X				24 Und.	
7	Apósito de algodón estéril	X				30 Und.	
8	Venda triangular tipo cabestrillo				X		
9	Venda de algodón				X		
10	Venda elástica	X				5 rollos	
11	Tapabocas	X				1 caja	
12	Esparadrapo de tela	X				1 rollo	
13	Aplicadores de algodón	X				50 Und.	
14	Curas	X				50 Und	
15	Bajalenguas	X				24 Und	
16	Parches oculares				X		
17	Termómetro	X				1 Und	
18	Linterna	X				1 Und	
19	Tijera trauma	X				1 Und.	
20	Máscara de reanimación RCP				X		
21	Alcohol aséptico	X				1T: 700 ml	
22	Jabón Líquido	X				1T: 600 ml	
23	Toalla higiénica	X				10 Und.	
24	Jeringa	X				1 Und.	
25	Pito	X				1 Und	
26	Agua mineral	X				600 ml	
27	Bisturí	X				1 Und	
28	Preservativo	X				1 Und	

*Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN CAMILLA

	Descripción del elemento	B	M	R	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Señalización	X				
3	Estado del soporte	X				
4	Correas de seguridad	X				
5	Sujetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

INSPECCIONÓ:	
NOMBRE	Maria Paula Monsalve
FIRMA	Maria Paula Monsalve
CARGO	Residente SST

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-057
MARIA PAULA MONSALVE RESPONSABLE SG-SST	MARIA PAULA MONSALVE RESPONSABLE SG-SST	MARIO FERNANDO RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL	Fecha de modificación: Junio 11 de 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-057
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA	**Fecha:** Junio 11 de 2025	
	Versión: 001	
	Página **1** de **1**	

Fecha de la inspección:	Noviembre 2025										
Ubicación del Botiquín	Interior campamento			Ubicación de la camilla							
Marque con una X según las condiciones observadas:											
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI		NO	X	Localizado en lugar visible?	SI	X	NO			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO		El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X	NO			
Fecha de recepción de elementos del botiquín					El material del botiquín es:	Lona		Metálico			

INSPECCIÓN BOTIQUÍN

	Descripción del elemento	B	R	M	No se tiene	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	X					
2	Manual uso de botiquín				X		
3	Collar cervical	X				1 Und	
4	Guantes de látex/nitrilo	X				1 caja	
5	Suero fisiológico	X				1 Und	
6	Gasa estéril	X				24 Und	
7	Apósito de algodón estéril	X				70 Und	
8	Venda triangular tipo cabestrillo				X		
9	Venda de algodón				X		
10	Venda elástica	X				5 rollos	
11	Tapabocas	X				1 caja	
12	Esparadrapo de tela	X				1 rollo	
13	Aplicadores de algodón	X				50 Und	
14	Curas	X				50 Und	
15	Bajalenguas	X				24 Und	
16	Parches oculares				X		
17	Termómetro	X				1 Und	
18	Linterna	X				1 Und	
19	Tijera trauma	X				1 Und	
20	Máscara de reanimación RCP				X		
21	Alcohol aséptico	X				1T=700mL	
22	Jabón Líquido	X				1T=600mL	
23	Toalla higiénica	X				10 Und	
24	Jeringa	X				1 Und	
25	Pito	X				1 Und	
26	Agua mineral	X				600 mL	
27	Bisturí	X				1 Und	
28	Preservativo	X				1 Und	

*Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN CAMILLA

	Descripción del elemento	B	M	R	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2	Señalización	X				
3	Estado del soporte	X				
4	Correas de seguridad	X				
5	Sujetadores para agarre	X				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				

INSPECCIONÓ:	
NOMBRE	Maria Paula Monsalve
FIRMA	Maria Paula Monsalve
CARGO	Residente SST

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
MARIA PAULA MONSALVE RESPONSABLE SG-SST	MARIA PAULA MONSALVE RESPONSABLE SG-SST	MARIO FERNANDO RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL	**Código:** FT-SST-057 **Fecha de modificación:** Junio 11 de 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	REGISTRO DIARIO DE CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-055
		Versión:	001

Objetivo: Sensibilizar e informar a los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

OBRA: Mejoramiento de la Carrera 3 entre calle 23 y calle 30 Sector Barrio Centenario Etapa 2.

SEMANA DEL 16-09-2025 **AL** 20-09-2025

TEMAS TRATADOS	
Lunes	Uso Correcto de EPP.
Martes	"
Miércoles	Orden de Aseo
Jueves	"
Viernes	Prevencion en Caidas.
Sábado	"

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	DÍA DE LA SEMANA												FIRMA DEL TRABAJADOR
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Leonardo Ospina	1121914547	X				X				X				Leonardo Ospina
Juan Ivan Leon	11.447.549	X				X				X				Juan.
Alexander Castiblanco	3.059.476	X				X				X				
David Rodriguez	1.020.797.397	X				X				X				David R.
Servando Monsalve	79.244.156	X				X				X				Servando M.

RESPONSABLES DE LA CHARLA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DEL RESPONSABLE DE LA CHARLA

Elaboró: María Paula Monsalve Moreno	María Paula Monsalve Moreno	Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	REGISTRO DIARIO DE CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-055
		Versión:	001

Objetivo: Sensibilizar e informar a los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

OBRA: Mejoramiento de la Carrera 3 entre Calle 23 y calle 30 Sector Barrio Centenario Etapa 2.

SEMANA DEL 22-09-2025 **AL** 27-09-2025

TEMAS TRATADOS	
Lunes	Uso Correcto de EPP.
Martes	// / / / /
Miércoles	Orden Aseo
Jueves	// // // // //
Viernes	Prevencion en Caidas
Sábado	// // // // //

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	DÍA DE LA SEMANA												FIRMA DEL TRABAJADOR
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Leonardo Ospina	1121914547	X				X				X				Leonardo Ospina
Juan Ivan León	11.447.549	X				X				X				Juan.
Alexander Castiblanco	3.059.476	X				X				X				Alexander C.
David Rodriguez	1.020.797397	X				X				X				David R.
Servando Monsalve	79.244.156	X				X				X				Servando M.

RESPONSABLES DE LA CHARLA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DEL RESPONSABLE DE LA CHARLA

Elaboró: María Paula Monsalve Moreno	María Paula Monsalve Moreno	Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	REGISTRO DIARIO DE CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-055
		Versión:	001

Objetivo: Sensibilizar e informar a los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

OBRA: Mejoramiento de la Carrera 3 entre Calle 23 y calle 30 Sector Barrio Centenario Etapa 2.

SEMANA DEL 29-09-2025 **AL** 04-10-2025.

TEMAS TRATADOS	
Lunes	Ergonomia de Trabajo
Martes	
Miércoles	Manejo de Herramientas
Jueves	
Viernes	Fatiga y Pausas Activas.
Sábado	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	DÍA DE LA SEMANA												FIRMA DEL TRABAJADOR
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
David Rodriguez	1.020.797.397	X				X				X				David R.
Leonardo Ospina	1.121.914.547	X				X				X				Leonardo Ospina
Alexander Castiblanco	3.059.476	X				X				X				Alexander C.
Jose Luis Leon	11.447.549	X				X				X				Jose Luis
Servando Monsalve	79.244.136	X				X				X				Servando M.

RESPONSABLES DE LA CHARLA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DEL RESPONSABLE DE LA CHARLA

Elaboró: María Paula Monsalve Moreno	María Paula Monsalve Moreno	Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

200

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	REGISTRO DIARIO DE CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-055
		Versión:	001

Objetivo: Sensibilizar e informar a los trabajadores sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

OBRA: Mejoramiento de la Carrera 3 entre Calle 23 y calle 30 Sector Barrio Centenario Etapa 2.

SEMANA DEL 05-11-2025 **AL** 08-11-2025.

TEMAS TRATADOS	
Lunes	— " — " — " —
Martes	— " — " — " —
Miércoles	-Prevención de Incidentes
Jueves	Señalizacion Vial
Viernes	Control de Ingreso de Personas.
Sábado	— " — " —

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	DÍA DE LA SEMANA												FIRMA DEL TRABAJADOR
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
David Rodriguez	1.020.779.397					X		X		X				David R.
Leonardo Ospina	1121.914.547					X		X		X				Leonardo Ospina
Iuan Leon	11.447.549					X		X		X				Iuan.
Alexander Castiblanco	3059.476					X		X		X				Alexander C.
Servando Monsalve	99.244.156					X		X		X				Servando M.

RESPONSABLES DE LA CHARLA	

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DEL RESPONSABLE DE LA CHARLA

Elaboró: María Paula Monsalve Moreno	María Paula Monsalve Moreno	Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

201

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-056
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	**Fecha:** Junio 11 de 2025 **Versión:** 001 Página **1** de **1**	

REALIZADO POR: Maria Paula Monsalve

CARGO: Residente SST **FECHA DILIGENCIAMIENTO:** 06-11-2025 **HORA:** 8:00 am.

OBJETIVO: Verificar las condiciones y mantenimiento de los extintores.

EXTINTOR No. 01 **TIPO DE EXTINTOR** ABC **UBICACION** Interior Campamento

DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES DE INSPECCION
RECIPIENTE				
Prueba hidrostática o fecha de fabricación				
Corrosión	X			
Estado del contenedor abolladuras)	X			
Condición de pintura	X			
Reparaciones (soldaduras)	X			
Roscas (corroídas, torcidas)	X			
Soporte o agarradera	X			
Superficie sellada (muescas)	X			
Etiqueta (legible, ilegible)	X			
BOQUILLA				
Condiciones en general	X			
Salida	X			
Roscas (Gastadas, torcidas)	X			
MANGUERA				
Condiciones en general	X			
Acoples o unión giratoria	X			
Roscas	X			
Tubo interno	X			
VALVULA (MANOMETRO)				
Condiciones del cristal	X			
Corrosión	X			
Indicador	X			
Cuadrante (legible, descolorido)	X			
MANIJA				
Oreja	X			
Manija	X			
Pasador	X			
Abrazaderas (sueltas, gastadas)	X			
UBICACION				
Altura (1,50 mts, máx. 10 cms. Min)	X			
Sitio correcto	X			
Tipo correcto al riesgo suficiente	X			
Señalización	X			
VARIOS				
Fecha de vencimiento	X			Septiembre 2026
Fecha de recargue	X			Septiembre 2025
Operable	X			
Lectura del peso	X			
Condiciones del agente	X			

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SE TOMARON

ACCIÓN	RESPONSABLE

ESTADO	CARACTERISTICAS
Bueno	estado óptimo estético y funcional
Regular	Estado estético regular pero funcional
Malo	Estado estético malo, no funcional

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-008
MARIA PAULA MONSALVE MORENO RESPONSABLE SG-SST	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA	MARIO FERNANDO RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL	Fecha de modificación: junio 11 de 2025

202

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-056
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	**Fecha:** junio 11 de 2025	
	Versión: 001	
	Página **1** de **1**	

REALIZADO POR: Maria Paula Monsalve

CARGO: Residente SST FECHA DILIGENCIAMIENTO: 07-10-25 HORA: 8:00 a m

OBJETIVO: Verificar las condiciones y mantenimiento de los extintores.

EXTINTOR No. 01 TIPO DE EXTINTOR ABC UBICACION Interior Campamento

DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES DE INSPECCION
RECIPIENTE				
Prueba hidrostática o fecha de fabricación	X			
Corrosión	X			
Estado del contenedor abolladuras)	X			
Condición de pintura	X			
Reparaciones (soldaduras)	X			
Roscas (corroldas, torcidas)	X			
Soporte o agarradera	X			
Superficie sellada (muescas)	X			
Etiqueta (legible, ilegible)	X			
BOQUILLA				
Condiciones en general	X			
Salida	X			
Roscas (Gastadas, torcidas)	X			
MANGUERA				
Condiciones en general	X			
Acoples o unión giratoria	X			
Roscas	X			
Tubo interno	X			
VALVULA (MANOMETRO)				
Condiciones del cristal	X			
Corrosión	X			
Indicador	X			
Cuadrante (legible, descolorido)	X			
MANIJA				
Oreja	X			
Manija	X			
Pasador	X			
Abrazaderas (sueltas, gastadas)	X			
UBICACION				
Altura (1,50 mts, máx. 10 cms. Min)	X			
Sitio correcto	X			
Tipo correcto al riesgo suficiente	X			
Señalización	X			
VARIOS				
Fecha de vencimiento	X			Septiembre 2026.
Fecha de recargue	X			Septiembre 2025
Operable	X			
Lectura del peso	X			
Condiciones del agente	X			

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE SE TOMARON

ACCION	RESPONSABLE

ESTADO	CARACTERISTICAS
Bueno	estado óptimo estético y funcional
Regular	Estado estético regular pero funcional
Malo	Estado estético malo, no funcional

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-008
MARIA PAULA MONSALVE MORENO RESPONSABLE SG-SST	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA	MARIO FERNANDO RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL	Fecha de modificación: Noviembre 07 de 2025

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR	**Fecha:** Junio 11 de 2025	
	Versión: 001	
	Página **1** de **1**	

PROYECTO: Mejoramiento (VO)	**ACTIVIDAD:** Concreto 3000 PSI	**CONTRATISTA:** Vía Centenario 2025.
NOMBRE DEL OPERADOR:	**MINICARGADOR No:**	
MARCA:	**MODELO:**	**SERIE:** Minicargador bobcat.
FECHA INICIAL: 22-09-2025	**FECHA FINAL:** 27-09-2025.	

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras									X					
Luces traseras									X					
Cinturón de seguridad									X					
Barra antivolco									X					
Silla									X					
Indicadores									X					
Horómetro									X					
Pito de mano									X					
Pito de reversa									X					
Guantera									X					
Retrovisor									X					
Palancas de mando									X					
Pedales									V					
Gato hidráulico									X					
Cucharón									X					
Control de fugas hidráulicas									X					
Agua de motor									V					
Batería									X					
Correas de motor									X					
Alternador									X					
Arranque									X					
Mangueras									X					
Exhostos									V					
Radiador									V					
Filtros									X					
Graceritas									X					
Puerta									X					
Aceite hidráulico									X					
Aceite de motor									X					
Tanque de combustible									V					
Protector radiador									X					
Llantas traseras									X					
Llantas delanteras									X					
Estado de herramienta									X					
Extintor									X					
Botiquín									X					
Gato-cruceta									X					
Conos									X					
¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Maria Paula Monsalve	**CARGO:** Residente SISO

Elaboró: **MARIA PAULA MONSALVE** **RESPONSABLE SG-SST**	**Revisó:** **DAVID RICARDO RODRÍGUEZ** **DIRECTOR**	**Aprobó:** **MARIO FERNANDO RUBIANO** **REPRESENTANTE LEGAL**	**Código:** FT-SST-065 **Fecha de modificación:** Junio 11 de 2025

2021

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-068
	Estándar E1.1.6	
FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR	**Fecha:** Junio 11 de 2025	
	Versión: 001	
	Página **1** de **1**	

PROYECTO: Mejoramiento Cra 3	**ACTIVIDAD:** Concreto 3000 PSI	**CONTRATISTA:** Vía Centenario 2025
NOMBRE DEL OPERADOR:	**VIBROCOMPACTADOR No:** 171428	
MARCA: Master.	**MODELO:**	**SERIE:** Vibrador Concreto
FECHA INICIAL: 16-09-2025	**FECHA FINAL:** 19-09-2025.	

DESCRIPCIÓN	DÍA DE INSPECCIÓN													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Motor					X									
Tanque combustible					X									
Guardas de seguridad					X									
Nivel de combustible					X									
Tubo de escape					X									
Tubo de admisión					X									
Filtro de aire					X									
Filtro de gasolina					X									
Guayas					X									
Guardapolvos					X									
Zapatas					X									
Cubierta Amortiguador					X									
¿EL EQUIPO SE PUEDE USAR?	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: María P. Monsalve **CARGO:** Residente SISO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-068
MARIA PAULA MONSALVE RESPONSABLE SG-SST	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ DIRECTOR	MARIO FERNANDO RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL	Fecha de modificación: Junio 11 de 2025

205

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	MEDEVAC	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-054
		Versión:	001

DIRECTORIO TELEFÓNICO INTERNO (Brigadistas)

Responsable	Rol	Dirección	Celulares	Correo

INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ENTIDAD	ALCANCE	TELÉFONOS	CELULARES	OBSERVACIÓN
Número integral de seguridad y emergencias	Nacional	123.		—
Empresa de Acueducto	Local		320 2220 699	—
Empresa de Aseo	Local		320 2220699	—
Empresa de energía	Local	6015115115	115	—
Ambulancias	Local		321 4008150	—
Bomberos	Local		313 316690	—
Secretaria de salud municipal	Local		—	—
Secretaria de salud departamental	Regional		—	—
Estacion de policia Cundinamarca	Local		3104595529	—
Estación de policía La vega	Local		310 4595529	—
Cruz Roja Colombiana	Nacional		313 349 2728	—
Alcaldía municipal de San Miguel de Sema	Local		—	—
Defensa civil	Local		313 3134498	—
Hospital	Local		318 741 9061	—
Alcaldía municipal	Local		311 440 2676	—
				—

DIRECTORIO TELÉFONICO ATENCIÓN ARL

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	TELÉFONO	NÚMERAL	OBSERVACIÓN
SURA	601 084 99 47		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
COLMENA	601 401 0447	# 324.	Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
EQUIDAD	601 941 2114		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
POSITIVA	601 330 9000		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
COLPATRIA	601 950 1616		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
BOLIVAR	01 8000 123322		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
LIBERTY SEGUROS			Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.

Elaboro: María Paula Monsalve	Revisó: María Paula Monsalve	Aprobó: Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025	MEDEVAC	Fecha:	11/06/2025
		Código:	FT-SST-054
		Versión:	001

DIRECTORIO TELEFÓNICO INTERNO (Brigadistas)

Responsable	Rol	Dirección	Celulares	Correo

INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ENTIDAD	ALCANCE	TELÉFONOS	CELULARES	OBSERVACIÓN
Número integral de seguridad y emergencias	Nacional	123.		—
Empresa de Acueducto	Local		320222 0697	—
Empresa de Aseo	Local		320222 0697	—
Empresa de energía	Local	6015115115	115	—
Ambulancias	Local		3214008150	—
Bomberos	Local		313 518 690	—
Secretaria de salud municipal	Local		—	—
Secretaria de salud departamental	Regional		—	—
Estación de policía Cundinamarca	Local		3104595527	—
Estación de policía La vega	Local		3104595527	—
Cruz Roja Colombiana	Nacional		313 3492928	—
Alcaldía municipal de San Miguel de Sema	Local		—	—
Defensa civil	Local		313 3134978	—
Hospital	Local		318 9419061	—
Alcaldía municipal	Local		311 440 2676.	—
				—

DIRECTORIO TELÉFONICO ATENCIÓN ARL

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	TELÉFONO	NÚMERAL	OBSERVACIÓN
SURA	601 054 9947		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
COLMENA	601 901 0447	# 324.	Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
EQUIDAD	601 741 2114		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
POSITIVA	601 330 7000		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
COLPATRIA	601 756 1616		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
BOLIVAR	01 8000 12 33 22		Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.
LIBERTY SEGUROS			Según emergencia se remite al hospital o IPS más cercana.

Elaboro: María Paula Monsalve	Revisó: María Paula Monsalve	Aprobó: Mario Fernando Rubiano
Responsable SST	Responsable SST	Representante legal

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025				MEDEVAC					Fecha:	11/06/2025	
									Código:	FT-SST-054	
									Versión:	001	
NOMBRE	EDAD	CÉDULA	ARL	EPS	TIPO DE SANGRE	ALERGIAS	CONSUME MEDICAMENTOS ¿CUAL?	EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR A:	TELÉFONO CONTACTO DE EMERGENCIA	ENTRENADO PRIMEROS AUXILIOS	DIRECCIÓN VIVIENDA
Jecardo Ospina	30	1121945549	Sura	Sanitas	O+	No	No	William Ospina	3125417833	No.	
Jose castiblanco	42	3059476	Sura	Sanitas	O+	No	No	Julieth León	3202929457	No.	
Josa Ivan León	42	11497595	Sura	Famisanar	A+	No	No	Julieth velez	3207131413	No.	
David Rodriguez	30	1.020977.370	Sura	Sanitas	O+	No	No	Paula Monsalve	3105556169	No.	

29

CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025				MEDEVAC					Fecha:	11/06/2025	
									Código:	FT-SST-054	
									Versión:	001	
NOMBRE	EDAD	CÉDULA	ARL	EPS	TIPO DE SANGRE	ALERGIAS	CONSUME MEDICAMENTOS ¿CUAL?	EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR A:	TELÉFONO CONTACTO DE EMERGENCIA	ENTRENADO PRIMEROS AUXILIOS	DIRECCIÓN VIVIENDA
Jose Juan León	42	11.447.34[illegible]	Sura	Famisanar	A+	No	No	Julieth Velez	3207131413	No.	
Leonardo Ospina	30	1.121.914.549	Sura	Sanitas	O+	No	No	William Ospina	3125497833	No.	
David Rodriguez	30	1020.997.317	Sura	Sanitas	O+	No	No	Paulo Monsalve	3105556160	No.	
Jose Castiblanco	42	3.059.496	Sura	sanitas	O+	No	No	Julieth León	3202929451	No.	

209
