ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8

16 MAR 2026 T.R.D. OP01-03-03-075

Chigorodó, Antioquia, 16 de Marzo de 2026

HORA: 10:54
RADICADO: 2026-AC1383
RECIBE: Johana Castrillón

Señores

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ, DARÍEN Y EL CARIBE - ASOMUDACAR**
Contratista de Interventoría
E-mail: asomudacar@gmail.com

**Referencia:** Convenio No 002 de 2021 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUNDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA".

**Asunto:** Reiteración de solicitud documental y socialización

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura Física y Valorización de la Alcaldía de Chigorodó se permite informar y manifestar lo siguiente:

El pasado 2 de marzo de 2026 se envió a su correo el oficio T.R.D.OP01-03-03-056 con radicado 2026-AC1107, mediante el cual se les invitaba a presentar la información que en múltiples ocasiones se ha solicitado y que esta fuera socializada a la secretaria con fines de que se avanzara más rápidamente en el entendimiento de la información y posterior tramite de liquidación del contrato de interventoría toda vez que este finalizó el 21 de agosto de 2025. da la fecha la información no ha sido presentada.

Manifestamos nuestra mayor voluntad en terminar este proyecto de la manera más conveniente y jurídicamente ajustada para todas las partes, pero cabe mencionar que de no presentarse la información completa como se ha requerido y no aceptarse las invitaciones a socializar la misma nos veremos en la obligación de liquidar unilateralmente el contrato tanto de obra como de interventoría.

Como municipio solicitamos que la información sea presentada de forma completa a esta secretaria por tardar el 19 de marzo de 2026.

Me permito adjuntar con esta misiva, copia de la última correspondencia enviada, la cual no fue atendida.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Stivinth Gonzalez M – apoyo a supervisión | | 16/03/2026 |
| Revisó | Hanner Palacios – Asesor Jurídico | | 16/03/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8

06 ABR 2026
HORA: 5:09
RADICADO: 2026-AC162
RECIBE: Johana Carmona

Chigorodó, 06 de Abril del 2026 T.R.D. OP01-0303-095

Señores
**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE ASOURANOR**
Interventoría
Email: asouranor@gmail.com

Referencia: Convenio interadministrativo 219 de 2023 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.

Contrato 220 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.


**Asunto:** Revisión de información enviada para gestión de revisión por parte del municipio de Chigorodó.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, se permite solicitarles nuevamente y muy respetuosamente que en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones dentro del contrato de la referencia, pedimos que revisen la información enviada para conocimiento de la secretaria ya que en los archivos comprimidos **no vinieron los editables correspondientes al acta, las memorias y la justificación de los componentes correspondientes a la administración y otros y en múltiples ocasiones se ha manifestado la importancia de enviarla.**

Relaciono parcialmente algunos aspectos encontrado:

En la carpeta de anexos viene este contenido

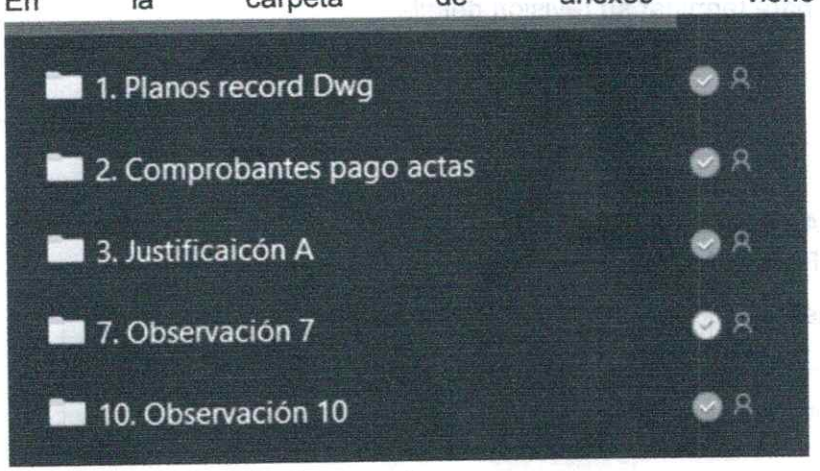


- La carpeta 10 llego vacía

- En la carpeta 3 se encuentra el acta AU en pdf y solicitamos la envíen también en Excel.
- La carpeta de planos récord los tiene únicamente en editable (favor mandarlos también en PDF, en el mismo archivo).
- Dentro de la carpeta de justificación en gastos de legalización los comprobantes de egreso tienen ambos como numero de comprobante 0.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT DEL URABÁ
Nit: 901.671.179
Página 1 de 1

CE Nº 00000

COMPROBANTE DE EGRESO

| DOC. ASIGNADOS | |
|---|---|
| NUM_DOCUM | Fecha Doc. |
| 00000 | 08/11/2023 |

Fecha de Expedición: 09/07/2024

Nit ó Cedula: 901.735.997
Beneficiario: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

Concepto de este Egreso
EL PAGO DEL ACTA PARCIAL N 2 FACTURA ED-4 DEL 12 DE JULIO 2024 CON CONTRATO C.I 022 DE 2023 DE MANTENIMIENTO DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO- ANTIOQUIA

- Dentro de la carpeta sistema de Cómputo se encuentran 3 archivos en AutoCAD

Solicitamos que se ajusten los documentos y nos compartan nuevamente y completa la documentación.
Sugiero presentar un oficio donde citan el texto de la observación realizada y manifestar la respuesta a dicha observación mediante el anexo o carpeta adjunta donde se encuentra para efecto de una validación rápida y avance expedito.

Con respecto a la cuenta de la interventoría observamos que solo vino la información en pdf y no en los archivos editables.

Favor tener muy presente adjuntar los soportes y evidencia de los gastos reembolsables.

Recordemos que el contrato se encuentra en proceso de liquidación y se requiere plasmar en la misma, las condiciones definitivas aceptadas.

Debido a que cuentan con la información solicitamos que sea enviada a más tardar el día miércoles 8 de abril de 2026, para terminar su revisión detalla.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Franci Stivinth Gonzalez – Apoyo a la supervisión | | 06/04/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

T.R.D. OP01-03-03-094

Chigorodó, Antioquia, 6 de abril de 2026

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8
06 ABR 2026
HORA: 4:26
RADICADO: 2026 - AC1618
RECIBE: Johana Carrillo

SEÑORES
**EMPRESA PÚBLICA DE APARTADÓ - EMPAPA S.A.S E.S.P**
Contratista de Obra
Email: secretariaempapa@gmail.com
gerenteempapa@gmail.com

**Referencia:** Convenio Nº 016 de 2020 - CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA

**Asunto:** Reiteración de solicitud documental y socialización.

Cordial saludo.

La Secretaría de Infraestructura Física y Valorización de la Alcaldía de Chigorodó se permite manifestar lo siguiente:

El pasado 2 de marzo de 2026 se envió a su correo el oficio T.R.D.OP01-03-03-056 con radicado 2026-AC1107, en el cual se les invitaba a que presentaran la información que en múltiples ocasiones se ha solicitado y que esta fuera socializada a la secretaria con fines de que se avanzara más rápidamente en el entendimiento de la información y posterior tramite de liquidación del contrato toda vez que este finalizo el 15 de agosto de 2025.

El pasado 16 de marzo de 2026 se envió a los correos respectivos oficio T.R.D. OP01-03-03-076 con radicado 2026-AC1382, en el cual se reiteraba la solicitud documental y socialización de la misma en la secretaria de infraestructura y se requería que esta fuera presentada de forma completa a mas tardar el jueves 19 de marzo de 2026.

El pasado 19 de marzo se recibió correo electrónico a las 6:41 pm en el que se encontraba oficio con relación de documentos adjuntos (EPA1-RS-2026-009) y un link para descargar documentación. EL link al intentar ser abierto presenta un condicionante donde tiene fecha de vencimiento de 3 días y no permite descargar la información respectiva.

Se solicita que se envié nuevamente el enlace con permisos abierto para que la información sea descargada y verificada y así poder dar respuesta del estado y completitud respectiva de la información requerida claramente en los oficios anteriores y poder avanzar con el proceso.

De igual manera reiteramos que se espera que la información haya sido avalada y enviada por la interventoría a este despacho.

Nuevamente manifestamos nuestra mayor voluntad en terminar este proyecto de la manera más conveniente y jurídicamente ajustada para todas las partes, pero cabe mencionar que de no presentarse la información completa como se ha requerido y no aceptarse las invitaciones a socializar la misma nos veremos en la obligación de liquidar unilateralmente el contrato.

Como municipio solicitamos que la información sea presentada completa a esta secretaria por tardar el miércoles 8 de marzo de 2026 en horas hábiles laborales.

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Stivinth Gonzalez M – apoyo a supervisión | | 06/04/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

T.R.D. OP01-03-03-076

Chigorodó, Antioquia, 16 de Marzo de 2026

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8

16 MAR 2026
HORA: 10:54
RADICADO: 2026-AC1382
RECIBE: Johana Castillo

Señores

**EMPRESA PÚBLICA DE APARTADÓ - EMPAPA S.A.S E.S.P**
Contratista de Obra

Email: secretariaempapa@gmail.com
gerenteempapa@gmail.com

**Referencia:** Convenio Nº 016 de 2020 - CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA

**Asunto:** Reiteración de solicitud documental y socialización.

Cordial saludo.

La Secretaría de Infraestructura Física y Valorización de la Alcaldía de Chigorodó se permite manifestar lo siguiente:

El pasado 2 de marzo de 2026 se envió a su correo el oficio T.R.D.OP01-03-03-056 con radicado 2026-AC1107, mediante el cual se les invitaba a que presentaran la información que en múltiples ocasiones se ha solicitado y que a su vez fuera socializada a la secretaria con fines de que se avanzara más rápidamente en el entendimiento de la información y posterior tramite de liquidación del contrato toda vez que este finalizó el 15 de agosto de 2025.

A la fecha la información no ha sido presentada este despacho, ni se tiene evidencia de que haya sido revisada y avalada por la interventoría.

Manifestamos nuestra mayor voluntad en terminar este proyecto de la manera más conveniente y jurídicamente ajustada para todas las partes, pero cabe mencionar que de no presentarse la información completa como se ha requerido y no aceptarse las invitaciones a socializar la misma, nos veremos en la obligación de liquidar unilateralmente el contrato en los términos y con la información que se tiene a la fecha.

Como municipio solicitamos que la información sea presentada de forma completa a esta secretaria por tardar el jueves 19 de marzo de 2026.

Me permito adjuntar con esta misiva, copia de la última correspondencia enviada, que a la fecha no ha sido contestada.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Stivinth Gonzalez M – apoyo a supervisión | | 16/03/2026 |
| Revisó | Hanner Palacios – Asesor Jurídico | | 16/03/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

T.R.D. OP01-03-03-080

Chigorodó, Antioquia; 24 de marzo de 2026

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Juan Guillermo Lopera Restrepo
Director Territorial Antioquia
Jlopera@invias.gov.co

Claudia Tibata
Ctibata@invias.gov.co

Andrés Felipe Jiménez
Ajimenez@invias.gov.co

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8
24 MAR 2026
HORA: 10:17
RADICADO: 2026-AE1498
RECIBE: Johana Padilla

**Asunto:** Solicitud de Informes del convenio 1817 de 2021

**Objeto:** Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías rurales en el municipio de Chigorodó departamento de Antioquia del Programa Colombia Rural – Nacional.

**Alcance:** Informes de Interventoría periodos Enero, Febrero

Respetados señores

La administración municipal de Chigorodó, expresa su respeto y se permite dar respuesta al requerimientos bajo radicado **2026S-VANT-007194**.

Se adjuntan los informes pertinentes enviados por la interventoría 214 de 2025

Cualquier información por favor ser enviada al correo electrónico obras@chigorodo-antioquia.gov.co

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Franci Stivinth González | | 24/03/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

Chigorodó, Antioquia; 20 de Marzo de 2026

T.R.D. OP01-03-03-079

Señor(es)
**INGENIO CIVIL S.A.S.**
Ing. Bernardo José Otalvarez Llorente
Director Interventoría
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

**CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO**
Ing. Rubén Darío Zapata
Rep. Legal
consorcioplacahuellaguapaal
to@gmail.com

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8
20 MAR 2026
HORA: 11:38
RADICADO: 2026 - AC1494
RECIBE: Johana Castillo

**Asunto:** CITACION A REUNION

**Referencia:** Contrato de obra 226 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Respetados señores,

La administración municipal de Chigorodó se permite invitar a reunión en la Secretaria de Infraestructura y Valorización (SIFV) para el día 25 de marzo de 2026 a las 4 pm, la agenda a tratar es la siguiente:

| Tema | Responsables |
|---|---|
| Cronograma de obra en términos de cantidades. | Obras e Interventoría |
| Seguridad Social y pagos de trabajadores. | Obras e Interventoría |
| Estado de las garantías. | Obras e Interventoría |
| Plan de acción y cronograma en términos de cantidades para terminación. | Obras e Interventoría |
| Programación de Visita a la obra. | Todos |
| Varios | Todos |

Con la firme intención de que se pueda avanzar rápida y puntualmente en la reunión y siendo está muy importante para el avance del proyecto solicitamos que todas las partes

traigan información pertinente documental respecto a los temas a tratar y referente al proyecto.

Cualquier información pertinente por favor ser remitida al correo electrónico obras@chigorodo-antioquia.gov.co y ser presentada físicamente en 3 paquetes.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Franci Stivinth González | | 20/03/2026 |
| Revisó | | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8

T.R.D. OP01-03-03-093

06 ABR 2026

HORA: 4:26
RADICADO: 2026 – AC1617
RECIBE: Johana Cubillos

Chigorodó, Antioquia, 06 de Abril de 2026

Señores

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ, DARÍEN Y EL CARIBE - ASOMUDACAR**
Contratista de Interventoría
E-mail: asomudacar@gmail.com

**Referencia:** Convenio No 002 de 2021 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUNDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA".

**Asunto:** Reiteración de solicitud documental y socialización

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura Física y Valorización de la Alcaldía de Chigorodó se permite informar y manifestar lo siguiente:

El pasado 2 de marzo de 2026 se envió a su correo el oficio T.R.D.OP01-03-03-056 con radicado 2026-AC1107, en el cual se les invitaba a que presentaran la información que en múltiples ocasiones se ha solicitado y que esta fuera socializada a la secretaria con fines de que se avanzara más rápidamente en el entendimiento de la información y posterior tramite de liquidación del contrato de interventoría toda vez que este finalizo el 21 de agosto de 2025.

El pasado 16 de marzo de 2026 se envió a los correos respectivos oficio T.R.D. OP01-03-03-076 con radicado 2026-AC1382, en el cual se reiteraba la solicitud documental y socialización de la misma en la secretaria de infraestructura y se requería que esta fuera presentada de forma completa a más tardar el jueves 19 de marzo de 2026, cita a la que como interventoría no asistieron ni dieron respuesta al oficio.

El pasado 19 de marzo se recibió correo electrónico a las 6:41 pm enviado por empapa en el que se encontraba oficio con relación de documentos adjuntos (EPA1-RS-2026-009) y un link para descargar documentación. EL link al intentar ser abierto presenta un condicionante donde tiene fecha de vencimiento de 3 días y no permite descargar la información respectiva.

Se solicita nuevamente que como interventoría en cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisen y avalen la información presentada por el contratista, para que sea mas expedito el avance en la liquidación del contrato.

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Stivinth Gonzalez M – apoyo a supervisión | | 06/04/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

T.R.D. OP01-03 03-097

Chigorodó, Antioquia; 08 de Abril de 2026

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8
08 ABR 2026
HORA: 2:58
RADICADO: 2026 - AE1650
RECIBE: Johana Cabillán

Señor(es)
**INGENIO CIVIL S.A.S.**
Ing. Bernardo José Otalvarez Llorente
Director Interventoría
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

**Asunto:** INVITACION A REUNION VIRTUAL Y OTROS

**Referencia:** Contrato de Interventoría N° 214 de 2025 cuyo objeto es: Interventoría a la Construcción de la Placa Huella en la vereda Guapa Alto del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia.

Contrato de obra N° 226 de 2023 cuyo objeto es: Construcción de Placa Huella en la vereda Guapa Alto del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia

Respetado Ingeniero;

Nos permitimos comunicarles que ha sido Invitado a una reunión Virtual exclusiva entre la interventoría y el municipio de Chigorodó a realizarse el jueves 9 de abril de 2026 con el objetivo de aclarar y definir algunos aspectos de los contratos de la referencia.

En dicha reunión se solicita que nos exponga, socialice y presente los siguientes temas:

- Las evidencias que soportan la entrega y recibos de oficios, comunicaciones, etc. en el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría.
- Socializar el informe enviado como soporte para apertura del proceso de incumplimiento al contratista.
- Socializar el cronograma de seguimiento a la obra en términos de avance en el alcance de las actividades y no en términos financieros.
- Cronograma de Ejecución de obra para el tiempo restante.
- Plan de acción aprobado.

Además de lo enunciado anteriormente cabe recordar lo siguiente:

Una vez revisada la cuenta de cobro 8 del contratista se encontraron múltiples inconsistencias en el informe de interventoría anexo en la cuenta y solicitamos que sean subsanadas y presentada nuevamente, pedimos que la cuenta sea realmente analizada y revisada por usted.

- En relación a la correspondencia y actas deben estar toda en una sola plantilla y presentadas cronológicamente desde el inicio hasta el corte realizado, adjuntar las evidencias (oficio, documento y pantallazos de envió y/o radicados de documento y/o oficio).
- No presentan los planos ni el levantamiento topográfico realizado al inicio de sus labores como lo manifiesta en el informe y en reuniones anteriores.
- En la cuenta relaciona vehículo y no lo hubo.
- No esta la seguridad social de la SST relacionada
- Los valores de la seguridad social no corresponden con lo presupuestado y esto afecta drásticamente el F. M. para el reconocimiento.
- No se observa la revisión de la Administración y el Imprevisto del contratista.
- Debe adjuntar y relacionar las pólizas de la Interventoría.
- Debe revisar que el valor del acta sea el correcto en el acumulado ya que se presentan diferencias con los presentados en el contenido de los informes.
- Relacionar los actos administrativos del contrato de interventoría.
- Organizar bien el tiempo total de ejecución tanto del contratista como de la interventoría.

También nos permitimos recordarle que en el comité de obra realizado el 27 de marzo de 2026, de manera presencial se dejaron compromisos como:

- Presentar el plan de acción del contratista aprobado por la interventoría para el martes 7 de abril lo cual no ha ocurrido.
- Realizar visita a la obra el 14 de abril de 2026 (pendiente).

Cualquier información pertinente por favor ser remitida al correo electrónico obras@chigorodo-antioquia.gov.co y ser presentada físicamente en 3 paquetes.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Franci Stivinth González – Apoyo a la supervisión | | 08/04/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

T.R.D. OP01-03 03-098

Chigorodó, Antioquia; 07 de Abril de 2026

ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA
NIT. 890.980.998-8
08 ABR 2026
HORA: 2:58
RADICADO: 2026 - AC1649
RECIBE: Johana Castillo

Señor(es)
**CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO**
Ing. Rubén Darío Zapata
Rep. Legal
consorcioplacahuellaguapa@gmail.com

**INGENIO CIVIL S.A.S.**
Ing. Bernardo José Otalvarez Llorente
Director Interventoría
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

**Asunto:** Segunda devolución de cuenta de cobro mediante acta de parcial # 8. La primera fue en febrero 5 de 2026

**Referencia:** Contrato de obra 226 de 2023 cuyo objeto es: Construcción de Placa Huella en la vereda Guapa Alto del municipio de Chigorodó en el departamento de Antioquia.

Respetados señores,

Nos permitimos comunicarles que una vez revisada la cuenta de cobro en medio físico, se encuentra faltantes e imprecisiones las cuales se manifiestan para que sean corregidas en la mayor brevedad posible.

- No se encontró acorde el cuadro donde se relacione cronológicamente las comunicaciones u oficios cruzados entre los intervinientes (municipio, contratista de obra e interventoría) en el proyecto con sus respectivos **soportes -constancias de envió (correos) y anexos (radicados, actas de obra, etc.).** Se reitera tener muy de presente toda la información ordenada cronológicamente, numero consecutivo (1, 2, 3 etc.), fecha, consecutivo propio, asunto, enviado por, recibido por, descripción (respuesta a, acta, etc.)observaciones (correo, físico,)
- Actas de seguimiento del proyecto (comités de obra entre los distintos intervinientes del proyecto, -obra, interventoría y supervisión-).
- Cuadro en donde se relacione el estado actual del contrato respecto a las pólizas y sus actualizaciones al momento del corte, así como el soporte de los reportes realizados - tanto por obra como por interventoría- a la aseguradora de las suspensiones, modificaciones o prórrogas.

- Cuadro de seguimiento del cronograma de obra con el detalle de los avances % ejecutados vs los % programados en términos de alcance, su variación y el concepto de interpretación de los mismos, en este cuadro que se aprecien los nombres de las actividades y los rótulos de cada columna en las hojas, de igual manera que se aprecien los totales por semana y por actividad.
- Revisar los cuadros donde relacionan los totales ejecutados ya que no son coincidentes con la realidad, en el acta parcial y el acumulado ocurre lo mismo.

Favor que todo esta información sea verificada por la interventoría y actualizada en sus informes antes de presentarse nuevamente.

Se solicita que se acerquen a la secretaría de infraestructura y valorización a que retiren el documento presentado para que sea ajustado lo más pronto posible.

Por favor que la información presentada como soporte sea lo más completa posible.

Una vez se complete la información podemos definir una fecha en la cual se nos sustente a la Supervisión, mediante exposición, lo entregado, facilitando así un rápido conocimiento de la información (documentación) y acelerando la gestión de trámite pertinente.

Cualquier información pertinente por favor ser remitida al correo electrónico obras@chigorodo-antioquia.gov.co y ser presentada físicamente en 3 paquetes.

Atentamente,

**MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI**
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

| | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Franci Stivinth González – Apoyo a la Supervisión | | 08/04/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

**Municipio de Chigorodó**
Departamento de Antioquia

Secretaría de Infraestructura Física y Valorización

TEMA: Revisión de estado de todos los procesos. FECHA: 19 de marzo de 2026

LUGAR: Secretaria de Infraestructura y Valoración

OBJETIVO: Realizar Seguimiento a los contratos asignados a todos Los Apoyos

CONTRATO Nº _____

| NOMBRES | EMPRESA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Ramirez Acevedo | Alc. Chigorodó | 3218394161 | mramirez a1@unal.edu.co | Mateo Ramirez |
| Hanner Palacios C | Alc. Chigorodó | 3148354255 | hannerpcaicedo@gmail.com | |
| Juan Pablo Medina Gutiérrez | Municipio de Chigorodó | 304 643 09 71. | juanmedina.obraschigo@gmail.com | |
| Franci Stiviuth Gonzalez | Municipio de Chigorodo | 3104143540 | Stiviuthgonzalez.chigo@gmail.com | |
| MÓNICA A. SALAZAR E. | Mpio. CHig. | 3218446298 | OBRAS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.GOV.CO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Scanned with CamScanner

# VISITA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **VÍA CHIGORODO REMIGIO** | | |
| **FECHA:** | 17 de marzo de 2026 | | |
| **HORA INICIO:** | 08:00 am | **HORA TERMINACIÓN:** | 10:00 am |
| **Objeto:** | Verificar el avance de los trabajos en la pavimentación de la vía que de la vocacional conduce a la vereda remigio | | |
| **Condición Climática** | Dia soleado | | |
| **Motivo de la Visita** | Seguimiento a la obra | | |
| **Visita No** | 4 | | |

| NOMBRES ASISTENTES: | Rol/Cargo |
|---|---|
| Franci Stivinth Gonzalez moreno | Ingeniero Apoyo a Supervisión SIFV. |
| | |

## DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizo desplazamiento desde la ciudad de Chigorodó hasta el lugar de inicio de los trabajos y se realizo recorrido a pie constatando la ejecución de varios frentes de trabajo en los primeros 2.2 km a construir que serán hasta el primer puente.
Se constato el lleno de la ampliación de calzada y la compactación del mismo.
Se observo un frente realizando la construcción de una alcantarilla en tubería PVC de 36” y se estaba ejecutando la construcción en concreto reforzado de la caja de encole de la misma.
Se pudo evidenciar la realización de labores de topografía y puesta de base granular con nivelación para ir dejando listo algunos tramos.
En el frente 2 que es en remigio se pudo apreciar la actividad de desplazamiento de la cerca para realizar la amplitud o nuevo ancho a la vía y tener control de los animales en los predios aledaños de igual manera se aprecio el cajeo en este frente.

Estado Físico General de la obra: **Bueno _X_** Regular_____ Mal estado_____
Porcentaje de Avance Físico Programado de la Obra (%): _____
Porcentaje de Avance Físico Ejecutado de la Obra (%): _____
Avance Financiero de la Obra (%)_____

| ACTIVIDADES VERIFICADAS EJECUTADAS Y/O NECESARIAS | |
|---|---|
| Ampliación de vía, lleno con material estructural de rio, colocación de base. | Elaboración de alcantarilla en PVC y colocación de concretos para encole. |

| HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS | |
|---|---|
| Se requiere la verificación de la realización de los ensayos de densidades y CBR. | |

| CONCLUSIONES |
|---|
| La obra se encuentra en ejecución y se aprecia coordinación y buen ritmo de trabajo, igualmente se aprecian características acorde en los materiales utilizados. |



Elaboro: Ing. Franci Stivinth González

# REGISTRO FOTOGRAFICO GEORREFERENCIADO












# VISITA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **VÍA CHIGORODO REMIGIO** | | |
| **FECHA:** | 27 de marzo de 2026 | | |
| **HORA INICIO:** | 03:00 pm | **HORA TERMINACIÓN:** | 03:30 pm |
| **Objeto:** | Verificar el avance de los trabajos en la pavimentación de la vía que de la vocacional conduce a la vereda remigio | | |
| **Condición Climática** | Dia soleado | | |
| **Motivo de la Visita** | Seguimiento a la obra | | |
| **Visita No** | 5 | | |

| NOMBRES ASISTENTES: | Rol/Cargo |
|---|---|
| Franci Stivinth Gonzalez moreno | Ingeniero Apoyo a Supervisión SIFV. |
| | |

## DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita al lugar de la obra. Se pudo hacer un recorrido a pie por todas las instalaciones. Se apreció la nivelación de la subbase, en algún tramo, de igual manera, se pudo constatar la ejecución de los ensayos de laboratorio para densidades y CBR. Se toman registros fotográficos. También se constata la construcción de cabezales en alcantarillas, cabezales en concreto, estos para el manejo de las aguas.
Se recibió información por parte de los trabajadores de que en el segundo frente se está realizando ampliación de la calzada y colocación de material para mejoramiento de la subrasante.

Estado Físico General de la obra: **Bueno _X_** Regular_____ Mal estado_____
Porcentaje de Avance Físico Programado de la Obra (%): _____
Porcentaje de Avance Físico Ejecutado de la Obra (%): _____
Avance Financiero de la Obra (%)_____

| ACTIVIDADES VERIFICADAS EJECUTADAS Y/O NECESARIAS | |
|---|---|
| Realización de ensayo de densidades y CBR en campo | Fundición de Cabezales de concreto, Serie de Nivelación de la Subbase. |

| HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS | |
|---|---|
| N/A | N/A |

| CONCLUSIONES |
|---|
| La obra se encuentra en ejecución y se aprecia buen ritmo de trabajo y avance, igualmente se aprecian características acorde en los materiales utilizados y se aprecia a ojo buen grado de compactación. |



Elaboro: Ing. Franci Stivinth González

# REGISTRO FOTOGRAFICO GEORREFERENCIADO












CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA


| ACTA DE VISITA FISCAL | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: Municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia 24/03/2026 – 27/03/2026 | Hora de inicio: 9:30 am | Hora de terminación: 5:00 pm |
| Lugar de visita: Municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia -Comunidad Indígena Dojura | | |
| **Tema:** Visita técnica en apoyo al PRF 801112-2023-45135 con el fin de determinar las irregularidades provenientes de la ejecución del convenio de obra N°017 de 2020 celebrado entre el Municipio de Chigorodó y Empresas Publicas de Apartadó S.A.S E.S.P - EMPAPA que tiene por objeto la construcción de Acueducto Veredal en la Comunidad Indígena Dojura del Municipio de Chigorodó, Antioquia | | |
| **OBJETIVO DE LA VISITA.** Establecer el estado actual y avance real de las obras ejecutadas bajo el convenio de obra No.017 de 2020. Además, la verificación de la calidad de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | | |

## DESARROLLO DE LA VISITA

Para dar inicio al desarrollo de la visita, se realiza reunión en las instalaciones del Palacio Municipal en la Oficina de Infraestructrua Fisica del Municipio de Chigorodó con el fin de coordinar las actividades que se van a realizar en el tanscurso de la visita.

Posterior, se programa y realiza visita de inspección a las obras ejecutadas bajo el convenio de obra 017 de 2020 para la cual se contó con la presencia de la Ingeniera Mónica Salazar como secretaria de infraestructura física del Municipio de Chigorodó, el Ingeniero Wilson Hoyos como profesional de apoyo SSCE, el Arquitecto Jimmy Ortega como coordinador operativo por parte de EMPAPA y el ingeniero Franci Stiviuth González como Apoyo a la secretaria de infraestructura física del Municipio de Chigorodó

La obras se ejecutaron en la comunidad Indígena Dojura en el Municipio de Chigorodó, como se evidencia a continuación:

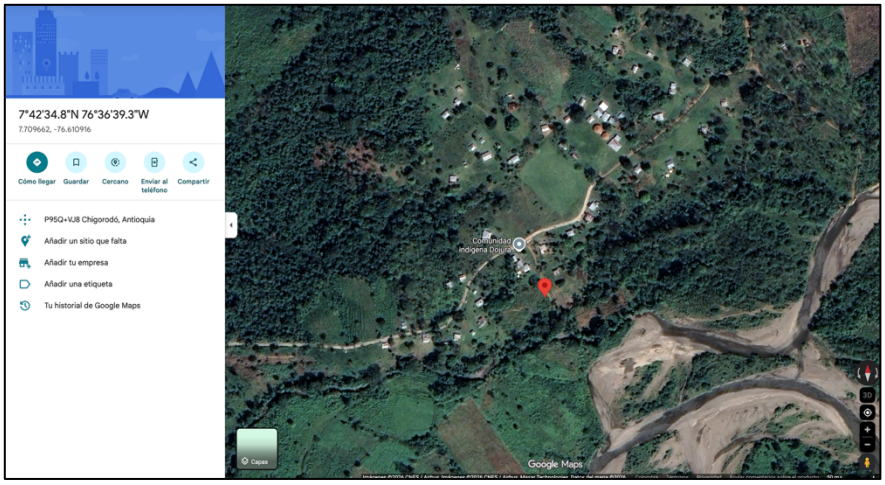

Se inicia el recorrido con la verificación del tanque elevado en concreto de almacenamiento y distribución del agua potable, además de la instalación de las domiciliarias y los micromedidores en las viviendas beneficiadas del servicio. En el recorrido el Municipio informa al ente de control, que a la fecha hay 85 usuarios conectado al sistema.

Se continua el recorrido con la inspección y verificación de la construcción de la planta de tratamientos de agua potable evidenciando que el sistema se encuentra funcional (Desde el pozo de captación, sistema de desinfección y potabilización y el tanque de almacenamiento semienterrado ubicado en la PTAP). Sin embargo, se puede evidenciar que en el momento de la visita no se está prestando el servicio a la comunidad debido a que el variador de la bomba que lleva el agua hasta el tanque de distribución se encuentra dañado, imposibilitando la prestación del servicio. El operador del acueducto de la comunidad informa que la situación se viene presentando hace aproximadamente un año.

En el recorrido realizado, el Municipio informa a la CGR que la obra se entregó a la comunidad terminada y funcional y se realizaron capacitaciones al personal designado por la comunidad indígena Dojura para la operación. La documentación que respalda esta información fue entregada a la CGR una vez se finalizó el recorrido en la obra.

Una vez se finaliza el recorrido, se realiza solicitud de información de la ejecución de la obra referente a los informes de ejecución de la obra, actas de pago y soportes de modificaciones realizadas al convenio de obra.

A continuación, se muestra el registro fotográfico de lo evidenciado

**TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO**









CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES**










**CASETA DE OPERACIONES**









CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**SISTEMA DE BOMBEO**










**PTAP**









CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA


| ACTA DE VISITA FISCAL | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: Municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia<br>24/03/2026 – 27/03/2026 | Hora de inicio:<br>9:30 am | Hora de terminación:<br>5:00 pm |
| Lugar de visita: Municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia<br>-Comunidad Indígena Saudo | | |
| **Tema:** Visita técnica en apoyo al PRF 801112-2023-45104 con el fin de determinar las irregularidades provenientes de la ejecución del convenio de obra N°016 de 2020 celebrado entre el Municipio de Chigorodó y Empresas Publicas de Apartadó S.A.S E.S.P - EMPAPA que tiene por objeto la construcción de Acueducto Veredal en la Comunidad Indígena Saudo del Municipio de Chigorodó, Antioquia | | |
| **OBJETIVO DE LA VISITA.** Establecer el estado actual y avance real de las obras ejecutadas bajo el convenio de obra No.016 de 2020. Además, la verificación de la calidad de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | | |

## DESARROLLO DE LA VISITA

Para dar inicio al desarrollo de la visita, se realiza reunión en las instalaciones del Palacio Municipal en la Oficina de Infraestructrua Fisica del Municipio de Chigorodó con el fin de coordinar las actividades que se van a realizar en el tanscurso de la visita.

Posterior, se programa y realiza visita de inspección a las obras ejecutadas bajo el convenio de obra 016 de 2020 para la cual se contó con la presencia de la Ingeniera Mónica Salazar como secretaria de infraestructura física del Municipio de Chigorodó, el Ingeniero Wilson Hoyos como profesional de apoyo SSCE, el Arquitecto Jimmy Ortega como coordinador operativo por parte de EMPAPA y el ingeniero Franci Stiviuth González como Apoyo a la secretaria de infraestructura física del Municipio de Chigorodó

La obras se ejecutaron en la comunidad Indígena Saudo en el Municipio de Chigorodó, como se evidencia a continuación:

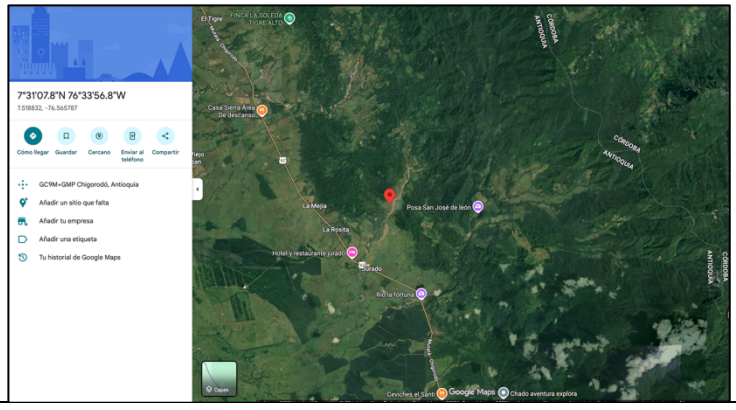

Se realiza inspección de la caseta de bombeo del pozo profundo, el cual está ubicado a 75m de profundidad compuesto por una bomba tipo lapicero que envía el agua al sistema de tratamiento, sin embargo, en la visita de inspección el Municipio informa a la CGR que aún no está en funcionamiento debido a que el caudal captado y envido por la bomba no garantiza la continuidad del servicio y no se ha dado la puesta en marcha del sistema completo por esta razón. El Municipio informa que hasta que el contratista de obra no solucione esta problemática y ponga en marcha el sistema, no podrán recibir la obra.

Se finaliza el recorrido con la verificación de la ejecución de las actividades, en la cual se pudo evidenciar que las obras para la construcción de la caseta y los demás componentes de la PTAP se encuentran ejecutados al 100%.

Adicional, se verifica la instalación de dos tanques de almacenamiento de 25m$^3$ cada uno y un tanque en concreto semi enterrado de 86m$^3$ y la instalación de las domiciliarias en la comunidad que se beneficiará del servicio de acueducto.

En el recorrido se pudo evidenciar que las obras se encuentra ejecutadas en un 100%, sin embargo no se ha puesto en marcha debido a que el sistema de captación no está funcional.

Una vez se finaliza el recorrido, se realiza solicitud de información de la ejecución de la obra referente a los informes de ejecución de la obra, actas de pago y soportes de modificaciones realizadas al convenio de obra.


A continuación, se muestra el registro fotográfico de lo evidenciado

CAPTACIÓN - POZO PROFUNDO







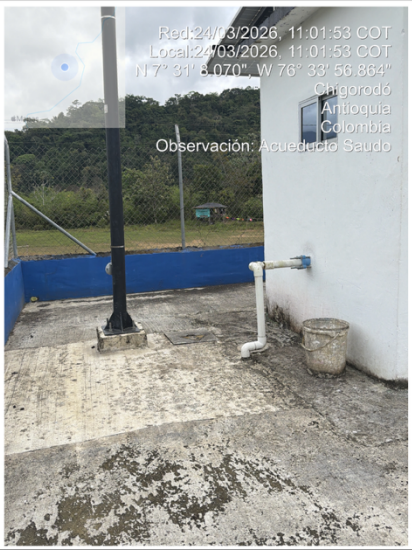

**DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES**










**TANQUES DE ALMACENAMIENTO**









**CASETA DE OPERACIONES**










**SISTEMA DE POTABILIZACION**









# ACTA DE COMITÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | Secretaria de Infraestructura Fisica y Valorización | | |
| **FECHA:** | 27 de Marzo de 2026 | | |
| **HORA INICIO:** | 04:00 pm | **HORA TERMINACIÓN:** | |
| **Objeto:** | Verificar el estado actual del proyecto Guapa. Para efectos de Revisión de compromisos de cara al Reinicio de la obra. | | |

**NOMBRE ASISTENTES:**

- Juan Pablo Medina Gutierrez
- Bernardo A. otalvarez
- Monica A. Salazar
- Ruben dario Zapata
- Sandra Milena Sanchez
- Franci Stiuluth Gonzalez

} Se adjunta listado de asistencia Firmado.

**TEMAS A TRATAR:**

1. Cronograma de obra en terminos de Cantidades
2. Seguridad social y pago de trabajadores.
3. Estado de las garantias
4. plan de acción y cronogramas en terminos de cantidades para terminación
5. programacion de visita a la obra
6. Varios

**DESARROLLO**

1. Cronograma de obra en terminos de Cantidades. el Contratista Expresa que lo presento en la cuenta de cobro a lo que se le solicita que lo enseñe en el documento y Se le presenta, al ser revisado se evidencia que no y se le pide que lo subsane hoy (27 de marzo de 2026).

4. Se le solicita al contratista el plan de acción para la Terminación a lo que manifiesta que NO lo tiene y que lo presentara para el 7 de abril de 2026. ajustado con el cronograma. del tiempo Faltante.

2. Se Solicita Información respecto a la Seguridad Social y pagos de trabajadores. El Contratista manifiesta que esta paga hasta diciembre. y se Suspendio la obra en diciembre, No esta pago los Meses de Enero y Febrero para los tiempos Ejecutados

en 2026. Expresan que tienen pagos programados en abonos para los pendientes con los trabajadores y que No cuentan con recursos. pero que el acta les dario aire y continuar en el logro del alcance.

3. Estado de las garantia y/o polizas al dia hasta el 27 de Enero/2026 (cumplimiento Anexo 17) y RCE (anexo 12) del 26 de Enero.

6. Varios. Se toca el tema de que el reinicio se hace el 4 de abril y que es tiempo de la Semana Santa por tanto se plantea ~~Ampliacion~~ de la Suspensión por 15 dias para correr el reinicio hasta el 26 de abril.

5. Se programa visita al lugar de la obra el 14 de Abril / 2026

**~~REGISTRO VIRTUAL~~**

Manifiestan que a la fecha el atraso es del 28%. lo Expresa el contratista y lo avala la interventoria.

**COMPROMISOS**

- el contratista entregara el plan de acción aprobado por Interventoria para el martes 7 de abril de 2026
- visita de obra el 14 de abril de 2026.

Elaboro: Ing. Franci Stivinth González

Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

**Municipio de Chigorodó**
Departamento de Antioquia

Secretaría de Infraestructura Física y Valorización

TEMA: Contrato Obra 226-2023: Seguimiento FECHA: 27 · Marzo · 2026.

LUGAR: Secretaria de Infraestructura Física y Valorización

OBJETIVO: Revisión de compromisos de cara al reinicio de la obra.

CONTRATO Nº 226-2023 (OBRA) / 214-2025 (INTERVENTORÍA)

| NOMBRES | EMPRESA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Medina Gutiérrez | Municipio de Chigorodó | 304 643 09 71 | juanmedina.obraschigo@gmail.com | |
| Bernardo J. Otalvarez | IC Ingenio Civil | 3014806359 | ic.ingeniocivil@gmail.com | |
| Mónica A. Salazar E. | Mpio. Chigorodó | 3218446798 | obras@chigorodo-antioquia.gov.co | |
| Ruben D. Zapata C. | Cooserdecon | 3117066417 | consecplazahuellaguapa@gmail.com | |
| Franci Stiviuth Gonzalez | Apoyo Supervisión Municipio de Chigorodó | 3104143540 | stiviuthgonzalez.chigo@gmail.com | |
| Sandra Milena Sanchez R. | Plaza Huella Guapa | 3104239778 | sami0812182@hotmail.com | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# ACTA DE COMITÉ No 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUGAR:** | **VIRTUAL (MEET)** | | |
| **FECHA:** | **26 de marzo de 2026** | | |
| **HORA INICIO:** | **08:00 am** | **HORA TERMINACIÓN:** | **09:30 am** |
| **Objeto:** | Seguimiento a la construcción de pavimento en la Vía Remigio (Tramo 1 y Tramo 2). | | |

## NOMBRE ASISTENTES:

- **Tulia Irene Ruiz:** Alcaldesa Municipal.
- **Camilo Hernández Macías:** Equipo del Contratista.
- **Santiago Representante CDIC SAS:** Interventoría.
- **Stivinth González:** Apoyo Técnico / Supervisión.
- **Yon Freider Castrillón Yepes:** Representante Unión Promotora / Gerencia.
- **Abel Garcés:** Interventoría / Consultoría.
- **Daniel Barrera:** Gerencia.
- **Mónica Salazar:** Secretaría de Infraestructura Física y Valorización

## TEMAS A TRATAR:

1. **Balance de obra:** Análisis de mayores y menores cantidades.
2. **Inclusión de Box Culvert (puente):** Evaluación técnica, financiera y modificación del diseño geométrico.
3. **Gestión de Permisos:** Revisión de permisos ambientales (Corpourabá) y prediales.
4. **Avances físicos de obra:** Actividades ejecutadas y programación de pruebas de densidades.
5. **Requerimientos administrativos:** Valla informativa y videos de avance exigidos por Regalías

## DESARROLLO DE LOS TEMAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO: COMITÉ DE OBRA N° 04 - PAVIMENTACIÓN VÍA REMIGIO**

**CAMILO HERNÁNDEZ MACÍAS (Contratista):**

- **Balance de Obra:** Explicó que hubo un incremento en los volúmenes de descapote y llenos mecánicos (con un costo directo de $74.7 millones en el tramo 1). Para compensar esto sin sacrificar los metros de pavimento (meta-física), se acordó disminuir ítems de señalización vial y filtros franceses.
- **Box Culvert:** Indicó que la construcción del Box Culvert tiene un costo directo aproximado de $170 millones.
- **Avances Físicos:** Reportó que están trabajando en la colocación de niveles para subrasante, excavación y llenos para la ampliación del tramo 2. En el tramo 1 instalaron subbase granular y construyeron pocetas y aletas para alcantarillas.
- **Densidades:** Confirmó que el laboratorio está programado para realizar la extracción de muestras de densidades el 27 de marzo en horas de la tarde.

**REPRESENTANTE CDIC SAS - SANTIAGO (Interventoría):**

- **Diseño Geométrico:** Señaló que para incluir el Box Culvert o excluir el tramo correspondiente, se debe realizar un nuevo diseño geométrico y topográfico delimitando coordenadas claras.
- **Recursos y Regalías:** Aclaró que hacer recortes de 70 metros al tramo 2 para financiar el puente es un proceso complejo ante el Sistema General de Regalías, por lo que requiere justificación sólida.
- **Permisos Ambientales:** Solicitó apoyo de la Alcaldía para agilizar el permiso de ocupación de cauce ante Corpourabá, comprometiéndose a elaborar los diseños técnicos e hidrológicos necesarios.
- **Requerimientos Documentales:** Instó al contratista a entregar los videos semanales de los tramos, ya que Regalías los está exigiendo para verificar visualmente los avances.

**TULIA IRENE RUIZ (Alcaldesa Municipal):**

- **Financiación:** Manifestó que actualmente el municipio no cuenta con los recursos ("plata no hay") para financiar los $170 millones del Box Culvert de manera inmediata.
- **Gestión:** Se comprometió a intervenir directamente ante el director de Corpourabá para acelerar el permiso de ocupación de cauce, una vez la interventoría presente los documentos técnicos y el radicado.

**STIVINTH GONZÁLEZ (Apoyo Técnico):**

- **Delimitación del Proyecto:** Exigió que el nuevo diseño geométrico aísle topográficamente el área del puente. Esto permitirá dar sustento técnico al proyecto actual y facilitará que la alcaldesa gestione recursos adicionales a futuro sin que se superpongan los alcances.
- **Permisos:** Aclaró a la interventoría que el municipio no puede fungir como ejecutor técnico ante Corpourabá. La interventoría y el contratista deben realizar la solicitud técnica, ya que es una entidad de puertas abiertas, pero el municipio sí apoyará con la gestión política.

**YON FREIDER CASTRILLÓN YEPES (Unión Promotora):**

- Hizo un llamado de atención para garantizar que se tramiten los permisos ambientales y prediales **antes** de realizar cualquier tipo de intervención, para evitar problemas legales o modificaciones no autorizadas en terrenos.

**ABEL GARCÉS (Interventoría):**

- Confirmó que todos los permisos de intervención con los vecinos colindantes del tramo 2 están listos. Para el tramo 1, indicó que solo falta la firma física de la Institución Educativa Agrícola, la cual ya otorgó el permiso verbalmente.

**DANIEL BARRERA (Gerencia):**

- Indagó específicamente sobre los costos del mayor volumen de llenos y corroboró que la idea principal es no sacrificar metros lineales de pavimento en la compensación de obra.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN:**

- Aclaró formalmente que, al ser la interventoría y el contratista los ejecutores del proyecto, son ellos quienes deben gestionar técnicamente y de manera personal los permisos de ocupación de cauce ante las autoridades competentes.

**Conclusiones**

1. **Viabilidad del Balance:** Se aprueba internamente compensar las mayores cantidades de excavación y llenos reduciendo la señalización vial y los filtros franceses. Este balance garantiza que la meta-física del contrato (metros lineales de pavimento a construir) se cumpla en su totalidad.
2. **Exclusión del Puente:** Debido a la falta de recursos inmediatos (aprox. $170 millones), el Box Culvert no se construirá dentro del alcance actual. Se aislará mediante un nuevo diseño geométrico para que la administración municipal busque financiación externa posteriormente.
3. **Trámite Ambiental:** El contratista y la interventoría asumirán el diseño hidrológico y radicarán el permiso de ocupación de cauce ante Corpourabá, mientras que la Alcaldesa liderará la gestión política para acelerar su aprobación.

**COMPROMISOS**

Según los acuerdos de la reunión y el acta proyectada en pantalla, se establecen los siguientes compromisos:

- **Informe de balance de obra:** A cargo del contratista. Fecha de cumplimiento: **27/03/2026**.
- **Prueba de densidades en campo:** A cargo del contratista. Fecha de cumplimiento: **27/03/2026**.
- **Impresión e instalación de la Valla publicitaria:** A cargo del contratista. Fecha de cumplimiento: **27/03/2026**.
- **Entrega de video de avance (Tramo 2) para Regalías:** A cargo del contratista. Fecha de cumplimiento: **27/03/2026**.
- **Informe técnico de nuevo diseño geométrico (excluyendo puente):** A cargo de la interventoría. Fecha de cumplimiento: **31/03/2026**

Elaboro: Ing. Franci Stivinth González

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

