CONSORCIO CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	**3601 DE 2022**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7**
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL 09**
CODIGO:	**IM-555-09**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ **No. De Revisiones**		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable de Elaboración	Nombre:	CARLOS MARTINEZ			
	Firma:				
	Fecha:	oct -24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	oct-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	BIBIANA PATERNINA ESPITIA			
	Firma.				
	Fecha:	oct-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 09
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

IM – 555 – 09

CONSORCIO CCSO

AGOSTO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 09	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	 Carlos Martínez Ingeniero Residente
REVISADO POR:	 Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 144 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148,51 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
SAMANÁ	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 139,5 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 179 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 142,8 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OBRAS DE ARTE:** 0	**OBRAS DE ARTE:** 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 147 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 183 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS 45
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 45
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 45
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 46

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 46
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 47
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 48
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 48
2.6.2 Seguimiento al plan de carga 48

3 INTRODUCCIÓN..... 51

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 53

4.1 LOCALIZACIÓN 53
4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO..... 54
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 54
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 54

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 54

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO..... 54
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 56
5.2.1 Actividades Administrativas 56
5.2.2 Actividades Técnicas 56
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 57
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 57

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 58

6.1 INFORME SEMANAL..... 58
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 58
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 58
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 58
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 59
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 59
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 59
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 59
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 59
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo..... 59
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 59
6.9.3 Actas de Comités..... 60
6.9.4 Actas de Reunión 60

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 60

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 60
7.1.1 Actividades Administrativas 60
7.1.2 Actividades Técnicas 61
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ..... 61

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 62

9 ANEXO..... 62

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 62
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 62
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 62
9.4 BITÁCORA 62

10 INTRODUCCIÓN 65

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 67

11.1 LOCALIZACIÓN 67
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 68
11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 68
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 69

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 69

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 69
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 70
12.2.1 Actividades Administrativas 70
12.2.2 Actividades Técnicas 70
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 71
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 71

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 72

13.1 INFORME SEMANAL 72
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 72
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 72
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 72
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 73
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 73
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 73
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 73
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 73
13.9.3 Actas de Comités 73
13.9.4 Actas de Reunión 73

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 74

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 74
14.1.1 Actividades Administrativas 74
14.1.2 Actividades Técnicas 74
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 74

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 75

16 ANEXO 75

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 75

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 75
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 75
16.4 BITÁCORA 75

17 INTRODUCCIÓN 78

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 80

18.1 LOCALIZACIÓN 80
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 81
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 81
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 81

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 82

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 82
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 83
19.2.1 Actividades Administrativas 83
19.2.2 Actividades Técnicas 83
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 84
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 84

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 85

20.1 INFORME SEMANAL 85
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 85
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 86
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 86
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 86
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 86
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 86
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 87
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 87
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 87
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 87
20.9.3 Actas de Comités 87
20.9.4 Actas de Reunión 87

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 88

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 88
21.1.1 Actividades Administrativas 88
21.1.2 Actividades Técnicas 88
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 88

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88

23 ANEXO 89

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 89
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 89

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 89
23.4 BITÁCORA 89

24 INTRODUCCIÓN 92

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 94

25.1 LOCALIZACIÓN 94
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 95
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 95
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 95

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 95

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 95
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 97
26.2.1 Actividades Administrativas 97
26.2.2 Actividades Técnicas 97
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 97
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 97

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 99

27.1 INFORME SEMANAL 99
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 99
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 99
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 99
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 99
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 99
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 99
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 99
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 99
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 99
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 100
27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 100
27.9.4 Actas de Comités 100
27.9.5 Actas de Reunión 100

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 100

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 100
28.1.1 Actividades Administrativas 100
28.1.2 Actividades Técnicas 100
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 100

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101

30 ANEXO 101

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 101
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 101

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 101
30.4 BITÁCORA 101

31 INTRODUCCIÓN 104

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 106

32.1 LOCALIZACIÓN 106
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 107
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 107
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 107

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 108

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 108
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 109
33.2.1 Actividades Administrativas 109
33.2.2 Actividades Técnicas 109
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 110
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 110

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 111

34.1 INFORME SEMANAL 111
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 111
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 111
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 111
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 112
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 112
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 112
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 112
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 112
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 112
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 112
34.9.3 Actas de Comités 113
34.9.4 Actas de Reunión 113

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 113

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 113
35.1.1 Actividades Administrativas 113
35.1.2 Actividades Técnicas 113
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 114

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 114

37 ANEXO 114

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 114
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 114
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 114

37.4 BITÁCORA 115

38 INTRODUCCIÓN 118

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 120

39.1 LOCALIZACIÓN 120
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 121
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 121
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 121

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 121

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 121
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 123
40.2.1 Actividades Administrativas 123
40.2.2 Actividades Técnicas 123
40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 124
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 124

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 124

41.1 INFORME SEMANAL 124
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 125
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 125
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 125
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 125
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 125
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 125
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 125
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 126
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 126
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 126
41.9.3 Actas de Comités 126
41.9.4 Actas de Reunión 126

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 126

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 126
42.1.1 Actividades Administrativas 127
42.1.2 Actividades Técnicas 127
42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 127

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 128

44 ANEXO 128

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 128
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 128
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 128
44.4 BITÁCORA 128

45 INTRODUCCIÓN 131

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 133

46.1 LOCALIZACIÓN 133
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 134
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 134
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 135

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 135

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 135
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 137
47.2.1 Actividades Administrativas 137
47.2.2 Actividades Técnicas 137
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 137
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 137

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 138

48.1 INFORME SEMANAL 138
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 138
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 138
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 138
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 139
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 139
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 139
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 139
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 139
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 139
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 139
48.9.3 Actas de Comités 140
48.9.4 Actas de Reunión 140

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 140

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 140
49.1.1 Actividades Administrativas 140
49.1.2 Actividades Técnicas 140
49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 141

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 141

51 ANEXO 141

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 141
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 141
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 141
51.4 BITÁCORA 142

52 INTRODUCCIÓN 145

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 147

53.1 LOCALIZACIÓN 147
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 148
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 148
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 148

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 148

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 148
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 150
54.2.1 Actividades Administrativas 150
54.2.2 Actividades Técnicas 150
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 151
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 151

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 151

55.1 INFORME SEMANAL 151
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 152
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 152
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 152
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 152
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 152
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 152
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 152
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 153
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 153
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 153
55.9.3 Actas de Comités 153
55.9.4 Actas de Reunión 153

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 153

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 153
56.1.1 Actividades Administrativas 154
56.1.2 Actividades Técnicas 154
56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 154

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 155

58 ANEXO 155

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 155
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 155
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 155
58.4 BITÁCORA 156

59 INTRODUCCIÓN 159

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 161

60.1 LOCALIZACIÓN 161
60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 162
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 162
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 162

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 162

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 162
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 164
61.2.1 Actividades Administrativas 164
61.2.2 Actividades Técnicas 164
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 165
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 165

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 167

62.1 INFORME SEMANAL 167
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.4 NFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 167
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 167
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 168
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 168
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 168
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 168
62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 168
62.9.3 Actas de Comités 169
62.9.4 Actas de Reunión 169

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 169

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 169
63.1.1 Actividades Administrativas 169
63.1.2 Actividades Técnicas 169
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 170

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 170

65 ANEXO 171

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 171
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 171
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 171
65.4 BITÁCORA 171

66 INTRODUCCIÓN 174

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 175

67.1 LOCALIZACIÓN 175

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 176
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 177
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 177

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 177

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 177
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 179
68.2.1 Actividades Administrativas 179
68.2.2 Actividades Técnicas 179
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 180
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 180

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 180

69.1 INFORME SEMANAL 180
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 181
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 181
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 182
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 182
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 182
69.9.3 Actas de Comités 182
69.9.4 Actas de Reunión 182

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 182

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 182
70.1.1 Actividades Administrativas 183
70.1.2 Actividades Técnicas 183
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 183

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 184

72 ANEXO 184

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 184
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 184
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 184
72.4 BITÁCORA 184

73 INTRODUCCIÓN 187

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 189

74.1 LOCALIZACIÓN 189

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 190
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 190
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 191

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 191

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 191
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 193
75.2.1 Actividades Administrativas 193
75.2.2 Actividades Técnicas 193
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 193
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 193

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 194

76.1 INFORME SEMANAL 194
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 195
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 195
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 195
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 195
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 195
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 195
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 195
76.9.3 Actas de Comités 195
76.9.4 Actas de Reunión 196

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 196

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 196
77.1.1 Actividades Administrativas 196
77.1.2 Actividades Técnicas 196
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 196

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 196

79 ANEXO 197

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 197
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 197
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 197
79.4 BITÁCORA 197

80 INTRODUCCIÓN 200

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 202

81.1 LOCALIZACIÓN 202

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 203
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 203
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 204

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 204

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 204
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 206
82.2.1 Actividades Administrativas 206
82.2.2 Actividades Técnicas 206
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 206
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 206

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 207

83.1 INFORME SEMANAL 207
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 208
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 208
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 208
83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 208
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 208
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 208
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 208
83.9.3 Actas de Comités 209
83.9.4 Actas de Reunión 209

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 209

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 209
84.1.1 Actividades Administrativas 209
84.1.2 Actividades Técnicas 209
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 209

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 210

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 210
85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 210
85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 210
85.4 BITÁCORA 210

86 INTRODUCCIÓN 213

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 215

87.1 LOCALIZACIÓN 215
87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 216
87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 216

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 217

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 217

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 217
88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 218
88.2.1 Actividades Administrativas 218
88.2.2 Actividades Técnicas 218
88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 219
88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 219

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 220

89.1 INFORME SEMANAL 220
89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 220
89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 220
89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 220
89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 221
89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 221
89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 221
89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 221
89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 221
89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 221
89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 221
89.9.3 Actas de Comités 222
89.9.4 Actas de Reunión 222

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 222

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 222
90.1.1 Actividades Administrativas 222
90.1.2 Actividades Técnicas 222
90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 222

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 223

92 ANEXO 223

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 223
92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 223
92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 223
92.4 BITÁCORA 224

93 INTRODUCCIÓN 227

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 229

94.1 LOCALIZACIÓN 229
94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 230
94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 230
94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 231

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 231

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 231
95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 233
95.2.1 Actividades Administrativas 233
95.2.2 Actividades Técnicas 233
95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 234
95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 234

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 234

96.1 INFORME SEMANAL 234
96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 235
96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 235
96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 236
96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 236
96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 236
96.9.3 Actas de Comités 236
96.9.4 Actas de Reunión 236

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 236

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 236
97.1.1 Actividades Administrativas 237
97.1.2 Actividades Técnicas 237
97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 237

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 238

99 ANEXO 238

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 238
99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 238
99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 238
99.4 BITÁCORA 238

100 INTRODUCCIÓN 241

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 243

101.1 LOCALIZACIÓN 243
101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 244
101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 244
101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 245

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 245

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 245
102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 247
102.2.1 Actividades Administrativas 247
102.2.2 Actividades Técnicas 247
102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 248
102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 248

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 248

103.1 INFORME SEMANAL 248
103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 249
103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 249
103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 250
103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 250
103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 250
103.9.3 Actas de Comités 251
103.9.4 Actas de Reunión 251

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 251

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 251
104.1.1 Actividades Administrativas 251
104.1.2 Actividades Técnicas 252
104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 252

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 253

106 ANEXO 253

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 253
106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 253
106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 253
106.4 BITÁCORA 253

107 INTRODUCCIÓN 256

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 258

108.1 LOCALIZACIÓN 258
108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 259
108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 259
108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 260

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 260

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 260

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 262
109.2.1 Actividades Administrativas 262
109.2.2 Actividades Técnicas 262
109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 263
109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 263

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 263

110.1 INFORME SEMANAL 263
110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 264
110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 264
110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 264
110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 264
110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 265
110.9.3 Actas de Comités 265
110.9.4 Actas de Reunión 265

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 265

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 265
111.1.1 Actividades Administrativas 265
111.1.2 Actividades Técnicas 265
111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 266

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 266

113 ANEXO 267

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 267
113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 267
113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 267
113.4 BITÁCORA 267

114 INTRODUCCIÓN 270

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 272

115.1 LOCALIZACIÓN 272
115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 273
115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 273
115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 273

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 273

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 273
116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 275

116.2.1 Actividades Administrativas 275
116.2.2 Actividades Técnicas 275
116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 276
116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 276

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 277

117.1 INFORME SEMANAL 277
117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 278
117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 278
117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 278
117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 278
117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 278
117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 278
117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 278
117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 278
117.9.3 Actas de Comités 279
117.9.4 Actas de Reunión 279

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 279

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 279
118.1.1 Actividades Administrativas 279
118.1.2 Actividades Técnicas 280
118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 280

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 280

120 ANEXO 281

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 281
120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 281
120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 281
120.4 BITÁCORA 281

121 INTRODUCCIÓN 284

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 286

122.1 LOCALIZACIÓN 286
122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 287
122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 287
122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 287

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 287

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 287
123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 289
123.2.1 Actividades Administrativas 289

123.2.2 Actividades Técnicas 289
123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 290
123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 290

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 292

124.1 INFORME SEMANAL 292
124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 292
124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 292
124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 292
124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 292
124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 293
124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 293
124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 293
124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 293
124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 293
124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 293
124.9.3 Actas de Comités 294
124.9.4 Actas de Reunión 294

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 294

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 294
125.1.1 Actividades Administrativas 294
125.1.2 Actividades Técnicas 294
125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 295

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 295

127 ANEXO 295

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 295
127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 296
127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 296
127.4 BITÁCORA 296

128 INTRODUCCIÓN 299

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 301

129.1 LOCALIZACIÓN 301
129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 302
129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 302
129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 303

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 303

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 303
130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 305
130.2.1 Actividades Administrativas 305
130.2.2 Actividades Técnicas 305

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 306
130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 306

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 307

131.1 INFORME SEMANAL 307
131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 307
131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 307
131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 307
131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 307
131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 307
131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 308
131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 308
131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 308
131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 308
131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 308
131.9.3 Actas de Comités 308
131.9.4 Actas de Reunión 308

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 309

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 309
132.1.1 Actividades Administrativas 309
132.1.2 Actividades Técnicas 309
132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 309

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 310

134 ANEXO 310

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 310
134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 310
134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 310
134.4 BITÁCORA 310

135 INTRODUCCIÓN 313

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 315

136.1 LOCALIZACIÓN 315
136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 316
136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 317
136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 317

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 317

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 317
137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 319
137.2.1 Actividades Administrativas 319
137.2.2 Actividades Técnicas 320
137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 320

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 320

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 321

138.1 INFORME SEMANAL 321
138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 321
138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 321
138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 322
138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 322
138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 322
138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 322
138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 322
138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 322
138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 322
138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 323
138.9.3 Actas de Reunión 323

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 323

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 323
139.1.1 Actividades Administrativas 323
139.1.2 Actividades Técnicas 324
139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 325

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 325

141 ANEXO 325

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 325
141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 325
141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 325
141.4 BITÁCORA 325

142 INTRODUCCIÓN 328

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 330

143.1 LOCALIZACIÓN 330
143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 331
143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 331
143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 331

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 331

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 331
144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 333
144.2.1 Actividades Administrativas 333
144.2.2 Actividades Técnicas 333
144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 334
144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 334

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 335

145.1 INFORME SEMANAL 335
145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 335
145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 335
145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 335
145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 336
145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 336
145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 336
145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 336
145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 336
145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 336
145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 336
145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 337
145.9.4 Actas de Reunión 337

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 337

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 337
146.1.1 Actividades Administrativas 337
146.1.2 Actividades Técnicas 337
146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 338

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 338

148 ANEXO 339

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 339
148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 339
148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 339
148.4 BITÁCORA 339

149 INTRODUCCIÓN 342

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 344

150.1 LOCALIZACIÓN 344
150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 345
150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 345
150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 345

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 345

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 345
151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 347
151.2.1 Actividades Administrativas 347
151.2.2 Actividades Técnicas 347
151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 348
151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 348

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 349

152.1 INFORME SEMANAL 349

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 349
152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 350
152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 350
152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 350
152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 350
152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 350
152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 350
152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 350
152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 350
152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 350
152.9.3 Actas de Reunión 352

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 352

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 352
153.1.1 Actividades Administrativas 352
153.1.2 Actividades Técnicas 352
153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 353

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 353

155 ANEXO 354

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 354
155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 354
155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 354
155.4 BITÁCORA 354

156 INTRODUCCIÓN 357

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 358

157.1 LOCALIZACIÓN 358
157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 359
157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 359
157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 360

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 360

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 360
158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 361
158.2.1 Actividades Administrativas 361
158.2.2 Actividades Técnicas 361
158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 361
158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 361

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 362

159.1 INFORME SEMANAL 362
159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 362

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 362
159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 362
159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 363
159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 363
159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 363
159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 363
159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 363
159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 363
159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 363
159.9.3 Actas de Reunión 363

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 363

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 363
160.1.1 Actividades Administrativas 363
160.1.2 Actividades Técnicas 364
160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 364

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 364

162 ANEXO 364

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 364
162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 364
162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 365
162.4 BITÁCORA 365

163 INTRODUCCIÓN 368

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 370

164.1 LOCALIZACIÓN 370
164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 371
164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 371
164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 371

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 371

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 371
165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 373
165.2.1 Actividades Administrativas 373
165.2.2 Actividades Técnicas 373
165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 374
165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 374

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 375

166.1 INFORME SEMANAL 375
166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 375

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 375
166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 376
166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 376
166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 376
166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 376
166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 376
166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 376
166.9.3 Actas de Reunión 377

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 377

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 377
167.1.1 Actividades Administrativas 377
167.1.2 Actividades Técnicas 377
167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 378

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 378

169 ANEXO 379

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 379
169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 379
169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 379
169.4 BITÁCORA 379

170 INTRODUCCIÓN 382

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 384

171.1 LOCALIZACIÓN 384
171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 385
171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 385
171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 386

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 386

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 386
172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 387
172.2.1 Actividades Administrativas 387
172.2.2 Actividades Técnicas 388
172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 388
172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 389

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 389

173.1 INFORME SEMANAL 389
173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 389
173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 390
173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 390
173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 390

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 390
173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 390
173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 390
173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 390
173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 390
173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 390
173.9.3 Actas de Reunión 391

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 392

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 392
174.1.1 Actividades Administrativas 392
174.1.2 Actividades Técnicas 392
174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 392

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 393

176 ANEXO 393

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 393
176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 393
176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 393
176.4 BITÁCORA 393

177 INTRODUCCIÓN 396

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 398

178.1 LOCALIZACIÓN 398
178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 399
178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 399
178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 399

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 400

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 400
179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 401
179.2.1 Actividades Administrativas 401
179.2.2 Actividades Técnicas 402
179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 402
179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 402

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 404

180.1 INFORME SEMANAL 404
180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 404
180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 404
180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 404
180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 404
180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 405
180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 405

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 405
180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 405
180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 405
180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 405
180.9.3 Actas de Reunión 406

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 406

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 406
181.1.1 Actividades Administrativas 406
181.1.2 Actividades Técnicas 406
181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 407

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 407

183 ANEXO 408

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 408
183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 408
183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 408
183.4 BITÁCORA 408

184 INTRODUCCIÓN 411

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 413

185.1 LOCALIZACIÓN 413
185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 414
185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 414
185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 414

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 414

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 414
186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 416
186.2.1 Actividades Administrativas 416
186.2.2 Actividades Técnicas 417
186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 417
186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 417

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 419

187.1 INFORME SEMANAL 419
187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 419
187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 419
187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 419
187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 419
187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 419
187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 419
187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 420
187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 420

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 420
187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 420
187.9.3 Actas de Reunión 421

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 421

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 421
188.1.1 Actividades Administrativas 421
188.1.2 Actividades Técnicas 421
188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 422

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 422

190 ANEXO 422

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 422
190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 422
190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 423
190.4 BITÁCORA 423

191 INTRODUCCIÓN 426

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 428

192.1 LOCALIZACIÓN 428
192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 429
192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 429
192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 429

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 429

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 429
193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 431
193.2.1 Actividades Administrativas 431
193.2.2 Actividades Técnicas 432
193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 432
193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 433

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 433

194.1 INFORME SEMANAL 433
194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 433
194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 434
194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 434
194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 434
194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 434
194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 434
194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 434
194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 434
194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 434
194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 435

194.9.3 Actas de Reunión 436

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 436

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 436
195.1.1 Actividades Administrativas 436
195.1.2 Actividades Técnicas 436
195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 437

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE 437

197 ANEXO 438

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 438
197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 438
197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 438
197.4 BITÁCORA 438

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 53
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 53
ILUSTRACIÓN 3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 54
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 67
ILUSTRACIÓN 5 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 67
ILUSTRACIÓN 6 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 68
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 80
ILUSTRACIÓN 8 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 80
ILUSTRACIÓN 9 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL JAC PATIO BONITO 81
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 94
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 95
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 106
ILUSTRACIÓN 13 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 106
ILUSTRACIÓN 14 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 107
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 120
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 120
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 133
ILUSTRACIÓN 18 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 134
ILUSTRACIÓN 19 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 135
ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 147
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 147
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 161
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 162
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 176
ILUSTRACIÓN 25 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 176
ILUSTRACIÓN 26. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 177
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 189
ILUSTRACIÓN 28 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 190
ILUSTRACIÓN 29. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 191

ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 202
ILUSTRACIÓN 31 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 203
ILUSTRACIÓN 32. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 204
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 215
ILUSTRACIÓN 34 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 216
ILUSTRACIÓN 35. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 216
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 229
ILUSTRACIÓN 37 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 230
ILUSTRACIÓN 38. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 231
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS). 243
ILUSTRACIÓN 40 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 244
ILUSTRACIÓN 41. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 245
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 258
ILUSTRACIÓN 43 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 259
ILUSTRACIÓN 44. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 260
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 272
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 273
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 286
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 287
ILUSTRACIÓN 49 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 301
ILUSTRACIÓN 50 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 302
ILUSTRACIÓN 51 ESTADO INICIAL DEL SECTOR..... 303
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS)..... 315
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 316
ILUSTRACIÓN 54 ESTADO INICIAL 317
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 330
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 331
ILUSTRACIÓN 57 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 344
ILUSTRACIÓN 58 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 345
ILUSTRACIÓN 59 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS). 359
ILUSTRACIÓN 60 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 359
ILUSTRACIÓN 61 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS)..... 370
ILUSTRACIÓN 62 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 371
ILUSTRACIÓN 63 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 384
ILUSTRACIÓN 64 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 385
ILUSTRACIÓN 65 ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 385
ILUSTRACIÓN 66 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 398
ILUSTRACIÓN 67 ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 399
ILUSTRACIÓN 68 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 413
ILUSTRACIÓN 69 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 414
ILUSTRACIÓN 70 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 428
ILUSTRACIÓN 71 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 429

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR 9
TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 45
TABLA 3 PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 47
TABLA 4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 56
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 58
TABLA 6 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 83
TABLA 7 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 86
TABLA 8 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 97
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 109
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 122
TABLA 11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 136
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 149
TABLA 13 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 164
TABLA 14 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 167
TABLA 15 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 179
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 193
TABLA 17 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 205
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 218
TABLA 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 233
TABLA 20 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 247
TABLA 21 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 262
TABLA 22 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 275
TABLA 23 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 277
TABLA 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 289
TABLA 25 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 292
TABLA 26 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 305
TABLA 27 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 319
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 322
TABLA 29 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 333
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 335
TABLA 31 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 347
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 350
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 361
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 373
TABLA 35 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 375
TABLA 36 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 387
TABLA 37 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 390
TABLA 38 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 401
TABLA 39 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 404
TABLA 40 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 416
TABLA 41 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 419
TABLA 42 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 431
TABLA 43 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 434

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 1.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 1.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 1.5	Informe financiero
ANEXO 1.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 1.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 1.8	Registro Fotográfico
ANEXO 1.9	Bitácora de obra
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 2.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 2.5	Informe financiero
ANEXO 2.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 2.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 2.8	Registro Fotográfico
ANEXO 2.9	Bitácora de obra
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 3.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 3.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 3.6	Ensayos de laboratorio

ANEXO 3.7	Registro Fotográfico
ANEXO 3.8	Bitácora de obra
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 4.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 4.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 4.5	Informe financiero
ANEXO 4.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 4.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 4.8	Registro Fotográfico
ANEXO 4.9	Bitácora de obra
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 5.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 5.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 5.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 5.7	Registro Fotográfico
ANEXO 5.8	Bitácora de obra
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 6.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 6.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 6.6	Ensayos de laboratorio

ANEXO 6.7	Registro Fotográfico
ANEXO 6.8	Bitácora de obra
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 7.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 7.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 7.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 7.7	Registro Fotográfico
ANEXO 7.8	Bitácora de obra
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 8.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 8.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 8.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 8.7	Registro Fotográfico
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 9.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 9.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 9.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 9.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 9.7	Registro Fotográfico
ANEXO 9.8	Bitácora de obra

ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 10.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 10.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 10.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 10.7	Registro Fotográfico
ANEXO 10.8	Bitácora de obra
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 11.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 11.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 11.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.7	Registro Fotográfico
ANEXO 11.8	Bitácora de obra
ANEXO 12	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 12.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 12.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 12.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 12.7	Registro Fotográfico

ANEXO 12.8	Bitácora de obra
ANEXO 13	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 13.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13.3	Relación de correspondencia
ANEXO 13.4	Actas de comité
ANEXO 13.5	Informe de los especialistas
ANEXO 13.6	Actas de reunión
ANEXO 13.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 13.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 13.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICIÓN No. 1	$532.999.145 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.700.014.247 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/05/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ

G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 9 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$170.001.424,70	11/09/2024	3/04/2026
Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	3/04/2026
Prestaciones sociales	$340.002.849,40	11/09/2024	3/10/2028
Calidad del servicio	$510.004.274,10	3/10/2025	3/10/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 13.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 13.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024. Los días 19 de marzo de 2025, la Interventoría remitió el oficio CINP-555-533-1197 con la hoja de vida del Residente, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-017188 de fecha 21 de marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 13 de julio de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP–555–978–2752, con la hoja de vida del Ingeniero Residente, para revisión y aprobación.
El 15 de agosto de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP–555–1177-3299, con la hoja de vida del Profesional financiero, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-060687.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARLOS MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	LUZ VITOLA

CARGO	NOMBRE
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	MILADY GAVIRIA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver Anexo 13.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Acta Parcial de Costos No. 10 correspondiente al periodo del informe se remite a la Supervisión de forma paralela con dicho informe y en este informe se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 13.7.

Hasta la fecha de corte de este informe después de haber transcurrido nueve (9) meses del plazo contractual, EL INSTITUTO ha cancelado al Consorcio CCSO el valor correspondiente a las Actas de Costos No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de los periodos noviembre y diciembre de 2024 y enero a abril de 2025, se encuentra pendiente el pago del Acta de Costos No. 8, correspondiente al mes de mayo 2025.

Al finalizar el mes de agosto de 2025, EL INSTITUTO solo ha cancelado $ $817 millones de los $946 millones que se llevan facturado, donde se puede ver claramente que el Consorcio hasta el mes de mayo de 2025 se vio afectado en el flujo de caja por el pago tardío por parte de INVIAS, teniendo que pagar el impuesto IVA de cada factura presentada sin recibir el valor de dichas facturas.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjuntan las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 13.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica para el Contrato No. 3601 de 2024.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 13.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	52
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	53
1	**INTRODUCCIÓN**		55
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		58
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		58
3.1	Información general del contrato		58
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		60
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		61
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		61
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		62
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	492
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	513
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	515
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	517
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	519
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	521
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	501
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		63
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		63
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	64
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		64
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		65
7	**Conclusiones y recomendaciones**		66
8	**Anexos**		66
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		523
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		525

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE REINICIO:	1/05/2025
PLAZO DE PRÓRROGA N 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/03/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	362,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	158.321.818,11
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.221.887,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.108.640,11

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 71.264.319,03	$ 83.082.534,23
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.075.000,00	$ 15.359.575,00
VALOR EJECUTADO	**$ 80.339.319,03**	**$ 98.442.109,23**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 81.740.594,23
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 98.442.109,23
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	49,19%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

Foto 1, Vaciado de concreto ciclópeo

Foto 2, Estriado, Espina de pescado y Juntas de Dilatación en huellas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

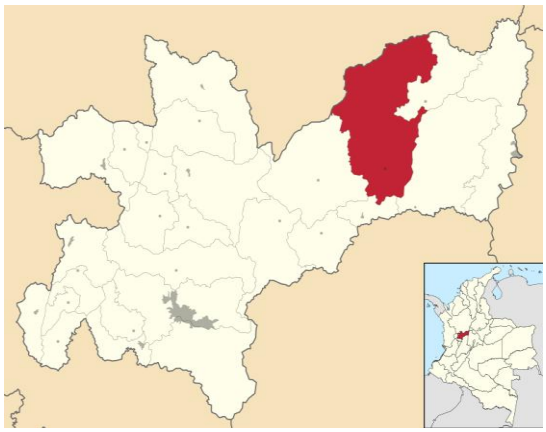

Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

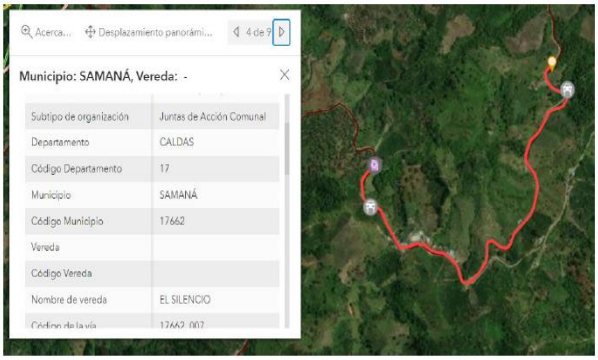

Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 3 Inventario y estado inicial

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8

TELÉFONO:	3107225125
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/2025
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/07/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010

Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**

CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	31/12/2024	30/05/2026
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	31/12/2024	30/05/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.434,00	30/05/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	30/05/2025

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 1/8/25, remitió el plan de compras no. 3.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 5/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 4.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 5/8/25, remitió el plan de compras y solicitud de desembolso no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/8/25, remitió el plan de compras no. 4.

5.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 39 ml, cantidad ejecutada: 24,0 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105,6 ml, cantidad ejecutada: 48,7 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 14,45 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 2396 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 73,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105,6 ml, cantidad ejecutada: 48,7 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 14,45 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 2396 Kg.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	59%	40,85%	81.740.594,23
Ejecutado	62%	49,19%	98.442.109,23
Avance / Retraso	**3%**	**8,35%**	**16.701.515,00**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,85	3,85
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	37%	195,72	73,19

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	31%	56%	27,08	48,68
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	68%	78%	12,64	14,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	54%	62%	2100,77	2396

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 1.3.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-683-1776 de fecha 2 de mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 1.4.

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 4.882.075 de fecha 17/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 48.565.648 de fecha 28/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 32.316.719,12 de fecha 1/08/2025

4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 2.656.500 de fecha 6/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 1.751.354 de fecha 13/08/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 8.763.080 de fecha 15/08/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 2.390.088 de fecha 15/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 101.325.463,23 correspondiente al 50,58% del valor del convenio. Ver anexo 1.5

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 1.6

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 1.7

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

Se encuentran pendiente las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 y Prórroga No. 2.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**65,5 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**59%**	**62%**
Excavaciones varias sin Clasificar	7 días	lun 21/07/25	lun 28/07/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 27/07/25	mar 19/08/25	100%	37%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	47 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	31%	56%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	35 días	jue 31/07/25	mar 9/09/25	68%	78%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	mié 6/08/25	lun 15/09/25	54%	62%

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $81.740.594,23; la Inversión Ejecutada fue de $98.442.109,23. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $16.701.515,00

6.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

6.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1118-3162 de fecha 6/8/25, remitió a la JAC los formatos de gestión social para la revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1149-3247 de fecha 13/8/25, remitió al INVIAS la documentación de gestión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1167-3271 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1234-3439 de fecha 26/8/25, remitió a la JAC los resultados de los ensayos de laboratorio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1244-3476 de fecha 28/8/25, respondió a la JAC solicitud de aprobación de transportes adicionales de materiales de ferretería.

7.1.2 Actividades Técnicas

El día 1 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se aprobó el Plan de Compras. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo, para su envió a pago

El día 9 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se aprobó el Plan de Compras. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 73,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105,6 ml, cantidad ejecutada: 48,7 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 14,45 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 2396 Kg.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y enero a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido la solicitud de giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.
- Que el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 presenta una situación, relacionado con el C.B.R. de la subrasante por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO . A la fecha de corte de este informe. INVIAS propuso un mejoramiento de la subrasante con una capa de afirmado de 10 cm de espesor, lo que permite cumplir con el CBR mínimo requerido,
- El avance físico de la obra es del 62% e Inversión de 49.19% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 73,2 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105,6 ml, cantidad ejecutada: 48,7 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 14,45 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 119 ml, cantidad ejecutada: 2396 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $98.442.109,23 correspondiente al 49,19% del valor del convenio.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 1.8

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

Ver anexo 1.9

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	68
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	69
1	**INTRODUCCIÓN**		71
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		73
2.1	Localización		73
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		74
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		74
2.4	Características técnicas del proyecto		75
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		75
3.1	Información general del contrato		75
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		76
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		77
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		77
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		78
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		79
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		79
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	79
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	79
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		80
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		80
7	**Conclusiones y recomendaciones**		81
8	**Anexos**		81
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	20/6/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE PRORROGA 03:	20/7/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.845.017,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	9.470.802	142.350.927,62
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	47.588.927,49
VALOR EJECUTADO	**9.470.801,76**	**189.939.855,11**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.688.268,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.939.855,11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	94,64%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 2 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de Suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que, de ser aceptada, las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

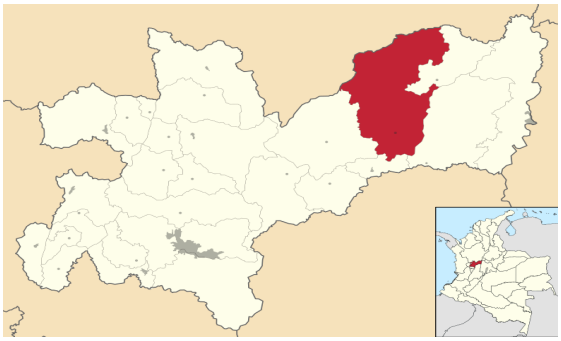

Ilustración 4 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

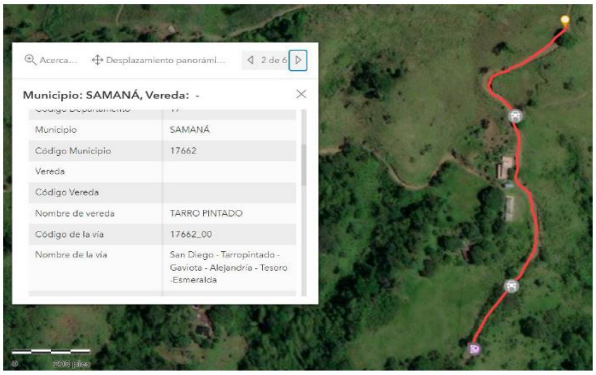

Ilustración 5 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 6 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros. De igual manera, se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MESES HASTA EL 1/08/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.068.826,80	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	02/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

12.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.688.268,00
Ejecutado	100%	94,64%	189.939.855,11
Avance / Retraso	**0%**	**-5,36%**	**-10.748.412,89**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	120,87	110,16
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	93,84	85,53

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	23,35
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4326,09	3.942,77

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.947.919 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 4.587.660 de fecha 07/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 8.109.428 de fecha 07/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 15.007.160 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.204.580 de fecha 09/03/2025.
6. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 34.000 de fecha 09/03/2025.
7. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 5.262.919 de fecha 13/03/2025
8. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 22.974.515,00 de fecha 19/03/2025
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 16.679.081,00 de fecha 26/03/2025
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 23.491.818,35 de fecha 10/04/2025
11. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 13.430.506,00 de fecha 14/05/2025
12. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 1.247.999,43 de fecha 27/05/2025

Desembolso Total por valor de $177.986.023,61 correspondiente al 89% del valor del convenio.

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1		**Placa Huella San Diego**	**60 días**	**lun 13/01/25**	**lun 7/04/25**	**100%**	**100%**
2		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
4		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%
6		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 200.688.268,00; la Inversión Ejecutada fue de $189.939.855,11. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $10.748.412,89.

13.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

13.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros del mes de julio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió los formatos financieros solicitados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió las planillas de seguridad social pagadas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/8/25, remitió los soportes financieros solicitados.

14.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 94,64% hasta el corte del presente periodo, teniendo en cuenta que se realizaron 144ml de placa huella con la estructura completa, con los recursos disponibles para la obra física. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $189.939.855,11 correspondiente al 94,64% del valor del convenio.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	83
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	84
1	**INTRODUCCIÓN**		86
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		88
2.1	Localización		88
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		89
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		89
2.4	Características técnicas del proyecto		89
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		90
3.1	Información general del contrato		90
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		91
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		92
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		92
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		93
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		95
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		95
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	95
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		96
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		96
7	**Conclusiones y recomendaciones**		96
8	**Anexos**		97
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE PRORROGA 03:	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	1.604.522	155.853.830,36
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	43.742.203,42
VALOR EJECUTADO	**1.604.522,36**	**199.596.033,78**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 203.482.844,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.596.033,78
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,09%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202542871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

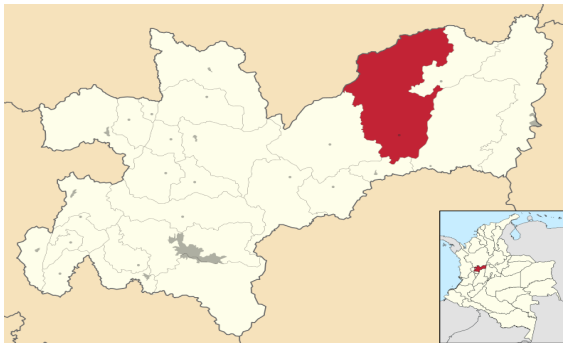

Ilustración 7 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

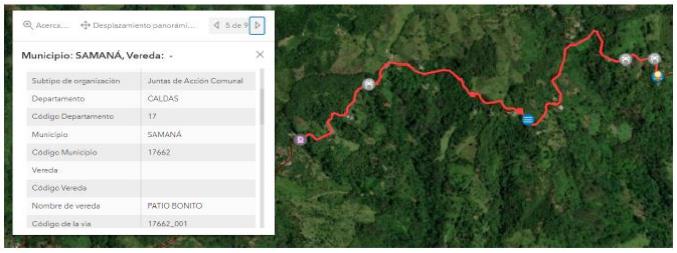

Ilustración 8 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 9 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/5/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25

PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/08/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.348.285,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	02/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	17/07/2024	01/08/2028

Tabla 6 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 02/08/25, remitió la solicitud de desembolso No. 12, para revisión y aprobación.

19.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4,60 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118, 58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.482.844,00
Ejecutado	100%	98,08%	199.596.033,78
Avance / Retraso	**0%**	**-1,92%**	3.886.810,22

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,86	4,6
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	99,45	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	77,4	92,28

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	24,47	29,18
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.546,03	4.227,96
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García

Tabla 7 Personal Convenio Solidario

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 45.709.003 de fecha 20/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.219.378 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 2.313.650 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 23.212.472 de fecha 09/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 5.157.000,00 de fecha 19/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 34.850.708,00 de fecha 25/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.079.661,00 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 419.368,00 de fecha 25/03/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.566.760,21 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.896.760,00 de fecha 24/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 18.100.594,73 de fecha 25/04/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.533.916,00 de fecha 27/05/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 532.533,00 de fecha 27/05/2025.

Ver Anexo 3.5

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo no ha presentado las pólizas de las nuevas novedades contractuales, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1	✓		**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**lun 17/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**sáb 22/02/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**sáb 22/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	sáb 22/02/25	sáb 8/03/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	vie 28/02/25	lun 17/03/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	jue 6/03/25	mié 9/04/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	100%	100%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada acumulada fue de $ 203.482.844,00; la Inversión Ejecutada fue de $ 199.596.033,78. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que ejecutada por valor de 3.886.810,22.

20.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

20.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP–555–1206–3339 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC la documentación para la liquidación.

21.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, se encuentran pendiente los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de julio 2024 a febrero 2025.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,08% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin

Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.596.033,78 correspondiente al 98,08% del valor del convenio.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	99
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		101
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		103
2.1	Localización		103
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		104
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		104
2.4	Características técnicas del proyecto		104
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		104
3.1	Información general del contrato		104
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		106
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		106
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		106
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		108
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		108
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		109
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	109
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		109
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		109
7	**Conclusiones y recomendaciones**		110
8	**Anexos**		110
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 3 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 4 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 13 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 1 del Convenio, que iría hasta el 22 de septiembre de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos

Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

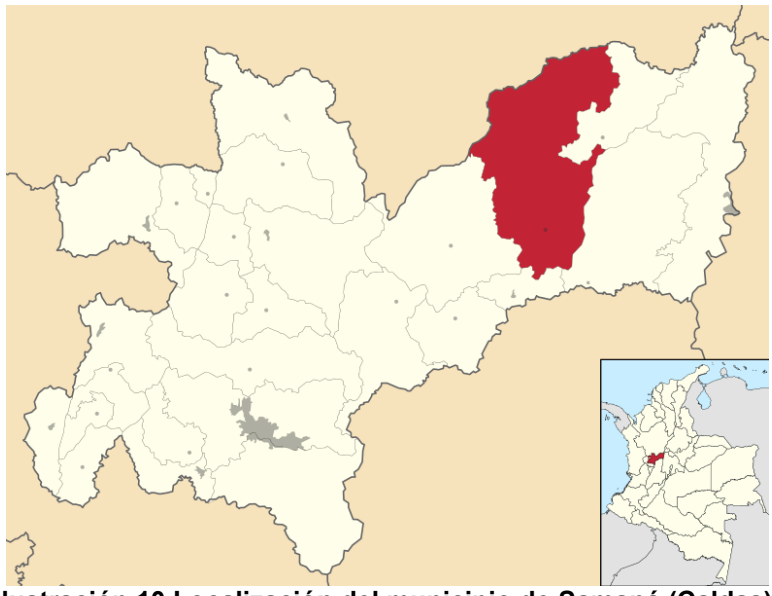

Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/5/25
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25
AMPLIACIÓN No. 5 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 21/09/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 03 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			

Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 8 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con	M3	0%	0%	7,30	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	material producto de la excavación					

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractual del Convenio No. 2159 de 2024.

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- La Interventoría realizará la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría realizará la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	112
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		114
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		116
2.1	Localización		116
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		117
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		117
2.4	Características técnicas del proyecto		117
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		118
3.1	Información general del contrato		118
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		119
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		120
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		120
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		121
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		122
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		122
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	122
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		123
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		124
7	**Conclusiones y recomendaciones**		124
8	**Anexos**		124
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

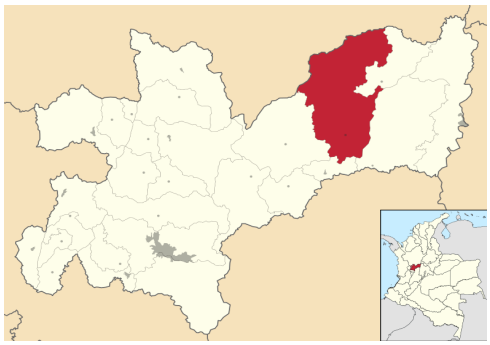

Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 14 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/08/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.067.401,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	01/08/2030	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	02/07/2024	01/08/2025

Tabla 9 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió los documentos financieros solicitados.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió las planillas de seguridad social pagadas.

33.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.674.007,00
Ejecutado	100%	97,02%	194.710.151,34
Avance / Retraso	**0%**	**2.98%**	**5.963.855,66**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	113,76
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,7	81,56
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	27,62
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3.756,53

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $55.537.787 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.587.660 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $3.221.014 de fecha 14/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $13.815.559 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.595.532 de fecha 06/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $60.000 de fecha 10/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $3.636.675 de fecha 13/03/2025.

8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 10.304.766,00 de fecha 19/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 21.103.169,41 de fecha 04/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 47.001.876,72 de fecha 14/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 22.662.110,71 de fecha 02/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 9.534.555 de fecha 30/05/2025.

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	D. Calenda	Comienzo	Fin	% prog	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4,41	M3	32	lun 13/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	115,52	M3	22	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	91,70	M3	64	vie 7/02/25	sáb 12/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	28,05	M3	53	jue 20/02/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4.223,65	KG	65	lun 3/02/25	mié 9/04/25	100%	100%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $200.674.007,00; la Inversión Ejecutada fue de $ 194.710.151,34. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $5.963.855,66.

34.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

34.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1194–3327, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.

35.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de Julio 2024 a Junio 2025.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 88,81% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.710.151,34 correspondiente al 97,02% del valor del convenio.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	127
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	128
1	**INTRODUCCIÓN**		130
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		132
2.1	Localización		132
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		133
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		133
2.4	Características técnicas del proyecto		133
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		133
3.1	Información general del contrato		133
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		135
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		136
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		136
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		136
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		138
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		138
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	138
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		138
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		139
7	**Conclusiones y recomendaciones**		140
8	**Anexos**		140
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	336,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	348.948	152.219.885,09
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	42.444.423,32
VALOR EJECUTADO	**348.948,27**	**194.664.308,41**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.533.857,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.664.308,41
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,59%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.

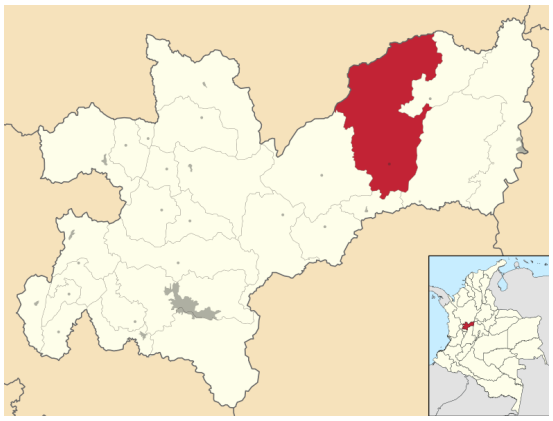

Ilustración 15 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

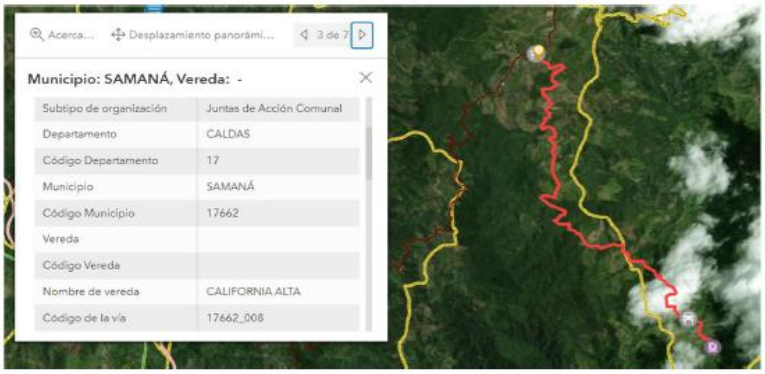

Ilustración 16 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE

VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.153.386,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	26/06/2024	01/08/2025

Tabla 10 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió los documentos financieros solicitados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió las planillas de seguridad social pagadas.

40.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.533.857,00
Ejecutado	100%	96,59%	194.664.308,41
Avance / Retraso	**0%**	**3,41%**	**6.869.548,59**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	118,58	106,72
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	92,01	88,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	25,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.243,89	3.819,5

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 6.3.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.936.944 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 03 probado por valor de $ 4.587.660 de fecha 14/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 8.553.302 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 27.000 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.647.805 de fecha 13/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.531.906 de fecha 20/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $1.489.715 de fecha 28/03/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $182.000 de fecha 09/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 42.507.598,07 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 16.167.261,73 de fecha 29/04/2025.
12. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 9.933.473,17 de fecha 22//05/2025.
13. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 5.411.484,67 de fecha 22/05/2025.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL	**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $201.533.857,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.664.308,41. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 6.869.548,59.

41.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

41.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1199–3332 de fecha 19/8/25, solicitó documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1213–3346 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.

42.1.2 Actividades Técnicas

A fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio de 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los

rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 17 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,59% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.664.308,41 correspondiente al 96,59% del valor del convenio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	142
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		144
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		146
2.1	Localización		146
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		147
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		147
2.4	Características técnicas del proyecto		148
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		148
3.1	Información general del contrato		148
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		150
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		150
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		150
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		151
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		152
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		152
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	153
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		153
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		154
7	**Conclusiones y recomendaciones**		154
8	**Anexos**		154
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.

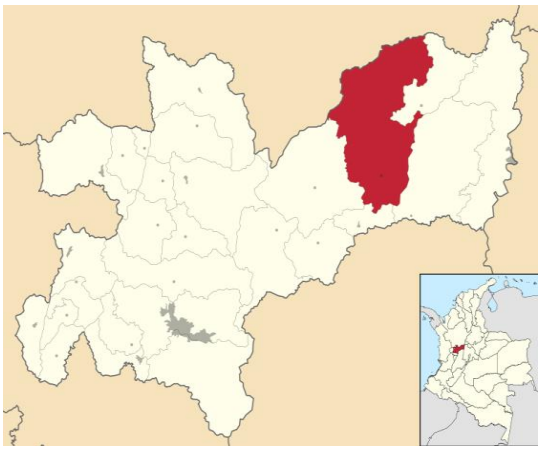

Ilustración 17 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 18 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.

Ilustración 19 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.300.258,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	01/08/2025

Tabla 11 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

47.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.002.573,00
Ejecutado	100%	99,36%	201.723.369,83
Avance / Retraso	**0%**	**4,27%**	**1.279.203,17**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	5,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,34	136,94
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	95,32	109,37
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	33,55
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.375,92	5.021,09

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, no se relaciona porque la Obra terminó el 15 de abril de 2025.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $49.763.368 de fecha 07/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $10.065.922 de fecha 21/02/2025.

3. Desembolso 04 aprobado por valor de $44.758.547 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $48.045.188 de fecha 13/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $3.119.882 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $2.246.646 de fecha 15/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $198.425 de fecha 19/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $10.860.988 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 17.875.733,66 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.900.599,00 de fecha 25/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 866.600,00 de fecha 06/05/2025.

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1	✓		**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**mar 21/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**dom 26/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	dom 26/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	sáb 1/02/25	mar 18/02/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 7/02/25	jue 13/03/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mié 12/02/25	jue 13/03/25	100%	100%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $203.002.573,00; la Inversión Ejecutada fue de $201.723.369,83. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 1.279.203,17

48.9.3 Actas de Comités

No aplica para el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1137–3226 de fecha 12/8/25, solicitó a la JAC documentación pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1203–3336 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1217–3350 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.

49.1.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de abril 2025, se encuentra pendiente por parte de la JAC la solicitud del giro de los rendimientos al corte del informe.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 15/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99.36% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 201.723.369,83

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	157
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		159
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		161
2.1	Localización		161
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		162
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		162
2.4	Características técnicas del proyecto		162
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		162
3.1	Información general del contrato		162
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		164
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		165
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		165
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		165
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		167
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		167
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	167
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		167
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		168
7	**Conclusiones y recomendaciones**		169
8	**Anexos**		169
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

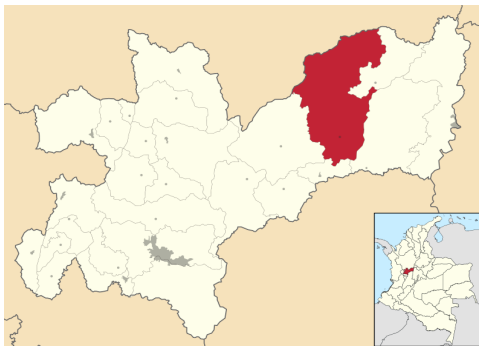

Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

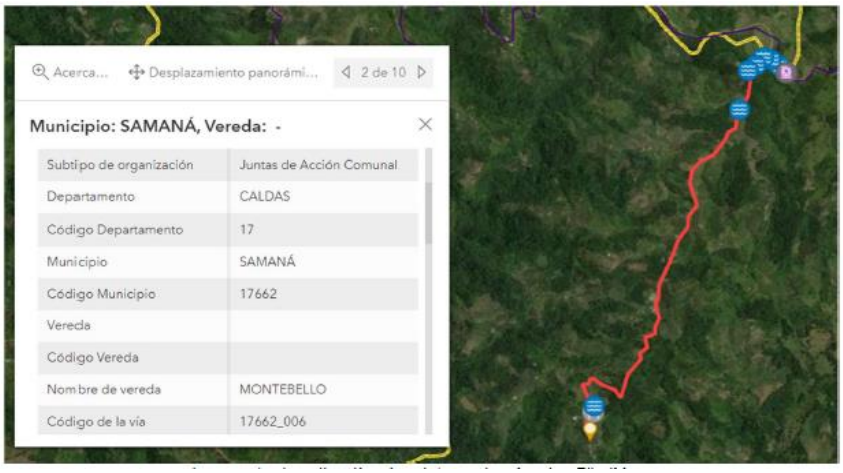

Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE

VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.122.901,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/05/2025

Tabla 12 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 11.

54.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 21 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.229.002,00
Ejecutado	100%	96,82%	194.829.972,26
Avance / Retraso	**0%**	**- 3,18%**	**- 6.399.029,74**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,23
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	113,99	109,25
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	90,04	82,72
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,88
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4125,38	3.789,81

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 8.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 47.162.934 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.620.194 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 14.638.851 de fecha 07/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.258.536 de fecha 18/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 23.059.752 de fecha 25/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 40.090.690,63 de fecha 25/03/2025.
7. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 237.849,49 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 513.766,89 de fecha 25/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 21.546.278,88 de fecha 02/05/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 375.100,00 de fecha 22/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 91.111,76 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 167.603.465,25 correspondiente al 84% del valor del convenio.

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y Prórroga No. 3.

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL		**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $201.229.002,00, la Inversión Ejecutada fue de $194.829.972,26. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $6.399.029,74.

55.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

55.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1196–3329 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–1210–3343 de fecha 19/8/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.

56.1.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de

los recursos de este convenio. Se encuentra pendiente el soporte de giro del Banco de los meses de julio 2024 a febrero 2025.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 21 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,82% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.829.972,26 correspondiente al 96,82% del valor del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Que desde el 24 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	172
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	173
1	**INTRODUCCIÓN**		175
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		177
2.1	Localización		177
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		178
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		178
2.4	Características técnicas del proyecto		178
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		178
3.1	Información general del contrato		178
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		180
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		181
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		181
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		183
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	546
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	561
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	563
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	565
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	567
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	569
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	555
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		184
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		184
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	184
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		185
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		186
7	**Conclusiones y recomendaciones**		186
8	**Anexos**		187
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		571
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		573

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	19/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01:	28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	27/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 15/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	363,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 202.747.162,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 202.747.162,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	156.490.887,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.149.964,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.247.162,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 48.801.014,54	$ 61.938.359,72
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.075.000,00	$ 16.324.170,00
VALOR EJECUTADO	**$ 57.876.014,54**	**$ 78.262.529,72**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 114.055.146,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 78.262.529,72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	38,88%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

Foto 1, Instalación de formaleta para vaciado de concreto ciclópeo

Foto 2, Instalación de hierro para las cuenetas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarro Pintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

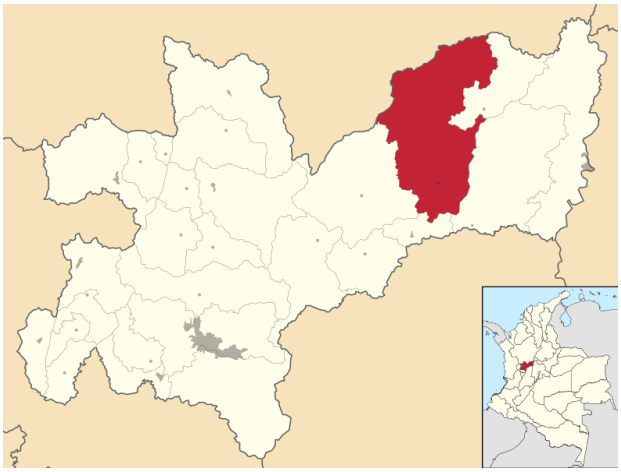

Ilustración 22 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

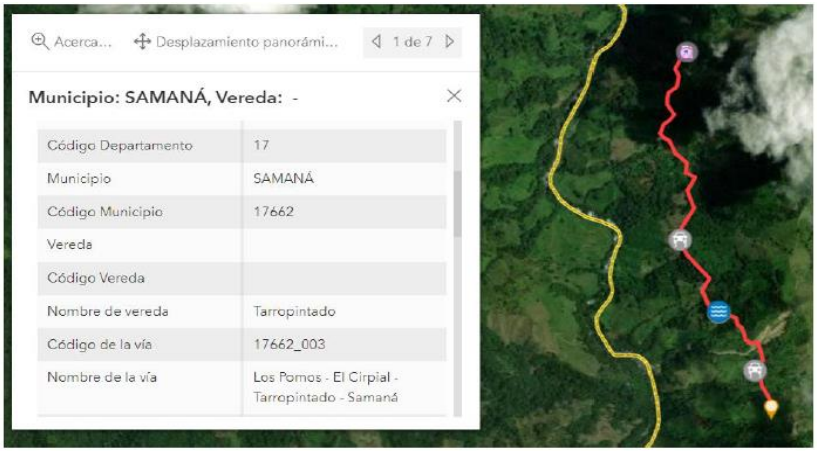

Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO

NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2524-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/04/2025
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/05/2025
REANUDACIÓN	19/5/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL	

Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 13 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 6/8/25, remitió el plan de compras no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de rendimientos financieros de julio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió nómina electrónica de julio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió informe de auxiliar detallado y buen manejo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/8/25, remitió el plan de compras no. 4.
- Se realizó comité operativo no. 7, 8, 9 y 10 de fechas 8/8/25, 14/8/25, 21/8/25 y 28/8/25 respectivamente.

61.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 20,25 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 23,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 16,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 1867 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 70,88 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 23,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 16,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 1867 Kg.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	38%	56,7%	114.055.146,48
Ejecutado	51%	38,9%	78.262.529,72
Avance / Retraso	**13%**	**-17,8%**	**- 35.792.616,77**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,62	5,62
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	61%	115,52	70,88
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	24%	27%	21,25	23,72
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24%	60%	6,73	16,88
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	20%	46%	815,11	1867
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	0	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 2.3

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–772–2097de fecha 21 de Mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Andrés Felipe Quiceno
Maestro de Obra	Rogelio Armando Loaiza Rua

Tabla 14 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver anexo 2.4

62.4 NFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 48.970.711 de fecha 24/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.734.091 de fecha 31/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 6.824.858 de fecha 11/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 21/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 64.420.520,00 correspondiente al 32,01% del valor del convenio. Ver anexo 2.5

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 2.6.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 2.7.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2524 de 2024.

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	**55 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**38%**	**51%**
INICIO	**55 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**38%**	**51%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 4/08/25	vie 22/08/25	100%	61%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	24%	27%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	24%	60%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	20%	46%
FINAL	**0 días**	**vie 3/10/25**	**vie 3/10/25**	0%	0%

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $114.055.146,48; la Inversión Ejecutada fue de $78.262.529,72. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $**35.792.616,77**

62.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

62.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1091-3106 de fecha 4/8/25, remitió a la JAC información ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1119-3163 de fecha 6/8/25, remitió a la JAC los formatos de gestión social para la revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1153-3257 de fecha 13/8/25, remitió al INVIAS la documentación de gestión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1155-3259 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC formatos ambientales para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1168-3272 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1228-3398 de fecha 22/8/25, remitió al INVIAS el plan de gestión ambiental de la JAC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/8/25, remitió plan de compras para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 7, 8, 9 y 10 de fechas 8/8/25, 14/8/25, 21/8/25 y 28/8/25 respectivamente.

63.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de Nomina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 8 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 14 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de Nomina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 70,88 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 23,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 16,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 1867 Kg.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes de solicitud del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.

- El avance físico de la obra es del 51% e Inversión de 38,9% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 70,88 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 23,72 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 16,88 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125 ml, cantidad ejecutada: 1867 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $78.262.529,72 correspondiente al 38,9% del valor del convenio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 2.8.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

Ver anexo 2.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	189
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	190
1	**INTRODUCCIÓN**		192
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		193
2.1	Localización		193
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		194
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		195
2.4	Características técnicas del proyecto		195
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		195
3.1	Información general del contrato		195
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		197
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		198
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		198
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		198
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		200
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		200
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	200
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		200
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		201
7	**Conclusiones y recomendaciones**		202
8	**Anexos**		202
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3901-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.855.760,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	3.836.926	164.610.861,84
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.721.331,00
VALOR EJECUTADO	**3.836.925,84**	**198.332.192,84**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.355.760,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.332.192,84
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

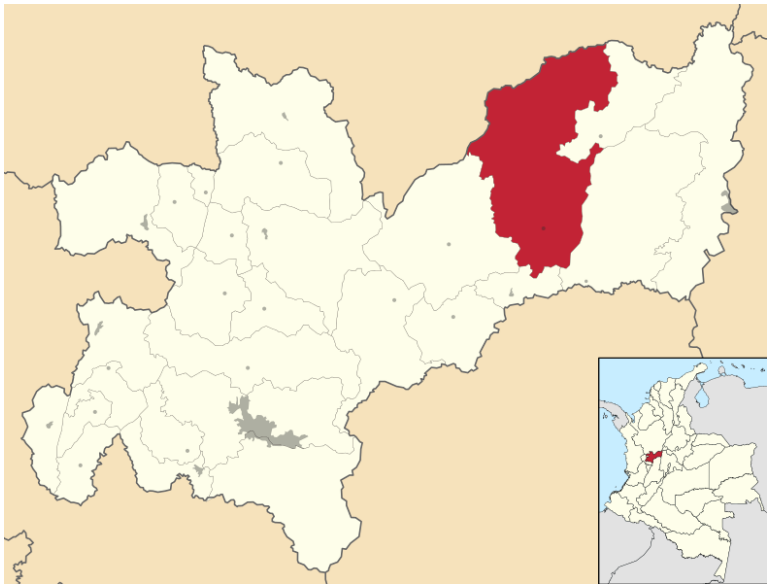

Ilustración 24 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

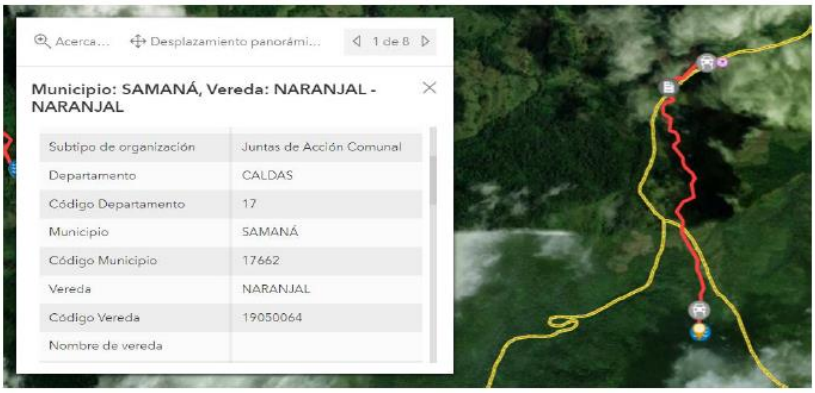

Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

Ilustración 26. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.135.576,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	30/04/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	30/05/2025

Patronal			

Tabla 15 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

68.2.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.355.760,00
Ejecutado	100%	98,49%	198.332.192,84
Avance / Retraso	**0%**	**- 1.5%**	**- 3.023.567,16**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	86,63	81,05
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,26
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3713,57

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 49.011.104 de fecha 10/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 4.608.800 de fecha 25/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 13.160.254 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.353.724 de fecha 10/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 14.360.988,00 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 17.669.304,25 de fecha 28/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 3.814.199,90 de fecha 31/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.658.441,47 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 27.406.000,26 de fecha 02/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.900.403,36 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.353.704,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 186.110.842,71 correspondiente al 93% del valor del convenio.

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**57 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin clasificar	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	mié 5/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21MPA (Clase D) - Mezcla in situ para placa huella	35 días	jue 13/02/25	mié 9/04/25	100%	100%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPA (F) 60% concreto - 40% piedra para placa huella	30 días	lun 24/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 6/02/25	mar 25/03/25	100%	100%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $201.355.760,00; la Inversión Ejecutada fue de $198.332.192,84. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $3.023.567,16.

69.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

69.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

70.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de mayo y junio 2025.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,49% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 198.332.192,84 correspondiente al 98,49 % del valor del convenio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	204
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	205
1	**INTRODUCCIÓN**		207
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		209
2.1	Localización		209
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		210
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		210
2.4	Características técnicas del proyecto		211
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		211
3.1	Información general del contrato		211
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		213
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		213
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		213
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		214
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		215
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		215
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	215
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		216
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		216
7	**Conclusiones y recomendaciones**		216
8	**Anexos**		217
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDALA LINDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.682.607,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	146,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.207.048,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.182.607,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	3.456.088,36	168.848.662,30
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	31.223.822,71
VALOR EJECUTADO	**3.456.088,36**	**200.072.485,01**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 202.682.607,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.072.485,01
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,71%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

Ilustración 27 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

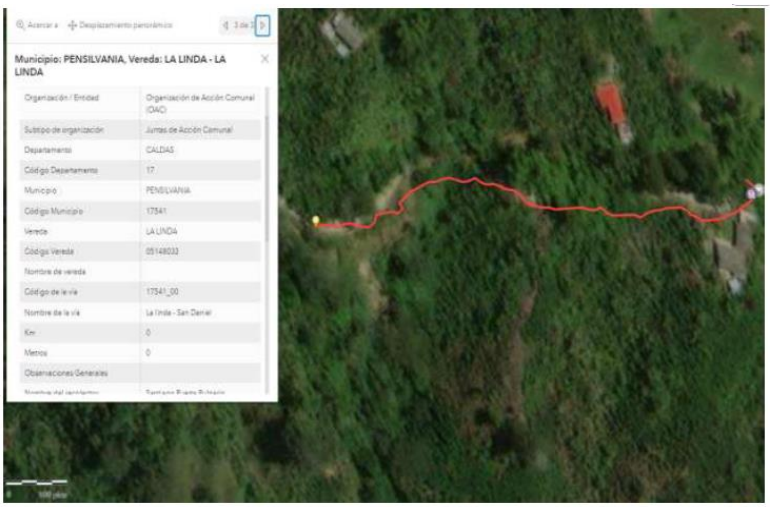

Ilustración 28 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciara que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 29. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL

	DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN NO. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 16 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	202.682.607,00
Ejecutado	100%	98,71%	200.072.485,01
Avance / Retraso	**0%**	**-1,28%**	**- 2.610.121,99**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	80,29	80,29
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3.969,12

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 28.185.246 de fecha 10/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 30.413.058 de fecha 22/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.533.588 de fecha 04/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 9.677.355 de fecha 11/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 144.600 de fecha 17/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 42.707.477 de fecha 26/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.670.450 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 1.099.373,18 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 12.923.150,00 de fecha 08/04/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 6.800.806,00 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 39.045.088,99 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 4.555.500,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 196.755.691,57 correspondiente al 97% del valor del convenio.

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentra pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No.1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga 3.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA			ACTIVIDADES ACUMULADAS				
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA			LONG. EJEC	CANT. PROG.	CANT. EJEC.	% PROG.	% EJEC.
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	146,00	4,31	4,31	100%	100%
2	320.3	Subbase Granular Clase C	146,00	111,69	111,69	100%	100%
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	146,00	80,29	80,29	100%	100%
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	146,00	27,45	27,45	100%	100%
5	640.10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	146,00	3.969,12	3.969,12	100%	100%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $202.682.607,00; la Inversión Ejecutada fue de $200.072.485,01. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $2.610.121,99.

76.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

76.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

77.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios del periodo de Julio 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos de los meses de enero, mayo y junio 2025 al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 28/03/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,71% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 80,29 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 27,45 m3. Acero

de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 3.969,12.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 200.072.485,01 correspondiente al 98,71% del valor del convenio.
- A pesar de haberse obtenido la No Objeción de la OPC por parte del Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el OAC se demoró en presentar los documentos en debida forma y con la completitud necesaria que permitiera a esta Interventoría aprobar el desembolso apara ejecutar la OPC.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	219
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		221
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		223
2.1	Localización		223
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		224
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		224
2.4	Características técnicas del proyecto		225
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		225
3.1	Información general del contrato		225
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		227
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		227
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		227
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		228
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		229
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		229
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	230
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		230
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		230
7	**Conclusiones y recomendaciones**		231
8	**Anexos**		231
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.

Ilustración 30 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

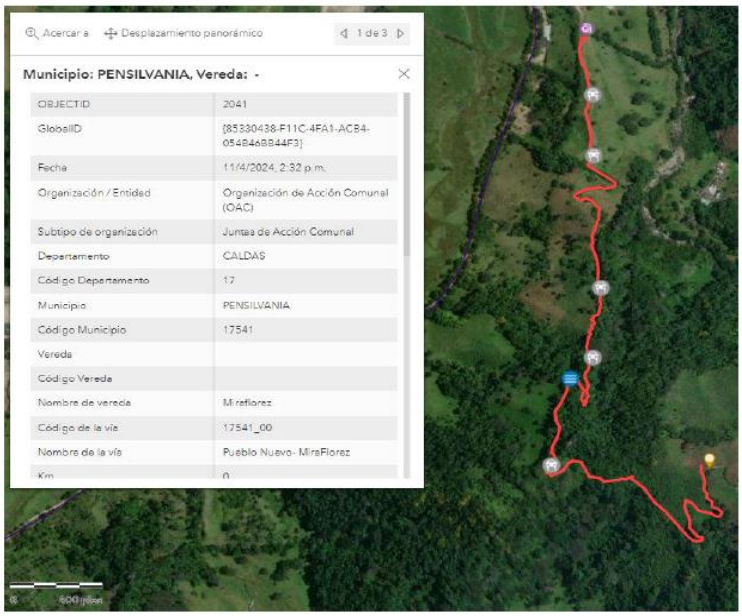

Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 32. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE

VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	30/05/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	30/05/2025

Tabla 17 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

82.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.393.774,00
Ejecutado	100%	98,23%	197.823.716,13
Avance / Retraso	**0%**	**- 1,77%**	**- 3.570.057,87**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	4,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	103,28	111,7
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	79,34	81,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	25,06	27,1
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.652,46	3766,09

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 50.347.996 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 11.041.270 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 8.496.904 de fecha 13/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 47.615.438 de fecha 28/02/2025.

5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 12.475.326 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 11.617.026,00 de fecha 02/04/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.946.782,00 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 2.314.200,00 de fecha 06/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 160.854.941,83 correspondiente al 79% del valor del convenio.

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga No. 3.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1	✓	**CONVENIO 2140 - 2024**	**59 días**	**mar 14/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**lun 20/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**53 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	100%	100%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 201.393.774,00; la Inversión Ejecutada fue de 197.823.716,13. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 3.570.057,87.

83.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

83.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

84.1.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibimos los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de agosto a diciembre 2024, marzo, mayo y junio 2025.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,23% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.823.716,13 correspondiente al 98,23% del valor del convenio.

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

85.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	233
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	234
1	**INTRODUCCIÓN**		236
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		238
2.1	Localización		238
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		239
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		239
2.4	Características técnicas del proyecto		240
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		240
3.1	Información general del contrato		240
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		241
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		242
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		242
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		243
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		244
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		244
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	244
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		245
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		245
7	**Conclusiones y recomendaciones**		246
8	**Anexos**		246
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	332,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.500.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1.500.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.155.580,85**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	10.498.422	164.652.191,56
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.924.931,09
VALOR EJECUTADO	**10.498.421,96**	**199.577.122,65**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.655.581,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.577.122,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,46%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA EL VERDAL
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

VEREDA EL VERDAL
FOTO 2 -OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

86 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.

Ilustración 33 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

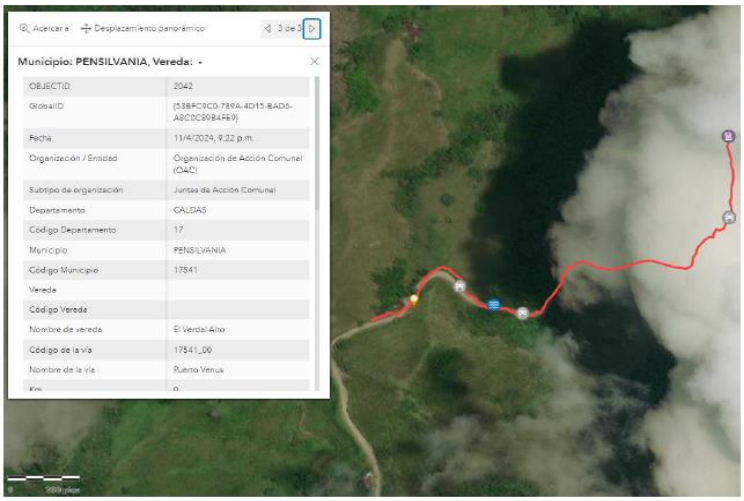

Ilustración 34 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

Ilustración 35. Estado inicial de la vía

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 6			
Cumplimiento	$20.065.559,00	03/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	03/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	01/08/2025

Tabla 18 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

88.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

88.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 4/2/25 para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.655.581,00
Ejecutado	100%	99,46%	199.577.122,67
Avance / Retraso	**0%**	**0,53%**	**-1.078.458,33**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,67	3,79
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	96,39	99,45
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	100%	100%	76,96	79,40

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	23,28	20,94
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.553,97	3.666,79

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 52.452.837 de fecha 6/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 5.527.000 de fecha 26/02/2025.
3. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 10.934.800 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 43.572.000 de fecha 26/02/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 14/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 359.800,00 de fecha 28/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.648.400,00 de fecha 26/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 14/04/2025.
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.555.891,00 de fecha 06/05/2025.
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 35.656.560,43 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.489.008,68 correspondiente al 96% del valor del convenio.

89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
CONVENIO 2077 - 2024	**79,63 días**	**mar 21/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**74,63 días**	**lun 27/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	lun 27/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 2/02/25	mar 25/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	40 días	lun 3/03/25	jue 17/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	29 días	jue 20/03/25	mar 22/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	lun 10/02/25	mar 11/03/25	100%	100%

89.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $200.655.581,00; la Inversión Ejecutada fue de $199.577.122,67. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $1.078.458,33.

89.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

89.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

90.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

90.1.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los

soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de julio a diciembre 2024.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,46% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.577.122,67 correspondiente al 99,46% del valor del convenio.
- Que desde el 10 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

92 ANEXO

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

92.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	249
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	250
1	**INTRODUCCIÓN**		252
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		254
2.1	Localización		254
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		255
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		255
2.4	Características técnicas del proyecto		256
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		256
3.1	Información general del contrato		256
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		258
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		259
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		259
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		259
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		261
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		261
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	261
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		261
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		262
7	**Conclusiones y recomendaciones**		263
8	**Anexos**		263
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	332,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3901-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.654.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	14.507.400	155.544.379,61
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	44.014.287,42
VALOR EJECUTADO	**14.507.400,11**	**199.558.667,03**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.154.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.558.667,03
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA MIRAFLORES
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24

VEREDA MIRAFLORES
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

93 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

94.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

Ilustración 36 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

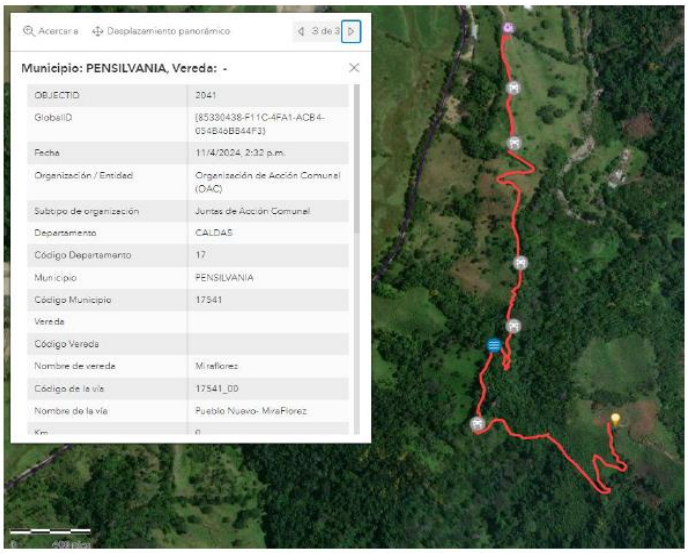

Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.

Ilustración 38. Estado inicial de la vía

94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.115.401,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025

Patronal			

Tabla 19 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

95.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

95.2.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.154.007,00
Ejecutado	100%	99,2%	199.558.667,00
Avance / Retraso	**0%**	**- 0,79%**	**- 1.595.340**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,12
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	107,87
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,70	85,63
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,19
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3943,94

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

5. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 33.767.250 de fecha 14/02/2025.
6. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 31.761.019 de fecha 18/02/2025.
7. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 1.839.500 de fecha 08/03/2025
8. Desembolso 06 aprobado por valor de $9.761.760 de fecha 08/03/2025.
9. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 15/03/2025.
10. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 19.624.364,33 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 31.352.100,01 de fecha 09/04/2025.
12. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 8.086.810,00 de fecha 09/04/2025.
13. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 400.000,00 de fecha 10/04/2025.
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 40.720.859,24 de fecha 02/05/2025.
15. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 7.943.681,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.148.203,56 correspondiente al 96% del valor del convenio.

96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
CONVENIO 2169 - 2024	**46 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**6 días**	**lun 10/02/25**	**dom 16/02/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**40 días**	**dom 16/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	30 días	dom 16/02/25	dom 23/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	lun 24/02/25	lun 31/03/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 28/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	sáb 22/02/25	dom 23/03/25	100%	100%

96.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 201.154.007,00; la Inversión Ejecutada fue de 199.558.667,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión de $1.595.340.

96.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

96.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

97.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

97.1.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de julio 2024 a enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,2% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.558.667,00 correspondiente al 99,2% del valor del convenio.

99 ANEXO

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

99.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	265
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	266
1	**INTRODUCCIÓN**		268
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		270
2.1	Localización		270
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		271
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		271
2.4	Características técnicas del proyecto		272
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		272
3.1	Información general del contrato		272
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		274
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		275
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		275
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		275
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		277
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		277
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	278
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		278
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		279
7	**Conclusiones y recomendaciones**		280
8	**Anexos**		280
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.055.145,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	6.316.345,57	157.299.019,57
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	42.380.178,50
VALOR EJECUTADO	**6.316.345,57**	**199.679.198,07**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.555.145,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.679.198,07
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,56%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

100 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

101.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

Ilustración 39 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

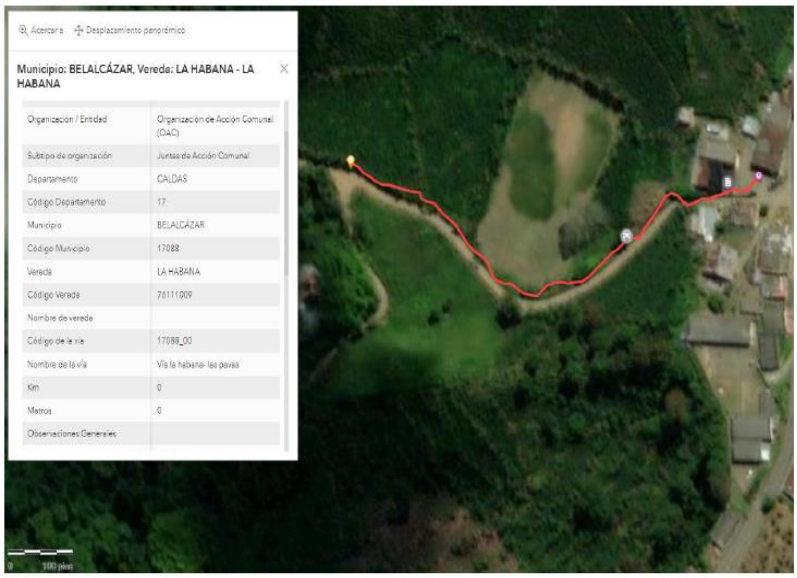

Ilustración 40 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 41. Estado inicial de la vía

101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.055.515,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.027.758,00	02/09/2024	01/08/2028

Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	01/08/2024	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	01/08/2025

Tabla 20 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

102.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

102.2.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.555.145,00
Ejecutado	100%	99,5%	199.679.198,07
Avance / Retraso	**0%**	**-0,43%**	**-875.946,92**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	133,11	140
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	101,5	106,75
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	32,22	33,89
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.675,13	4.916,95

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $40.872.017 de fecha 20/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.095.148 de fecha 24/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $2.163.019 de fecha 30/01/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $198.000 de fecha 30/01/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $1.279.400 de fecha 06/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $10.676.213 de fecha 11/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.852.689 de fecha 24/02/2025
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 51.530.938 de fecha 11/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 1.178.000,00 de fecha 19/03/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.054.330,00 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 15.401.283,83 de fecha 10/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 6.708.140,00 de fecha 24/04/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.578.473,52 de fecha 24/04/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 10.928.118,05 de fecha 06/05/2025.
15. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 16.185.256,00 de fecha 14/05/2025.
16. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 7.799.953,00 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.500.978,63 correspondiente al 96% del valor del convenio.

103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
Proyecto Placas Huellas en concreto	**73 días**	**jue 16/01/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
ETAPA 1	**30 días**	**jue 16/01/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Fase 1	**14 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 1/02/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
Fase 2	**8 días**	**sáb 1/02/25**	**mar 11/02/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
Fase 3	**8 días**	**mié 12/02/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
ETAPA 2	**23 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Fase 4	**7 días**	**vie 21/02/25**	**sáb 1/03/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%

Fase 5	**8 días**	**sáb 1/03/25**	**mar 11/03/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
Fase 6	**8 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
ETAPA 3	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Fase 7	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	100%	100%

103.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 200.555.145,00; la Inversión Ejecutada fue de 199.679.198,07. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 875.946,92.

103.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

103.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

104.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

104.1.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto 2024 a Julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, se encuentra pendiente recibir los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de agosto 2024 a enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 10 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,5% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.679.198,07 correspondiente al 99,5% del valor del convenio.

106 ANEXO

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

106.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	282
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	283
1	**INTRODUCCIÓN**		285
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		287
2.1	Localización		287
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		288
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		288
2.4	Características técnicas del proyecto		289
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		289
3.1	Información general del contrato		289
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		291
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		292
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		292
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		292
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		293
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		294
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	294
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		294
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		295
7	**Conclusiones y recomendaciones**		295
8	**Anexos**		296
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.792.352,17**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	3.580.861,90	156.702.963,90
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	42.995.000,00
VALOR EJECUTADO	**3.580.861,90**	**199.697.963,90**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 203.292.353,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.697.963,90
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,23%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

107 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

108.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.

Ilustración 42 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

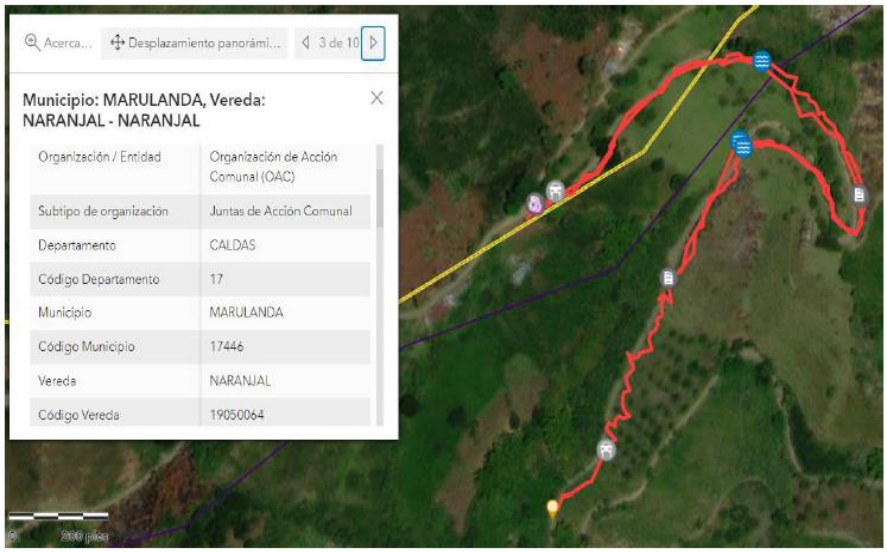

Ilustración 43 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 44. Estado inicial de la vía

108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.329.236,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	02/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	01/08/2025	01/08/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	28/06/2024	01/08/2025

Tabla 21 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

109.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

109.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 2 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.292.353,00
Ejecutado	100%	98,2%	199.697.963,90
Avance / Retraso	**0%**	**- 1,76%**	**- 3.594.389,09**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	83,69	85,34
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	29,21
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.133,51	4.215,09

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $39.203.611 de fecha 30/01/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $1.750.000 de fecha 19/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $3.913.907 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.870.860 de fecha 12/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $1.975.800 de fecha 12/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $34.341.128 de fecha 28/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 14.219.143 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 28.299.630,60 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 25.488.017,00 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 38.197.174,23 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 12.584.560,00 de fecha 25/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 7.075.014,00 de fecha 22/05/2025.

110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
FINAL		**0**	**0 días**	**mié 16/04/25**	**mié 16/04/25**	0%	100%
INICIO		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%

110.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 203.292.353,00; la Inversión Ejecutada fue de 199.697.963,90. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 3.594.389,09.

110.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

110.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

111.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

111.1.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Junio de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría no recibió el soporte del giro de los rendimientos de marzo a junio 2025 al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 2 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,2% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar,

longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.697.963,90 correspondiente al 98,2% del valor del convenio.

113 ANEXO

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

113.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	298
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	299
1	**INTRODUCCIÓN**		301
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		303
2.1	Localización		303
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		304
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		304
2.4	Características técnicas del proyecto		304
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		304
3.1	Información general del contrato		304
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		306
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		307
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		307
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		308
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	597
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	620
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	622
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	624
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	626
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	628
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	606
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		309
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		309
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	310
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		310
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		311
7	**Conclusiones y recomendaciones**		311
8	**Anexos**		312
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		628
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		630

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3551-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL PARAMO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA REINICIO 01:	11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 28/5/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02:	27/05/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	335,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 202.740.460,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 202.740.460,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	157.896.079,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.633.997,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.710.384,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.240.460,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 11.768.183,52	$ 11.768.183,52
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.693.750,00	$ 11.693.750,00
VALOR EJECUTADO	**$ 23.461.933,52**	**$ 23.461.933,52**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 96.907.325,61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.461.933,52
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	11,66%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 - Compactación de la Subbase granular

Foto 2 - Vaciado de concreto para la huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

114 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

115.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

Ilustración 45 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

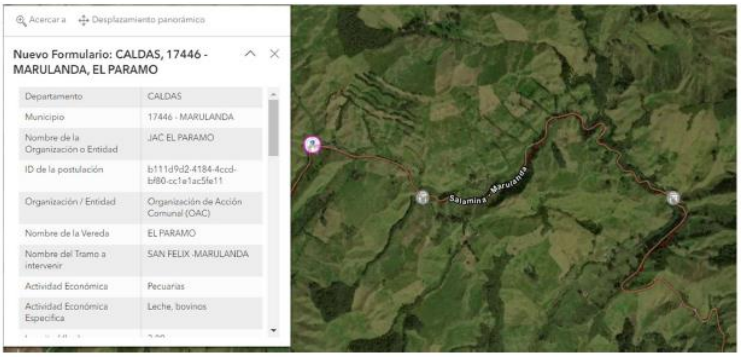

Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2
TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/5/25 28/4/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			

Cumplimiento	$20.303.349,20	30/09/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	30/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	03/10/2025	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	06/09/2024	03/10/2025

Tabla 22 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

116.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió el plan de compras no. 2.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió los formatos ambientales solicitados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió el plan de compras no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la documentación ambiental solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fechas 11/8/25, remitió las facturas electrónicas del mes de julio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió el formato de auxiliar detallado de julio.
- Se realizó comité operativo no. 5 y 6 de fechas 8/8/25 y 22/8/25.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/8/25, remitió solicitud de desembolso a cuenta rechazada por el Banco.

116.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 54 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 54 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este convenio.

116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	38%	48,15%	96.907.325,61
Ejecutado	5%	11,66%	23.461.933,52
Avance / Retraso	**-33%**	**-36,5%**	**73.445.392,09**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,28	5,28
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	39%	137,53	54
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	32%	0%	33,14	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27%	0%	10,51	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	32%	0%	1531,25	0

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 3.1.

117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 3.3.

117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1041–2922 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 3.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Julián Sánchez
Contador	Andrés Felipe Quinceno
Maestro de Obra	Dorian Mauricio García Arenas

Tabla 23 Personal Convenio Solidario

117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 33.362.571,00 de fecha 08/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 7.186.062,00 de fecha 21/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.124.886,00 de fecha 21/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 47.673.519,00 correspondiente al 23,66% del valor del convenio. Ver anexo 3.5.

117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 3.6.

117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 3.7.

117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**53 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**38%**	**5%**
Capitulo 1. Construcción Placas Huellas	**53 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**38%**	**5%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	12,67 días	vie 1/08/25	sáb 16/08/25	100%	39%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	32%	0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	40,89 días	jue 14/08/25	vie 3/10/25	27%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	32%	0%

117.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $96.907.325,61; la Inversión Ejecutada fue de $23.461.933,52. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $73.445.392,09

117.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

117.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

118.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1146-3247 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC información social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1148-3249 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC formatos sociales para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1141-3242 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC formatos ambientales para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1169-3273 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1238-3443 de fecha 26/8/25, remitió al INVIAS el plan de gestión social de la JAC.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/8/25, remitió documentación SST solicitada.

- Se realizó comité operativo no. 5 y 6 de fechas 8/8/25 y 22/8/25.

118.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 22 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 54 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a julio 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 30 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 5% e Inversión de 11,66% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin

Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 54 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $23.461.933,52 correspondiente al 11,66% del valor del convenio.

120 ANEXO

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

120.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	314
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	315
1	**INTRODUCCIÓN**		317
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		319
2.1	Localización		319
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		320
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		320
2.4	Características técnicas del proyecto		320
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		320
3.1	Información general del contrato		320
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		322
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		323
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		323
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		325
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	643
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	664
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	666
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	668
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	670
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	672
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	652
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		326
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		326
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	326
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		327
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		328
7	**Conclusiones y recomendaciones**		328
8	**Anexos**		328
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		674
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		676

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA REINICIO 01:	11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	348,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 32.651.051,44	$ 38.301.285,44
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.355.000,00	$ 16.880.842,00
VALOR EJECUTADO	**$ 42.006.051,44**	**$ 55.182.127,44**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 112.255.225,19
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55.182.127,44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	27,29%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Armado de acero de las huellas

VEREDA SARCIRÍ

Foto 2 Vaciado de concreto de las cunetas y bordillos

VEREDA SARCIRÍ

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

121 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

122.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

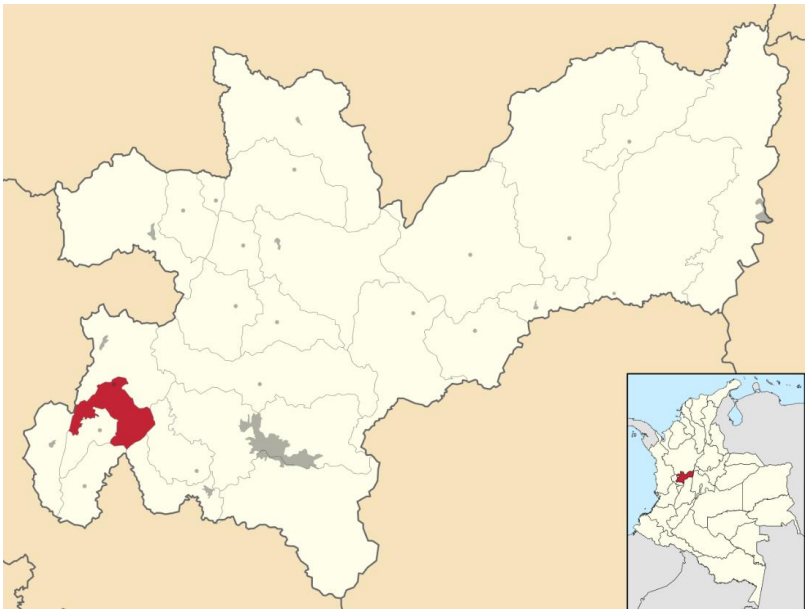

Ilustración 47 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

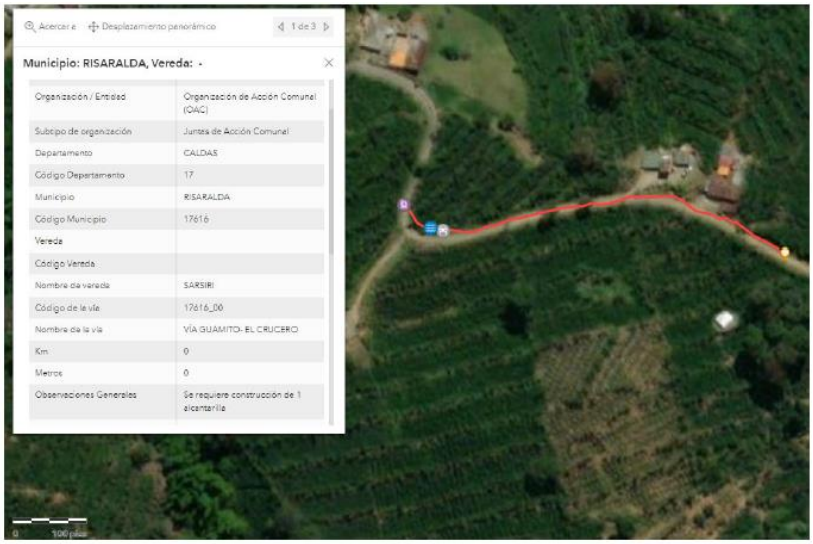

Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de	

Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.368.991,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 24 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

123.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 6/8/25, remitió la solicitud de desembolso de la nómina de la primera quincena de agosto.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1173-3277 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió el la solicitud de desembolso no. 5.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió la seguridad social de julio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, remitió el plan de compras no. 6.
- Se realizó comité operativo no. 8, 9 y 10 de fechas 12/8/25, 20/8/25 y 27/8/25.

123.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 18,39 ml, cantidad ejecutada: 31,36 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 24,91 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 66 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 1124,6 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 84,7 ml, cantidad ejecutada: 52,09 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 24,91 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 66 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 1124,6 Kg.

123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	51%	55,52%	112.255.225,19
Ejecutado	36%	27,29%	55.182.127,44
Avance / Retraso	**-15%**	**-28,23%**	**- 57.073.097,75**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	91%	100%	40,89	44,93
2	Subbase Granular Clase C	M3	53%	35%	78,13	52,09
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	40%	23%	42,76	24,91
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	35%	15%	8,93	3,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45%	24%	2088,33	1124,6
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0
13	Relleno para Estructuras con	M3	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	material producto de la excavación					

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 4.1

124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 4.3

124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–674–1760 y CINP–555–948–2708 de fechas 2 de mayo de 2025 y 9 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	Carlos Adelmo Sanchez

Tabla 25 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 4.4

124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 43.015.972 de fecha 17/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 3.084.492 de fecha 18/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.163.233,00 de fecha 23/07/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.320.500 de fecha 10/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 59.584.197,00 correspondiente al 29,47% del valor del convenio. Ver anexo 4.5

124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 4.6

124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 4.7

124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, Prórroga No. 1, suspensión No. 2, Ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Programado	% completado
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	**60 días**	**lun 14/07/25**	**vie 3/10/25**		**51%**	**36%**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	**60 días**	**lun 14/07/25**	**vie 3/10/25**		**51%**	**36%**
Excavaciones varias sin Clasificar	35 días	lun 14/07/25	vie 29/08/25		91%	100%
Subbase Granular Clase C	60 días	lun 14/07/25	vie 3/10/25		53%	35%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	47 días	jue 31/07/25	vie 3/10/25		40%	23%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	43 días	mié 6/08/25	vie 3/10/25		35%	15%
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	47 días	mar 29/07/2	mié 1/10/25		45%	24%

124.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $112.255.225,19; la Inversión Ejecutada fue de $55.182.127,44. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $**57.073.097,75**

124.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

124.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

125.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1116-3151 de fecha 5/8/25, remitió a la JAC respuesta de comunicado.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1094-3109 de fecha 4/8/25, remitió al INVIAS el plan ambiental de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1096-3111 de fecha 4/8/25, remitió a Corpocaldas información de la JAC.
- Se realizó comité operativo no. 8, 9 y 10 de fechas 12/8/25, 20/8/25 y 27/8/25.

125.1.2 Actividades Técnicas

El día 12 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 20 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales y nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 27 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 10 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 84,7 ml, cantidad ejecutada: 52,09 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 24,91 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 66 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 1124,6 Kg.

125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a julio 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de los extractos bancarios pendientes y del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 14 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 36% e Inversión de 27.29% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 84,7 ml, cantidad ejecutada: 52,09 m. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 24,91 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 66 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 66,6 ml, cantidad ejecutada: 1124,6 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $55.182.127,44 correspondiente al 27,29% del valor del convenio.

127 ANEXO

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 18.8

127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

127.4 BITÁCORA

Ver anexo 18.9.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	331
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	332
1	**INTRODUCCIÓN**		334
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		336
2.1	Localización		336
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		337
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		337
2.4	Características técnicas del proyecto		338
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		338
3.1	Información general del contrato		338
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		340
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		341
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		341
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		342
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		343
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		343
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	343
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		344
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		344
7	**Conclusiones y recomendaciones**		345
8	**Anexos**		345
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2187-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.034.766,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	181,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.483.797,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.534.766,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	17.514.375,02	148.074.995,72
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	43.985.967,08
VALOR EJECUTADO	**17.514.375,02**	**192.060.962,80**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 202.034.766,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192.060.962,80
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025

FOTO 3 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

128 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

129.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.

Ilustración 49 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

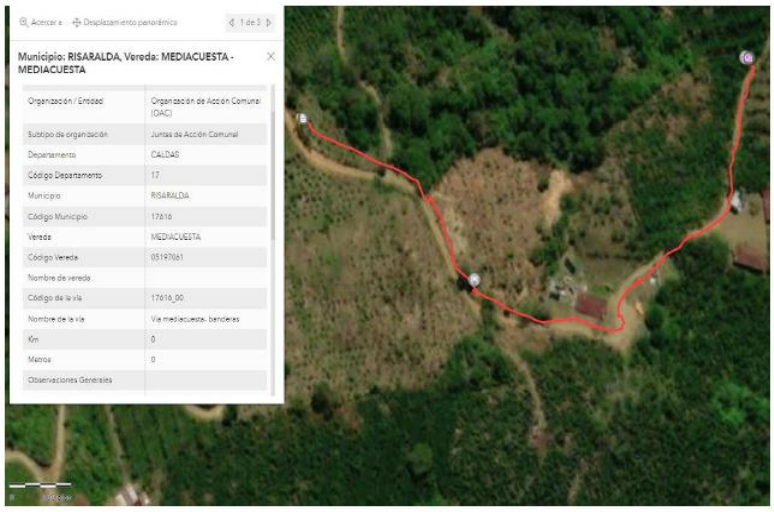

Ilustración 50 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 51 Estado inicial del sector

129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9

TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HSTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			

Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Tabla 26 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

130.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

130.2.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	202.034.766,00
Ejecutado	100%	95,06%	192.060.962,82
Avance / Retraso	**0%**	**- 4,9%**	**- 9.973.803,18**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	4,48
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	135,70	116,96
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	100,35	86,49
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	31,41	27,07
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.949,68	4.266,02

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 41.980.856 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.021.533 de fecha 04/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.403.163 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 609.000 de fecha 14/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.221.018 de fecha 14/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.778.860 de fecha 24/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 13.843.532 de fecha 12/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 35.512.326,96 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.824.512,57 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 13.083.737,50 de fecha 24/04/2025.
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 2.919.645,10 de fecha 06/05/2025.
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 8.650.649,00 de fecha 13/05/2025.
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 8.616.844,27 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 161.465.676,46 correspondiente al 80% del valor del convenio.

131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la prórroga No. 2, suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga No. 3.

131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%

131.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de 202.034.766,00; la Inversión Ejecutada fue de 192.060.962,82. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 9.973.803,18.

131.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4.

131.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6.

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

132.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

132.1.2 Actividades Técnicas

A la fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23 de mayo de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 95,06% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 192.060.962,82 correspondiente al 95,06% del valor del convenio.

134 ANEXO

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

134.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	347
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	348
1	**INTRODUCCIÓN**		350
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		352
2.1	Localización		352
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		353
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		354
2.4	Características técnicas del proyecto		354
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		354
3.1	Información general del contrato		354
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		356
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		357
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		357
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		358
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	697
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	718
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	720
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	722
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	724
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	726
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	706
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		359
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		360
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	360
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		360
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		362
7	**Conclusiones y recomendaciones**		362
8	**Anexos**		362
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		728
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		730

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRÓRROGA 1:	28/05/2025
PLAZO PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	347,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.901.649,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.901.649,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.540.859,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.316.469,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.401.649,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 15.989.464,17	$ 15.989.464,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.693.750,00	$ 11.693.750,00
VALOR EJECUTADO	**$ 27.683.214,17**	**$ 27.683.214,17**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 98.461.407,84
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27.683.214,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	13,66%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

FOTO 1 - Instalación de piedras para la contra huella

FOTO 2 - Armado de acero e instalción de formaleta para la huella

FOTO 3 - Vaciado de concreto para la huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

135 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

136.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.

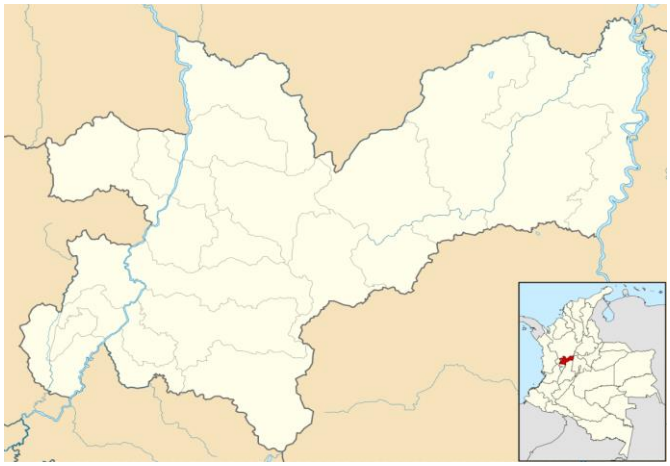

Ilustración 52 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

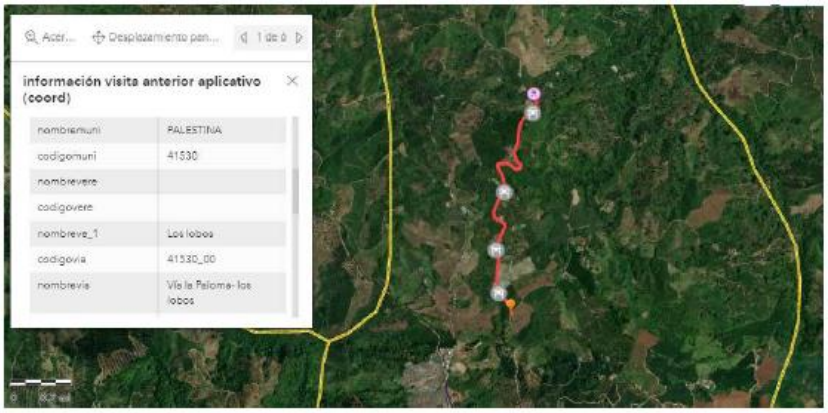

Ilustración 53 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 54 Estado inicial

136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS

NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353	

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.104.810,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 27 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

137.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 4/8/25, remitió la solicitud de desembolso de la nómina de la primera quincena de agosto.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 4/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 6/8/25, remitió el plan de compras y solicitud de desembolso no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 4.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, remitió las actas de vecindad.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió los documentos correspondientes al programa de inversión social.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió documentos ambientales solicitados.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 25/8/25 y 26/8/25, remitió solicitud de desembolso no. 7 y 8.
-La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió plan de compras no. 5 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió documentación ambiental solicitada.

137.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 25,65 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 6,41 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 5,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 311,54 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 25,65 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 6,41 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 5,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 311,54 Kg.

137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	51%	49,38%	98.461.407,84
Ejecutado	20%	13,88%	27.683.214,17
Avance / Retraso	**-31%**	**-35,5%**	**70.778.193,67**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,58	4,58
2	Subbase Granular Clase C	M3	64%	21%	76,77	22,65
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	21%	7%	19,24	6,41
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	44%	21%	12,12	5,85
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	58%	7%	2624,53	311,54

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 5.1

138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 5.3

138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1046–2927 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Claudia Ceballos
Contador	Maritza Pineda Torres
Maestro de Obra	Luis Eduardo Hincapié

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 5.4

138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 7.799.866,00 de fecha 14/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.765.678,00 de fecha 19/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 1.642.644,00 de fecha 21/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 23.208.188,00 correspondiente al 11,63% del valor del convenio. Ver anexo 5.5.

138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 5.5

138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 5.6

138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, prórroga no. 1, suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
CONVENIO 3169-2024	**59,5 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**51%**	**20%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**59 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**51%**	**20%**
Excavaciones varias sin Clasificar	13 días	lun 28/07/25	lun 11/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	36 días	vie 1/08/25	jue 11/09/25	64%	21%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	41 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	21%	7%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	40 días	vie 8/08/25	lun 22/09/25	44%	21%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	mar 29/07/25	jue 18/09/25	58%	7%

138.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $98.461.407,84; la Inversión Ejecutada fue de $27.683.214,17. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $70.778.193,67

138.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

138.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

139.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1145-3246 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC información social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1171-3275 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1156-3260 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC formatos ambientales para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1239-3449 de fecha 26/8/25, remitió al INVIAS el plan de gestión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1249-3481 de fecha 28/8/25, remitió a la JAC los formatos sociales para su revisión y firma.

139.1.2 Actividades Técnicas

El día 5 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 20 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 25 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 25,65 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 6,41 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 5,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 311,54 Kg.

139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 20% e Inversión de 13,88% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 25,65 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 6,41 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 5,85 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 311,54 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $27.683.214,17 correspondiente al 13,88% del valor del convenio.

141 ANEXO

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 20.7

141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

141.4 BITÁCORA

Ver anexo 20.8

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.		FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	364
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	365
1	**INTRODUCCIÓN**		367
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		369
2.1	Localización		369
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		370
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		370
2.4	Características técnicas del proyecto		370
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		370
3.1	Información general del contrato		370
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		372
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		373
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		373
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		374
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	751
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	772
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	774
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	776
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	778
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	780
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	760
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		375
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		375
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	376
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		376
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		377
7	**Conclusiones y recomendaciones**		377
8	**Anexos**		378
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		782
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		784

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	28/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	335.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.205.858,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.205.858,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158.00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.993.502,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.132.974,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.705.858,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 4.111.334,11	$ 4.111.334,11
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.677.500,00	$ 4.677.500,00
VALOR EJECUTADO	**$ 8.788.834,11**	**$ 8.788.834,11**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 11.445.046,55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.788.834,11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	4,40%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

Foto 1 Inicio de Actividades en obra- Nivelación del terreno

Foto 2 Nivelación y compactación de la subbase granular

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

142 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No.1 suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

143.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

Ilustración 55 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

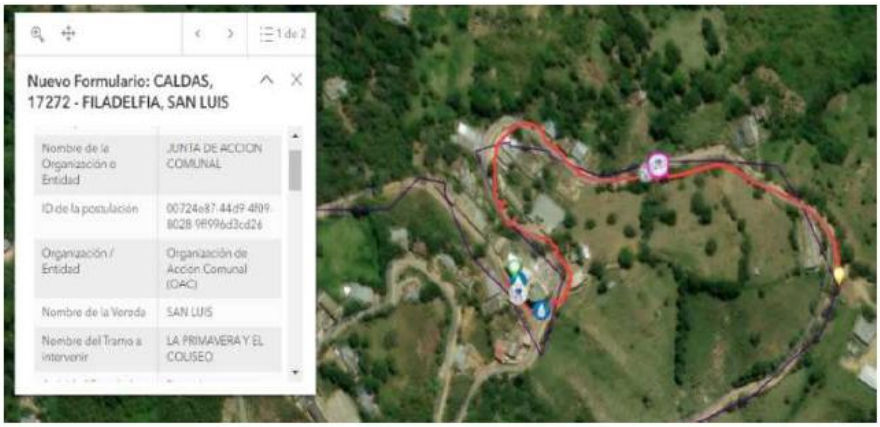

Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8

TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392		
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.147.254,00	30/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	30/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 29 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

144.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 8/8/25 y 12/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, remitió hoja de vida de maestro de obra para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió el plan de compras no. 2 para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 4 y 5 de fechas 8/8/25 25/8/25.

144.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 60 ml, cantidad ejecutada: 43,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 60 ml, cantidad ejecutada: 43,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	9%	5,73%	11.445.046,55
Ejecutado	6%	4,4%	8.788.834,11
Avance / Retraso	**-3%**	**-1,33%**	**2.656.212,44**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,77	5,77

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	46%	29%	69,23	43,2
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 6.1.

145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 6.3.

145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1060–2975 de fecha 28 de julio de 2025. Ver Anexo 6.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jerson Castañeda
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Javier Ramírez

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1.Desembolso 01 aprobado por valor de $ 6.026.160,00 de fecha 21/08/21025

Desembolso Total por valor de $ 6.026.160,00 correspondiente al 3,01% del valor del convenio.
Ver Anexo 6.5.

145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 6.6.

145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 6.7.

145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, prórroga no. 1, suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Progrmado	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**38,33 días**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**9%**	**6%**
Capitulo 1. Construcción Placas Huellas	**38,33 días**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**9%**	**6%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	14,11 días	mié 20/08/25	vie 5/09/25	46%	29%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	27,22 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	24,22 días	jue 4/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	27,22 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%

145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $11.445.046,55; la Inversión Ejecutada fue de $8.788.834,11. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $2.656.212,44.

145.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

145.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

146.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1125-3202 de fecha 11/8/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1126-3213 de fecha 12/8/25, remitió a la JAC aprobación de hoja de vida.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1166-3270 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1157-3261 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación ambientales.
-La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1225-3395 de fecha 22/8/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- Se realizó comité operativo no. 4 y 5 de fechas 8/8/25 y 25/8/25.

146.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 4 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 25 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 60 ml, cantidad ejecutada: 43,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 6% e Inversión de 4,4% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 60 ml, cantidad ejecutada: 43,2 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Acero

de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $8.788.834,11 correspondiente al 4,4% del valor del convenio.

148 ANEXO

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

148.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	380
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	381
1	**INTRODUCCIÓN**		383
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		385
2.1	Localización		385
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		386
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		386
2.4	Características técnicas del proyecto		386
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		386
3.1	Información general del contrato		386
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		388
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		389
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		389
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		390
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	794
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	815
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	817
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	819
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	821
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	823
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	803
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		391
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		391
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	392
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		393
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		394
7	**Conclusiones y recomendaciones**		394
8	**Anexos**		395
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		825
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		827

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/03/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	26/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.939.311,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.939.311,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.661.171,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.639.835,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.138.305,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.439.311,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 71.382,00	$ 71.382,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.537.500,00	$ 4.537.500,00
VALOR EJECUTADO	**$ 4.608.882,00**	**$ 4.608.882,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 48.264.661,52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.608.882,64
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	2,30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Adecuación de terreno retiro de material de deslizamiento en la vías

Foto 2 Figuración de hierro para vigas riostras

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

149 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

150.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.

Ilustración 57 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

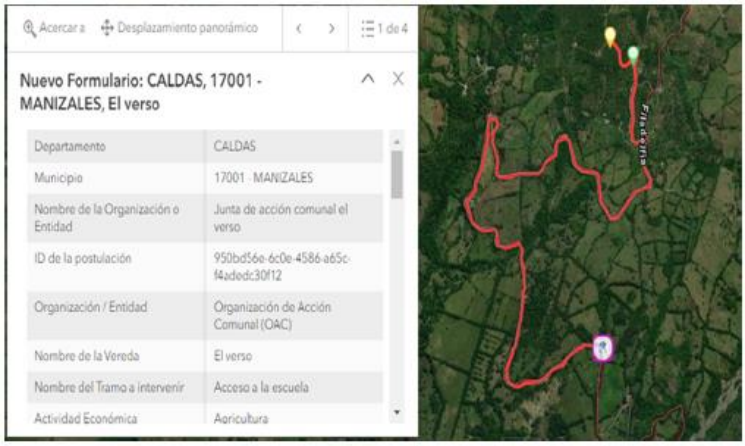

Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1

TELÉFONO:	3193164956
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No.1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610		
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.194.971,20	02/10/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	02/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	03/10/2024	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	03/10/2025

Tabla 31 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

151.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 4/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió plan de inversión y cronograma de obra para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 6 de fecha 11/8/25.

151.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	11%	23,9%	48.264.661,52
Ejecutado	7%	2,28%	4.608.882,64
Avance / Retraso	**-4%**	**-21,62%**	**43.655.778,88**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	68%	100%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	68%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	29%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 7.1.

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 7.3.

152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1040–2921 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 7.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Oxfaro Bustamante
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Giraldo Rios

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 7.5.

152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 7.6.

152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 7.7.

152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
PROYECTO PLACA HUELLAS EL VERSO	**39 días?**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**11%**	**7%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**38 días**	**mar 19/08/25**	**vie 3/10/25**	**6%**	**9%**
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	10 días	mar 19/08/25	vie 29/08/25	68%	100%
SUBBASE GRANULAR CLASE	24 días	lun 1/09/25	mar 30/09/2	0%	0%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) -MEZCLA INSITU PARA PLACA HUELLA	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (F) 60% CONCRETO -40% PIEDRA PARA PLACA	27 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4200 KG/CM2 (60000 PSI)	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	**38 días?**	**mar 19/08/25**	**vie 3/10/25**	**10%**	**0%**
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	10 días	mar 19/08/25	vie 29/08/25	68%	0%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	22 días	mar 19/08/25	lun 15/09/25	29%	0%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (CLASE F) -MEZCLA INSITU	12 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25	0%	0%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) -MEZCLA INSITU PARA PLACA HUELLA	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4200 KG/CM2 (60000 PSI)	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO	12 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25	0%	0%
FIN	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	0%	0%

152.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $48.264.661,52; la Inversión Ejecutada fue de $4.608.882,64. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $43.655.778,88

152.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

152.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

153.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1093-3108 de fecha 4/8/25, remitió a la JAC la aprobación de las hojas de vida.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1169-3274 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1226-3396 de fecha 22/8/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1237-3442 de fecha 22/8/25, remitió a la JAC los formatos sociales para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1242-3474 de fecha 28/8/25, remitió a la JAC el Acta de inicio para su revisión y firma.
- Se realizó comité operativo no. 6 de fecha 11/8/25.

153.1.2 Actividades Técnicas

El día 1 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 4 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 4 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 11 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio

aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 22 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Junio 2025, se encuentra a la espera de los soportes del giro al Tesoro Nacional.

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 7% e Inversión de 2,28% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40%

Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $4.608.882,64 correspondiente al 2,28% del valor del convenio.

155 ANEXO

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

155.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	397
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCIÓN**		399
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		400
2.1	Localización		400
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		401
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		401
2.4	Características técnicas del proyecto		402
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		402
3.1	Información general del contrato		402
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		403
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		403
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		403
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		404
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		405
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		405
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	405
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		405
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		406
7	**Conclusiones y recomendaciones**		406
8	**Anexos**		406
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

156 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

157.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.

Ilustración 59 Localización del municipio de Supía (Caldas).

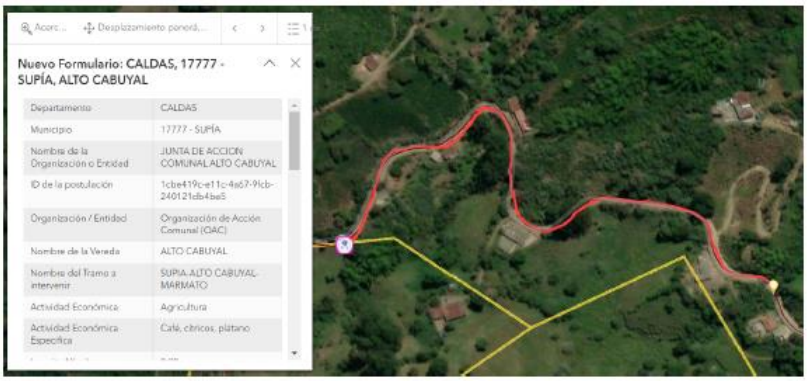

Ilustración 60 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	VENCIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 33 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

158.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

158.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se vencido.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0

Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3622 de 2024.

159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

159.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

159.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

159.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

160.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

160.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte del presente informe, el Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación conforme a la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, fue el 02/03/25.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025.
- Que EL INSTITUTO a pesar de saber que el OAC no tenía ningún interés en continuar con la ejecución del Convenio Solidario No. 3622 de 2024, al no prorrogar la suspensión No. 1, procedió a realizar el giro de los recursos.
- A la fecha de corte de este informe, EL INSTITUTO no ha indicado como se va a proceder con este convenio que está vencido, no hubo ejecución de las obras contempladas en dicho convenio y tiene los recursos en la cuenta corriente, solicitud que realizó la Interventoría a través del oficio CINP-555-475-0948 del 4 de marzo de 2025.

162 ANEXO

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

162.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	409
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	410
1	**INTRODUCCIÓN**		412
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		414
2.1	Localización		414
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		415
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		415
2.4	Características técnicas del proyecto		415
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		415
3.1	Información general del contrato		415
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		417
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		418
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		418
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		419
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	830
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	851
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	853
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	855
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	857
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	859
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	839
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		420
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		420
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	420
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		421
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		422
7	**Conclusiones y recomendaciones**		422
8	**Anexos**		423
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		861
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		863

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/03/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	26/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	304.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.461.661,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.461.661,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.399.467,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.990.118,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.961.661,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 4.841.232,10	$ 4.841.232,10
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.677.500,00	$ 4.677.500,00
VALOR EJECUTADO	**$ 9.518.732,10**	**$ 9.518.732,10**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 38.731.975,71
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.518.732,10
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	4,72%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Compactación de material de subbase granular

Foto 2 Figuración de Acero

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

163 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

164.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

Ilustración 61 Localización del municipio de Supía(Caldas).

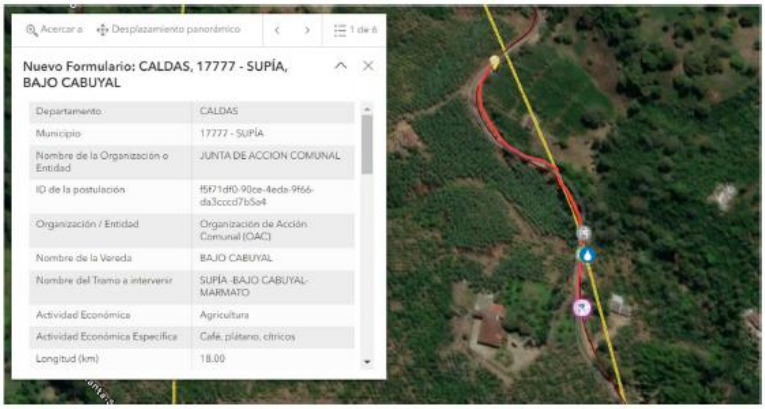

Ilustración 62 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			

Cumplimiento	$20.146.474,00	30/10/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	30/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	03/10/2025	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	03/10/2025

Tabla 34 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

165.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 4/8/25, remitió hojas de vida de ingenieros para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió solicitud de desembolso de la segunda quincena de agosto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/8/25, remitió anexos del primer plan de compras aprobado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/8/25, remitió hoja de vida de Ingeniero residente, para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 7 de fecha 11/8/25.

165.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 28,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 28,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	19%	19,23%	38.731.975,71
Ejecutado	10%	4,72%	9.518.732,10
Avance / Retraso	**9%**	**-14,5%**	**29.213.243,61**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	100%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	21%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	21%	0%	0	0

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 8.1.

166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 8.3.

166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1049–2930 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 8.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jaime Pardo
Contador	Elizabeth Gómez
Maestro de Obra	Guillermo Moreno

Tabla 35 Personal Convenio Solidario

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No se han realizado desembolsos hasta la fecha.

166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 8.6.

166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 8.7.

166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
Placa huella	**34 días**	**mar 19/08/2**	**vie 3/10/25**	**19%**	**10%**
Excavaciones varias sin	6 días	mar 19/08/25	mar 26/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	6 días	vie 5/09/25	dom 14/09/25	0%	21%
Concreto reforzado resistencia 21	12 días	lun 15/09/25	mar 30/09/25	0%	0%
Concreto Ciclópeo	12 días	jue 18/09/25	vie 3/10/25	0%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	21%	0%

166.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $38.731.975,71; la Inversión Ejecutada fue de $9.518.732,10. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $29.213.243,61

166.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

166.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

167.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1090-3105 de fecha 4/8/25, remitió a la JAC información ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1099-3134 de fecha 5/8/25, remitió a la JAC la aprobación de las hojas de vida.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1162-3266 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1224-3394 de fecha 22/8/25, remitió a la JAC los formatos ambientales para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1241-3473 de fecha 28/8/25, remitió a la JAC los formatos sociales para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1243-3475 de fecha 28/8/25, remitió a la JAC el Acta de inicio para su revisión y firma.
- Se realizó comité operativo no. 7 de fecha 11/8/25.

167.1.2 Actividades Técnicas

El día 4 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 11 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 15 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 20 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 28,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de julio de 2025, se encuentra a la espera del resto de extractos pendientes y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 10% e Inversión de 4,72% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 28,5 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml,

cantidad ejecutada: 0 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $9.518.732,10 correspondiente al 4,72% del valor del convenio.

169 ANEXO

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

169.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	425
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	426
1	**INTRODUCCIÓN**		428
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		430
2.1	Localización		430
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		431
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		431
2.4	Características técnicas del proyecto		432
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		432
3.1	Información general del contrato		432
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		433
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		434
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		435
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		435
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	876
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	897
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	899
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	901
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	903
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	905
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	885
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		436
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		436
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	437
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		438
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		438
7	**Conclusiones y recomendaciones**		439
8	**Anexos**		439
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		907
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		909

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	304,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.282.005,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.282.005,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	165.747.623,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.466.486,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.782.005,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 15.297.623,01	$ 15.297.623,01
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.016.250,00	$ 7.016.250,00
VALOR EJECUTADO	**$ 22.313.873,01**	**$ 22.313.873,01**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 105.456.174,28
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.313.873,01
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	11,23%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Armado de acero e instalación de formaleta para el vaciado de las huellas

Foto 2 - Estado de la placa huella y compactación de la zona de las cunetas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

170 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

171.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

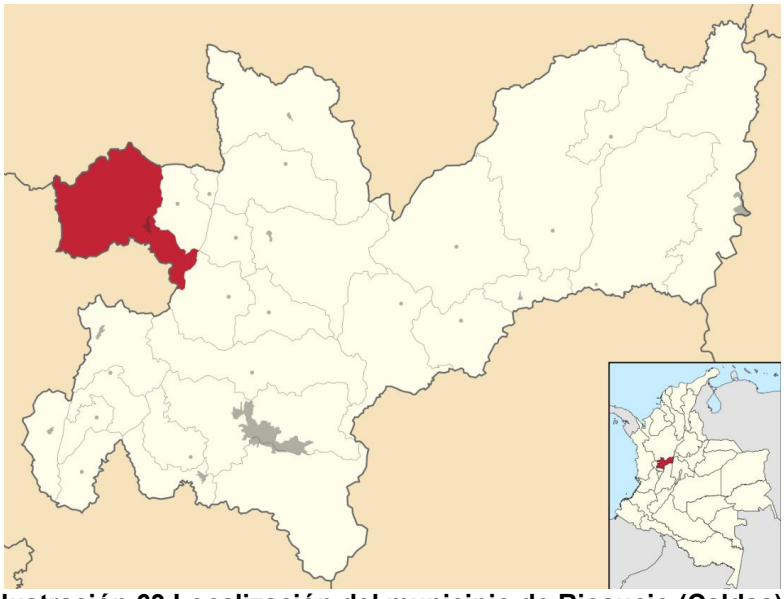

Ilustración 63 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

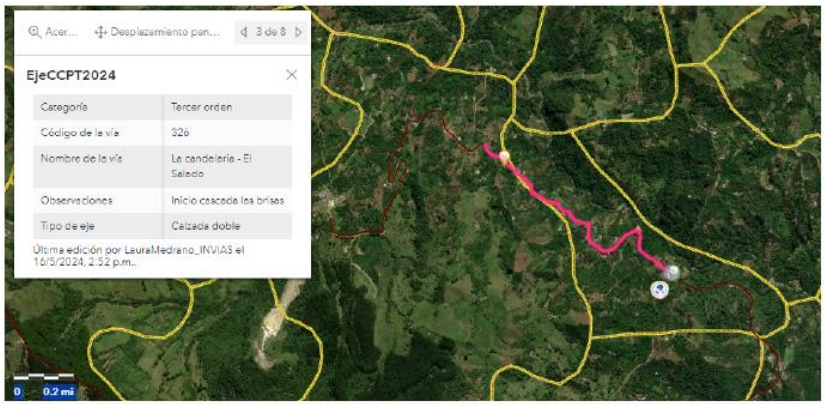

Ilustración 64 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 65 Estado inicial de la vía

171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 23/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 30/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.046.067,20	02/10/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	02/10/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	30/05/2025

Tabla 36 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

172.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 4/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
-La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/8/25, remitió entregables compromiso de los comité operativos.

172.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 132 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 40,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 3,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 31,5 ml, cantidad ejecutada: 4,25 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 311 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 132 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 40,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 3,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 31,5 ml, cantidad ejecutada: 4,25 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 311 Kg.

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	24%	53,05%	105.456.174,28
Ejecutado	20%	11,23%	22.313.873,01
Avance / Retraso	**-4%**	**-41,83%**	83.142.301,27

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,5	4,5
2	Subbase Granular Clase C	M3	55%	35%	63,95	40,5
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	4%	0	3,65
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	15%	15%	4,3	4,25
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	5%	0	311

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 9.1.

173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 9.3.

173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–768-2067 de fecha 20 de mayo de 2025. Ver Anexo 9.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Giancarlo Velásquez
Contador	Ana Bañol

Tabla 37 Personal Convenio Solidario

173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 9.5.

173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 9.6.

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 9.7.

173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
ETAPA EJECUCION	**57,44 días**	**lun 11/08/25**	**vie 3/10/25**	**24%**	**20%**
Excavaciones varias sin Clasificar	5 días	lun 11/08/25	vie 15/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	vie 15/08/25	jue 4/09/25	55%	35%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (clase D) -	15 días	jue 4/09/25	mar 23/09/25	0%	4%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40%	12 días	jue 18/09/25	vie 3/10/25	15%	15%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	15 días	jue 4/09/25	mar 23/09/25	0%	0%

173.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $105.456.174,28; la Inversión Ejecutada fue de $22.313.873,01. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $83.142.301,27.

173.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

173.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

174.1.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 4/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/8/25, remitió entregables compromiso de los comités operativos.

174.1.2 Actividades Técnicas

En el mes de agosto, no se realizaron Comités Operativos con el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 132 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 40,5 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 3,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 31,5 ml, cantidad ejecutada: 4,25 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 311 Kg.

174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario de los meses de Febrero a Julio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 11 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 20% e Inversión de 11.23% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada:4,5 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 40,5 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 3,65 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 31,5 ml, cantidad ejecutada: 4,25 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 311 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $22.313.873,01 correspondiente al 11,23% del valor del convenio.

176 ANEXO

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 9.8.

176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

176.4 BITÁCORA

Ver Anexo 9.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	441
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	442
1	**INTRODUCCIÓN**		444
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		446
2.1	Localización		446
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		447
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		447
2.4	Características técnicas del proyecto		447
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		448
3.1	Información general del contrato		448
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		449
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		450
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		450
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		452
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	922
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	938
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	940
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	942
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	945
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	947
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	931
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		453
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		453
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	454
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		454
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		455
7	**Conclusiones y recomendaciones**		455
8	**Anexos**		456
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		949
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		951

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	19/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	29/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	348,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 190.662.593,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 190.662.593,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	141.320.130,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	189.162.593,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 5.774.726,11	$ 5.774.726,11
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.343.750,00	$ 11.343.750,00
VALOR EJECUTADO	**$ 17.118.476,11**	**$ 17.118.476,11**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 73.851.292,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.118.476,11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	9,05%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Adecuación de terreno

Foto 2 Nivelación y compactación de material de subbase granular

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

177 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

178.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

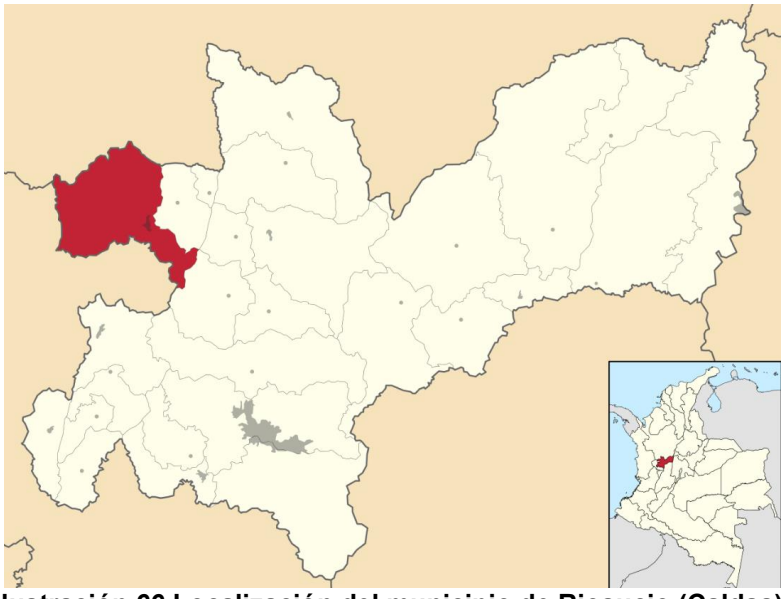

Ilustración 66 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 67 Estado inicial de la vía

178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN NO. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.048.784,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 38 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

179.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 6/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 11/8/25 y 12/8/25, remitió la solicitud de desembolso de la primera quincena de agosto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/8/25, remitió los documentos correspondientes a la propuesta de inversión social.
- Se realizó comité operativo no. 7 y 8 de fechas 11/8/25 y 14/8/25 respectivamente.

179.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 57 ml, cantidad ejecutada: 35,91 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 57 ml, cantidad ejecutada: 35,91 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	26%	39,04%	73.851.292,80

Ejecutado	9%	9,05%	17.118.476,11
Avance / Retraso	**-17%**	**-29,99%**	**56.732.816,69**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	34,1	34,1
2	Subbase Granular Clase C	M3	80%	34%	85,58	35,91
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	30%	0%	5,95	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	13%	0%	527,75	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 10.1.

180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 10.3.

180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–727–1899, CINP–555–947–2699 y CINP–555–1042–2923 de fechas 9 de mayo de 2025, 9 y 24 de julio de 2025. Ver Anexo 10.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Diego Alejandro Mejía
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Mario Uchima

Tabla 39 Personal Convenio Solidario

180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:
1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 7.670.372,00 de fecha 15/08/2025

Desembolso Total por valor de $ 7.670.372,00 correspondiente al 3,85% del valor del convenio.
Ver Anexo 10.5.

180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 10.6.

180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 10.6.

180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	**48 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**26%**	**9%**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	**48 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**26%**	**9%**
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	mié 30/07/25	mié 6/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 11/08/25	vie 29/08/25	80%	34%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	28 días	jue 28/08/25	lun 6/10/25	0%	0%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	38,1 días	jue 14/08/25	mar 7/10/25	30%	0%
Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 21/08/25	mié 1/10/25	13%	0%
Excavaciones varias en roca en seco	5 días	jue 28/08/25	mié 3/09/25	0%	0%
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25	0%	0%
Tuberia de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	3 días	mar 30/09/25	jue 2/10/25	0%	0%

180.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $73.851.292,80; la Inversión Ejecutada fue de $17.118.476,11. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $56.732.816,69

180.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

180.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

181.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-931-2638 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-947-2699 de fecha 9/7/25, remitió aprobación a la hoja de vida del Ingeniero enviada por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-967-2740 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-987-2780 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1005-2802 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- Se realizó comité operativo no. 4, 5 y 6, los días 18/7/25, 21/7/25 y 24/7/25.

181.1.2 Actividades Técnicas

El día 11 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 14 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 20 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 57 ml, cantidad ejecutada: 35,91 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a julio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 30 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 9% e Inversión de 9.05% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 57 ml, cantidad ejecutada: 35,91 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml,

cantidad ejecutada: 0 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $17.118.476,11correspondiente al 9,05% del valor del convenio.

183 ANEXO

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 10.8.

183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

183.4 BITÁCORA

Ver Anexo 10.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	458
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	459
1	**INTRODUCCIÓN**		461
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		463
2.1	Localización		463
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		464
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		464
2.4	Características técnicas del proyecto		464
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		464
3.1	Información general del contrato		464
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		466
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		467
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		467
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		469
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	971
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	988
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	990
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	992
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	994
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	996
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	980
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		470
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		470
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	470
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		471
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		472
7	**Conclusiones y recomendaciones**		472
8	**Anexos**		472
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		998
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1000

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3286-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/03/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	3/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	348,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 23.249.464,50	$ 23.249.464,50
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.075.000,00	$ 9.075.000,00
VALOR EJECUTADO	**$ 32.324.464,50**	**$ 32.324.464,50**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 28.631.539,01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 32.324.464,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	18%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Vaciado de concreto de las cunetas

Foto 2 Armado de acero e instalación de formaleta en las huellas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

184 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

185.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

Ilustración 68 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

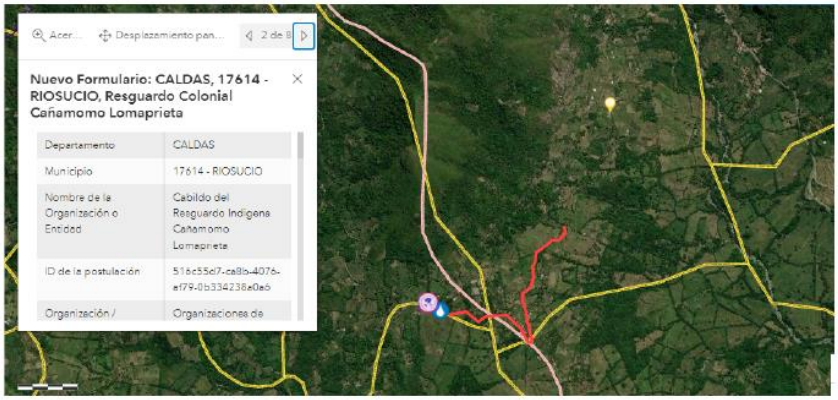

Ilustración 69 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04

TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$19.953.377,00	17/09/2026	30/05/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	17/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	30/05/2025

Tabla 40 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

186.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 4/8/25, remitió la hoja de vida para el cambio de maestro de obra.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 6/8/25, remitió el plan de compras y solicitud de desembolso no. 2.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 6/8/25, remitió la solicitud de desembolso de la nómina de la primera quincena de agosto.
-La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/8/25, remitió solicitud de desembolso no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de desembolso de la primera quincena de agosto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 2.
- Se realizó comité operativo no. 5 de fecha 8/8/25.

186.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 140 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 33,83 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 13,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 7,2 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 701,29 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 140 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 33,83 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 13,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 7,2 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 701,29 Kg.

186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en etapa de alistamiento. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	37%	15,95%	28.631.539,61

Ejecutado	23%	18%	32.324.464,50
Avance / Retraso	**-14%**	**2,06%**	**3.692.924,89**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,76	3,76
2	Subbase Granular Clase C	M3	25%	34%	24,63	33,83
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	11%	16%	9,13	13,17
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	26%	40%	4,73	7,2
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	14%	19%	519,1	701,29
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 11.1.

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 11.3.

187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del CINP–555–1013–2810de fecha 16 de julio de 2025. Ver Anexo 11.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Sebastián Osorio
Contador	Andrea Clavijo
Maestro de obra	Jose Guerrero

Tabla 41 Personal Convenio Solidario

187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No se han realizado desembolsos hasta la fecha.

187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 11.6.

187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 11.7.

187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3286 de 2024

187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de la Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programado	% completado
CONVENIO 3286-2024	**45 días**	**lun 4/08/25**	**vie 3/10/25**	**37%**	**23%**
ETAPA REVISION	**0 días**	**lun 4/08/25**	**lun 4/08/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	**16 días**	**lun 4/08/25**	**lun 25/08/25**	**100%**	**0%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	100%	0%
Excavaciones vrias en roca en seco	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	100%	0%
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	3 días	jue 21/08/25	lun 25/08/25	100%	0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ	2 días	jue 21/08/25	vie 22/08/25	100%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	100%	0%
Tubería de Concreto Reforzado cla	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	100%	0%
Relleno para Estructuras con Suelc	2 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25	100%	0%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**29 días**	**mar 26/08/25**	**vie 3/10/25**	22%	**29%**
Excavaciones varias sin Clasificar	3 días	mar 26/08/25	jue 28/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	9 días	jue 28/08/25	mar 9/09/25	25%	34%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	19 días	mar 9/09/25	vie 3/10/25	11%	16%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	12 días	lun 1/09/25	mar 16/09/25	26%	40%
Acero de refuerzo de FY = 4.200	16 días	jue 4/09/25	jue 25/09/25	14%	19%

187.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $28.631.539,61; la Inversión Ejecutada fue de $32.324.464,50. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $3.692.924,89

187.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

187.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

188.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1089-3104 de fecha 4/8/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra para la revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1100-3135 de fecha 5/8/25, remitió a la JAC la aprobación de las hojas de vida.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1144-3245 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC información social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1165-3269 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1227-3397 de fecha 22/8/25, remitió a la JAC los formatos ambientales para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1246-3478 de fecha 26/8/25, remitió a la JAC los resultados de los ensayos de laboratorio.
- Se realizó comité operativo no. 5 de fecha 8/8/25.

188.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 140 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 33,83 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 13,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 7,2 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 701,29 Kg.

188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario de los meses de febrero a julio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 4 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 23% e Inversión de 18% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 140 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 33,83 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 13,17 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 7,2 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 34 ml, cantidad ejecutada: 701,29 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $32.324.464,50 correspondiente al 18% del valor del convenio.

190 ANEXO

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 11.8.

190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

190.4 BITÁCORA

Ver Anexo 11.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	475
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	476
1	**INTRODUCCIÓN**		478
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		480
2.1	Localización		480
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		481
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		481
2.4	Características técnicas del proyecto		481
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		481
3.1	Información general del contrato		481
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		483
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		484
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		485
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		485
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1020
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1037
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1039
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1041
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1043
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1045
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1029
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		486
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		487
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	487
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1100
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1284
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		488
5.3	Informes especialistas y profesionales		1205
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		48
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		48
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1295
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1070
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1293
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1079
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1300
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		489
7	**Conclusiones y recomendaciones**		489
8	**Anexos**		490
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1086
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1047
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1049

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO No.: 3595-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	7/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/03/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	378,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.348.439,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.348.439,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	165,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	160.524.336,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.602.357,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.721.746,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.848.439,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 40.936.829,48	$ 40.936.829,48
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.693.750,00	$ 11.693.750,00
VALOR EJECUTADO	**$ 52.630.579,48**	**$ 52.630.579,48**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 120.749.943,03
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52.630.579,48
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	26,34%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

FOTO 1 - Compactación de subbase granular

FOTO 2 - Vaciado de concreto ciclópeo

FOTO 3 - Vaciado de bordillos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

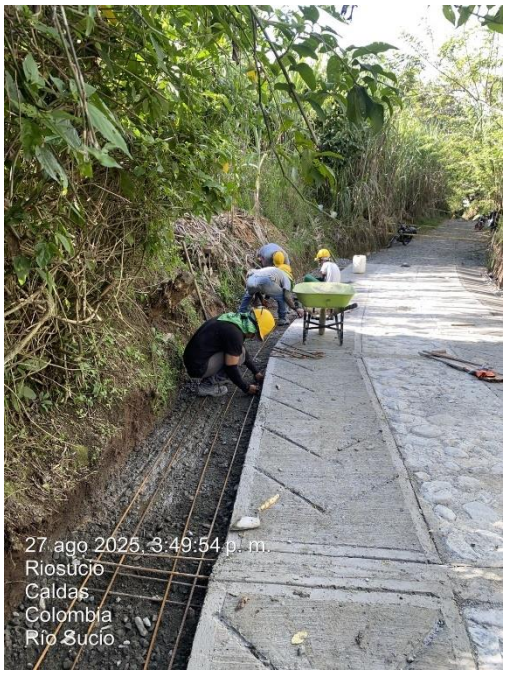

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

191 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 09, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

192.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.

Ilustración 70 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

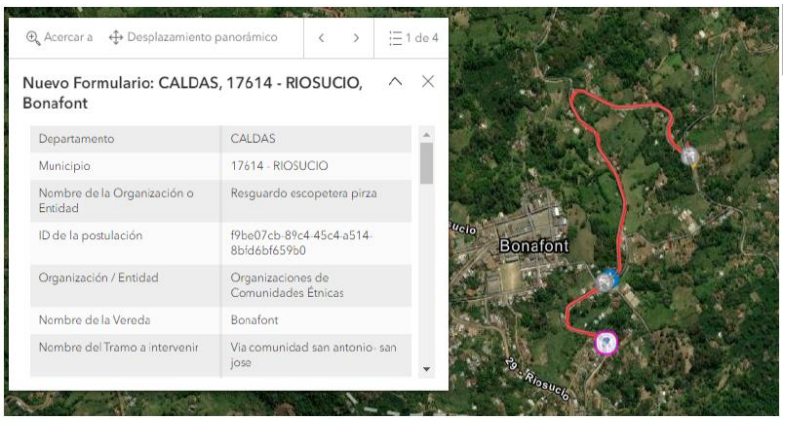

Ilustración 71 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San
Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8

DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	07/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.134.844,00	12/12/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	12/12/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	30/05/2025

Tabla 42 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

193.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 5/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 6/8/25, solicitó comité operativo.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 8/8/25, remitió la documentación pendiente compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 8/8/25, remitió la documentación compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/8/25, remitió la solicitud de desembolso no. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/8/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a la primera nómina de agosto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, solicitó encuentro virtual con el área financiera para aclaración de dudas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/8/25, remitió la documentación requerida para revisión de ítem no previsto.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/8/25, remitió solicitud de desembolso no. 3.
- Se realizó comité operativo no. 6 de fecha 8/8/25.

193.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 165 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 5,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 21 ml, cantidad ejecutada: 2,84 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 358 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 165 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 5,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 21 ml, cantidad ejecutada: 2,84 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 358 Kg.

193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	35%	60,42%	120.749.943,03
Ejecutado	26%	26,34%	52.630.579,48
Avance / Retraso	**-9%**	**-34,09%**	**68.119.363,55**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,44	4,44
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	80%	119,65	95,33
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	21%	6%	18,81	5,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	18%	14%	3,64	2,84
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	18%	9%	688,76	358

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 12.1

194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 12.3

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–531–1156, CINP–555–765–2054 y CINP–555–952–2720 de fechas 18 de marzo de 2025, 19 de mayo de 2025 y 10 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Rubén Zabala
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Dorance Ladino

Tabla 43 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 12.4

194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No se han realizado desembolsos hasta la fecha.

194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 12.5

194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 12.6

194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
MEJORAMIENTO DE VIA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	**52 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**35%**	**26%**
Inicio	0 días	lun 28/07/25	lun 28/07/25	100%	100%
PLACA HUELLA	**52 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**30%**	**20%**
Excavaciones varias sin calsificar	5 días	lun 28/07/25	vie 1/08/25	100%	100%
Subbase clase C	11 días	sáb 2/08/25	sáb 16/08/25	100%	80%
Concreto Reforzado resistencia 21 MPA (Clase D)	34 días	lun 18/08/25	jue 2/10/25	21%	6%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	18%	14%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000)	34 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	18%	9%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
FILTRO	**7 días**	**jue 7/08/25**	**sáb 16/08/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin clasificar	4 días	jue 7/08/25	mié 13/08/25	100%	100%
Geotexil No tejido	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25	100%	100%
Tuberia de drenaje corrugada perforada	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25	100%	100%
Material granularfiltrante	2 días	jue 14/08/25	sáb 16/08/25	100%	100%
FIN	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	0%	0%

194.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 30 de agosto de 2025, la Inversión Programada fue de $120.749.943,03; la Inversión Ejecutada fue de $52.630.579,48. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $68.119.363,55

194.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 13.4

194.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 13.6

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

195.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1142-3243 de fecha 13/8/25, remitió a la JAC información social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1163-3267 de fecha 13/8/25, solicitó a la JAC documentación financiera.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1175-3296 de fecha 14/8/25, remitió a la JAC aprobación del ítem no previsto.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1176-3297 de fecha 14/8/25, remitió al INVIAS la documentación del ítem no previsto para revisión.
- Se realizó comité operativo no. 6 de fecha 8/8/25.

195.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 20 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 29 de agosto de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 165 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 5,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 21 ml, cantidad ejecutada: 2,84 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 358 Kg.

195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de febrero a julio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.

- El avance físico de la obra es del 26% e Inversión de 26,34% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 165 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 5,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 21 ml, cantidad ejecutada: 2,84 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 18 ml, cantidad ejecutada: 358 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $52.630.579,48correspondiente al 26,34% del valor del convenio.

197 ANEXO

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.3

197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 12.7

197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

197.4 BITÁCORA

Ver anexo 12.8
