CONSORCIO CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	**3601 DE 2022**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7**
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL 11**
CODIGO:	**IM-555-11**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ **No. De Revisiones**		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable de Elaboración	Nombre:	CARLOS MARTINEZ			
	Firma:				
	Fecha:	nov-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	nov-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	BIBIANA PATERNINA ESPITIA			
	Firma.				
	Fecha:	nov-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 11
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

IM – 555 – 11

OCTUBRE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 11	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	 Carlos Martínez Ingeniero Residente
REVISADO POR:	 Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 144 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148,51 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 139,5 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 179 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 142,8 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OBRAS DE ARTE:** 0	**OBRAS DE ARTE:** 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 147 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 183 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS 45
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 45
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 46
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 46

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 46
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 48
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 48
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 48
2.6.2 Seguimiento al plan de carga 48

3 INTRODUCCIÓN..... 51

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 53

4.1 LOCALIZACIÓN 53
4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO..... 54
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 54
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 55

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 55

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO..... 55
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 56
5.2.1 Actividades Administrativas 56
5.2.2 Actividades Técnicas 56
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 57
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 57

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 58

6.1 INFORME SEMANAL..... 58
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 58
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 58
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 59
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 59
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 59
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO..... 60
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 60
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo..... 60
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 60
6.9.3 Actas de Comités..... 60
6.9.4 Actas de Reunión 60

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 60

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 60
7.1.1 Actividades Administrativas 61
7.1.2 Actividades Técnicas 61
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ..... 61

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 61

9 ANEXO 62

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 62
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 62
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 62
9.4 BITÁCORA 62

10 INTRODUCCIÓN 65

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 67

11.1 LOCALIZACIÓN 67
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 68
11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 68
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 69

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 69

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 69
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 71
12.2.1 Actividades Administrativas 71
12.2.2 Actividades Técnicas 71
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 71
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 72

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 72

13.1 INFORME SEMANAL 72
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 73
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 73
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 74
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 74
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 74
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 74
13.9.3 Actas de Comités 74
13.9.4 Actas de Reunión 74

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 74

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 74
14.1.1 Actividades Administrativas 74
14.1.2 Actividades Técnicas 75
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 75

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 75

16 ANEXO 76

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 76

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 76
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 76
16.4 BITÁCORA 76

17 INTRODUCCIÓN 79

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 81

18.1 LOCALIZACIÓN 81
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 82
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 82
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 83

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 83

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 83
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 85
19.2.1 Actividades Administrativas 85
19.2.2 Actividades Técnicas 85
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 85
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 86

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 87

20.1 INFORME SEMANAL 87
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 87
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 87
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 88
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 88
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 89
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 89
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 89
20.9.3 Actas de Comités 89
20.9.4 Actas de Reunión 89

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 89

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 89
21.1.1 Actividades Administrativas 89
21.1.2 Actividades Técnicas 90
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 90

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 90

23 ANEXO 91

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 91
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 91

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 91
23.4 BITÁCORA 91

24 INTRODUCCIÓN 94

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 96

25.1 LOCALIZACIÓN 96
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 97
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 97
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 98

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 98

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 98
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 99
26.2.1 Actividades Administrativas 99
26.2.2 Actividades Técnicas 100
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 100
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 100

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 101

27.1 INFORME SEMANAL 101
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 102
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 102
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 102
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 102
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 102
27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 102
27.9.4 Actas de Comités 102
27.9.5 Actas de Reunión 103

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 103

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 103
28.1.1 Actividades Administrativas 103
28.1.2 Actividades Técnicas 103
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 103

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103

30 ANEXO 104

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 104
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 104

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 104
30.4 BITÁCORA 104

31 INTRODUCCIÓN 107

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 109

32.1 LOCALIZACIÓN 109
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 110
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 110
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 111

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 111

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 111
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 113
33.2.1 Actividades Administrativas 113
33.2.2 Actividades Técnicas 113
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 113
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 113

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 114

34.1 INFORME SEMANAL 114
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 115
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 115
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 115
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 115
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 116
34.9.3 Actas de Comités 116
34.9.4 Actas de Reunión 116

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 116

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 116
35.1.1 Actividades Administrativas 116
35.1.2 Actividades Técnicas 116
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 117

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117

37 ANEXO 117

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 117
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 118
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 118

37.4 BITÁCORA 118

38 INTRODUCCIÓN 121

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 123

39.1 LOCALIZACIÓN 123
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 124
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 124
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 124

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 124

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 124
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 126
40.2.1 Actividades Administrativas 126
40.2.2 Actividades Técnicas 126
40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 126
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 127

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 127

41.1 INFORME SEMANAL 127
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 128
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 128
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 129
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 129
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 129
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 129
41.9.3 Actas de Comités 129
41.9.4 Actas de Reunión 129

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 129

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 129
42.1.1 Actividades Administrativas 130
42.1.2 Actividades Técnicas 130
42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 130

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 130

44 ANEXO 131

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 131
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 131
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 131
44.4 BITÁCORA 131

45 INTRODUCCIÓN 134

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 136

46.1 LOCALIZACIÓN 136
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 137
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 137
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 138

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 138

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 138
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 140
47.2.1 Actividades Administrativas 140
47.2.2 Actividades Técnicas 140
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 140
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 140

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 141

48.1 INFORME SEMANAL 141
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 142
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 142
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 142
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 142
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 142
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 142
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 142
48.9.3 Actas de Comités 143
48.9.4 Actas de Reunión 143

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 143

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 143
49.1.1 Actividades Administrativas 143
49.1.2 Actividades Técnicas 143
49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 144

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 144

51 ANEXO 144

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 144
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 144
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 145
51.4 BITÁCORA 145

52 INTRODUCCIÓN 148

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 150

53.1 LOCALIZACIÓN 150
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 151
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 151
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 151

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 151

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 151
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 153
54.2.1 Actividades Administrativas 153
54.2.2 Actividades Técnicas 153
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 154
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 154

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 155

55.1 INFORME SEMANAL 155
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 155
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 156
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 156
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 156
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 156
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 156
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 156
55.9.3 Actas de Comités 156
55.9.4 Actas de Reunión 157

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 157

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 157
56.1.1 Actividades Administrativas 157
56.1.2 Actividades Técnicas 157
56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 157

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 157

58 ANEXO 158

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 158
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 158
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 158
58.4 BITÁCORA 158

59 INTRODUCCIÓN 161

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 163

60.1 LOCALIZACIÓN 163
60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 164
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 164
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 164

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 164

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 164
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 166
61.2.1 Actividades Administrativas 166
61.2.2 Actividades Técnicas 166
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 167
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 167

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 169

62.1 INFORME SEMANAL 169
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 169
62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 169
62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 169
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 170
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 170
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 170
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 170
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 170
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 170
62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 170
62.9.3 Actas de Comités 171
62.9.4 Actas de Reunión 171

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 171

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 171
63.1.1 Actividades Administrativas 171
63.1.2 Actividades Técnicas 171
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 172

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 172

65 ANEXO 173

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 173
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 173
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 173
65.4 BITÁCORA 173

66 INTRODUCCIÓN 176

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 178

67.1 LOCALIZACIÓN 178

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 179
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 179
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 180

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 180

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 180
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 181
68.2.1 Actividades Administrativas 181
68.2.2 Actividades Técnicas 181
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 182
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 182

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 183

69.1 INFORME SEMANAL 183
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 183
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 183
69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 183
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 184
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 184
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 184
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 184
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 184
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 184
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 184
69.9.3 Actas de Comités 185
69.9.4 Actas de Reunión 185

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 185

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 185
70.1.1 Actividades Administrativas 185
70.1.2 Actividades Técnicas 185
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 185

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 186

72 ANEXO 186

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 186
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 186
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 186
72.4 BITÁCORA 186

73 INTRODUCCIÓN 189

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 191

74.1 LOCALIZACIÓN 191

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 192
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 192
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 193

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 193

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 193
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 195
75.2.1 Actividades Administrativas 195
75.2.2 Actividades Técnicas 195
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 195
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 195

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 196

76.1 INFORME SEMANAL 196
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 196
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 196
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 196
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 197
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 197
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 197
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 197
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 197
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 197
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 197
76.9.3 Actas de Comités 198
76.9.4 Actas de Reunión 198

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 198

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 198
77.1.1 Actividades Administrativas 198
77.1.2 Actividades Técnicas 198
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 198

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 198

79 ANEXO 199

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 199
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 199
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 199
79.4 BITÁCORA 199

80 INTRODUCCIÓN 202

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 204

81.1 LOCALIZACIÓN 204

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 205
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 205
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 206

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 206

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 206
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 208
82.2.1 Actividades Administrativas 208
82.2.2 Actividades Técnicas 208
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 208
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 208

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 209

83.1 INFORME SEMANAL 209
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 209
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 209
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 209
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 210
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 210
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 210
83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 210
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 210
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 210
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 210
83.9.3 Actas de Comités 211
83.9.4 Actas de Reunión 211

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 211

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 211
84.1.1 Actividades Administrativas 211
84.1.2 Actividades Técnicas 211
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 212

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 212

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 212
85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 212
85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 213
85.4 BITÁCORA 213

86 INTRODUCCIÓN 216

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 218

87.1 LOCALIZACIÓN 218
87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 219
87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 219

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 220

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 220

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 220
88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 222
88.2.1 Actividades Administrativas 222
88.2.2 Actividades Técnicas 222
88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 222
88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 222

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 223

89.1 INFORME SEMANAL 223
89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 223
89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 223
89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 223
89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 224
89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 224
89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 224
89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 224
89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 224
89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 224
89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 224
89.9.3 Actas de Comités 225
89.9.4 Actas de Reunión 225

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 225

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 225
90.1.1 Actividades Administrativas 225
90.1.2 Actividades Técnicas 225
90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 226

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 226

92 ANEXO 226

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 226
92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 226
92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 227
92.4 BITÁCORA 227

93 INTRODUCCIÓN 230

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 232

94.1 LOCALIZACIÓN 232
94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 233
94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 233
94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 234

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 234

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 234
95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 236
95.2.1 Actividades Administrativas 236
95.2.2 Actividades Técnicas 236
95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 236
95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 236

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 237

96.1 INFORME SEMANAL 237
96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 237
96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 237
96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 238
96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 238
96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 238
96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 238
96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 238
96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 238
96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 238
96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 238
96.9.3 Actas de Comités 239
96.9.4 Actas de Reunión 239

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 239

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 239
97.1.1 Actividades Administrativas 239
97.1.2 Actividades Técnicas 239
97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 240

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 240

99 ANEXO 240

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 240
99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 240
99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 241
99.4 BITÁCORA 241

100 INTRODUCCIÓN 244

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 246

101.1 LOCALIZACIÓN 246
101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 247
101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 247
101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 248

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 248

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 248
102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 250
102.2.1 Actividades Administrativas 250
102.2.2 Actividades Técnicas 250
102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 250
102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 250

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 251

103.1 INFORME SEMANAL 251
103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 251
103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 251
103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 252
103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 252
103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 252
103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 252
103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 252
103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 253
103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 253
103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 253
103.9.3 Actas de Comités 254
103.9.4 Actas de Reunión 254

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 254

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 254
104.1.1 Actividades Administrativas 254
104.1.2 Actividades Técnicas 255
104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 255

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 255

106 ANEXO 256

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 256
106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 256
106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 256
106.4 BITÁCORA 256

107 INTRODUCCIÓN 259

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 261

108.1 LOCALIZACIÓN 261
108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 262
108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 262
108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 263

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 263

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 263

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 265
109.2.1 Actividades Administrativas 265
109.2.2 Actividades Técnicas 265
109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 265
109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 266

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 266

110.1 INFORME SEMANAL 266
110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 266
110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 267
110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 267
110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 267
110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 267
110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 267
110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 267
110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 268
110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 268
110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 268
110.9.3 Actas de Comités 268
110.9.4 Actas de Reunión 268

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 268

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 268
111.1.1 Actividades Administrativas 268
111.1.2 Actividades Técnicas 269
111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 269

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 269

113 ANEXO 270

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 270
113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 270
113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 270
113.4 BITÁCORA 270

114 INTRODUCCIÓN 273

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 275

115.1 LOCALIZACIÓN 275
115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 276
115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 276
115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 276

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 277

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 277
116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 278

116.2.1 Actividades Administrativas 278
116.2.2 Actividades Técnicas 278
116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 279
116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 280

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 280

117.1 INFORME SEMANAL 280
117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 281
117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 281
117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 281
117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 281
117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 281
117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 282
117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 282
117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 282
117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 282
117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 282
117.9.3 Actas de Comités 282
117.9.4 Actas de Reunión 282

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 283

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 283
118.1.1 Actividades Administrativas 283
118.1.2 Actividades Técnicas 283
118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 284

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 284

120 ANEXO 284

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 284
120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 285
120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 285
120.4 BITÁCORA 285

121 INTRODUCCIÓN 288

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 290

122.1 LOCALIZACIÓN 290
122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 291
122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 292
122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 292

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 292

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 292
123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 294
123.2.1 Actividades Administrativas 294

123.2.2 Actividades Técnicas 294
123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 295
123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 295

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 296

124.1 INFORME SEMANAL 296
124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 296
124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 297
124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 297
124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 297
124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 298
124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 298
124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 298
124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 298
124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 298
124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 298
124.9.3 Actas de Comités 299
124.9.4 Actas de Reunión 299

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 299

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 299
125.1.1 Actividades Administrativas 299
125.1.2 Actividades Técnicas 299
125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 300

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 300

127 ANEXO 301

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 301
127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 301
127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 301
127.4 BITÁCORA 301

128 INTRODUCCIÓN 304

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 306

129.1 LOCALIZACIÓN 306
129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 307
129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 307
129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 308

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 308

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 308
130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 310
130.2.1 Actividades Administrativas 310
130.2.2 Actividades Técnicas 310

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 310
130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 311

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 311

131.1 INFORME SEMANAL 311
131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 311
131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 312
131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 312
131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 312
131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 312
131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 312
131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 312
131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 313
131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 313
131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 313
131.9.3 Actas de Comités 313
131.9.4 Actas de Reunión 313

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 313

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 313
132.1.1 Actividades Administrativas 313
132.1.2 Actividades Técnicas 314
132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 314

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 314

134 ANEXO 315

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 315
134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 315
134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 315
134.4 BITÁCORA 315

135 INTRODUCCIÓN 318

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 320

136.1 LOCALIZACIÓN 320
136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 321
136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 322
136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 322

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 322

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 322
137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 324
137.2.1 Actividades Administrativas 324
137.2.2 Actividades Técnicas 324
137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 325

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 325

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 326

138.1 INFORME SEMANAL 326
138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 326
138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 326
138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 327
138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 327
138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 327
138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 328
138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 328
138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 328
138.9.3 Actas de Reunión 329

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 329

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 329
139.1.1 Actividades Administrativas 329
139.1.2 Actividades Técnicas 329
139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 330

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 330

141 ANEXO 331

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 331
141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 331
141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 331
141.4 BITÁCORA 331

142 INTRODUCCIÓN 334

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 336

143.1 LOCALIZACIÓN 336
143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 337
143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 337
143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 338

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 338

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 338
144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 339
144.2.1 Actividades Administrativas 339
144.2.2 Actividades Técnicas 339
144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 341
144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 341

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 342

145.1 INFORME SEMANAL 342
145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 342
145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 342
145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 342
145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 343
145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 343
145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 343
145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 343
145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 343
145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 343
145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 343
145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 344
145.9.4 Actas de Reunión 344

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 344

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 344
146.1.1 Actividades Administrativas 344
146.1.2 Actividades Técnicas 344
146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 345

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 346

148 ANEXO 346

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 346
148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 346
148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 346
148.4 BITÁCORA 346

149 INTRODUCCIÓN 349

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 351

150.1 LOCALIZACIÓN 351
150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 352
150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 353
150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 353

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 353

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 353
151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 354
151.2.1 Actividades Administrativas 355
151.2.2 Actividades Técnicas 355
151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 356
151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 356

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 357

152.1 INFORME SEMANAL 357

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 358
152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 358
152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 358
152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 358
152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 358
152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 359
152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 359
152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 359
152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 359
152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 359
152.9.3 Actas de Reunión 360

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 360

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 360
153.1.1 Actividades Administrativas 360
153.1.2 Actividades Técnicas 360
153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 362

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 362

155 ANEXO 362

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 362
155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 362
155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 362
155.4 BITÁCORA 362

156 INTRODUCCIÓN 365

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 366

157.1 LOCALIZACIÓN 366
157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 367
157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 368
157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 368

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 368

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 368
158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 369
158.2.1 Actividades Administrativas 369
158.2.2 Actividades Técnicas 369
158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 369
158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 370

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 370

159.1 INFORME SEMANAL 370
159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 370

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 371
159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 371
159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 371
159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 371
159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 371
159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 371
159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 371
159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 371
159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 371
159.9.3 Actas de Reunión 371

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 372

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 372
160.1.1 Actividades Administrativas 372
160.1.2 Actividades Técnicas 372
160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 372

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 372

162 ANEXO 373

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 373
162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 373
162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 373
162.4 BITÁCORA 373

163 INTRODUCCIÓN 376

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 378

164.1 LOCALIZACIÓN 378
164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 379
164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 379
164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 380

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 380

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 380
165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 381
165.2.1 Actividades Administrativas 381
165.2.2 Actividades Técnicas 381
165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 383
165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 383

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 383

166.1 INFORME SEMANAL 383
166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 384
166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 384

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 384
166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 384
166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 384
166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 384
166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 385
166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 385
166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 385
166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 385
166.9.3 Actas de Reunión 385

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 386

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 386
167.1.1 Actividades Administrativas 386
167.1.2 Actividades Técnicas 386
167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 387

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 387

169 ANEXO 387

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 387
169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 388
169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 388
169.4 BITÁCORA 388

170 INTRODUCCIÓN 391

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 393

171.1 LOCALIZACIÓN 393
171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 394
171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 395
171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 395

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 395

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 395
172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 397
172.2.1 Actividades Administrativas 397
172.2.2 Actividades Técnicas 397
172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 398
172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 398

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 399

173.1 INFORME SEMANAL 399
173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 399
173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 400
173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 400

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 400
173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 400
173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 400
173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 400
173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 400
173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 400
173.9.3 Actas de Reunión 401

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 402

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 402
174.1.1 Actividades Administrativas 402
174.1.2 Actividades Técnicas 402
174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 403

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 403

176 ANEXO 404

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 404
176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 404
176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 404
176.4 BITÁCORA 404

177 INTRODUCCIÓN 407

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 409

178.1 LOCALIZACIÓN 409
178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 410
178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 411
178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 411

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 411

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 411
179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 413
179.2.1 Actividades Administrativas 413
179.2.2 Actividades Técnicas 413
179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 414
179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 414

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 416

180.1 INFORME SEMANAL 416
180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 416
180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 416
180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 416
180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 417
180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 417
180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 417

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 417
180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 417
180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 417
180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 417
180.9.3 Actas de Reunión 418

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 418

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 418
181.1.1 Actividades Administrativas 418
181.1.2 Actividades Técnicas 419
181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 419

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 420

183 ANEXO 420

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 420
183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 420
183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 420
183.4 BITÁCORA 421

184 INTRODUCCIÓN 424

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 426

185.1 LOCALIZACIÓN 426
185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 427
185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 428
185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 428

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 428

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 428
186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 430
186.2.1 Actividades Administrativas 430
186.2.2 Actividades Técnicas 430
186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 431
186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 431

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 432

187.1 INFORME SEMANAL 432
187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 432
187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 432
187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 433
187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 433
187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 433
187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 433
187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 433
187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 433

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 433
187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 434
187.9.3 Actas de Reunión 434

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 435

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 435
188.1.1 Actividades Administrativas 435
188.1.2 Actividades Técnicas 435
188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 436

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 436

190 ANEXO 436

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 436
190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 436
190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 436
190.4 BITÁCORA 436

191 INTRODUCCIÓN 439

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 441

192.1 LOCALIZACIÓN 441
192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 442
192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 443
192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 443

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 443

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 443
193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 445
193.2.1 Actividades Administrativas 445
193.2.2 Actividades Técnicas 445
193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 446
193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 446

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 447

194.1 INFORME SEMANAL 447
194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 447
194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 447
194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 447
194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 448
194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 448
194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 448
194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 448
194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 448
194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 448
194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 448

194.9.3 Actas de Reunión 449

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 449

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 449
195.1.1 Actividades Administrativas 449
195.1.2 Actividades Técnicas 449
195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 450

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE 451

197 ANEXO 451

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 451
197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 451
197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 451
197.4 BITÁCORA 451

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 53
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 54
ILUSTRACIÓN 3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 54
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 67
ILUSTRACIÓN 5 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 68
ILUSTRACIÓN 6 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 69
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 81
ILUSTRACIÓN 8 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 82
ILUSTRACIÓN 9 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL JAC PATIO BONITO 83
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 97
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 97
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 109
ILUSTRACIÓN 13 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 110
ILUSTRACIÓN 14 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 111
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 123
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 124
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 136
ILUSTRACIÓN 18 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 137
ILUSTRACIÓN 19 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 138
ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 150
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 151
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 163
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 164
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 178
ILUSTRACIÓN 25 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 179
ILUSTRACIÓN 26. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 179
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 191
ILUSTRACIÓN 28 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 192
ILUSTRACIÓN 29. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 193

ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 204
ILUSTRACIÓN 31 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 205
ILUSTRACIÓN 32. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 206
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 218
ILUSTRACIÓN 34 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 219
ILUSTRACIÓN 35. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 220
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 232
ILUSTRACIÓN 37 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 233
ILUSTRACIÓN 38. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 234
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS). 246
ILUSTRACIÓN 40 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 247
ILUSTRACIÓN 41. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 248
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 261
ILUSTRACIÓN 43 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 262
ILUSTRACIÓN 44. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 263
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 276
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 276
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 291
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 291
ILUSTRACIÓN 49 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 306
ILUSTRACIÓN 50 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 307
ILUSTRACIÓN 51 ESTADO INICIAL DEL SECTOR 308
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS) 321
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 321
ILUSTRACIÓN 54 ESTADO INICIAL 322
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 337
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 337
ILUSTRACIÓN 57 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 352
ILUSTRACIÓN 58 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 352
ILUSTRACIÓN 59 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS). 367
ILUSTRACIÓN 60 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 367
ILUSTRACIÓN 61 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS) 379
ILUSTRACIÓN 62 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 379
ILUSTRACIÓN 63 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 394
ILUSTRACIÓN 64 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 394
ILUSTRACIÓN 65 ESTADO INICIAL DE LA VÍA 395
ILUSTRACIÓN 66 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 410
ILUSTRACIÓN 67 ESTADO INICIAL DE LA VÍA 411
ILUSTRACIÓN 68 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 427
ILUSTRACIÓN 69 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 427
ILUSTRACIÓN 70 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 442
ILUSTRACIÓN 71 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 442

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR 9
TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 45
TABLA 3 PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 47
TABLA 4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 56
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 59
TABLA 6 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 85
TABLA 7 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 87
TABLA 8 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 99
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 113
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 126
TABLA 11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 139
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 153
TABLA 13 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 166
TABLA 14 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 169
TABLA 15 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 181
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 195
TABLA 17 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 207
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 221
TABLA 19 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 236
TABLA 20 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 250
TABLA 21 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 265
TABLA 22 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 278
TABLA 23 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 281
TABLA 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 294
TABLA 25 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 297
TABLA 26 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 310
TABLA 27 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 324
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 327
TABLA 29 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 339
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 342
TABLA 31 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 354
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 358
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 369
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 381
TABLA 35 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 384
TABLA 36 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 397
TABLA 37 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 399
TABLA 38 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 413
TABLA 39 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 416
TABLA 40 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 429
TABLA 41 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 433
TABLA 42 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 444
TABLA 43 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 447

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 1.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 1.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 1.5	Informe financiero
ANEXO 1.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 1.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 1.8	Registro Fotográfico
ANEXO 1.9	Bitácora de obra
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 2.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 2.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 2.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 2.7	Registro Fotográfico
ANEXO 2.8	Bitácora de obra
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 3.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 3.5	Informe financiero
ANEXO 3.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 3.7	Ensayos de laboratorio

ANEXO 3.8	Registro Fotográfico
ANEXO 3.9	Bitácora de obra
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 4.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 4.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 4.5	Informe financiero
ANEXO 4.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 4.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 4.8	Registro Fotográfico
ANEXO 4.9	Bitácora de obra
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 5.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 5.5	Informe financiero
ANEXO 5.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 5.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 5.8	Registro Fotográfico
ANEXO 5.9	Bitácora de obra
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 6.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 6.5	Informe financiero

ANEXO 6.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 6.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 6.8	Registro Fotográfico
ANEXO 6.9	Bitácora de obra
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 7.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 7.5	Informe financiero
ANEXO 7.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 7.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 7.8	Registro Fotográfico
ANEXO 7.9	Bitácora de obra
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 8.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 8.5	Informe financiero
ANEXO 8.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 8.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 8.8	Registro Fotográfico
ANEXO 8.9	Bitácora de obra
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 9.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 9.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 9.5	Informe financiero
ANEXO 9.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 9.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 9.8	Registro Fotográfico
ANEXO 9.9	Bitácora de obra
ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 10.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 10.5	Informe financiero
ANEXO 10.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 10.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 10.8	Registro Fotográfico
ANEXO 10.9	Bitácora de obra
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 11.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 11.5	Informe financiero
ANEXO 11.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 11.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.8	Registro Fotográfico
ANEXO 11.9	Bitácora de obra

ANEXO 12	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 12.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Relación de correspondencia
ANEXO 12.4	Actas de comité
ANEXO 12.5	Informe de los especialistas
ANEXO 12.6	Actas de reunión
ANEXO 12.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 12.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 12.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA

ADICIÓN No. 1	$532.999.145 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.700.014.247 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/05/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 4	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 5	HASTA EL 15/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ

G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 9 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$170.001.424,70	11/09/2024	3/04/2026
Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	3/04/2026
Prestaciones sociales	$340.002.849,40	11/09/2024	3/10/2028
Calidad del servicio	$510.004.274,10	3/10/2025	3/10/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 12.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 12.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024. Los días 19 de marzo de 2025, la Interventoría remitió el oficio CINP-555-533-1197 con la hoja de vida del Residente, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-017188 de fecha 21 de marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 13 de julio de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP–555–978–2752, con la hoja de vida del Ingeniero Residente, para revisión y aprobación.
El 15 de agosto de 2025, la Interventoría remitió oficio CINP–555–1177-3299, con la hoja de vida del Profesional financiero, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-060687.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARLOS MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO

CARGO	NOMBRE
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN ARTEAGA CORDOBA
PROFESIONAL FINANCIERO	LUZ VITOLA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	JOSE ARTURO CASTRO
APOYO SOCIAL	MILADY GAVIRIA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver Anexo 12.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Acta Parcial de Costos No. 11 correspondiente al periodo del informe se remite a la Supervisión de forma paralela con dicho informe y en este informe se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 12.7.

Hasta la fecha de corte de este informe después de haber transcurrido once (11) meses del plazo contractual, EL INSTITUTO ha cancelado al Consorcio CCSO el valor correspondiente a las Actas de Costos No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los periodos noviembre - diciembre de 2024, enero a mayo de 2025 y julio de 2025, se encuentra pendiente el pago del Acta de Costos No. 10, correspondiente al mes de agosto de 2025. Está pendiente de facturar el Acta de Costos No. 11 del mes de septiembre de 2025

Al finalizar el mes de octubre de 2025, EL INSTITUTO solo ha cancelado $1.114 millones de los $1.297 millones que se llevan facturado, donde se puede ver claramente de acuerdo a la fecha de pago, que el Consorcio hasta el mes de mayo de 2025 se vio afectado en el flujo de caja por el pago tardío por parte de INVIAS, teniendo que pagar el impuesto IVA de cada factura presentada sin recibir el valor de dichas facturas.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjuntan las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 12.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica para el Contrato No. 3601 de 2024.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 12.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	52
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	53
1	**INTRODUCCION**		55
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		59
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		59
3.1	Información general del contrato		59
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		60
3.3	Seguimiento Items no previstos		60
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		60
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		61
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		64
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		64
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		64
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		65
7	**Conclusiones y recomendaciones**		65
8	**Anexos**		66
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE REINICIO:	1/05/2025
PLAZO DE PRÓRROGA N 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	395,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	157.274.096,94
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.221.887,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.060.918,94

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 18.875.922,46	$ 156.596.014,17
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 4.564.935,00	$ 4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 36.755.718,00
VALOR EJECUTADO	**$ 23.440.857,46**	**$ 197.916.667,17**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.060.918,94
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.916.667,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,43%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

Foto 1, Compactación zona de cuneta y bordillo

Foto 2, Estado final de la placa huella y limpieza superficial

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

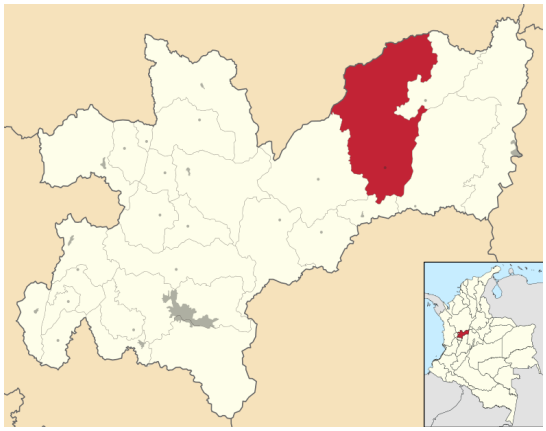

Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

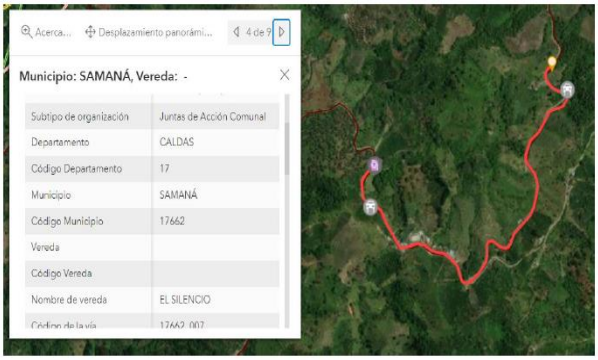

Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 3 Inventario y estado inicial

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPESIÓN No. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/2025
SUSPESIÓN No. 2	DESDE EL 28/05/25

	HASTA EL 18/06/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/07/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	31/12/2024	30/05/2026
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	31/12/2024	30/05/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.434,00	30/05/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	30/05/2025

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/10/25, remitió el desembolso no. 16 corregido.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/10/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos del mes de septiembre.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/10/25, remitió el desembolso no. 17 correspondientes a las retenciones del desembolso 1 y 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 18.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/10/25, remitió el plan de compras no. 8 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/10/25, remitió el plan de compras no. 9 para revisión y aprobación.

5.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 158,88 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 18,59 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3835 Kg.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	199.060.918,94
Ejecutado	100%	99,43%	197.916.667,17

Avance / Retraso	**0%**	**-0,57%**	1.144.251,77

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,85	3,85
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	195,72	158,88
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	87,34	74,4
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	18,59	18,59
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3890,31	3835

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-683-1776 de fecha 2 de mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao

CARGO	PROFESIONAL
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 4.882.075 de fecha 17/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 48.565.648 de fecha 28/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 32.316.719,12 de fecha 1/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 2.656.500 de fecha 6/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 1.751.354 de fecha 13/08/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 8.763.080 de fecha 15-08-2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 2.390.088 de fecha 15-08-2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 29.195.207,39 de fecha 2-09-2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 6.608.750 de fecha 25-08-2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 2.627.030 de fecha 25-08-2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 6.136.050 de fecha 8-09-2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 11.651.301 de fecha 12-09-2025
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 4.552.00 de fecha 18-09-2025
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 271.218 de fecha 18-09-2025
15. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 465.132 de fecha 24-09-2025
16. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 26.066.487 de fecha 10-10-2025
17. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 4.887.250 de fecha 1-10-2025
18. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 1.774.699,58 de fecha 9-10-2025
19. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 1.512.112,61 de fecha 14-10-2025
20. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 1.316.667 de fecha 22-10-2025

Desembolso Total por valor de $ 198.379.367,81 correspondiente al 99% del valor del convenio.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendiente las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 y Prórroga No. 2.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**65,5 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	7 días	lun 21/07/25	lun 28/07/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 27/07/25	mar 19/08/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	47 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	35 días	jue 31/07/25	mar 9/09/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	mié 6/08/25	lun 15/09/25	100%	100%

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $199.060.918,94; la Inversión Ejecutada fue de $197.916.667,17. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $1.144.251,77.

6.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

6.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1441-4169 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1502-4471 de fecha 24/10/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1513-4534 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC formatos ambientales para revisión y firma.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1522-4567 de fecha 29/10/25, remitió al INVIAS el cierre social de la JAC.

7.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 158,88 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 18,59 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3835 Kg.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría recibido la solicitud de giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los periodos mencionados.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.
- La obra finalizó el 15 de septiembre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,43% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin

Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 158,88 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 18,59 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 3835 Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $197.916.667,17 correspondiente al 99,43% del valor del convenio.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	68
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCION**		71
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		73
2.1	Localización		73
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		74
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		74
2.4	Características técnicas del proyecto		75
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		75
3.1	Información general del contrato		75
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		77
3.3	Seguimiento Items no previstos		77
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		78
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		78
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		80
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		80
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	80
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		80
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		81
7	**Conclusiones y recomendaciones**		81
8	**Anexos**		82
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE PRORROGA 03:	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.845.017,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	150.130.247,07
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	42.787.900,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**197.473.498,07**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.926.204,39
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.473.498,07
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 2 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de Suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que, de ser aceptada, las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

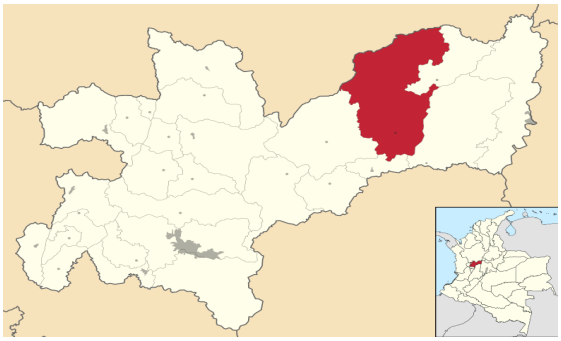

Ilustración 4 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

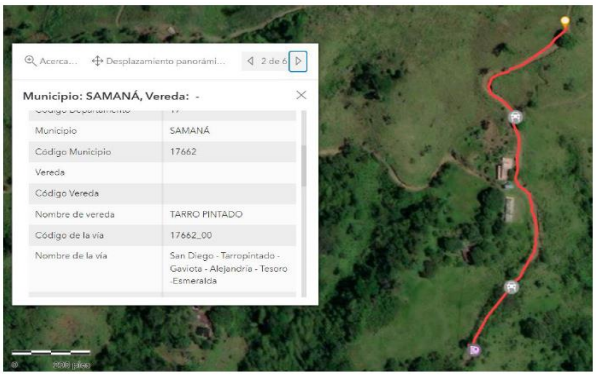

Ilustración 5 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 6 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros. De igual manera, se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MESES HASTA EL 1/08/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.068.826,80	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	02/09/2024	01/08/2028

Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

12.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.926.204,39
Ejecutado	100%	99,77%	197.473.498,07
Avance / Retraso	**0%**	**-0,23%**	**452.706,77**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	120,87	110,16
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	93,84	85,53
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	23,35
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4326,09	3.942,77

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.947.919 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 4.587.660 de fecha 07/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 8.109.428 de fecha 07/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 15.007.160 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.204.580 de fecha 09/03/2025.
6. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 34.000 de fecha 09/03/2025.
7. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 5.262.919 de fecha 13/03/2025
8. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 22.974.515,00 de fecha 19/03/2025
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 16.679.081,00 de fecha 26/03/2025
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 23.491.818,35 de fecha 10/04/2025
11. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 13.430.506,00 de fecha 14/05/2025
12. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 1.247.999,43 de fecha 27/05/2025
13. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 148,89 de fecha 2/07/2025
14. Desembolso 21 aprobado por valor de $ 465.000 de fecha 30/07/2025
15. Desembolso 22 aprobado por valor de $ 2.140.413,01 de fecha 04/08/2025
16. Desembolso 23 aprobado por valor de $ 4.030.351,01 de fecha 06/08/2025
17. Desembolso 24 aprobado por valor de $ 628.994,21 de fecha 22/10/2025

Desembolso Total por valor de $184.621.936,52 correspondiente al 93% del valor del convenio.

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1	✓		**Placa Huella San Diego**	**60 días**	**lun 13/01/25**	**lun 7/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
4	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
5	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%
6	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $ 197.926.204,39 ; la Inversión Ejecutada fue de $ 197.473.498,07. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 452.706,77.

13.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

13.9.4 Actas de Reunión

Ver anexo 12.6.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

14.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,77% hasta el corte del presente periodo, teniendo en cuenta que se realizaron 144ml de placa huella con la estructura completa, con los recursos disponibles para la obra física. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $197.473.498,07 correspondiente al 99,77% del valor del convenio.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	84
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	85
1	**INTRODUCCION**		87
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		89
2.1	Localización		89
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		90
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		90
2.4	Características técnicas del proyecto		91
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		91
3.1	Información general del contrato		91
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		93
3.3	Seguimiento Items no previstos		93
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		94
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		96
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		97
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		97
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	98
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		98
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		98
7	**Conclusiones y recomendaciones**		98
8	**Anexos**		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE PRORROGA 03:	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	150.969.496,11
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	4.627.479,00	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	43.742.203,42
VALOR EJECUTADO	**4.627.479,00**	**199.339.178,53**

INVERSIÓN EN OBRA **199339178,5**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.726.194,31
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.339.178,53
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,31%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202542871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

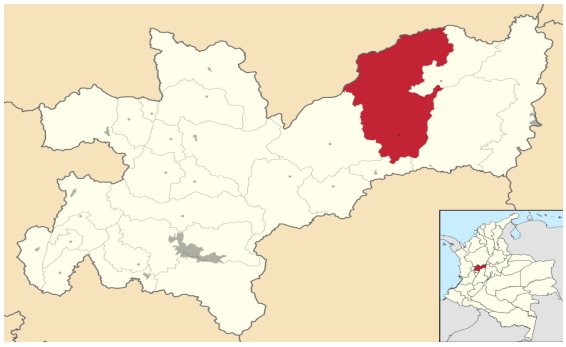

Ilustración 7 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

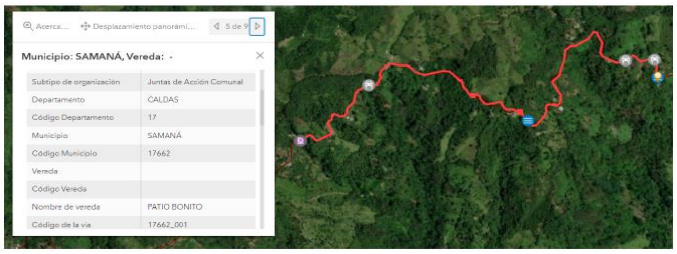

Ilustración 8 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 9 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/5/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/08/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.348.285,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	02/09/2024	01/08/2028

Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	17/07/2024	01/08/2028

Tabla 6 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

19.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4,60 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118, 58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.726.194,31
Ejecutado	100%	99,31%	199.339.178,53
Avance / Retraso	**0%**	**-0,69%**	1.387.015,78

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,86	4,6
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	99,45	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	77,4	92,28
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	24,47	29,18
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.546,03	4.227,96
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García

Tabla 7 Personal Convenio Solidario

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 45.709.003 de fecha 20/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.219.378 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 2.313.650 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 228.949.08 de fecha 09/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 5.157.000,00 de fecha 19/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 21.363.949,00 de fecha 25/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.079.661,00 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 56.349,76 de fecha 25/03/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.566.760,21 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.896.760,00 de fecha 24/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 18.100.594,73 de fecha 25/04/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.533.916,00 de fecha 27/05/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 532.533,00 de fecha 27/05/2025.
15. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 2.009.845 de fecha 9/06/2025.
16. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 177,76 de fecha 2/07/2025.
17. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 90.914,7 de fecha 2/07/2025.
18. Desembolso 21 aprobado por valor de $ 517.099,10 de fecha 25/06/2025.
19. Desembolso 22 aprobado por valor de $ 3.922.085 de fecha 21/07/2025.

Desembolso Total por valor de $199.835.444 correspondiente al 98,94% del valor del convenio.

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El OAC al corte del periodo no ha presentado las pólizas de las nuevas novedades contractuales, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1	✓		**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**lun 17/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**sáb 22/02/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**sáb 22/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	sáb 22/02/25	sáb 8/03/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	vie 28/02/25	lun 17/03/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	jue 6/03/25	mié 9/04/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	100%	100%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada acumulada fue de $ 200.726.194,31; la Inversión Ejecutada fue de $ 199.339.178,53 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $1.387.015,78.

20.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

20.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

21.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, se encuentran pendiente los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de julio 2024 a febrero 2025 y de julio a septiembre 2025.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,31% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 199.339.178,53 correspondiente al 99,31% del valor del convenio.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	101
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCION**		103
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		105
2.1	Localización		105
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		106
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		107
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Items no previstos		109
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		109
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		110
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		111
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		111
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	111
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		112
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		111
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		112
7	**Conclusiones y recomendaciones**		113
8	**Anexos**		113
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 3 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 4 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 13 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 1 del Convenio, que iría hasta el 22 de septiembre de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos

Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 22 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 6 a la suspensión No. 1 del Convenio, que iría hasta el 9 de octubre de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

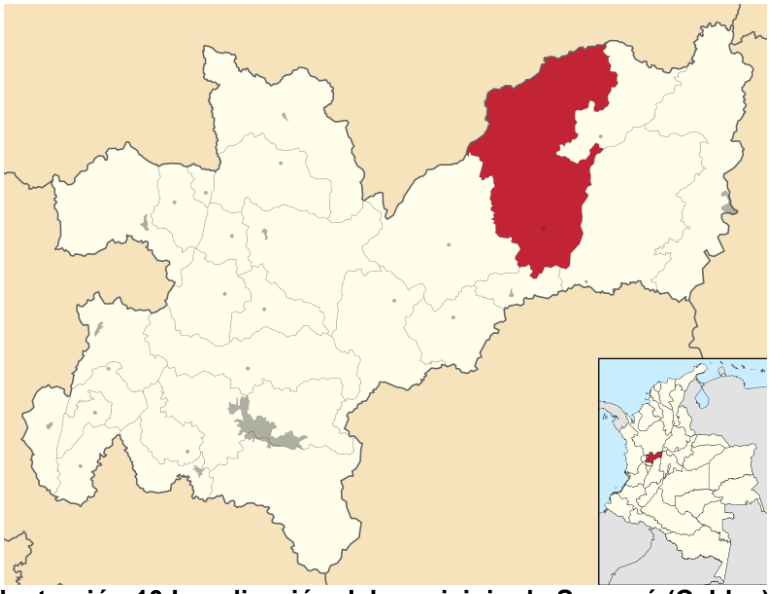

Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUPERVISIÓN DIRECTA
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/5/25

AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25
AMPLIACIÓN No. 5 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 21/09/25
AMPLIACIÓN No. 6 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 9/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 8 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 15/10/25, 17/10/25 y 27/10/25, remitió la hoja de vida del maestro de obra para revisión y aprobación.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no pudo realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto estuvo suspendido desde el 20/12/24 hasta el 9 de octubre de 2025, una vez se reinició el 10 de octubre de 2025, estuvo bajo la supervisión del Consorcio CCSO hasta el 21 del mismo mes, tiempo en el cual solo se pudo adelantar algunas actividades de la etapa de alistamiento..

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2159 de 2024.

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto estuvo suspendido desde el 20/12/24 hasta el 9 de octubre de 2025 y la supervisión a cargo del Consorcio CCSO solo estuvo hasta el 21 de octubre de 2025.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto estuvo suspendido desde el 20/12/24 hasta el 9 de octubre de 2025 y la supervisión a cargo del Consorcio CCSO solo estuvo hasta el 21 de octubre de 2025..

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1482-4307 de fecha 17/10/25, remitió la respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto estuvo suspendido desde el 20/12/24 hasta el 9 de octubre de 2025 y la supervisión a cargo del Consorcio CCSO solo estuvo hasta el 21 de octubre de 2025.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto estuvo suspendido desde el 20/12/24 hasta el 9 de octubre de 2025 y la supervisión a cargo del Consorcio CCSO solo estuvo hasta el 21 de octubre de 2025.
- La Interventoría realizó la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinició el Convenio.
- La Interventoría realizó la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinició el Convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	115
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	116
1	**INTRODUCCION**		118
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		120
2.1	Localización		120
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		121
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		121
2.4	Características técnicas del proyecto		122
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		122
3.1	Información general del contrato		122
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		124
3.3	Seguimiento Items no previstos		124
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		124
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		125
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		126
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		127
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	127
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		127
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		128
7	**Conclusiones y recomendaciones**		128
8	**Anexos**		128
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVÍSOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2124-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL DORADO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2025
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	295,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.674.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.674.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.174.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	151.687.590,90
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	41.038.235,39
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**197.257.014,29**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.910.021,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.257.014,29
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,67%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA

FOTO 2 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

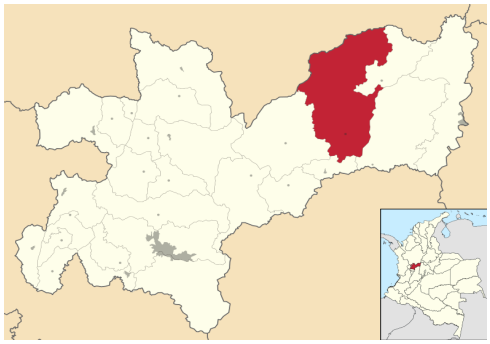

Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.

Ilustración 14 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL

	SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/08/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.067.401,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	01/08/2030	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	02/07/2024	01/08/2025

Tabla 9 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

33.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.910.021,00
Ejecutado	100%	99, 67%	197.257.014,29
Avance / Retraso	**0%**	**0.33%**	653.006,71

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	113,76
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,7	81,56
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	27,62
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3.756,53

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $55.537.787 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $4.587.660 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $8.906.849 de fecha 14/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $13.815.559 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $5.595.532 de fecha 06/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $60.000 de fecha 10/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $3.636.675 de fecha 13/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 5.934.767,33 de fecha 19/03/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 21.103.169,41 de fecha 04/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 47.001.876,72 de fecha 14/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 22.662.110,71 de fecha 02/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 9.534.555 de fecha 30/05/2025.
13. Desembolso 22 aprobado por valor de $ 791.178,49 de fecha 22/10/2025

Desembolso Total por valor de $199.171.969,49 correspondiente al 100% del valor del convenio.

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	D. Calenda	Comienzo	Fin	% prog	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4,41	M3	32	lun 13/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	115,52	M3	22	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	91,70	M3	64	vie 7/02/25	sáb 12/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	28,05	M3	53	jue 20/02/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4.223,65	KG	65	lun 3/02/25	mié 9/04/25	100%	100%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $ 197.910.021,00; la Inversión Ejecutada fue de $ 197.257.014,29. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $653.006,71.

34.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

34.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

35.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría no ha recibido el soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de septiembre 2025.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,67% hasta el corte del presente periodo.
- Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.257.014,29 correspondiente al 99,67% del valor del convenio.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	131
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	132
1	**INTRODUCCION**		134
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		136
2.1	Localización		136
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		137
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		137
2.4	Características técnicas del proyecto		137
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		137
3.1	Información general del contrato		137
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		139
3.3	Seguimiento Items no previstos		139
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		140
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		140
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		142
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		142
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	142
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		142
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		143
7	**Conclusiones y recomendaciones**		143
8	**Anexos**		144
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	336,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	149.442.627,09
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	44.757.836,91
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**198.756.599,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.756.599,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.756.599,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de

veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.

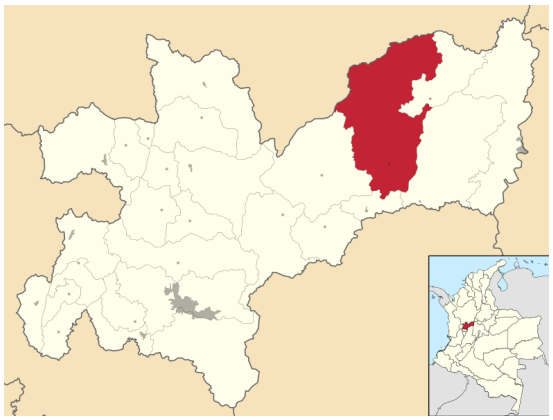

Ilustración 15 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

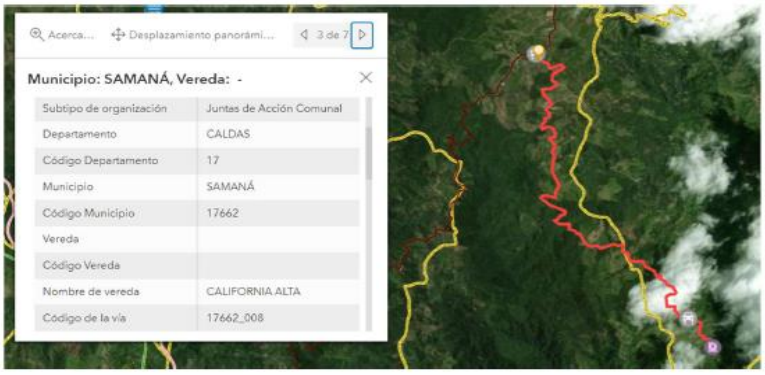

Ilustración 16 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1

TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			

Cumplimiento	$20.153.386,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	26/06/2024	01/08/2025

Tabla 10 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

40.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.756.599,00
Ejecutado	100%	100%	198.756.599,00
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	**0**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	118,58	106,72
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	92,01	88,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	25,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.243,89	3.819,5

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.936.944 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 03 probado por valor de $ 4.587.660 de fecha 14/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 8.553.302 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 27.000 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.647.805 de fecha 13/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.531.906 de fecha 20/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $1.489.715 de fecha 28/03/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $182.000 de fecha 09/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 42.507.598,07 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 16.167.261,73 de fecha 29/04/2025.
12. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 9.933.473,17 de fecha 22//05/2025.
13. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 5.411.484,67 de fecha 22/05/2025.
14. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 13.588.642,44 de fecha 27/06/2025.
15. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 1.896.822,36 de fecha 30/07/2025.
16. Desembolso 21 aprobado por valor de $ 4.556.100,5 de fecha 8/08/2025.
17. Desembolso 22 aprobado por valor de $ 230.646,19 de fecha 23/10/2025

Desembolso Total por valor de $199.523.361,19 correspondiente al 99,74% del valor del convenio.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL	**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.756.599,00; la Inversión Ejecutada fue de $198.756.599,00.

41.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

41.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

42.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio de 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 17 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 100% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 198.756.599,00 correspondiente al 100% del valor del convenio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3.

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	146
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	147
1	**INTRODUCCION**		149
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		151
2.1	Localización		151
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		152
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		152
2.4	Características técnicas del proyecto		153
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		153
3.1	Información general del contrato		153
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		155
3.3	Seguimiento Items no previstos		155
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		155
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		156
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		157
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		157
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	158
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		158
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		159
7	**Conclusiones y recomendaciones**		159
8	**Anexos**		159
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2119-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLÍ

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	336,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.002.573,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.002.573,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	156,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	154.478.193,06
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	41.135.665,94
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**200.209.706,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.218.288,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 200.209.706,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA CARACOLÍ
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/04/25

VEREDA CARACOLÍ
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA 15/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.

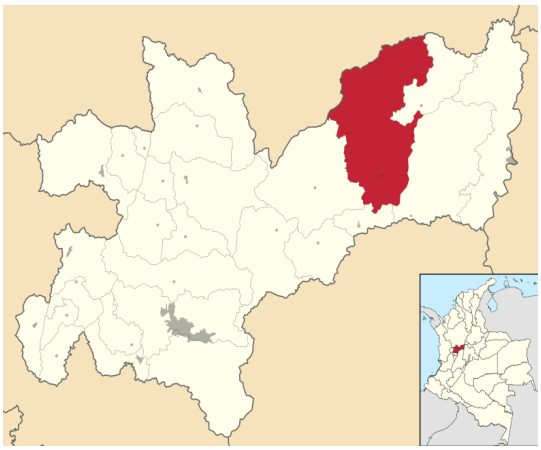

Ilustración 17 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

Ilustración 18 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.

Ilustración 19 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.300.258,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	01/08/2025

Tabla 11 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

47.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.218.288,00
Ejecutado	100%	100%	200.209.706,00

Avance / Retraso	**0%**	**0%**	8.582,00

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	5,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,34	136,94
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	95,32	109,37
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	33,55
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.375,92	5.021,09

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $49.763.368 de fecha 07/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $10.065.922 de fecha 21/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $44.758.547 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $48.045.188 de fecha 13/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $3.119.882 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $2.246.646 de fecha 15/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $198.425 de fecha 19/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $10.860.988 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 17.875.733,66 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.900.599,00 de fecha 25/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 866.600,00 de fecha 06/05/2025.
12. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 4.595.847 de fecha 23/07/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 1.333.584 de fecha 5/08/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 2.954,32 de fecha 27/10/2025.

Desembolso Total por valor de $200.634.284,32 correspondiente al 99,57% del valor del convenio.

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1	✓	**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**mar 21/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**dom 26/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	dom 26/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	sáb 1/02/25	mar 18/02/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 7/02/25	jue 13/03/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mié 12/02/25	jue 13/03/25	100%	100%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $200.218.288,00; la Inversión Ejecutada fue de $200.209.706,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $8.582,00.

48.9.3 Actas de Comités

No aplica para el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

49.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.

- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de abril 2025.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 15/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 100% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 200.209.706,00 correspondiente al 100% del valor del convenio

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	162
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	163
1	**INTRODUCCION**		165
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		167
2.1	Localización		167
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		168
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		168
2.4	Características técnicas del proyecto		168
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		168
3.1	Información general del contrato		168
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		170
3.3	Seguimiento Items no previstos		171
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		171
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		172
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		173
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		173
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	173
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		174
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		174
7	**Conclusiones y recomendaciones**		174
8	**Anexos**		175
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2173-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.229.002,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	149,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	-	150.698.036,47
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	41.869.345,55
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**197.144.743,02**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.455.098,72
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.144.743,02
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,34%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

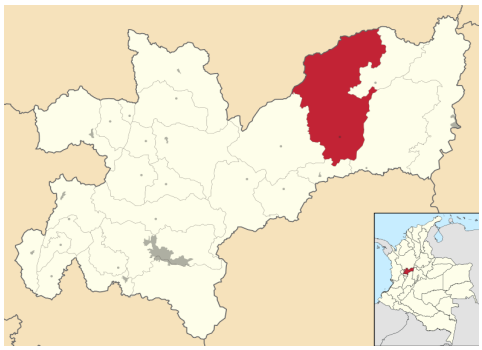

Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

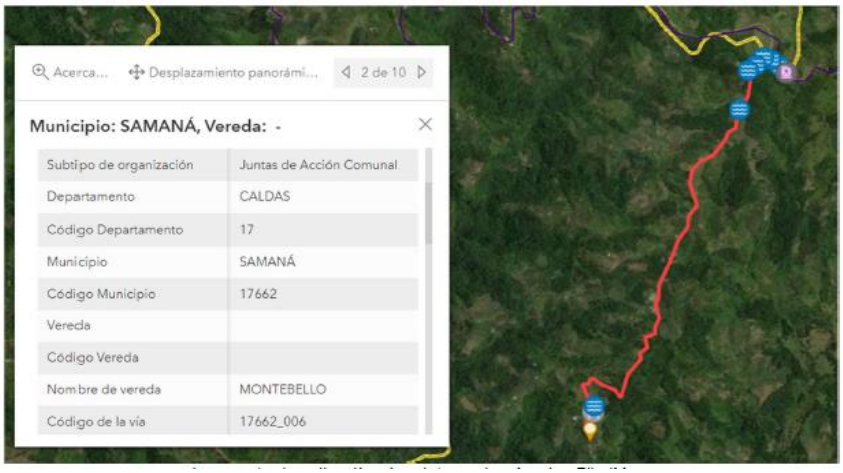

Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza	

de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.122.901,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/05/2025

Tabla 12 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

54.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.455.098,72
Ejecutado	100%	99,34%	197.144.743,02
Avance / Retraso	**0%**	- 0,66%	**- 1.310.355,7**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,23
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	113,99	109,25
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	90,04	82,72
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,88
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4125,38	3.789,81

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 47.162.934 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.620.194 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 14.508.734,83 de fecha 07/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.258.536 de fecha 18/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 23.059.752 de fecha 25/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 40.090.690,63 de fecha 25/03/2025.
7. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 237.849,49 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 513.766,89 de fecha 25/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 21.546.278,88 de fecha 02/05/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 7.032.891,86 de fecha 22/05/2025.
11. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 3.464.088 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 13.391.947,6 de fecha 09/06/2025
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $213.340,58 de fecha 02/07/2025
14. Desembolso 18 aprobado por valor de $307,43 de fecha 02/07/2025
15. Desembolso 19 aprobado por valor de $1.178.948,77 de fecha 25/06/2025
16. Desembolso 20 aprobado por valor de $2.414.117,65 de fecha 25/06/2025
17. Desembolso 22 aprobado por valor de $91.392 de fecha 05/08/2025
18. Desembolso 23 aprobado por valor de $5.295.529,41 de fecha 04/09/2025
19. Desembolso 24 aprobado por valor de $152.653 de fecha 05/09/2025

Desembolso Total por valor de $ 200.233.953 correspondiente al 100% del valor del convenio.

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y Prórroga No. 3.

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL		**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.455.098,72, la Inversión Ejecutada fue de $197.144.743,02. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $1.310.355,7.

55.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

55.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

56.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 21 de mayo de 2025

- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,34% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.144.743,02 correspondiente al 99,34% del valor del convenio.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	177
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	178
1	**INTRODUCCION**		180
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		182
2.1	Localización		182
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		183
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		183
2.4	Características técnicas del proyecto		183
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		183
3.1	Información general del contrato		183
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		185
3.3	Seguimiento Items no previstos		186
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		186
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		188
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	509
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	519
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	521
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	523
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	525
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	527
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	513
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		189
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		189
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	189
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		190
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		191
7	**Conclusiones y recomendaciones**		191
8	**Anexos**		192
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		529
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		531

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	18/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01:	28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	27/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 01	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	3/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	396,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 202.747.162,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 202.747.162,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	156.490.887,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.149.964,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.247.162,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 12.431.607,65	$ 154.255.329,65
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.604.000,00	$ 4.604.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12.482.044,00	$ 40.149.964,00
VALOR EJECUTADO	**$ 29.517.651,65**	**$ 199.009.293,65**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.004.017,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.009.293,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,50%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

Foto 1, Limpieza de formaleta y placa huella

Foto 2, Estado final de la placa huella 3/10

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarro Pintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

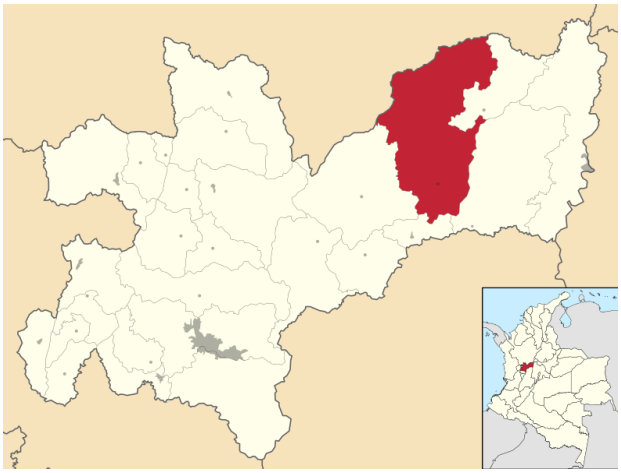

Ilustración 22 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

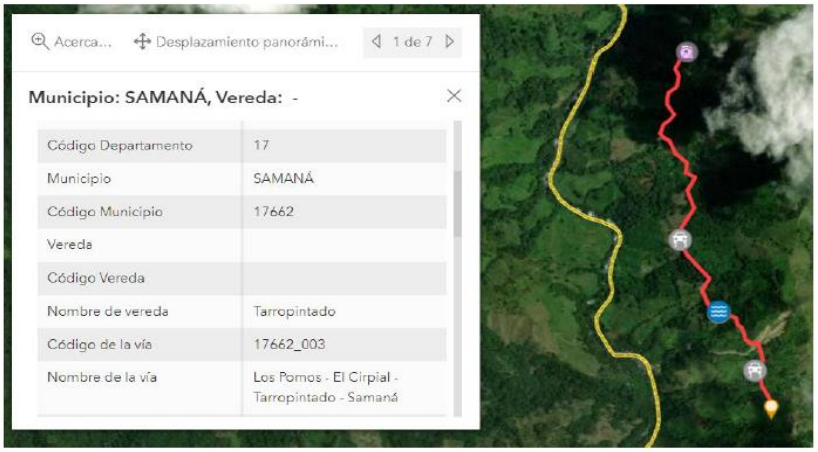

Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO
NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2524-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/04/2025
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/05/2025
REANUDACIÓN	19/5/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA NO. 2	HASTA EL 27/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	03/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 13 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió el último plan de compras para revisión y aprobación.
- Se realizaron los comité operativo no. 13 (3/10/25) y 14 (8/10/25).
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió la solicitud reintegro de rendimientos del mes de septiembre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió el último plan de compras para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió el documento enviado por Corpocaldas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió el paz y salvo de participación ciudadana.

61.2.2 Actividades Técnicas

A la fecha de corte del presente periodo, y con la obra finalizada, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 108 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 33,75 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 3813 Kg.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, las obras del Convenio Solidario se encuentran finalizadas. El proyecto, presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	97,71%	200.004.017,00
Ejecutado	100%	99,5%	199.009.293,65
Avance / Retraso	**0%**	**- 0,5%**	**- 994.723,35**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,62	5,62

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	108
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	88,56	74,4
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	33,75
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4075,54	3813
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	0	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 1.3

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–772–2097 de fecha 21 de Mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Andrés Felipe Quiceno
Maestro de Obra	Rogelio Armando Loaiza Rua

Tabla 14 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver anexo 1.4

62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 48.970.711 de fecha 24/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.734.091 de fecha 31/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 6.824.858 de fecha 11/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 21/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 2.699.644 de fecha 21/08/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 37.566.600 de fecha 28/08/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $17.399.760 de fecha 28/08/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 13.078.492 de fecha 08/09/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 7.213.854 de fecha 09/09/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 9.180.000 de fecha 12/09/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 4.604.000 de fecha 1709/2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $1.020.000 de fecha 23/09/2025
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $30.695.760,01 de fecha 24/09/2025
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $11.573.124,67 de fecha 08/10/2025
15. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 587.538,45 de fecha 20/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 200.039.293,13 correspondiente al 99,4% del valor del convenio. Ver anexo 1.5

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 1.6.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 1.7.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2524 de 2024.

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	**55 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
INICIO	**55 días**	**lun 21/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 4/08/25	vie 22/08/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	100%	100%
FINAL	**0 días**	**vie 3/10/25**	**vie 3/10/25**	100%	100%

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $200.004.017,00; la Inversión Ejecutada fue de $199.009.293,65 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $994.723,35

62.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

62.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1442-4170 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1468-4215 de fecha 10/10/25 remitió nuevamente al INVIAS la documentación ambiental que ya había sido radicada.

63.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 13 con presencia de JAC vereda Tarro pintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de Nomina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 8 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 14 con presencia de JAC vereda Tarro pintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

A la fecha de corte del presente periodo, y con la obra finalizada, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 108 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 33,75 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 3813 Kg.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes de solicitud del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.
- Obra finalizada el 3 de octubre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,5% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 108 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 33,75 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 3813 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $199.009.293,65 correspondiente al 99,5% del valor del convenio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 1.8.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

Ver anexo 1.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	194
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	195
1	**INTRODUCCION**		197
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		199
2.1	Localización		199
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		200
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		200
2.4	Características técnicas del proyecto		201
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		201
3.1	Información general del contrato		201
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		202
3.3	Seguimiento Items no previstos		203
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		203
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		204
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		205
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		205
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	205
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		206
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		206
7	**Conclusiones y recomendaciones**		206
8	**Anexos**		207
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.855.760,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		154.610.861,84
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	34.843.057,42
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**189.453.919,26**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.581.257,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.453.919,26
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,40%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

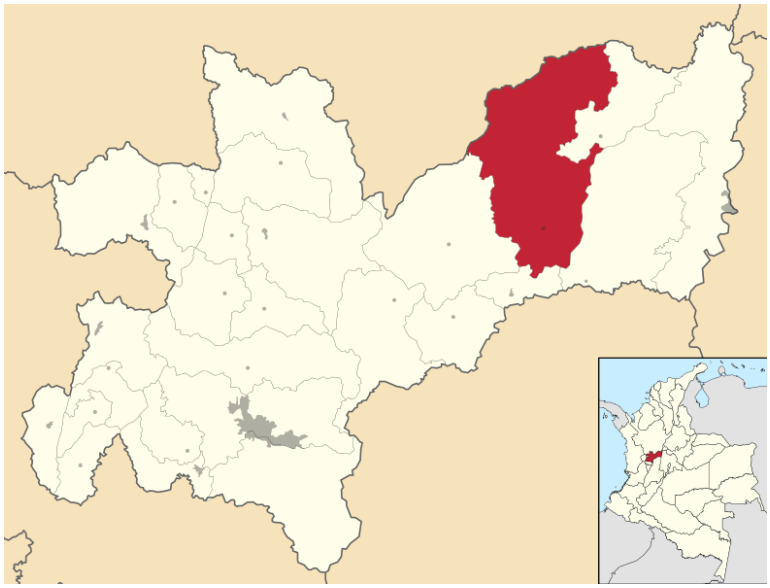

Ilustración 24 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

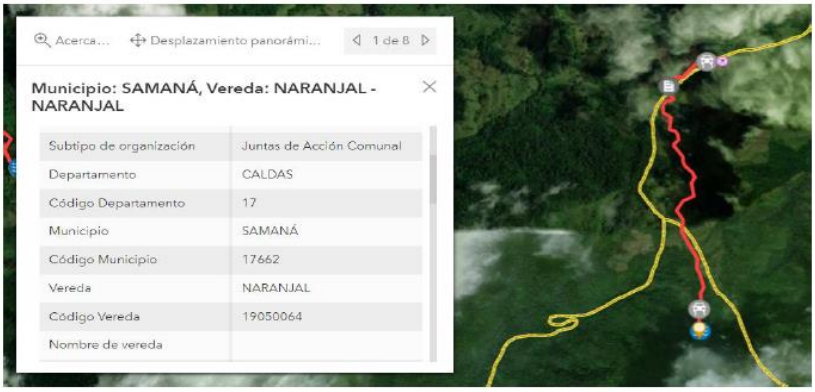

Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

Ilustración 26. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025

SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.135.576,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	30/04/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/05/2025

Tabla 15 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

68.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.581.257,16
Ejecutado	100%	95,4%	189.453.919,26
Avance / Retraso	**0%**	**- 4.6%**	**- 9.127.337,90**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	86,63	81,05
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto -	M3	100%	100%	27,45	27,26

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	40% Piedra para placa huella)					
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3713,57

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 49.011.104 de fecha 10/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 4.608.800 de fecha 25/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 13.160.254 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.353.724 de fecha 10/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 14.360.988,00 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 17.669.304,25 de fecha 28/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 3.814.199,90 de fecha 31/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.658.441,47 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 27.406.000,26 de fecha 02/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.900.403,36 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.353.704,00 de fecha 27/05/2025.
13. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 2.492.257,91 de fecha 4/06/2025.
14. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 3.259.253,59 de fecha 13/06/2025.
15. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 1.310.976,04 de fecha 30/10/2025.

Desembolso Total por valor de $ 193.173.330,25 correspondiente al 96,66% del valor del convenio.

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**57 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin clasificar	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	mié 5/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21MPA (Clase D) - Mezcla in situ para placa huella	35 días	jue 13/02/25	mié 9/04/25	100%	100%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPA (F) 60% concreto - 40% piedra para placa huella	30 días	lun 24/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 6/02/25	mar 25/03/25	100%	100%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.581.257,16; la Inversión Ejecutada fue de $189.453.919,26. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $9.127.337,90.

69.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

69.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

70.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 95,4% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 189.453.919,26 correspondiente al 95,4 % del valor del convenio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	209
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	210
1	**INTRODUCCION**		212
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		214
2.1	Localización		214
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		215
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		215
2.4	Características técnicas del proyecto		216
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		216
3.1	Información general del contrato		216
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		218
3.3	Seguimiento Items no previstos		218
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		218
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		219
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		220
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		220
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	221
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		221
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		221
7	**Conclusiones y recomendaciones**		221
8	**Anexos**		222
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDALA LINDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.682.607,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	146,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.207.048,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.182.607,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	150.938.281,97
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	41.916.632,02
VALOR EJECUTADO	-	**197.421.124,99**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.905.813,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 197.421.124,99
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,76%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

Ilustración 27 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

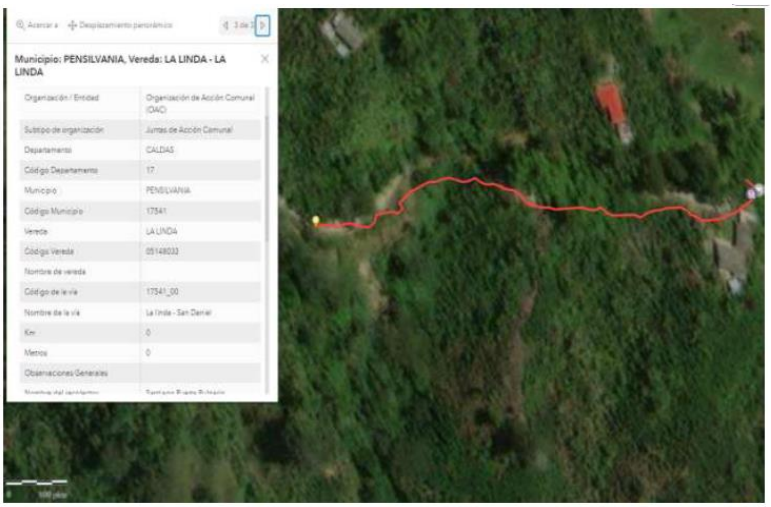

Ilustración 28 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciara que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 29. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL

	DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN NO. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 16 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	199.905.813,56
Ejecutado	100%	98,76%	197.421.124,99
Avance / Retraso	**0%**	**-1,24%**	**- 2.484.688,57**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	80,29	80,29
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3.969,12

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 28.185.246 de fecha 10/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 30.413.058 de fecha 22/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.533.588 de fecha 04/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 9.677.355 de fecha 11/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 144.600 de fecha 17/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 42.707.477 de fecha 26/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.670.450 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 1.099.373,18 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 12.923.150,00 de fecha 08/04/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 6.800.806,00 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 39.045.088,99 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 4.555.500,00 de fecha 27/05/2025.

13. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 540.000 de fecha 04/06/2025.
14. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 86.560 de fecha 02/09/2025.
15. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 268.869 de fecha 01/10/2025.

Desembolso Total por valor de $ 197.651.120.57 correspondiente al 98% del valor del convenio.

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentra pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No.1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga 3.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA			ACTIVIDADES ACUMULADAS				
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA			LONG. EJEC	CANT. PROG.	CANT. EJEC.	% PROG.	% EJEC.
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	146,00	4,31	4,31	100%	100%
2	320.3	Subbase Granular Clase C	146,00	111,69	111,69	100%	100%
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	146,00	80,29	80,29	100%	100%
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	146,00	27,45	27,45	100%	100%
5	640.10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	146,00	3.969,12	3.969,12	100%	100%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $199.905.813,56; la Inversión Ejecutada fue de $197.421.124,99 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $2.484.688,57.

76.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

76.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

77.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios del periodo de Julio 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 28/03/25.
  El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,76% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada:

80,29 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 27,45 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 3.969,12.

El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.421.124,99 correspondiente al 98,76% del valor del convenio.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	224
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	225
1	**INTRODUCCION**		227
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		229
2.1	Localización		229
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		230
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		230
2.4	Características técnicas del proyecto		231
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		231
3.1	Información general del contrato		231
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		233
3.3	Seguimiento Items no previstos		233
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		233
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		234
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		235
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		235
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	236
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		236
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		237
7	**Conclusiones y recomendaciones**		237
8	**Anexos**		238
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO	
	VERSION	
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2140-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA RITA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 201.393.774,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.727.480,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.893.774,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	154.971.023,67
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	40.076.019,00
VALOR EJECUTADO	-	**195.047.042,67**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.617.100,54
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 195.047.042,67
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,20%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 -OBRA FINALIZADA - 23/04/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 23/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.

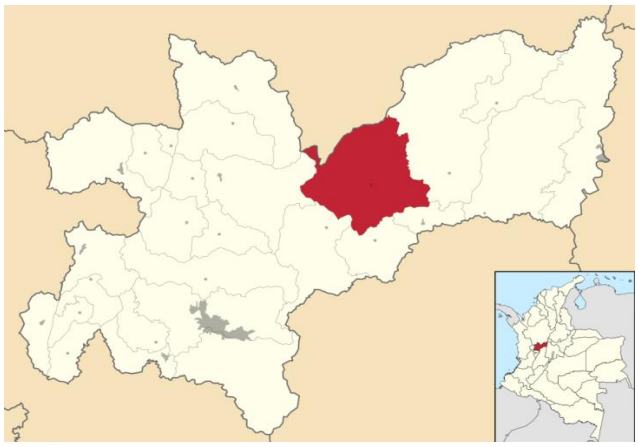

Ilustración 30 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

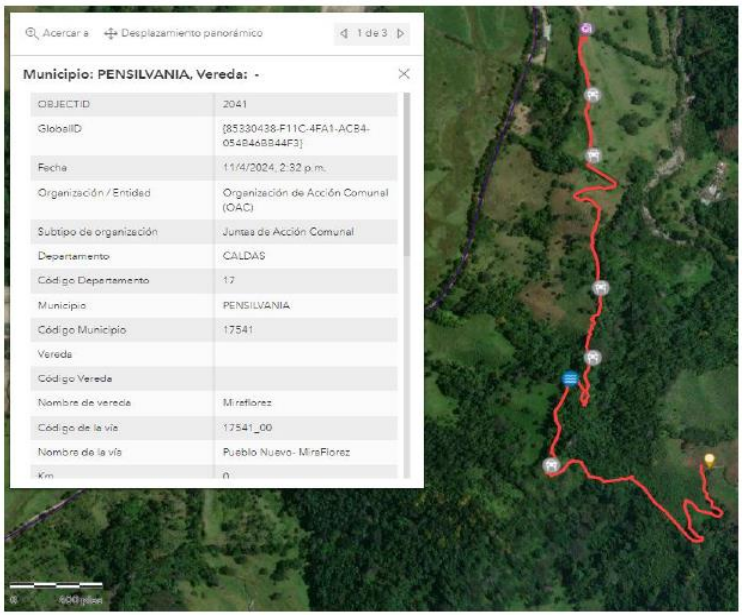

Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 32. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE

VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/09/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	30/05/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	30/05/2025

Tabla 17 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

82.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.617.100,54
Ejecutado	100%	98,23%	195.047.042,67
Avance / Retraso	**0%**	**- 1,77%**	**- 3.570.057,87**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	4,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	103,28	111,7
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	79,34	81,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	25,06	27,1
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.652,46	3766,09

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 50.347.996 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 11.041.270 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 8.496.904 de fecha 13/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 47.615.438 de fecha 28/02/2025.

5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 12.475.326 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 11.617.026,00 de fecha 02/04/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.946.782,00 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 2.314.200,00 de fecha 06/05/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 475,23 de fecha 13/05/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 4.500.000 de fecha 06/07/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 20.980.760 de fecha 04/09/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 11.255.583 de fecha 26/09/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 196.139 de fecha 01/10/2025.

Desembolso Total por valor de $ 197.787.899,06 correspondiente al 98,95% del valor del convenio.

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga No. 3.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1	✓		**CONVENIO 2140 - 2024**	**59 días**	**mar 14/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**lun 20/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**53 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	100%	100%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de 198.617.100,54; la Inversión Ejecutada fue de 195.047.042,67 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de 3.570.057,87.

83.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

83.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

84.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a julio 2025 y septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,23% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 195.047.042,67 correspondiente al 98,23% del valor del convenio.

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2.

85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

85.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	240
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	241
1	**INTRODUCCION**		243
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		245
2.1	Localización		245
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		246
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		246
2.4	Características técnicas del proyecto		247
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		247
3.1	Información general del contrato		247
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		248
3.3	Seguimiento Items no previstos		249
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		249
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		250
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		251
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		251
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	252
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		252
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		253
7	**Conclusiones y recomendaciones**		253
8	**Anexos**		253
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	332,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.500.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1.500.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.155.580,85**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	151.325.212,60
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	40.320.219,54
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**196.179.749,14**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.884.424,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.179.749,14
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,14%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA EL VERDAL
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

VEREDA EL VERDAL
FOTO 2 -OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

86 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.

Ilustración 33 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

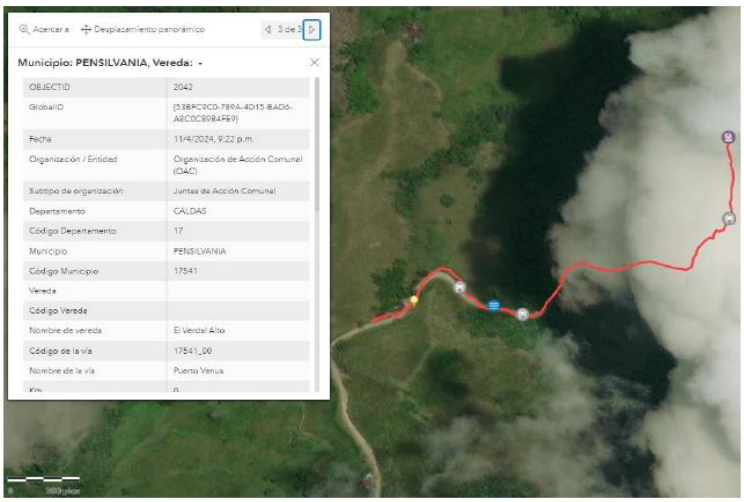

Ilustración 34 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

Ilustración 35. Estado inicial de la vía

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE

VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 6			
Cumplimiento	$20.065.559,00	03/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	03/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	01/08/2025

Tabla 18 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

88.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

88.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.884.424,00
Ejecutado	100%	99,14%	196.179.749,14
Avance / Retraso	**0%**	**0,86%**	

			-1.704.674,86

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,67	3,79
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	96,39	99,45
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	76,96	79,40
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	23,28	20,94
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.553,97	3.666,79

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 52.452.837 de fecha 6/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 5.527.000 de fecha 26/02/2025.
3. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 10.934.800 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 43.572.000 de fecha 26/02/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 14/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 359.800,00 de fecha 28/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.648.400,00 de fecha 26/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 14/04/2025.
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.555.891,00 de fecha 06/05/2025.
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 35.656.560,43 de fecha 22/05/2025.
11. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 2.512.464,71 de fecha 21/05/2025.
12. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 178.100 de fecha 18/07/2025.
13. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 2.021.852,46 de fecha 29/07/2025.
14. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 1.705.285,14 de fecha 23/10/2025.

Desembolso Total por valor de $ 198.906.710,99 correspondiente al 99,88% del valor del convenio.

89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
CONVENIO 2077 - 2024	**79,63 días**	**mar 21/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**74,63 días**	**lun 27/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	lun 27/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 2/02/25	mar 25/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	40 días	lun 3/03/25	jue 17/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	29 días	jue 20/03/25	mar 22/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	lun 10/02/25	mar 11/03/25	100%	100%

89.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $197.884.424,00; la Inversión Ejecutada fue de $196.179.749,14, que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $1.704.674,86.

89.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

89.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

90.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

90.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,14% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 196.179.749,14 correspondiente al 99,14% del valor del convenio.

92 ANEXO

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2.

92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

92.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	256
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	257
1	**INTRODUCCION**		259
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		261
2.1	Localización		261
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		262
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		262
2.4	Características técnicas del proyecto		263
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		263
3.1	Información general del contrato		263
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		265
3.3	Seguimiento Items no previstos		265
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		265
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		266
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		267
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		268
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	268
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1182
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		268
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		269
7	**Conclusiones y recomendaciones**		269
8	**Anexos**		269
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	332,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.654.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	150.648.225,08
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	41.240.738,42
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**196.420.151,50**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.380.458,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.420.151,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA MIRAFLORES
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24

VEREDA MIRAFLORES
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

93 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

94.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

Ilustración 36 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

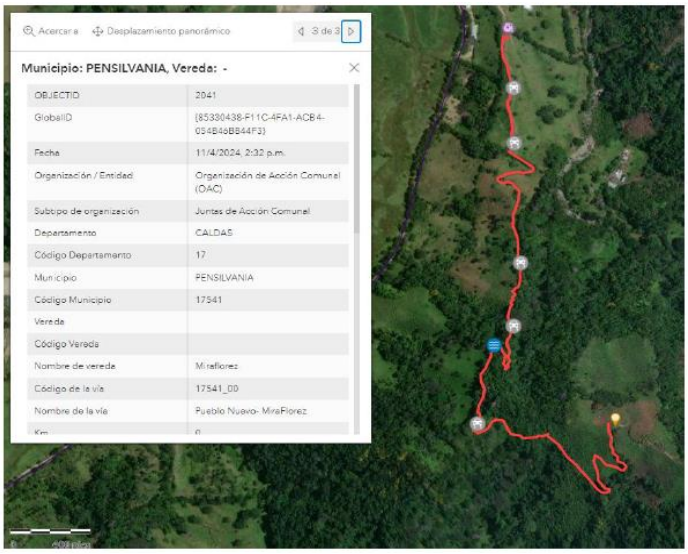

Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.

Ilustración 38. Estado inicial de la vía

94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.115.401,00	30/08/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	30/08/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	01/08/2025	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025

Patronal			

Tabla 19 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

95.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

95.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.380.458,00

Ejecutado	100%	99,01%	196.420.151,50
Avance / Retraso	**0%**	**- 0,99%**	**- 1.960.306,50**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,12
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	107,87
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,70	85,63
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,19
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3943,94

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 33.767.250 de fecha 14/02/2025.
2. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 31.761.019 de fecha 18/02/2025.
3. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 1.839.500 de fecha 08/03/2025
4. Desembolso 06 aprobado por valor de $9.761.760 de fecha 08/03/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 19.624.364,33 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 31.352.100,01 de fecha 09/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 8.086.810,00 de fecha 09/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 400.000,00 de fecha 10/04/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 40.720.859,24 de fecha 02/05/2025.
11. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 7.943.681,00 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 99.275 de fecha 21/07/2025.
13. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 4.531.188 de fecha 25/07/2025.

Desembolso Total por valor de $196.778.66,56 correspondiente al 98,56% del valor del convenio.

96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
CONVENIO 2169 - 2024	**46 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**6 días**	**lun 10/02/25**	**dom 16/02/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**40 días**	**dom 16/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	30 días	dom 16/02/25	dom 23/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	lun 24/02/25	lun 31/03/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 28/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	sáb 22/02/25	dom 23/03/25	100%	100%

96.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de 198.380.458,00; la Inversión Ejecutada fue de 196.420.151,50 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $1.960.306,50.

96.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

96.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

97.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

97.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,01% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 196.420.151,50 correspondiente al 99,01% del valor del convenio.

99 ANEXO

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2.

99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

99.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	272
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	273
1	**INTRODUCCION**		275
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		277
2.1	Localización		277
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		278
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		278
2.4	Características técnicas del proyecto		279
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		279
3.1	Información general del contrato		279
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		281
3.3	Seguimiento Items no previstos		281
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		281
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		282
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		283
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		284
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	285
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		285
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		286
7	**Conclusiones y recomendaciones**		286
8	**Anexos**		287
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DIAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.055.145,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	149.926.811,97
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	42.380.178,50
VALOR EJECUTADO	-	**196.836.470,47**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.786.418,64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.836.470,47
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,52%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

100 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

101.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

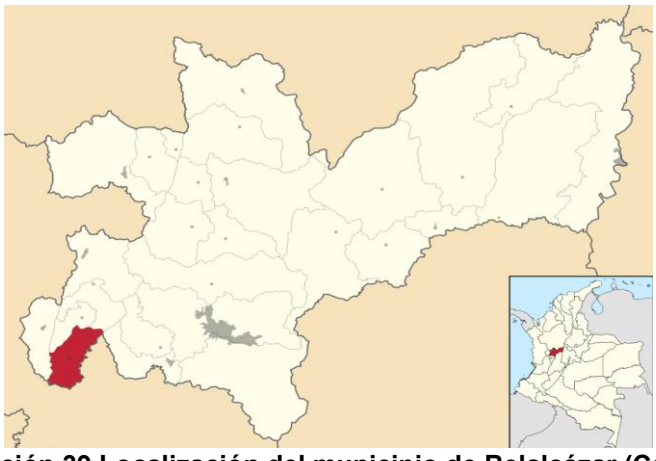

Ilustración 39 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

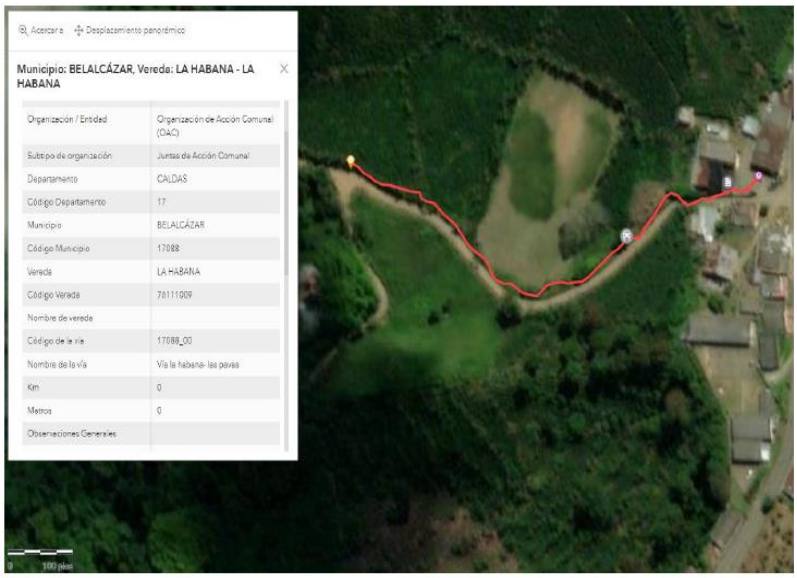

Ilustración 40 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 41. Estado inicial de la vía

101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.055.515,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.027.758,00	02/09/2024	01/08/2028

Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	01/08/2024	01/08/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	01/08/2025

Tabla 20 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

102.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

102.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra finalizado. El proyecto presenta el siguiente estado:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.786.418,64
Ejecutado	100%	99,52%	196.836.470,47
Avance / Retraso	**0%**	**-0,48%**	**949.948,17**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	133,11	140
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	101,5	106,75
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	32,22	33,89
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.675,13	4.916,95

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $40.872.017 de fecha 20/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.095.148 de fecha 24/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $2.163.019 de fecha 30/01/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $198.000 de fecha 30/01/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $1.279.400 de fecha 06/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $10.676.213 de fecha 11/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.852.689 de fecha 24/02/2025
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 51.530.938 de fecha 11/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 1.178.000,00 de fecha 19/03/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.054.330,00 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 15.401.283,83 de fecha 10/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 6.708.140,00 de fecha 24/04/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.578.473,52 de fecha 24/04/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 10.928.118,05 de fecha 06/05/2025.
15. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 16.185.256,00 de fecha 14/05/2025.
16. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 7.799.953,00 de fecha 22/05/2025.
17. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 283.483,78 de fecha 31/07/2025.
18. Desembolso 21 aprobado por valor de $ 4.126.029 de fecha 19/08/2025.

Desembolso Total por valor de $196.910.491,41 correspondiente al 98,92% del valor del convenio.

103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
Proyecto Placas Huellas en concreto	**73 días**	**jue 16/01/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
ETAPA 1	**30 días**	**jue 16/01/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Fase 1	**14 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 1/02/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
Fase 2	**8 días**	**sáb 1/02/25**	**mar 11/02/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
Fase 3	**8 días**	**mié 12/02/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
ETAPA 2	**23 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Fase 4	**7 días**	**vie 21/02/25**	**sáb 1/03/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%

Fase 5	**8 días**	**sáb 1/03/25**	**mar 11/03/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
Fase 6	**8 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
ETAPA 3	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Fase 7	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	100%	100%

103.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de 197.786.418,64; la Inversión Ejecutada fue de 196.836.470,47 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de 949.948,17.

103.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

103.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

104.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

104.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto 2024 a Septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 10 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,52% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 196.836.470,47 correspondiente al 99,52% del valor del convenio.

106 ANEXO

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2.

106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

106.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	289
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	290
1	**INTRODUCCION**		292
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		294
2.1	Localización		294
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		295
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		295
2.4	Características técnicas del proyecto		296
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		296
3.1	Información general del contrato		296
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		298
3.3	Seguimiento Items no previstos		298
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		299
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		299
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		301
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		301
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	301
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		301
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		302
7	**Conclusiones y recomendaciones**		302
8	**Anexos**		303
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISÓR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00

VALOR INICIAL :	$ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.792.352,17**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	150.268.876,33
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	40.199.147,67
VALOR EJECUTADO	**-**	**195.061.687,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.510.851,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 195.061.687,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,28%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

107 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

108.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.

Ilustración 42 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

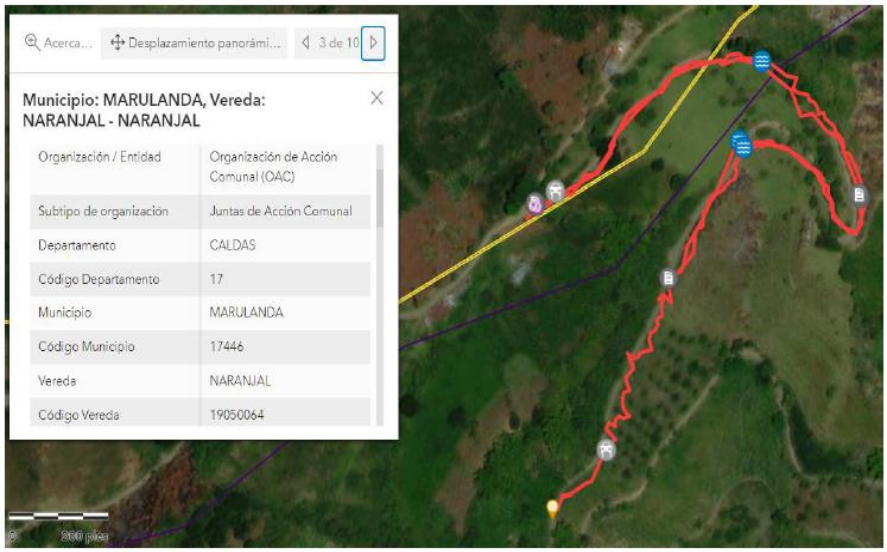

Ilustración 43 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 44. Estado inicial de la vía

108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$20.329.236,00	02/09/2024	01/08/2026
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	02/09/2024	01/08/2028
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	01/08/2025	01/08/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	28/06/2024	01/08/2025

Tabla 21 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

109.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

109.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.510.851,10
Ejecutado	100%	97,28%	195.061.687,00
Avance / Retraso	**0%**	**- 2,72%**	**- 5.449.164,10**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	83,69	85,34
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	29,21
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.133,51	4.215,09

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $39.203.611 de fecha 30/01/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $1.750.000 de fecha 19/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $3.913.907 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.870.860 de fecha 12/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $1.975.800 de fecha 12/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $29.271.228 de fecha 28/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 14.219.143 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 28.299.630,60 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 13.721.867,00 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 38.197.174,23 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 11.990.560 de fecha 25/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 7.075.014,00 de fecha 22/05/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 4.358.133 de fecha 9/06/2025.
14. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 852.592 de fecha 9/06/2025.
15. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 1.120.000 de fecha 25/06/2025.
16. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 125.000 de fecha 22/07/2025.
17. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 152.653 de fecha 29/07/2025.

Desembolso Total por valor de $202.097.173 correspondiente al 100% del valor del convenio.

110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
FINAL		**0**	**0 días**	**mié 16/04/25**	**mié 16/04/25**	0%	100%
INICIO		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%

110.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de 200.510.851,10; la Inversión Ejecutada fue de 195.061.687,00, que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de 5.449.164,10.

110.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

110.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

111.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

111.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 Septiembre de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 2 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97,28% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 195.061.687,00 correspondiente al 97,28% del valor del convenio.

113 ANEXO

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2.

113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

113.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	305
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	306
1	**INTRODUCCION**		308
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		310
2.1	Localización		310
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		311
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		311
2.4	Características técnicas del proyecto		311
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		311
3.1	Información general del contrato		311
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		313
3.3	Seguimiento Items no previstos		314
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		314
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		315
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	536
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	553
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	555
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	557
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	559
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	561
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	545
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		316
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		316
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	317
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		317
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		319
7	**Conclusiones y recomendaciones**		319
8	**Anexos**		319
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		563
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		565

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3551-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL PARAMO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA REINICIO 01:	11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 29/5/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02:	27/05/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02:	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 01	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 01	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	396,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 202.740.460,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 202.740.460,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	157.896.079,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.633.997,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.710.384,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.240.460,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 83.808.198,53	$ 131.559.314,79
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.737.341,25	$ 40.897.341,25
VALOR EJECUTADO	**$ 103.545.539,78**	**$ 172.456.656,04**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.380.613,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.456.656,04
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86,06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 - Compactación de la Subbase granular.



Foto 2 - Vaciado de concreto para la huella.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

114 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

115.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

Ilustración 45 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

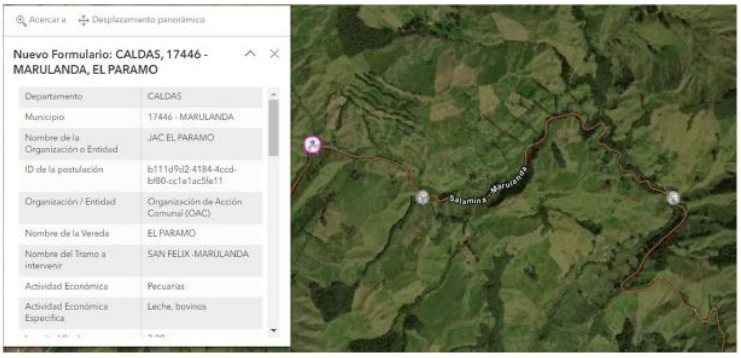

Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2
TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/5/25 28/4/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25

PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 15/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.303.349,20	30/09/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	30/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	03/10/2025	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	06/09/2024	03/10/2025

Tabla 22 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

116.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/10/25, remitió el plan de compras no. 11 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/10/25, remitió el plan de compras no. 12 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió el plan de compras no. 13 para revisión y aprobación.
- Se realizaron comités operativos no. 9 (6/10/25) y 10 (9/10/25).

116.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 39,6 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 28,4 ml, cantidad ejecutada: 14,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 18,5 ml, cantidad ejecutada: 10,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 28,4ml, cantidad ejecutada: 921,6 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 93,6 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 91,1 ml, cantidad ejecutada: 44,25 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 54,4 ml, cantidad ejecutada: 15,63 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 91,1ml, cantidad ejecutada: 2509,5 Kg.

116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este convenio.

116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.380.613,00
Ejecutado	33%	86,06%	172.456.656,04
Avance / Retraso	**-67%**	**-13,94%**	**27.923.956,96**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,28	5,28
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	39%	137,53	54
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	95%	29%	98,38	30,08
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	95%	12%	36,98	4,85
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	95%	33%	4545,9	1587,9

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 2.1.

117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 2.3.

117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1041–2922 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 2.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Julián Sánchez
Contador	Andrés Felipe Quinceno
Maestro de Obra	Dorian Mauricio García Arenas

Tabla 23 Personal Convenio Solidario

117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 33.362.571,00 de fecha 08/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 7.186.062,00 de fecha 21/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.124.886,00 de fecha 21/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 9.316.793,04 de fecha 25/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 14.521.902 de fecha 2/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 805.131 de fecha 2/09/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.529.265 de fecha 09/09/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 754.810 de fecha 08/09/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 63.984.334.59 de fecha 24/09/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 6.586.514,33 de fecha 7/10/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 4.420.000 de fecha 7/10/2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 19.414.982,76 de fecha 20/10/2025
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 4.791.058 de fecha 23/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 178.798.309,72 correspondiente al 88,72% del valor del convenio. Ver anexo 2.5.

117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 2.6.

117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 2.7.

117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**53 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**48%**
Capitulo 1. Construcción Placas Huellas	**53 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**48%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	12,67 días	vie 1/08/25	sáb 16/08/25	100%	68%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	100%	43%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	40,89 días	jue 14/08/25	vie 3/10/25	100%	40%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	100%	52%

117.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $200.380.613,00; la Inversión Ejecutada fue de $172.456.656,04. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $27.923.956,96.

117.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

117.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

118.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1418-4090 de fecha 3/10/25, remitió a la JAC no conformidades del proyecto
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1441-4169 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1521-4564 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.

118.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 10 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 9 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 17 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 20 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 13 con presencia de JAC vereda El Páramo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 93,6 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 91,1 ml, cantidad ejecutada: 44,25 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 54,4 ml, cantidad ejecutada: 15,63 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 91,1ml, cantidad ejecutada: 2509,5 Kg.

118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a septiembre 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del mes de septiembre 2025

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 30 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 86,06% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 5,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 93,6 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 91,1 ml, cantidad ejecutada: 44,25 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 54,4 ml, cantidad ejecutada: 15,63 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 91,1ml, cantidad ejecutada: 2509,5 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $172.456.656,04 correspondiente al 86,06% del valor del convenio.

120 ANEXO

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

120.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	322
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	323
1	**INTRODUCCION**		325
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		327
2.1	Localización		327
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		328
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		329
2.4	Características técnicas del proyecto		329
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		329
3.1	Información general del contrato		329
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		330
3.3	Seguimiento Items no previstos		332
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		332
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		333
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	575
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	590
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	592
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	594
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	596
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	598
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	584
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		335
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		335
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	335
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		335
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		337
7	**Conclusiones y recomendaciones**		337
8	**Anexos**		337
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		600
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		602

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARICIRI

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA REINICIO 01:	11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	27/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	405,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 32.806.482,88	$ 124.689.368,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.342.608,00	$ 47.917.200,00
VALOR EJECUTADO	**$ 56.649.090,88**	**$ 177.106.568,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.904.363,63
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 177.106.568,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	88,15%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Instalación de formaleta para la placa huella y armado de vigas riostras

VEREDA SARCIRÍ

Foto 2 Vaciado de concreto ciclópeo para la contra huella

VEREDA SARCIRÍ

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

121 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

122.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

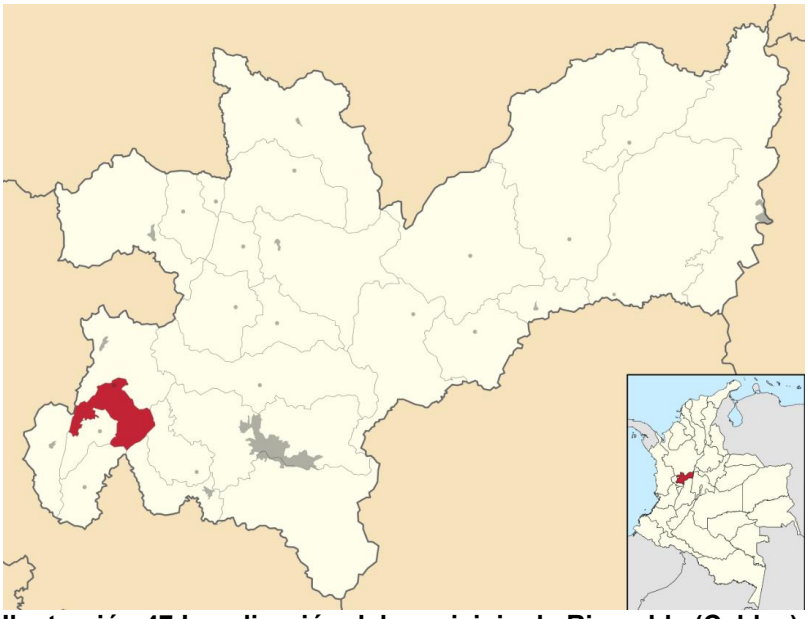

Ilustración 47 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

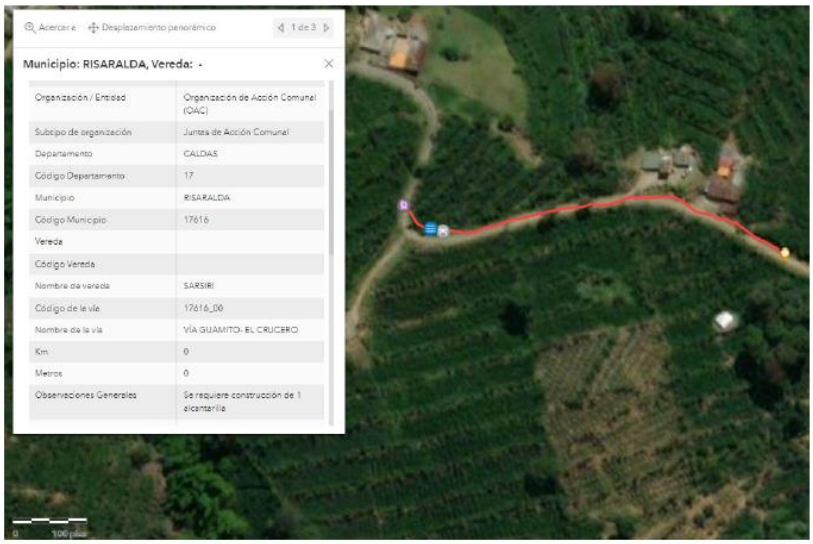

Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE

VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.368.991,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 24 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

123.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió el plan de compras no. 14 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente al plan de compras no. 13.
- Se realizó comité operativo no. 16 (3/10/25).
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/10/25, remitió el plan de compras no. 15.

123.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 27,1 ml, cantidad ejecutada: 17,84 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 39,1 ml, cantidad ejecutada: 26,61 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 39,1 ml, cantidad ejecutada: 7,52 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 39,1 ml, cantidad ejecutada: 1180,26 Kg.

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 103,6 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 84,96 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 23,9 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 4532,92 Kg.

123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.904.363,63
Ejecutado	100%	88,15%	177.106.568,00
Avance / Retraso	**0%**	**-11,85%**	**- 23.797.795,63**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	91%	100%	40,89	44,93
2	Subbase Granular Clase C	M3	53%	35%	78,13	52,09
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	40%	23%	42,76	24,91

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	35%	15%	8,93	3,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45%	24%	2088,33	1124,6
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	100%	100%	44,93	44,93
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	95%	58%	140,05	85,76
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	94%	55%	100,48	58,35
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	93%	64%	23,73	16,36
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	98%	72%	4547,91	3352,66
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	0	0

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 3.1

124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 3.3

124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–674–1760 y CINP–555–948–2708 de fechas 2 de mayo de 2025 y 9 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	Carlos Adelmo Sanchez

Tabla 25 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 3.4

124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 43.015.972 de fecha 17/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 3.084.492 de fecha 18/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.163.233,00 de fecha 23/07/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.320.500 de fecha 10/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 21.811.362,41 de fecha 1/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 2.324.108 de fecha 25/08/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 7.987.167 de fecha 4/09/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 9.394.200 de fecha 05/09/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 415.730 de fecha 08/09/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 7.028.860 de fecha 10/09/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 26.598.159 de fecha 25/09/2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 7.028.860 de fecha 7/10/2025
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 4.500.000 de fecha 7/10/2025
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 6.952.300 de fecha 7/10/2025
15. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 415.730 de fecha 7/10/2025
16. Desembolso 16 aprobado por valor de $21.247.003 de fecha 20/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 175.287.646,41 correspondiente al 86,69% del valor del convenio. Ver anexo 3.5

124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 3.6

124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 3.7

124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, Prórroga No. 1, suspensión No. 2, Ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Programado	% completado
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	**60 días**	**lun 14/07/25**	**vie 3/10/25**		**100%**	**100%**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	**60 días**	**lun 14/07/25**	**vie 3/10/25**		**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	35 días	lun 14/07/25	vie 29/08/25		100%	100%
Subbase Granular Clase C	60 días	lun 14/07/25	vie 3/10/25		100%	100%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	47 días	jue 31/07/25	vie 3/10/25		100%	100%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	43 días	mié 6/08/25	vie 3/10/25		100%	100%
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	47 días	mar 29/07/2	mié 1/10/25		100%	100%

124.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $200.904.363,63; la Inversión Ejecutada fue de $177.106.568,00 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de$23.797.795,63

124.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

124.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

125.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1428-4156 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1469-4216 de fecha 10/10/25 remitió nuevamente al INVIAS la documentación ambiental que ya había sido radicada.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1478-4303 de fecha 17/10/25, remitió una solicitud socioambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1505-4487 de fecha 27/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación para el cierre socioambiental.

125.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 15 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 16 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 30 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 17 con presencia de JAC vereda Sarciri, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 103,6 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 84,96 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 23,9 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 4532,92 Kg.

125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a julio 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de los extractos bancarios pendientes y del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 14 de julio de 2025.
- Obra finalizada el 20 de octubre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 88,15% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 103,6 m3 Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 84,96 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 23,9 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 175,1 ml, cantidad ejecutada: 4532,92 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $177.106.568,00 correspondiente al 88,15% del valor del convenio.

127 ANEXO

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 3.8

127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

127.4 BITÁCORA

Ver anexo 3.9.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	340
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	341
1	**INTRODUCCION**		343
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		345
2.1	Localización		345
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		346
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		346
2.4	Características técnicas del proyecto		347
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		347
3.1	Información general del contrato		347
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		349
3.3	Seguimiento Items no previstos		349
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		350
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		350
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		352
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		352
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	352
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		352
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		353
7	**Conclusiones y recomendaciones**		353
8	**Anexos**		354
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2187-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN : 30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03: 18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 333.00

VALOR INICIAL : $ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 202.034.766,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	181,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.483.797,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.534.766,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	-	148.074.995,72
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	44.827.279,49
VALOR EJECUTADO	-	**197.446.789,21**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.259.043,18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 197.446.789,21
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,09%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025

FOTO 3 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

128 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

129.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.

Ilustración 49 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

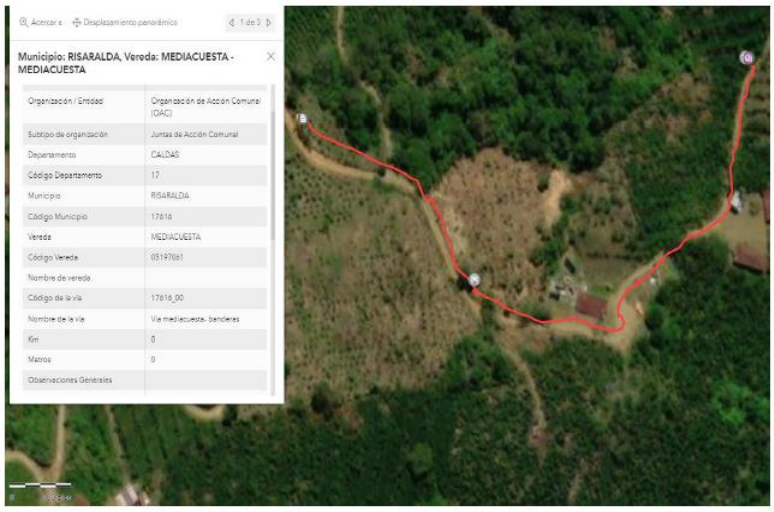

Ilustración 50 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

Ilustración 51 Estado inicial del sector

129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9

TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HSTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			

Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Tabla 26 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

130.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

130.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	199.259.043,18
Ejecutado	100%	99,1%	197.446.789,21
Avance / Retraso	**0%**	**- 0,9%**	**-1.812.253,97**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	4,48
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	135,70	116,96
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	100,35	86,49
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	31,41	27,07
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.949,68	4.266,02

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 41.980.856 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.021.533 de fecha 04/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.403.163 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 609.000 de fecha 14/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.221.018 de fecha 14/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.778.860 de fecha 24/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 13.843.532 de fecha 12/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 35.512.326,96 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.824.512,57 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 13.083.737,50 de fecha 24/04/2025.
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 2.919.645,10 de fecha 06/05/2025.
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 8.650.649,00 de fecha 13/05/2025.
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 8.616.844,27 de fecha 22/05/2025.
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 25.784.300 de fecha 10/06/2025.
15. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 7.259.181 de fecha 16/09/2025.
16. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 196.139 de fecha 20/10/2025.

Desembolso Total por valor de $ 194.705.296,46 correspondiente al 97,09% del valor del convenio.

131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la prórroga No. 2, suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 y prórroga No. 3.

131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%

131.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de 199.259.043,18; la Inversión Ejecutada fue de 197.446.789,21 que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de 1.812.253,97.

131.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4.

131.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6.

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

132.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

132.1.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23 de mayo de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,1% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.446.789,21 correspondiente al 99,1% del valor del convenio.

134 ANEXO

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

134.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	356
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	357
1	**INTRODUCCION**		359
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		361
2.1	Localización		361
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		362
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		363
2.4	Características técnicas del proyecto		363
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		363
3.1	Información general del contrato		363
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		365
3.3	Seguimiento Items no previstos		366
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		366
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		367
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	617
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	633
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	635
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	637
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	639
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	641
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	626
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		369
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		369
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	369
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		370
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		371
7	**Conclusiones y recomendaciones**		371
8	**Anexos**		372
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		643
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		645

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRÓRROGA 1:	28/05/2025
PLAZO PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 04	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 04	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	408,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.901.649,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.901.649,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.540.859,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.316.469,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.401.649,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 60.309.089,33	$ 129.156.726,75
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.848.591,25	$ 43.236.091,25
VALOR EJECUTADO	**$ 80.157.680,58**	**$ 172.392.818,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.358.645,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.392.818,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86,46%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

FOTO 1 - Fundida de las vigas riostras

FOTO 2 - Vaciado de concreto para las huellas

FOTO 3 -Estado general de la placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

135 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 4 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

136.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.

Ilustración 52 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

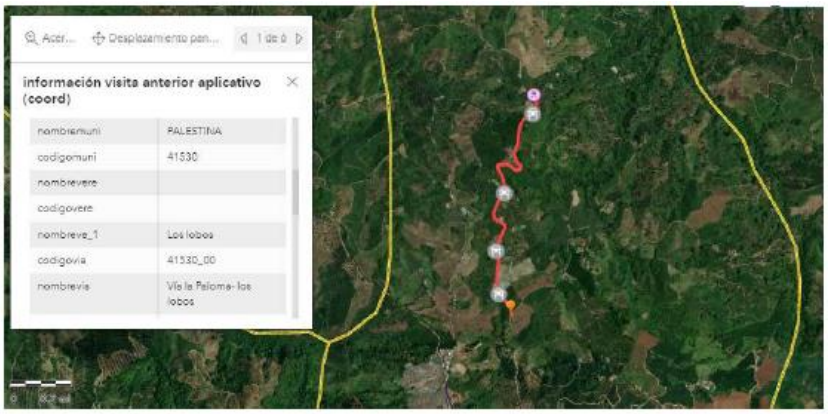

Ilustración 53 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 54 Estado inicial

136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS

NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 4	HASTA EL 15/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza	

de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.104.810,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 27 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

137.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/10/25, remitió el contrato del ingeniero residente.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió el plan de compras no. 11 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 18.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió el plan de compras no. 12 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a la OPC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 19 corregida.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/10/25, remitió la carta de terminación del contrato del ingeniero residente.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 29/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 21.

137.2.2 Actividades Técnicas

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 5,55 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 47,62 ml, cantidad ejecutada: 24,18 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 105,75 ml, cantidad ejecutada: 20,01 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 47,62 ml, cantidad ejecutada: 808,78 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 57,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 140,75 ml, cantidad ejecutada: 37,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 2039,9 Kg.

137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.358.645,00
Ejecutado	81%	86,25%	172.392.818,00

Avance / Retraso	**-19%**	**-13,75%**	**25.965.827,00**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,58	4,58
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	110,76	113,1
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	84%	68,16	57,4
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	88%	42,6	37,62
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	50%	4095	2039,9

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 4.1

138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 4.3

138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1046–2927 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Claudia Ceballos
Contador	Maritza Pineda Torres
Maestro de Obra	Luis Eduardo Hincapié

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 4.4

138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 7.799.866,00 de fecha 14/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.765.678,00 de fecha 19/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 1.642.644,00 de fecha 21/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 280.000 de fecha 21/08/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 3.017.477 de fecha 26/08/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 25.959.333 de fecha 26/08/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 10.540.300 de fecha 26/08/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.994.684 de fecha 29/08/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 15.505.152 de fecha 05/09/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 6.164.520 de fecha 05/09/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 2.676.244 de fecha 08/09/2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 1.770.000 de fecha 11/09/2025
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 9.158.000 de fecha 15/09/2025
14. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 13.758.755 de fecha 23/09/2025
15. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 14.522.250 de fecha 1/10/2025
16. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 6.889.801 de fecha 17/10/2025
17. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 605.784,30 de fecha 20/10/2025
18. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 12.867.099 de fecha 24/10/2025
19. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 4.082.771 de fecha 24/10/2025
20. Desembolso 20 aprobado por valor de $ 9.807.460 de fecha 30/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 166.807.818,3 correspondiente al 83,59% del valor del convenio. Ver anexo 4.5.

138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 5.5

138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 4.6

138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, prórroga no. 1, suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
CONVENIO 3169-2024	**59,5 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**81%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**59 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**81%**
Excavaciones varias sin Clasificar	13 días	lun 28/07/25	lun 11/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	36 días	vie 1/08/25	jue 11/09/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	41 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	100%	84%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	40 días	vie 8/08/25	lun 22/09/25	100%	88%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	mar 29/07/25	jue 18/09/25	100%	50%

138.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.358.645,00; la Inversión Ejecutada fue de $172.392.818,00, que fue lo que físicamente se pudo ejecutar. Es decir, el proyecto presenta un excedente financiero por valor de $25.965.827,00

138.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

138.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

139.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1425-4136 de fecha 7/10/25, remitió la aprobación de la hoja de vida del ingeniero presentado por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1427-4155 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1518-4561 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.

139.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 10 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 13 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 21 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 14 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

El día 23 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 15 con presencia de JAC vereda Los Lobos, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago.

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 57,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 140,75 ml, cantidad ejecutada: 37,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 2039,9 Kg.

139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a julio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 81% e Inversión de 86,25% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4,58 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 57,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 140,75 ml, cantidad ejecutada: 37,62 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 128,12 ml, cantidad ejecutada: 2039,9 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $172.392.818,00 correspondiente al 86,25% del valor del convenio.

141 ANEXO

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 4.7

141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

141.4 BITÁCORA

Ver anexo 4.8

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.		FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	374
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	375
1	**INTRODUCCION**		377
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		379
2.1	Localización		379
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		380
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		380
2.4	Características técnicas del proyecto		381
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		381
3.1	Información general del contrato		381
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		382
3.3	Seguimiento Items no previstos		384
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		384
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		385
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	709
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	725
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	727
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	729
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	731
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	733
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	718
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		386
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		386
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	386
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		387
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		388
7	**Conclusiones y recomendaciones**		388
8	**Anexos**		389
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		735
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		737

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 01	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 01	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	396,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.205.858,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.205.858,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.993.502,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.132.974,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.705.858,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 91.737.035,84	$ 128.616.050,98
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.848.591,25	$ 36.219.841,25
VALOR EJECUTADO	**$ 111.585.627,09**	**$ 164.835.892,23**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.824.962,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 164.835.892,23
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	82,91%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

Foto 1 Estado general de la placa huella

Foto 2 Armado de acero para las huellas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

142 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No.1 suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

143.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

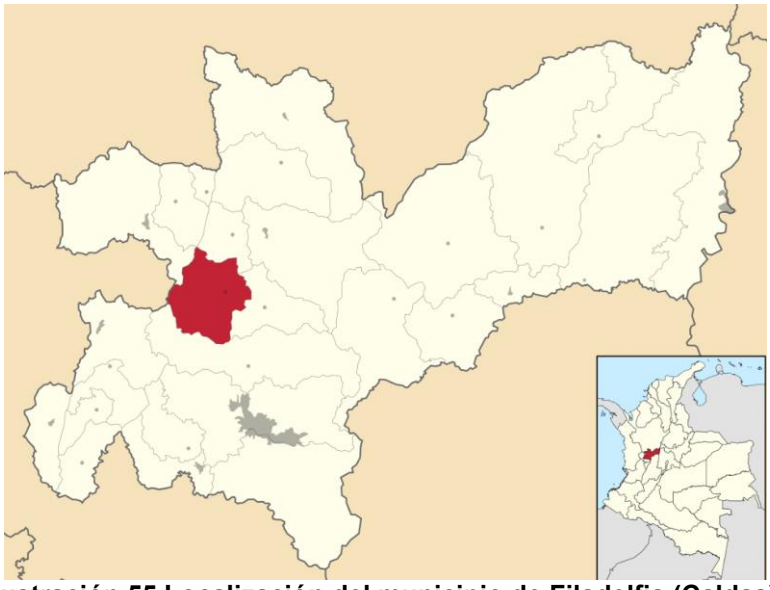

Ilustración 55 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

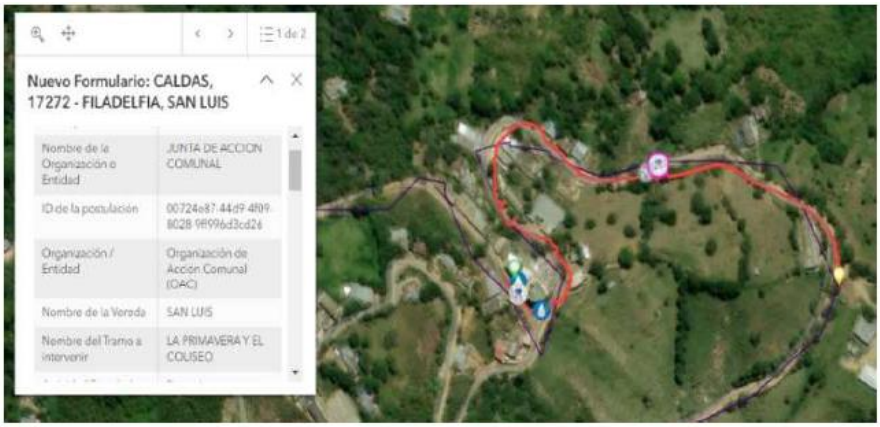

Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/9/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 15/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.147.254,00	30/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	30/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 29 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

144.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión y aprobación.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió la nómina electrónica de septiembre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos de febrero a septiembre 2025.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió el plan de compras no. 8 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió los exámenes médicos del nuevo personal.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/10/25, remitió el plan de compras No. 10.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 10.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 11.

144.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 20 ml, cantidad ejecutada: 12,3 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 18,69 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 6,25 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 1066 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 38,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2734 Kg.

144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.824.962,46
Ejecutado	49%	82,91%	164.835.892,23
Avance / Retraso	**-51%**	**-17,09%**	**33.989.070,23**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,77	5,77
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	67%	150,5	100,8
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	100%	25%	111,29	27,8

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	31%	42,6	13,01
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	33%	5139,84,05	1705

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 5.1.

145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 5.3.

145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1060–2975 de fecha 28 de julio de 2025. Ver Anexo 5.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jerson Castañeda
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Javier Ramírez

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 6.026.160,00 de fecha 21/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 46.625.589,79 de fecha 27/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.532.264 de fecha 04/09/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 7.641.750 de fecha 11/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 7.028.860 de fecha 23/09/2025

6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 10.070.329 de fecha 1/10/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 42.855.750,78 de fecha 1/10/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 10.730.860 de fecha 8/10/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 151.654 de fecha 22/10/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 18.682.673,67 de fecha 28/10/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 2.490.000 de fecha 28/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 164.835.891,24 correspondiente al 82,43% del valor del convenio.. Ver Anexo 5.5.

145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 5.6.

145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 5.7.

145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, prórroga no. 1, suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Progrmado	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**38,33 días**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**49%**
Capitulo 1. Construcción Placas Huellas	**38,33 días**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**49%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	14,11 días	mié 20/08/25	vie 5/09/25	100%	75%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	27,22 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	35%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	24,22 días	jue 4/09/25	vie 3/10/25	100%	42%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	27,22 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	53%

145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.824.962,46; la Inversión Ejecutada fue de $164.835.892,23. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $33.989.070,23

145.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

145.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

146.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1429-4157 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1445-4178 de fecha 9/10/25, remitió la aprobación a la hoja de vida del contador presentado por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1470-4217 de fecha 10/10/25 remitió nuevamente al INVIAS la documentación ambiental que ya había sido radicada.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1512-4533 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC solicitud sst.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1519-4562 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.

146.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soportes

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 10 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de póliza. Compromisos: Entregar soportes

El día 21 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia de JAC vereda San Luis, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 38,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2734 Kg.

146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a septiembre 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de

los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 82,91% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 5,77 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 113,1 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 38,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 18 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2734 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $164.835.892,23 correspondiente al 82,91% del valor del convenio.

148 ANEXO

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 5.8.

148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

148.4 BITÁCORA

Ver anexo 5.9.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	391
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	392
1	**INTRODUCCION**		394
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		396
2.1	Localización		396
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		397
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		398
2.4	Características técnicas del proyecto		398
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		398
3.1	Información general del contrato		398
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		399
3.3	Seguimiento Items no previstos		401
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		401
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		402
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	745
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	761
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	763
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	764
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	766
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	768
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	754
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		403
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		403
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	405
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		405
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		407
7	**Conclusiones y recomendaciones**		407
8	**Anexos**		407
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		770
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		772

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 01	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 01	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	394,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.939.311,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.939.311,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.661.171,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.639.835,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.138.305,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.439.311,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 105.290.103,09	$ 132.326.983,32
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.404.826,50	$ 35.286.076,50
VALOR EJECUTADO	**$ 124.694.929,59**	**$ 167.613.059,82**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.311.814,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 167.613.059,82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	84,10%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Fundida de cunetas y bordillos

FOTO 2 Instalación de formaleta y armado de acero para las huellas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

149 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

150.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.

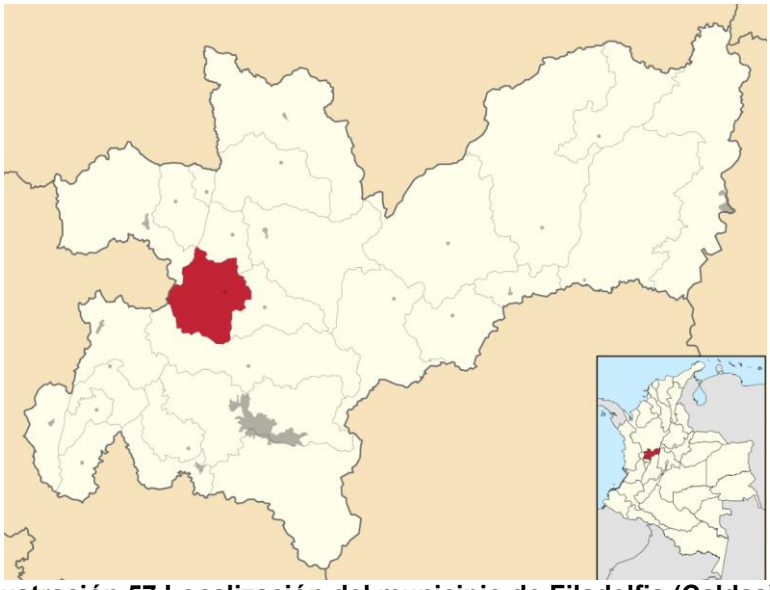

Ilustración 57 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

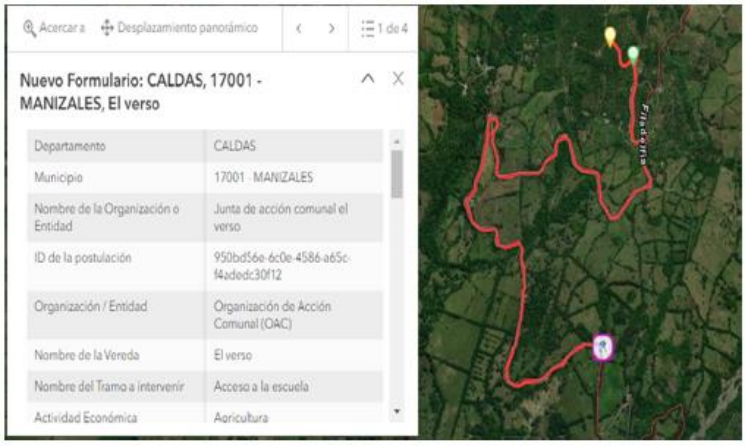

Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1
TELÉFONO:	3193164956
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No.1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No.2	HASTA EL 2/10/25
PRÓRROGA No.3	HASTA EL 15/11/25
FECHA · DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.194.971,20	02/10/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	02/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	03/10/2024	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	03/10/2025

Tabla 31 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia

151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

151.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/10/25, remitió el presupuesto ajustado del cárcamo para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/10/25, remitió respuesta a solicitud ambiental.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió la corrección de la liquidación del desembolso no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/10/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1 pt2, correspondiente a la subsanación de impuestos pendientes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió el plan de compras no. 7 y 8 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 10.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/10/25, remitió los documentos faltantes en las cotizaciones.

151.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 43,4 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 50,8 ml, cantidad ejecutada: 21,8 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 4,86 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 50,8 ml, cantidad ejecutada: 700,82 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 115 ml, cantidad ejecutada: 83,65 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 28,71 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 9,72 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 1052,72 Kg.

151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	199.311.814,00
Ejecutado	51%	84,1%	167.613.059,82
Avance / Retraso	**-49%**	**-15,9%**	**31.698.754,18**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,28	3,28

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	59%	141,73	83,65
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	42%	67,89	28,71
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	52%	18,59	9,72
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	33%	3223,93	1052,72
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	100%	100%	82,5	82,5
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	100%	100%	9,2	9,2
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	100%	0%	0,9	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	0%	19,1	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	11%	1157,8	128,51
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	100%	100%	7	7
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	100%	0%	38,6	0

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 6.1.

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 6.3.

152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1040–2921 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 6.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Oxfaro Bustamante
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Giraldo Rios

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta le fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 42.280.919 de fecha 04/09/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 16.074.681 de fecha 18/09/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 608.735,03 de fecha 09/09/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 1.593.603 de fecha 11/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.019.009 de fecha 25/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 66.761.896,88 de fecha 02/10/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.461.425.000 de fecha 10/10/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 10.735.600,28 de fecha 20/10/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 9.867.936 de fecha 24/10/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 7.209.254 de fecha 28/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 167.613.059,19 correspondiente al 83,62% del valor del convenio. Ver Anexo 6.5.

152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 6.6.

152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 6.7.

152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
PROYECTO PLACA HUELLAS EL VERSO	**39 días?**	**lun 18/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**51%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**38 días**	**mar 19/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**51%**
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	10 días	mar 19/08/25	vie 29/08/25	100%	100%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	24 días	lun 1/09/25	mar 30/09/25	100%	59%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) -MEZCLA INSITU PARA PLACA HUELLA	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	42%
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14 MPA (F) 60% CONCRETO -40% PIEDRA PARA PLACA HUELLA	27 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	52%
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4200 KG/CM2 (60000 PSI)	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	33%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	**38 días?**	**mar 19/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**48%**
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	10 días	mar 19/08/25	vie 29/08/25	100%	100%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	22 días	mar 19/08/25	lun 15/09/25	100%	100%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (CLASE F) -MEZCLA INSITU	12 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25	100%	0%
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) -MEZCLA INSITU PARA PLACA HUELLA	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	0%
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4200 KG/CM2 (60000 PSI)	28 días	lun 1/09/25	vie 3/10/25	100%	11%
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	12 días	lun 1/09/25	lun 15/09/25	100%	100%

152.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $199.311.814,00; la Inversión Ejecutada fue de $167.613.059,82. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de $31.698.754,18

152.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

152.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

153.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1430-4158 de fecha 8/10/25, remitió a la JAC solicitud ambiental.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1475-4268 de fecha 15/10/25 remitió al INVIAS el plan de gestión ambiental de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1476-4269 de fecha 15/10/25 remitió los resultados de los ensayos para respuesta de la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1520-4563 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.

153.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia de JAC vereda El Verso, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia de JAC vereda El Verso, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de póliza. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 24 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 13 con presencia de JAC vereda El Verso, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de OPC. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 115 ml, cantidad ejecutada: 83,65 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 28,71 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 9,72 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 1052,72 Kg.

.

153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Septiembre 2025, se encuentra a la espera de los soportes del giro al Tesoro Nacional.

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 84,1% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3,28 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 115 ml, cantidad ejecutada: 83,65 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 28,71 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 9,72 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 76,4 ml, cantidad ejecutada: 1052,72 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $167.613.059,82 correspondiente al 84,1% del valor del convenio.

155 ANEXO

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 6.8.

155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

155.4 BITÁCORA

Ver anexo 6.9.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	408
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCION**		410
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		411
2.1	Localización		411
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		412
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		412
2.4	Características técnicas del proyecto		413
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		413
3.1	Información general del contrato		413
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		414
3.3	Seguimiento Items no previstos		414
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		414
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		415
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		416
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		416
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	416
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		416
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		417
7	**Conclusiones y recomendaciones**		417
8	**Anexos**		417
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

156 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

157.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.

Ilustración 59 Localización del municipio de Supía (Caldas).

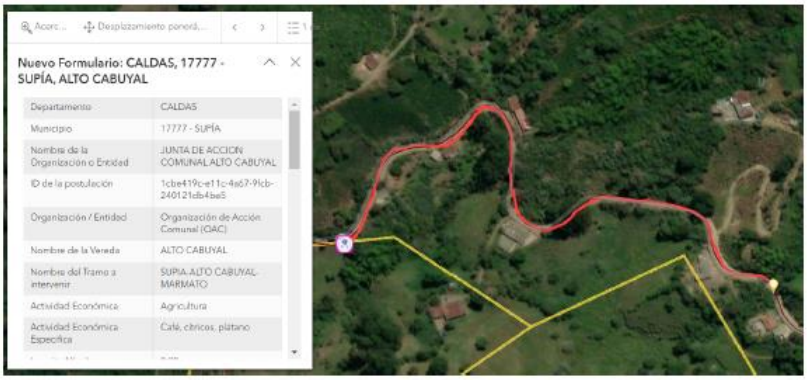

Ilustración 60 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	VENCIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 33 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

158.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

158.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se vencido.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3622 de 2024.

159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

159.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

159.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

159.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

160.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

160.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Julio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte del presente informe, el Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación conforme a la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, fue el 02/03/25.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025.
- Que EL INSTITUTO a pesar de saber que el OAC no tenía ningún interés en continuar con la ejecución del Convenio Solidario No. 3622 de 2024, al no prorrogar la suspensión No. 1, procedió a realizar el giro de los recursos.
- A la fecha de corte de este informe, EL INSTITUTO no ha indicado como se va a proceder con este convenio que está vencido, no hubo ejecución de las obras contempladas en dicho convenio y tiene los recursos en la cuenta corriente, solicitud que realizó la Interventoría a través del oficio CINP-555-475-0948 del 4 de marzo de 2025.

162 ANEXO

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 13.2

162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

162.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	421
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	422
1	**INTRODUCCION**		424
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		426
2.1	Localización		426
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		427
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		427
2.4	Características técnicas del proyecto		428
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		428
3.1	Información general del contrato		428
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		429
3.3	Seguimiento Items no previstos		431
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		431
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		432
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	798
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	814
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	816
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	818
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	820
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	822
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	807
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		433
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		433
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	433
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		434
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		435
7	**Conclusiones y recomendaciones**		435
8	**Anexos**		436
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		824
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		826

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02:	29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 0	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 01	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 01	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	365,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.461.661,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.461.661,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.399.467,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.990.118,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.961.661,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 61.871.243,50	$ 107.031.761,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.848.591,25	$ 36.219.841,25
VALOR EJECUTADO	**$ 81.719.834,75**	**$ 143.251.602,25**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.868.904,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 143.251.602,25
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	72,03%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Armado de acero para las huellas y vigas riostras

Foto 2 Fundida de las huellas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

163 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

164.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

Ilustración 61 Localización del municipio de Supía(Caldas).

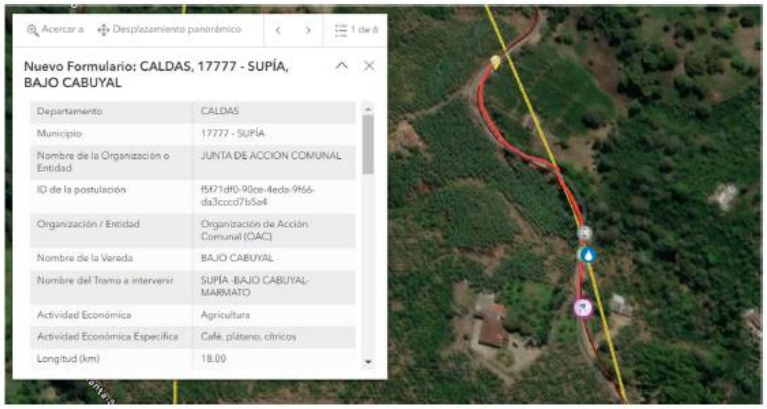

Ilustración 62 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25

AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 15/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.146.474,00	30/10/2024	03/10/2026
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	30/10/2024	03/10/2028
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	03/10/2025	03/10/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	03/10/2025

Tabla 34 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

165.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/10/25, remitió documentos de ingreso de un nuevo trabajador.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/10/25, remitió incapacidad de trabajador para conocimiento.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 20/10/25 y 22/10/25, remitió el plan de compras no. 8 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió la documentación de afiliación de los trabajadores.
- Se realizó comité operativo no. 15 (7/10/25).

165.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51,9 ml, cantidad ejecutada: 20,69 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 44,79 ml, cantidad ejecutada: 12,05 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 51,9 ml, cantidad ejecutada: 2019,82 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 150,75 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 78 ml, cantidad ejecutada: 33,22 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 18,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 2019,82 Kg.

165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.868.904,00
Ejecutado	53%	72,03%	143.251.602,25
Avance / Retraso	**47%**	**-27,97%**	**55.617.301,75**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	5,20
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	134,64	150,75
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	35%	95,36	33,22
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	44%	41,31	18,35
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	46%	4418,26	2019,82

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 7.1.

166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 8.3.

166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1049–2930 de fecha 24 de julio de 2025. Ver Anexo 7.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jaime Pardo
Contador	Elizabeth Gómez
Maestro de Obra	Guillermo Moreno

Tabla 35 Personal Convenio Solidario

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 31.415.229 de fecha 29/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 17.341.633 de fecha 29/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 5.455.933,67 de fecha 9/09/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 21.539.195,5 de fecha 12/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 35.509.981 de fecha 25/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 13.780.284,33 de fecha 9/10/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 1.836.763 de fecha 15/10/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 14.943.583 de fecha 24/10/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 802.273 de fecha 27/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 142.624.875,5 correspondiente al 71,33% del valor del convenio. Ver Anexo 7.5

166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 7.6.

166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 7.7.

166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
Placa huella	**34 días**	**mar 19/08/2**	**vie 3/10/25**	**100%**	**53%**
Excavaciones varias sin	6 días	mar 19/08/25	mar 26/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	6 días	vie 5/09/25	dom 14/09/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21	12 días	lun 15/09/25	mar 30/09/25	100%	35%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	12 días	jue 18/09/25	vie 3/10/25	100%	44%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	100%	46%

166.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.868.904,00; la Inversión Ejecutada fue de $143.251.602,25. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $55.617.301,75

166.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

166.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

167.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1420-4110 de fecha 3/10/25, remitió al INVIAS el plan de gestión ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1516-4559 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.

167.1.2 Actividades Técnicas

El día 1 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 14 con presencia de JAC vereda Bajo Cabuyal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 7 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 15 con presencia de JAC vereda Bajo Cabuyal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 17 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 16 con presencia de JAC vereda Bajo Cabuyal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 23 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 17 con presencia de JAC vereda Bajo Cabuyal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 150,75 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 78 ml, cantidad ejecutada: 33,22 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 18,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 2019,82 Kg.

.

167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de marzo a agosto de 2025, se encuentra a la espera del resto de extractos pendientes y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 72,03% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 5,2 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 160 ml, cantidad ejecutada: 150,75 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 78 ml, cantidad ejecutada: 33,22 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 18,35 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 78 ml, cantidad ejecutada: 2019,82 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $143.251.602,25correspondiente al 72,03% del valor del convenio.

169 ANEXO

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

Ver anexo 7.8.

169.4 BITÁCORA

Ver anexo 7.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	438
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	439
1	**INTRODUCCION**		441
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		443
2.1	Localización		443
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		444
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		445
2.4	Características técnicas del proyecto		445
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		445
3.1	Información general del contrato		445
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		447
3.3	Seguimiento Items no previstos		448
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		448
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		449
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	851
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	867
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	869
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	871
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	873
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	875
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	860
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		450
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		450
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	451
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		452
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		453
7	**Conclusiones y recomendaciones**		453
8	**Anexos**		454
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		877
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		879

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	27/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	361,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.282.005,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.282.005,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	165.747.623,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.466.486,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.782.005,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 87.413.704,09	$ 151.226.790,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.040.000,00	$ 4.040.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 23.346.455,00	$ 42.056.455,00
VALOR EJECUTADO	**$ 114.800.159,09**	**$ 197.323.245,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.829.659,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.323.245,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	99,74%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Vaciado de concreto para la cuneta y bordillos

Foto 2 Estado General de la Placa Huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

170 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

171.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

Ilustración 63 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

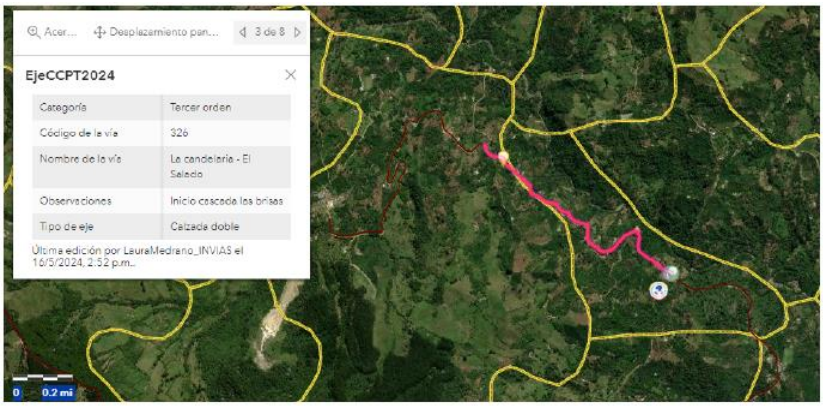

Ilustración 64 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 65 Estado inicial de la vía

171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL

	DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 23/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 30/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS		
CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740		
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.046.067,20	02/10/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	02/10/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	30/05/2025

Tabla 36 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

172.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió el desembolso correspondiente al plan de compras no. 6.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, el plan de compras correspondiente a la OPC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió el plan de compras no. 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente al plan de compras no. 9.

172.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 20 ml, cantidad ejecutada: 27,15 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 40,4 ml, cantidad ejecutada: 28,46 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada:40,4 ml, cantidad ejecutada: 6,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 67,4 ml, cantidad ejecutada: 2249,6 Kg.

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,95 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 62,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 18,2 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3736,2 Kg.

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente avance

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.829.659,00
Ejecutado	100%	99,74%	197.323.245,00
Avance / Retraso	**0%**	**-0,26%**	**506.414,00**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,5	4,5
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	79,95
797,6	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	98,85	62,4
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	18,2
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4207,56	3736,2

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 8.1.

173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 8.3.

173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–768-2067 de fecha 20 de mayo de 2025. Ver Anexo 8.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Giancarlo Velásquez
Contador	Ana Bañol

Tabla 37 Personal Convenio Solidario

173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 1 aprobado por valor de $ 54.808.487 de fecha 2/09/2025
2. Desembolso 2 aprobado por valor de $ 68.237.325 de fecha 18/09/2025
3. Desembolso 3 aprobado por valor de $ 12.061.100 de fecha 12/09/2025
4. Desembolso 4 aprobado por valor de $ 9.970.326 de fecha 24/09/2025
5. Desembolso 5 aprobado por valor de $ 25.405.360 de fecha 7/10/2025
6. Desembolso 6 aprobado por valor de $ 14.212.870 de fecha 7/10/2025
7. Desembolso 7 aprobado por valor de $ 309.617 de fecha 20/10/2025
8. Desembolso 8 aprobado por valor de $ 4.040.000 de fecha 21/10/2025
9. Desembolso 9 aprobado por valor de $12.436.159 de fecha 29/10/2025

Desembolso Total por valor de $197.323.245 correspondiente al 99,18% del valor del convenio. Ver Anexo 8.5.

173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 8.6.

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 8.7.

173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
ETAPA EJECUCION	**57,44 días**	**lun 11/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	5 días	lun 11/08/25	vie 15/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	vie 15/08/25	jue 4/09/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (clase D) -	15 días	jue 4/09/25	mar 23/09/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60%	12 días	jue 18/09/25	vie 3/10/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	15 días	jue 4/09/25	mar 23/09/25	100%	100%

173.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $197.829.659,00; la Inversión Ejecutada fue de $197.323.245,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $506.414,00

173.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

173.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

174.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1480-4305 de fecha 17/10/25, remitió una solicitud socioambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1507-4489 de fecha 27/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación para el cierre socioambiental.

174.1.2 Actividades Técnicas

En el mes de agosto, se realizaron Comités Operativos con el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña así:

El día 1 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 8 con presencia de el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 9 con presencia de el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 14 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 10 con presencia de el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia de el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de póliza. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 24 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia de el Resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,95 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 62,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 18,2 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3736,2 Kg.

174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

La Interventoría recibió el extracto bancario de los meses de Febrero a Mayo, Julio y septiembre de 2025, se encuentra a la espera de los extractos pendientes y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 11 de agosto de 2025.
- Obra finalizada el 24 de octubre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99,74% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,95 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud

ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 62,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 18,2 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3736,2 Kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $197.323.245,00 correspondiente al 99,74% del valor del convenio.

176 ANEXO

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 8.8.

176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

176.4 BITÁCORA

Ver Anexo 8.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	456
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	457
1	**INTRODUCCION**		459
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		461
2.1	Localización		461
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		462
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		463
2.4	Características técnicas del proyecto		463
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		463
3.1	Información general del contrato		463
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		465
3.3	Seguimiento Items no previstos		466
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		466
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		468
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	893
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	909
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	911
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	913
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	915
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	917
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	4902
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		469
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		469
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	469
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		470
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		471
7	**Conclusiones y recomendaciones**		471
8	**Anexos**		472
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		919
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		921

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	27/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 04	28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 04	15/11/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	409,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.257.231,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.257.231,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	141.320.130,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	197.757.231,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	$ 89.100.381,50	$ 116.056.422,08
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.404.826,50	$ 42.092.326,50
VALOR EJECUTADO	**$ 108.505.208,00**	**$ 158.148.748,58**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.757.231,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 158.148.748,58
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	79,97%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Fundida de cunetas y bordillos

Foto 2 Vaciado de concreto ciclópeo para la cuneta huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

177 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 4 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

178.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

Ilustración 66 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Ilustración 67 Estado inicial de la vía

178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN NO. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
PRÓRROGA No. 4	HASTA EL 15/11/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/11/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.048.784,00	17/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	17/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 38 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

179.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió el desembolso correspondiente a la primera quincena de octubre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió la solicitud de aprobación de cárcamo y bordillo de contención.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a nómina y proveedores.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a la segunda nómina de octubre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió sugerencia con respecto al pago de las liquidaciones.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 13.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió el plan de compra no. 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió la solicitud aprobación de batea y bordillo de contención.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 29/10/25, remitió el acta aprobación de batea y bordillo de contención.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 29/10/25, remitió el plan de compras no. 10.

179.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 24,5 ml, cantidad ejecutada: 15,07 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 38,4 ml, cantidad ejecutada: 23,78 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 10,13 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 38,4 ml, cantidad ejecutada: 1120,04 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 101,1 ml, cantidad ejecutada: 63,03 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 39,98 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 10,13 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 2093,82 Kg.

179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	197.757.231,00
Ejecutado	49%	79,97%	158.148.748,58
Avance / Retraso	**-51%**	**- 20,03%**	39.608.482,42

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	34,1	34,1
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	59%	106,98	63,03
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	45%	89,3	39,98
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	51%	19,83	10,13
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	52%	4059,62	2093,82
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III,	M	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	de 900 mm de diámetro interior					

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 9.1.

180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 9.3.

180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–727–1899, CINP–555–947–2699 y CINP–555–1042–2923 de fechas 9 de mayo de 2025, 9 y 24 de julio de 2025. Ver Anexo 9.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Diego Alejandro Mejía
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Mario Uchima

Tabla 39 Personal Convenio Solidario

180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 7.670.372,00 de fecha 15/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 5.543.964 de fecha 28/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.682.000 de fecha 28/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 37.562.553,38 de fecha 4/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.752.860,00 de fecha 08/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 322.679 de fecha 08/09/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 4.619.000 de fecha 17/09/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 45.847.961.2 de fecha 25/09/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 9.862.000 de fecha 1/10/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 10.862.216 de fecha 7/10/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 1.393.296 de fecha 20/10/2025
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 11.569.588 de fecha 23/10/2025

13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 3.636.739 de fecha 28/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 158.325.229,08 correspondiente al 79,56% del valor del convenio. Ver Anexo 9.5.

180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 9.6.

180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 9.6.

180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	**48 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**49%**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	**48 días**	**mié 30/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**49%**
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	mié 30/07/25	mié 6/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 11/08/25	vie 29/08/25	100%	59%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	28 días	jue 28/08/25	lun 6/10/25	100%	45%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	38,1 días	jue 14/08/25	mar 7/10/25	100%	51%
Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 21/08/25	mié 1/10/25	100%	52%

180.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $197.757.231,00; la Inversión Ejecutada fue de $158.148.748,58. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $39.608.482,42.

180.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 12.4

180.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 12.6

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

181.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1486-4392 de fecha 21/10/25, remitió a la JAC una solicitud sst.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1517-4560 de fecha 28/10/25, remitió a la JAC la notificación de un presunto incumplimiento.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1523-4568 de fecha 29/10/25, remitió a la JAC la no objeción a la memoria de cálculo.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1524-4569 de fecha 29/10/25, remitió al INVIAS la los documentos aprobados de la JAC, referentes a la memoria de la batea y bordillo de contención.

181.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 14 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 15 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de póliza. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 21 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 16 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 24 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 17 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de OPC. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 29 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 18 con presencia de JAC vereda Barrio 1 de mayo, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 101,1 ml, cantidad ejecutada: 63,03 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 39,98 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 10,13 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 2093,82 Kg.

181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a julio de 2025, se encuentra pendiente el extracto del mes de agosto 2025, y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 30 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 79,97% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 34,1 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 101,1 ml, cantidad ejecutada: 63,03 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 39,98 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 10,13 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 83,3 ml, cantidad ejecutada: 2093,82 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $158.148.748,58 correspondiente al 79,97% del valor del convenio.

183 ANEXO

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 9.8.

183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

183.4 BITÁCORA

Ver Anexo 9.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	474
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	475
1	**INTRODUCCION**		477
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		479
2.1	Localización		479
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		480
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		481
2.4	Características técnicas del proyecto		481
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		481
3.1	Información general del contrato		481
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		483
3.3	Seguimiento Items no previstos		484
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		484
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		485
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	949
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	965
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	967
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	969
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	971
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	973
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	958
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		487
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		487
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	487
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		488
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		489
7	**Conclusiones y recomendaciones**		489
8	**Anexos**		490
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		975
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		977

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** oct-25

CONVENIO No.: 3286-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	3/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	2/07/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 02:	4/07/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 02	2/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 02	3/10/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA N 03	4/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N 03	27/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	405,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 74.009.381,58	$ 146.636.607,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.385.000,00	$ 4.385.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 22.848.102,00	$ 43.266.852,00
VALOR EJECUTADO	**$ 101.242.483,58**	**$ 194.288.459,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 196.865.297,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.288.459,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 Instalación de formaleta para las huellas

Foto 2 Fundida de las huellas y terminado en espina de pescado

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

184 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

185.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

Ilustración 68 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

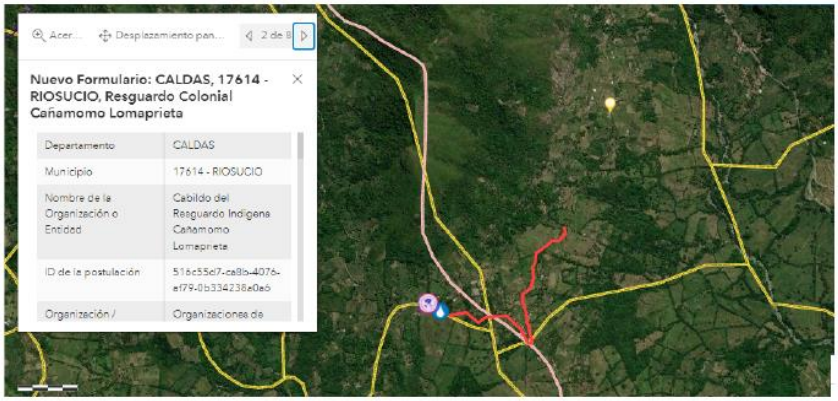

Ilustración 69 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04
TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	TERMINADO
FECHA DE INICIO:	17/09/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 3			
Cumplimiento	$19.953.377,00	17/09/2026	30/05/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	17/09/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	30/05/2025

Tabla 40 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

186.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/10/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/10/25, remitió documentación financiera para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió la solicitud de desembolso no. 9, 10 y 11.

186.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 6,15 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 31 ml, cantidad ejecutada: 14,88 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 31 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 31 ml, cantidad ejecutada: 2367,24 Kg.

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 73,8 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 57,6 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 18,27 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3043,24 Kg.

186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	196.865.297,00
Ejecutado	100%	98,69%	194.288.459,00
Avance / Retraso	**0%**	**-1,31%**	2.576.838,00

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,76	3,76
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	98,53	73,8
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	82,98	57,6
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	18,18	18,27
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3707,88	3043,24
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	100%	100%	54	54
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	100%	100%	6	6
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	100%	100%	0,5	0,5
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	9,6	9,6
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	578,9	578,9
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	100%	100%	7,5	7,5
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	100%	100%	29,1	29,1

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORME SEMANAL

Ver Anexo 10.1.

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver Anexo 10.3.

187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del CINP–555–1013–2810de fecha 16 de julio de 2025. Ver Anexo 10.4.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Sebastián Osorio
Contador	Andrea Clavijo
Maestro de obra	Jose Guerrero

Tabla 41 Personal Convenio Solidario

187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 6.055.400 de fecha 25/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 7.227.303 de fecha 25/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 50.799.797 de fecha 26/08/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.488.166 de fecha 8/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 7.570.500 de fecha 8/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 40.323.140 de fecha 9/09/2025
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 10.677.700 de fecha 10/09/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 18.197.114 de fecha 17/09/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 30.195.998 de fecha 6/10/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $12.367.310 de fecha 24/10/2025
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $4.385.000 de fecha 27/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 194.287.428 correspondiente al 98,11% del valor del convenio. Ver anexo 10.5

187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver Anexo 10.6.

187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver Anexo 10.7.

187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3286 de 2024

187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se presenta el Seguimiento al Programa de la Obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programad	% completado
CONVENIO 3286-2024	**45 días**	**lun 4/08/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**0 días**	**lun 4/08/25**	**lun 4/08/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA	**16 días**	**lun 4/08/25**	**lun 25/08/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	100%	100%
Excavaciones vrias en roca en seco	2 días	lun 11/08/25	mar 12/08/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	3 días	jue 21/08/25	lun 25/08/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	2 días	jue 21/08/25	vie 22/08/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	100%	100%
Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	2 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	100%	100%
Relleno para Estructuras con Suelo	2 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25	100%	100%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programad	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**29 días**	**mar 26/08/25**	**vie 3/10/25**	100%	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	3 días	mar 26/08/25	jue 28/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	9 días	jue 28/08/25	mar 9/09/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	19 días	mar 9/09/25	vie 3/10/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	12 días	lun 1/09/25	mar 16/09/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	16 días	jue 4/09/25	jue 25/09/25	100%	100%

187.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $196.865.297,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.288.459,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $2.576.838,00

187.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

187.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

188.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1481-4306 de fecha 17/10/25, remitió una solicitud socioambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1508-4490 de fecha 27/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación para el cierre socioambiental.

188.1.2 Actividades Técnicas

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 21 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 73,8 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 57,6 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 18,27 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3043,24 Kg.

188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de febrero a septiembre de 2025, se encuentra pendiente el extracto del mes de agosto 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra se firmó el 4 de agosto de 2025.
- Obra finalizada el 17 de octubre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,69% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3,76 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 73,8 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 57,6 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 18,27 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 3043,24 Kg..
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $194.288.459,00 correspondiente al 98,69% del valor del convenio.

190 ANEXO

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver Anexo 12.8.

190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

190.4 BITÁCORA

Ver Anexo 12.9.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	492
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N.A.
1	**INTRODUCCION**		494
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		496
2.1	Localización		496
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		497
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		498
2.4	Características técnicas del proyecto		498
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		498
3.1	Información general del contrato		498
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		500
3.3	Seguimiento Items no previstos		501
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		501
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		502
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	988
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1005
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1007
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1009
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1011
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1013
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	998
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		503
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		503
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	504
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1103
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1252
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		505
5.3	Informes especialistas y profesionales		1203
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1259
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1082
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1257
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1088
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1264
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		506
7	**Conclusiones y recomendaciones**		506
8	**Anexos**		506
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1095
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1015
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1017

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

191 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos ($532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos ($1.700.014.247).

Que, el 29 de septiembre de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 30 de septiembre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 4 del Contrato de Interventoría, por un término de veinticuatro (24) días, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2025.

Que, el 22 de octubre de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 5 del Contrato de Interventoría, quedando como nueva fecha de vencimiento el 15 de noviembre de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 11, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

192.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.

Ilustración 70 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

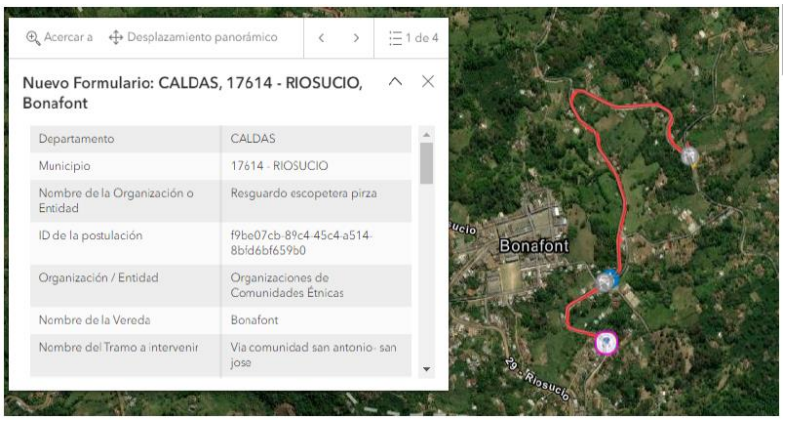

Ilustración 71 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San
Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	07/10/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 27/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.134.844,00	12/12/2024	30/05/2026
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	12/12/2024	30/05/2028
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	30/05/2025	30/05/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	30/05/2025

Tabla 42 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

193.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/10/25, remitió los documentos de pago de póliza para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 14/10/25 y 15/10/25, remitió el plan de compras no. 7 y no. 8 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/10/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a los comité no. 8 y 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/10/25, remitió el volante de la primera nómina de septiembre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/10/25, remitió el plan de compra no. 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/10/25, remitió el plan de compras correspondiente al componente social.

193.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 64,5 ml, cantidad ejecutada: 30,96 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 22,5 ml, cantidad ejecutada: 1,74 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 64,5 ml, cantidad ejecutada: 1699 Kg.

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 19,63 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4047 Kg.

193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	198.709.342,00
Ejecutado	100%	88,47%	175.790.535,40
Avance / Retraso	**0%**	**-11,53%**	22.918.806,60

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,18	4,44
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,65	95,33
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	89,59	74,4

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	20,25	19,63
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3826,47	4047

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 11.1

194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 11.3

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CINP–555–531–1156, CINP–555–765–2054 y CINP–555–952–2720 de fechas 18 de marzo de 2025, 19 de mayo de 2025 y 10 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Rubén Zabala
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Dorance Ladino

Tabla 43 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 11.4

194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 50.059.058,28 de fecha 22/08/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 34.216.827.54 de fecha 26/08/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 17.129.440,27 de fecha 11/09/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.839.026 de fecha 15/09/2025
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 7.434.862,1 de fecha 22/09/2025
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 8.215.862.1 de fecha 1/10/2025

7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 308.976 de fecha 7/10/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 51.586.483,1 de fecha 23/10/2025

Desembolso Total por valor de $ 175.790.535,39 correspondiente al 87,96% del valor del convenio. Ver anexo 11.5

194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 11.6

194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 11.7

194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

Se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la suspensión No. 2, ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 y prórroga No. 2.

194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
MEJORAMIENTO DE VIA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	**52 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
Inicio	0 días	lun 28/07/25	lun 28/07/25	100%	100%
PLACA HUELLA	**52 días**	**lun 28/07/25**	**vie 3/10/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin calsificar	5 días	lun 28/07/25	vie 1/08/25	100%	100%
Subbase clase C	11 días	sáb 2/08/25	sáb 16/08/25	100%	100%
Concreto Reforzado resistencia 21 MPA (Clase D)	34 días	lun 18/08/25	jue 2/10/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000)	34 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	100%	100%

194.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de octubre de 2025, la Inversión Programada fue de $198.709.342,00 ; la Inversión Ejecutada fue de $175.790.535,40. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $22.918.806,60

194.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 11.4

194.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 11.6

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

195.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1422-4112 de fecha 3/10/25, remitió a la JAC no conformidades del proyecto.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1479-4304 de fecha 17/10/25, remitió una solicitud socioambiental.

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1506-4488 de fecha 27/10/25, remitió a la JAC solicitud de documentación para el cierre socioambiental.

195.1.2 Actividades Técnicas

El día 14 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 11 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina y materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 15 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 12 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de póliza. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 28 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 13 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de materiales y otros. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

El día 30 de octubre de 2025, se realizó el Comité Operativo No 14 con presencia del Resguardo Escopetera Pirza, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras de nómina. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envió a pago

Teniendo en cuenta la terminación de obra, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 19,63 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4047 Kg.

195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de febrero a septiembre de 2025, se encuentra pendiente el extracto de agosto 2025 y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.
- Obra finalizada el 27 de octubre de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 88,47% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,44 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 95,33 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 74,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 19,63 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4047 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $175.790.535,40correspondiente al 88,47% del valor del convenio.

197 ANEXO

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver Anexo 12.2

197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 11.7.

197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

197.4 BITÁCORA

Ver anexo 11.8
