BOGOTÁ GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Nombre de la reunión: Mesa Verificación Inventario - Dotaciones 1790 - 2024
Fecha: 13-03-26
Lugar: Bodega LPX
Dependencia: Educación
Hora de inicio: 8:00 AM
Hora de finalización: 11:30 AM
Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Nombre del Responsable:

ITEM	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO	CARGO: ASISTENCIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: PLANTA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBR.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	CC 80730141	Jose J González	Inge	ALSC	cultura			X						X	3166229402	
2	CC 1000024061	Juan Jose Ospina	Juan	LPX											3103353170	
3	CC 1031422058	Juan Paul Pineda	Juan Paul	LPX											3021612961	
4	CC 1020472767	Luz Marcela Moreno	Maneth	ALSC	Meras Pobreza		X						X		3144155039	
5																
6																
7																
8																

BOGOTÁ GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objetivo de la reunión: Mesa de Verificación Inventario - Dotaciones 1790 - 2024
Fecha: 13-03-26
Lugar: Bodega LPX
Dependencia:
Hora de inicio: 8:00 am
Hora de finalización: 11:30 am
Modalidad: [X] Presencial [ ] Virtual [ ] Telefónica [ ] Mixta
Nombre del Responsable:

	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO / TECNÓLOGO	CARGO: ASISTENCIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROFESIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBR.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1136888156	Edward Martinez	Edward	Cpx	Cpx										3115740090	
CC	1023886021	Edward Fernandez		ALSC	Almacen									X	3194145987	
CC	65787773	Arley Forero	Arley	DLSC	Educación									Y	3133482530	
C.C	1018459927	María Avendaño	—	ALSC	Sistemas		X							X	3002618657	María
CC	1013600956	Brian Arturo Canelo	Arturo	ALSC.	Educación		X							X	3228898300	
CC	1067734350	Nathaly collazos	Nathaly	+LSC	Educación		+							+	3102455516	Nathalycc
CC	1013662612	Esteban Nicolas	Gonzalez	ALSC	Sistemas		X							X	3133606080	
CC	52338356	Liz Tatiana Guerra		ALSC	Eduvin		X							X	Lizguerra	
CC	80188474	Mauricio Barroso	—	ALSC	CTO S		·							X	3145855578	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO

Proyecto de Dotaciones No. 1790 de 2024

Orden del dia

Orden del día:
1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Contextualización de la reunión
3. Desarrollo
4. Conclusiones y cierre
5. Tabla descriptiva elementos dotación y fotografías.

Desarrollo de la jornada

1. Saludo y presentación de los asistentes

Siendo las **8:00 a. m. del día 13 de marzo de 2026**, se reunieron en la **bodega del LPX** funcionarios y profesionales vinculados al **Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de San Cristóbal**, con el propósito de adelantar **verificación de inventario** de los elementos correspondientes al **proyecto de dotaciones No. 1790 de 2024**, en el marco de las actividades de revisión y constatación de bienes pendientes de entrega de dicha vigencia.

La presente mesa tuvo como finalidad revisar el estado, cantidad, identificación y correspondencia técnica de los elementos presentados dentro del proceso de dotación, dejando constancia del avance en la verificación de los bienes que hacen parte de esta entrega.

2. Contextualización de la reunión.

Objeto: Verificación de inventario de elementos mobiliarios, tecnológicos y de audio correspondientes al proyecto de dotaciones 1790 de 2024.

Durante la jornada se realizó la revisión física y técnica de los elementos presentados, con énfasis en los bienes mobiliarios, tecnológicos y de audio contemplados en esta fase del proyecto. En el marco de esta mesa se presentaron para verificación los siguientes elementos:

- **174 cables HDMI de 5 metros**
- **33 tablets profesionales de mínimo 9.7 pulgadas**
- **8 cabinas auto potenciadas activas**
- **11 televisores LED Smart TV de 55 pulgadas**
- **4 equipos de cómputo portátil con diadema incluida**
- **4 mezcladores amplificadores de audio de 6 canales**

- **4 micrófonos inalámbricos con planta receptora**
- **6 casilleros estudiantiles**
- **5 estanterías de depósito**
- **4 maleteros de biblioteca**
- **27 muebles de almacenamiento de aulas**
- **91 tableros**
- **6 tableros móviles**

3. Desarrollo

En el desarrollo de la mesa, los profesionales de las distintas áreas adelantaron la verificación de los bienes conforme a sus competencias, dejando los siguientes resultados:

3.1 Cables HDMI de 5 metros

Frente a los **175 cables HDMI de 5 metros**, se realizó la revisión correspondiente y se concluyó que los elementos presentados **no registran objeciones ni observaciones**, razón por la cual se emite **concepto favorable** respecto de este ítem.

3.2 Cabinas auto potenciadas activas

En la revisión de las **8 cabinas auto potenciadas activas**, se identificó como observación que **algunos de estos elementos no cuentan con placa o código de registro**. En consecuencia, se adquirió el compromiso de **remitir un correo electrónico a la líder del proceso**, adjuntando un archivo en formato Excel que contenga el listado de los elementos que actualmente no disponen de código de registro, con el fin de adelantar el proceso de asignación e identificación correspondiente para cada uno de ellos. En este sentido, el ítem queda con **concepto favorable con observación y compromiso de subsanación administrativa**.

3.3 Tablets

Respecto de las **33 tablets profesionales**, marca **Lenovo Idea Tab**, modelo **TB336FU**, cuya verificación física y técnica fue realizada por los ingenieros **María Avendaño** y **Esteban Nicolás González**, con acompañamiento del profesional de apoyo del área de educación **Brian Arturo Camelo Niño**, se evidenció correspondencia con las especificaciones técnicas exigidas para este componente, por lo cual se otorga **concepto favorable**.

3.4 Televisores

En cuanto a los **11 televisores LED tipo Smart de 55 pulgadas**, marca **Samsung**, modelo **UN55U8000FK**, una vez revisados por el área de sistemas, se evidenció cumplimiento frente a las características generales verificables del bien presentado, motivo por el cual se otorga **concepto favorable**.

3.5 Equipos de cómputo portátil

Frente a los **4 equipos de cómputo portátil marca Compumax**, con diadema incluida, se realizó la verificación técnica correspondiente por parte del área de sistemas, evidenciándose concordancia con el componente tecnológico presentado, motivo por el cual se emite **concepto favorable**.

3.6 Mezcladores amplificadores de audio de seis canales

Durante la revisión de los **4 mezcladores amplificadores de audio de seis canales**, se evidenció que los equipos **cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha correspondiente**, razón por la cual se otorgó **concepto favorable** para este ítem.

3.7 Micrófonos inalámbricos con planta receptora

Respecto de los **4 micrófonos inalámbricos con planta receptora**, una vez efectuada la revisión correspondiente, se emitió **concepto favorable**, al evidenciarse su conformidad con el bien presentado para verificación.

3.8 Casilleros estudiantiles

En la revisión de los **6 casilleros estudiantiles**, se evidenció que **los imanes de las puertas no encajan adecuadamente o no hacen cierre correcto**, y que **algunas puertas ingresan de manera forzada**, situación que afecta las condiciones funcionales del mueble.
Por lo anterior, se deja la observación correspondiente y se establece que **Eduard Martínez**, del equipo del EPX, **se compromete a realizar los ajustes pertinentes para que el mueble quede en perfectas condiciones**.
En consecuencia, para este ítem se emite **concepto desfavorable**, hasta tanto se adelanten las correcciones requeridas.

3.9 Maleteros de biblioteca

Durante la jornada se realizó la revisión de **4 maleteros de biblioteca**, evidenciándose que **cumplen con las especificaciones técnicas requeridas**, razón por la cual se otorga **concepto favorable**.

3.10 Estanterías de depósito

Una vez revisadas las **5 estanterías de depósito**, se emite **concepto favorable**, al no evidenciarse observaciones que impidan su conformidad dentro de la presente verificación.

3.11 Muebles de almacenamiento de aulas

Frente a los **27 muebles de almacenamiento de aulas**, se otorga **concepto favorable**, dejando constancia de la existencia de **observaciones asociadas al manejo del mueble**, las cuales deberán ser consideradas en el proceso de instalación, uso o ajuste correspondiente, sin que estas afecten de manera sustancial el concepto técnico emitido en esta etapa.

3.12 Tableros:

En la revisión de los **91 tableros**, se dejó como observación que **los elementos fueron entregados con pinzas en polipropileno y no con sistema de rodillo**, como se especifica en la ficha técnica, debido a la obsolescencia del sistema de rodillo en el mercado. Así mismo, se evidenció que **cada tablero cuenta con dos porta borradores laterales y tres pinzas**.
En este sentido, se emite **concepto favorable con observación**.

3.13 Tableros móviles

Respecto de los **6 tableros móviles**, una vez realizada la revisión correspondiente, se emitió **concepto favorable.**

4. Conclusiones y cierres.

Como resultado de la mesa de verificación adelantada el día **13 de marzo de 2026**, en la bodega del EPX, se deja constancia de que se realizó la revisión física y técnica de los elementos presentados dentro del proyecto de dotaciones No. 1790 de 2024, con participación de funcionarios y profesionales de las áreas de educación, sistemas, cultura, almacén y demás dependencias convocadas.

De la revisión efectuada se concluye que la mayoría de los ítems verificados recibieron **concepto favorable**, en tanto se evidenció conformidad general con las especificaciones técnicas y funcionales requeridas. No obstante, se registraron observaciones específicas en algunos componentes, particularmente en las **cabinas auto potenciadas activas**, los **casilleros estudiantiles**, respecto de los cuales se dejaron consignados compromisos y requerimientos de ajuste o subsanación.

En relación con las **cabinas auto potenciadas**, se definió como compromiso la remisión de un correo electrónico a la líder del proceso, adjuntando un archivo Excel con el listado de elementos que no cuentan actualmente con código de registro, con el fin de adelantar su asignación e identificación. En cuanto a los **casilleros estudiantiles**, se emitió **concepto desfavorable**, debido a inconsistencias en el cierre y funcionamiento de las puertas, quedando a cargo de **Eduard Martínez** la realización de los ajustes necesarios para que estos queden en perfectas condiciones. Respecto de los **tableros**, se dejó la observación relacionada con la diferencia entre el sistema entregado y el sistema especificado en la ficha técnica debido a la obsolescencia del sistema del sistema pedido.

Se deja igualmente constancia de que la presente acta recoge el avance de verificación efectuado hasta el momento, particularmente en lo referente a componentes tecnológicos, de audio y parte del mobiliario.

A continuación, se presenta una tabla con evidencia fotográfica y los seriales de los elementos tecnológicos. Primero se realiza una descripción técnica de cada elemento, y luego las observaciones realizadas, para finalizar con la evidencia fotográfica en cada tabla.

PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	CABLE HDMI 5 METROS	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	174	CABLE HDMI DE MINIMO 5 M- SOPORTA LA ESPECIFICACIONES HDMI 1.3. 1.4 3D- CONDUCTOR BAÑADO EN ORO, COLOR NEGRO, PERMITE LA TRANSMISION DE AUDIO DIGITAL, CIDEO DIGITAL Y ETHERNET IMAGEN DE REFERENCIA	Se realizó la contabilización individual de los cables, evidenciándose un total de 174 unidades. Durante la verificación se constató que los elementos cumplen con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, razón por la cual se emite concepto favorable y aprobación en el proceso de verificación.







PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	CABINA AUTOPOTENCIADA ACTIVA	ELEMENTOS TECNÓLOGICOS	8	CABINA AUTOPOTENCIADA ACTIVA, CON POTENCIA DE MÍNIMO 1000 W EN RMS, GABINETE DE DISEÑO MOLDEADO ABS REFORZADO DE ALTO IMPACTO, ENTRADA DE 1 X MIC XLR, O PLUG DE ¼, ENTRADA DE LÍNEA 1 X JACK, SALIDA MÍNIMA DE 1 X JACK, ECUALIZADOR DE GRAVES. AGUDOS, RESPUESTA DE FRECUENCIA MINIMO 70 HZ - 18 KHZ. LECTOR DE MEMORIAS USB Y TARJETA SD Y/O CON SU RESPECTIVO ADAPTADOR, GARANTÍA DE 1 AÑO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA.	Sin embargo, se identificó que algunos de estos elementos no cuentan con placa o código de registro. En consecuencia, se adquirió el compromiso de remitir un correo electrónico a la líder del proceso, adjuntando un archivo en formato Excel que contenga el listado de los elementos que actualmente no disponen de código de registro, con el fin de adelantar el proceso de asignación e identificación correspondiente para cada uno de ellos. Sin embargo, se identificó que algunos de estos elementos no cuentan con placa o código de registro. En consecuencia, se adquirió el compromiso de remitir un correo electrónico a la líder del proceso, adjuntando un archivo en formato Excel que contenga el listado de los elementos que actualmente no disponen de código de registro, con el fin de adelantar el proceso de asignación e identificación correspondiente para cada uno de ellos.
  					
PROY-1790-2024	MEZCLADOR AMPLIFICADOR DE AUDIO 6 CANALES	ELEMENTOS TECNÓLOGICOS	4	MEZCLADOR DE 6 CANALES PARA MIC XLR + 2 CANALES ESTÉREO, CADA CANAL CON ECUALIZADOR DE 4 BANDAS, CONTROLES DE VOLUMEN POR CANAL, MASTE GENERAL Y DE SUB GRUPOS EN FADER. ECUALIZADOR GRAFICO GENERAL DE 9 BANDAS. PROCESADOR DE EFECTOS DIGITAL DE 32/40 BIT CON MÍNIMO 80 PROGRAMAS + TAP DELAY. MODULO USB. DEBE INCLUIR: ALETAS PARA MONTAJE EN RACK, DEBE INCLUIR SU RACK DESCUBIERTO, PARA TRANSPORTE DEL MEZCLADOR Y MULTITOMA DE 6 SALIDAS, 15 AMP, SWITC ENCENDIDO/APAGADO, ATENUACIÓN DE RUIDO EMI/RFI CON CABLE DE APROX 4,5 MTS. EXTENSIÓN DE 40 METROS 3 X 16 AWG CON CLAVIJA Y TOMA DE 15 AMP CON CONEXIÓN DE POLO A TIERRA. GARANTÍA DE 1 AÑO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA.	Durante la jornada de verificación, los elementos tecnológicos fueron revisados por el ingeniero del área de Cultura, quien acompañó el proceso de validación de los equipos destinados a la dotación de las Instituciones Educativas Distritales (IED). Como resultado de dicha revisión, se evidenció que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica correspondiente, motivo por el cual se otorgó concepto favorable frente a su conformidad.






PROY-1790-2024	MICRÓFONO INALÁMBRICO CON PLANTA RECEPTORA	ELEMENTOS TECNÓLÓGICOS	**4**	DEBE SOPORTAR FRECUENCIAS SELECCIONABLES: MÍNIMO 150, FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA, DEBE INCLUIR ANTENAS TANTO INTERNAS, COMO DESMONTABLE, PANTALLA DEL TRANSMISOR: LED, RANGO DE OPERACIÓN: MÍNIMO DE 80 M CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO: XLR Y 1⁄4 "(6.3 MM) DURACIÓN DE LA BATERÍA: MÍNIMO 5 HORAS, RANGO DINÁMICO: >=100 DB, RECEPTOR CON IMPEDANCIA A SALIDA CON CONECTOR XLR 200 Ω Y/O 600 Ω, EL MICRÓFONO Y EL RECEPTOR DEBE SER DE LA MISMA MARCA, LA CARCASA DEBE SER EN MATERIAL ABS MOLDEADO, RESPUESTA DE FRECUENCIA MINIMO 70 HZ A 15.000 HZ., SE DEBE ENTREGAR CABLE XLR DE 5 METROS COMPATIBLE CON EL RECEPTOR Y COMPATIBLE PARA LA CONEXIÓN CON EL MEZCLADOR AMPLIFICADOR DE AUDIO 6 CANALES. LA GARANTÍA PARA EL MICRÓFONO Y LA PLANTA RECEPTORA ES DE 1 AÑO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA.	Durante la jornada de verificación, los elementos tecnológicos fueron revisados por el ingeniero del área de Cultura, quien acompañó el proceso de validación de los equipos destinados a la dotación de las Instituciones Educativas Distritales (IED). Como resultado de dicha revisión, se evidenció que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica correspondiente, motivo por el cual se otorgó concepto favorable frente a su conformidad.













PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	TABLET PROFESIONAL DE MINIMO 9.7 PULGADAS	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	33	TABLET PROFESIONAL DE MINIMO 9.7 PULGADAS, PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, TECNOLOGÍA DE 64 BITS Y VELOCIDAD MÍNIMO DE 2.0 GHZ, ALMACENAMIENTO INTERNO DIRECTAMENTE DE FABRICA CON DISCO DURO DE 128 GB O SUPERIOR NO SE ACEPTAN MEMORIAS SD Y/O MICRO SD, COMO CUMPLIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, MEMORIA RAM DE MÍNIMO 2 GB, SE DEBE ENTREGAR CON UN LAPIZ TACTIL PREFERIBLEMENTE DE LA MISMA MARCA DE LA TABLET Y/O UN LAPIZ QUE SEA COMPATIBLE CON LA TABLET, PANTALLA LCD LED O LCD IPS, CAPACITIVA, MULTITÁCTIL. ROTACIÓN 4 VÍAS DE MINIMO 9.7", CON RESOLUCIÓN 1200 X 1920 PIXELS Ó SUPERIOR, AURICULARES Y CONECTOR DE AURICULARES DE 3.5 MM INDEPENDIENTE O EN COMBO, CÁMARA TRASERA DE MÍNIMO 8.0 MEGAPÍXELES CON AUTOFOCO, CÁMARA DELANTERA DE MÍNIMO 1.2 MEGAPÍXELES, UNIDAD PARLANTE O ALTAVOZ MONO O ESTEREO, BATERÍA INTEGRADA CON AUTONOMIA DE MÍNIMO 10 HORAS DE NAVEGACIÓN WEB CON CERTIFICACIÓN FCC, UL O CE, ADAPTADOR DE CA ORIGINAL DEL FABRICANTE. QUE SOPORTE RANGOS 100-240 V/50-60 HZ CON CERTIFICACIÓN FCC, UL O CE, GPS INTEGRADO, WI-FI (802.11 B/G/N) CON CERTIFICACIÓN WI-FI CERTIFIED™", BLUETOOTH 4.2 O SUPERIOR, PESO MAXIMO DE 600 GRAMOS,600G, CON SENSORES (MÍNIMO ACELEROMETRO Y SENSOR DE LUZ), SOFTWARE LICENCIADO Y PRE-INSTALADO CON LICENCIA DE ANDROID 10 Y/O SUPERIOR Y/O IOS 12 O SUPERIOR, LA SED SOLICITA DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA VERIFICACIÓN DECUIDADO DEL MEDIO AMABIENTE Y MANEJO CONSUMO DE ENERGÍA CON LAS CERTIFICACIONES ENERGY STAR CERTIFICACIÓN VERSIÓN 6.1 O SUPERIOR, PRESENTAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE DE LA TABLET OFERTADA QUE ACREDITE SER MIEMBRO EPEAT Y/O PRESENTAR CERTIFICADO EPEAT DE LA TABLET OFERTADA, CERTIFICACIÓN WI-FI CERTIFIED™, CERTIFICACIÓN FCC, UL O CE PARA CARGADOR Y BATERIA. LA TABLET DEBE INCLUIR UN ESTUCHE PROTECTOR EJECUTIVO QUE PERMITA DOS ÁNGULOS DE INCLINACIÓN SOBRE EL PLANO HORIZONTAL PARA LA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL USUARIO, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR LAS MANOS, QUE PERMITA ACCESO A TODOS LOS BOTONES DE CONTROL, CÁMARAS, PANTALLA, SENSORES, PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA DE LA TABLETA Y A TODOS LOS SLOTS DE LA MISMA, SIN NECESIDAD DE RETIRAR O DESPLAZAR EL ESTUCHE, DEBE INCLUIR SOFTWARE QUE PERMITA LA LECTURA O EDICIÓN BÁSICA DE ARCHIVOS DE OFFICE: WORD, POWERPOINT, EXCEL PARA TABLETAS, DEBE INCLUIR ROTULADO CON UN STICKER ADHESIVO CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE SUMINISTRA LOS EQUIPOS, EL NÚMERO DEL CONTRATO Y LÍNEA DE ATENCIÓN DEL PROVEEDOR. ADICIONALMENTE Y EN CASO DE QUE LA ENTIDAD COMPRADORA ASÍ LO REQUIERA, DEBE ENTREGARSE EL EQUIPO CON MARCACIÓN CON TINTA INSOLUBLE Y/O LASER RESISTENTE A SOLVENTES, CON EL LOGOTIPO DE LA SED. LA SED ENTREGARA EL ARTE PARA LLEVAR A CABO LA MARCACIÓN. GARANTÍA DE 1 AÑO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA.	Se deja constancia de que el proveedor presentó **treinta y tres (33) tablets Lenovo Idea Tab, modelo TB336FU**, correspondientes al ítem de dotación tecnológica objeto de verificación. La constatación técnica y física de los equipos fue realizada por los ingenieros del área de sistemas del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, **María Avendaño** y **Esteban Nicolás González,** quienes verificaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, así como la correspondencia de los equipos, accesorios, software, rotulado, garantía y demás condiciones exigidas para este componente de la dotación tecnológica. De la misma forma, se deja constancia de la verificación de treinta y tres (33) tablets Lenovo Idea Tab modelo TB336FU, identificadas con los seriales relacionados a continuación, en el anexo de inventario correspondiente, los cuales fueron constatados físicamente durante la revisión técnica efectuada por los ingenieros María Avendaño y Esteban Nicolás González, del área de sistemas del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. HA2BK2QX HA2BJ5YT HA2BHMYS HA2BR4XB HA2BKHPM HA2BJWC9 HA2BJYJ6 HA2BJYJA HA2BJWDJ HA2BK948 HA2BJP1F HA2BJ80K HA2BRONZ HA2BKFJS HA2BK94Z HA2BJYES HA2BJWES HA2BJLVX HA2BKFKR HA2BJLTC HA2BHMVW HA2BKVFM HA2BJEE3 HA2BR7FF HA2BQ631 HA2BKDFQ HA2BQWD3 HA2BKFLC HA2BKHM6 HA2BKHNK HA2BHZJL HA2BJEFV HA2BJYGH










Lenovo


Lenovo


Lenovo


Lenovo


Lenovo


Lenovo

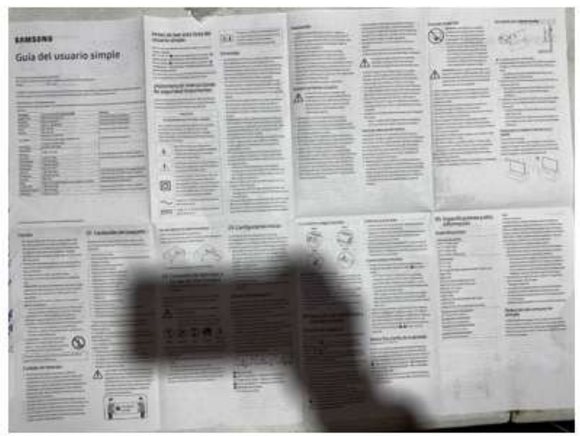

Lenovo

PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	TELEVISOR LED 55 PULGADAS SMART TV	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	11	TELEVISOR LED TIPO SMART DE MINIMO 55" RESOLUCIÓN 4K UHD DE MINIMO 3840 x 2160 PÍXELES, MÍNIMO; CON WIFI INCORPORADO; SALIDA DE SONIDO PARA AMPLIFICAR; FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE; DOLBY DIGITAL INTEGRADO; MÍNIMO 2 ALTAVOCES 1 VÍA; SALIDA DE SONIDO DE 10 W X 2 (RMS), MÍNIMO; 2 HDMI MÍNIMO; 1 USB MÍNIMO; LAN INALÁMBRICA INTEGRADA DISPONIBLE SOPORTE LAN POR CABLE (RJ 45); ENTRADA PC POR HDMI Y/O VGA; SE DEBE INSTALAR Y ENTREGAR SOPORTE EXCUALIZABLE CON BRAZO EXTENSIBLE PARA MONTAJE DE PARED DEL TELEVISOR, GARANTÍA DE 3 AÑOS, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA.	Se deja constancia de que, dentro de los bienes propuestos por el oferente para la dotación tecnológica, fueron presentados **once (11) televisores LED tipo Smart de 55 pulgadas**, marca **Samsung,** modelo **UN55U8000FK**, los cuales fueron objeto de revisión física, constatación de seriales y análisis técnico por parte de los ingenieros **María Avendaño** y **Esteban Nicolás González**, del área de sistemas del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. En dicha verificación se evidenció la correspondencia de los equipos con las especificaciones técnicas exigidas para este ítem, particularmente en lo relacionado con tamaño, resolución 4K UHD, conectividad, puertos, funcionalidades de audio, capacidades Smart, soporte de montaje y garantía. Así mismo, se realizó la identificación individual de cada equipo mediante la lectura de sus seriales, los cuales quedaron registrados en el anexo de inventario que hace parte integral de la presente acta. Como parte del proceso de verificación física, se procedió igualmente a la validación de la identificación individual de cada equipo mediante sus correspondientes seriales, evidenciándose para los once (11) televisores los siguientes registros: 1. 0J5R3CRL200857 2. 0J5R3CRL201044 3. 0J5R3CRL200855 4. 0J5R3CRL200852 5. 0J5R3CRL200916 6. 0J5R3CRL200980 7. 0J5R3CRL201012 8. 0J5R3CRL201073 9. 0J5R3CRL200863 10. 0J5R3CRL200982 11. 0J5R3CRL200974











PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS	4	PROCESADOR MINIMO 8 NUCLEOS, NUMERO DE SUBPROCESOS 16, CON FRECUENCIA BASE DE MINIMO 1.9 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB O SUPERIOR. ESCALABLE. A 32 GB EN RAM DISCO DURO SDD MINIMO 1 TB PCIE NVME, PARLANTES ALTAVOCES ESTEREO INTERNOS, DIADEMA AUDIFONO ESTEREO Y MICROFONO COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO. TAMANO PANTALLA MINIMO 14", LED, BRILLO MÍNIMO 220 NITS, VIDEO HD GRAPHICS, INTEGRADA 1 GB (DINÁMICA), CONECTIVIDAD GIGABIT (10/100/1000) RJ 45, INTEGRADA, TARJETA INALAMBRICA INTEGRADA, WIFI 6, 802.11AX, TECLADO EN ESPAÑOL RESISTENTE A DERRAMES O SALPICADURAS PUERTOS MINIMO 2 X USB 3.2 TIPO A O SUPERIOR LIBRES (UNO DE ELLOS CON CAPACIDAD DE CARGA), MINIMO 1 X USB 3.0 TIPO C, (CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Y DISPLAY PORT 1.2), MINIMO 1 X USB 2.0 TIPO A, 1 MICRO SD 3.0, 1X RJ 45, 1 PUERTO HDMI 1.4, CÁMARA WEB HD INTEGRADA AL CHASIS DEL EQUIPO CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE CA PARA EL PORTATIL, SEGURIDAD FISICA (GUAYA) O ELECTRONICA PARA PREVENCION ANTI-ROBO, EL COMPUTADOR DEBE DE SER CORPORATIVO.EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ENERGY STAR MINIMO 7.0 Y NORMA AMBIENTAL EPEAT GOLD Y/O SILVER Y/O BRONZE, CERTIFICACIÓN DE DURABILIDAD MIL-STD-810H, GARANTIA 3 AÑOS EN SITIO, INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA, A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA SED. SE DEBE ADQUIRIR CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME OEM DE 64 BITS, POSTERIORMENTE EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA ACTUALIZACION ACORDE CON LOS MEDIOS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 EDUCATION Y ENTERPRISE DE 64 BITS, QUE SERAN SUMINISTRADOS POR LA SED. EL PROPONENTE DEBE ENTREGAR EN SU PROPUESTA LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE (CASA MATRIZ), MEDIANTE LA CUAL ACREDITE QUE ES DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO DE LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO PARA ESTE PROCESO. DICHA CERTIFICACION DEBERA SER EMITIDA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, LA CERTIFICACION DEBE TENER FECHA DE EXPEDICION NO SUPERIOR A UN (1) ANO ANTERIOR A LA ESTIPULADA COMO LIMITE PARA PRESENTAR PROPUESTA. EN CASO DE PRORROGA DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, LA CERTIFICACION TENDRA VALIDEZ CON RESPECTO A LA PRIMERA FECHA DE CIERRE.	Se deja constancia de que, dentro de los bienes presentados por el oferente para la dotación tecnológica, fueron puestos a disposición para verificación **cuatro (4) equipos portátiles marca Compumax**, los cuales fueron objeto de revisión física, constatación de seriales y análisis técnico por parte de los ingenieros **María Avendaño** y **Esteban Nicolás González**, del área de sistemas del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. En dicha verificación se evidenció la correspondencia de los equipos con las especificaciones técnicas exigidas para este ítem, particularmente en lo relacionado con procesador, memoria, almacenamiento, conectividad, puertos, sistema operativo, condiciones de seguridad, certificaciones de eficiencia y durabilidad, y garantía. Así mismo, se realizó la identificación individual de cada equipo mediante la lectura de sus seriales: 1. 700SN23984 2. 700SN23982 3. 700SN23981 4. 700SN23983 los cuales quedaron registrados como soporte de la verificación adelantada.







PROYECTO	ELEMENTO	FAMILIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	OBSERVACIONES
PROY-1790-2024	***CASILLEROS ESTUDIANTES***	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	**6**	Material acero, columnas 12; divisiones 6; base y tapa 4; zócalo 2; pared de fondo 2. Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, grafadas y plegadas en omega, Todas las piezas de lámina deben tener pliegues estructurales en sus caras. El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante. El zócalo de 5 cm, debe ser plegado en sus caras. Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: gris humo. NIVELADORES en Polipropileno, Nivelador Base (polipropileno de alto impacto), Nivelador Espigo (Acero de 3/8" por 2" de largo) Polipropileno Texturizado color negro / Zincado, CANTIDAD 12. PUERTAS Acero Lamina de cold rolled 0.9 mm con refuerzo estructural en su interior en lamina calibre 18 a 1.2 mm tipo omega, posee seis celosías cada una con 9 huecos troquelados ara sistema de ventilación y circulación de aire, posee lamina soldada a la puerta con hueco que permita el uso del portacandado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster gofrado COLORES: Verde Amarillento, Amarillo póker, rojo, azul mar, naranja dispuestos en forma diagonal CATIDAD 40. PORTAROTULOS Acero Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y grafadas; soldada a cada uno de las puertas. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster. Acabado gofrado. COLOR: gris humo CANTIDAD 40. BISAGRAS Acero Calibre 16 espesor de pared a 1.5 mm; El sistema de anclaje de la puerta al cuerpo del casillero con sistema de cierre sobre su eje vertical tipo pin arriba y ajuste mediante tornillo abajo, Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster. Tornillo ajustable abajo. CANTIDAD 40. MANIJAS Acero Sistema de manija embebida, figurada en Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.5 mm bebida Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster CANTIDAD 40. GANCHO Acero Lamina de acero espesor de pared a 1.6 mm de 8 cm de larga doblada y figurada por 3 cm de ancho. Pintura en polvo tipo epoxi poliéster CANTIDAD 40. PORTACANDADO Acero Lamina de acero espesor de pared a 1.6 mm de 4 cm de larga doblada y figurada por 3 cm de ancho, soldada a los parales verticales a nivel central de cada una de las puertas. Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: gris humo CANTIDAD 40. CIERRE CHAPAS /IMANES Acero chapa de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2. Cada una de las puertas debe tener dos (2) imanes equidistantes de manera vertical junto con la estructura principal del mueble uno del otro de tal forma que permita que las puertas se encuentren cerradas y evitar que las golpeen, doblen o rompan al Acero calibre 16 / comercial cromado, Debe poseer chapa de pestillo horizontal o Vertical de acción con llave (Dos copias). CANTIDA 40/40. UNIONES EN ACERO MIG Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica en cordón continúo de 5 mm por punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo. Buen aporte de material, terminaciones limpias, sin porosidades ni socavados. DESCRIPCION DIMENSION (mm) TOLERANCIA (mm) Altura 1900 +/- 10 mm Ancho 4000 +/- 10 mm Profundo 400 +/- 10 mm Zócalo 80 +/- 5 mm	Al momento de realizar la verificación del inmueble se evidencia que los imanes de las puestas de estos no casan bien, algunas puertas entran forzadas y otras quedan flojas por tal razón se deja la observación, a lo que Edward Martínez del equipo de LPX se compromete a realizar los ajustes pertinentes para que el inmueble quede en perfectas condiciones. se realiza la verificación de 12 casilleros grandes de 4*4 y 6 casilleros pequeños de 2*4. Nota: un casillero se compone de 2 casilleros grandes y uno pequeño para un total de 40 divisiones. Y así se conforman las 6 unidades requeridas.








PROY-1790-2024	MALETERO BIBLIOTECA	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	4	PARTE Estructura en acero, especificación: lámina cold rolled de espesor de 0,9 mm mínimo (sin pintura). Acabado:pintura en polvo para aplicación aelectrostática tipo epoxi polieter color gris calro gofrado. ENTREPAÑOS wn acero,Lamina cold rolled de espesor 0,9mm mínimo (sin Pintura), Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. TAPA en ACERO Lamina cold rolled de espesor 0,9mm mínimo (sin Pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. PARED DE FONDO en acero, Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. BASE en acero, Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura).Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. DIVISION CENTRAL EN ACERO Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. REFUERZO DE PARDE DE FONDO en acero, Lámina cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. PATAS ANTIDESLIZANTES en caucho, Diámetro de 2" mínimo altura mínima 10 mm, Color negro. DESCRIPCION Y DIMENSIONES Ancho 700 mm, tolerancia 5 mm +/- altura total del mueble 1520 mm, tolerncia 5mm +/-, alto del mueble sin patas 1510 mm , tolerancia 5 mm +/, profundiadad del mueble 300 mm , tolerancia 5m +/-, ancho casilla (unidad) 335 mm, tolerancia 5mm+/-, alto de casilla(unidad) 290 mm, tolerancia 5mm +/-.	Durante la jornada se verificaron 4 maleteros de biblioteca los cuales cumplen con las especificaciones técnicas. Cada uno cuenta con 10 divisiones
				  	

PROY-1790-2024	***ESTANTERÍA DE DEPÓSITO***	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	5	ESTRUCTURA Acero Parales deben ser fabricados en lámina cold rolled de espesor de 1,6 mm (sin pintura), esquineros de refuerzo en lamina cold rolled de 1.8 mm, entrepaños en lámina cold rolled de espesor 1,2 mm (sin pintura) deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado más largo, como reforzamiento estructural. Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: GRIS CENIZO 4 NIVELADORES Polipropileno Nivelador Base (polipropileno de alto impacto), Nivelador Espigo (Acero de ¾" por 2" de largo) Polipropileno Texturizado color negro / Zincado CATIDAD 4. ENTREPAÑOS Acero Lámina cold rolled de espesor 1,2 mm (sin pintura) deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado más largo, como reforzamiento estructural. Doblados y grafados. Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado gofrado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR:GRIS CANTIDAD 6. SISTEMA DE SUJECION Acero Acero cabeza garbanzo estrella de 1/4" x 1/2" Zincado y tuercas de seguridad en acero de 1/4" Zincado. Zincado 24 UNIONES EN ACERO Acero Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica en cordón continúo de 5 mm por punto con una distancia de 10 cm entre uno y otro que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo. Buen aporte de material, terminaciones limpias, sin porosidades ni socavados.	Durante la jornada se verificaron las estanterías de depósitos las cuales cumplen con las condiciones de la ficha técnica, estos fueron revisados por el profesional de educación y almacén.







PROY-1790-2024	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	27	PARTE Patas, MATERIAL Polipropileno, ESPECIFICACIÓN Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas Color negro CANTIDAD 4. Base Piso: MATERIAL Acero, ESPECIFICACION Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura) ACABADO: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 1. PARTE Laterales, MATERIAL: Acero, ESPECIFICACION: Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura), ACABADO:Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 2. PARTE: Puerta, MATERIAL:Acero,ESPECIFICACION:Lamina plegada spesor de pared 1,2 mm (Sin pintura), ACABADO Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 2. PARTE:Marco Estructural Puerta, MATERIAL Acero, ACABADO:Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 2. PARTE:Manija, MATERIAL Acero, ACABADO Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 2. PARTE: Entrepaño, MATERIAL Acero, ACABADO Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura) ESPECIFICACION Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 2. PARTE: Refuerzo Entrepaños y Base, MATERIAL Acero, ACABADO: Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura), ESPECIFICACION: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 3. PARTE: Tapa Superior, MATERIAL: Acero, ACABADO Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura), ESPECIFICACION Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado CANTIDAD 1. PARTE: Remate Superior, MATERIAL: Madera, ACABADO: Madera Contrachapada de 14 mm, ESPECIFICACION: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras CANTIDAD 1. PARTE Chapa, MATERIAL Acero, ACABADO Comercial de triple cierre, ESPECIFICACION: Zincado CANTIDAD 1 PARTE: Pared de Fondo, MATERIAL: Acero ACABADO: Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm, ESPECIFICACION: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado. CANTIDAD 1. PARTE: Refuerzo Pared de Fondo, MATERIAL: Acero, ACABADO: Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo eposi poliéster color gris claro gofrado, CANTIDAD 1. PARTE: CAJONES: MATERIAL: Polipropileno Copo limero de alto impacto. Inyectado con filtro UV,ESPECIFICACION: Gris Claro o Transparente o azul claro, Madera Contrachapada de 15 mm Color negro CANTIDAD 3.	Duran te la jordana se realiza verificación del inmueble por parte del profesional de educación y almacén y concuerdan que cumplen las condiciones técnicas, en total se encontraron 27 muebles en el almacén de LPX. Cada mueble se entrega con sus respectivas llaves las cuales quedan amarradas en una de las manijas del mueble y se entrega con tres canastas plásticas. Dado que los muebles están para entregar a los colegios y se encuentran en una bodegas algunas se encontraron selladas y protegidas con cartón, esto con el fin de que no se rallen o se dañen, se confía con el contratitas que todas lleguen en buen estado.







PROY-1790-2024	TABLERO	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	**91**	PARTE:MARCO MATERIAL:acero, ESPECIFICACIONES:Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y grafada. Ancho de perfil 5 cm con cama por la parte interna de la estructura para recibir y fijar la superficie.: Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado, corde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: Nopal PARTE:ESQUINEROS, MATERIAL:Acero,ESPECIFICACIONES:Perfil cuadrado figurado en Lámina de acero en cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). Debe adaptarse a las dimensiones que genera el perfil figurado del marco, sin perder la uniformidad del mismo, soldadura tipo MIG en cordón continuo para las uniones de las estructura, ACABADO Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: Nopal, CANTIDAD 4. PARTE :SUPERFICIE, MATERIAL: Madera, Madera contrachapada de 9 mm. No tendrá grumos, ondulaciones y/o perturbaciones en su superficie.ACABADO: Laminado decorativo melamínico de alta presión; espesor de pared 1,2 mm por su cara principal blanco semibrillante con cuadrícula, balance en laminado decorativo de alta presión espesor de pared a 0.6 mm.CANTIDAD 1. PARTE: PLATINAS DE SUJECION, MATERIAL:Acero, ESPECIFICACIONES:Lamina de Acero cold rolled troquelada y soldada a la estructura, espesor de pared sin pintura de 1.3 mm; de 2" x 3/16", ACABADO: Aluminio / Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster acabado gofrado. CANTIDAD 6. PARTE: PISAPAPELES , Material: Acero y Polipropileno /, ESPECIFICACIONES: Prensa Polipropileno de alto impacto macizo .Resorte espiral en acero, ACABADO: Polipropileno Blanco / Acero Zincado, CANTIDAD 3.PARTE:PORTA BORRADORES MARCADORES, MATERIAL:Acero, ESPECIFICACIONES: Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada, grafada y Punzonado. En forma rectangular 3D con diseño funcional que permita almacenar marcadores y borrador. Ubicado en uno de los parales laterales al tablero. ACABADO:Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado, acorde a la norma técnica NTC 2808. COLOR: Nopal. CANTIDAD 1. PARTE: UNIONES EN ACERO, MATERIAL: MIG, ESPECIFICACIONES: Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica en cordón continúo que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo, ACABADO: Buen aporte de material, terminaciones limpias, sin porosidades ni socavados. CANTIDAD 3	Durante la jornada de verificación, los tableros fueron verificados por el profesional de almacén quien realizó acampioañamineto durante la jordana y verifico con la ficha técnica que estos cumplen con las especificaciones técnicas. La observación al realizar es que los tableros se entregaran con pinzas en polipropileno, no en rodillo como especifica la ficha. Cada tablero cuenta con dos portas borradores al os lados y tres pinzas.









PROY-1790-2024	***TABLERO MOVIL***	ELEMENTOS INMOBILIARIOS	**6**	PARTE: Marco, MATERIAL Acero, ESPECIFICACION Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).ACABADO Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro, CANTIDAD 1. PARTE Estructura, MATERIAL Acero, ESPECIFICACION:Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura). ACABADO.Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. CANTIDAD 1. PARTE:Tablero, Base Madera, Aglomerado de partículas espesor mínimo 12 mm, Laminado de alta presión CANTIDAD 1.Superficie de Escritura:Laminado Melaminico de Alta Presión,Espesor de pared mínimo 1 mm,Blanco con cuadricula CANTIDAD 1. Superficie de Escritura Laminado Melaminico de Alta Presión,Espesor de pared mínimo 1 mm,Blanco con cuadricula CANTIDAD 1. PARTE: Base Porta borrador: Acero, Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro CANTIDAD 1. PARTE: base, MATERIAL: acero, ESPECIFICACION: Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura). ACABADO:Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro CANTIDAD 2. PARTE :Refuerzo, MATERIAL:Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).ESPECIFICACION Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro, CANTIDAD 1. PARTE Ruedas,MATERIAL: Comercial,ESPECIFICACION:Espigo de 2" de 3" de diámetro con freno a rueda. ACABADO:Comercial, zincado, C ANTIDAD 4. PARTE:Pisapapeles, MATERIAL: Prensa,Polipropileno,Macizo,Blanco CANTIDAD 4. Resorte,Acero,Resorte espiral,Zincado,4	Durante la jordana los tableros móviles fueron verificados por el profesional de almacén quien acompaño en la verificación de elementos tecnológicos e inmobiliarios, a lo que teniendo en cuenta la descripción de la ficha técnicas estos cumplen.





COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	**Cabinas auto potenciadas activas:** Remitir correo electrónico a la líder del proceso, adjuntando archivo en Excel con la relación de los elementos que no cuentan con placa o código de registro, para surtir el respectivo proceso de asignación e identificación.	LPX	16/03/2026
2.	**Casilleros estudiantiles:** Eduard Martínez, del equipo del LPX, realizará los ajustes pertinentes para corregir el cierre, alineación y funcionamiento de las puertas, de manera que el mueble quede en condiciones adecuadas.	LPX	16/03/2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que genereen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunió
