	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. ..... **Contratista:** .....

Contrato de Interventoría No. 3555-202 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL JJ

Objeto Contrato de Obra:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** julio

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		41-85
1	**INTRODUCCIÓN**		86
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		86-88
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de ejecucion del proyecto		88-113
2.3	Características técnicas del proyecto		113
3	**INFORMACIÓN CONVENIO**		
3.1	Información general del convenio		114,136,157,197,228,250,272,294,316,340,364,391,413,435,457,480,507,531,554,576,598,620,642,660,702,724,747,777,802,827,847,873,891,913,936,958,980,1002,1023,1045,1065,1087,1110,1153,1176
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		114,137,158,198,229,251,273,295,317,341,365,392,414,436,458,481,508,532,555,577,599,621,643,661,703,725,748,778,803,828,848,874,892,914,936,958,981,1003,1024,1046,1066,1088,1111,1154,1177,
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		115,137,158,198,229,251,273,295,317,341,365,392,414,436,458,481,509,533,555,577,599,621,643,662,703,725,749,778,803,828,849,874,892,914,937,959,981,1003,1024,1046,1066,1088,1111,1154,1177,
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		115-123,137,158,198,229,251,273,295,295,317,341,366,392,414,436,459,481,509,533,555,577,599,621,643,662,703,725,749,778,803,828,849,874,892,914,937,959,981,1003,1024,1047,1066,1088,1111,1154,1177,
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	124,137-145,159-167,198-215,230-238,251-259,273-281,295-303,295-318-326,342-351,366-374,392-400,414-422,436-444,459-467,482-490,509-517,533-541,555-563,577-585,599-607,621-629,643-651,662-670,703-711,725-733,749-757,778-786,803-811,828-833,849-857,874-882,892-900,914-923,937-945,959-967,981-989,1003-1011,1024-1032,1047-1051,1066-1074,1088-1096,1111-1119,1154-1160,1177-1185,
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	124,146,168,215,239,260,282,304,327,351,375,401,423,445,468,491,518,542,564,586,608,630,652,671,712,734,749,758,787,812,834,858,874,874,901,924,946,968,990,1012,1033,1052,1075,1097,1120,1161,1186,
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	124,146,168,215,239,260,282,304,327,351,375,401,423,445,468,491,518,542,564,586,608,630,652,671,712,734,758,787,812,834,858,874,901,924,946,968,990,1012,1033,1052,1075,1097,1120,1161,1186,
4.4	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	124,146,168,215,239,260,282,304,327,351,375,401,423,445,468,491,518,542,564,586,608,630,652,671,712,734,758,787,812,834,858,874,901,924,946,968,990,1012,1033,1052,1075,1097,1120,1161,1186,
4.5	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	124,146,168,215,239,260,282,304,327,351,375,401,423,445,468,491,518,542,564,586,608,630,652,671,712,734,758,787,812,834,858,874,901,924,946,968,990,1012,1033,1052,1075,1097,1120,1161,1186,
4.6	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	124-131,146-152,168-176,215-223,239-245,260-267,282-289,304-312,327-335,351-359,375-383,401-408,423-431,445-452,468-475,491-498,518-526,542-549,564-571,586-593,608-615,630-637,652-655,1075,671-674,712-719,734-742,758-766,787-795,812-820,834-842,858-866,874-886,901-908,924-931,946-953,968-975,990-997,1012-1018,1033-1040,1052-1060,1075-1082,1097-1105,1120-1128,1161-1169,1186-1193,

4.7	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	132,153,177,224,246,268,290,312,336,360,384,409,423,431,453,476,500,527,550,572,594,616,638,656,675,720,743,767,796,821,843,867,887,901,909,932,954,976,998,1019,1041,1061,1083,1106,1129,1170,1194,
4.8	Actas		132,153,177,224,246,268,290,290,312,336,360,384-386,409,423,431,453,476,500-502,527,550,572,594,616,638,656,675-677,720,743,767-765,796-798,821-823,843,867-869,887,909,932,954,976,998,1019,1041,1061,1083,1106,1129,1170-1172,1194,
5	**COMPONENTE FINANCIERO**		
5.1	Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-1	132,153,178-193,224,246,268,290,312,336,360,387,409,431,453,476,503,527,552,550,572,594,616,638,656,678-698,720,743,773,798,823,843,869,887,909,932,954,976,998,1019,1041,1061,1083,1106,1129-1149,1172,1194,
5.2	Auxiliar detallado	MEPI-MN-IN-2-FR-2	132-133,153-154,194,224-225,246-247,268-269,290-291,312-313,336-337,360-361,387-388,409-410,431-432,453-454,476-477,503.504,527-528,550-551,572-573,594-595,616-617,638-639,656-657,699,720-721,743-744,773-774,798-799,823-424,843-844,869-970,887-888,909-910,932-933,954-955,976-977,998-999,1019-1020,1041-1042,1061-1062,1083-1084,1106-1107,1150,1172-1173,1194-1195,
5.3	Informe de inversión y buen manejo del desembolso convenio		134,155,195,226,246-248,270,292,314,338,362,389,411,433,455,478,505,529,552,574,596,618,640,658,700,722,745,775,800,825,845,871,889,911,934,956,978,1000,1021,1043,1063,1085,1108,1151,1174,1196
5.4	Plan de inversion y desembolso	MEPI-MN-IN-6-FR-1	135,156,196,227,249,271,293,315,339,363,390,412,434,456,479,506,530,553,575,597,619,641,659,701,723,746,776,801,826,846,872,890,912,935,957,979,1001,1022,1044,1064,1086,1109,1152,1175,1197,
6	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Información general del contrato		1198
6.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		1199-1202
6.3	Informes especialistas y profesionales		1202-1212
6.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1213
7	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
7.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1213-1214
7.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1215-1216
7.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1217
7.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1218-1223
7.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1224-1226
7.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1127-1228
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1229-1230
8	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		1231
9	**ANEXOS**		
9.1	Relacion de la correspondencia generada entreda entre contratista e interventor incluyendo asunto,fecha de recibo		1231-1233
9.2	Registro fotografico		1234-1243

Firma:
Nombre: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8
CONTRATO 3555 – 2024



INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8

CONTRATO 3555 – 2024

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.
INTERVENTORIA:	CONVENIOS CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL OAC O COMUNIDADES ÉTNICAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Contenido

ALVARADO 41

ANZOATEGUI 43

CAJAMARCA 47

CASABIANCA 49

COYAIMA 52

ICONONZO 55

MURILLO 56

NATAGAIMA 57

ORTEGA 63

PIEDRAS 66

PLANADAS 67

RIOBLANCO 72

ROVIRA 77

SALDAÑA 80

SAN LUIS 81

SUAREZ 82

VENADILLO 83

VILLARICA 84

1.INTRODUCCION 86

2.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 86

2.1 LOCALIZACIÓN 86

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 88

ALVARADO 88

ANZOATEGUI 89

CAJAMARCA 91

CASABIANCA 93

COELLO 94

COYAIMA 94

ICONONZO 96

MURILLO 96
NATAGAIMA 97
ORTEGA 100
PIEDRAS 102
PLANADAS 102
2.2.15 RIOBLANCO 105
SALDAÑA 110
SAN LUIS 110
SUAREZ 111
VENADILLO 111
VILLARICA 112
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 113
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO (1) 114
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 114
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 115
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 115
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 115
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO - 4047-2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO 115
4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL 115
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 124
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 124
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 124
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 124
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 124
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 132
4.8 ACTAS 132
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO 132

5.1 ACTAS DE COMITÉ 132
5.2 AUXILIAR DETALLADO 132
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 134
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 135
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO (2) 136
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 136
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 137
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 137
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 137
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO 137
4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL 137
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 146
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 146
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 146
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 146
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 146
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 153
4.8 ACTAS 153
5. 0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO 153
5.1 ACTAS DE COMITÉ 153
5.2 AUXILIAR DETALLADO 153
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 155
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 156
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA (3) 157
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 157
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 158

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 158
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 158
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA 159
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 159
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 168
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 168
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 168
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 168
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 168
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 178
4.8 ACTAS 178
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA 179
5.1 ACTAS DE COMITÉ 179
5.2 AUXILIAR DETALLADO 195
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 196
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 197
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4) 198
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 198
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 199
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 199
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 199
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4) 199
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 199
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 216

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 216
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 216
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 216
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 216
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 224
4.8 ACTAS 224
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO 224
5.1 ACTAS DE COMITÉ 224
5.2 AUXILIAR DETALLADO 224
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 226
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 227
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA (5) 228
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 228
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 229
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 229
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 229
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA 230
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 230
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 239
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 239
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 239
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 239
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 239
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 246
4.8 ACTAS 246

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA 246
5.1 ACTAS DE COMITÉ 246
5.2 AUXILIAR DETALLADO 246
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 248
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 249
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA (6) 250
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 250
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 251
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 251
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 251
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA 251
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 251
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 260
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 260
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 260
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 260
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 260
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 268
4.8 ACTAS 268
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA 268
5.1 ACTAS DE COMITÉ 268
5.2 AUXILIAR DETALLADO 268
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 270
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 271
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA3359-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALOMA (7) 272

3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS. 272
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 273
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 273
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 273
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA 273
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 273
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 282
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 282
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 282
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 282
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 282
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 290
4.8 ACTAS 290
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA 290
5.1 ACTAS DE COMITÉ 290
5.2 AUXILIAR DETALLADO 290
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 292
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 293
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES (8) 294
3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS 294
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 295
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 295
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 295
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES 295
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 304

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 304
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 304
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 304
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 304
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 312
4.8 ACTAS 312
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES 312
5.1 ACTAS DE COMITÉ 312
5.2 AUXILIAR DETALLADO 312
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 314
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 315
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE (9) 316
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 316
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 317
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 317
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 317
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE 318
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 318
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 327
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 327
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 327
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 327
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 327
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 336
4.8 ACTAS 336

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE 336
5.1 ACTAS DE COMITÉ 336
5.2 AUXILIAR DETALLADO 336
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 338
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 339
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA 340
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 340
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 341
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 341
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 341
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA 342
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 342
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 351
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 351
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 351
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 351
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 351
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 360
4.8 ACTAS 360
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA 360
5.1 ACTAS DE COMITÉ 360
5.2 AUXILIAR DETALLADO 360
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 362
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 363
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN (11) 364

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 364
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 365
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 365
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 366
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN 366
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 366
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 375
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 375
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 375
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 375
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 375
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 384
4.8 ACTAS 384
5.0 COMPONENTE FINANCIERO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN 387
5.1 ACTAS DE COMITÉ 387
5.2 AUXILIAR DETALLADO 387
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 389
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 390
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12) 391
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 391
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 392
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 392
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 392
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12) 392
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 392

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 401
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 401
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 401
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 401
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 401
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 409
4.8 ACTAS 409
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA 409
5.1 ACTAS DE COMITÉ 409
5.2 AUXILIAR DETALLADO 409
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 411
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 412
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA (13) 413
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 413
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 414
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 414
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 414
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA 414
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 414
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 423
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 423
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 423
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 423
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 423
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 431
4.8 ACTAS 431

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA DEL TOLIMA..... 431
5.1 ACTAS DE COMITÉ 431
5.2 AUXILIAR DETALLADO..... 431
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 433
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO..... 434
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO (14)..... 435
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS..... 435
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 436
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS..... 436
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 436
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO 436
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 436
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 445
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA..... 445
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 445
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO..... 445
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO..... 445
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA..... 453
4.8 ACTAS..... 453
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO 453
5.1 ACTAS DE COMITÉ 453
5.2 AUXILIAR DETALLADO..... 453
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 455
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO..... 456
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA (15) 457

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 457
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 458
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 458
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 459
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA 459
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 459
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 468
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 468
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 468
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 468
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 468
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 476
4.8 ACTAS 476
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA 476
5.1 ACTAS DE COMITÉ 476
5.2 AUXILIAR DETALLADO 476
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 478
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 479
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI (16) 480
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 480
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 481
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 481
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 481
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI 482
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 482

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 491
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 491
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 491
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 491
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 491
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 500
4.8 ACTAS 500
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI 503
5.1 ACTAS DE COMITÉ 503
5.2 AUXILIAR DETALLADO 503
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 505
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 506
3.0 INFORMACION CONVENIO NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 507
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 507
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 508
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 509
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 509
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 509
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 509
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 518
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 518
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 518
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 518
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 518
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 527
4.8 ACTAS 527

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 2024 NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 527
5.1 ACTAS DE COMITÉ 527
5.2 AUXILIAR DETALLADO 527
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 529
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 530
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO (18) 531
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 531
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 532
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 533
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 533
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO 533
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 533
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 542
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 542
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 542
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 542
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 542
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 550
4.8 ACTAS 550
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO 550
5.1 ACTAS DE COMITÉ 550
5.2 AUXILIAR DETALLADO 550
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 552
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 553
INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 554

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 554
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 555
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 555
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 555
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGIAMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 555
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 555
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 564
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 564
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 564
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 564
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 564
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 572
4.8 ACTAS 572
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO NATAGIAMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 572
5.1 ACTAS DE COMITÉ 572
5.2 AUXILIAR DETALLADO 572
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 574
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 575
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO(20) 576
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 576
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 577
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 577
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 577
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO 577
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 577

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 586
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 586
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 586
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 586
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 594
4.8 ACTAS 594
5.0 COMPONENTE FINANCIERO NATAGAIMA CONVENIO NATAGAIMA 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO 594
5.1 ACTAS DE COMITÉ 594
5.2 AUXILIAR DETALLADO 594
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 596
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 597
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL (21) 598
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 598
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 599
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 599
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 599
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL 599
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 599
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 608
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 608
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 608
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 608
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 608
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 616
4.8 ACTAS 616

5.0 COMPONENTE FINANCIERO NATAGAIMA 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL (21) 616
5.1 ACTAS DE COMITÉ 616
5.2 AUXILIAR DETALLADO 616
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 618
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 619
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE(21) 620
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 621
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 621
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 621
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE 621
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 621
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 630
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 630
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 630
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 630
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 630
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 638
4.8 ACTAS 638
5.0 COMPONENTE FINANCIERO AL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE 638
5.1 ACTAS DE COMITÉ 638
5.2 AUXILIAR DETALLADO 638
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 640
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 641
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ORTEGA 2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE (22) 642
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 642

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 643
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 643
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 643
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ORTEGA 2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE 643
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 643
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 652
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 652
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 652
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 652
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 652
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 656
4.8 ACTAS 656
5.0 COMPONENTE FINANCIERO AL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE 656
5.1 ACTAS DE COMITÉ 656
5.2 AUXILIAR DETALLADO 656
5.2 AUXILIAR DETALLADO 657
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 658
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 659
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA (23) 660
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 660
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 662
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 662
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA 662
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 662

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 671
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 671
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 671
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 671
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 671
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 675
4.8 ACTAS 675
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA 678
5.1 ACTAS DE COMITÉ 678
5.2 AUXILIAR DETALLADO 699
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 700
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 701
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI (24) 702
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 702
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 703
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 703
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 703
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI (24) 703
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 703
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 712
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 712
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 712
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 712
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 712
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 720
4.8 ACTAS 720

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI 720
5.1 ACTAS DE COMITÉ 720
5.2 AUXILIAR DETALLADO 720
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 722
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 723
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PIEDRA S2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO((25) 724
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 724
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 725
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 725
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 725
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PIEDRAS 2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO 725
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 725
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 734
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 734
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 734
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 734
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 734
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 743
4.8 ACTAS 743
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PIEDRAS 2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO 743
5.1 ACTAS DE COMITÉ 743
5.2 AUXILIAR DETALLADO 743
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 745
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 746
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 747

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 747
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 748
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 749
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 749
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 749
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 749
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 758
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 758
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 758
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 758
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 758
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 767
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 773
5.1 ACTAS DE COMITÉ 773
5.2 AUXILIAR DETALLADO 773
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 775
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 776
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 777
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 777
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 778
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 778
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 778
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 778
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 778
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 787

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 787
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 787
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 787
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 787
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 796
4.8 ACTAS 796
5. 0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 798
5.1 ACTAS DE COMITÉ 798
5.2 AUXILIAR DETALLADO 798
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 800
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 801
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,(29) 802
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 802
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 803
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 803
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 803
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA 803
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 803
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 812
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 812
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 812
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 812
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 812
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 821
4.8 ACTAS 821

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA, ... 823
5.1 ACTAS DE COMITÉ 823
5.2 AUXILIAR DETALLADO..... 823
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 825
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO..... 826
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA(30) 827
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS..... 827
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES..... 828
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS..... 828
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 828
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 828
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 828
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 834
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA..... 834
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 834
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO..... 834
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO..... 834
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA..... 843
4.8 ACTAS..... 843
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA..... 843
5.1 ACTAS DE COMITÉ 843
5.2 AUXILIAR DETALLADO..... 843
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 845
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO..... 846
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO..... 847

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 847
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 848
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 849
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 849
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO 849
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 849
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 858
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 858
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 858
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 858
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 867
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO 869
5.1 ACTAS DE COMITÉ 869
5.2 AUXILIAR DETALLADO 869
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 871
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 872
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 873
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 873
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 874
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 874
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 874
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 874
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 874
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 883

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 883
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 883
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 883
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 883
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 887
4.8 ACTAS 887
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 887
5.1 ACTAS DE COMITÉ 887
5.2 AUXILIAR DETALLADO 887
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 889
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 890
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE (33) 891
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 891
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 892
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 892
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 892
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE 892
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 892
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 901
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 901
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 901
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 901
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 901
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 909
4.8 ACTAS 909

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE 909
5.1 ACTAS DE COMITÉ 909
5.2 AUXILIAR DETALLADO 909
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 911
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 912
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA(34) 913
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 913
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 914
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 914
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 914
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 914
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 914
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 924
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 924
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 924
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 924
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 924
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 932
4.8 ACTAS 932
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 932
5.1 ACTAS DE COMITÉ 932
5.2 AUXILIAR DETALLADO 932
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 934
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 935
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO (35) 936

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 936
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 936
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 937
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 937
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO 937
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 937
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 946
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 946
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 946
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 946
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 946
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 954
4.8 ACTAS 954
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO 954
5.1 ACTAS DE COMITÉ 954
5.2 AUXILIAR DETALLADO 954
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 956
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 957
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS (36) 958
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 958
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 958
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 959
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 959
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS (36) 959
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 959

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 968
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 968
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 968
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 968
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 968
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 976
4.8 ACTAS 976
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS 976
5.1 ACTAS DE COMITÉ 976
5.2 AUXILIAR DETALLADO 976
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 978
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 979
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 980
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 980
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 981
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 981
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 981
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 981
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 981
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 990
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 990
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 990
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 990
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 990
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 998
4.8 ACTAS 998

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 998
5.1 ACTAS DE COMITÉ 998
5.2 AUXILIAR DETALLADO 998
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1000
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1001
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO (38) 1002
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1002
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1003
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1003
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1003
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO 1003
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1003
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1012
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1012
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1012
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1012
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1019
4.8 ACTAS 1019
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO 1019
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1019
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1019
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1021
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1022
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1023
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1024
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1024
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1024
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1024
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1024
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1033
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1033
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1033
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1033
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1033
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1041
4.8 ACTAS 1041
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1041
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1041
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1041
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1043
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1044
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1045
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1046
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1046
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1047
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1052
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1052
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1052
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1052
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1052

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1061
4.8 ACTAS 1061
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO SALDAÑA 2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO 1061
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1061
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1061
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1063
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1064
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1065
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1066
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1066
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1066
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL SAN LUIS 3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI 1066
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1066
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1075
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1075
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1075
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1075
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1075
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1083
4.8 ACTAS 1083
5.0 COMPONENTE FINANCIERO SAN LUIS 3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI 1083
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1083
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1083
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1085
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1086
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO SUAREZ 2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA (42) 1087

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1087
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1088
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1088
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL SUAREZ 2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA 1088
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1088
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1097
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1097
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1097
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1097
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1097
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1106
4.8 ACTAS 1106
5.0 COMPONENTE FINANCIERO SAN LUIS 3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI 1106
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1106
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1106
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1108
5.4 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1109
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1110
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1110
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1111
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1111
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1111
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSAL VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1111
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1111
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1120

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1120
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1120
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1120
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1120
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1129
4.8 ACTAS 1129
5.0 COMPONENTE FINANCIERO VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1129
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1129
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1150
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1151
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1152
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MI 1153
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1153
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1154
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1154
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1154
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL 1154
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1154
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1161
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1161
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1161
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1161
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1161
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1170
4.8 ACTAS 1170

5.0 COMPONENTE FINANCIERO VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL 1172
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1172
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1172
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1174
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1175
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1176
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1176
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1177
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1177
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1177
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1177
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1177
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1186
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1186
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1186
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1186
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1186
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1194
4.8 ACTAS 1194
5.0 COMPONENTE FINANCIERO VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1194
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1194
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1194
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1196
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1197
6.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1198
6.1 INFORMACION GENERAL DE CONTRATO 1198

6.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTEVENTORIA.. 1199

6.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES..... 1202

6.4 INFORME ANUAL DE LA CAJA-PAC 1213

7.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 1213

7.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 1213

7.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1215

7.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1217

7.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 1218

7.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.. 1224

7.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 1227

8.0 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES..... 1231

9.0 ANEXOS..... 1231

9.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, FECHA DE RECIBO..... 1231

9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 1234

INFORME MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS

ALVARADO

4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4047-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO ALVARADO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.903.527,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.903.527,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	196
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.219.426,00	$ -	$ 151.219.426,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.583,00	$ -	$ 4.536.583,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.518,00	$ -	$ 44.147.518,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.903.527,00	$ -	$ 199.903.527,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4076-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO ALVARADO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.201.607,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.201.607,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	161
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.540.587,00	$ -	$ 150.540.587,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.516.218,00	$ -	$ 4.516.218,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.802,00	$ -	$ 44.144.802,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.201.607,00	$ -	$ 199.201.607,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Revisión de documentos para pago de proveedores
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing residente, contador, maestro obra.

Firma

Nombre-Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANZOATEGUI

2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** Jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2271-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.514.428,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.514.428,00
DESEEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEEMBOLSO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	137
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.187.719,00	$ -	$ 151.187.719,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.535.632,00	$ -	$ 4.535.632,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.391,00	$ -	$ 44.147.391,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.870.742,00	$ -	$ 199.870.742,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA SANTA BARBARA

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA SANTA BARBARA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Terminacion de seleccion de proveedores
*Solicitud a las organizaciones comunales la entrega de hojas de vida del personal propuesto: Ing. residente, contador y maestro de obra.
*Envio de documentos a correspondientes al primer desembolso de inicio de obra ;
*Solicitud de aprobacion de acta de asociacion de cuenta y pago a proveedore
*Solicitud de verificacion y posible aprobacionde la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2306-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOATEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.589.383,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.589.383,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	139
Estructuras	Alcantarillas	UND	2
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.915.613,00	$ -	$ 150.915.613,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.527.468,00	$ -	$ 4.527.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.302,00	$ -	$ 44.146.302,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.589.383,00	$ -	$ 199.589.383,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
**Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envia solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31-07-205 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2366-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.716.333,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.716.333,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.038.387,00	$ -	$ 151.038.387,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.152,00	$ -	$ 4.531.152,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.794,00	$ -	$ 44.146.794,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.716.333,00	$ -	$ 199.716.333,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

Foto 2

SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Revision de documentos para pago a proveedores.
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vidas delpersonal propuesto: Ing. residente, contador y maestro de obra.
*Solicitud pago a proveedores.
*Envio de documentos correspondientes al primer desembolso de inicio de obra
*Solicitud de aprobacion de acta de asociacion de cuenta y pago a proveedores
*Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024


Firma

Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ARMERO

3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

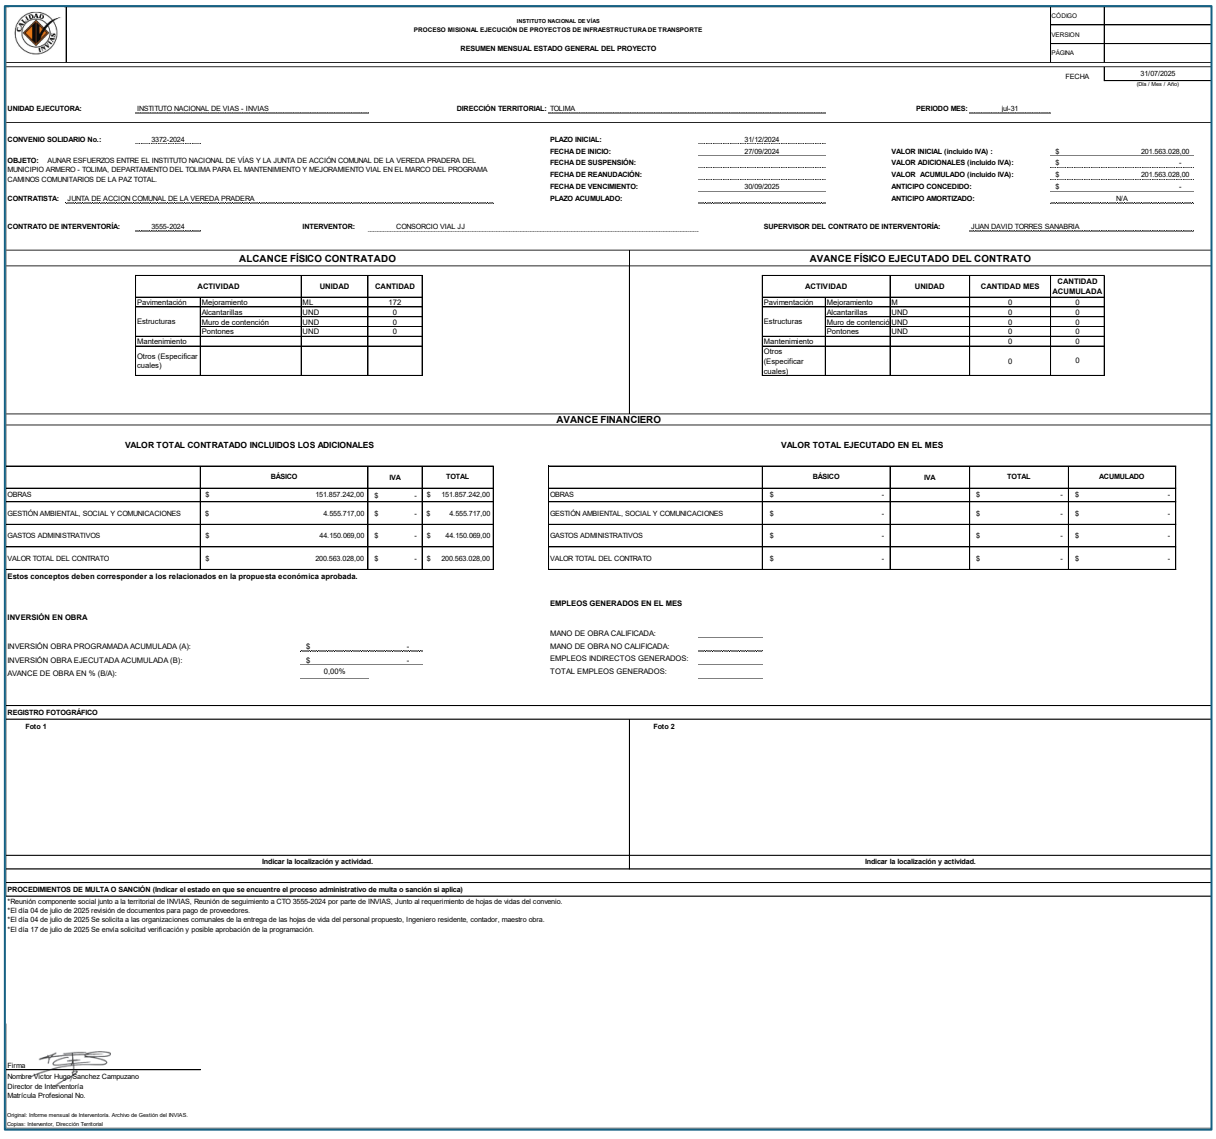

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3372-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.563.028,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.563.028,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	172
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.857.242,00	$ -	$ 151.857.242,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.555.717,00	$ -	$ 4.555.717,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.069,00	$ -	$ 44.150.069,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.563.028,00	$ -	$ 200.563.028,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CAJAMARCA

3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO | VERSION | PÁGINA

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3359-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO CAJAMARCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.126.666,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.126.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	144
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.435.228,00	$ -	$ 151.435.228,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.057,00	$ -	$ 4.543.057,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.381,00	$ -	$ 44.148.381,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.126.666,00	$ -	$ 200.126.666,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 — Indicar la localización y actividad.

Foto 2 — Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envia solicitud verificación y posible aprobación de la programación

Firma
Nombre:Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3355-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO CAJAMARCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.139.384,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.139.384,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	165
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.447.528,00	$ -	$ 151.447.528,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.426,00	$ -	$ 4.543.426,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.430,00	$ -	$ 44.148.430,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.139.384,00	$ -	$ 200.139.384,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

Firma
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CASABIANCA

2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31-07-205 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2366-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.716.333,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.716.333,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.038.387,00	$ -	$ 151.038.387,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.152,00	$ -	$ 4.531.152,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.794,00	$ -	$ 44.146.794,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.716.333,00	$ -	$ 199.716.333,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

Foto 2

SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Revision de documentos para pago a proveedores.
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vidas delpersonal propuesto: Ing. residente, contador y maestro de obra.
*Solicitud pago a proveedores.
*Envio de documentos correspondientes al primer desembolso de inicio de obra
*Solicitud de aprobacion de acta de asociacion de cuenta y pago a proveedores
*Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

Firma

Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2206-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO CASABIANCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.951.148,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.951.148,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	114
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.265.482,00	$ -	$ 151.265.482,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.537.964,00	$ -	$ 4.537.964,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.702,00	$ -	$ 44.147.702,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.951.148,00	$ -	$ 199.951.148,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA PORFIA LINDA

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA PORFIA LINDA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Revision de documnetos para pago a proveedores
*Se solicita a las organizaciones comunales la entrega de hojas de vida del personal propuesto: Ing. Rsidente, contador maestro de obra
*Se envia cotizacion para revision y aprobacion
*Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COELLO

2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2122-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO COELLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.274.651,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.274.651,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	171
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.611.229,00	$ -	$ 150.611.229,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.518.337,00	$ -	$ 4.518.337,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.085,00	$ -	$ 44.145.085,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.274.651,00	$ -	$ 199.274.651,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

Foto 2



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Revision de documentos para pago a proveedores
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas d evida del personal propuesto, Ing. Residente, contador y maestro de obra
* Remison de estudios de caracterizacion realizados por la empresa Concrelab para revision de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chiplao municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canada escocia municipio de Iconozo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio de Saldaña
*Solicitud de verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024
*Envio de programacion para socializacion metodologia social comunitaria y programacion de reunion selección de proveedores para el dia 21 de julio
*Se envia actualizacion de diseño geometrico OAC
*Se realiza entrega de cotizaciones, memoria de cálculos y otro por parte de JAC de la vereda Llano de la virgen

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COYAIMA

3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3515-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 11/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.550.463,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.550.463,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.845.090,00	$ -	$ 151.845.090,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.555.353,00	$ -	$ 4.555.353,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.020,00	$ -	$ 44.150.020,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.550.463,00	$ -	$ 200.550.463,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

Firma
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3421-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.248.396,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.248.396,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.585.838,00	$ -	$ 150.585.838,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.517.575,00	$ -	$ 4.517.575,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.983,00	$ -	$ 44.144.983,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.248.396,00	$ -	$ 199.248.396,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3421-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.248.396,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.248.396,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.585.838,00	$ -	$ 150.585.838,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.517.575,00	$ -	$ 4.517.575,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.983,00	$ -	$ 44.144.983,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.248.396,00	$ -	$ 199.248.396,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ICONONZO

2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3340-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.493.740,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.493.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	156
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.823.115,00	$ -	$ 150.823.115,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.524.693,00	$ -	$ 4.524.693,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.932,00	$ -	$ 44.145.932,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.493.740,00	$ -	$ 199.493.740,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma

Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MURILLO

2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2641-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI DEL MUNICIPIO MURILLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.784.352,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.784.352,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	133
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.071.288,00	$ -	$ 152.071.288,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.562.139,00	$ -	$ 4.562.139,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.925,00	$ -	$ 44.150.925,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.784.352,00	$ -	$ 200.784.352,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

VISITA SECTOR PLACA HUELLA VEREDA PAJONALES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Revision de documentos para pago de proveedores
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, ing civil, contador, maestro de obra
*Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO3555-2024
*Envio de programacion para socializacionmetodologia social comunjtaria y programacion de reunion selección de proveedores para el dia 25 de julio

Firma

Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NATAGAIMA

2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2660-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POCHARCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POCHARCO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.053.438,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.053.438,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	140
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.364.408,00	$ -	$ 151.364.408,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.540.932,00	$ -	$ 4.540.932,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.098,00	$ -	$ 44.148.098,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.053.438,00	$ -	$ 200.053.438,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA POCHARCO

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA POCHARCO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing residente, contador, maestro obra
*Se realiza reunión virtual comité operativo selección de proveedores vereda pocharco.
*Selección de proveedores entre interventoría, representante legal y veeduría, para la vereda pocharco del municipio de natagaima
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024
*Solicitud para revisión y aprobación para pago a proveedores en la vereda Pocharco municipio de Natagaima Tolima

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor. Dirección Territorial

3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3016-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TAMIRCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TAMIRCO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.875.939,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.875.939,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	148
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.159.529,00	$ -	$ 152.159.529,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.564.786,00	$ -	$ 4.564.786,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.624,00	$ -	$ 44.151.624,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.875.939,00	$ -	$ 200.875.939,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3247 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.703.080,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.703.080,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.091.335,00	$ -	$ 151.038.387,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.472.740,00	$ -	$ 4.531.152,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.139.005,00	$ -	$ 44.146.794,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.703.080,00	$ -	$ 199.716.333,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ANACARCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.286.097,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.286.097,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	143
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.622.299,00	$ -	$ 150.622.299,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.518.669,00	$ -	$ 4.518.669,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.129,00	$ -	$ 44.145.129,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.286.097,00	$ -	$ 199.286.097,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3167-2024

OBJETO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.231.908,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.231.908,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	153
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.569.891,00	$ -	$ 150.569.891,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.517.097,00	$ -	$ 4.517.097,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.920,00	$ -	$ 44.144.920,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.231.908,00	$ -	$ 199.231.908,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** Jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3194-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.128.206,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.128.206,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	117
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.469.600,00	$ -	$ 150.469.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.514.088,00	$ -	$ 4.514.088,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.518,00	$ -	$ 44.144.518,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.128.206,00	$ -	$ 199.128.206,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ORTEGA

2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2437-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUINEAL HORIZONTE DEL MUNICIPIO ORTEGA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUINEAL HORIZONTE

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.872.650,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.872.650,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	95
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.156.683,00	$ -	$ 152.156.683,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.564.700,00	$ -	$ 4.564.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.267,00	$ -	$ 44.151.267,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.872.650,00	$ -	$ 200.872.650,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA GUINEAL HORIZONTE

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA GUINEAL HORIZONTE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. Residente, contador y maestro de obra
*Seleccion de proveedores entre interventoria, representante legal y veeduria de la vereda
*Solicitd verificacion y posible aprobacion de la programacion plan d ecargas CTO 3555-2024

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2205-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA DEL MUNICIPIO ORTEGA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.962.149,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.962.149,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	136
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones		0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.243.239,00	$ -	$ 152.243.239,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.567.297,00	$ -	$ 4.567.297,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.613,00	$ -	$ 44.151.613,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.962.149,00	$ -	$ 200.962.149,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION DEL TERRENO

Foto 2

TOMA DE. MUESTRAS - CARACTERIZACION DE L TERRENO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. Residente, contador y maestro de obra
*Remision de estudios de caracterizacion realizados por la emoresa Concrelab para revision de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chípalo municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canadá escocia municipio de Icononzo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio Saldaña *Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan ad ecargs CTO 3555-2024
*Envío de programacion para socializacionmetodologia social comunitaria y programacion de reunion selección de proveedores par el dia 25 de julio

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director De Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PALOCABILDO

3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3422-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL GUALI DEL MUNICIPIO PALOCABILDO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL GUALI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.956.308,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.956.308,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	168
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.237.590,00	$ -	$ 152.237.590,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.567.128,00	$ -	$ 4.567.128,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.590,00	$ -	$ 44.151.590,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.956.308,00	$ -	$ 200.956.308,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PIEDRAS

2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2693-2024
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.125.042,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.125.042,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	162
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.433.657,00	$ -	$ 151.433.657,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.010,00	$ -	$ 4.543.010,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.375,00	$ -	$ 44.148.375,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.125.042,00	$ -	$ 200.125.042,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
TOMA DE MUESTRAS- CARACTERIZACION SUELO	TOMA DE MUESTRAS- CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Revision de documentos para pago a proveedores
*Se solicita a la sorganizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. Residente, contador y maestro de obra
*Remisión de estudios de caracterización realizados por la empresa Concrelab para revisión de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chípalo municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canadá escocia municipio de Icononzo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio Saldaña *Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANADAS

2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2123-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.004.115,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	83
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.316.707,00	$ -	$ 151.316.707,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.539.501,00	$ -	$ 4.539.501,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.907,00	$ -	$ 44.147.907,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.004.115,00	$ -	$ 200.004.115,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA EL OSO

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA EL OSO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Socialización metodología social comunitaria, junto a selección de proveedores de la vereda el oso del municipio de planadas, reunion componente social junto a la territoral invias,Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, toma de coordenadas en el sector de la placa huella
*Se envía copia de los estudios aprobados y cantidades de obra para realizar estudio de mercado para selección de proveedores veredas el oso,el jordan san isidro y el recreo en el municipio de Planadas
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2052-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 198.985.230,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	115
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.364.207,00	$ -	$ 149.364.207,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.480.926,00	$ -	$ 4.480.926,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.140.097,00	$ -	$ 44.140.097,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.985.230,00	$ -	$ 197.985.230,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA RECREO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* socialización metodología social comunitaria, junto a selección de proveedores de la vereda el recreo del municipio de planadas, reunion componente social junto a la territoral invias,Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, toma de coordenadas en el sector de la placa huella
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

D

2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO SOLIDARIO
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2030-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.711.608,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.711.608,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.033.818,00	$ -	$ 151.033.818,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.015,00	$ -	$ 4.531.015,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.775,00	$ -	$ 44.146.775,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.711.608,00	$ -	$ 199.711.608,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA EL JORDAN

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA EL JORDAN

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* socialización metodología social comunitaria, junto a selección de proveedores de la vereda el jordán del municipio de planadas, reunion componente social junto a la territoral invias.Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, toma de coordenadas en el sector de la placa huella
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024 *

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** Jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2278-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 200.212.157,00
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 200.212.157,00
FECHA DE REANUDACIÓN:		**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	N/A
PLAZO ACUMULADO:			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	116
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.550.790,00	$ -	$ 150.550.790,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.516.524,00	$ -	$ 4.516.524,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.843,00	$ -	$ 44.144.843,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.212.157,00	$ -	$ 199.212.157,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

INSPECCION PLACA HUELLA VEREDA LA AURORA

Foto 2

INSPECCION PLACA HUELLA VEREDA LA AURORA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Reunion componente social junto a la territoral invias,Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2278-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.820.453,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.820.453,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	153
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.139.084,00	$ -	$ 151.139.084,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.534.173,00	$ -	$ 4.534.173,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.196,00	$ -	$ 44.147.196,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.820.453,00	$ -	$ 199.820.453,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA SAN ISIDRO

Foto 2



TOMA DE MUESTRA - CARACTERIZACON SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Socialización metodologia social comunitaria, junto a selección de proveedores de la vereda san isidro del municipio de planadas, reunion componente social junto a la territoral invias,
*Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, toma de coordenadas en el sector de la placa huella, toma de coordenadas geograficas en el sector de la placa huella
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RIOBLANCO

2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2716-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ALFONSO CARRILLO DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALFONSO CARRILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.354.094,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.354.094,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	119
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.688.060,00	$ -	$ 150.688.060,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.520.642,00	$ -	$ 4.520.642,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.392,00	$ -	$ 44.145.392,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.354.094,00	$ -	$ 199.354.094,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS. Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial

Del 04/07//2025 al 31/07/2025

2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2854-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 11/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.295.900,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.295.900,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	117
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.598.897,00	$ -	$ 151.598.897,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.547.967,00	$ -	$ 4.547.967,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.036,00	$ -	$ 44.149.036,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.295.900,00	$ -	$ 200.295.900,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2676-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 12/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 193.060.349,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 193.060.349,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	6
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 143.634.148,00	$ -	$ 143.634.148,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.309.024,00	$ -	$ 4.309.024,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.117.177,00	$ -	$ 44.117.177,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 192.060.349,00	$ -	$ 192.060.349,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Del 04/07//2025 al 31/07/2025

2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2663-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.691.981,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.691.981,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	107
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.014.837,00	$ -	$ 151.014.837,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.530.445,00	$ -	$ 4.530.445,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.699,00	$ -	$ 44.146.699,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.691.981,00	$ -	$ 199.691.981,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Del 04/07//2025 al 31/07/2025

2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2833-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.618.622,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.618.622,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	107
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.976.772,00	$ -	$ 149.976.772,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.499.303,00	$ -	$ 4.499.303,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.142.547,00	$ -	$ 44.142.547,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.618.622,00	$ -	$ 198.618.622,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ROVIRA

4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO | VERSION | PÁGINA

FECHA: 31/06/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4093-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO DEL MUNICIPIO ROVIRA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.452.139,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.452.139,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	192
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.749.999,00	$ -	$ 151.749.999,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.552.500,00	$ -	$ 4.552.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.640,00	$ -	$ 44.149.640,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.452.139,00	$ -	$ 200.452.139,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Del 04/07//2025 al 31/07/2025

4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4031-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO DEL MUNICIPIO ROVIRA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.758.515,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.758.515,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	181
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.046.301,00	$ -	$ 152.046.301,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.561.389,00	$ -	$ 4.561.389,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.825,00	$ -	$ 44.150.825,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.758.515,00	$ -	$ 200.758.515,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El dia 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El dia 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El dia 17 de julio de 2025 Se envia solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4087-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO ROVIRA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.905.476,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.905.476,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	186
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.221.312,00	$ -	$ 151.221.312,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.639,00	$ -	$ 4.536.639,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.525,00	$ -	$ 44.147.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.905.476,00	$ -	$ 199.905.476,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

* El dia 04 junio de 2025 Se realizo la socializacion feria de servicios con los 45 convenios en el centro recreacional Comfalolima.
* El dia 16 junio de 2025 Se elaboro la documentacion para la prorroga del convenio
* El dia 16 de junio de 2025 se envia solicitud de la colaboración del ingeniero Renzo para la aprobación de las pólizas cargadas a la plataforma Secop II
* El 17 de junio se solicita al director y supervisor el ajuste de inconsistencias que se identificaron en la información recibida de INVIAS por parte de la empresa INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S (responsable de los estudios de suelos)
* El dia 19 de junio de 2025 envio y cargue de las polizas al secop ii del respectivo convenio. por lo tanto el dia 19 de junio Se envia soporte cuenta de cobro abril 2025 – informe interventoria CTO 3555-2024
* Reunión solicitada por la dirección de interventoria el dia 20 de junio de 2025 , Por otro lado se realizo Solicitud firma del director para MEPIS de proceso prórroga y suspensión.
* Se envia expediente contractual del convenio, del primer desembolso a INVIAS Bogotá, el dia 21 de junio de 2025
* El dia 26 de junio de 2025 Se remiten facturas a la supervisión del mes de Diciembre, Enero Febrero y Marzo, ya cargadas en la plataforma SIIF NACIÓN para seguimiento.
* El dia 01 de julio de 2025, Se solicita reunión para capacitación financiera por parte de la profesional Tania Manilla INVIAS

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SALDAÑA

2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2131-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO SALDAÑA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.022.497,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 200.022.497,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	155
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contencio	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.367.367,00	$ -	$ 150.367.367,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.511.021,00	$ -	$ 4.511.021,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.109,00	$ -	$ 44.144.109,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.022.497,00	$ -	$ 199.022.497,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

Foto 2



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Se realiza levantamiento topografico por parte de la inteventoria.
*Revision de socumentos para pago a proveedores
*Remisión de estudios de caracterización realizados por la empresa Concrelab para revisión de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chípalo municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canadá escocia municipio de Icononzo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio Saldaña *Solicitud d everificacion y posible aprobacion de la progroamcion plan de cargas CTO 3555-2024
*Envió de programación para Socialización metodologia social comunitaria y programación de reunión selección de proveedores para el dia 22 de julio
*Se envian formatos firmados para Placa huella vereda pueblo nuevo en el municipio de Saldaña Tolima *

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

D

SAN LUIS

3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3399-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO SAN LUIS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.895.992,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.895.992,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	162
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.212.139,00	$ -	$ 151.212.139,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.364,00	$ -	$ 4.536.364,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.489,00	$ -	$ 44.147.489,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.895.992,00	$ -	$ 199.895.992,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SUAREZ

2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2153-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA DEL MUNICIPIO SUAREZ - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	15/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.415.903,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.415.903,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	168
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.714.954,00	$ -	$ 151.714.954,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.551.449,00	$ -	$ 4.551.449,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.500,00	$ -	$ 44.149.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.415.903,00	$ -	$ 200.415.903,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
INSPECCION PLACA HUELLA	**INSPECCION PLACA HUELLA**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS
*Revisión de documentos para pago de proveedores
*Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing residente, contador, maestro obra
*Envio de levantamiento topográfico de la vereda La salada municipio de Suarez
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

VENADILLO

2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2156-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA DEL MUNICIPIO VENADILLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.991.913,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.991.913,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contensió	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.304.906,00	$ -	$ 151.304.906,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.539.147,00	$ -	$ 4.539.147,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.860,00	$ -	$ 44.147.860,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.991.913,00	$ -	$ 199.991.913,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA LA PLANADA	SOCIALIZACION VEREDA LA PLANADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Terminacion de selección de proveedores
*Revision pago a proveedores
*Solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador y maestro
*Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

Firma

Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

VILLARICA

2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2465-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL DEL MUNICIPIO VILLARICA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.120.337,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.120.337,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	135
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.494.872,00	$ -	$ 149.494.872,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.484.846,00	$ -	$ 4.484.846,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.140.619,00	$ -	$ 44.140.619,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.120.337,00	$ -	$ 198.120.337,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
TOMA DE MUESTRAS. - CARACTERIZACION SUELO	TOMA DE MUESTRAS. - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunion componente social junto a la territoral invias,Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS
* Remisión de estudios de caracterización realizados por la empresa Concrelab para revisión de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chipalo municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canadá escocia municipio de Icononzo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio Saldaña. *Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2452-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIOLINDO DEL MUNICIPIO VILLARICA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIOLINDO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 06/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.427.032,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.427.032,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	135
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.758.600,00	$ -	$ 150.758.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.522.758,00	$ -	$ 4.522.758,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.674,00	$ -	$ 44.145.674,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.427.032,00	$ -	$ 199.427.032,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1.INTRODUCCION

El Consorcio Vial JJ, postula sus experiencia en ejecución, estructuración, seguimiento y control de proyectos, participando en el proceso licitatorio con Objeto contractual de interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para los convenios o contratos suscritos entre el INVIAS con organismos de acción comunal o comunidades étnicas para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías regionales de la zona sur oriente en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 3.

Proceso derivado de la estrategia del Gobierno Nacional Caminos para la Paz Total, canalizado, estructurado y dirigido por el Instituto Nacional de vías INVIAS, el cual propone que las mismas comunidades identifiquen sus necesidades frente al mejoramiento de las vías terciarias de sus territorios, y sean los ejecutores de obras de infraestructura vial.


Por ende el Consorcio Vial JJ, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato 3555-2024, realiza seguimiento y control a cuarenta y cinco (45) convenios solidarios a desarrollarse en el Departamento del Tolima.

2.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.1 LOCALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se encuentra Ubicado en veintidós (21) municipios del departamento del Tolima; Alvarado, Anzoátegui, Armero Guayabal, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Icononzo, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Rio Blanco, Rovira, Saldaña, San Luis, Suarez, Venadillo, Villarrica, donde la construcción de mejoramiento vial se realizara en cuarenta y cinco (45) convenios solidarios pertenecientes al sector rural de los municipios relacionados

.

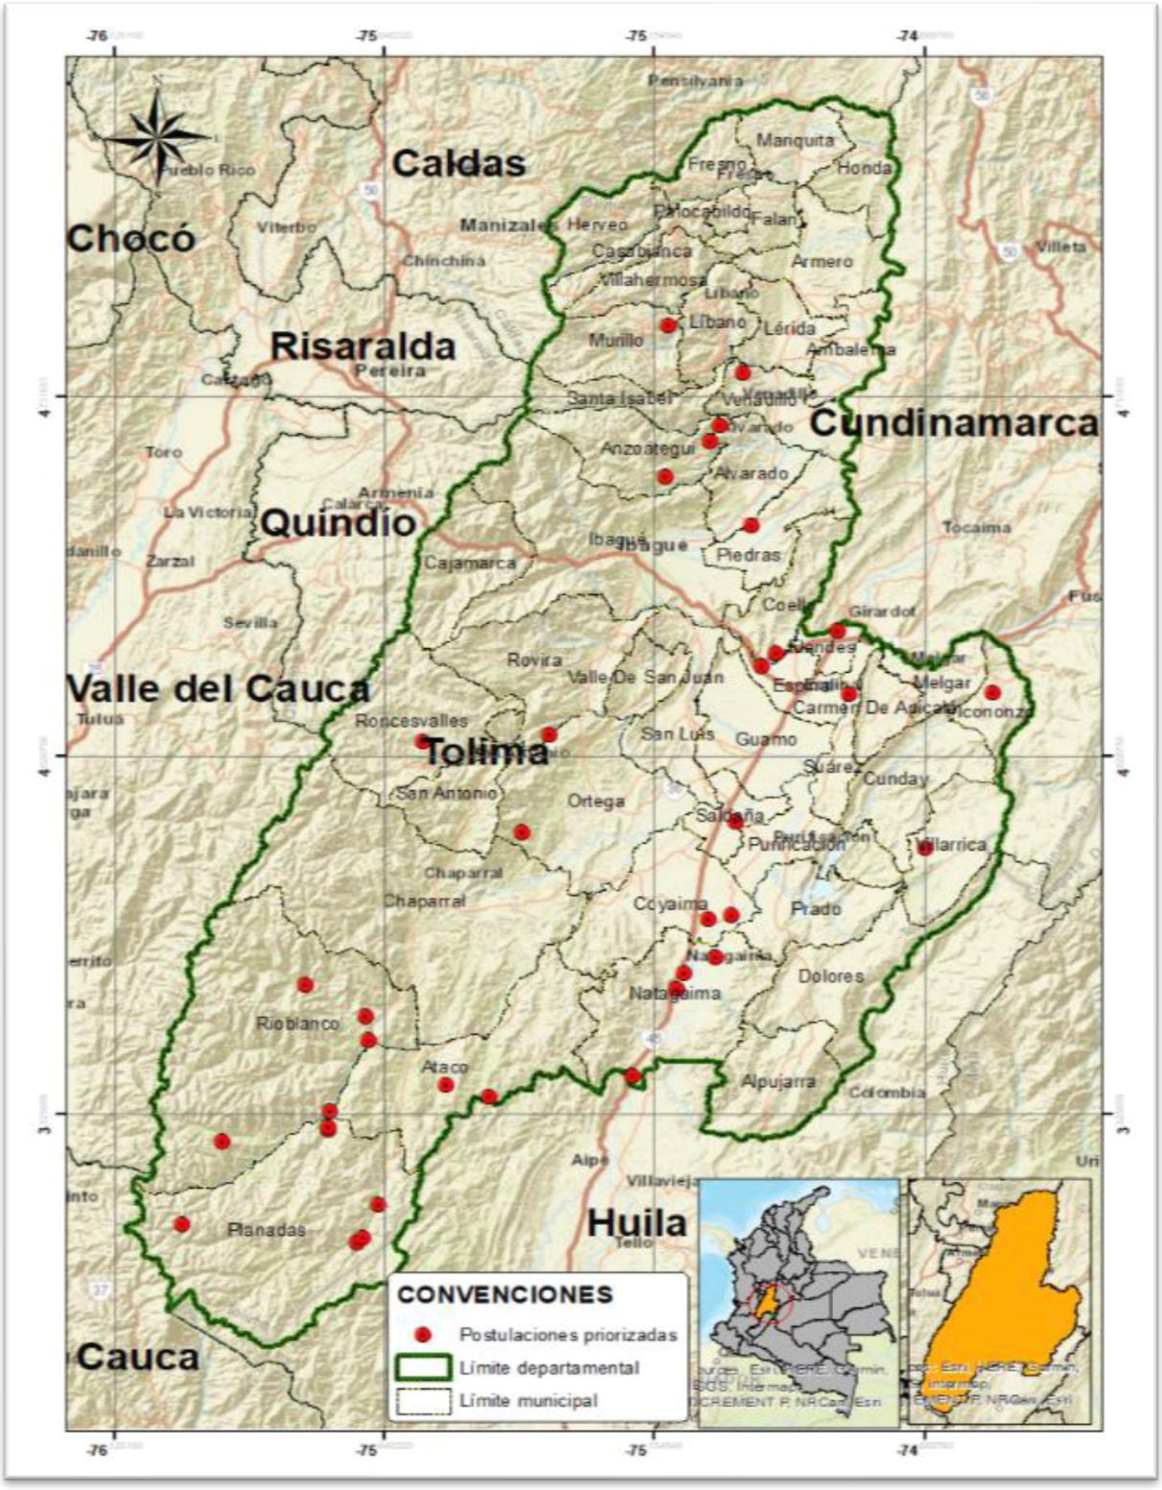
Caldas
Chocó
Risaralda
Cundinamarca
Quindío
Valle del Cauca
Tolima
Huila
Cauca
Pensilvania
Manizales
Pereira
Armenia
Ibagué
Neiva
Popayán
CONVENCIONES
Postulaciones priorizadas
Límite departamental
Límite municipal


Para lo anterior el Instituto Nacional de vías INVIAS realizo entrega de soportes topográficos y estudio de suelos, puntualmente relacionada con la zona de intervención, siendo estos insumo de análisis de los especialistas en diseño, construcción de pavimento y diseño geométrico de vías adscritos al equipo profesional del Consorcio Vial JJ, quienes sustentaran técnicamente la obra de mejoramiento que se debe implementar en cada tramo identificado, procediendo a realizar un comité operativo donde se toman todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera, como también estando atentos a presentación de ajustes técnicos que se consideren necesarios para optimizar los recursos, en este punto será importante contar con las hojas de vida aprobadas del personal profesional que cumplirá la función directa de asesoría física y financiera dentro del Organismo de Acción Comunal y/o comunidad étnica, necesaria para el perfeccionamiento del convenio, que dará paso a la firma de acta de inicio de Obra.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto enmarcado en la estrategia del Gobierno Nacional caminos comunitarios para la Paz Total, tendrá convenios comunitarios suscritos con organismos de acción comunal o comunidades étnicas, ubicadas en veredas del municipio del Tolima , en beneficio de comunidades que no cuentan con una infraestructura vial optima, permitiendo mejorar sus condiciones de comunicación terrestre en los tramos determinados y distribuidos de la siguiente manera:


ALVARADO

4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

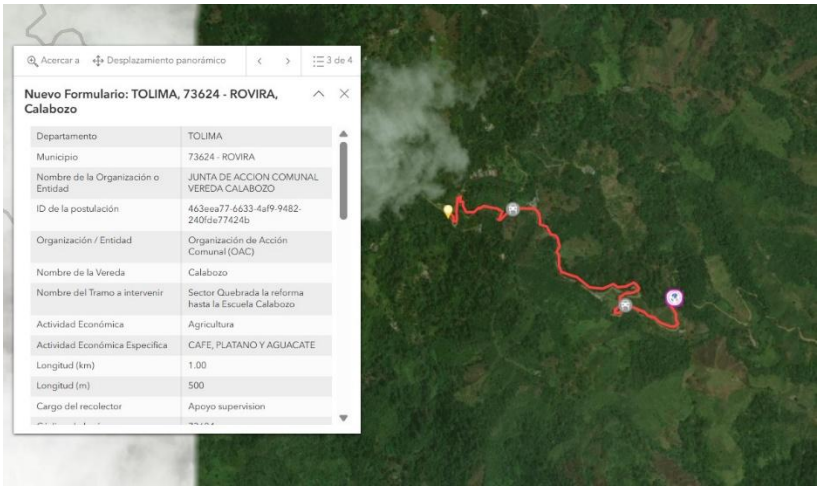

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui


4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

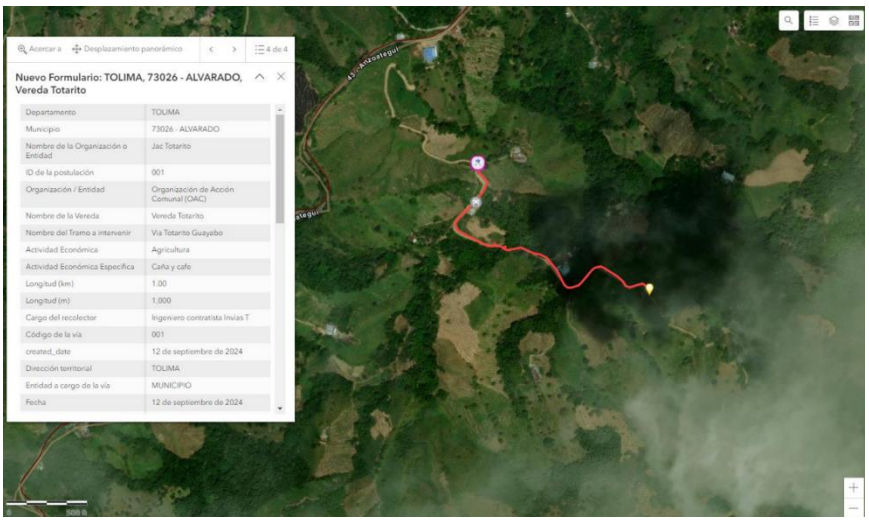

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles.


ANZOATEGUI

2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

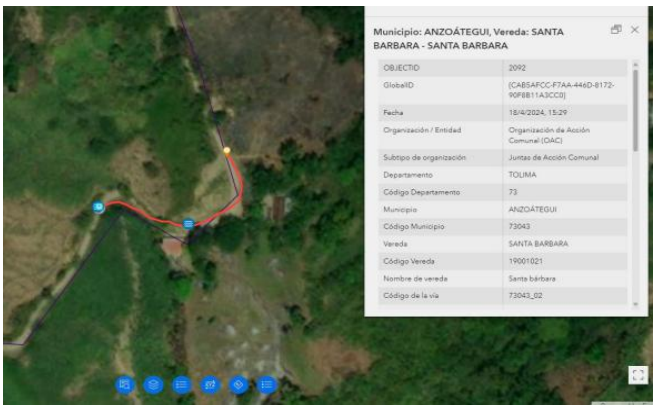


El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda Santa Barbara, en el corredor vial denominado vereda Santa Bárbara desde Finca San Jorge a casa El Milagro.

2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

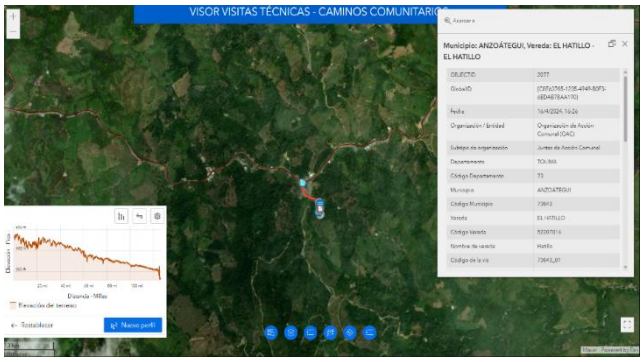

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión.

2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

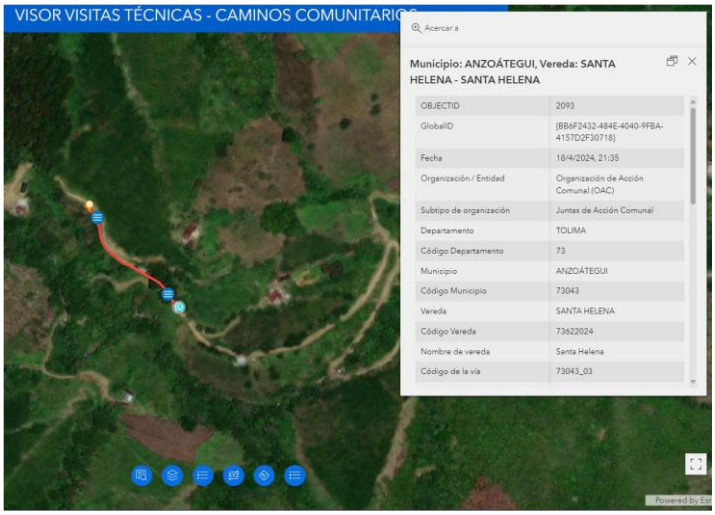


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda Santa Helena, del tramo comprendido en la vía que comunica la vereda Santa Helena con el municipio de Anzoátegui en el corredor vial denominado Vía Escuela - Vereda Santa Helena, tomando

como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la entrada de acceso a la finca Santa Helena y el punto final de referencia es PR00+140

ARMERO


3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

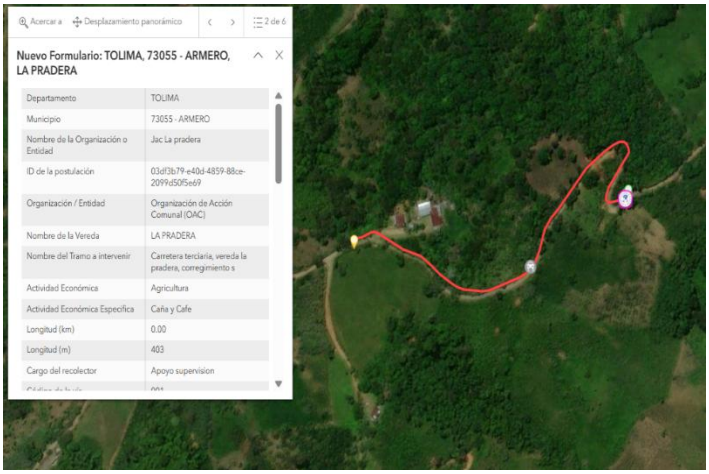

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de **0,403 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero


CAJAMARCA

3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

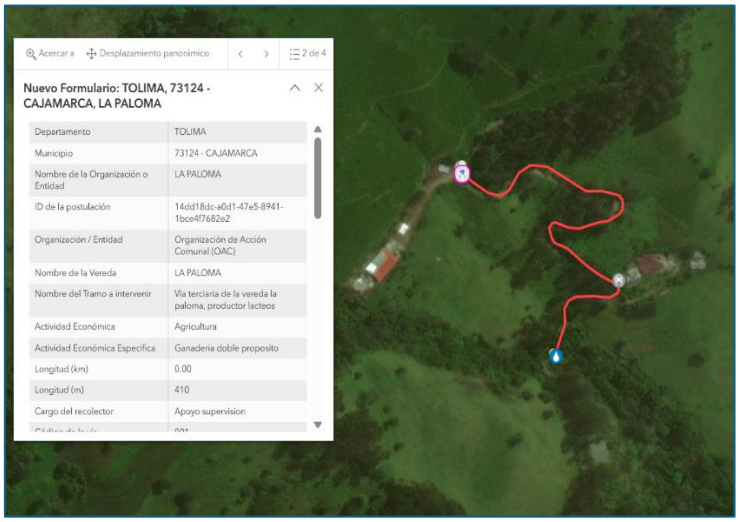

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la “Guala” – Diamante que tiene una longitud de atención de **0,41 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja


3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

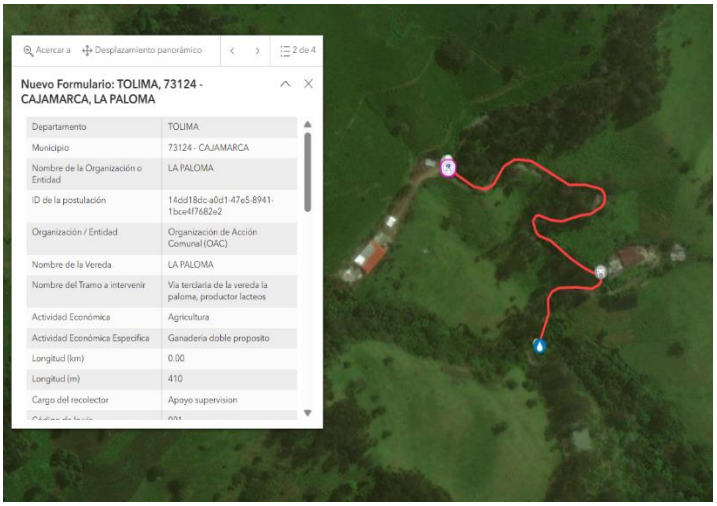

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta


CASABIANCA

2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

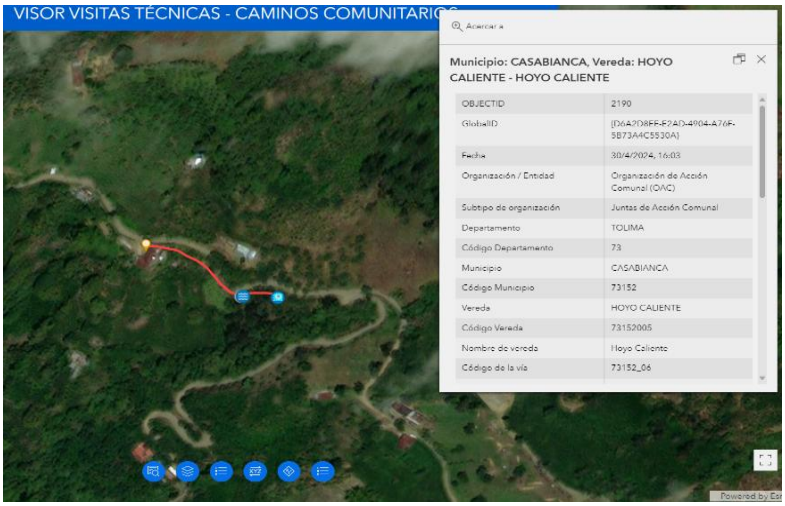

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Casabianca del departamento de Tolima en la vereda Hoyo Caliente, en la vía que comunica la vereda Hoyo Caliente con el casco urbano de Casabianca con una longitud de 0,139 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el cafetal de la señora Luz Garzón, y el punto final de referencia el PR00+139 al frente de la casa de Luz Garzón.


2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

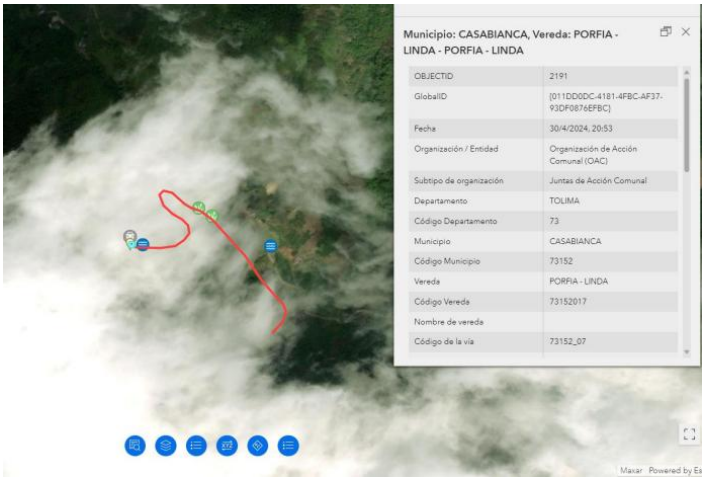

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Casabianca del departamento de Tolima en la vereda Porfia Linda, en la via que comunica la vereda Porfia Linda con el casco urbano de Casabianca en el corredor vial de la vereda Porfia Linda – Repecho con una longitud de atención de 0,570 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de Guillermo Valencia,

COELLO


2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

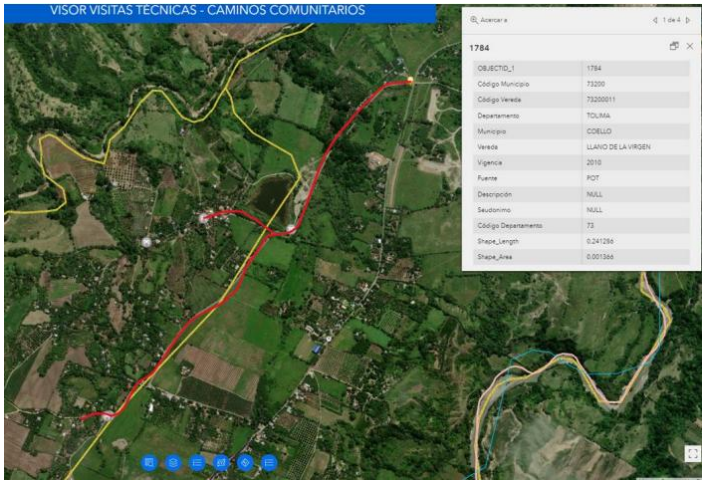

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de COELLO del departamento de Tolima en la vereda Llano de La Virgen, en el corredor vial denominado Coello Llano de la Virgen que tiene una longitud de 1,6 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 sobre baden existente que limita la vereda Llano de la Virgen con la Vereda la Arenosa y el punto final de referencia es el PR1 +565 en la intersección de la vía hacia Coello, portón Triturados del Tolima


COYAIMA

3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

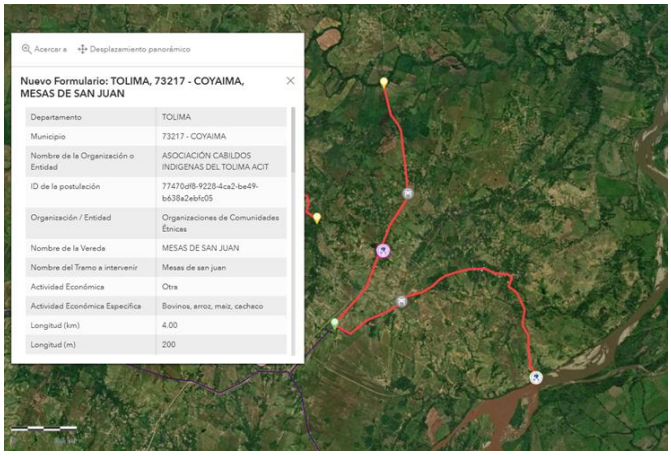


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en la asociación de cabildos indígenas del Tolima, en el corredor vial denominado mesas de san juan, con una longitud de 4,2 km, el punto de inicio de referencia es en el PR0+000 en la entrada a la vereda mesas de inca y el punto final de referencia es en el PR4+200 puente de la quebrada Larco

3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

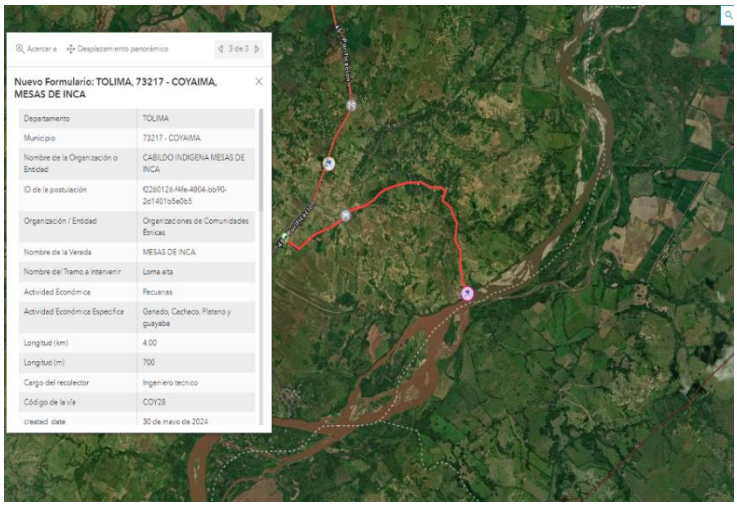

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.


3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

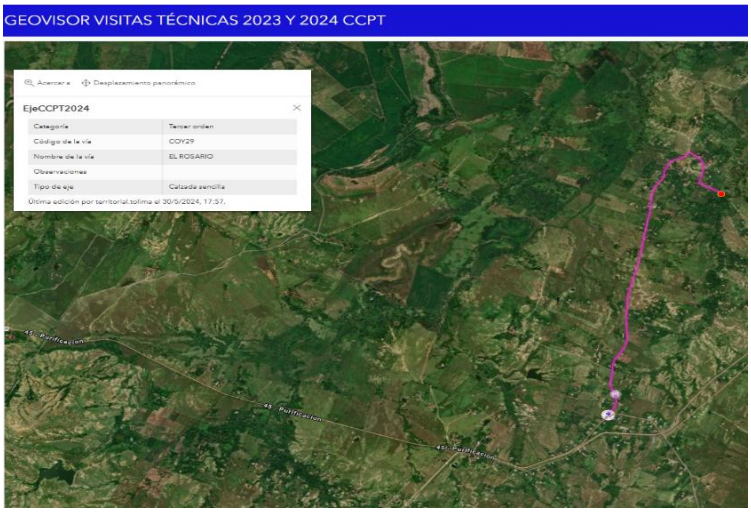

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la “Y” y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden

ICONONZO


2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA

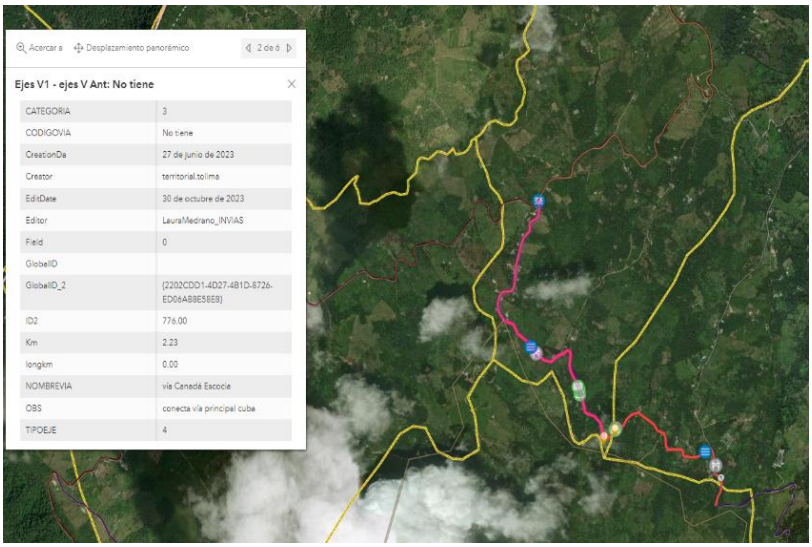

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Icononzo del departamento de Tolima en la vereda Canadá Escocia, en el corredor vial denominado Icononzo – vía Villarrica - Vereda Canadá Escocia finalizando con la intersección de los Cruces Guamitos y Cruce Dosquebradas, que tiene una longitud de 3,00 km, tomando como punto de inicio de referencia PR0+000 frente de la finca del señor Jairo García (subiendo a mano izquierda) y punto final de referencia PR03+000 donde finaliza la finca de don Jairo García

MURILLO


2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

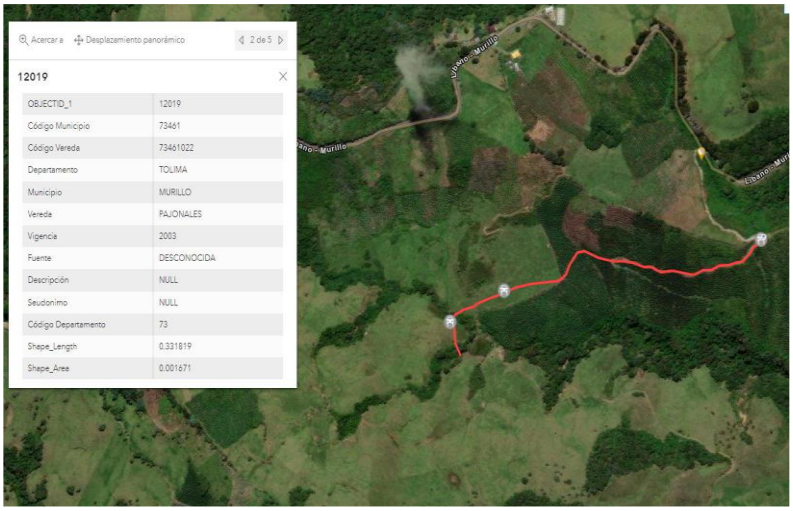

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MURILLO del departamento de Tolima, en la vereda Pajonales al norte del municipio de MURILLO a 13.4 Km del casco urbano y sobre la vía que conduce del Municipio de MURILLO al Municipio de Carmen de Apicalá. En el tramo comprendido desde la vereda Pajonales-vereda pradera alta-vereda cajones que tiene una longitud de atención de 0.72 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio de la placa huella por ejecutar, y punto final de referencia PR0+720.


NATAGAIMA

2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO

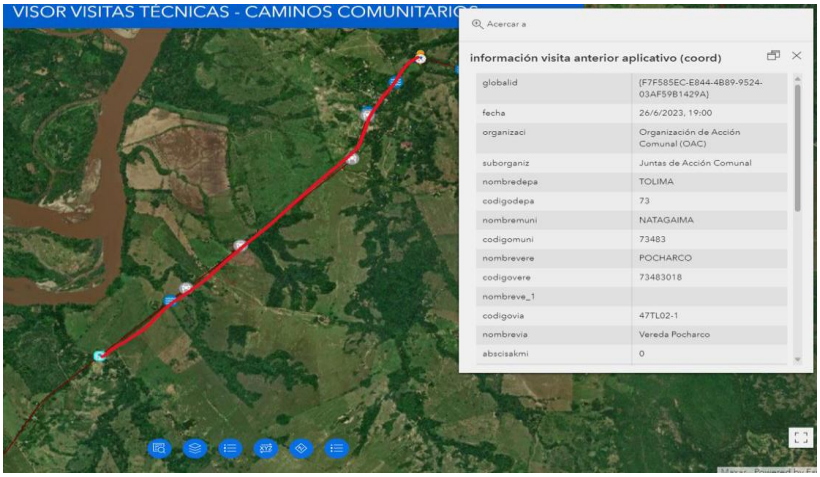


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la vereda Pocharco, en el corredor vial que conduce de la Cabecera municipal a la vereda Pocharco en el tramo de la quebrada Damas a la quebrada Jagual que tiene una longitud de atención de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 sobre quebrada Jagual y el punto final de referencia es el PR3+000 en la quebrada Pocharco.

3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO

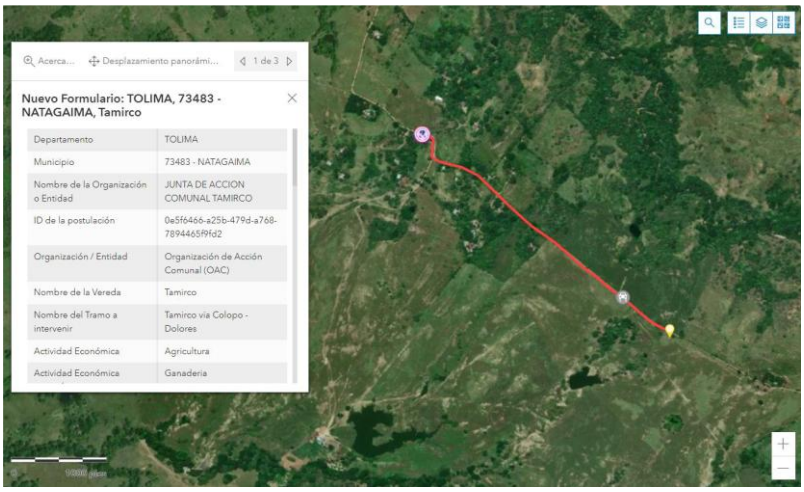


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la vereda Tamirco, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la institución educativa Policarpa Salavarrieta con el sector Peñas Negras que tiene una longitud de atención de 1,1 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca Las Palmas y el punto final de referencia es el PR1+100 de la vivienda de Teófila

3247 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

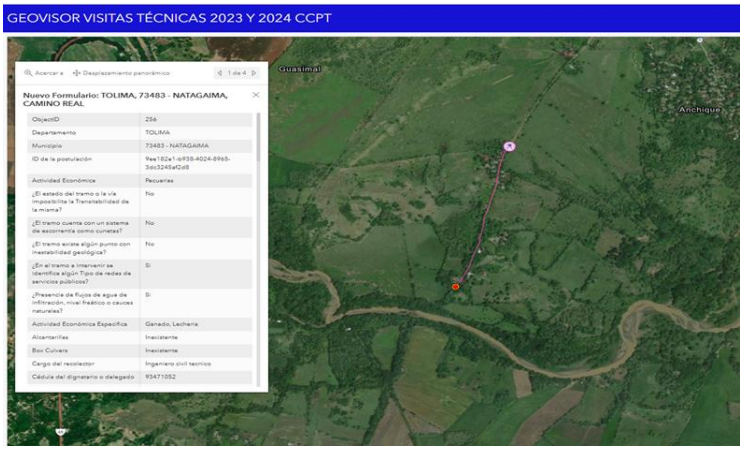


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima departamento de Tolima, al norte del municipio de Natagaima a 0.82 Km del corredor vial denominado COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Lote llamado piedra grande, y punto final de referencia PR0+820 donde finaliza

3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

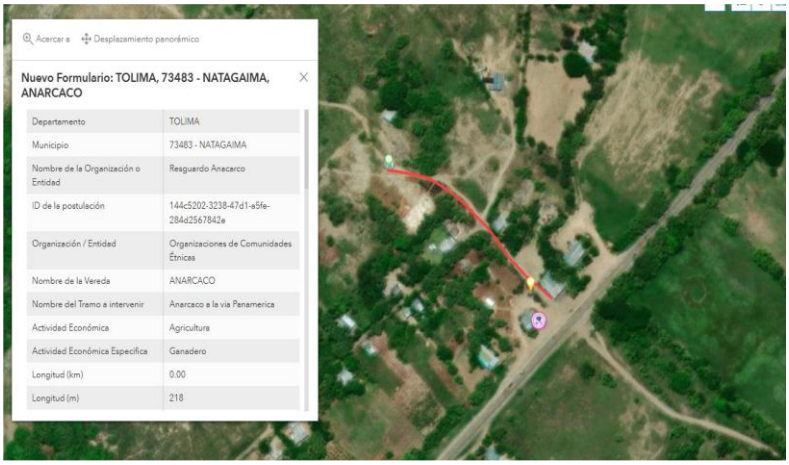


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima departamento del Tolima en la vereda Anacarco, en el corredor vial denominado entrada de el resguardo indígena Anacarco hasta el polideportivo de el mismo, con una longitud de 0,22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía panamericana.

3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

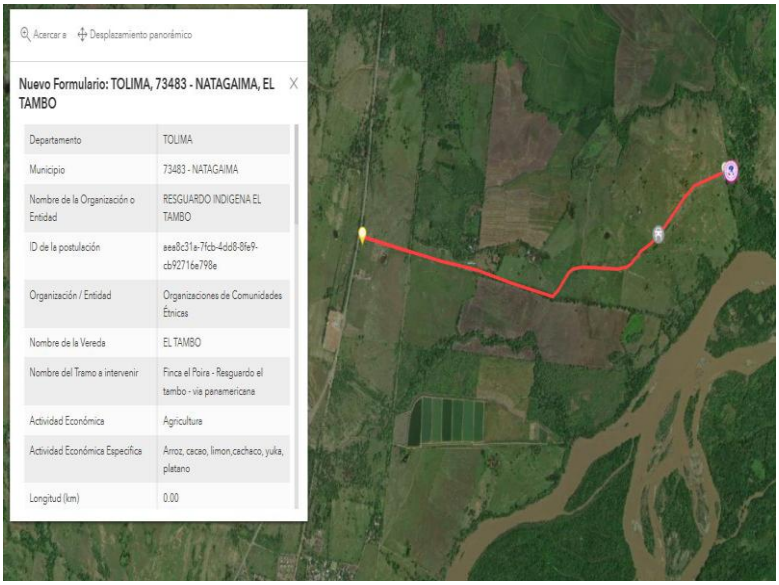

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento del Tolima en el resguardo indígena el tambo, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica de la carretera a la finca el Poira vereda Baloca con una longitud de atención de **2,9 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el mojón de la entrada al resguardo, y el punto final de referencia es PR2+900 en la intersección vía panamericana.


3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

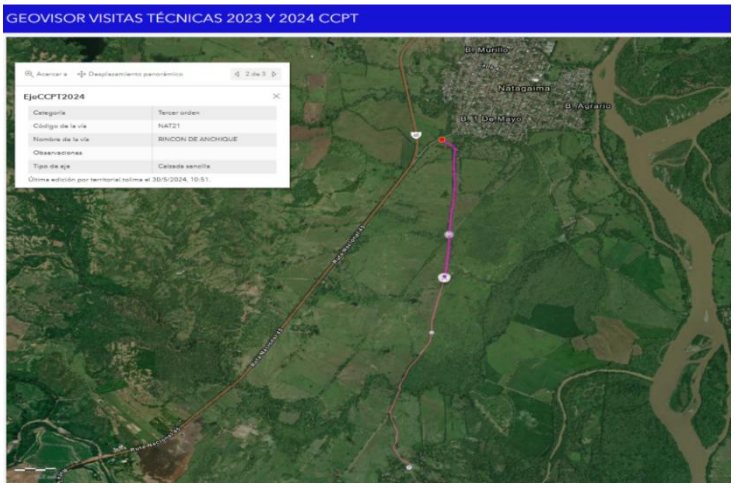

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en el resguardo indígena rincón de Anchique, en el corredor vial denominado carretera nacional que conduce al sector agua fría, que tiene una longitud de 1,53 km, tomando como punto de inicio PR0+000 de referencia el sector agua fría – Entrada al resguardo y el punto final de referencia es el PR1+053 intersección vía panamericana


ORTEGA

2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE

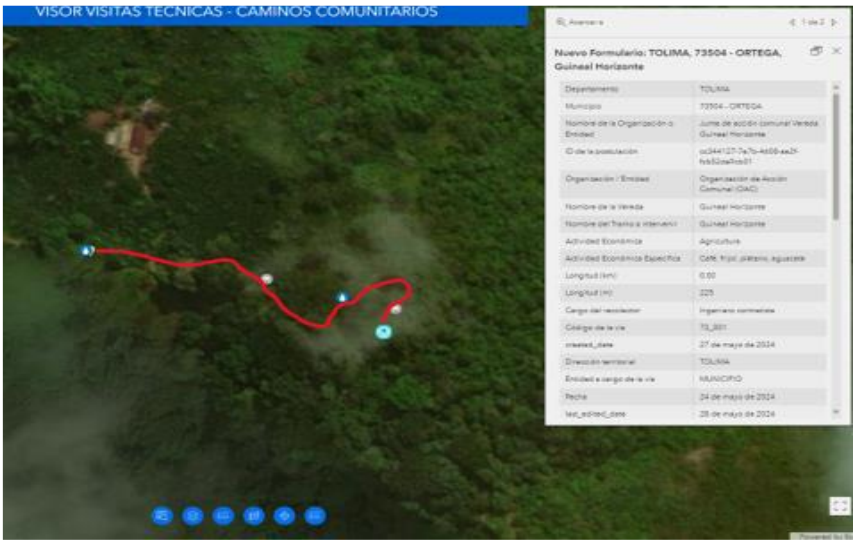

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ortega del departamento de Tolima en la vereda Guineal Horizonte, en el tramo comprendido en la vía que comunica Guineal las Palmas hacia la vereda Leticia que tiene una longitud de atención de 0,225 km, tomando como punto de inicio dereferencia el PR0+000 Finca Mirador 1, y el punto final de referencia es PR0+225 en la casa de Elkin Samper


2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

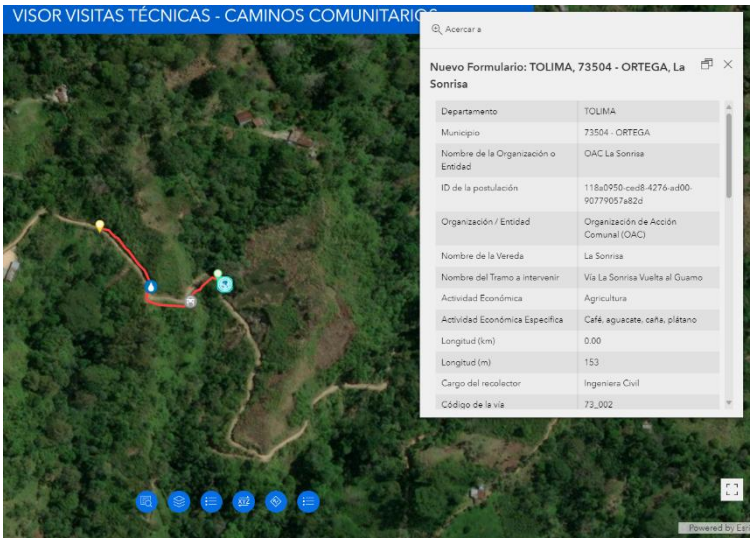

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ortega del departamento de Tolima en la vereda La Sonrisa, en el corredor vial denominado La Sonrisa – Vuelta al Guamo que comunica con el municipio de Ortega que tiene una longitud de atención de **0,153 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Después de la quebrada Maculito en el límite, y el punto final de referencia es PR 0+0153 en la curva del lote La Esmeralda

PALOCABILDO

3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI

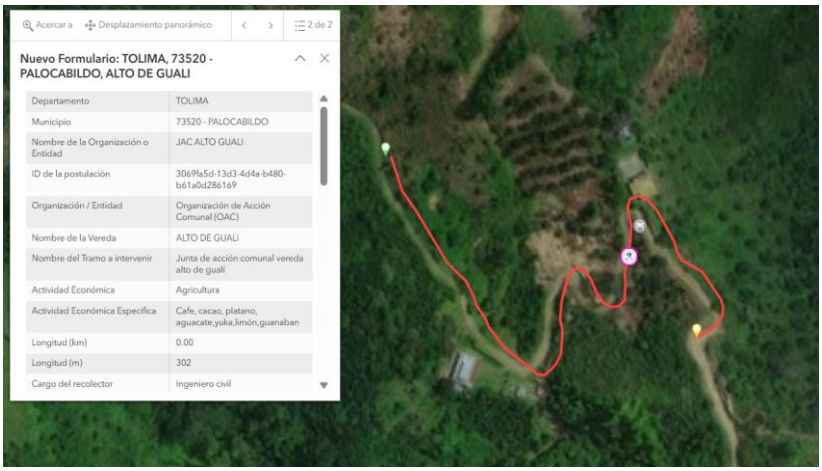


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Palocabildo del departamento de Tolima en la vereda Alto del Gualí, en el corredor vial del tramo comprendido Junta de acción comunal vereda alto del Gualí que tiene una longitud de atención de **0,302 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0

+000 en la finca La primavera y el punto final de referencia es el PR0+302 en el alto del chupo.

PIEDRAS

2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO

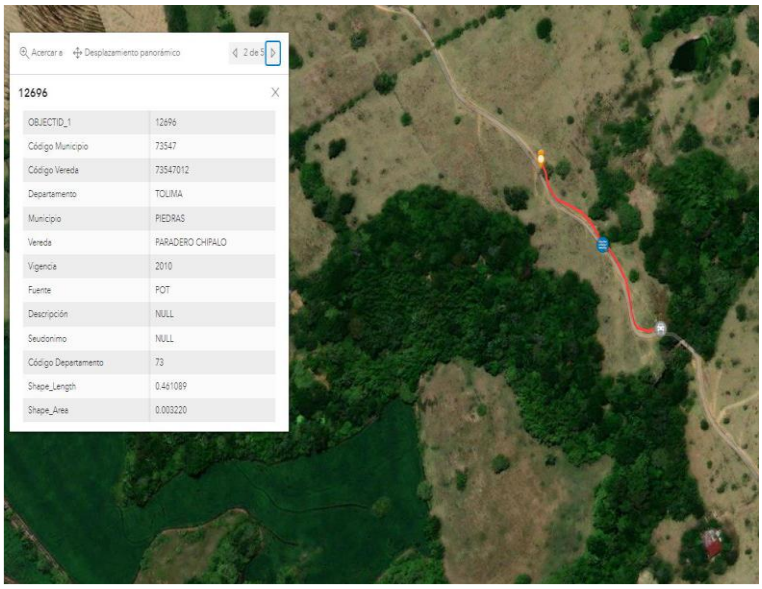

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de PIEDRAS del departamento de Tolima en la vereda Paradero Chípalo. En el tramo comprendido en la vía Tres puertas – Quebrada la Ventilla, que tiene una longitud de atención de 0.19 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio de la vía tres puertas, y punto final de referencia PR0+190

PLANADAS

2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO




El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas del departamento de Tolima en la vereda El Oso, en el corredor vial de la vereda La Unión – El Oso con una longitud de 0,181 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el sector del ETCR, y punto final de referencia PR 0+181 en el final del puente de la quebrada El Puerto,

2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas departamento del Tolima en la vereda el recreo, en el corredor vial denominado el recreo, con una longitud de 0,56 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 vía que comunica a Bilbao, y el punto final de referencia es PR0 +560

2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,

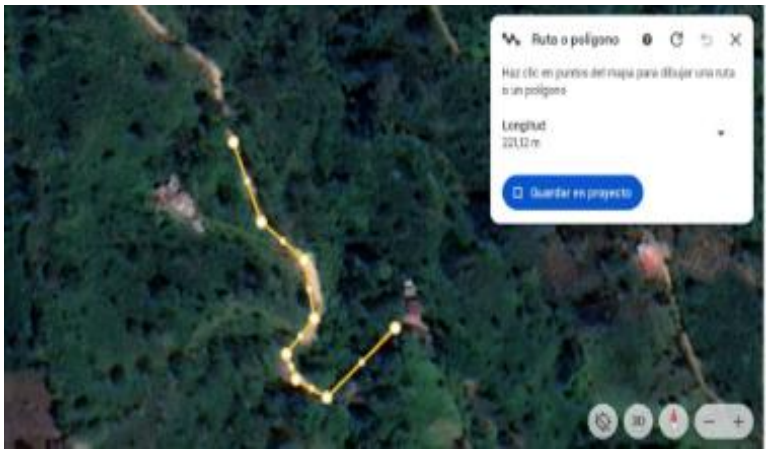


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas del departamento de Tolima en la vereda El Jordán, en el corredor vial denominado Vía Gaitania La Fonda que tiene una longitud de 0.256 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Finca Ricardo Castellanos, y el punto final de referencia es PR 00+256 Finca El Tesoro

2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Planadas del departamento de Tolima en la vereda La Aurora, en el corredor vial La Escuela con una longitud de 0,480 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la quebrada Aurora, y el punto final de referencia es PR00 +480 el polideportivo


2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

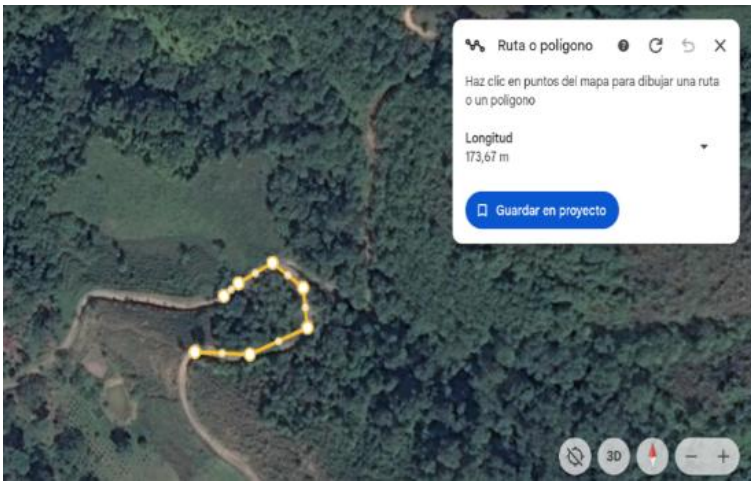

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Planadas del departamento de Tolima en la vereda San Isidro, en el corredor vial de la vereda Vía vuelta de Misingo con una longitud de 0,17 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 finca Bellavista , y el punto final de referencia es PR 0+153 finca la habitación de Ernesto Soto

2.2.15 RIOBLANCO


2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO

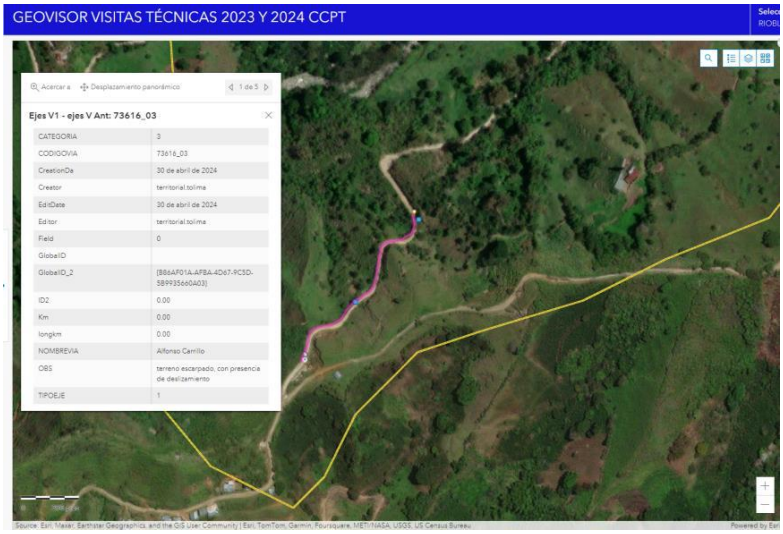

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda Alfonso Carrillo, en el corredor vial de la vereda Alfonso Carrillo – Rio Negro con una longitud de atención de 0,22 Km,


tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 sobre alcantarillaexistente y el punto final de referencia es el PR0+222 final de la placa huella proyectada.

2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

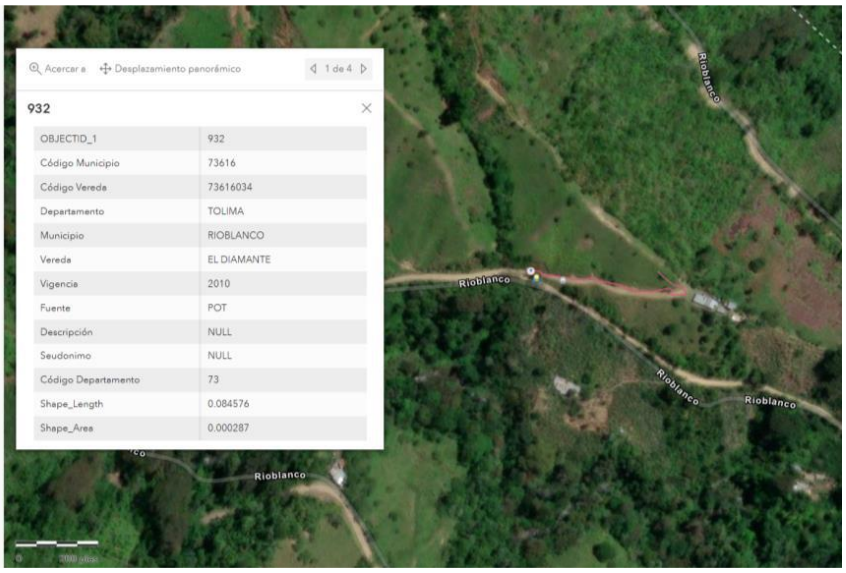

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda El diamante, del tramo comprendido en la vía Diamante – Las Juntas en el corredor vial *FINCA EL MIRADOR A FINCA EL TAMBOR* con una longitud de atención de **0.16 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 intersección vía a Bilbao Planadas, y el punto final de referencia es PR0+160 finca del señor Freddy Rubio


2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

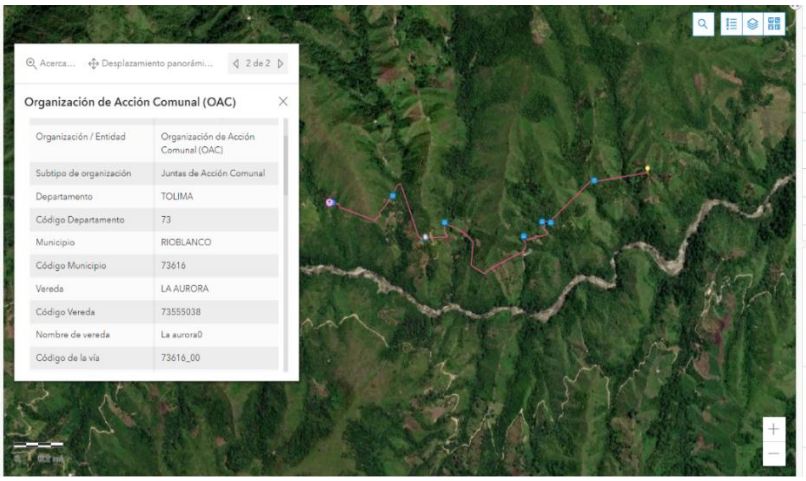

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda La aurora, en el corredor vial denominado La aurora con una longitud de 3.5 km, tomando como punto de inicio de


referencia el PR00+000, vivienda presidente JAC y el punto final de referencia es PR 3+500.

2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

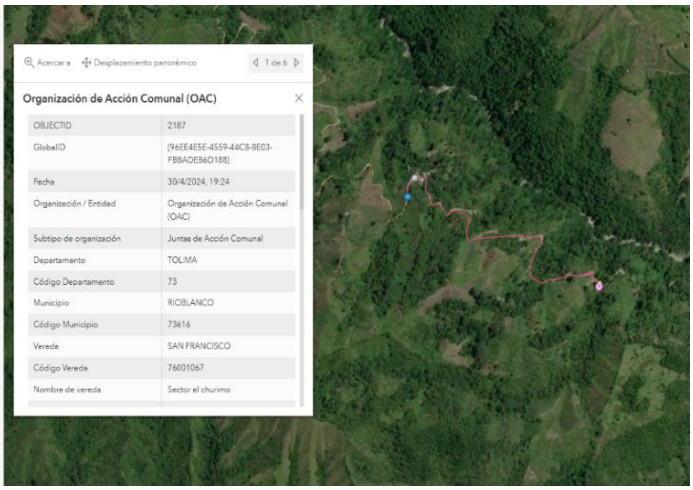

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda San francisco, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía Bocas - La Uribe de san francisco con una longitud de 1.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 badén de la quebrada El churimo


2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

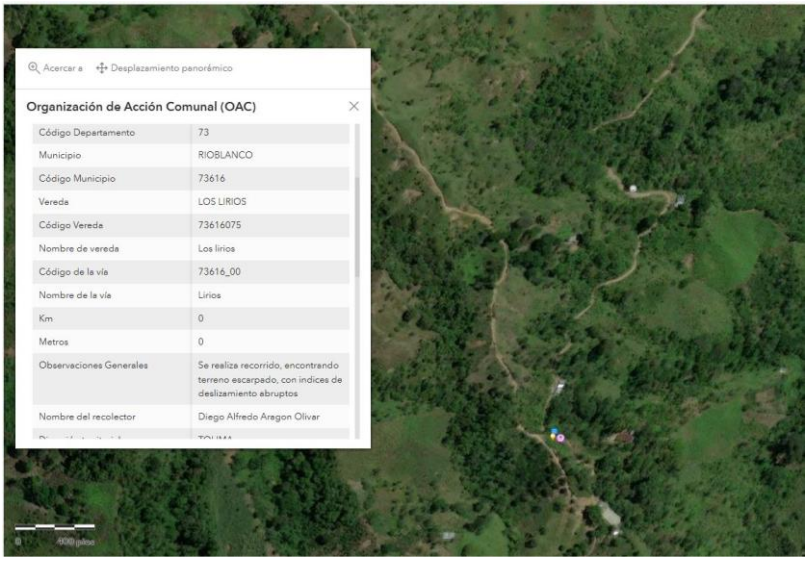

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda Los Lirios, en el corredor vial denominado Chele - Los lirios con una longitud de atención de **0,78 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Institución educativa Jesús Amézquita, y el punto final de referencia es PR0+780 paso en la sequía hacia chele.

. ROVIRA

4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

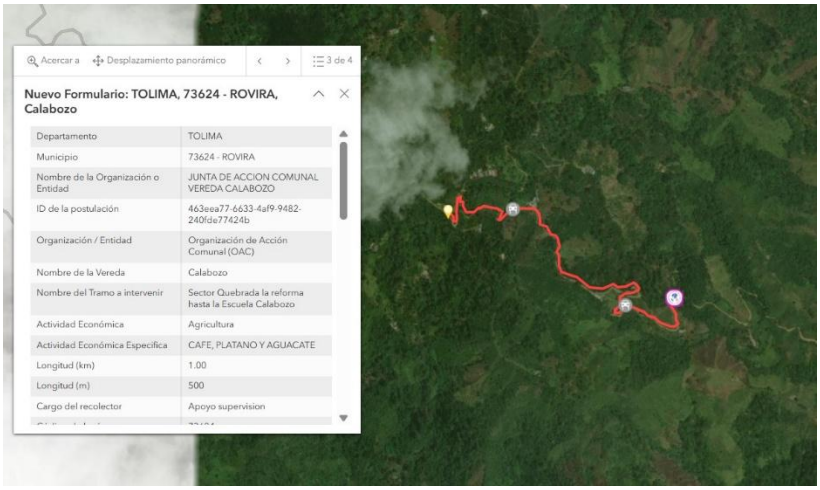

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda Calabozo, en el corredor vial comprendido de la vereda Calabozo hasta empalme de vía hacia Riomanso, que tiene una longitud de atención de **1,5 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la alcantarilla Higuerón – Ángel Alberto, y el punto final de referencia es PR 1+500 en la vivienda de Judith Barragán.

4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda de Hato Viejo, en el corredor vial comprendido de la vereda Hato viejo vía que comunica hacia la vereda La selva, que tiene una longitud de atención de **0,240 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la Y - vía la selva, y el punto final de referencia es PR 0+240 en el Baden quebrada Totumo,


4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda La Reforma, en el corredor vial del tramo comprendido de la Vereda La reforma vía que comunica Las Auras Colón, que tiene una longitud de atención de **0,645 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la Finca Aldemar Angarita - potrero, y el punto final de referencia es PR 0+645 en La Y - Ceiba la varita.

SALDAÑA


2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

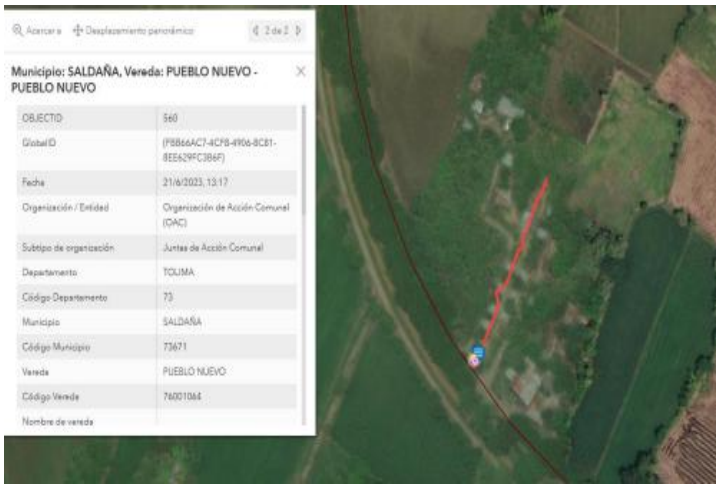

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Saldaña del departamento del Tolima en la vereda Pueblo Nuevo, en el tramo comprendido en la vía al costado de la Asociación de vivienda Pueblo nuevo que tiene una longitud de 0,160 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el caserío y el punto final de referencia es el PR00+160 en la intersección de la vía hacia Purificación.

SAN LUIS

3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

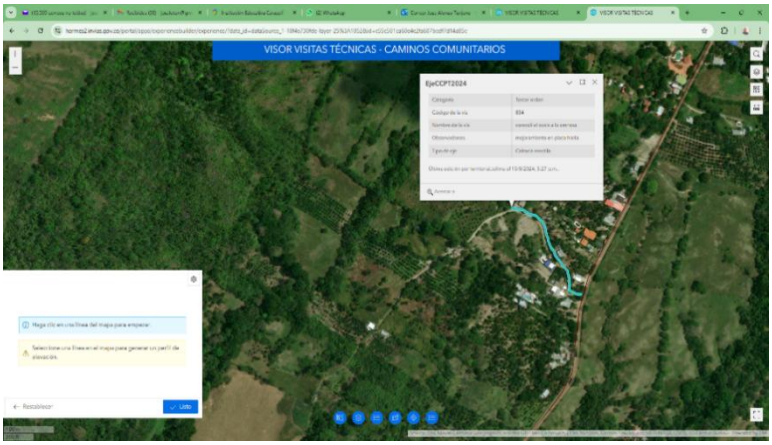


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN LUIS del departamento de Tolima en la vereda CARACOLÍ, en el corredor vial denominado CARACOLÍ de finca el Oasis a Finca La Arenosa que tiene una longitud de 1,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 La Vía que de Ibagué conduce al Valle de San Juan a doscientos metro de la institución Educativa CARACOLÍ y

el punto final de referencia es el PR0+162 sobre la Finca La Arenosa en el municipio de San Luis Tolima,

SUAREZ


2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA

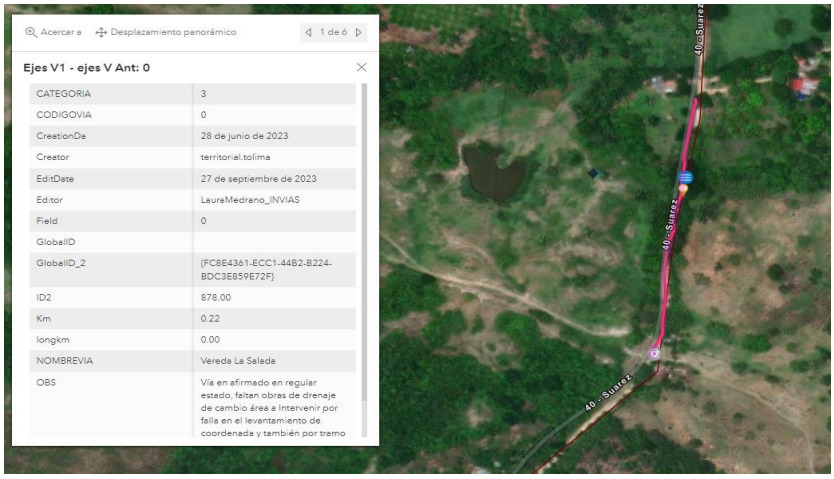

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SUAREZ en el departamento del Tolima, al norte del municipio de Suarez a 13.4 Km del casco urbano y sobre la vía que comunica EL PASO-SUAREZ-PURIFICACION-PRADO. El corredor vial denominado Vereda LA SALADA tiene una longitud de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000, y punto final de referencia PR00+168 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar

VENADILLO

2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

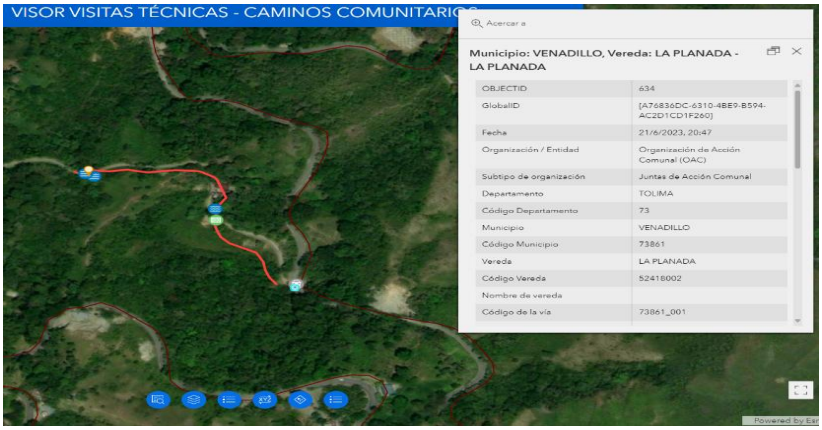


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Venadillo del departamento de Tolima en la vereda La Planada, en el corredor de la vía

que comunica la vereda la Planada a la Vereda La Aguada que tiene una longitud de 0,242 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Entrada a la Planada, y el punto final de referencia es PR00+242


VILLARICA

2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

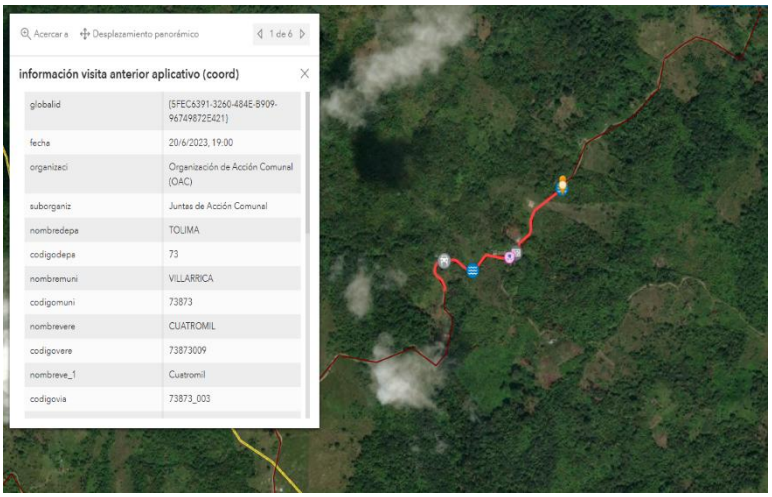

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villarrica del departamento de Tolima en la vereda Cuatro Mil, en el corredor vial RIO SECO - LA TIGRA con una longitud de 0,71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 rio seco, y el punto final de referencia es el PR0+710 quebrada la tigra

2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO

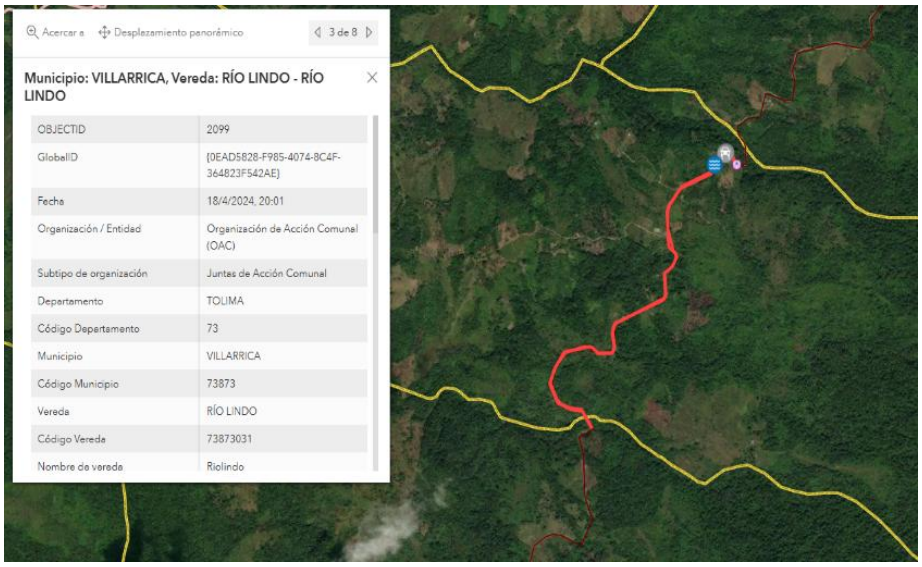

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villarrica del departamento de Tolima en la vereda Riolindo, en el corredor vial puente rio lindo a puente rio seco con una longitud de 2.6 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 puente Riolindo, y el punto final de referencia es el PR2+600 puente Rioseco

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -Invías y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas, los cuales se plantean según la cronología técnica en los siguientes ítems.

- Aprobación de Hojas de Vida
- Aprobación de Estudios y diseños
- Implementación cartilla INVIAS
- Seguimiento afiliación personal
- Cantidades de obra
- Cotizaciones materiales o insumos para la construcción
- Aprobación compra materiales o insumos para la construcción
- Construcción Placa Huella
- Construcción Alcantarilla
- Liquidación de convenio

Sujeto al estado inicial de la vía indicado por la OAC y a la verificación del mismos teniendo en cuenta la topografía e informe estudio de suelos entregado por INVIAS, la interventoría elevara concepto en diseño de pavimentos indicando si es viable la construcción de sistema de estructura vial como lo es la Placa Huella o si en el punto o zona de construcción se debe construir otra estructura de pavimento.

Proyecto que involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO (1)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	4047 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	**DESDE**	**HASTA**
	21/12/2024	31/03/2025
REINICIO CONVENIO	5 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	30 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jacveredaelbarroalvarado2021@gmail.com	
CELULAR	3108037623	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepcióna los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría envia los soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO - 4047-2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día 7de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y .el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC.& JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: LUZ MIRA MURILLO BUSTOS
CONVENIO No. 4047 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC.& JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 200.903.527,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 342.407.991,00 16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 342.407.991,00 16,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA: ..... NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A	
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y .el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4047DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100009005 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	30	6	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100099005 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100099005 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:52:05 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YYeAGMB+2Mx+M47nXQvhEw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100089005	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	900.022.701-4
DIRECCIÓN	VDA EL BARRO FCA DON MATEO	TELÉFONO	3108837623
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ALVARADO E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4047 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.798,00
PATRONAL	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.798,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.798,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,18
TOTAL A PAGAR	$	399.598,18

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA: APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100009085	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 900.022.701-4. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/10/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:50:04 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ckiYXzW4GoFU0Y6Eq3CMQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-CODI

No. PÓLIZA	I-100037196	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148864	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	900.022.701-4
DIRECCIÓN	VDA EL BARRO FCA DON MATEO	TELÉFONO	3108837623
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025 LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELCONVENIO SOLIDARIO NO. 4047 DE 2024, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.090.352,70	23.695,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.045.176,35	11.847,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.180.705,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.316.234,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.543,41
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.543,41
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.753,25
TOTAL A PAGAR	$	42.296,66

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA- AEF

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100037196	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148864	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.022.701-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO. 9
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/10/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4047 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO **NIT** 900022701 4

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
													-		-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
													-		-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
TOTALES		-											-	-	-	-	-	-	-	198.557.901,56	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO

VERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

CONVENIO No. 4047 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366050001325 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.903.527,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO NIT 900022701 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:10240:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:9740:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.345.625,44	ZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS		
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR ACUMULADO ACTUAL	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 23.000.000,00		$ -	$ 23.000.000,00
2	MATERIALES	$ 116.021.318,56		$ -	$ 116.021.318,56
3	TRASPORTE	$ 26.000.000,00		$ -	$ 26.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 24.000.000,00		$ -	$ 24.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
6	PAGA	$ 4.536.583,00		$ -	$ 4.536.583,00
7	POLIZAS			$ -	$ -
		$ -			
		$ -	$ -		
	TOTALES	$ 198.557.901,56	$ -		
		$ 198.557.901,56	$ -		
		$ -	$ -		
			$ -		

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) :

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -
0	$ -		$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PUBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**.

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/07/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4047 - 2024
(Indicar número y año)

EJECUTOR: JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO ALVARADO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00	12%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 116.021.318,56	$ 116.021.318,56	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00	13%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	12%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA			$ 4.536.583,00	$ 4.536.583,00	
	TOTAL				**$ 198.557.901,56**	**98%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO (2)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	4076 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	BERNEL GARZON CASTILLO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
VALOR INICIAL	$200.201.607	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHADE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	30 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	j.a.c.veredatotarito@gmail.com	
CELULAR	3132854628	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepcióna los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría envia los soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO-4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día 7de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	BERNEL GARZON CASTILLO		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-09-2025	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Calculo de cantidades					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de documentos para pago de proveedores
Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing residente, contador, maestro obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 (Numeración consecutiva) del 11/07/2025 al 17/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: BERNEL GARZON CASTILLO
CONVENIO No. 4076 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.201.607,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
* Calculo de cantidades				
* Cotizaciones				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de documentos para pago de proveedores
Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing residente, contador, maestro obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 (Numeración consecutiva) del 18/07/2025 al 24/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: BERNEL GARZON CASTILLO
CONVENIO No.: 4076 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-20-2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.201.607,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Calculo de cantidades					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....

FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....

AVALÚOS APROBADOS: .....

PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se registra actividad

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO

Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	BERNEL GARZON CASTILLO		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-20-2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Calculo de cantidades					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

No se registra actividad

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4076 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOTARITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 20.020.160,70	4 / 10 / 2024	31 / 10 / 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4 / 10 / 2024	31 / 12 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	31 / 12 / 2024	31 / 12 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4 / 10 / 2024	31 / 12 / 2024
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100009003 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.020.160,70	4	10	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4	10	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	10	2024	30	6	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 1000039003 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento Otros	10%	$ 20.020.160,70	4	10	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4	10	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Del .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	10	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 1000039003 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 22:57:37 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: o5fvIbN6cVxBh6xopKFXTw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	I-180037198	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148066	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.055.737-8
DIRECCIÓN	VDA TOTARITO FCA EL PLACER	TELÉFONO	3132854628
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4076 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/10/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	28.828.160,70	23.612,82
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/10/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	18.818.080,35	11.806,41
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	48.848.321,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 78.878.562,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.419,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.419,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.729,65
TOTAL A PAGAR	$	42.148,88

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Beinel Garzon C.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO POR LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA+ APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100037198	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148066	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.055.737-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/10/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 04/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APF

HOJA No.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 22:58:54 -05:00

Código de Seguridad: uP6OuoXevvsevygCQIUcrw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSRR000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100009003	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148540	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.055.737-8
DIRECCIÓN	VDA TOTARITO FCA EL PLACER	TELÉFONO	3132854628
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ALVARADO E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 20/12/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4076 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.790,00
PATRONAL	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.790,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.590,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Beinel Garton C.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AMP

HOJA No.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5. 0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

JOYCO SOCIEDADES BIC
calidad en infraestructura
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4076 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO NIT 800055737 8

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	197.866.315,85	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTARITO	NIT 800055737 8						-				-	197.866.315,85	
													-		-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
TOTALES		-											-	-	-	-	-	-	-	197.866.315,85	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 4076 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366050001317 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.201.607,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO NIT 800055737_8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:1024 0:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:97 40:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.335.291,15	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ -	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.350.097,85			$ -	$ 115.350.097,85
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ (126.605,00)		$ (126.605,00)	$ 5.126.605,00
6	PAGA	$ 4.516.218,00			$ -	$ 4.516.218,00
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ -
		$ -			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 197.866.315,85	$ (126.605,00)	$ -	$ (126.605,00)	$ 197.992.920,85
		$ 197.866.315,85	$ -			$ 197.992.920,85
		$ -	-$ 126.605,00			$ -
			$ (9.337,00)			

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 117.268,00 $ - $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma.
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4076 - 2024
(Indicar número y año)

EJECUTOR: JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO ALVARADO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 115.350.097,85	$ 115.350.097,85	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA		$ -	$ 4.516.218,00	$ 4.516.218,00	2%
TOTAL					**$ 197.866.315,85**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA (3)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	2271 – 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ANZOATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL	$200.514.428
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	veredasantabarbaraanzoategui@hotmail.com
CELULAR	316 8560383

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

selección de proveedores entre interventoría, representante legal y veeduría, para la vereda santa bárbara y santa helena del municipio de Anzoátegui.

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry Vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

solicitud pago a proveedores Vereda Santa Helena Municipio de Anzoátegui.

envió de documentos correspondientes al primer desembolso de inicio de obra Vereda Santa helena Municipio de Anzoátegui

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepcióna los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría envia los soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir
EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día 7de julio hasta el día 31 de julio 2025

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 04/07//2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que g

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO N°	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.017.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.017.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Terminacion de seleccion de proveedores
Solicitud a las organizaciones comunales la entrega de hojas de vida del personal propuesto: Ing. residente, contador y maestro de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO N°	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Envio de documentos a correspondientes al primer desembolso de inicio de obra ;
Solicitud de aprobacion de acta de asociacion de cuenta y pago a proveedore
Solicitud de verificacion y posible aprobacionde la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA
INTEGRANTES: RAMON DAVID FRANCO BEJARANO
CONVENIO N°: 2271 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 199.514.428,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 199.514.428,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199.514.428,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO x	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO x	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO x	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO x	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO x	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO x	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO x	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO x	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actualizacion de de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO		
CONVENIO N°	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	x	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	x	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	x	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	x	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	x	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	x	N/A ____
EMISIONES:	SI	____	NO	x	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	x	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actualizacion de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2271 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.589.383,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.589.383,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO(INICIAL_)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	11	7	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	11	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES (INICIAL)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	31	3	2025	31	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	30	6	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Expediente Contractual Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

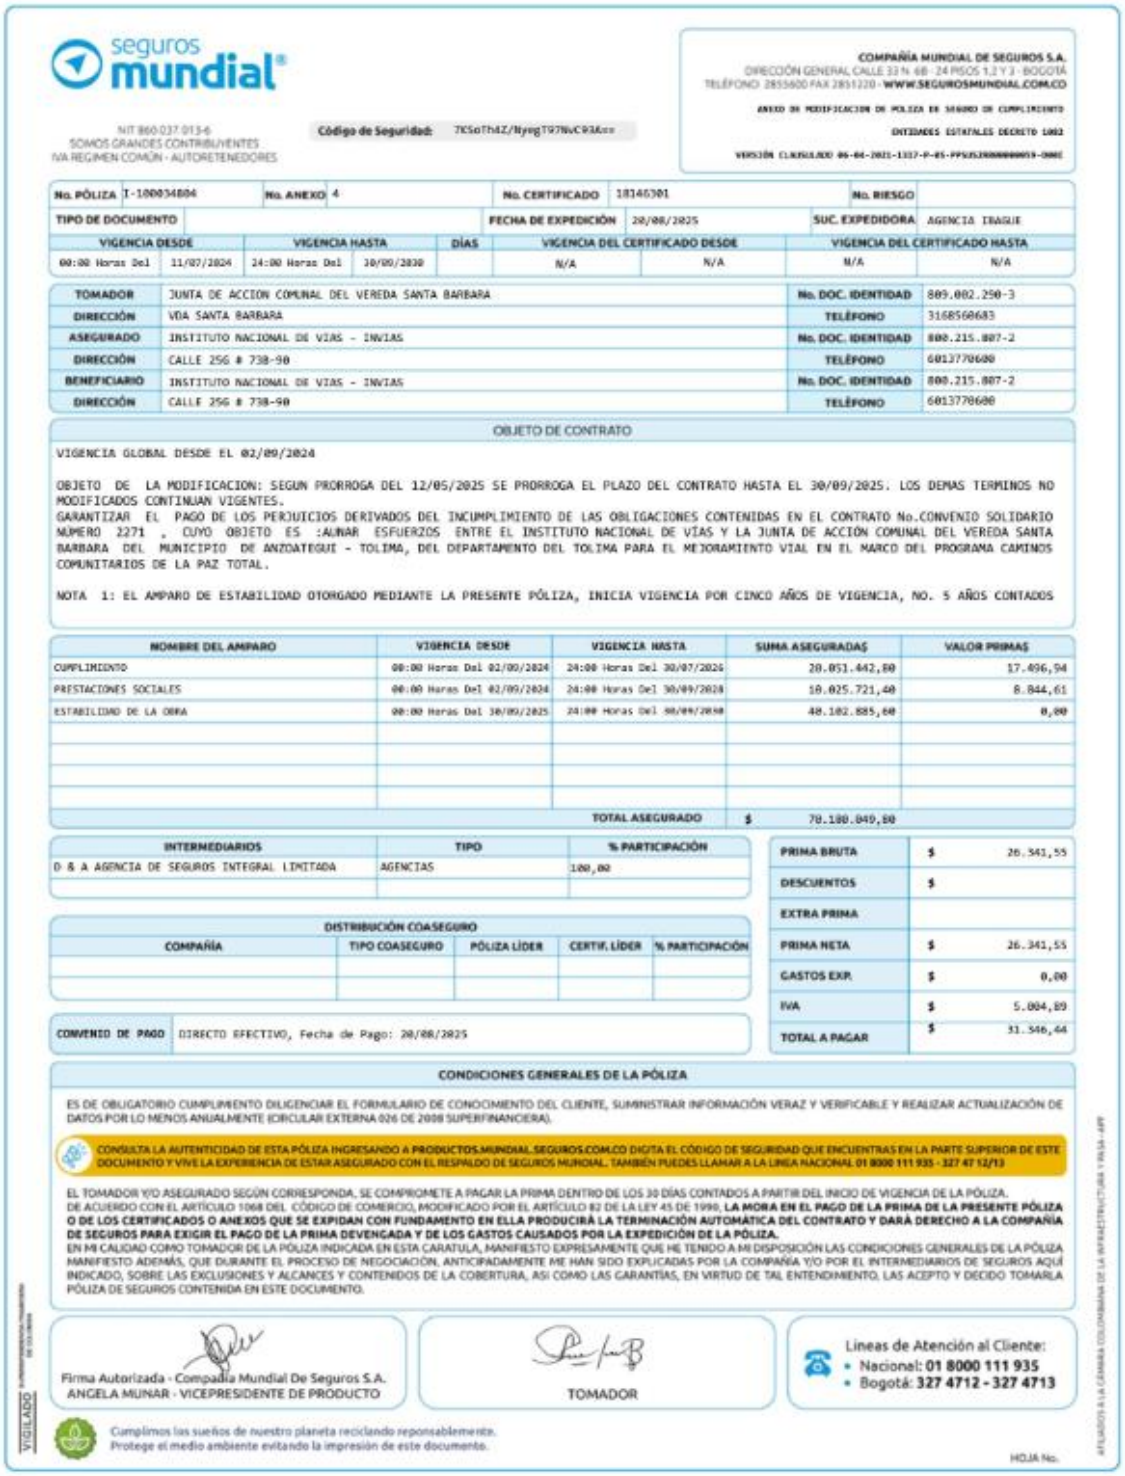

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7CSoTh4Z/NyegT97NvC93Exx

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA EN SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSZL2000000019-0000

No. PÓLIZA	I-100034804	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146301	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.250-3
DIRECCIÓN	VDA SANTA BARBARA	TELÉFONO	3168560683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 2271 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	28.051.442,00	17.496,94
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	18.025.721,40	8.844,61
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.102.885,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.180.049,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.341,55
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.341,55
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.004,89
TOTAL A PAGAR	$	31.346,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO. LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034804	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146301	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGU, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.002.290-3 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Proteger el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACSA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034804** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial



seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: [illegible]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO [illegible]

No. PÓLIZA	I-100008349	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146309	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	23:59 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.250-3
DIRECCIÓN	VDA SANTA BARBARA	TELÉFONO	3168560683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI - TOLIMA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2271 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	251.160,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	251.160,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	251.160,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.720,40
TOTAL A PAGAR	$	298.880,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

ATENDIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008349	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146309	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	23:59 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.002.290-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 11/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Procege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	**Regional INVIAS: Tolima**	**Fecha: 3/7/2025**

Vereda Santa Barbara– Municipio Anzoátegui - Departamento: Tolima
No. Convenio(s)Solidário(s): 2271 - 2024
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	**Institución u Organización**	**Cargo**
VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO	CONSORCIO VIAL JJ	DIRECTOR INTERVENTORIA
CAMILO ANDRES PENAGOS M	CONSORCIO VIAL JJ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ	CONSORCIO VIAL JJ	PROFESIONAL FINANCIERO
RENZO GUTIERREZ	INVIAS	SUPERVISOR CAMINOS COMUNITARIOS BOGOTA
CRISTIAN FLOREZ	INVIAS	APOYO SUPERVISOR TERRITORIAL TOLIMA
RAMON DAVID FRANCO BEJARANO	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA	PRESIDENTE DE JUNTA
SANDRA MILENA CAICEDO M	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA	PRESIDENTE DE VEEDURIA
SARA SOFIA MONSALVE VERJAN	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA	RESIDENTE DE OBRA
GUILLERMO ALEJANDRO ARENALES ZEA	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA	CONTADOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: ***(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)***

1. Presentar tres cotizaciones para selección de proveedor por la junta de acción comunal
2. Realizar la votación para selección de cotizaciones por parte el presidente de junta, presidente de veeduría e interventoría
3. Dentro de la selección de la mejor cotización se debe garantizar la calidad de cada uno de los materiales y equipo cotizados.
4. Programar el desembolso de los recursos
5. Programación de inicio de obra

1

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AGENDA DEL COMITE:

1-Presentar tres cotizaciones para selección de proveedor por la junta de acción comunal
2- votación para selección de cotizaciones por parte el presidente de junta, presidente de veeduría e interventoría
3- Proveedores seleccionados
4- Programar el desembolso de los recursos para compra de materiales y pago de servicios de equipos
4-ProgramaciónIniciode Obra.

TEMAS TRATADOS:

Tema	Resumen
1.	Cantidades de materiales a cotizar – producto de especificaciones determinadas en diseño de pavimento y diseño geométrico.

MATERIAL	CANTIDAD
CEMENTO	818
ACERO 3/8" (KG)	3257,00
ACERO 1/2" (KG)	4063,50
ALAMBRE	146
MADERA (DOCENAS)	1
TUBERIA	5,0

MATERIAL PETREO	
MATERIAL	**M3**
ARENA (M3)	73
TRITURADO 3/4" (M3)	100,00
PIEDRA DE RIO	7,00
SUB BASE	184,95

ELEMENTOS DE FERRETERIA	
MATERIAL	**CANTIDAD**
PUNTILLA 2"1/2 (**CAJA**)	6
PUNTILLA 3 CAJA	6
ALAMBRE GALVANIZADO(KILOS)	13
NYLON	2
PLASTICO (M)	20
CINTA PELIGRO 500 MTS	1
EMULCION ASFALTICA	1
CARRETILLA	2
BALDE DE CONSTRUCCION	10
LLANAS METALICAS	3
BOQUILLERA TRES METROS	2
ESTIBAS DE MADERA	
DISCOS DE CORTE	20

2

TRANSPORTE	
ARENA	13
TRITURADO	17
SUB BASE	31
ACERO	2
PIEDRA DE RIO	1
TUBERIA	1
CEMENTO	4
TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1
TRANSPORTE DE FORMALETA	2
TRANSPORTE CAMA BAJA	2

MAQUINARIA	HORA
RETROEXCAVADORA	60
VIBROCOMPACTADOR	25,00
EQUIPOS	
MEZCLADORA DE CONCRETO	1,00
VIBRADOR DE CONCRETO	1,00
PULIDORA	1,00
FORMALETA METALICA	2,00
RANA COMPACTADORA	1,00

EQUIPO	CANTIDAD
EXAMENES MEDICOS	7
BOTAS	7
UNIFORMES	7
CASCO	7
GAFA	7
TAPA OIDO	7
GUANTE REFORZADO	7
VALLA	1

Se presentan 3 proveedores para compra del acero para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36":

1. GYJ FERRETERIAS S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
2. TREFILADOS NACIONALES S.A.S MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
3. SODIAC COLOMBIA S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA



INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

2.	Se presentan 3 proveedores para compra del Cemento marca Cemex o argos de 50 kilos cantidad 818 bultos para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36": 1. PROCEMENTOS MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 2. GYJ FERRETERIAS S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 3. SODIAC COLOMBIA S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 
3.	Se presentan 3 proveedores para compra de Materiales de Cantera para la construcción: 1.AGRETOL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA 2.TRITURADOS LA CAIMA MUNICIPIO DE TOLIMA 3. LA ESMERALDA MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 
4.	Se presentan 3 proveedores para compra del Materiales de Ferretería para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36": 1. GYJ FERRETERIAS S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 2. TREFILADOS NACIONALES S.A.S MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 3. FERRETERIA AJ MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA  1. TREFILADOS NACIONALES S.A.S MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA 2. FERRE ANZOATEGUI MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA 3. FERRETERIA AJ MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA

4

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



1. TREFILADOS NACIONALES S.A.S MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
2. FERRE ANZOATEGUI MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA
3. FERRETERIA AJ MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA



1. GYJ FERRETERIAS S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
2. SODIAC COLOMBIA S.A MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA



5. Se presentan 3 proveedores para el suministro de transporte de materiales de cantera de Triturados La Caima hasta el punto de obra vereda Santa Barbara del municipio de Anzoátegui Tolima para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36":


1. LUIS HERNANDO PULIDO MUNICIPIO DE AZOATEGUI TOLIMA
2. NELSON ZAMBRANO MOLINA MUNICIPIO DE AZOATEGUI TOLIMA
3. YEFERSON RODRIGUEZ MUNICIPIO DE AZOATEGUI TOLIMA



6. Se presentan 3 proveedores para el Alquiler de Equipo menor para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. MAKRO EQUIPOS MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
2. EQUIPOS IBAGUE MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
3. CONSTRUCIONES PIEDRA ANGULAR MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA

5



Se presentan 3 proveedores para el Alquiler de Equipo menor Formaleta para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. CARLOS ARTURO SUAREZ MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
2. FORMESAN MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
3. LUZ HELEIDA AVILA MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIM



7. Se presentan 3 proveedores para la compra de la tubería para la construcción de la alcantarilla de 36"

1. PREFABRICADOS DE CONCRETO OPTIMO MUNICIPIO IBAGUE TOLIMA
2. PREFABRICADOS DE CONCRETO PRODELCAG MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA
3. POSTE EQUIPOS S.A.S MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA



8. Se presentan 2 proveedores para la compra de la madera para la formaleta para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36":

1. MADERAS Y MACHIMBRES DEL TOLIMA IBAGUE TOLIMA
2. MADERAS PROFORCA IBAGUE TOLIMA

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	PROVEEDOR 1 Maderas y Machimbres del Tolima [en blanco] 3203206507				PROVEEDOR 2 Maderas pinilla [en blanco] 3104295687	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
LISTON CEPILLADO	Unidad	50	$ 17.750,00	$ 887.500,00	$ 18.875,00	$ 943.750,00
TABLA A 1 CARA	Unidad	200	$ 26.790,00	$ 5.358.000,00	$ 28.218,00	$ 5.643.600,00
RESTIRAS MADERA DE 1.40M	Unidad	8	$ 53.190,00	$ 425.520,00	$ 56.200,00	$ 449.600,00
Total general			$ 753.510,00	$ 2.627.980,00	$ 103.293,00	$ 2.821.570,00
SITIO DE ENTREGA						
TRANSPORTE			No incluido		Incluido	
GARANTIAS					El proveedor garantiza la entrega de la madera que cumple con los estandares de calidad y medida en el riego en Icagua por lo cual se debe cancelar el transporte por el valor de $200.000	
FORMA DE PAGO			Contraentrega		Anticipado	

9. Se presentan 3 proveedores para el Alquiler de Maquinaria Amarilla Retrocargador de Llantas para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. JULIO ARANAGA MUNCIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA
2. JOAQUIN ARLEY SIERRA MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA
3. REINEL STIVEN MORA MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA

	PROVEEDOR 1 Julio Aranaga [en blanco] 2858953				PROVEEDOR 2 Joaquin Arley Sierra [en blanco] 3227451725		PROVEEDOR 3 Reinel stiven Mora [en blanco] 3154303360	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROCARGADORA	Horas	80	$ 179.500,00	$ 14.360.000,00	$ 195.000,00	$ 15.600.000,00	$ 162.000,00	$ 12.960.000,00
Total general			$ 179.500,00	$ 14.360.000,00	$ 195.000,00	$ 15.600.000,00	$ 162.000,00	$ 12.960.000,00
SITIO DE ENTREGA								
TRANSPORTE			No incluido		Incluido		No incluido	
GARANTIAS					el proveedor garantiza cambio si presenta daños en los motores empiezan a sonar cambio de aceite			
FORMA DE PAGO			Contraentrega		Contraentrega		Contraentrega	

Se presentan 2 proveedores para el Alquiler de Maquinaria Amarilla Vibro compactador para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. JUAN PABLO CASTILLO HERNADEZ MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA
2. REINEL STIVEN MENDOZA MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA

	PROVEEDOR 1 Juan Pablo Castillo Hernandez [en blanco] 3125433404				PROVEEDOR 2 Reinel stiven Mora [en blanco] 3203519057	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VIBROCOMPACTADOR	Horas	25	$ 120.000,00	$ 3.250.000,00	$ 142.000,00	$ 3.550.000,00
Total general			$ 120.000,00	$ 3.250.000,00	$ 142.000,00	$ 3.550.000,00
SITIO DE ENTREGA						
TRANSPORTE			No incluido		Incluido	
GARANTIAS			el proveedor garantiza la entrega de la maquina en Icagua y se debe cancelar el valor del transporte en el cual se aumenta la hora al valor de $186.000			
FORMA DE PAGO			Contraentrega		Contraentrega	

10. Se presentan 3 proveedores para la compra de dotación para el personal de obra para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. LUZ MARINA RUBIO
2. GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES
3. JULIAN BARRETO

.

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	PROVEEDOR 1 LUZ MARINA RUBIO		PROVEEDOR 2 GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES		PROVEEDOR 3 Julian Barreto	
			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
BOTA DE SEGURIDAD	Unidad	1	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ 94.250,00	$ 94.250,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00
CASCOS AMARILLOS	Unidad	1	$ 21.000,00	$ 21.000,00	$ 22.500,00	$ 22.500,00	$ 23.000,00	$ 23.000,00
GAFA	Unidad	1	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ 11.500,00	$ 11.500,00	$ 11.000,00	$ 11.000,00
GUANTES	Unidad	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 14.000,00	$ 14.000,00	$ 13.000,00	$ 13.000,00
OVEROL OPVEL MARINA	Unidad	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ 105.000,00	$ 105.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
TAPA OIDOS	Unidad	1	$ 13.000,00	$ 13.000,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ 11.000,00	$ 11.000,00
Total general			$ 261.000,00	$ 1.703.000,00	$ 331.000,00	$ 31.321.156,00	$ 243.358,00	$ 1.696.490,00
SITIO DE ENTREGA								
TRANSPORTE			Incluido		Incluido		No Incluido	
GARANTIAS							el proveedor garantiza la entrega de los EPP en el casco urbano y de ahí los llevara presidente con experiencia locales	
FORMA DE PAGO			Contraentrega		Contraentrega		Contraentrega	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE:

Tema	Decisión
1.	El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para compra del acero: 1. G Y J FERRERERIAS S.A. 2. TREFILADOS NACIONALES 3. SODIMAC COLOMBIA S.A. VOTACION: **PRESIDENTE DE JUNTA: G Y J FERRETERIAS S.A.** **PRESIDENTE DE VEEDURIA: G Y J FERRETERIAS S.A.** **INTERVENTORIA: G Y J FERRETERIAS S.A.** Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **G Y J FERRERERIAS S.A.** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.
2.	El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para compra del cemento:

			PROVEEDOR 1	
			G y J FERRETERIAS S. A.	
			servicioalcliente@gyj.com.co	
			320 630 2902	
CONCEPTO	Unidad Medi	CANTIDA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VARILLA DE 1/2	Kilos	4063.5	$ 3.867,50	$ 15.715.586,25
VARILLA DE 3/8	Kilos	3257	$ 3.927,00	$ 12.790.239,00
ALAMBRE NEGRO	Unidad	145	$ 5.712,00	$ 833.952,00
Total general			$ 13.506,50	$ 29.339.777,25
SITIO DE ENTREGA			CASCO URBANO ANZOATEGUI	
TRANSPORTE			Incluido	
GARANTIAS			El proveedor garantiza la entrega del material que cumple con los estandares de calidad en el casco urbano por ende se debe adicionar el valor de transporte por lo cual el precio de la varilla de 1/2" es $ 24.051,67 y de la de 3/8" a $ 13.879,73	
FORMA DE PAGO			Anticipado	

1. PROCEMENTOS
2. G Y J FERRERERIAS S.A.
3. SODIMAC COLOMBIA S.A.

VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: PROCEMENTOS

PRESIDENTE DE VEEDURIA: PROCEMENTOS

INTERVENTORIA: PROCEMENTOS

Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **PROCEMENTOS** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

			PROVEDOR 1	
			PROCEMENTOS	
			(en blanco)	
			320 830 2902	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
CEMENTO	Bulto 42,5 Kg	816	$ 29.000,00	$ 23.722.000,00
CEMENTO	Bulto 50 kg	816		
Total general			$ 29.000,00	$ 23.722.000,00
SITIO DE ENTREGA				
TRANSPORTE			No incluido	
GARANTIAS			El proveedor garantiza la entrega del material que cumple con los estandares de calidad en el cruce de palobayo por ende se debe adicionar el valor de transporte por lo cual el precio del bulto de cemento es de $31,000	
FORMA DE PAGO			anticipado	

El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de dos proveedores de la región para compra de materiales de cantera:

1. AGRETOL
2. LA CAIMA TRITURADOS
3. LA ESMERALDA

3. VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: LA CAIMA TRITURADOS

PRESIDENTE DE VEEDURIA: LA CAIMA TRITURADOS

INTERVENTORIA: LA CAIMA TRITURADOS

Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **LA CAIMA TRIRTURADOS** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

9

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

				PROVEEDOR 2		
				La caima Triturados		
				subgerencia@lacaima.com		
				3144315638		
	CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
3	ARENA	M3	73	$ 38.000,00	$ 2.774.000,00	
3	SUBBASE	M3	185	$ 39.000,00	$ 7.215.000,00	
3	TRITURADO	M3	100	$ 67.000,00	$ 6.700.000,00	
	Total general			$ 144.000,00	$ 16.689.000,00	
	SITIO DE ENTREGA					
	TRANSPORTE			No incluido		
	GARANTIAS			el proveedor garantiza la entrega de material que cumple con los estandares de calidad ademas de que cuentan con su licencia ambiental		
	FORMA DE PAGO			ANTICIPADO		

El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para compra de materiales:

1. G Y J FERRERERIAS S.A.
2. TREFILADOS NACIONALES S.A.S.
3. FERRERTERIA A J

VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: G Y J FERRETERIAS S.A.

PRESIDENTE DE VEEDURIA: G Y J FERRETERIAS S.A

INTERVENTORIA: G Y J FERRETERIAS S.A

4. Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **G Y J FERRERERIAS S.A.** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

					PROVEEDOR 1	
					G y J FERRETERIAS S. A.	
					servicioalcliente@gyj.com.co	
					320 830 2902	
	CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
4	CARRETILLA BOGY ANTIPI	Unidad	2	$ 240.500,00	$ 481.000,00	
4	DISCOS DE CORTE 9 PULG	Unidad	20	$ 15.646,12	$ 312.922,40	
4	BALDE DE CONSTRUCCION	Unidad	10	$ 6.000,00	$ 60.000,00	
4	PUNTILLA 2 1/2"	libras	4	$ 3.213,00	$ 12.852,00	
4	PUNTILLA 3"	libras	4	$ 3.213,00	$ 12.852,00	
4	ALAMBRE GALVANIZADO	Kilos	10	$ 6.902,00	$ 69.020,00	
	Total general			$ 275.474,12	$ 948.646,40	
	SITIO DE ENTREGA					
	TRANSPORTE			No incluido		
	GARANTIAS			El proveedor garantiza la entrega del material que cumple con los estandares de calidad en el casco urbano por ende el valor va incluido con el acero		
	FORMA DE PAGO			anticipado		

10

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

5.	La presidenta de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para suministro de transporte de materiales desde la cantera de agregados nacionales hasta el punto de obra vereda Santa Barbara Horizonte del municipio de Anzoátegui : 1. LUIS HERNANDO PULIDO 2. NELSON ZAMBRANO MOLINA 3. YEFERSON RODRIGUEZ VOTACION: **PRESIDENTE DE JUNTA: SE ESCOGIERON LOS TRES PROVEEDORES** **PRESIDENTE DE VEEDURIA: SE ESCOGIERON LOS TRES PROVEEDORES** **INTERVENTORIA: SE ESCOGIERON LOS TRES PROVEEDORES** Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que los tres (3) proveedores ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto. 
6.	El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para el alquiler de Equipo Menor: 1. MAKRO EQUIPOS 2. EQUIPOS DE IBAGUE 3. CONSTRUCCIONES PIEDRA ANGULAR VOTACION: **PRESIDENTE DE JUNTA: MAKRO EQUIPOS** **PRESIDENTE DE VEEDURIA: MAKRO EQUIPOS** **INTERVENTORIA: MAKRO EQUIPOS** Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **MAKRO EQUIPOS** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

11

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

			PROVEEDOR 1		
			Makro equipos		
			(en blanco)		
			3112374158		
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
ALQUILER DE MEZCLADOR	Día	45	$ 107.778,00	$ 4.850.010,00	
ALQUILER DE PULIDORA	Día	45	$ 18.889,00	$ 850.005,00	
ALQUILER DE RANA COMPA	Día	45	$ 57.778,00	$ 2.600.010,00	
ALQUILER DE VIBRADOR DI	Día	45	$ 26.667,00	$ 1.200.015,00	
Total general			$ 211.112,00	$ 9.500.040,00	
SITIO DE ENTREGA					
TRANSPORTE			No incluido		
GARANTIAS			el proveedor garantiza la entrega de la maquina en ibague y se debe cancelar el valor del transporte en el cual se aumentaria $600,000 el total, dando asi un valor de $10,100,040		
FORMA DE PAGO			Contraentrega		

El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para compra de la tubería para la construcción de la alcantarilla de 36":

1. PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO S.A.S.
2. PREFABRICADOS DE CEMENTO PRODELCAG
3. POSTEQUIPOS S.A.S.

VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO S.A.S

PRESIDENTE DE VEEDURIA: PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO S.A.S.

INTERVENTORIA: PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO S.A.S.

7. Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO S.A.S.** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

			PROVEEDOR 1		
			Prefabricados de cemento optimo SAS		
			(en blanco)		
			3112887623		
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
TUBERIA DE CONCRETO RE	Unidad	5	$ 428.400,00	$ 2.142.000,00	
Total general			$ 428.400,00	$ 2.142.000,00	
SITIO DE ENTREGA					
TRANSPORTE			No incluido		
GARANTIAS			El proveedor garantiza la entrega del material que cumpla con los estandares de calidad la entrega se realizara directamente en la obra pero se le debe adicionar el transporte por lo cual el precio por cada tubo es de $588.400,0		
FORMA DE PAGO			anticipado		
INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO	SI	NO	Rubro		

8. El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA (OAC) presentó las cotizaciones de dos proveedores de la región para la compra de la madera para la formaleta para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36":

12

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

1. MADERAS Y MACHIMBRES DEL TOLIMA
2. MADERAS PROFORCA

VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: MADERAS PROFORCA

PRESIDENTE DE VEEDURIA: MADERAS PROFORCA

INTERVENTORIA: MADERAS PROFORCA

Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **MADERAS PROFORCA** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

			PROVEEDOR 2	
			Maderas proforca	
			(en blanco)	
			3134265607	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MEDIO CERCO	Unidad	50	$ 8.925,00	$ 446.250,00
TABLA BURRA	Unidad	36	$ 39.270,00	$ 1.413.720,00
ESTIBAS MADERA DE 1.40X	Unidad	8	$ 95.200,00	$ 761.600,00
Total general			**$ 143.395,00**	**$ 2.621.570,00**
SITIO DE ENTREGA				
TRANSPORTE			Incluido	
GARANTIAS			El proveedor garantiza la entrega del material que cumple con los estanderes de calidad y realiza entrega en ibague por lo cual se debe cancelar el transporte por el valor de 5500,000	
FORMA DE PAGO			Anticipado	

9. La presidenta de la JAC VDA GUINEAL HORIZONTEOAC) presentó las cotizaciones de tres proveedores de la región para para el Alquiler de Maquinaria Amarilla para la construcción de placa huella y alcantarilla de 36"

1. JULIO ARANAGA
2. JOAQUIN ARLEY SIERRA
3. REINEL STIVEN MORA

VOTACION:

PRESIDENTE DE JUNTA: REINEL STIVEN MORA

PRESIDENTE DE VEEDURIA: REINEL STIVEN MORA

INTERVENTORIA: REINEL STIVEN MORA

Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **REINEL STIVEN MORA** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

13

			PROVEEDOR 3	
			Reinel stiven Mora	
			(en blanco)	
			3154993280	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROEXCAVADORA	Horas	60	$ 142.000,00	$ 8.520.000,00
Total general			$ 142.000,00	$ 8.520.000,00
SITIO DE ENTREGA				
TRANSPORTE			No incluido	
GARANTIAS				
FORMA DE PAGO			Contraentrega	

			PROVEEDOR 1	
			Juan Pablo Castillo Hernandez	
			(en blanco)	
			3125423404	
CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VIBROCOMPACTADOR	Horas	25	$ 130.000,00	$ 3.250.000,00
Total general			$ 130.000,00	$ 3.250.000,00
SITIO DE ENTREGA				
TRANSPORTE			No incluido	
GARANTIAS			el proveedor garantiza la entrega de la maquina en itagua y se debe cancelar el valor del transporte en el cual se aumentaria la hora al valor de $186,000	
FORMA DE PAGO			Contraentrega	

El presidente de la JAC VDA SANTA BARBARA presentó las cotizaciones de dos proveedores de la región para compra de la Dotación para el personal de obra:

1. LUZ MARINA RUBIO
2. GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES
3. JULIAN BARRETO

VOTACION:

10 **PRESIDENTE DE JUNTA: JULIAN BARRETO**

PRESIDENTE DE VEEDURIA: JULIAN BARRETO

INTERVENTORIA: JULIAN BARRETO

Tras una revisión exhaustiva de las propuestas, se determinó que **JULIAN BARRETO** ofrecía las condiciones más favorables en cuanto a precios y términos para el desarrollo del proyecto.

Julian Barreto
(en blanco)
3167549201

CONCEPTO	Unidad Medida	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7 BOTA DE SEGURIDAD	Unidad	7	$ 65.000,00	$ 455.000,00
7 CASCOS AMARILLOS	Unidad	7	$ 19.000,00	$ 133.000,00
7 GAFA	Unidad	7	$ 6.600,00	$ 46.200,00
7 GUANTES	Unidad	7	$ 8.800,00	$ 61.600,00
7 OVEROL DRYLL NARANJA	Unidad	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00
7 TAPA OIDOS	Unidad	7	$ 2.950,00	$ 20.650,00
Total general			$ 242.350,00	$ 1.696.450,00

SITIO DE ENTREGA	
TRANSPORTE	No incluido
GARANTIAS	el proveedor garantiza la entrega de los EPP en el casco urbano y de ahi los lleva el presidente o el ingeniero a la obra
FORMA DE PAGO	Contraentrega

INFORME PRESENTADOS: ***(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)***

No.	Anexos			
1.	Acta conformación comité operativo:	SI __X__	NO ____	No. Folios: ___2_____
2.	Verificación Resolución Veeduría:	SI _X___	NO ____	No. Folios: _____11____
3.	Aprobación personal:	SI __X__	NO ____	No. Folios: ___2_____
4.	Pre aprobación Estudios y diseños:	SI __X__	NO ____	No. Folios: ____2_____
5.	Aprobación Estudios y diseños:	SI __X__	NO ____	No. Folios: ____2_____
6.	Comité operativo en la vereda la planada socialización proveedores y componentes social, ambiental, técnico	SI __X__	NO ____	No. Folios: ____7_____
7.	Comité operativo en la vereda la planada			

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. ***(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)***

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Generación documento asociación de cuenta proveedores seleccionados, y documento solicitud pago de proveedor ante AV Villas	Contador OAC Profesional Financiero interventoría	15/07/2025

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

15

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Víctor Hugo Sánchez
Cargo: Director Interventoría



Nombre: Camilo A Penagos M
Cargo: Residente de Interventoria



Nombre: Henry A Vanegas
Cargo: Profesional financiero Cargo:



Nombre: Ramon David Bejarano
Cargo: presidenta Junta de OAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

16

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2271 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA **NIT** 809002290 3

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
	Desembolso														-				-	197.896.127,18	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.345,29	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SANTA BARBARA	NIT 809002290 3						-				-	197.897.472,47	
7	GASTOS BANCARIOS						GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					472.920,63		472.920,63				472.920,63	197.424.551,84	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ACEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	G Y J FERRETERIAS S A	800130426				31.753.219,00		31.753.219,00				31.753.219,00	165.671.332,84	
2	MATERIALES						CEMENTO ARGOS 42,5KG	PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA Y CIA	800049896				21.221.603,00		21.221.603,00				21.221.603,00	144.449.729,84	
3	TRANSPORTES						TRANSPORTE CEMENTO	LILIA RAQUEL MARTINEZ DE GASTELBONDO	20311310				2.024.550,00		2.024.550,00				2.024.550,00	142.425.179,84	
2	MATERIALES						TUBO DE CEMENTO REFORZADO 36"	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS	901667149				2.097.000,00		2.097.000,00				2.097.000,00	140.328.179,84	
5	ADMINISTRATIVOS						COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	JULIAN STIVEN BARRETO PADILLA	1110575710				1.654.039,00		1.654.039,00				1.654.039,00	138.674.140,84	
5	ADMINISTRATIVOS						COMPRA VALLA	JUAN DIEGO GOMEZ MARIN	1234641040				200.000,00		200.000,00				200.000,00	138.474.140,84	
2	MATERIALES						COMPRA MATERIALES PETREOS	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S.	900237153				16.338.391,00		16.338.391,00				16.338.391,00	122.135.749,84	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER DE EQUIPOS	FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS	901309862				9.180.711,00		9.180.711,00				9.180.711,00	112.955.038,84	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER FORMALETA METALICA	LUZ HELIDA AVILA NAVARRETE	65729989				1.343.995,00		1.343.995,00				1.343.995,00	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
																			-	111.611.043,84	
													-		-				-	111.611.043,84	
															-				-	111.611.043,84	
															-				-	111.611.043,84	
TOTALES		1.345,29											86.286.428,63	-	86.286.428,63	-	-	-	86.286.428,63	111.609.698,55	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	42.277.925,00
2	MATERIALES	39.656.994,00
3	TRANSPORTES	2.024.550,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	1.854.039,00
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	472.920,63
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.345,29
TOTAL DE SUBTOTALES		**86.286.428,63**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L-

CONVENIO No. 2271 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29557 - 1 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.514.428,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA 809002290 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TO	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 132.870,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 326.406,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 472.920,63	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ 931.996,77	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 42.277.925,00	$ 42.277.925,00	$ (21.277.925,00)
2	MATERIALES	$ 116.226.961,20	$ -	$ 39.656.994,00	$ 39.656.994,00	$ 76.569.967,20
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ 2.024.550,00	$ 2.024.550,00	$ 27.975.450,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.134.506,60	$ 944.931,00	$ 1.854.039,00	$ 2.798.970,00	$ 2.335.536,60
6	PAGA	$ 4.535.632,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.535.632,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTALES	$ 197.897.099,80	$ 944.931,00	$ 85.813.508,00	$ 86.758.439,00	$ 111.138.660,80

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___) : $ 1.345,29
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 18.720,17 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2271 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 10.524.706,00	$ 10.475.294,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 71.410.213,00	$ 44.816.748,20	$ 116.226.961,20	59%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 2.024.550,00	$ 27.975.450,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 472.383,47	$ 2.325.614,34	$ 2.335.536,17	$ 5.134.506,60	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.535.632,00	$ 4.535.632,00	2%
	TOTAL				**$ 197.897.099,80**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	**2306 - 2024**	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RAMIREZ GOMEZ	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$200.589.383	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	**DESDE**	**HASTA**
	20/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2		
CORREO ELECTRONICO	veredahatilloanzoategui@gmail.com	
CELULAR	3142058558	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepcióna los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría envia los soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4)

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de 4juio es comprendido en 4 semanas desde el día 6 de julio hasta el día 31 de 31 julio 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar el alcance, la meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y 2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1706/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar el alcance, la meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y 2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El dia 17 de julio de 2025 Se envia solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matricula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar el alcance, la meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y 2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar el alcance, la meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y 2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONVENIO No.	4076 - 2024	CONTRATO No.	3555 DE 2024
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025
VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Proq					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades, se adelantan trabajos de oficina para el convenio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 12/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 32 del 6/06/2025 al 12/06/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA
INTEGRANTES: JUAN CARLOS RAMIREZ GOMEZ
CONVENIO No.: 4076 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.589.383,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.589.383,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 — $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.686,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 2.020.943.686,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 — VALOR ANTICIPO: $
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.686	$ 1.999.824.496		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.188	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 200.589.383,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ ____ ____ %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (DI: $ ____ ____ %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - ____ %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - ____ %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - ____ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ ____ ____ %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ ____ ____ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - ____ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - ____ %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR.	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 79.826.804,00 — 3,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 79.826.804,00 — 3,95%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 453.561,39 — 0,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 997.835,05 — 0,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR.	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/05/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de junio de 2025
VALOR FACTURA: $ 79.826.804,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ — Avance o Atraso Físico %: ____
Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1.
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES.	SI ____	NO ____	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X	
EMISIONES.	SI ____	NO ____	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X	

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la revision y elaboración de la documentación para prorrogar los 45 convenios, 11/06/2025 Se solicita al gerente del banco Av Villas los extractos bancarios de los meses Abril y Mayo 2025 de las cuentas que se relacionan en respectivo correo,12/06/2025. Se anexan Prorrogas CTO 3555-2024 para la revisión y aprobación del supervisor

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

cargar las garantias de las pólizas al secop 2 de los 45 convenios,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA: _____ NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: T.P.M 70202 - 251182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 33 del 13/06/2025 al 19/06/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 453.561,39	0,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 997.835,05	0,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de junio de 2025
VALOR FACTURA: $ 79.826.804,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
* Cantidades de obra				
* Cotizaciones				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI - NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI - NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI - NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI - NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI -	NO -	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI -	NO -	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI -	NO -	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI -	NO -	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI -	NO -	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI -	NO -	N/A	x
EMISIONES:	SI -	NO -	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI -	NO -	N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se enviay se cargan las garantías de las pólizas al secop 2 de los 45 convenios 16/06/2025. Se envía solicitud de la colaboración del ingeniero Renzo para la aprobación de las pólizas cargadas a la plataforma Secop II

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar la firma del director para los MEPIS de proceso prórroga.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad esclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____

NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO

Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 34 del 20/06/2025 al 26/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONVENIO No.	4076 - 2024	CONTRATO No.	3555 DE 2024
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025
VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 453.561,39	0,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 997.835,05	0,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de junio de 2025
VALOR FACTURA: $ 79.826.804,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	x
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el dia 20 de junio se realiza la solicitud firma del director para MEPIS de proceso prórroga y suspensión,21/06/2025.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la inteventoria Henrry vanegas para el manejo contable y fiananciero de los 45 convenios, Comite operativo para la selección de proveedores

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 35 del 27/06/2025 al 3/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONVENIO No.	4076 - 2024	CONTRATO No.	3555 DE 2024
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025
VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 79.826.804,00	3,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 453.561,39	0,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 997.835,05	0,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de junio de 2025
VALOR FACTURA: $ 79.826.804,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....

FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....

AVALÚOS APROBADOS: .....

PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1/07/2025: Se solicita reunión para capacitación financiera por parte de la profesional Tania Mantilla INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Terminación de selección de proveedores para la vereda santa bárbara del municipio de anzoategui

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2306 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEL HATII

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGU DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.589.383,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.589.383,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta	
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	11	7	2024	31	10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	11	7	2024	31	12
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	31	12	2024	31	12

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	12
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta	
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	2	9	2024	30	4
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	2	9	2024	30	6
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	30	6	2025	30	6

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	30	6
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta	
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	2	9	2024	31	8
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	2	9	2024	31	10
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	31	10	2025	31	10

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	10
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o segu el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:04:48 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: rfrebdRyWZXCbmEGsPM8Ng==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU528000000059-CMMI

No. PÓLIZA	I-100034882	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.759-0
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	TELÉFONO	3142858558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2386 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.058.938,30	23.658,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.029.469,15	11.829,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.117.876,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.206.284,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	35.487,84
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.487,84
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.742,69
TOTAL A PAGAR	$	42.230,53

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034802	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 889.081.759-0 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:06:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UprRycm+op+Nn8hUERRGFw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5880000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008347	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.759-0
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	TELÉFONO	3142858558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2306 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	268.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.798,00
PATRONAL	268.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	268.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	268.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.798,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.798,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.598,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA- AIF

HOJA No.

(415)

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034802	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2038		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 889.001.759-0 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AGENCIA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2306 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI NIT 809001759 0

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	197.970.674,82	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.675,32	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL HATILLO	NIT 809001759 0						-				-	197.972.350,14	
													-		-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
															-				-	197.972.350,14	
TOTALES		1.675,32											-	-	-	-	-	-	-	197.970.674,82	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.675,32
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 2306 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-795 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.589.383,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI NIT 809001759 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:1024 0:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:97 40:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.708,18	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ -	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 114.946.840,24			$ -	$ 114.946.840,24
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.496.691,89	$ 640.566,02		$ 640.566,02	$ 4.856.125,87
6	PAGA	$ 4.527.468,00			$ -	$ 4.527.468,00
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ -
		$ -			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 197.971.000,13	$ 640.566,02	$ -	$ 640.566,02	$ 197.330.434,11
		$ 197.970.674,82	$ -			$ 197.330.434,11
		$ 325,31	$ 640.566,02			$ -
			$ 647.498,92			

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ 1.675,32
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 5.257,58 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 2306 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 114.946.840,24	$ 114.946.840,24	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 641.916,03	$ 1.675,32	$ 4.853.100,54	$ 5.496.691,89	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.527.468,00	$ 4.527.468,00	2%
	TOTAL				**$ 197.971.000,13**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA (5)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	2366 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.716.333
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	jacsantahelenaanzoategui@gmail.com
CELULAR	3223911395

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

selección de proveedores entre interventoría, representante legal y veeduría, para la vereda santa bárbara y santa helena del municipio de Anzoátegui.

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry Vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

solicitud pago a proveedores Vereda Santa Helena Municipio de Anzoátegui.

Solicitud de aprobación de acta de asociación de cuenta y pago a proveedores, de las Veredas Santa bárbara y Santa helena del Municipio de Anzoátegui.

envió de documentos correspondientes al primer desembolso de inicio de obra Vereda Santa helena Municipio de Anzoátegui

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI-2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision de documentos para pago a proveedores
Se solcita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vidas delpersonal propuesto: Ing. residente, contador y maestro de obra
Solicitud pago a proveedores

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que g

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Envio de documentos correspondientes al primer desembolso de inicio d eobra
Solicitud de aprobacion de acta de asociacion de cuenta y pago a proveedores
Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

D

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X	

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actualizacion de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y aprobadas. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No hubo registro de actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	7	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2366 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 06/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.716.333,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.716.333,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	16	7	2024	31	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.035.816,65	16	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	16	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	6	2025	30	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zmMfqdbF7/RGwlI0Z5Bhvw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034908	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.758-3
DIRECCIÓN	FCA EL PROGRESA VDA SANTA HELENA	**TELÉFONO**	3223911395
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2366 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.071.633,30	17.514,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.035.816,65	8.853,51
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.143.266,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.250.716,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.368,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.368,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.009,93
TOTAL A PAGAR	$	31.378,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Nancy Mora V
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034908	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT.809.001.758-3 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 16/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 16/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034908** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2** , expedida por la Compañía en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2366 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA **NIT** 809001758_3

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	198.113.486,85	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.377,28	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SANTA HELENA	NIT 809001758_3						-				-	198.114.864,13	
7	GASTOS BANCARIOS						GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					434.969,36		434.969,36				434.969,36	197.679.894,77	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ACEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	G Y J FERRETERIAS S A	800130426				25.286.688,00		25.286.688,00				25.286.688,00	172.393.206,77	
2	MATERIALES						CEMENTO ARGOS 42,5KG	PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA Y CIA	800049896				16.655.586,00		16.655.586,00				16.655.586,00	155.737.620,77	
3	TRANSPORTES						TRANSPORTE CEMENTO	LILIA RAQUEL MARTINEZ DE GASTELBONDO	20311310				1.588.950,00		1.588.950,00				1.588.950,00	154.148.670,77	
2	MATERIALES						TUBO DE CEMENTO REFORZADO 36"	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS	901667149				2.097.000,00		2.097.000,00				2.097.000,00	152.051.670,77	
5	ADMINISTRATIVOS						COMPRA MADERAS	JUAN CARLOS LONDOÑO VALENCIA	5842853				2.069.280,00		2.069.280,00				2.069.280,00	149.982.390,77	
5	ADMINISTRATIVOS						COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	JULIAN STIVEN BARRETO PADILLA	1110575710				1.654.039,00		1.654.039,00				1.654.039,00	148.328.351,77	
2	MATERIALES						COMPRA VALLA	JUAN DIEGO GOMEZ MARIN	1234641040				200.000,00		200.000,00				200.000,00	148.128.351,77	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						COMPRA MATERIALES PETREOS	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S.	900237153				12.647.592,00		12.647.592,00				12.647.592,00	135.480.759,77	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER DE EQUIPOS	FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS	901309862				9.180.711,00		9.180.711,00				9.180.711,00	126.300.048,77	
2	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER FORMALETA METALICA	LUZ HELIDA AVILA NAVARRETE	65729989				1.343.995,00		1.343.995,00				1.343.995,00	124.956.053,77	
													-		-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
													-		-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
															-				-	124.956.053,77	
TOTALES		1.377,28											73.158.810,36	-	73.158.810,36	-	-	-	73.158.810,36	124.954.676,49	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	48.458.986,00
2	MATERIALES	18.952.586,00
3	TRANSPORTES	1.588.950,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	3.723.319,00
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	434.969,36
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.377,28
TOTAL DE SUBTOTALES		**73.158.810,36**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

247

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

2 de 45

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 2366 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29558-9 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.716.333,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA 809001758 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	E ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - T	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.602.846,15	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 150.645,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 326.437,12	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 434.969,36	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ 912.051,48	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 48.458.986,00	$ 48.458.986,00	$ (27.458.986,00)
2	MATERIALES	$ 115.426.593,95	$ -	$ 18.952.586,00	$ 18.952.586,00	$ 96.474.007,95
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ 1.588.950,00	$ 1.588.950,00	$ 28.411.050,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.151.260,90	$ 597.241,92	$ 3.723.319,00	$ 4.320.560,92	$ 1.830.699,98
6	PAGA	$ 4.535.632,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.535.632,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTALES	$ 198.113.486,85	$ 597.241,92	$ 72.723.841,00	$ 73.321.082,92	$ 124.792.403,93

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ 1.377,28
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 19.095,57 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/07/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2366 - 2024**
(Indicar número y año)

EJECUTOR: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024**
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 10.524.706,00	$ 10.475.294,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 58.756.146,00	$ 56.670.447,95	$ 115.426.593,95	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 1.588.950,00	$ 28.411.050,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 490.086,96	$ 2.287.631,08	$ 3.373.542,86	$ 6.151.260,90	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.535.632,00	$ 4.535.632,00	2%
				$ -		
TOTAL				**$ -**	**$ 198.113.486,85**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA (6)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	3372 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO DIAZ GUZMAN	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.563.028	
FECHA DE INICIO	27/09/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	**DESDE**	**HASTA**
	19/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jac.lapradera.armero@gmail.com	
CELULAR	3160533440	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualizacion semanal de la matriz de seguimiento de cada convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.

Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS es de 172 m de placa huella yalcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS es de 172 m de placa huella yalcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
* Cantidades de obra				
* Cotizaciones				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS es de 172 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS es de 172 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA
INTEGRANTES: MAURICIO DÍAZ GUZMÁN
CONVENIO No. 3372- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.563.028,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.563.028,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3372 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.563.028,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.563.028,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.605,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.605,60	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	5	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.605,60	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084

Certificado de modificación o anexo No.: 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:58:40 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UQk6RJiiE9CJ+SgQoTIBEA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5880000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008702	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148548	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.008.547-1
DIRECCIÓN	VDA PRADERA CORR SAN PEDRO FCA EL PORVENIR	**TELÉFONO**	3160533448
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL /INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3372 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.698,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.698,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.698,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.851,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008702	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148548	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.000.547-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

ADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:56:12 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: KprxuLYcIwF/Pb5WWnJpGg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU528000000059-OMNI

No. PÓLIZA	I-100036084	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA	No. DOC. IDENTIDAD	809.008.547-1
DIRECCIÓN	VDA PRADERA CORR SAN PEDRO FCA EL PORVENIR	TELÉFONO	3160533440
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO 3372 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	28.156.302,80	29.571,78
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.078.151,40	14.785,89
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.312.605,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 78.547.059,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.357,67
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.357,67
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.427,96
TOTAL A PAGAR	$	52.785,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA-AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	I-100036884	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148382	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809000547-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO; DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO:3

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ABF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3372 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL NIT 809001759 0

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	199.094.685,11	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.686,56	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	PRADERA	NIT 809000547 1						-				-	199.096.371,67	
													-		-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
													-		-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
															-				-	199.096.371,67	
TOTALES		1.686,56											-	-	-	-	-	-	-	199.094.685,11	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.686,56
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

269

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ' '

CONVENIO No. 3372 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-795 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.563.028,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL NIT 809000547_1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

S DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE			NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO			VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM				
SECOP				DICIEMBRE DEL 2024	SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			$ 1.000.000,00	APORTE DE LA				
EXPIDE INVIAS				DICIEMBRE DEL 2024	IDIAL DE SEGUROS S.A			$ 1.468.342,89	PAGO DE POLIZA				
NDIAL DE SEGUROS				MARZO DEL 2025	IDIAL DE SEGUROS S.A			$ -	TRANSFERENCIAS				
NDIAL DE SEGUROS				MAYO DEL 2025	IDIAL DE SEGUROS S.A			$ -	TRANSFERENCIAS				
AV VILLAS				JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS			$ -	GASTOS				
AV VILLAS				JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS			$ -	GASTOS				
								$ -					

* Comprobantes de movimiento.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM				VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA				$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES				$ 115.938.968,11			$ -	$ 115.938.968,11
3	TRASPORTE				$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA				$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS				$ 5.600.000,00	$ 440.885,29		$ 440.885,29	$ 5.159.114,71
6	PAGA				$ 4.555.717,00			$ -	$ 4.555.717,00
7	POLIZAS				$ -			$ -	$ -
					$ -			$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 199.094.685,11	$ 440.885,29	$ -	$ 440.885,29	$ 198.653.799,82
					$ 199.094.685,11	$ -			$ 198.653.799,82
					$ -	$ 440.885,29			$ -
						$ 447.723,26			

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___) : $ 1.686,56
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 5.151,41 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

0	$ -					$ -
0	$ -					$ -
0	$ -					$ -
0	$ -					$ -
0	$ -					$ -
0	$ -					$ -
0	$ -					$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3372 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo) **%**

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 115.938.968,11	$ 115.938.968,11	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 442.571,85	$ 1.686,56	$ 5.155.741,59	$ 5.600.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.555.717,00	$ 4.555.717,00	2%
	TOTAL				**$ 199.094.685,11**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA3359-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALOMA (7)

3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	3359 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JORGE SICACHA PINZON	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.126.666	
FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE 2024	
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 2025	
CELULAR	3118850138	
CORREO ELECTRONICO	Jaclapaloma58@gmail.com	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semanal de la matriz de seguimiento para cada convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.

Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día 4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ -
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ... NO ...	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ... NO ...	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ... NO ...	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ... NO ...	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ... NO ...	N/A	
EMISIONES:	SI ... NO ...	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ... NO ...	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA: ..... NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3359 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PALOMA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.126.666,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.126.666,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.112.666,60	27	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.333,30	27	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.225.333,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036086

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008704 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.112.666,60	30	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.333,30	30	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.225.333,20	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100036086

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	30	9	2024	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:18:22 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 8+15942l0qk0AyjNr+NUMw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU528000000059-0001

No. PÓLIZA	I-100036086	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	18148865	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/09/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.009.477-5
DIRECCIÓN	VDA LA PALOMA FCA EL ENCANTO	**TELÉFONO**	3118580138
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO 3359 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	28.112.666,60	29.700,62
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.056.333,30	14.753,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.225.333,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 78.394.333,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.454,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.454,50
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.446,36
TOTAL A PAGAR	$	52.900,86

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA- AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036086	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148065	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.009.477-5 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036086** y endoso, 3 cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **10/09/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:19:29 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: B/Iv8+RU3DM2Ir6RWT3wdw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 20-03-2021-1317-P-06-PPSU58R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008704	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148556	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	No. DOC. IDENTIDAD	809.009.477-5
DIRECCIÓN	VDA LA PALOMA FCA EL ENCANTO	TELÉFONO	3118500138
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CAJAMARCA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 30/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3359 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.690,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIO$	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.690,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.690,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.051,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008704	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148556	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DE , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 889.009.477-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA. AIF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3359 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA NIT 809009477 5

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	198.660.659,66	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	513.457,00	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CABILDOS INDIGENAS	NIT 800235798 1						-				-	199.174.116,66	
7	GASTOS BANCARIOS						GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					403.840,00		403.840,00				403.840,00	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
													-		-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
															-				-	198.770.276,66	
TOTALES		513.457,00											403.840,00	-	403.840,00	-	-	-	403.840,00	198.256.819,66	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	403.840,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	513.457,00
TOTAL DE SUBTOTALES		**403.840,00**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

291

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 3359 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366070001958 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.126.666,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JJUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA NIT 809009477 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:1024 0:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:97 40:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.466.006,34	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ -	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.617.602,66			$ -	$ 115.617.602,66
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.410.615,00			$ -	$ 22.410.615,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.089.385,00	$ -		$ -	$ 5.089.385,00
6	PAGA	$ 4.543.057,00			$ -	$ 4.543.057,00
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ -
		$ -			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 198.660.659,66	$ -	$ -	$ -	$ 198.660.659,66
		$ 198.660.659,66	$ -			$ 199.071.274,66
		$ -	$ -			-$ 410.615,00
			$ 879.440,00			

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ 513.457,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 365.983,00 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3359 - 2024 (Indicar número y año)

EJECUTOR: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO CAJAMARCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 115.617.602,66	$ 115.617.602,66	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.410.615,00	$ 22.410.615,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 109.617,00	$ 5.390.383,00	$ 5.500.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.543.057,00	$ 4.543.057,00	2%
	TOTAL				**$ 199.071.274,66**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES (8)

3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3355 - 2024	
OAC	UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ARIAS	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.139.384	
FECHA DE INICIO	27/09/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	06 DE MAYO 2025	06 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jaccionveredalosalpes@gmail.com	
CELULAR	3214815769	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semanal de la matriz de seguimiento para cada convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.

Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta fisica generado por INVIAS de 165 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta que tiene una longitud de atención de 0,51 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca san mateo y el punto final de referencia es el PR0+500 de la finca Víctor Guerrero

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA
INTEGRANTES: FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ
CONVENIO No. 3355- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.108.459,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.108.459,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 8/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.108.459			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.108.459			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 201.108.459,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Proq					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEFI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 165 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta que tiene una longitud de atención de 0,51 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca san mateo y el punto final de referencia es el PR0+500 de la finca Víctor Guerrero

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA				
INTEGRANTES:	FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ				
CONVENIO No.	3355- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.108.459,00		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.108.459,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.108.459			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.108.459			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.108.459,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños					Prog					
						Ejec					
*	Cantidades de obra					Prog					
						Ejec					
*	Cotizaciones					Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 165 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta que tiene una longitud de atención de 0,51 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca san mateo y el punto final de referencia es el PR0+500 de la finca Víctor Guerrero

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3355- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.108.459,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.108.459,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.108.459			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.108.459			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.108.459,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva) INGENIERO RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 165 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta que tiene una longitud de atención de 0,51 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca san mateo y el punto final de referencia es el PR0+500 de la finca Víctor Guerrero

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA
INTEGRANTES: FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ
CONVENIO No. 3355- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.108.459,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.108.459,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 8/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.108.459			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.108.459			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 201.108.459,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 393.080.233,00 — 19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 393.080.233,00 — 19,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3355 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.139.384,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.139.384,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	27	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	27	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008703 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	27	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	27	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	5	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008703 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	12	5	2025	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	12	5	2025	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:30:29 -05:00

Código de Seguridad: I1B2VaUfSCLXsuDCJC2Hfw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-0001

No. PÓLIZA	I-10008703	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148554	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.146.951-9
DIRECCIÓN	VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALINA	TELÉFONO	3214815769
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADO/MUNICIPIO DE CAJAMARCA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 19/12/'2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 20/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3355 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.698,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.698,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.698,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.851,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA: APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008703	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148554	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 800.146.951-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:26:26 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52800000059-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: TXuGhvQHJApYs5zqRyI9lQ==

No. PÓLIZA	I-100036085	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148046	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.146.951-9
DIRECCIÓN	VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALINA	TELÉFONO	3214815769
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770680
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770680

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 19/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 20/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3355 VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALIN , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.113.938,40	29.589,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.056.969,20	14.754,81
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.227.876,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.398.784,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.264,44
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.264,44
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.410,24
TOTAL A PAGAR	$	52.674,68

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA: APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036085	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148046	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800146951-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036085** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **09/09/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3355 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES **NIT** 800146951 9

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-					198.673.309,56	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.682,98	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LOS ALPES	NIT 800146951 9						-				-	198.674.992,54	
													-		-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
															-				-	198.674.992,54	
TOTALES		1.682,98											-	-	-	-	-	-	-	198.673.309,56	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.682,98
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

313

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 3355 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-803 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.139.384,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JJUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES NIT 800146951 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:1024 0:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:97 40:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TO	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.466.074,44	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ -	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 116.117.592,56			$ -	$ 116.117.592,56
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ 440.758,04		$ 440.758,04	$ 4.559.241,96
6	PAGA	$ 4.555.717,00			$ -	$ 4.555.717,00
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ -
		$ -			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 198.673.309,56	$ 440.758,04	$ -	$ 440.758,04	$ 198.232.551,52
		$ 198.673.309,56	$ -			$ 198.232.551,52
		$ -	$ 440.758,04			$ -
			$ 447.625,39			

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ 1.673,20
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 5.194,15 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

torial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/07/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3355 - 2024** **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO CAJAMARCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ
(Indicar número y año)

JUSTIFICACION:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 116.117.592,56	$ 116.117.592,56	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 442.441,02	$ 1.682,98	$ 4.555.876,00	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.555.717,00	$ 4.555.717,00	2%
	TOTAL				**$ 198.673.309,56**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE (9)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2121 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	AMIRO CELIS ALVAREZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.513.076
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PRORROGA 3	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	jacveredahoyocaliente@gmail.com
CELULAR	3202655689.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry Vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

se envía cotización para revisión y aprobación, vereda hoyo caliente, porfía linda en el municipio casabianca Tolima.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Se envía actualización de diseño geométrico OAC Vereda Hoyo caliente en el Municipio de Casabianca Tolima.

solicitud para revisión y aprobación para pago a proveedores en la Vereda Hoyo Caliente Municipio de Casabianca.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semana de la matrizz de seguimiento de loa 45 convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita de obra y verificacion de las actividades a realizar el alcance meta fisica generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que gene

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.513.076,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Proq					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobados Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision de documentos para pago de proveedores
Se solicita a las prganizaciones comunalesde la entrega de las hojas de vida del personal propuesto: Ing. Residente, contador, maestro de obra
Se envia cotizacion para revision y aprobacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del CONVENIO y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 (Numeración consecutiva) del 11/07/2025 al 17/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita de obra y verificacion de las actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que gene

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4
INTEGRANTES: RAMIRO CELIS ALVAREZ
CONVENIO No. 2121 de 2024 — VALOR INICIAL: 199,513,076.00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: 199,513,076.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): $ 200.513.076,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobados Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del CONVENIO y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita de obra y verificacion de las actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que gene

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.513.076,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobados Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del CONVENIO y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita de obra y verificacion de las actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que gene

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.513.076,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran aprobados Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actualizacion de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del CONVENIO y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2121 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.513.076,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.513.076,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO INICIAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024		30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024		30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025		30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024		31	3	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	7	5	2024		30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	7	5	2024		30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025		30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

ICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	5	7	2024		30	6	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA				Hasta		
					Desde						
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024		30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024		30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	9	2025		30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA				Hasta		
					Desde						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024		30	9	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma: _____
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: c+sdEnUbqCF71I+VHk1M1w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034560	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146303	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.418-4
DIRECCIÓN	VEREDA HOYO CALIENTE FINCA EL RODEO	**TELÉFONO**	3202655689
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2121 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.051.307,60	17.496,83
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.025.653,80	8.748,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.102.615,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.179.576,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.244,83
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.244,83
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.986,52
TOTAL A PAGAR	$	31.231,35

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Ramiro Calis Alvarez
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034560	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146303	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.418-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034560** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

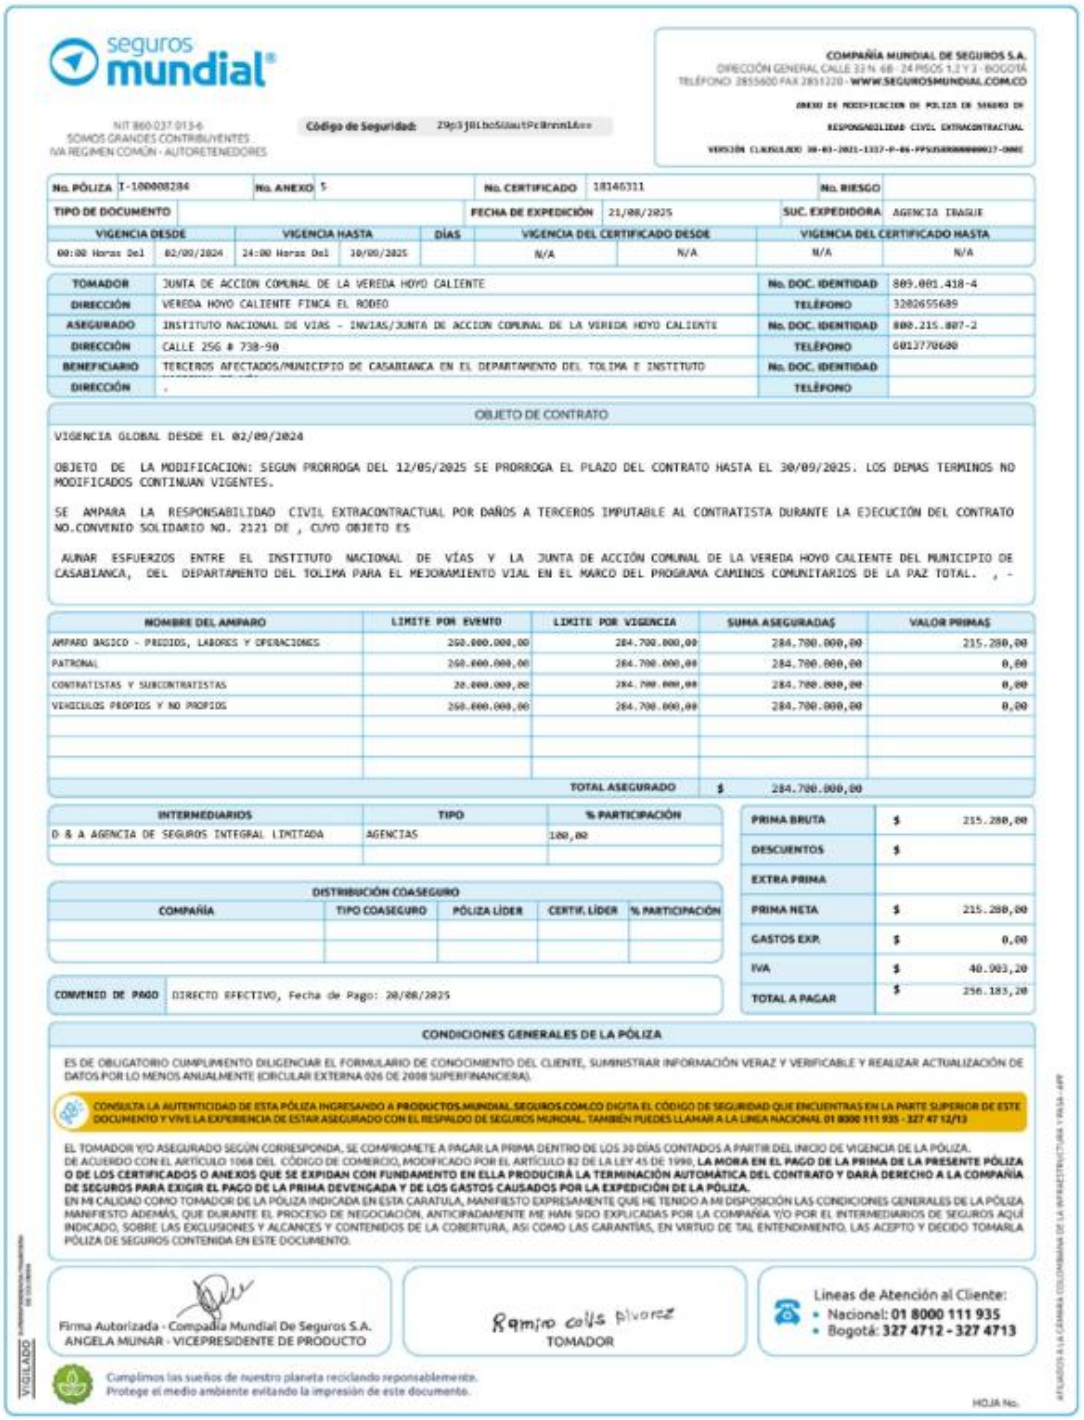

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 29p3jBLboSUaUtPcBnnnlA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSSSRRRRRRRR17-0000

No. PÓLIZA	T-100008284	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.418-4
DIRECCIÓN	VEREDA HOYO CALIENTE FINCA EL RODEO	TELÉFONO	3202655689
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770680
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E INSTITUTO	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NO. 2121 DE , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , -

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	215.280,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	215.280,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	215.280,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	40.903,20
TOTAL A PAGAR	$	256.183,20

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Ramiro Celis Alvarez
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y NIT 830.54-.489

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008284	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. . 809.001.418-4 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2121 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE **NIT 809001418 4**

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	197.858.845,20	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.556,83	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HOYO CALIENTE	NIT 809001418 4						-				-	197.860.402,03	
7	GASTOS BANCARIOS						GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					143.500,00		143.500,00				143.500,00	197.716.902,03	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ACEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	G Y J FERRETERIAS S A	800130426-3				40.186.812,00		40.186.812,00				40.186.812,00	157.530.090,03	
5	ADMINISTRATIVOS						COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	MACRODOTAMOS S.A.S	901589266-9				1.797.429,00		1.797.429,00				1.797.429,00	155.732.661,03	
3	TRANSPORTES						TRANSPORTE CEMENTO	LAJAREANO CATAÑO BURITICA	6029019				2.275.666,00		2.275.666,00				2.275.666,00	153.456.995,03	
5	ADMINISTRATIVOS						EXAMENES MEDICOS	VITALITEC SAS	900996582				647.920,00		647.920,00				647.920,00	152.809.075,03	
2	MATERIALES						CEMENTO ARGOS 42,5KG	DIACEMENTO S.A.S	900353601				21.278.970,00		21.278.970,00				21.278.970,00	131.530.105,03	
2	MATERIALES						COMPRA MATERIALES PETREOS	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS	900237153				8.725.762,42		8.725.762,42				8.725.762,42	122.804.342,61	
2	MATERIALES						TUBO DE CEMENTO REFORZADO 36"	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS	901667149				2.242.625,00		2.242.625,00				2.242.625,00	120.561.717,61	
3	TRANSPORTES						TRANSPORTE CEMENTO	FABIO ANDRES PALACIOS MACHADO	93411427				1.485.000,00		1.485.000,00				1.485.000,00	119.076.717,61	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER DE EQUIPOS	HUGO ORLANDO CHACUA DELGADO	98381327				20.621.000,00		20.621.000,00				20.621.000,00	98.455.717,61	
2	EQUIPO Y HERRAMIENTA						ALQUILER FORMALETA METALICA	NESTOR ELIAS ATUESTA ACOSTA	93406249				9.836.640,00		9.836.640,00				9.836.640,00	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
															-				-	88.619.077,61	
TOTALES		1.556,83											109.241.324,42	-	109.241.324,42	-	-	-	109.241.324,42	88.617.520,78	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	70.644.452,00
2	MATERIALES	32.247.357,42
3	TRANSPORTES	3.760.666,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	2.445.349,00
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	143.500,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.556,83
TOTAL DE SUBTOTALES		**109.241.324,42**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

337

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 11

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 2121 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-514 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.513.076,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIM 809001418 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TO	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.654.230,80	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 91.010,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 284.172,33	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 143.500,00	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ 518.682,33	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 70.644.452,00	$ 70.644.452,00	$ (49.644.452,00)
2	MATERIALES	$ 115.237.866,00	$ -	$ 32.247.357,42	$ 32.247.357,42	$ 82.990.508,58
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ 3.760.666,00	$ 3.760.666,00	$ 26.239.334,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.095.725,20	$ 532.449,28	$ 2.445.349,00	$ 2.977.798,28	$ 3.117.926,92
6	PAGA	$ 4.525.254,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.525.254,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTALES	$ 197.858.845,20	$ 532.449,28	$ 109.097.824,42	$ 109.630.273,70	$ 88.228.571,50

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (___) : $ 1.556,83
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 18.076,22 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2121 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 20.621.000,00	$ 379.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 74.709.835,42	$ 40.528.030,58	$ 115.237.866,00	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 11.321.640,00	$ 18.678.360,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 392.140,44	$ 2.585.657,84	$ 3.117.926,92	$ 6.095.725,20	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.525.254,00	$ 4.525.254,00	2%
	TOTAL				**$ 197.858.845,20**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2206 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.951.148
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAXO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
CORREO ELECTRONICO	juntadeaccioncomunallaporfia@gmail.com
CELULAR	3202655689.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry Vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

se envía cotización para revisión y aprobación, vereda hoyo caliente, porfía linda en el municipio casabianca Tolima.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Se envía actualización de diseño geométrico OAC Vereda porfía linda en el Municipio de Casabianca Tolima.

solicitud para revisión y aprobación para pago a proveedores en la Porfia linda

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semana de la matriz de seguimiento de loa 45 convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a obra y la verificacion de actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfia Linda, El tramo de vía del estudio está situado a menos de 1 km del municipio de Casabianca, con una longitud de 114m.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA NIT. 809.001.661-8			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	2206 - 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.513.076,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Proq					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | SEMANA No.: 37 (Numeración consecutiva) del 11/07/2025 al 17/07/2025 | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a obra y la verificacion de actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfia Linda, El tramo de vía del estudio está situado a menos de 1 km del municipio de Casabianca, con una longitud de 114m.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA NIT. 809.001.661-8		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS	
CONVENIO No.	2206 - 2024	VALOR INICIAL: $ 199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.513.076,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision de documnetos para pago a proveedores
Se solicita a las organizaciones comunales la entrega de hojas de vida del personal propuesto: Ing. Rsidente, contador maestro de obra
Se envia cotizacion para revision y aprobacion

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Socializacion metodologia comunitaria	**Socializacion metodologia comunitaria**	**Socializacion metodologia comunitaria**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a obra y la verificacion de actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfia Linda, El tramo de vía del estudio está situado a menos de 1 km del municipio de Casabianca, con una longitud de 114m.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas.

CONVENIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA NIT. 809.001.661-8
INTEGRANTES: GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO
CONVENIO No.: 2206 - 2024 — VALOR INICIAL: 199,513,076.00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: 199,513,076.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.513.076,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DE CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a obra y la verificacion de actividades a realizar el alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfia Linda, El tramo de vía del estudio está situado a menos de 1 km del municipio de Casabianca, con una longitud de 114m.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas.

CONVENIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA NIT. 809.001.661-8
INTEGRANTES: GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO
CONVENIO No.: 2206 - 2024 — VALOR INICIAL: 199,513,076.00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: 199,513,076.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.513.076,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 393.080.233,00 — 19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 393.080.233,00 — 19,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actualizacion de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2206 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 04/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.951.148,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.951.148,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	5	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	31	3	2025	31	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECC 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	5	7	2024	30	6	2030
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	5	9	2024	30	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma
Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

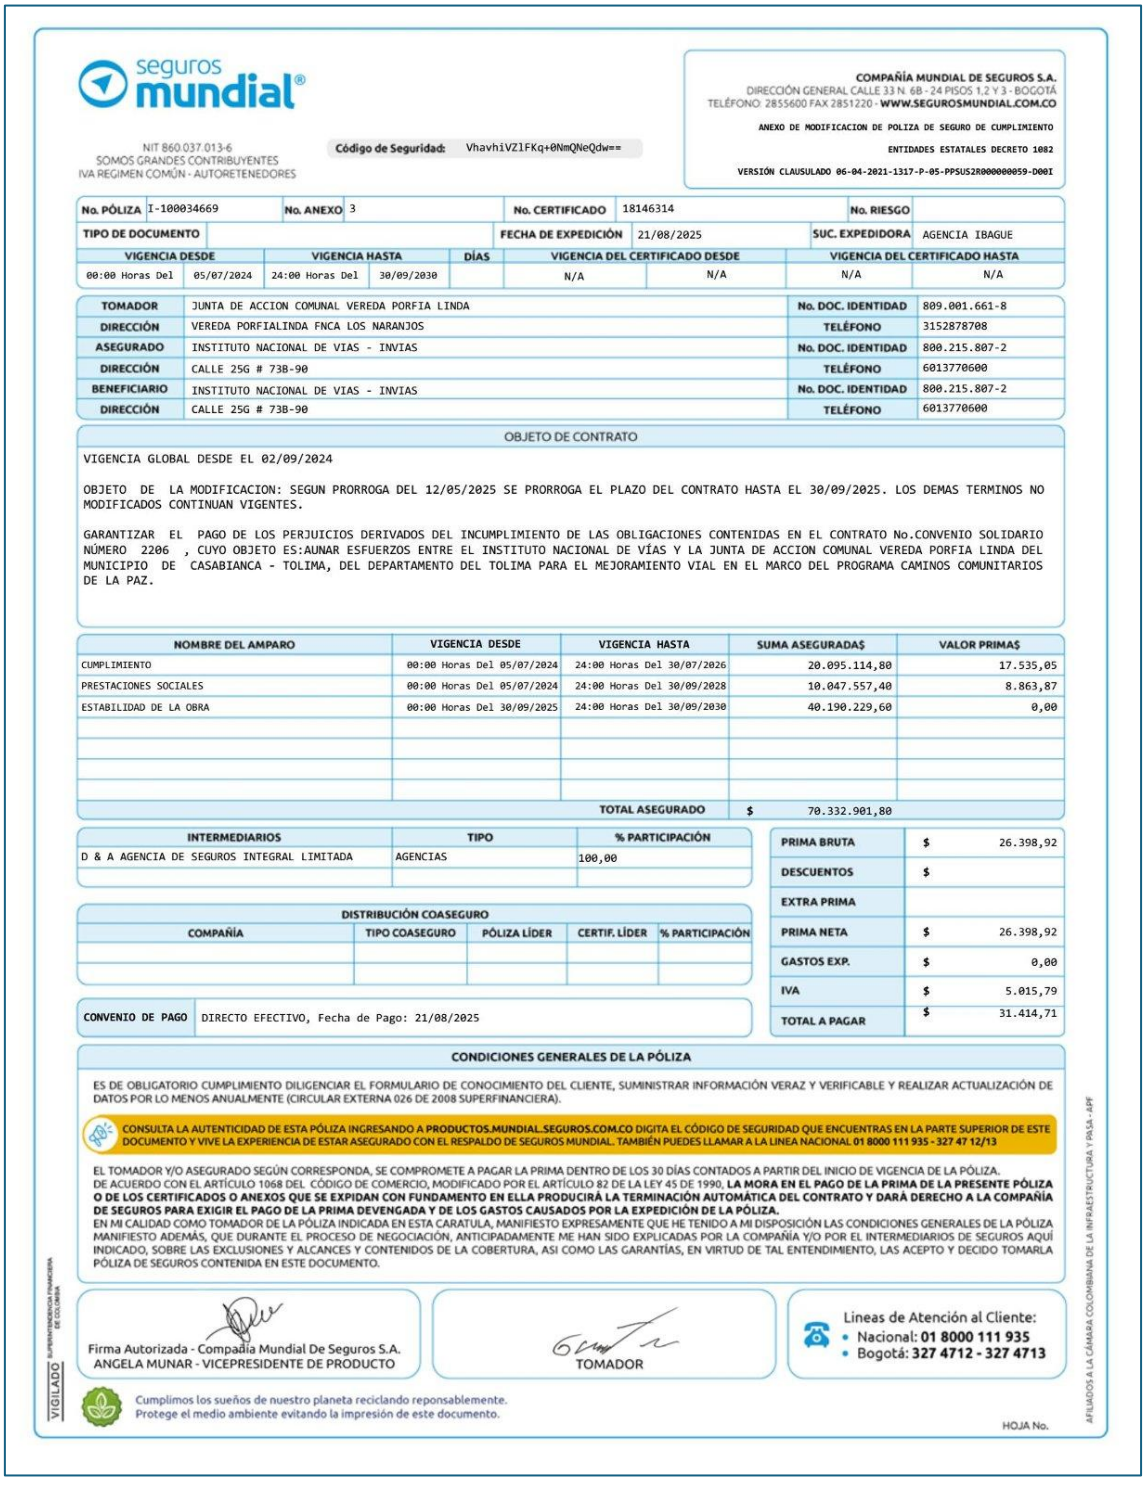

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: VhavhiVZlFKq+0NmQNeQdw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034669	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18146314	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.661-8
DIRECCIÓN	VEREDA PORFIALINDA FNCA LOS NARANJOS	TELÉFONO	3152878708
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2206 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.095.114,80	17.535,05
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.047.557,40	8.863,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.190.229,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.332.901,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.398,92
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.398,92
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.015,79
TOTAL A PAGAR	$	31.414,71

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIPF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034669	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18146314	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.661-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 05/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 05/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034669** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **21/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co

Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

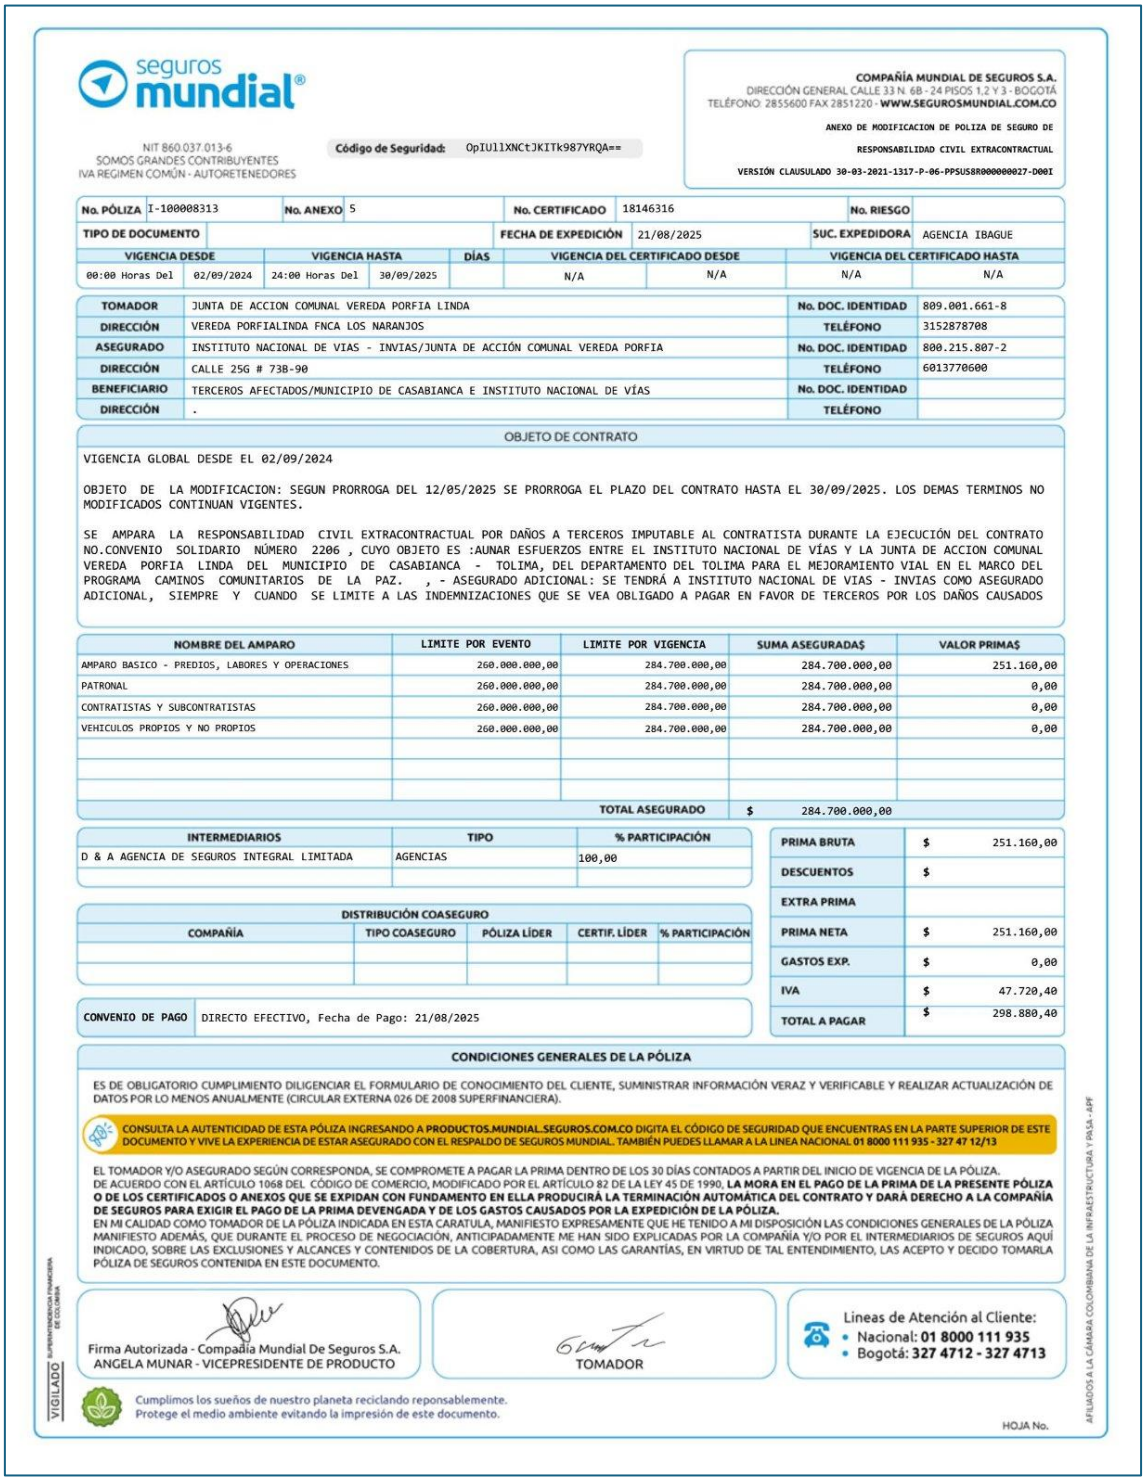

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: OpIUllXNCtJKITk987YRQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008313	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146316	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.661-8
DIRECCIÓN	VEREDA PORFIALINDA FNCA LOS NARANJOS	**TELÉFONO**	3152878708
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CASABIANCA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2206 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	251.160,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	251.160,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	251.160,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.720,40
TOTAL A PAGAR	$	298.880,40

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIPF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008313	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146316	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.001.661-8 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 05/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 05/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - APF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2206 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA NIT 809001661 8

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-					198.337.666,70	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.679,85	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	PORFIA LINDA	NIT 809001661 8						-				-	198.339.346,55	
													-		-				-	198.339.346,55	

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L-

CONVENIO No. 2206 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-506 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.951.148,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA 809001661 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TO	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.613.481,30	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 132.238,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 326.473,17	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ 458.711,17	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 116.164.302,62	$ -	$ -	$ -	$ 116.164.302,62
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.635.400,08	$ 474.278,87	$ -	$ 474.278,87	$ 5.161.121,21
6	PAGA	$ 4.537.964,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.537.964,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	
	TOTALES	$ 198.337.666,70	$ 474.278,87	$ -	$ 474.278,87	$ 197.863.387,83

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ 1.679,85

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 18.120,89 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Origi

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 2206 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA -TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 116.164.302,62	$ 116.164.302,62	59%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 476.226,05	$ 1.679,85	$ 5.157.494,18	$ 5.635.400,08	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.537.964,00	$ 4.537.964,00	2%
				$ -		
	TOTAL			**$ -**	**$ 198.337.666,70**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN (11)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2122 - 2024
OAC	UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	ROBER PIO ROJAS TORRES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.274.651
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	Juntallanovirgen@gmail.com
CELULAR	3224661751.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry Vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Se envía actualización de diseño geométrico OAC Vereda Llano de la Virgen en el Municipio de Coello Tolima.

remisión de estudios de caracterización realizados por la empresa Concrelab para revisión de las veredas: Pajonales Municipio Murillo, Chípalo Municipio de Piedras, Llano de la Virgen Municipio de Coello, Canadá Escocia Municipio de Icononzo, San isidro Municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil Municipio Villarica y Pueblo Nuevo Municipio Saldaña

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Envió de programación para Socialización metodología social comunitaria y programación de reunión selección de proveedores para el día 21 de julio de la Vereda Llano de la Virgen Municipio de Coello.

Se realiza entrega de cotizaciones, memoria de cálculos y otro por parte de la JAC de la Vereda Llano virgen del Municipio de Coello Tolima.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semana de la matrizz de seguimiento de loa 45 convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 317.071.870,00	15,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	0,01%
		1,25

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se envia actualizacion de diseño geometrico OAC
Se realiza entrega de cotizaciones, memoria de calculos y otro por parte de JAC de la vereda Llano de la virgen

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**
Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social	**Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social**	**Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 342.407.991,00	16,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	0,01%
		1,25

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Revision de documentos para pago a proveedores
Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas d evida del personal propuesto, Ing. Residente, contador y maestro de obra
Remison de estudios de caracterizacion realizados por la empresa Concrelab para revision de las veredas: Pajonales municipio Murillo, Chiplao municipio de Piedras, Llano de la virgen municipio de Coello, Canada escocia municipio de Icononzo, San isidro municipio de Planadas, La sonrisa municipio de Ortega, Cuatromil municipio Villarica y Pueblo nuevo municipio de Saldaña

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA: _____ NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 367.744.112,00	18,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
		1,25

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	...	NO ...	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	...	NO ...	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	...	NO ...	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	...	NO ...	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	...	NO ...	N/A	X
EMISIONES:	SI	...	NO ...	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	...	NO ...	N/A	X

OBSERVACIONES:EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de verificacion y posible aprobacion de la programacion plan de cargas CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Envio de programacion para socializacion metodologia social comunitaria y programacion de reunion selección de proveedores para el dia 21 de julio
Actualizacion de la matriz

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**
Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social	**Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social**	**Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2122 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.274.651,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.274.651,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.027.465,10	2	7	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.013.732,55	2	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.054.930,20	2	7	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034542

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.027.465,10	2	9	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.013.732,55	2	9	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.054.930,20	31	3	2025	31	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034542

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008279 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.027.465,10	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.013.732,55	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.054.930,20	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034542

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/05/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008279 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/05/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.13 16:49:36 -05:00

Código de Seguridad: NiKf8jOfaIqdntkwldKbug==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034542	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18138019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.000.673-1
DIRECCIÓN	VDA LLANO DE LA VIRGEN FCA VILLA POLA	**TELÉFONO**	3224661751
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 21/03/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2122 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/04/2026	20.027.465,10	14.650,23
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2028	10.013.732,55	5.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2025	24:00 Horas Del 30/06/2030	40.054.930,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.096.127,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	19.650,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.650,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.733,54
TOTAL A PAGAR	$	23.383,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034542	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18138019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.000.673-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034542** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **08/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **13** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.13 16:50:46 -05:00

Código de Seguridad: vQXMpG03xRVRAkmKG107vQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008279	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18138020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.000.673-1
DIRECCIÓN	VDA LLANO DE LA VIRGEN FCA VILLA POLA	**TELÉFONO**	3224661751
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE COELLO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA E INSTITUTO NACIONAL DE	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 21/03/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2122 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	212.940,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	212.940,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	212.940,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	40.458,60
TOTAL A PAGAR	$	253.398,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008279	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18138020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. . 900.000.673-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

2122 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 (Indicar número de contrato y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Socialización metodologia social comunitaria , junto a seleccion proveedores. 2, Veeduria ciudadana para el proyecto.
TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Presentación de asistentes OAC, Interventoria e INVIAS. 2. Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoria. 3, Aspectos area Tecnica. 4. Aspectos administrativos. 5. Aspectos area socioambiental. 6. Veeduria ciudadana y comité de participación ciudadana. 7. inquietudes o solicitudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

• Se exponen mecanismos para poder ampliar el alcance inicial planteado que inicialmente es de 171 ml con la construcción de una alcantarilla, siendo necesaria la gestión de la comunidad para que la alcaldía municipal los apoye prestándoles la maquinaria pesada, para las labores de excavación, cajeo y/o conformación de la vía, y así mismo establecer el apoyo a brindarle a la Junta De Acción Comunal, en la construcción de la Obra.

4. Aspectos administrativos - previo a selección de proveedores

• Se entrega le indica a la veeduría y a la comunidad presente, que pueden apoyar al representante legal de la Organización de acción comunal, en el proceso de cotizaciones y que será de pleno conocimiento de la veeduría conformada previamente a esta visita, las cotizaciones presentadas a la interventoría.

5. Aspectos área socioambiental.
Plan de gestión social es el conjunto de actividades de información, atención a la comunidad y participación comunitaria, que se realizarán durante el inicio, la ejecución y cierre del Convenio Solidario.
Todas las actividades las realiza la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN, con el acompañamiento de la interventoría y la profesional social de la Dirección Territorial INVIAS.
Designación del Dignatario/a responsable de la gestión social durante el convenio Encargado de Liderar:
- Liderar la atención a PQRSF, la realización de socializaciones, y actividades con la comunidad en General.
- Proporcionar la información que requiera la interventoría en el desarrollo de actividades con la comunidad.
- Articularse con la interventoría inicio, Ejecución y Cierre del convenio.
- Manejar el buzón de PQRSF, ubicado en el lugar de fácil acceso de la comunidad.
- Atención oportuna a las soluciones que se realicen a la JAC.
- Convocatoria, Acta de reunión, listado de asistencia.
- Para la inauguración se puede realizar alguna de las siguientes actividades:
Olla comunitaria, Placa o valla comunitaria, Actividad deportiva, Muestra artística y cultural, Juntaza o Bazar, veeduría Ciudadana /Comité Participación Comunitaria.

Se deben tomar acciones y estrategias implementadas para minimizar el impacto negativo de la construcción en el medio ambiente. Esto implica la gestión de recursos, la prevención de la contaminación, la protección de la biodiversidad y la correcta disposición de residuos.

6. veeduría ciudadana y comité de participación ciudadana:
Se ratifica la veeduría en la VEREDA LLANO DE LA VIRGEN del municipio de COELLO, Conformada en el marco del convenio con RESOLUCION N°. 057 conformada por:
CARGO ---------- NOMBRE---------- CEDULA ---------- CEL.
- Luisa Fernanda Ortiz Vega – C.C. 1.109.265.084
- Filiberto Barrero Díaz – C.C. 79.650.462
- Maritza Morales Montealegre – C.C. 1.109.266.051

Se realiza la descripción de la veeduría, es un sistema de control social que involucra a ciudadanos y organizaciones para supervisar la gestión pública y asegurar que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Las veedurías buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta inversión de los recursos públicos, cuyas funciones serán de:
- Vigilar procesos de planeación
- Vigilar la asignación de presupuestos
- Vigilar procesos de contratación-
- Fiscalizar la ejecución de obras e inversiones
- Recibir informes y sugerencias
- Solicitar información que permita verificar el cumplimiento
- Comunicar a la ciudadanía avances de procesos en desarrollo
- Remitir a las autoridades informes de control y vigilancia
- Denunciar hechos o actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

Las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente:
-Retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.
-Solicitar beneficios o compensaciones por las funciones realizadas.
-Modificar o cambiar los objetivos o beneficiarios de los programas o proyectos.

7. Inquietudes o solicitudes.
La interventoría resalta que es fundamental establecer un plan de divulgación, difusión con las veredas aledañas y empresas de transporte u otras instituciones que habiten, ocupen el paso por esta vía, ya que esta obra requiere un cierre total de la vía en el momento de la construcción de alcantarillas.
La interventoría reitera el PLAN DE INVERSION SOCIAL y la importancia de contar con una propuesta en la cual se puedan aplicar estos recursos; se resalta que debe ser con inmediatez. La comunidad manifiesta la instalación de un parque infantil en la escuela de la vereda.

8. OTROS
- AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRES: Se sugiere a la Junta de acción comunal realice tramite de permiso de servidumbres para la alcantarilla nueva, esto por ser nuevos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2025 (Día / Mes / Año)

pasos de conducción de agua con el fin de prevenir dificultades en el momento constructivo y posterior a este.
- MANEJO DE TRÁFICO: Se solicita comunicación por escrita y de diversos medios que permita dejar trazabilidad e implementar acciones mientras la obra se encuentra en ejecución, usualmente estas intervenciones generan incomodidades a las comunidades aledañas, por lo tanto, es fundamental estar al tanto todos los actores con el inicio y la ejecución del proyecto.
- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES: Se expone a la comunidad que estos materiales tienen una destinación específica para el proyecto por lo tanto todos debemos actuar como veedores para el cuidado y buen uso de estos, no es posible estos tomen otra destinación.
- CUENTA CONJUNTA Con el fin de dar claridad en cuanto al manejo del recurso, se informa a la comunidad que este presupuesto no está en el bolsillo del presidente de junta ni de los veedores, esto hace parte de una cuenta conjunta con el INVIAS, el cual tiene una destinación específica que no es diferente a cumplir el alcance del proyecto.
- PUNTO SAC Se establece la importancia en la elaboración de una cartelera con los correos electrónicos y números de contacto de los profesionales que intervienen a fin de dar claridad a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto. Se reitera que debe ser una cartelera en un lugar visible y debe contar con un buzón.
- PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL: Se deriva un compromiso y es el envío por parte de interventoría de un formato que facilite la formulación de la propuesta.
- SOCIALIZACION FINAL: Una vez el proyecto cumpla con un 95% de obra ejecutada se realiza la socialización final la cual se estima sea en celebración y oficialmente entrega a disfrute de la obra construida.
- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: Se expone a la comunidad asistente que los proyectos regularmente cuentan con un manual de mantenimiento el cual se espera la comunidad se apropie con el fin de dar una vida adecuada a la obra ejecutada y un mantenimiento a las alcantarillas de esta forma se garantiza la vida de lo realizado, resaltando el manejo adecuado de esta.

Se da por terminada la socialización siendo las 10:30 PM

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Envio del formato para el planteamiento de la propuesta del PIS		INTERVENTORIA
Elaboración e instalación de cartelera, buzon del punto de servicio de atención al ciudadano.		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CAMILO ANDRES PENAGOS MORALES	INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA - CONSORCIO VIAL JJ	
JOHN EDWIN GIL RICARDO	PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA - CONSORCIO VIAL JJ	
PABLO EMILIO MÉNDEZ	INSPECTOR	INTERVENTORIA - CONSORCIO VIAL JJ	

SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventoría y Dirección Territorial

5.0 COMPONENTE FINANCIERO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2122 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT 900000673 1

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	197.789.643,30	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.676,26	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LLANO DE LA VIRGEN	NIT 900000673 1						-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
															-				-	197.791.319,56	
TOTALES		1.676,26											-	-	-	-	-	-	-	197.789.643,30	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.676,26
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

388

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L-

CONVENIO No. 2122 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 40512709-3 **BANCO** AV VILLAS ESPINAL SUCURSAL: AV VILLAS ESPINAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.274.651,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA 900000673_1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.465.007,70	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 89.990,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 276.762,37	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ 366.772,37	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 114.486.549,77			$ -	$ 114.486.549,77
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.785.729,27	$ 349.806,64		$ 349.806,64	$ 5.435.922,63
6	PAGA	$ 4.518.337,00			$ -	$ 4.518.337,00
7	POLIZAS			$ -	$ -	$ -
		$ -		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 197.790.616,04	$ 349.806,64	$ -	$ 349.806,64	$ 197.440.809,40

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ 1.676,26
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 16.396,23 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 2122 - 2024 (Indicar número y año)

EJECUTOR: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 114.486.549,77	$ 114.486.549,77	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 350.510,16	$ 1.676,26	$ 5.433.542,85	$ 5.785.729,27	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.518.337,00	$ 4.518.337,00	2%
				$ -		
TOTAL				**$ -**	**$ 197.790.616,04**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3515 - 2024	
OAC	ASOCIACON DE CABILDOS INIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	DARIO BOTACHE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	201.550.463	
FECHA DE INICIO	11/10/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	23/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE MAYO 2025	
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	presidenciaacit2017@gmail.com	
CELULAR	3124000009	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12)

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
INTEGRANTES: LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN
CONVENIO No. 3421- 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 8/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.248.396,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingenioro residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEFI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 37 del 11/07/2025 al 17/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta fisica generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No.: 3515- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 8/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 201.550.463,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 342.407.991,00 — 16,94%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 38 del 18/07/2025 al 24/07/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No. 3515- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 8/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: $ 201.550.463,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 367.744.112,00 — 18,20%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 39 del 25/07/2025 al 31/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA:	LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA,		
INTEGRANTES:	DARIO BOTACHE		
CONVENIO No.	3515- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO:	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 393.080.233,00	19,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.336.121,00	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No hubo registro de actividades.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3515 DE 2024 **CONTRATISTA:** LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.155.046,30	4	9	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.523,15	4	9	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.310.092,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036423

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	9	9	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.155.046,30	4	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.523,15	4	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.310.092,60	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036423

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	9	2024	31	5	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008791 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.





seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.25 11:42:34 -05:00

Código de Seguridad: OYMjpCZJlDW5A4fKCwAihQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036423	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18135892	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.235.798-1
DIRECCIÓN	CR 3 1 22 ESQ	**TELÉFONO**	3172791036
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B 90, CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B 90, CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3219524750

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 11/10/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 23/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 223/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.3515 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2026	20.155.046,30	29.183,40
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	10.077.523,15	14.688,34
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	40.310.092,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.542.662,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	43.871,74
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	43.871,74
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.335,63
TOTAL A PAGAR	$	52.207,37

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Dario Fernando Bolaños Tique

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036423	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18135892	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT), EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.235.798-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/09/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 04/09/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Del 06/08/2025 al 05/09/2025

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036423** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **09/04/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **25** días del mes **ABRIL** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.25 11:44:54 -05:00

Código de Seguridad: srMphPissMueS3I7PTX9xg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008791	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18136383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.235.798-1
DIRECCIÓN	CR 3 1 22 ESQ	**TELÉFONO**	3172791036
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B 90, CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE COYAIMA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 11/10/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 23/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 223/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.3515 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	412.230,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	412.230,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	412.230,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	78.323,70
TOTAL A PAGAR	$	490.553,70

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Darío fernando Bolaños T.que
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008791	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	18136383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 800.235.798-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 04/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 04/09/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3515 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA **NIT 800235798 1**

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso														-				-	199.123.516,29	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.685,85	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CABILDOS INDIGENAS	NIT 800235798 1						-				-	199.125.202,14	
													-		-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
															-				-	199.125.202,14	
TOTALES		1.685,85											-	-	-	-	-	-	-	199.123.516,29	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.685,85
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

410

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** L

CONVENIO No. 3515 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401 29589- 4 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.550.463,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA NIT 800235798 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)+40:91A9440:9940:101A9440:9940:1024 0:10140:9840:9940:10240:10340:10240:10140:97 40:9840:99	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOL	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.426.946,71	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
MUNDIAL DE SEGUROS		MARZO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
MUNDIAL DE SEGUROS		MAYO DEL 2025	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS A JUNIO
AV VILLAS		JUNIO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	GASTOS BANCARIOS JULIO
				$ -	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00			$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.568.163,29			$ -	$ 115.568.163,29
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00			$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.000.000,00	$ 552.395,25		$ 552.395,25	$ 5.447.604,75
6	PAGA	$ 4.555.353,00			$ -	$ 4.555.353,00
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ -
		$ -			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	$ 199.123.516,29	$ 552.395,25	$ -	$ 552.395,25	$ 198.571.121,04

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( ) : $ 1.685,85
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 5.258,41 $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3515 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO COYAIMA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 115.568.163,29	$ 115.568.163,29	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 554.081,10	$ 1.685,85	$ 5.444.233,05	$ 6.000.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ 4.555.353,00	$ 4.555.353,00	2%
	TOTAL				**$ 199.123.516,29**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA (13)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3421 - 2024	
OAC	COMUNIDAD INIGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN	
OBJETO	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$200.248.396	
FECHA DE INICIO	27/SEPTIEMBRE 2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	19/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 20258	
CORREO ELECTRONICO	Cabildopijaomesasdeinca@gmail.com	
CELULAR	3155640675	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Solicitar una reunión con la profesional Tania Mantilla INVIAS junto al profesional financiero de la interventoría Henrry vanegas para el manejo contable y financiero de los 45 convenios.

Solicitud cargue documentos SharePoint de cada convenio.

se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ing. residente, contador, maestro obra.

Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024.

Actualización semanal de la matriz de seguimiento para cada convenio

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 36	4/07/2025	10/07/2025
SEMANA 37	11/07/2025	17/07/2025
SEMANA 38	18/07/2025	24/07/2025
SEMANA 39	25/06/2025	31/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 36 del 4/07/2025 al 10/07/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.
INTEGRANTES: LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN
CONVENIO No. 3421- 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: 8/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 200.248.396,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 317.071.870,00 — 15,69%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 25.336.121,00 — 1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* Cantidades de obra					Prog					
					Ejec					
* Cotizaciones					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...	N/A ...
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A ...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A ...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A ...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A ...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A ...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A ...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
