	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. ..... **Contratista:** .....

Contrato de Interventoría No. 3555-202 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL JJ

Objeto Contrato de Obra:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** Agosto

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		41-85
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		86-88
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de ejecucion del proyecto		88-112
2.3	Características técnicas del proyecto		113
3	**INFORMACIÓN CONVENIO**		
3.1	Información general del convenio		114, 140,166,200,225,253,279,307,336,369,400,426,452,478,504,530,555,581,610,635,662,688,716,732,753,778,799,820,841,863,884,905,926,951,977,1003,1029,1057,1085,1113,1134,1160,1181,1213,1234,
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		115,141,167-169,201,226-227,254,280,308,337,370,401,427,453,479,505,531,556,582,611,636,663,689,717-718,733,754,779,800,821,842,864,886,906,927,952,978,11004,1030,1058,1086,1114,1135,1161,1182,1214,1235,
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		115,141,167,169,201,227,254,280,308,338,371,402,428,453,480,505,532,557,583,612,636-638,664,689,718,734,755,779,801,821,842,864,886,907,928,953,979,1005,1031,1059,1087,1114,1135,1161,1183,1214,1236,
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		115,141,169,201,227,255,281,309,338,371,402,428,453,480,506,532,557,583,612,639,664,690,7734,755,779,801,821,843,865,886,907,928,953,979,1005,1031,1059,1087,1115,1136,1161,1183,1215,1236,
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	116-126, 142-152,169-179,202-212,227-237,255-265,281-291,309-319,338-348,371-380,402-412,428-438,454-464,480-490,506-516,532-542,557-567,584-593,612-622,639-649,664-674,690-700,718-723,734-739,755-765,780-785,801-806,822-827,843-848,865-870,886-891,907-917,928-938,953-963,979-989,1005-1015,1031-1041,1059-1069,1087-1097,1115-1120,1136-1146,1162-1167,1183-1190,1215-1220,1236-1246,
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	127,153,180,213,238,266,292,320,349,381,413,439,465,491,517,543,568,594,623,650,675,701,724,740,766,786,807,828,849,871,892,918,939,964,990,1016,1042,1070,1098,1121,1147,1168,1191,1221,1247,
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	127,153,181-183,213,239,266,292,320,350-351,382,413,439,465,491,517,543,568,594,623,650,675,701,724,740,766,786,807,828,849,871,892,918,939,964,990,1016,1042,1070,1098,1121,1147,1168,1192,1221,1247,
4.4	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	127,153,184,213,240,266,292,320,352,383,413,439,465,491,517,543,568,594,623,650,675,701,724,740,766,786,807,828,849,871,892,918,939,964,990,1016,1042,1070,1098,1121,1147,1168,1193,1221,1247,
4.5	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	127,153,185-186,213,241,266,292,320,353,384,413,439,465,491,517,543,568,594,623,650,675,701,724,740,766,786,807,828,849,871,892,918,939,964,990,1016,1042,1070,1098,1121,1147,1168,1194,1221,1247,
4.6	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	127-135, 153-161,187-194,213-220,242,266-274,292-298,320-328,353-360,384-391,413-421,439-447,465-473,491-499,517-525,543-550,568-576,594-602,623-630,650-657,675-683,701-709,724-727,740-748,766-773,786-794,807-815,828-836,849-857,871-879,892-900,918-921,939-946,964-972,990-998,1016-1024,1042-1050,1070-1078,1098-1107,1121-1129,1147-1155,1168-1176,1195-1202,1221-1229,1247-1254,
4.7	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	136,162,195,221,242-247,275,299,329,361,392,422,448,474,500,526,551,577,603,631,658,684,710,728,749,774,795,816,837,858,880,901,922,947,973,999,1025,1051,1079,1107,1130,1156,1177,1203-1208,1230,1255,

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

4.8	Actas		136,162,196,221,242,249,275,299-302,329-331,361,392,422,448,474,500,526,551,577,604-606,631,658,684,710-712,728,749,774,795,816,858,880,901,922,947,973,999,1025,1051,1079,1107,1130,1156,1177,1209,1230,1255-1256,
5	**COMPONENTE FINANCIERO**		
5.1	Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-1	136,162,196,221,249,275,303,332,361-365,393-396,422,474,500,526,551,577,606,631,658,684,712,728,749,774,795,816,837,858,880,901,922,947,973,999,1025,1051-1053,1079-1081,1108-1109,1130,1156,1177,1209,1230,1256,
5.2	Auxiliar detallado	MEPI-MN-IN-2-FR-2	137,163,197,222,250,276,304,333,366,397,423,449,475,501,527,552,578,607,632,659,685,713,729,750,775,796,817,838,859,881,902,923,948,974,1000,1026,1054,1082,1110,1131,1157,1178,1210,1231,1257,
5.3	Informe de inversión y buen manejo del desembolso convenio		138,164,198,223,251,277,305,334,367,398,424,450,476,502,528,553,579,608,633,660,686,714,730,751,776,797,818,839,860,882,903,924,949,975,1001,1027,1055,1083,1111,1132,1158,1179,1211,1232,1258,
5.4	Plan de inversion y desembolso	MEPI-MN-IN-6-FR-1	139,165,199,224,252,278,306,335,368,399,425,451,477,503,529,554,580,609,634,661,687,715,731,752,777,798,819,840,861,883,904,925,950,976,1002,1028,1056,1084,1112,1133,1159,1180,1212,1233,1259,
6	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Información general del contrato		1260
6.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		1261-1267
6.3	Informes especialistas y profesionales		1268
6.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1268
7	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
7.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1269
7.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1270-1272
7.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1273-1274
7.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1275-1280
7.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1281-1283
7.6	Otros documentos seguimiento mensual		1284
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1284
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1285
8	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		1286
9	**ANEXOS**		
9.1	Relacion de la correspondencia generada entreda entre contratista e interventor incluyendo asunto,fecha de recibo		1286-1287
9.2	Registro fotografico		1288-1310
	Documentos del embargo del convenio el tambo		1311-1469

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9
CONTRATO 3555 – 2024



INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 9

CONTRATO 3555 – 2024

OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"LOTE 3.
INTERVENTORIA:	CONVENIOS CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL OAC O COMUNIDADES ÉTNICAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA
PERIODO:	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Contenido

ALVARADO 41

ANZOATEGUI 43

CAJAMARCA 47

CASABIANCA 49

COYAIMA 52

ICONONZO 55

MURILLO 56

NATAGAIMA 57

ORTEGA 63

PIEDRAS 66

PLANADAS 67

RIOBLANCO 72

ROVIRA 77

SALDAÑA 80

SAN LUIS 81

SUAREZ 82

VENADILLO 83

VILLARICA 84

1.INTRODUCCION 86

2.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 86

2.1 LOCALIZACIÓN 86

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 88

ALVARADO 88

ANZOATEGUI 89

CAJAMARCA 91

CASABIANCA 92

COELLO 93

COYAIMA 94

ICONONZO 95

MURILLO 96
NATAGAIMA 97
ORTEGA 100
PIEDRAS 101
PLANADAS 102
2.2.15 RIOBLANCO 105
SALDAÑA 110
SAN LUIS 110
SUAREZ 111
VENADILLO 111
VILLARICA 112
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 113
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO (1) 114
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 114
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 115
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 115
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 116
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO - 4047-2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO 116
4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL 116
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 127
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 127
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 127
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 127
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 127
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 136
4.8 ACTAS 136
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO 136

5.1 ACTAS DE COMITÉ 136
5.2 AUXILIAR DETALLADO 137
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 138
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 139
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO (2) 140
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 140
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 141
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 141
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 142
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO 142
4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL 142
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 153
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 153
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 153
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 153
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 153
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 162
4.8 ACTAS 162
5. 0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO 162
5.1 ACTAS DE COMITÉ 162
5.2 AUXILIAR DETALLADO 163
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 164
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 165
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA (3) 166
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 166
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 167

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 169
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 169
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA 169
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 169
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 180
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 181
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 184
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 185
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 187
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 195
4.8 ACTAS 196
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA 196
5.1 ACTAS DE COMITÉ 196
5.2 AUXILIAR DETALLADO 197
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 198
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 199
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4) 200
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 200
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 201
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 201
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 202
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4) 202
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 202
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 213
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 213

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 213
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 213
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 213
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 221
4.8 ACTAS 221
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO 221
5.1 ACTAS DE COMITÉ 221
5.2 AUXILIAR DETALLADO 222
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 223
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 224
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA (5) 225
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 225
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 226
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 227
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 227
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA 227
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 227
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 238
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 239
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 240
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 241
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 242
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 248
4.8 ACTAS 249
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA 249
5.1 ACTAS DE COMITÉ 249

5.2 AUXILIAR DETALLADO 250
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 251
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 252
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA (6) 253
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS. 253
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 254
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 254
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 255
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA 255
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 255
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 266
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 266
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 266
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 266
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 266
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 275
4.8 ACTAS 275
5.0 COMPONENTE FINANCIERO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA 275
5.1 ACTAS DE COMITÉ 275
5.2 AUXILIAR DETALLADO 276
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 277
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 278
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA3359-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALOMA (7) 279
3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS. 279
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 280
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 280

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 281
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA 281
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 281
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 292
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 292
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 292
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 292
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 292
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 299
4.8 ACTAS 299
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA 303
5.1 ACTAS DE COMITÉ 303
5.2 AUXILIAR DETALLADO 304
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 305
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 306
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES (8) 307
3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS 307
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 308
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 308
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 309
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES 309
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 309
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 320
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 320
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 320

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 320
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 320
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 329
4.8 ACTAS 329
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES 332
5.1 ACTAS DE COMITÉ 332
5.2 AUXILIAR DETALLADO 333
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 334
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 335
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE (9) 336
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 336
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 337
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 338
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 338
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE 338
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 338
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 349
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 350
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 352
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 353
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 353
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 361
4.8 ACTAS 361
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE 361
5.1 ACTAS DE COMITÉ 361
5.2 AUXILIAR DETALLADO 366

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 367
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 368
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA 369
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 369
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 370
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 371
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 371
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA 371
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 371
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 381
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 383
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 384
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 384
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 392
4.8 ACTAS 392
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA 392
5.1 ACTAS DE COMITÉ 393
5.2 AUXILIAR DETALLADO 397
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 398
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 399
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN (11) 400
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 400
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 401
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 402
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 402

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN 402
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 402
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 413
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 413
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 413
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 413
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 413
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 422
4.8 ACTAS 422
5.0 COMPONENTE FINANCIERO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN 422
5.1 ACTAS DE COMITÉ 422
5.2 AUXILIAR DETALLADO 422
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 424
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 425
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12) 426
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 426
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 427
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 428
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 428
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12) 428
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 428
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 438
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 438
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 439
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 439

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 439
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 448
4.8 ACTAS 448
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA 448
5.1 ACTAS DE COMITÉ 448
5.2 AUXILIAR DETALLADO 449
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 450
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 451
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA (13) 452
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 452
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 453
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 453
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 453
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA 454
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 454
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 465
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 465
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 465
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 465
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 465
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 474
4.8 ACTAS 474
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA DEL TOLIMA 474
5.1 ACTAS DE COMITÉ 474
5.2 AUXILIAR DETALLADO 475
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 476

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 477
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO (14) 478
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 478
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 479
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 480
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 480
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO 480
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 480
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 490
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 491
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 491
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 491
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 491
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 500
4.8 ACTAS 500
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO 500
5.1 ACTAS DE COMITÉ 500
5.2 AUXILIAR DETALLADO 501
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 502
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 503
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA (15) 504
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 504
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 505
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 505
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 506

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA 506
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 506
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 517
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 517
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 517
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 517
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 517
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 525
4.8 ACTAS 526
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ICONONZO 2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA 526
5.1 ACTAS DE COMITÉ 526
5.2 AUXILIAR DETALLADO 526
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 528
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI (16) 530
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 530
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 531
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 532
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 532
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI 532
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 532
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 543
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 543
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 543
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 543
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 543

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 551
4.8 ACTAS 551
5.0 COMPONENTE FINANCIERO MURILLO 2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI 551
5.1 ACTAS DE COMITÉ 551
5.2 AUXILIAR DETALLADO 552
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 553
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 554
3.0 INFORMACION CONVENIO NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 555
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 555
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 556
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 557
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 557
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 557
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 557
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 568
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 568
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 568
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 568
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 568
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 577
4.8 ACTAS 577
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO 2024 NATAGAIMA 2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO 577
5.1 ACTAS DE COMITÉ 577
5.2 AUXILIAR DETALLADO 578
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 579
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 580

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO (18) 581
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 581
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 582
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 583
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 583
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO 583
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 583
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 594
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 594
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 594
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 594
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 594
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 603
4.8 ACTAS 604
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO NATAGAIMA 3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO 606
5.1 ACTAS DE COMITÉ 606
5.2 AUXILIAR DETALLADO 607
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 608
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 609
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 610
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 610
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 611
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 612
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 612
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGIAMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 612

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 612
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 623
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 623
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 623
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 623
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 623
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 631
4.8 ACTAS 631
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO NATAGIAMA 3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO (19) 631
5.1 ACTAS DE COMITÉ 631
5.2 AUXILIAR DETALLADO 631
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 633
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO(20) 635
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 635
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 636
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 636
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 638
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO 639
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 639
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 650
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 650
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 650
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 650
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 650
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 658
4.8 ACTAS 658

5.0 COMPONENTE FINANCIERO NATAGAIMA CONVENIO NATAGAIMA 3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO 658
5.1 ACTAS DE COMITÉ 658
5.2 AUXILIAR DETALLADO 659
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 660
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 661
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL (21) 662
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 662
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 663
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 663
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 664
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL 664
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 664
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 675
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 675
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 675
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 675
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 675
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 684
4.8 ACTAS 684
5.0 COMPONENTE FINANCIERO NATAGAIMA 3247 - 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL (21) 684
5.1 ACTAS DE COMITÉ 684
5.2 AUXILIAR DETALLADO 685
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 686
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 687
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE(21) 688

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 688
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 689
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 689
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 690
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE 690
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 690
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 701
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 701
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 701
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 701
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 701
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 710
4.8 ACTAS 710
5.0 COMPONENTE FINANCIERO AL CONVENIO NATAGAIMA 3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE 712
5.1 ACTAS DE COMITÉ 712
5.2 AUXILIAR DETALLADO 713
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 714
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 715
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ORTEGA 2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE (22) 716
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 716
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 717
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 718
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 718
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ORTEGA 2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE 718
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 718

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 724
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 724
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 724
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 724
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 724
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 728
4.8 ACTAS 728
5.0 COMPONENTE FINANCIERO AL CONVENIO ORTEGA 2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE 728
5.1 ACTAS DE COMITÉ 728
5.2 AUXILIAR DETALLADO 729
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 730
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 731
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA (23) 732
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 732
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 734
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 734
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA 734
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 734
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 740
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 740
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 740
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 740
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 740
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 749
4.8 ACTAS 749

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ORTEGA 2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA 749
5.1 ACTAS DE COMITÉ 749
5.2 AUXILIAR DETALLADO 750
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 751
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 752
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI (24) 753
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 753
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 754
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 755
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 755
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI (24) 755
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 755
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 766
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 766
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 766
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 766
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 766
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 774
4.8 ACTAS 774
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PALOCABILDO3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI 774
5.1 ACTAS DE COMITÉ 774
5.2 AUXILIAR DETALLADO 775
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 776
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 777
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PIEDRA S2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO((25) 778

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 778
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 779
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 779
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 779
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PIEDRAS 2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO 780
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 780
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 786
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 786
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 786
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 786
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 786
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 795
4.8 ACTAS 795
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PIEDRAS 2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO 795
5.1 ACTAS DE COMITÉ 795
5.2 AUXILIAR DETALLADO 796
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 797
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 798
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 799
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 799
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 800
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 801
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 801
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 801
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 801

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 807
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 807
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 807
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 807
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 807
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 816
4.8 ACTAS 816
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO (26) 816
5.1 ACTAS DE COMITÉ 816
5.2 AUXILIAR DETALLADO 817
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 818
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 819
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 820
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 820
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 821
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 821
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 821
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 822
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 822
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 828
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 828
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 828
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 828
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 828
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 837
4.8 ACTAS 837

5. 0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 837
5.1 ACTAS DE COMITÉ 837
5.2 AUXILIAR DETALLADO 838
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 839
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 840
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,(29) 841
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 841
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 842
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 842
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 843
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA 843
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 843
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 849
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 849
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 849
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 849
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 849
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 858
4.8 ACTAS 858
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA, ... 858
5.1 ACTAS DE COMITÉ 858
5.2 AUXILIAR DETALLADO 859
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 861
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 862
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA(30) 863

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 863
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 864
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 864
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 865
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 865
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 865
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 871
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 871
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 871
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 871
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 871
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 880
4.8 ACTAS 880
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 880
5.1 ACTAS DE COMITÉ 880
5.2 AUXILIAR DETALLADO 881
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 882
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 883
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO 884
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 884
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 885
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 886
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 886
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO 886
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 886

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 892
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 892
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 892
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 892
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 892
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 901
4.8 ACTAS 901
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO PLANADAS 2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO 901
5.1 ACTAS DE COMITÉ 901
5.2 AUXILIAR DETALLADO 902
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 903
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 904
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 905
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 905
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 906
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 907
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 907
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 907
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 907
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 918
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 918
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 918
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 918
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 918
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 922
4.8 ACTAS 922

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO 922
5.1 ACTAS DE COMITÉ 922
5.2 AUXILIAR DETALLADO 923
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 924
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 925
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE (33) 926
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 926
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 927
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 928
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 928
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL. RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE 928
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 928
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 939
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 939
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 939
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 939
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 939
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 947
4.8 ACTAS 947
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE 947
5.1 ACTAS DE COMITÉ 947
5.2 AUXILIAR DETALLADO 948
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 949
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 950
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA(34) 951

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 951
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 952
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 953
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 953
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 953
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 953
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 964
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 964
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 964
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 964
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 964
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 973
4.8 ACTAS 973
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA 973
5.1 ACTAS DE COMITÉ 973
5.2 AUXILIAR DETALLADO 974
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 975
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 976
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO (35) 977
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 977
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 978
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 979
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 979
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO 979
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 979

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 990
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 990
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 990
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 990
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 990
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 999
4.8 ACTAS 999
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO 999
5.1 ACTAS DE COMITÉ 999
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1000
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1001
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1002
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS (36) 1003
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1003
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1004
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1005
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1005
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS (36) 1005
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1005
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1016
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1016
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1016
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1016
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1016
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1025
4.8 ACTAS 1025

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO RIOBLANCO 2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS 1025
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1025
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1026
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1027
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1028
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 1029
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1029
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1030
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1031
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1031
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 1031
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1031
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1042
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1042
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1042
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1042
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1051
4.8 ACTAS 1051
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO 1051
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1051
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1054
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1055
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1056
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO (38) 1057
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1057

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1058
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1059
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1059
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO 1059
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1059
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1070
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1070
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1070
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1070
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1079
4.8 ACTAS 1079
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO 1079
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1079
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1082
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1083
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1084
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1085
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1085
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1086
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1087
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1087
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1087
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1087
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1098
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1098

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1098
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1098
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1098
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1107
4.8 ACTAS 1107
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO ROVIRA 4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA(39) 1108
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1108
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1110
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1111
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1112
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO SALDAÑA 2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO (40) 1113
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1113
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1114
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1114
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1115
4.0 REPORTES EJECUIÓN MENSUAL SALDAÑA 2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO 1115
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1115
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1121
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1121
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1121
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1121
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1121
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1130
4.8 ACTAS 1130
5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO SALDAÑA 2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO 1130
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1130

5.2 AUXILIAR DETALLADO 1131
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1132
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1133
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1134
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1135
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1135
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1136
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL SAN LUIS 3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI 1136
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1136
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1147
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1147
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1147
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1147
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1147
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1156
4.8 ACTAS 1156
5.0 COMPONENTE FINANCIERO SAN LUIS 3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI 1156
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1156
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1157
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1158
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1159
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO SUAREZ 2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA (42) 1160
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1160
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1161
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1161
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1161

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL SUAREZ 2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA 1162
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1162
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1168
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1168
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1168
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1168
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1168
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1177
4.8 ACTAS 1177
5.0 COMPONENTE FINANCIERO SUAREZ 2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA 1177
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1177
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1177
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1179
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1181
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1181
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1182
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1183
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1183
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSAL VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1183
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1183
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1191
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1192
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1193
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1194
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1195

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1203
4.8 ACTAS 1209
5.0 COMPONENTE FINANCIERO VENADILLO2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA 1209
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1209
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1210
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1211
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1212
3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL 1213
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1213
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1214
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1214
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1215
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL 1215
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1215
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1221
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1221
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1221
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1221
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1221
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1230
4.8 ACTAS 1230
5.0 COMPONENTE FINANCIERO VILLARICA 2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL 1230
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1230
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1230
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1232

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1234
3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS 1234
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 1235
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 1236
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 1236
4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1236
4.1INFORME MENSUAL SEMANAL 1236
4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 1247
4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA 1247
4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1247
4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 1247
4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO 1247
4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 1255
5.0 COMPONENTE FINANCIERO VILLARICA2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO 1256
5.1 ACTAS DE COMITÉ 1256
5.2 AUXILIAR DETALLADO 1257
5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO 1258
5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO 1259
6.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1260
6.1 INFORMACION GENERAL DE CONTRATO 1260
6.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTEVENTORIA .. 1261
6.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 1268
6.4 INFORME ANUAL DE LA CAJA 1268
7.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 1268
7.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 1268
7.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1270

7.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1273

7.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 1275

7.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.. 1281

7.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 1284

8.0 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES..... 1286

9.0 ANEXOS..... 1286

9.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, FECHA DE RECIBO..... 1286

9.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 1288

INFORME MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS

ALVARADO

4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4047-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO ALVARADO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.903.527,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 200.903.527,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	196
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.219.426,00	$ -	$ 151.219.426,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.583,00	$ -	$ 4.536.583,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.518,00	$ -	$ 44.147.518,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.903.527,00	$ -	$ 199.903.527,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Indicar la localización y actividad.

Foto 2



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma

Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4076-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO ALVARADO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.201.607,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.201.607,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	161
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contencio	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.540.587,00	$ -	$ 150.540.587,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNCACIONES	$ 4.516.218,00	$ -	$ 4.516.218,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.802,00	$ -	$ 44.144.802,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.201.607,00	$ -	$ 199.201.607,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Indicar la localización y actividad.

Foto 2



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envia correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envia acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el TOTARITO convenio 4076-2024.

Firma
Nombre Héctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANZOATEGUI

2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2271-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.514.428,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 200.514.428,00
DESEEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEEMBOLSO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	137
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.187.719,00	$ -	$ 151.187.719,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.535.632,00	$ -	$ 4.535.632,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.391,00	$ -	$ 44.147.391,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.870.742,00	$ -	$ 199.870.742,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 151.187.719,00		$ 84.816.024,61	$ 84.816.024,61
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.535.632,00		$ 2.544.480,98	$ 2.544.480,98
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.391,00		$ 24.766.602,91	$ 24.766.602,91
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.870.742,00		$ 112.127.108,51	$ 112.127.108,51

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 114.929.310,53
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112.127.108,54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,56%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA SANTA BARBARA

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA SANTA BARBARA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de abar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, cunas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se realiza toma densidades a la sub base installada.
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huella.

Firma
Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2306-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOATEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.589.383,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.589.383,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	139
	Alcantarillas	UND	2
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.915.613,00	$ -	$ 150.915.613,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.527.468,00	$ -	$ 4.527.468,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.302,00	$ -	$ 44.146.302,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.589.383,00	$ -	$ 199.589.383,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2366-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.716.333,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.716.333,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.038.387,00	$ -	$ 151.038.387,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.152,00	$ -	$ 4.531.152,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.794,00	$ -	$ 44.146.794,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.716.333,00	$ -	$ 199.716.333,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 151.038.387,00		$ -	$ 86.910.159,45
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.152,00		$ -	$ 2.607.305,01
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.794,00		$ -	$ 25.402.846,14
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.716.333,00		$ -	$ 114.920.310,59

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 114.920.310,53
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114.920.310,53
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

Foto 2



SOCILAIZACION VEREDA SANTA HELENA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
** Comenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantias hasta 30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta fisica a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 118 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la residencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topografica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huella.
*Fundida en concreto para placa huella y cuneta

Firma
Nombre Viatic Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ARMERO

3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3372-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.563.028,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.563.028,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	172
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.857.242,00	$ -	$ 151.857.242,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.555.717,00	$ -	$ 4.555.717,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.069,00	$ -	$ 44.150.069,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.563.028,00	$ -	$ 200.563.028,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS, Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores.
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CAJAMARCA

3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3359-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO CAJAMARCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.126.666,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.126.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	144
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.435.228,00	$ -	$ 151.435.228,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.057,00	$ -	$ 4.543.057,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.381,00	$ -	$ 44.148.381,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.126.666,00	$ -	$ 200.126.666,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Indicar la localización y actividad.

Foto 2



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*Reunión componente social junto a la territorial de INVIAS. Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, Junto al requerimiento de hojas de vidas del convenio.
*El día 04 de julio de 2025 revisión de documentos para pago de proveedores
*El día 04 de julio de 2025 Se solicita a las organizaciones comunales de la entrega de las hojas de vida del personal propuesto, Ingeniero residente, contador, maestro obra.
*El día 17 de julio de 2025 Se envía solicitud verificación y posible aprobación de la programación

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3355-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO CAJAMARCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 201.139.384,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 201.139.384,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	165
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.447.528,00	$ -	$ 151.447.528,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.426,00	$ -	$ 4.543.426,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.430,00	$ -	$ 44.148.430,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.139.384,00	$ -	$ 200.139.384,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socializacion de inicio de Obra.

Firma
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CASABIANCA

2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2121-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO CASABIANCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.513.076,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.513.076,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	110
Estructuras	Alcantarillas	UND	2
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.841.815,00	$ -	$ 150.841.815,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.525.254,00	$ -	$ 4.525.254,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.491.776,20	$ -	$ 42.491.776,20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.858.845,20	$ -	$ 197.858.845,20

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 150.841.815,00		$ 23.728.060,57	$ 23.728.060,57
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.525.254,00		$ 711.841,75	$ 711.841,75
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.491.776,20		$ 6.684.137,55	$ 6.684.137,55
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.858.845,20		$ 31.124.039,86	$ 31.124.039,86

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 73.021.785,82
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 31.124.039,86
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 42,62%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se presenta un porcentaje de retraso en la ejecucion de la obra por el motivo de que la maquinaria y equipo en este caso, la mezcladora se encuentra en mal estado. Por lo tanto se le hace el requerimiento a la JAC para dar solucion lo mas pronto posible, ya que se ve afectada la ejecucion de la obra en su programacion , por ende no cumplirian los tiempos estipulados del convenio pertenente.

Firma
Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2206-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO CASABIANCA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.951.148,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.951.148,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	114
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.265.482,00	$ -	$ 151.265.482,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.537.964,00	$ -	$ 4.537.964,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.534.220,70	$ -	$ 42.534.220,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.337.666,70	$ -	$ 198.337.666,70

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 151.265.482,00		$ 151.265.482,00	$ 22.672.124,24
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.537.964,00		$ -	$ 680.163,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.534.220,70		$ -	$ 6.375.156,60
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.337.666,70		$ -	$ 29.727.444,50

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 31.124.039,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 29.727.448,32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,51%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



FERIA DE SERVICIOS- COMFATOLIMA

Foto 2



FERIA DE SERVICIOS- COMFATOLIMA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 114 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al Ing. residente de la OAC, para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del representate legal de la OAC, representante legal de vecduria, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topografica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Nivelación de la subrasante.

Firma
Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COELLO

2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2122-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO COELLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (Incluido IVA) :	$ 200.274.651,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA):	$ 200.274.651,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	171
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.611.229,00	$ -	$ 150.611.229,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.518.337,00	$ -	$ 4.518.337,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.085,00	$ -	$ 44.145.085,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.274.651,00	$ -	$ 199.274.651,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

Foto 2



TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 01 agosto de 2025 se envía solicitud de visita especialista hidráulica y/o hidrología para martes 05 de agosto a las Veredas Llano de la Virgen Coello Tolima, Chipalo Piedras Tolima. Y para el 06 de agosto Vereda la Aurora del Municipio de Rioblanco.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 13 de agosto de 2025 revisión y aprobación de firma para desembolso Llano de la Virgen en el Municipio de Coello Tolima.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envían soportes para respectivo desembolso de la vereda Llano de la Virgen Municipio de Coello Tolima.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 20 de agosto de 2025 la JAC Llano de la virgen del Municipio de Coello envía solicitud de inicio físico de obra y otros.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 25 de agosto de 2025 se envía autorización de firmas para aprobación de desembolsos a las Veredas, Hoyo caliente, Llano de la Virgen y Cuatromil.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*Se realiza socializacion de metodologia.
* se realiza topografia del terreno (nivelacion).
*Se realiza descapote.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COYAIMA

3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3515-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 11/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 201.550.463,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 201.550.463,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.845.090,00	$ -	$ 151.845.090,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.555.353,00	$ -	$ 4.555.353,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.020,00	$ -	$ 44.150.020,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.550.463,00	$ -	$ 200.550.463,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socializacion metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3421-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.248.396,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.248.396,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.585.838,00	$ -	$ 150.585.838,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.517.575,00	$ -	$ 4.517.575,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.983,00	$ -	$ 44.144.983,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.248.396,00	$ -	$ 199.248.396,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social.



Socializacion metodologia social.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3340-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO COYAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.493.740,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 200.493.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	156
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.823.115,00	$ -	$ 150.823.115,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.524.693,00	$ -	$ 4.524.693,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.932,00	$ -	$ 44.145.932,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.493.740,00	$ -	$ 199.493.740,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

ICONONZO

2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	1
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2106-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA DEL MUNICIPIO ICONONZO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.287.848,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.287.848,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	160
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.591.111,00	$ -	$ 151.591.111,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.547.733,00	$ -	$ 4.547.733,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.004,00	$ -	$ 44.149.004,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.287.848,00	$ -	$ 200.287.848,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO	TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*Socializacion comité operativo
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MURILLO

2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO | VERSION | PÁGINA | FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2641-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI DEL MUNICIPIO MURILLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.784.352,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.784.352,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	133
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.071.288,00	$ -	$ 152.071.288,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.562.139,00	$ -	$ 4.562.139,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.925,00	$ -	$ 44.150.925,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.784.352,00	$ -	$ 200.784.352,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

VISITA SECTOR PLACA HUELLA VEREDA PAJONALES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*"El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

NATAGAIMA

2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2660-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POCHARCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POCHARCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.053.438,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.053.438,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	140
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.364.408,00	$ -	$ 151.364.408,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.540.932,00	$ -	$ 4.540.932,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.098,00	$ -	$ 44.148.098,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.053.438,00	$ -	$ 200.053.438,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA POCHARCO

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA POCHARCO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 agosto de 2025 desembolso del banco AVVILLAS para la Vereda Pocharco del Municipio de Natagaima Tolima
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado..
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 21 de agosto de 2025 se envía documentación para desembolso Vereda Santa Helena, Pocharco, La Planada, Santa Barbara del Departamento del Tolima.
*El día 23 de agosto de 2025 solicitud comité operativo, inicio de obra para el 26 de agosto a la JAC Pocharco Natagaima Tolima.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 27 de agosto de 2025 radicación solicitud no objeción etapa inicio de CTO 3355-2024 de los convenios 2660-2024, 2030-2024, 2052-2024, 2061-2024, 2123-2024, odograma Caminos Comunitarios de la Paz total- DPTO del Tolima.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3016-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TAMIRCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TAMIRCO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.875.939,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.875.939,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	148
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.159.529,00	$ -	$ 152.159.529,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.564.786,00	$ -	$ 4.564.786,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.624,00	$ -	$ 44.151.624,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.875.939,00	$ -	$ 200.875.939,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social



Socializacion metodologia social

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC Tamirco 3016-2024
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3247 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 198.703.080,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 198.703.080,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	151
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.091.335,00	$ -	$ 151.038.387,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.472.740,00	$ -	$ 4.531.152,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.139.005,00	$ -	$ 44.146.794,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.703.080,00	$ -	$ 199.716.333,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodolofia social.



Socializacion metodolofia social.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Camino Real convenio 3247-2024.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social: para inicio de obra.

Firma
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3247-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ANACARCO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 200.286.097,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 200.286.097,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	143
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.622.299,00	$ -	$ 150.622.299,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.518.669,00	$ -	$ 4.518.669,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.129,00	$ -	$ 44.145.129,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.286.097,00	$ -	$ 199.286.097,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodología social.



Socializacion metodología social.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC Anacarco convenio 3148-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre:Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3167-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.231.908,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.231.908,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	153
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.569.891,00	$ -	$ 150.569.891,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.517.097,00	$ -	$ 4.517.097,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.920,00	$ -	$ 44.144.920,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.231.908,00	$ -	$ 199.231.908,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social.



Socializacion metodologia social.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envia correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían polizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
* El dia 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Rincón Anchique convenio 3167-2024,
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las polizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3194-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO DEL MUNICIPIO NATAGAIMA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.128.206,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.128.206,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	117
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.469.600,00	$ -	$ 150.469.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.514.088,00	$ -	$ 4.514.088,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.518,00	$ -	$ 44.144.518,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.128.206,00	$ -	$ 199.128.206,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían polizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, El Tambo convenio 3194-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las polizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social para inicio de obra.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ORTEGA

2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2437-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUINEAL HORIZONTE DEL MUNICIPIO ORTEGA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUINEAL HORIZONTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.872.650,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.872.650,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	95
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.156.683,00	$ -	$ 152.156.683,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.564.700,00	$ -	$ 4.564.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.267,00	$ -	$ 44.151.267,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.872.650,00	$ -	$ 200.872.650,00

Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA GUINEAL HORIZONTE

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA GUINEAL HORIZONTE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfia Linda del Municipio de Casabianca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima..
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía requerimiento para acopio de material en obra para la Vereda Guineal Horizonte del Municipio de Ortega Tolima
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud de prorroga por parte de la JAC Guineal Horizonte a CONSORCIO VIAL JJ.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 29 de agosto de 2025 el profesional financiero Henry Vanegas envía desembolso para nómina de las Veredas Santa Helena, Santa Barbara y Guineal Horizonte.

Firma
Nombre Victor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2205-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA DEL MUNICIPIO ORTEGA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.962.149,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.962.149,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	136
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones		0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.243.239,00	$ -	$ 152.243.239,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.567.297,00	$ -	$ 4.567.297,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.613,00	$ -	$ 44.151.613,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.962.149,00	$ -	$ 200.962.149,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION DEL TERRENO

Foto 2

TOMA DE. MUESTRAS - CARACTERIZACION DE L TERRENO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria. *El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

PALOCABILDO

3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3422-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL GUALI DEL MUNICIPIO PALOCABILDO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL GUALI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 201.956.308,00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 201.956.308,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	168
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.237.590,00	$ -	$ 152.237.590,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.567.128,00	$ -	$ 4.567.128,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.151.590,00	$ -	$ 44.151.590,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.956.308,00	$ -	$ 200.956.308,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
* El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Guali convenio 3422-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PIEDRAS

2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2693-2024
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.125.042,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.125.042,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	162
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.433.657,00	$ -	$ 151.433.657,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.543.010,00	$ -	$ 4.543.010,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.148.375,00	$ -	$ 44.148.375,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.125.042,00	$ -	$ 200.125.042,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

TOMA DE MUESTRAS- CARACTERIZACION SUELO

Foto 2

TOMA DE MUESTRAS- CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*"El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 01 agosto de 2025 se envía solicitud de visita especialista hidráulica y/o hidrología para martes 05 de agosto a las Veredas Llano de la Virgen Coello Tolima, Chipalo Piedras Tolima. Y para el 06 de agosto Vereda la Aurora del Municipio de Roblanco.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades. *El día 08 de agosto de 2025 Banco AVVILLAS envía formatos de desembolsos para las Veredas Porfia Linda en el Municipio de Casabianca, Cuatro mil en el Municipio de Villarica, Chipalo Municipio de Piedras en el Departamento Tolima
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANADAS

2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2123-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.004.115,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	83
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.316.707,00	$ -	$ 151.316.707,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.539.501,00	$ -	$ 4.539.501,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.907,00	$ -	$ 44.147.907,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.004.115,00	$ -	$ 200.004.115,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA EL OSO

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA EL OSO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.AS.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 27 de agosto de 2025 radicación solicitud no objeción etapa inicio de CTO 3355-2024 de los convenios 2660-2024, 2030-2024, 2052-2024, 2061-2024, 2123-2024, odograma Caminos Comunitarios de la Paz total- DPTO del Tolima.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2052-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RECREO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 198.985.230,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	115
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.364.207,00	$ -	$ 149.364.207,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.480.926,00	$ -	$ 4.480.926,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.140.097,00	$ -	$ 44.140.097,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 197.985.230,00	$ -	$ 197.985.230,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

SOCIALIZACION VEREDA RECREO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envia correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 radicación solicitud no objeción etapa inicio de CTO 3355-2024 de los convenios 2660-2024, 2030-2024, 2052-2024, 2061-2024, 2123-2024, odograma Caminos Comunitarios de la Paz total- DPTO del Tolima.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO SOLIDARIO
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: jul-25

CONTRATO DE CONVENIO No.: 2030-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.711.608,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.711.608,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.033.818,00	$ -	$ 151.033.818,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.531.015,00	$ -	$ 4.531.015,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.775,00	$ -	$ 44.146.775,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.711.608,00	$ -	$ 199.711.608,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA EL JORDAN

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA EL JORDAN

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
* socialización metodologia social comunitaria, junto a selección de proveedores de la vereda el jordán del municipio de planadas, reunion componente social junto a la territoral invias,Reunión de seguimiento a CTO 3555-2024 por parte de INVIAS, toma de coordenadas en el sector de la placa huella
*Solicitud verificación y posible aprobación de la programación plan de cargas CTO 3555-2024 *

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PAGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2278-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:	

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.212.157,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.212.157,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	116
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.550.790,00	$ -	$ 150.550.790,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.516.524,00	$ -	$ 4.516.524,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.843,00	$ -	$ 44.144.843,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.212.157,00	$ -	$ 199.212.157,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
INSPECCION PLACA HUELLA VEREDA LA AURORA	INSPECCION PLACA HUELLA VEREDA LA AURORA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 01 agosto de 2025 se envía solicitud de visita especialista hidráulica y/o hidrología para martes 05 de agosto a las Veredas Llano de la Virgen Coello Tolima, Chipalo Piedras Tolima. Y para el 06 de agosto Vereda la Aurora del Municipio de Rioblanco.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024, Mesas de Inca convenio 3421-2024, El Rosario convenio 3340-2024, Tamirco 3016-2024, Camino Real convenio 3247-2024, Anacarco convenio 3148-2024, El Tambo convenio 3194-2024, Rincón Anchique convenio 3167-2024, Alto del Guali convenio 3422-2024, Alfonso Carillo convenio 2716-2024, El Diamante convenio 2854-2024, La Aurora convenio 2676-2024, San Francisco convenio 2663-2024, Los Lirios convenio 2833-2024,El Calabozo convenio 4093-2024, Hato Viejo convenio 4031-2024, La Reforma convenio 4787-2024, Caracolí convenio 3399-2024, Río Lindo convenio 2452-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2278-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO PLANADAS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 02/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.820.453,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.820.453,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	153
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.139.084,00	$ -	$ 151.139.084,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.534.173,00	$ -	$ 4.534.173,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.196,00	$ -	$ 44.147.196,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.820.453,00	$ -	$ 199.820.453,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

SOCIALIZACION VEREDA SAN ISIDRO

Foto 2

TOMA DE MUESTRA - CARACTERIZACON SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RIOBLANCO

2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PAGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2716-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ALFONSO CARRILLO DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALFONSO CARRILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.354.094,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.354.094,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	119
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.688.060,00	$ -	$ 150.688.060,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.520.642,00	$ -	$ 4.520.642,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.392,00	$ -	$ 44.145.392,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.354.094,00	$ -	$ 199.354.094,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este período se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC Vereda Alfonso Carilo convenio 2716-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2854-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 11/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.295.900,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.295.900,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	117
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.598.897,00	$ -	$ 151.598.897,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.547.967,00	$ -	$ 4.547.967,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.036,00	$ -	$ 44.149.036,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.295.900,00	$ -	$ 200.295.900,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este período se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, El Diamante convenio 2854-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma:
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2676-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO ROBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 12/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 193.060.349,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 193.060.349,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0
	Alcantarillas	UND	6
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 143.634.148,00	$ -	$ 143.634.148,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.309.024,00	$ -	$ 4.309.024,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.117.177,00	$ -	$ 44.117.177,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 192.060.349,00	$ -	$ 192.060.349,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este período se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, La Aurora convenio 2676-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma:
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2663-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO RIOBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.691.981,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.691.981,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	107
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.014.837,00	$ -	$ 151.014.837,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.530.445,00	$ -	$ 4.530.445,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.146.699,00	$ -	$ 44.146.699,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.691.981,00	$ -	$ 199.691.981,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envia correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC. San Francisco convenio 2663-2024.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2833-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIROS DEL MUNICIPIO ROBLANCO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 04/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.618.622,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.618.622,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	107
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.976.772,00	$ -	$ 149.976.772,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.499.303,00	$ -	$ 4.499.303,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.142.547,00	$ -	$ 44.142.547,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.618.622,00	$ -	$ 198.618.622,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este período se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Los Lirios convenio 2833-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ROVIRA

4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4093-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO DEL MUNICIPIO ROVIRA – TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.452.139,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.452.139,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	192
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.749.999,00	$ -	$ 151.749.999,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.552.500,00	$ -	$ 4.552.500,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.149.640,00	$ -	$ 44.149.640,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.452.139,00	$ -	$ 200.452.139,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social.



Socializacion metodologia social.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El dia 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Calabozo convenio 4093-2024.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El dia 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4031-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO DEL MUNICIPIO ROVIRA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.758.515,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.758.515,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	181
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152.046.301,00	$ -	$ 152.046.301,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.561.389,00	$ -	$ 4.561.389,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.150.825,00	$ -	$ 44.150.825,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.758.515,00	$ -	$ 200.758.515,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metodologia social.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de trastado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
* El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Hato Viejo convenio 4031-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4087-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO ROVIRA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.905.476,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.905.476,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	186
	Alcantarillas	UND	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.221.312,00	$ -	$ 151.221.312,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.639,00	$ -	$ 4.536.639,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.525,00	$ -	$ 44.147.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.905.476,00	$ -	$ 199.905.476,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Indicar la localización y actividad.

Foto 2



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, La Reforma convenio 4787-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socialización metodología social. para inicio de obra.

Firma
Nombre Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

SALDAÑA

2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2131-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO SALDAÑA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.022.497,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.022.497,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	155
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contencio	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.367.367,00	$ -	$ 150.367.367,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.511.021,00	$ -	$ 4.511.021,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.144.109,00	$ -	$ 44.144.109,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.022.497,00	$ -	$ 199.022.497,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

Foto 2

TOMA DE MUESTRAS - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SAN LUIS

3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3399-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO SAN LUIS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.895.992,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.895.992,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	162
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contencio	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.212.139,00	$ -	$ 151.212.139,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.364,00	$ -	$ 4.536.364,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.489,00	$ -	$ 44.147.489,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.895.992,00	$ -	$ 199.895.992,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Caracoli convenio 3399-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

SUAREZ

2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3399-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO SAN LUIS - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 19/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.895.992,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.895.992,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	162
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.212.139,00	$ -	$ 151.212.139,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.536.364,00	$ -	$ 4.536.364,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.489,00	$ -	$ 44.147.489,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.895.992,00	$ -	$ 199.895.992,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Caracolí convenio 3399-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma

Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

VENADILLO

2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2156-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA DEL MUNICIPIO VENADILLO - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 03/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.991.913,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.991.913,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	118
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.304.906,00	$ -	$ 151.304.906,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.539.147,00	$ -	$ 4.539.147,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.860,00	$ -	$ 44.147.860,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.991.913,00	$ -	$ 199.991.913,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 151.304.906,00		$ 85.033.357,17	$ 85.033.357,17
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.539.147,00		$ 2.551.000,61	$ 2.551.000,61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.860,00		$ 24.811.097,32	$ 24.811.097,32
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.991.913,00		$ 112.395.455,11	$ 112.395.455,11

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): ##########
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): ##########
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,57%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 11
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION VEREDA LA PLANADA

Foto 2



SOCIALIZACION VEREDA LA PLANADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
** El dia 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envia correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El dia 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El dia 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El dia 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
* El dia 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfía Linda del Municipio de Casablanca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima.
*El dia 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El dia 12 de agosto de 2025 solicitud autorización y firma para pagos de retención en la fuente, para las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui, La Planada Municipio de Venadillo junto a otros gastos como transporte, en cuanto a la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Casabianca se envían dos pagos que fueron rechazados por el Banco AVVILLAS.
*El dia 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El dia 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El dia 14 de agosto de 2025 se anexa informe semana 1 de la Vereda La Planada en el Municipio de Venadillo Tolima.
*Toma de muestras de concreto.
*Amarre de acero en placa huella
*Toma de muestras de concreto.
*Amarre de acero en placa huella
*Inicio de fundida en concreto placa huella
* El dia 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El dia 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El dia 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*Amarre de acero de placa huella
*Fundida en concreto de placa huella

Firma:
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

VILLARICA

2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **PERIODO MES:** ago-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2465-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL DEL MUNICIPIO VILLARICA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.120.337,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.120.337,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	135
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de contenció	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.494.872,00	$ -	$ 149.494.872,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.484.846,00	$ -	$ 4.484.846,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.140.619,00	$ -	$ 44.140.619,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.120.337,00	$ -	$ 198.120.337,00

Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



TOMA DE MUESTRAS. - CARACTERIZACION SUELO

Foto 2



TOMA DE MUESTRAS. - CARACTERIZACION SUELO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 03 de agosto de 2025 la Junta de la Vereda Cuatromil en el Municipio de Villarrica Tolima, envía hoja de vida del maestro.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 04 de agosto de 2025 la Junta comunal de la Vereda Cuatromil del Municipio de Villarrica Tolima envía Hoja de vida del ingeniero residente.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 08 de agosto de 2025 Banco AVVILLAS envía formatos de desembolsos para las Veredas Porfía Linda en el Municipio de Casabianca, Cuatro mil en el Municipio de Villarica, Chipalo Municipio de Piedras en el Departamento Tolima.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 21 de agosto de 2025 comité operativo, inicio de obra viernes 22 de agosto en la vereda Cuatromil del Municipio de Villarica Tolima.

Firma
Nombre Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
PERIODO MES: ago-31

CONVENIO SOLIDARIO No.: 2452-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIOLINDO DEL MUNICIPIO VILLARICA - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIOLINDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3555-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 06/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.427.032,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.427.032,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	135
	Alcantarillas	UND	1
Estructuras	Muro de contención	UND	0
	Pontones	UND	0
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	M	0	0
	Alcantarillas	UND	0	0
Estructuras	Muro de contención	UND	0	0
	Pontones	UND	0	0
Mantenimiento			0	0
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.758.600,00	$ -	$ 150.758.600,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 4.522.758,00	$ -	$ 4.522.758,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.145.674,00	$ -	$ 44.145.674,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.427.032,00	$ -	$ 199.427.032,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ -		$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -		$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



SOCIALIZACION

Foto 2



SOCIALIZACION

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:
*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.
*El día 11 de agosto de 2025 se envían polizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC, Rio Lindo comenio 2452-2024.
*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las polizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

Firma
Nombre: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1.INTRODUCCION

El Consorcio Vial JJ, postula sus experiencia en ejecución, estructuración, seguimiento y control de proyectos, participando en el proceso licitatorio con Objeto contractual de interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para los convenios o contratos suscritos entre el INVIAS con organismos de acción comunal o comunidades étnicas para el mejoramiento y/o mantenimiento de vías regionales de la zona sur oriente en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" – lote 3.

Proceso derivado de la estrategia del Gobierno Nacional Caminos para la Paz Total, canalizado, estructurado y dirigido por el Instituto Nacional de vías INVIAS, el cual propone que las mismas comunidades identifiquen sus necesidades frente al mejoramiento de las vías terciarias de sus territorios, y sean los ejecutores de obras de infraestructura vial.


Por ende el Consorcio Vial JJ, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato 3555-2024, realiza seguimiento y control a cuarenta y cinco (45) convenios solidarios a desarrollarse en el Departamento del Tolima.

2.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.1 LOCALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se encuentra Ubicado en veintidós (21) municipios del departamento del Tolima; Alvarado, Anzoátegui, Armero Guayabal, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Icononzo, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Rio Blanco, Rovira, Saldaña, San Luis, Suarez, Venadillo, Villarrica, donde la construcción de mejoramiento vial se realizara en cuarenta y cinco (45) convenios solidarios pertenecientes al sector rural de los municipios relacionados

.

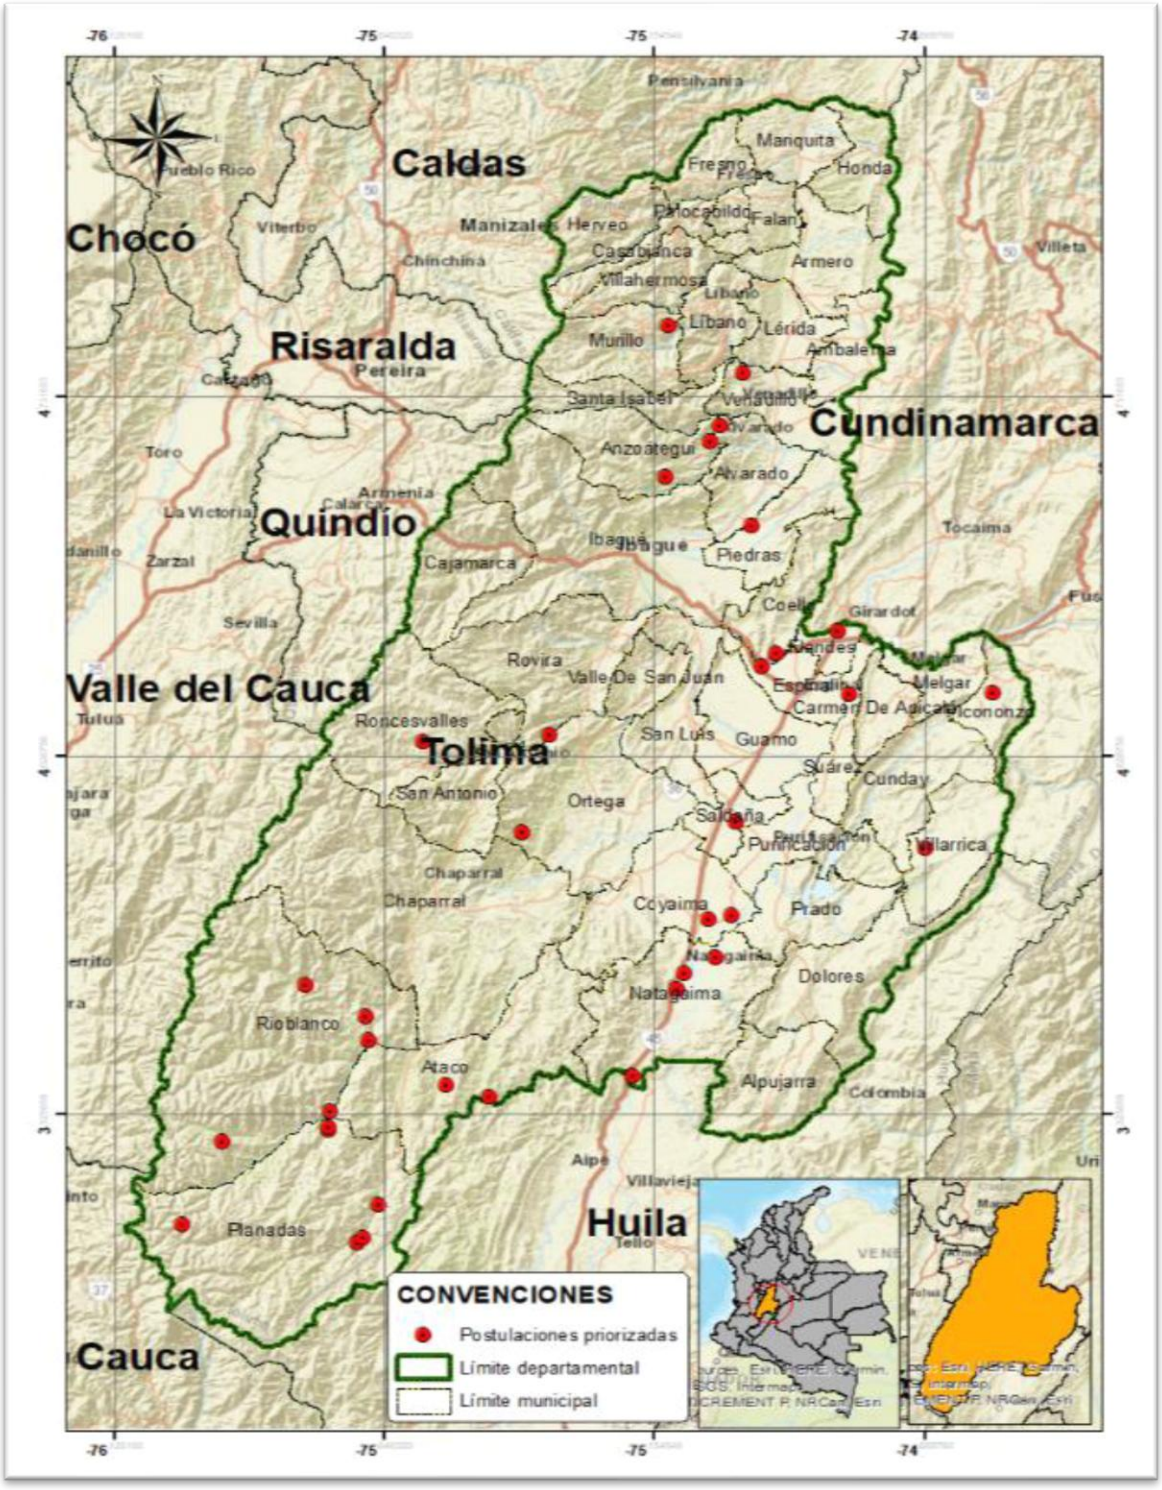
Caldas
Chocó
Risaralda
Cundinamarca
Quindío
Valle del Cauca
Tolima
Huila
Cauca
Pensilvania
Manizales
Pereira
Armenia
Ibagué
Neiva
Popayán
Cali
Manquita
Honda
Líbano
Lérida
Armero
Villeta
Girardot
Tocaima
Melgar
Fusagasugá
Anzoátegui
Piedras
Cajamarca
Roncesvalles
Rovira
Valle De San Juan
San Luis
Guamo
Suárez
Cunday
Ortega
San Antonio
Chaparral
Coyaima
Prado
Dolores
Natagaima
Rioblanco
Ataco
Planadas
Alpujarra
Colombia
CONVENCIONES
Postulaciones priorizadas
Límite departamental
Límite municipal


Para lo anterior el Instituto Nacional de vías INVIAS realizo entrega de soportes topográficos y estudio de suelos, puntualmente relacionada con la zona de intervención, siendo estos insumo de análisis de los especialistas en diseño, construcción de pavimento y diseño geométrico de vías adscritos al equipo profesional del Consorcio Vial JJ, quienes sustentaran técnicamente la obra de mejoramiento que se debe implementar en cada tramo identificado, procediendo a realizar un comité operativo donde se toman todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera, como también estando atentos a presentación de ajustes técnicos que se consideren necesarios para optimizar los recursos, en este punto será importante contar con las hojas de vida aprobadas del personal profesional que cumplirá la función directa de asesoría física y financiera dentro del Organismo de Acción Comunal y/o comunidad étnica, necesaria para el perfeccionamiento del convenio, que dará paso a la firma de acta de inicio de Obra.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto enmarcado en la estrategia del Gobierno Nacional caminos comunitarios para la Paz Total, tendrá convenios comunitarios suscritos con organismos de acción comunal o comunidades étnicas, ubicadas en veredas del municipio del Tolima , en beneficio de comunidades que no cuentan con una infraestructura vial optima, permitiendo mejorar sus condiciones de comunicación terrestre en los tramos determinados y distribuidos de la siguiente manera:


ALVARADO

4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

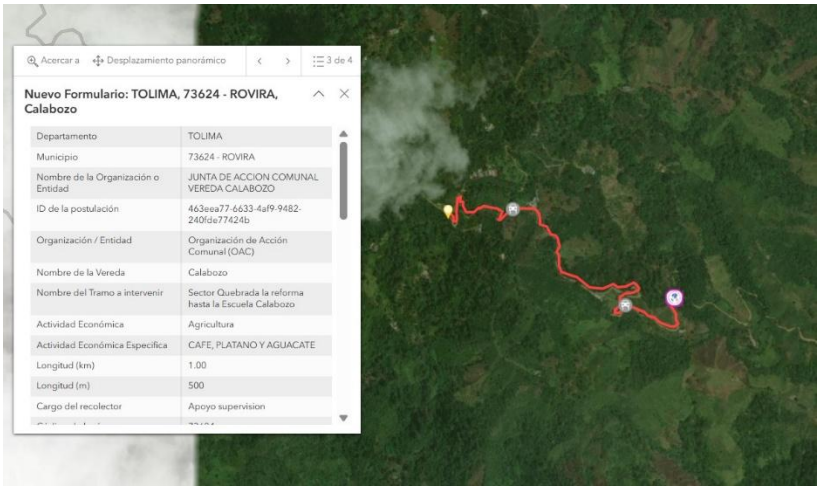

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui


4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

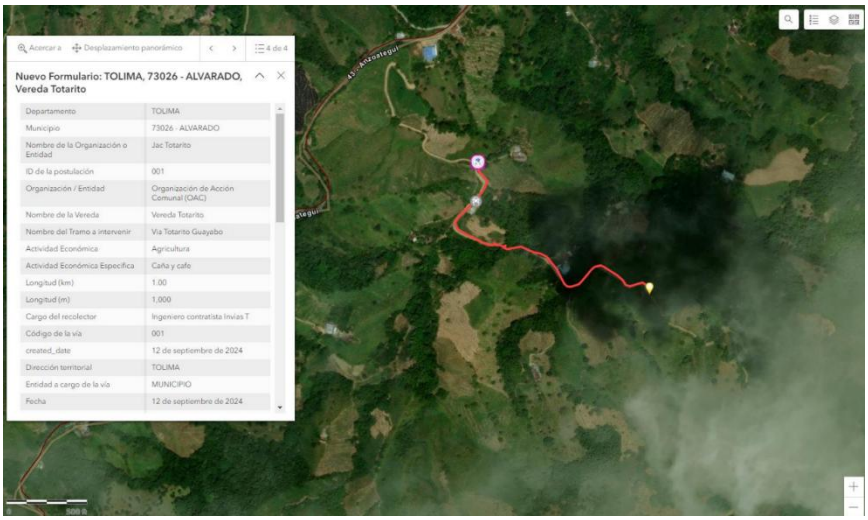

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles.


ANZOATEGUI

2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

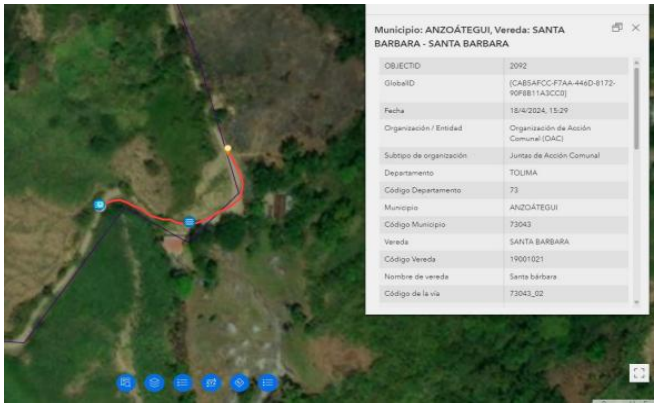


El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda Santa Barbara, en el corredor vial denominado vereda Santa Bárbara desde Finca San Jorge a casa El Milagro.

2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

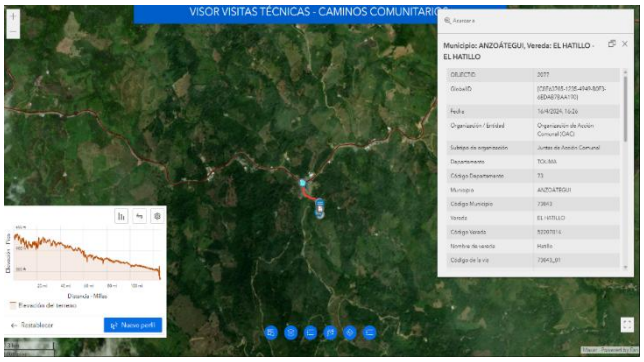

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión.

2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

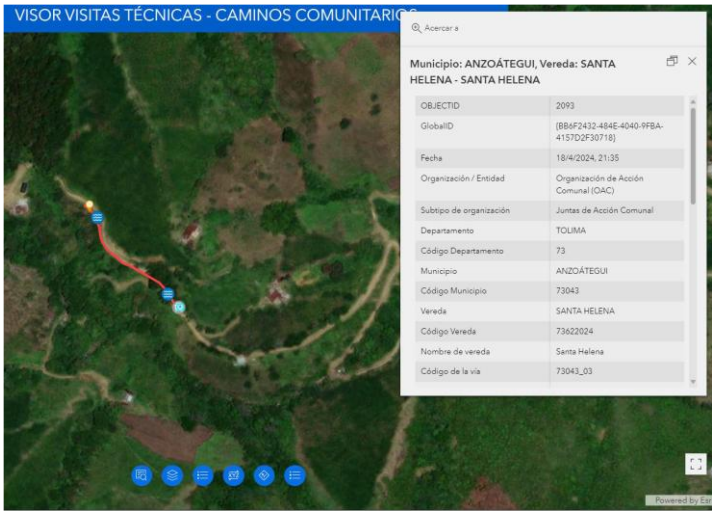


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda Santa Helena, del tramo comprendido en la vía que comunica la vereda Santa Helena con el municipio de Anzoátegui en el corredor vial denominado Vía Escuela - Vereda Santa Helena, tomando

como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la entrada de acceso a la finca Santa Helena y el punto final de referencia es PR00+140

ARMERO


3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

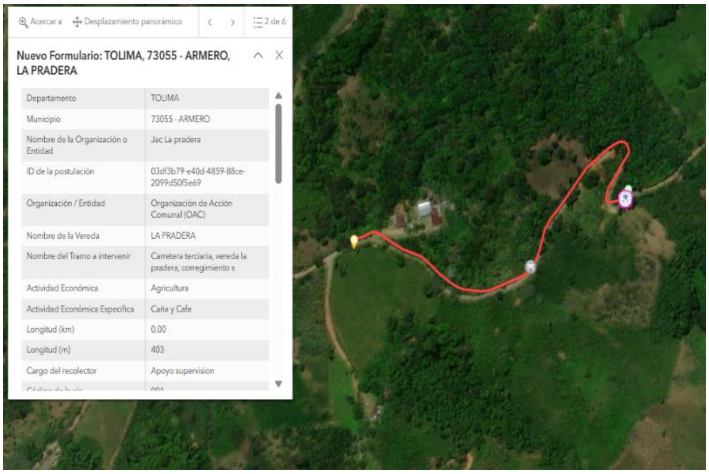

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de **0,403 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero


CAJAMARCA

3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

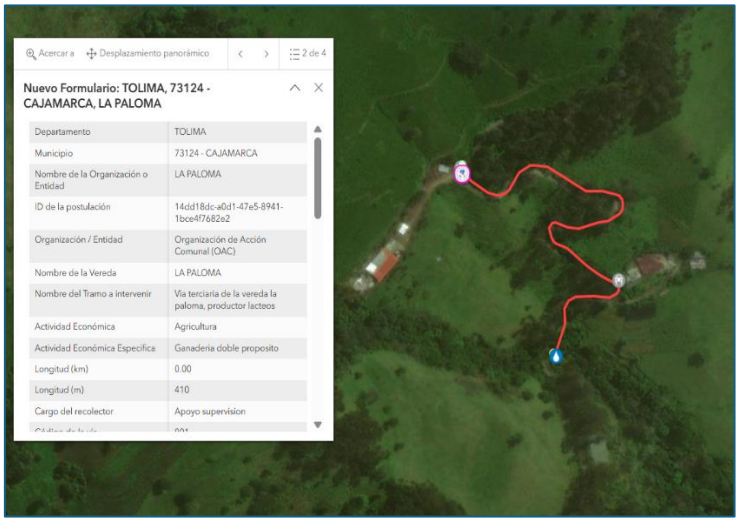

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la “Guala” – Diamante que tiene una longitud de atención de **0,41 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja


3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

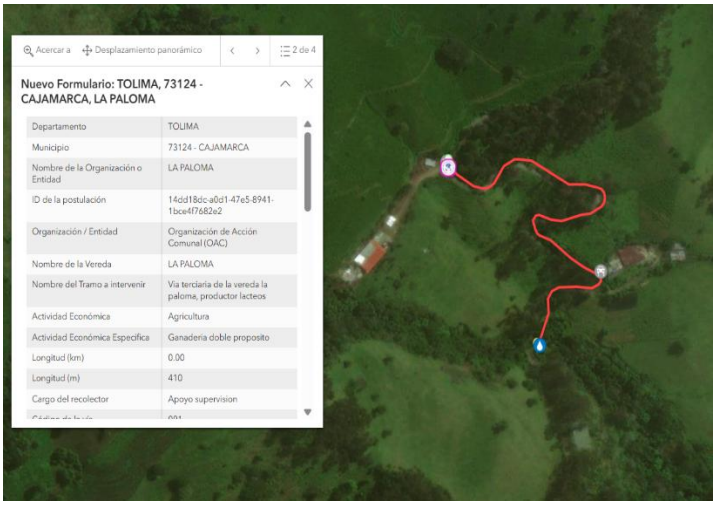

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta


CASABIANCA

2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

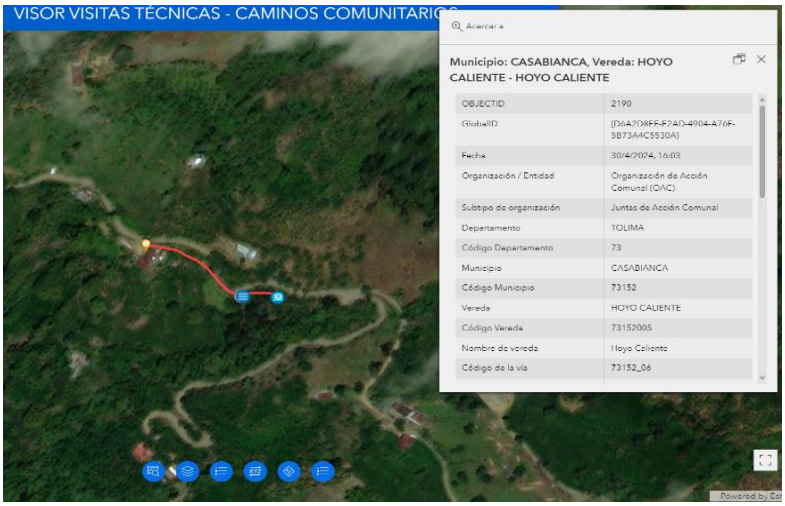

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Casabianca del departamento de Tolima en la vereda Hoyo Caliente, en la vía que comunica la vereda Hoyo Caliente con el casco urbano de Casabianca con una longitud de 0,139 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el cafetal de la señora Luz Garzón, y el punto final de referencia el PR00+139 al frente de la casa de Luz Garzón.


2206-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

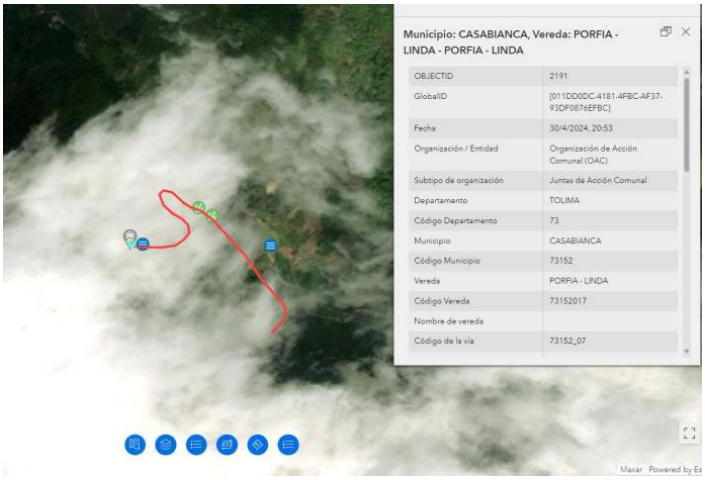

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Casabianca del departamento de Tolima en la vereda Porfia Linda, en la via que comunica la vereda Porfia Linda con el casco urbano de Casabianca en el corredor vial de la vereda Porfia Linda – Repecho con una longitud de atención de 0,570 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de Guillermo Valencia,

COELLO


2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

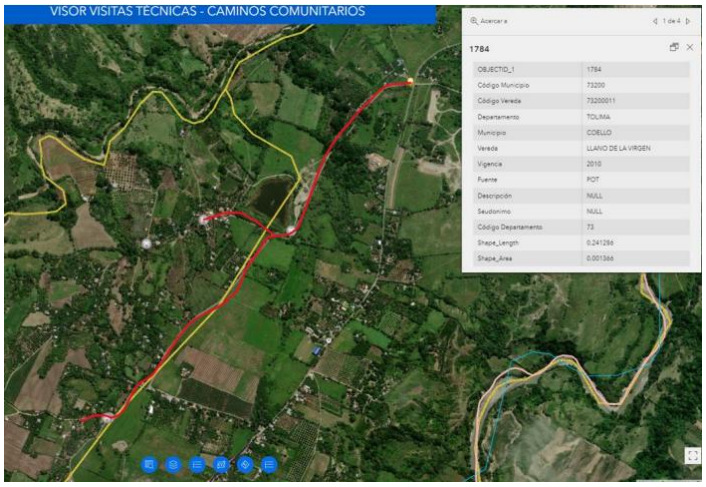

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de COELLO del departamento de Tolima en la vereda Llano de La Virgen, en el corredor vial denominado Coello Llano de la Virgen que tiene una longitud de 1,6 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 sobre baden existente que limita la vereda Llano de la Virgen con la Vereda la Arenosa y el punto final de referencia es el PR1 +565 en la intersección de la vía hacia Coello, portón Triturados del Tolima


COYAIMA

3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

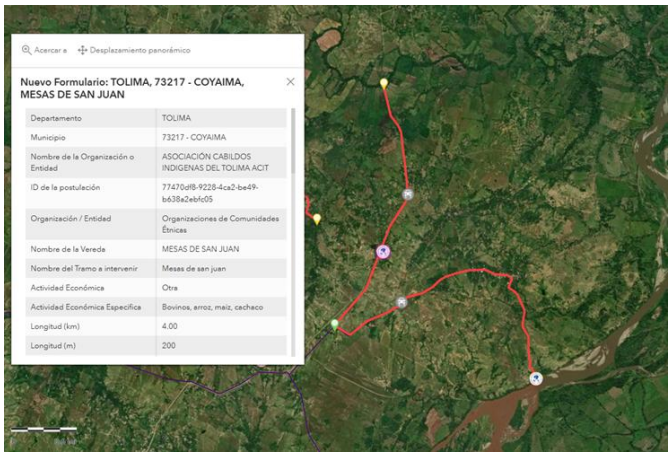


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en la asociación de cabildos indígenas del Tolima, en el corredor vial denominado mesas de san juan, con una longitud de 4,2 km, el punto de inicio de referencia es en el PR0+000 en la entrada a la vereda mesas de inca y el punto final de referencia es en el PR4+200 puente de la quebrada Larco

3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

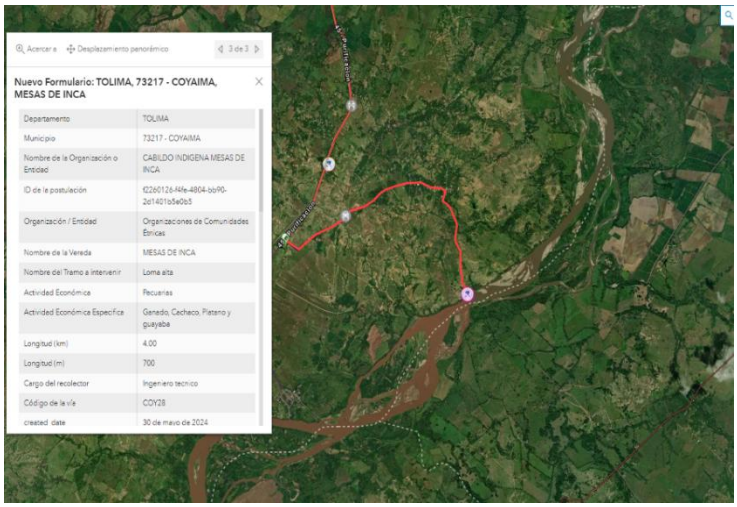

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.


3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

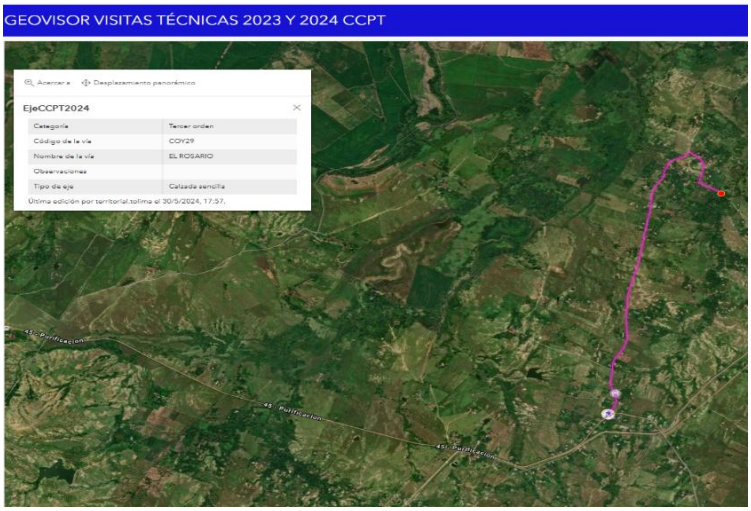

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la “Y” y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden

ICONONZO


2106 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA

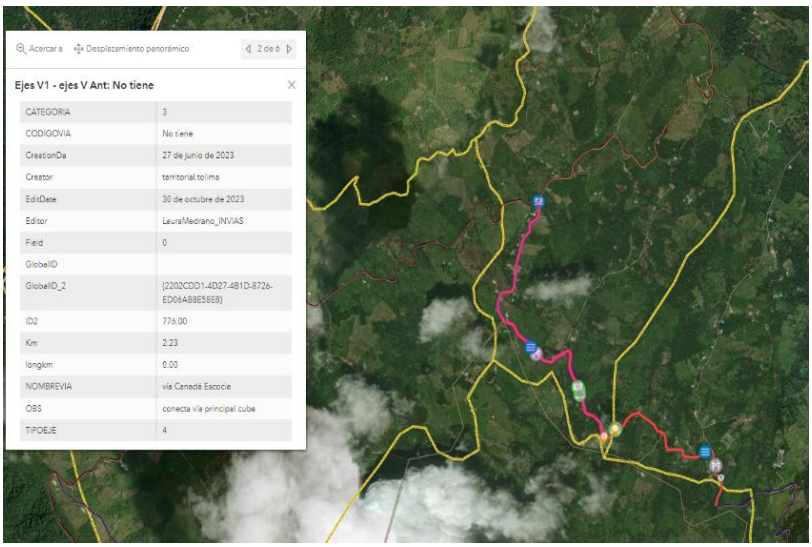

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Icononzo del departamento de Tolima en la vereda Canadá Escocia, en el corredor vial denominado Icononzo – vía Villarrica - Vereda Canadá Escocia finalizando con la intersección de los Cruces Guamitos y Cruce Dosquebradas, que tiene una longitud de 3,00 km, tomando como punto de inicio de referencia PR0+000 frente de la finca del señor Jairo García (subiendo a mano izquierda) y punto final de referencia PR03+000 donde finaliza la finca de don Jairo García

MURILLO


2641 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI

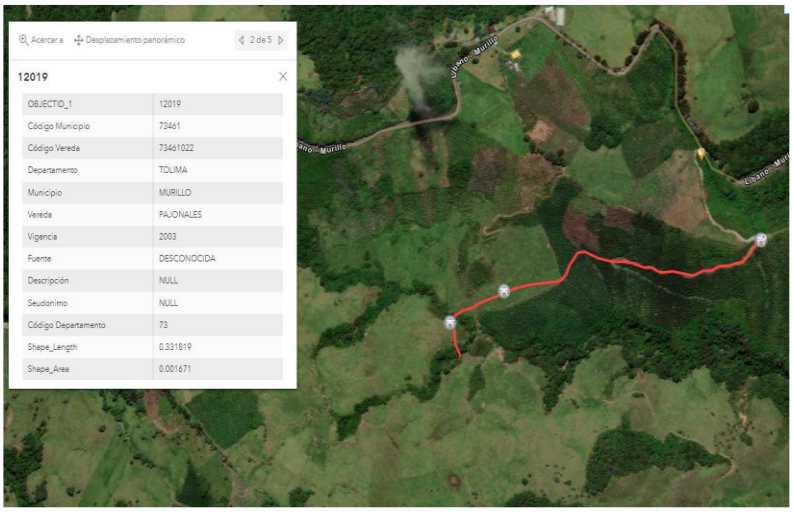

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MURILLO del departamento de Tolima, en la vereda Pajonales al norte del municipio de MURILLO a 13.4 Km del casco urbano y sobre la vía que conduce del Municipio de MURILLO al Municipio de Carmen de Apicalá. En el tramo comprendido desde la vereda Pajonales-vereda pradera alta-vereda cajones que tiene una longitud de atención de 0.72 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio de la placa huella por ejecutar, y punto final de referencia PR0+720.


NATAGAIMA

2660 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO

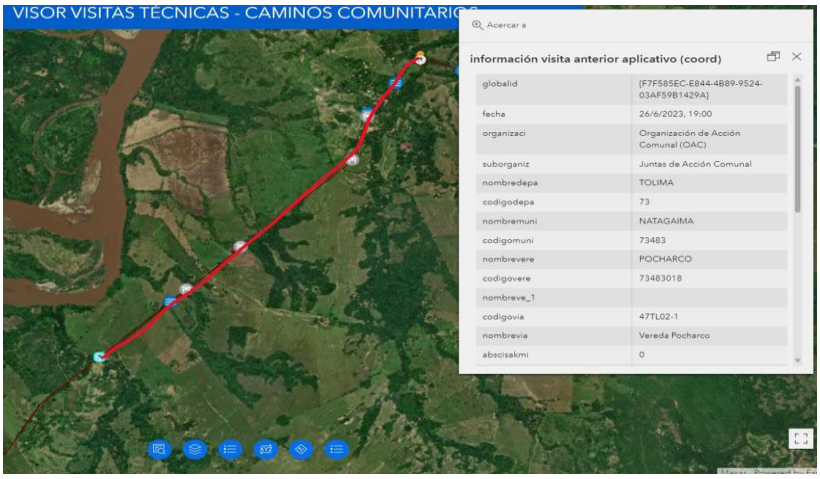


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la vereda Pocharco, en el corredor vial que conduce de la Cabecera municipal a la vereda Pocharco en el tramo de la quebrada Damas a la quebrada Jagual que tiene una longitud de atención de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 sobre quebrada Jagual y el punto final de referencia es el PR3+000 en la quebrada Pocharco.

3016 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO

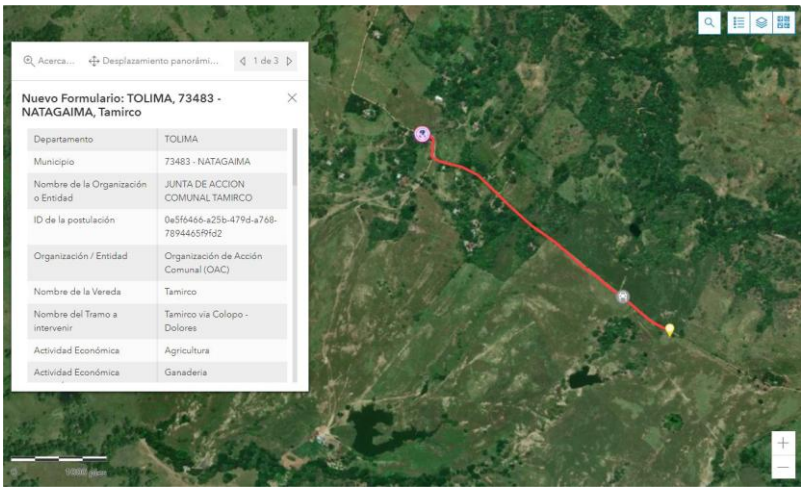


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en la vereda Tamirco, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la institución educativa Policarpa Salavarrieta con el sector Peñas Negras que tiene una longitud de atención de 1,1 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca Las Palmas y el punto final de referencia es el PR1+100 de la vivienda de Teófila

3247 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL

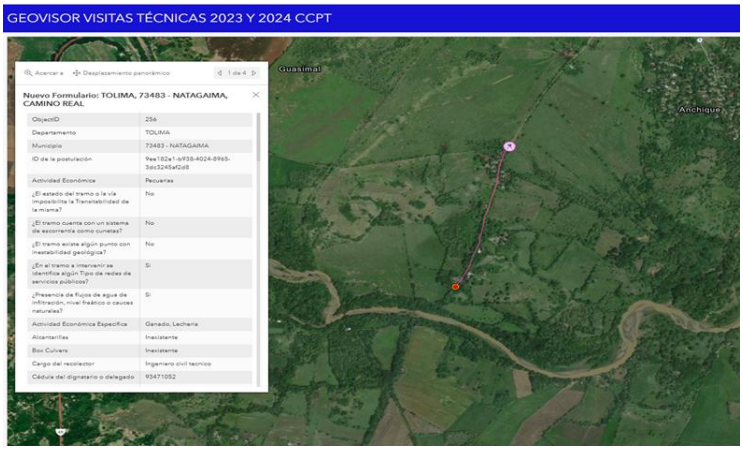


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima departamento de Tolima, al norte del municipio de Natagaima a 0.82 Km del corredor vial denominado COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Lote llamado piedra grande, y punto final de referencia PR0+820 donde finaliza

3198 – 2024 RESGUARDO INDIGENA ANACARCO

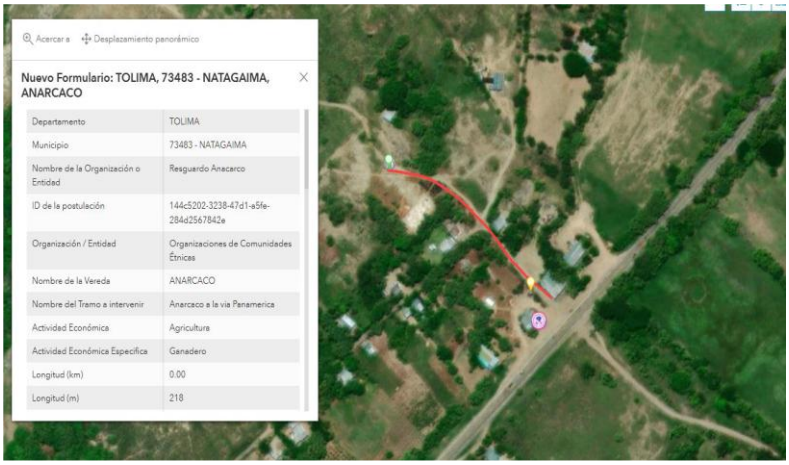


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima departamento del Tolima en la vereda Anacarco, en el corredor vial denominado entrada de el resguardo indígena Anacarco hasta el polideportivo de el mismo, con una longitud de 0,22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía panamericana.

3194 – 2024 RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO

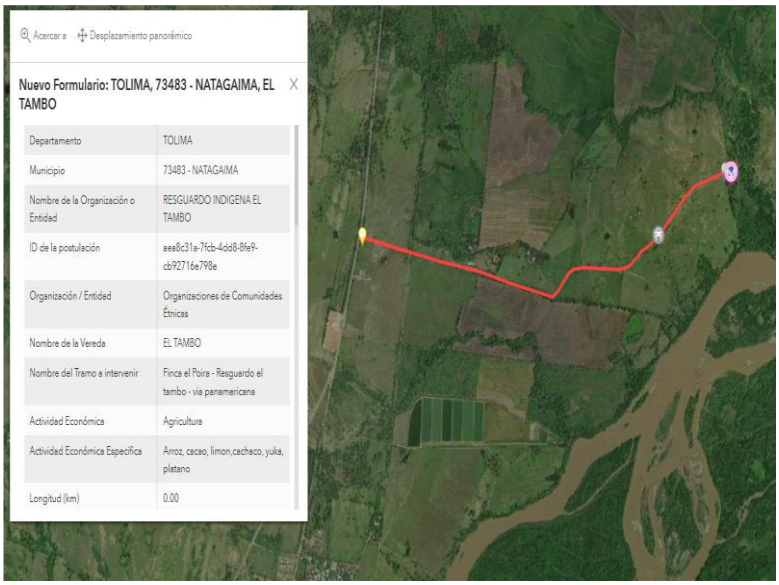

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento del Tolima en el resguardo indígena el tambo, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica de la carretera a la finca el Poira vereda Baloca con una longitud de atención de **2,9 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el mojón de la entrada al resguardo, y el punto final de referencia es PR2+900 en la intersección vía panamericana.

3167 – 2024 RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE

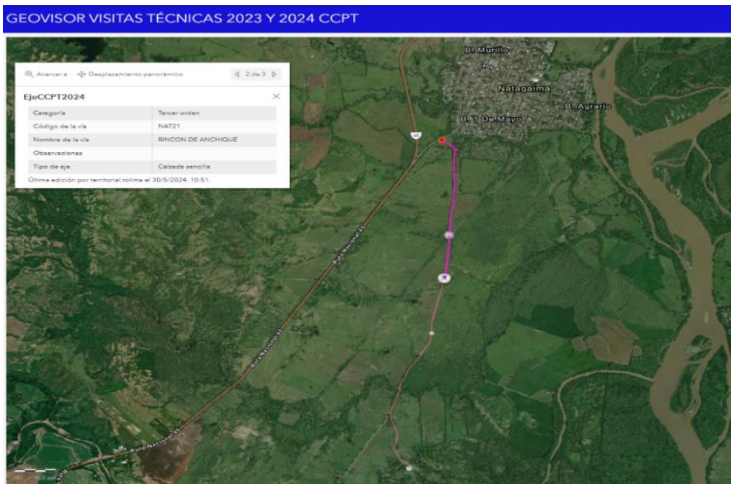


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Natagaima del departamento de Tolima en el resguardo indígena rincón de Anchique, en el corredor vial denominado carretera nacional que conduce al sector agua fría, que tiene una longitud de 1,53 km, tomando como punto de inicio PR0+000 de referencia

el sector agua fría – Entrada al resguardo y el punto final de referencia es el PR1+053 intersección vía panamericana


ORTEGA

2437 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE

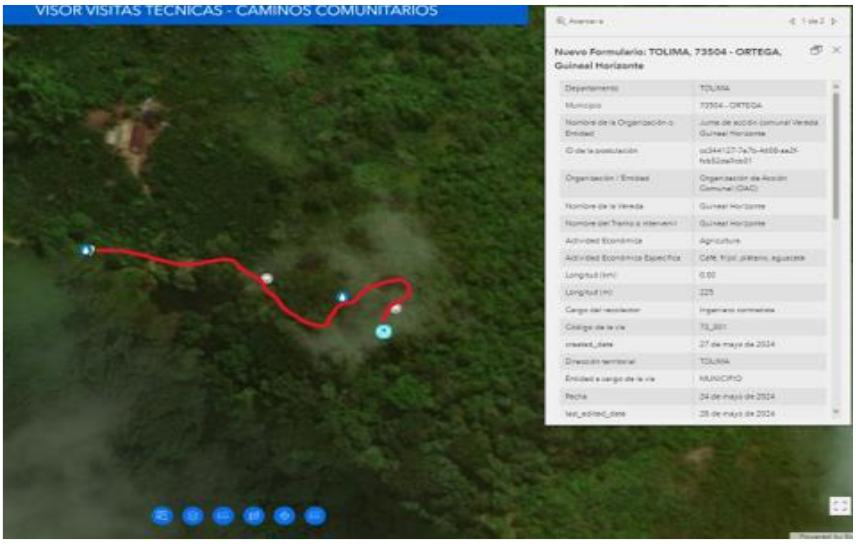

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ortega del departamento de Tolima en la vereda Guineal Horizonte, en el tramo comprendido en la vía que comunica Guineal las Palmas hacia la vereda Leticia que tiene una longitud de atención de 0,225 km, tomando como punto de inicio dereferencia el PR0+000 Finca Mirador 1, y el punto final de referencia es PR0+225 en la casa de Elkin Samper


2205 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA

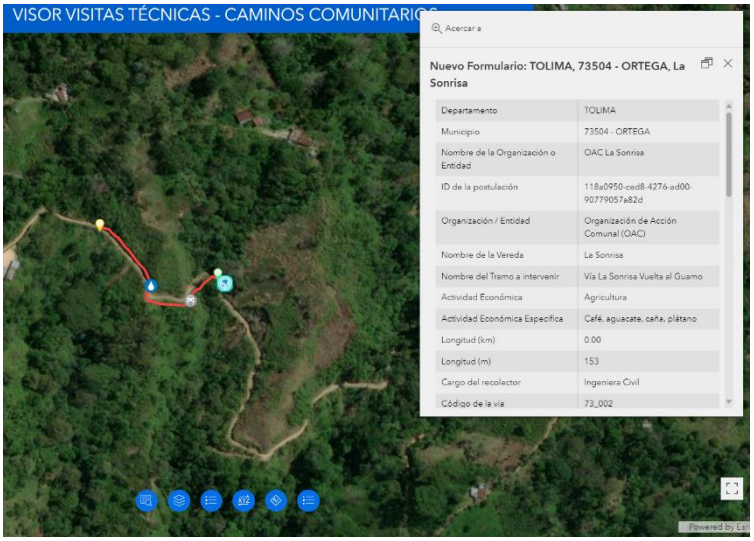

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ortega del departamento de Tolima en la vereda La Sonrisa, en el corredor vial denominado La Sonrisa – Vuelta al Guamo que comunica con el municipio de Ortega que tiene una longitud de atención de **0,153 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Después de la quebrada Maculito en el límite, y el punto final de referencia es PR 0+0153 en la curva del lote La Esmeralda

PALOCABILDO


3422 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DEL GUALI

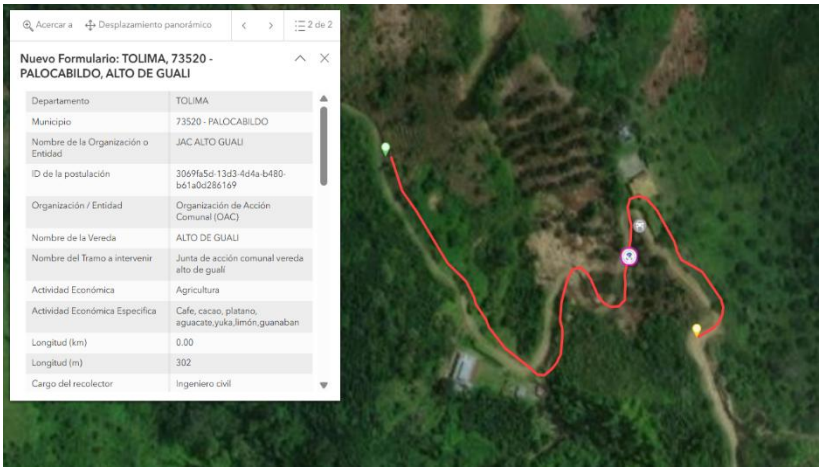

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Palocabildo del departamento de Tolima en la vereda Alto del Gualí, en el corredor vial del tramo comprendido Junta de acción comunal vereda alto del Gualí que tiene una longitud de atención de **0,302 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la finca La primavera y el punto final de referencia es el PR0+302 en el alto del chupo.

PIEDRAS

2693 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO

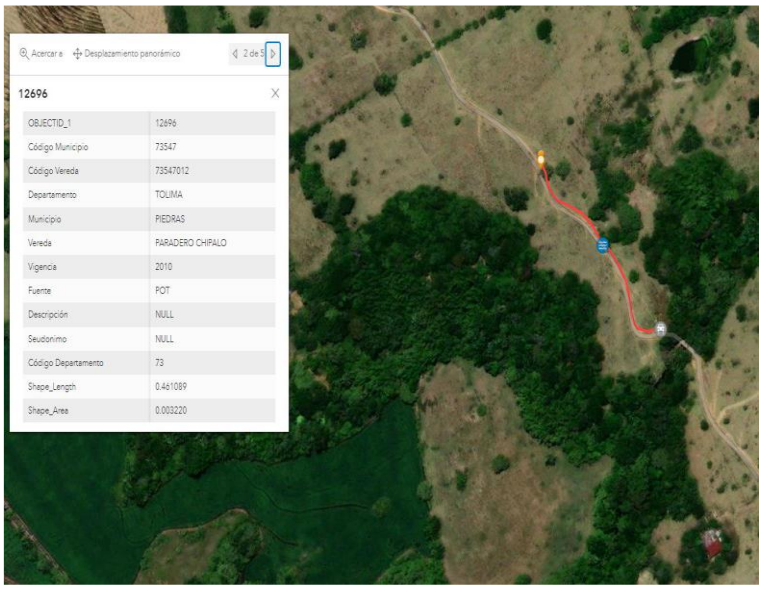

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de PIEDRAS del departamento de Tolima en la vereda Paradero Chípalo. En el tramo comprendido en la vía Tres puertas – Quebrada la Ventilla, que tiene una longitud de atención de 0.19 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio de la vía tres puertas, y punto final de referencia PR0+190

PLANADAS

2123 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO




El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas del departamento de Tolima en la vereda El Oso, en el corredor vial de la vereda La Unión – El Oso con una longitud de 0,181 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el sector del ETCR, y punto final de referencia PR 0+181 en el final del puente de la quebrada El Puerto,

2052 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas departamento del Tolima en la vereda el recreo, en el corredor vial denominado el recreo, con una longitud de 0,56 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 vía que comunica a Bilbao, y el punto final de referencia es PR0 +560

2030 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA,

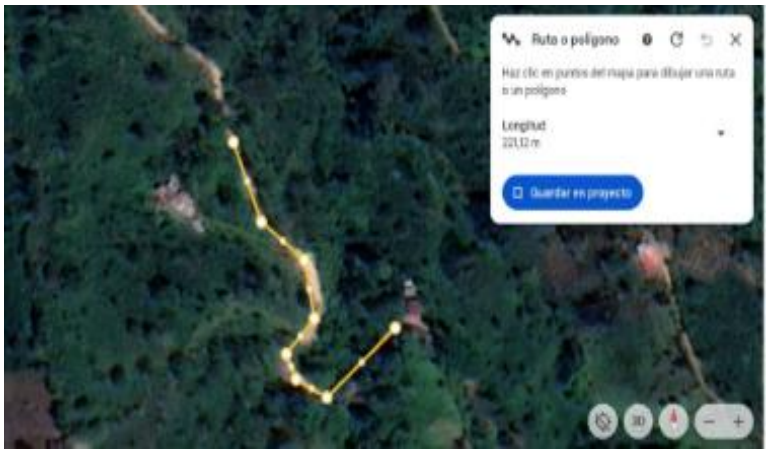


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Planadas del departamento de Tolima en la vereda El Jordán, en el corredor vial denominado Vía Gaitania La Fonda que tiene una longitud de 0.256 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Finca Ricardo Castellanos, y el punto final de referencia es PR 00+256 Finca El Tesoro

2278 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Planadas del departamento de Tolima en la vereda La Aurora, en el corredor vial La Escuela con una longitud de 0,480 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la quebrada Aurora, y el punto final de referencia es PR00 +480 el polideportivo


2061 - 20 24 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO

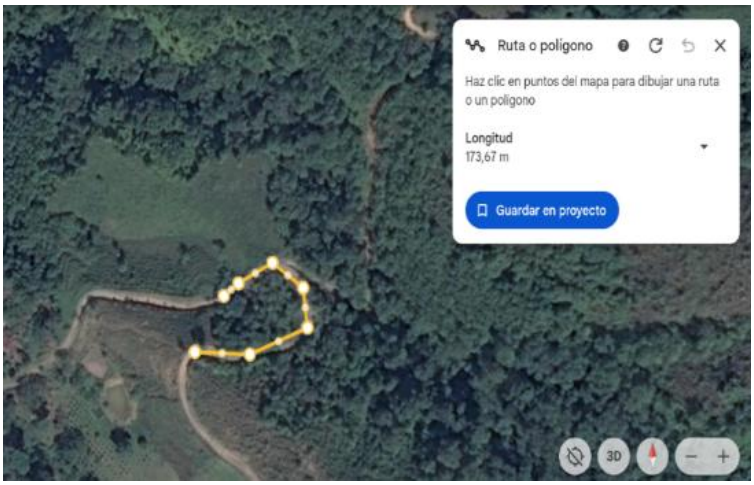

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio Planadas del departamento de Tolima en la vereda San Isidro, en el corredor vial de la vereda Vía vuelta de Misingo con una longitud de 0,17 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 finca Bellavista , y el punto final de referencia es PR 0+153 finca la habitación de Ernesto Soto


2.2.15 RIOBLANCO

2716 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO

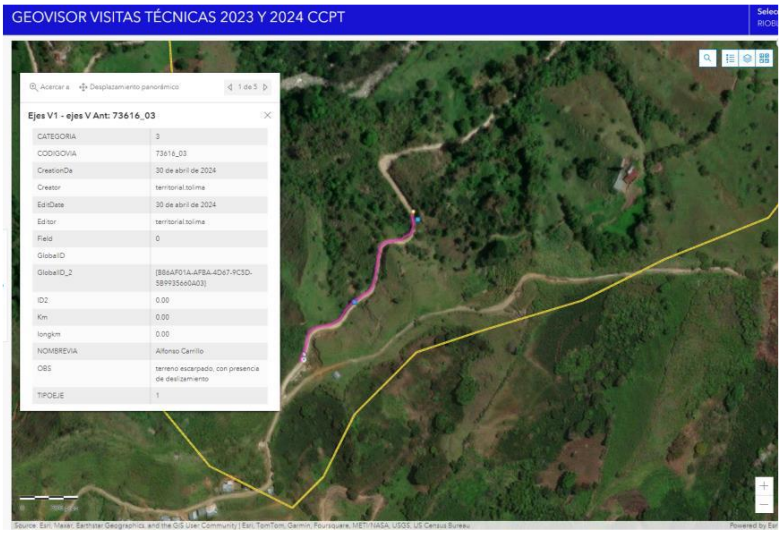


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda Alfonso Carrillo, en el corredor vial de la vereda Alfonso Carrillo – Rio Negro con una longitud de atención de 0,22 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 sobre alcantarillaexistente y el punto final de referencia es el PR0+222 final de la placa huella proyectada.

2854 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE

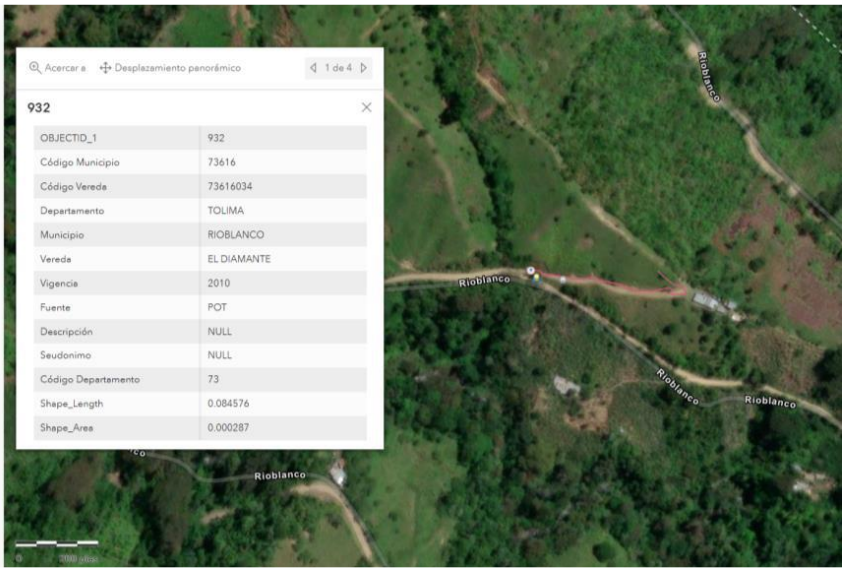


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda El diamante, del tramo comprendido en la vía Diamante – Las Juntas en el corredor vial *FINCA EL MIRADOR A FINCA EL TAMBOR* con una longitud de atención de **0.16 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 intersección vía a Bilbao Planadas, y el punto final de referencia es PR0+160 finca del señor Freddy Rubio

2676- 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA

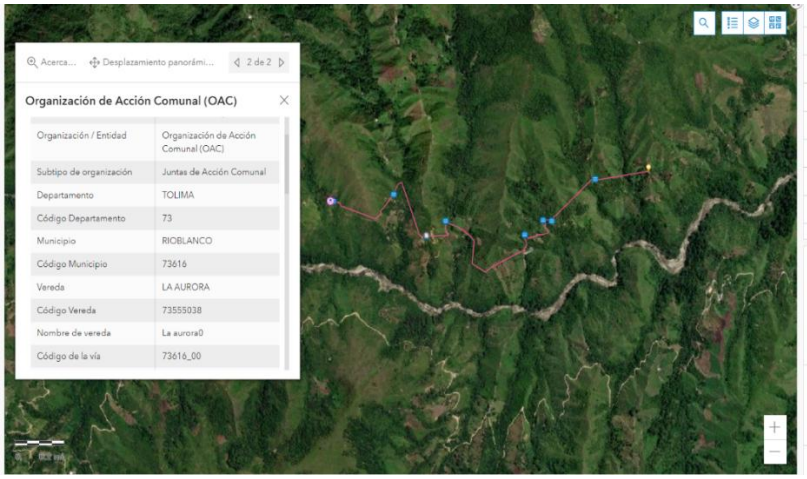


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda La aurora, en el corredor vial denominado La aurora con una longitud de 3.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000, vivienda presidente JAC y el punto final de referencia es PR 3+500.

2663 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO

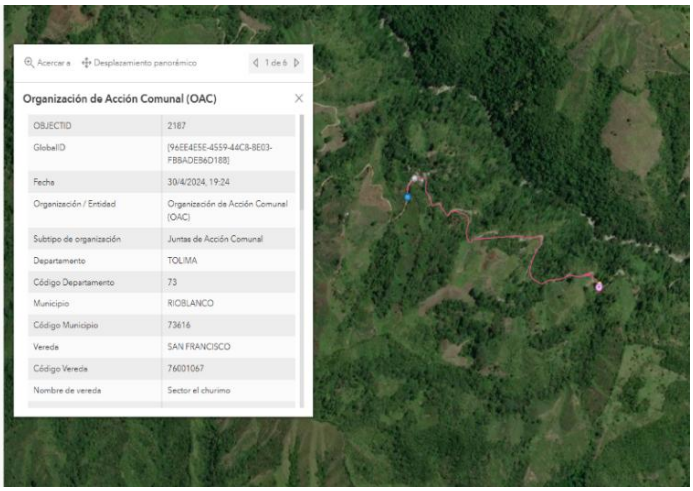

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda San francisco, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía Bocas - La Uribe de san francisco con una longitud de 1.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 badén de la quebrada El churimo


2833 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS

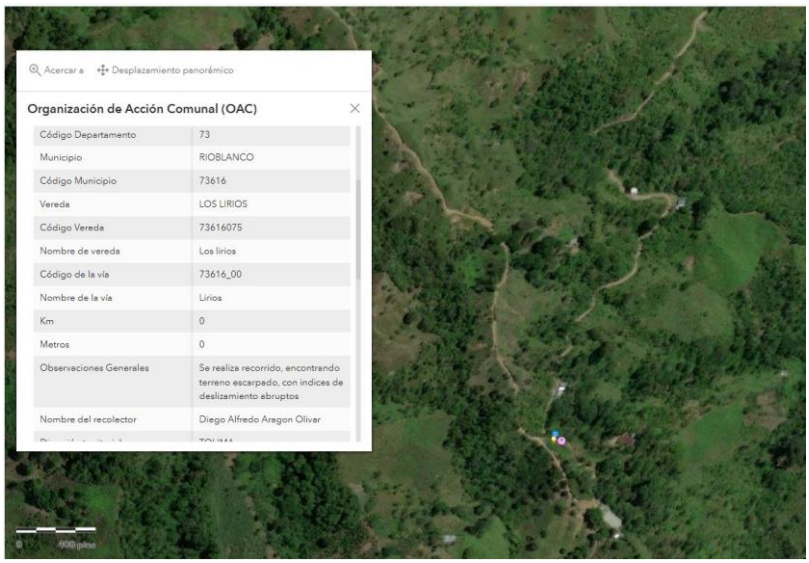

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Rioblanco del departamento de Tolima en la vereda Los Lirios, en el corredor vial denominado Chele - Los lirios con una longitud de atención de **0,78 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Institución educativa Jesús Amézquita, y el punto final de referencia es PR0+780 paso en la sequía hacia chele.

. ROVIRA

4093 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALABOZO

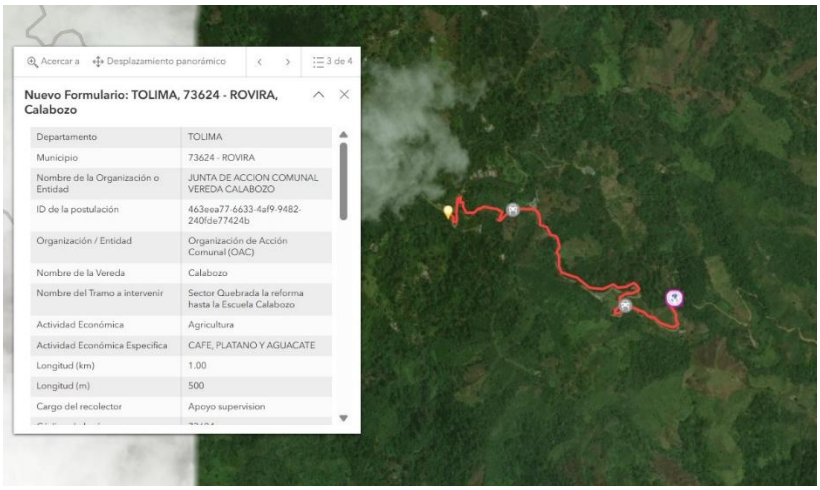

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda Calabozo, en el corredor vial comprendido de la vereda Calabozo hasta empalme de vía hacia Riomanso, que tiene una longitud de atención de **1,5 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la alcantarilla Higuerón – Ángel Alberto, y el punto final de referencia es PR 1+500 en la vivienda de Judith Barragán.

4031 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda de Hato Viejo, en el corredor vial comprendido de la vereda Hato viejo vía que comunica hacia la vereda La selva, que tiene una longitud de atención de **0,240 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la Y - vía la selva, y el punto final de referencia es PR 0+240 en el Baden quebrada Totumo,


4087 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA REFORMA



El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Rovira del departamento del Tolima en la vereda La Reforma, en el corredor vial del tramo comprendido de la Vereda La reforma vía que comunica Las Auras Colón, que tiene una longitud de atención de **0,645 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en la Finca Aldemar Angarita - potrero, y el punto final de referencia es PR 0+645 en La Y - Ceiba la varita.

SALDAÑA


2131 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO

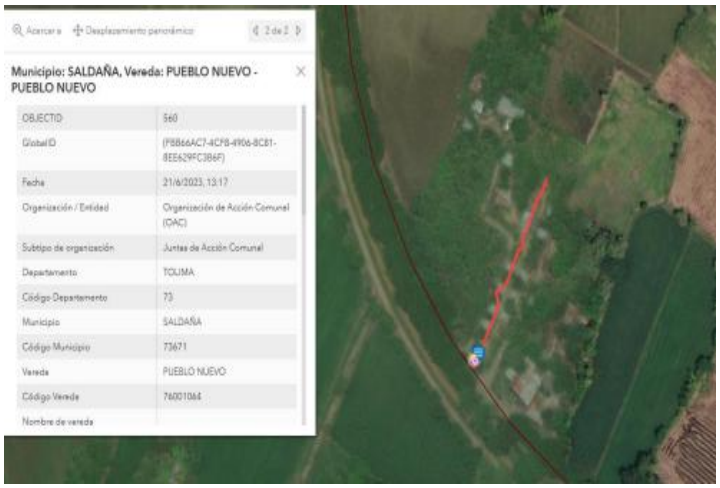

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Saldaña del departamento del Tolima en la vereda Pueblo Nuevo, en el tramo comprendido en la vía al costado de la Asociación de vivienda Pueblo nuevo que tiene una longitud de 0,160 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 en el caserío y el punto final de referencia es el PR00+160 en la intersección de la vía hacia Purificación.

SAN LUIS


3399 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI

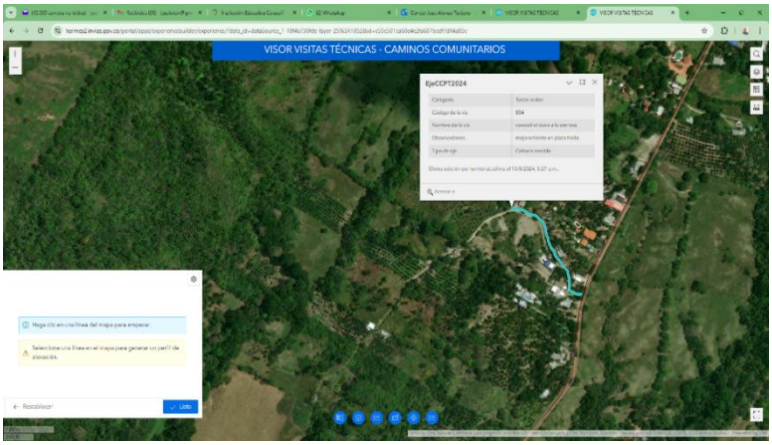

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SAN LUIS del departamento de Tolima en la vereda CARACOLÍ, en el corredor vial denominado CARACOLÍ de finca el Oasis a Finca La Arenosa que tiene una longitud de 1,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 La Vía que de Ibagué conduce al Valle de San Juan a doscientos metro de la institución Educativa CARACOLÍ y el punto final de referencia es el PR0+162 sobre la Finca La Arenosa en el municipio de San Luis Tolima,

SUAREZ


2153 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA

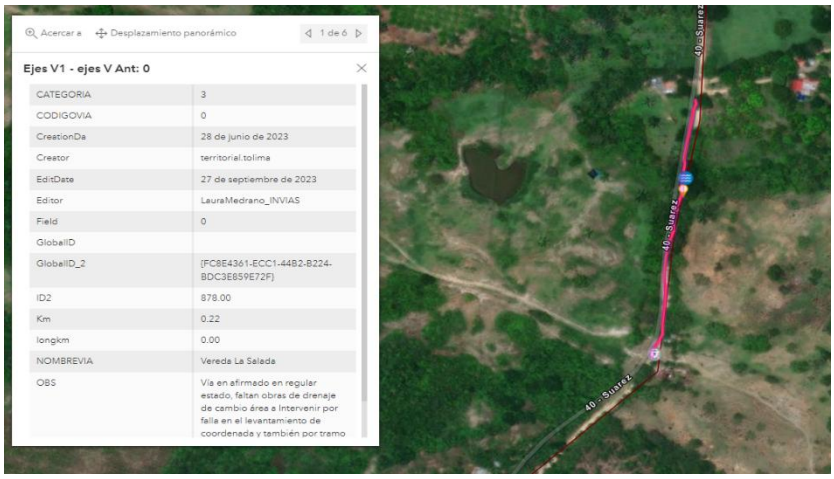

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de SUAREZ en el departamento del Tolima, al norte del municipio de Suarez a 13.4 Km del casco urbano y sobre la vía que comunica EL PASO-SUAREZ-PURIFICACION-PRADO. El corredor vial denominado Vereda LA SALADA tiene una longitud de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000, y punto final de referencia PR00+168 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar

VENADILLO

2156 - 2024JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA

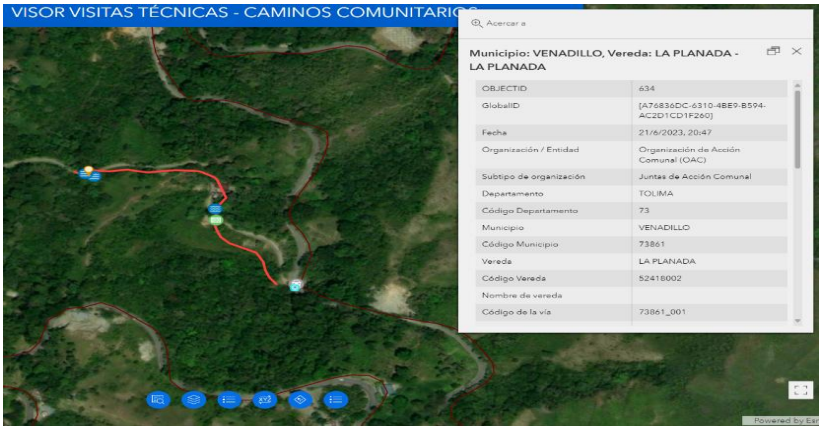


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Venadillo del departamento de Tolima en la vereda La Planada, en el corredor de la vía que comunica la vereda la Planada a la Vereda La Aguada que tiene una longitud de

0,242 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Entrada a la Planada, y el punto final de referencia es PR00+242


VILLARICA

2465 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL

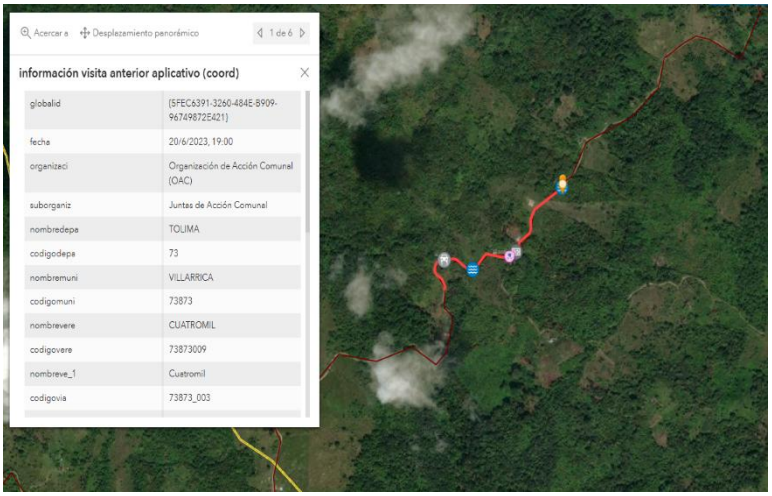

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villarrica del departamento de Tolima en la vereda Cuatro Mil, en el corredor vial RIO SECO - LA TIGRA con una longitud de 0,71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 rio seco, y el punto final de referencia es el PR0+710 quebrada la tigra

2452 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO

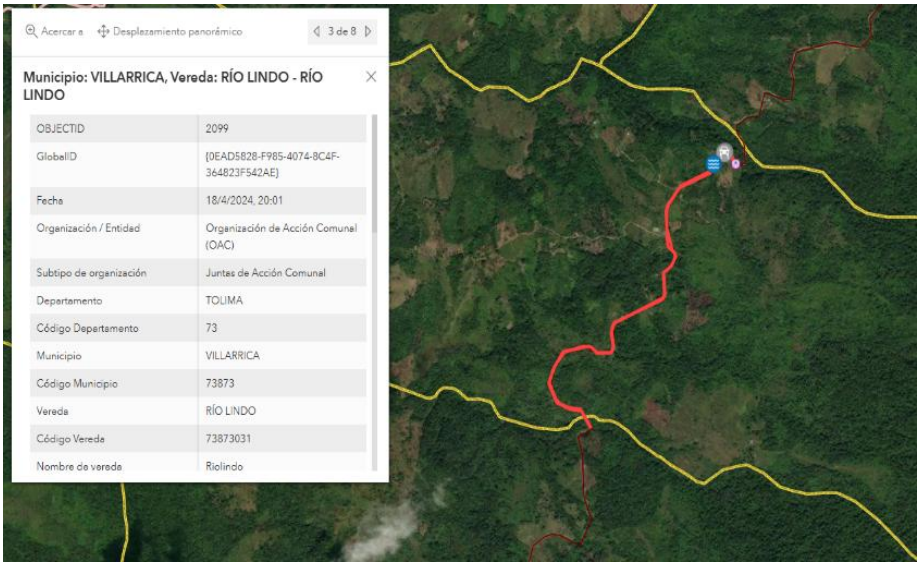

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Villarrica del departamento de Tolima en la vereda Riolindo, en el corredor vial puente rio lindo a puente rio seco con una longitud de 2.6 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 puente Riolindo, y el punto final de referencia es el PR2+600 puente Rioseco

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -Invías y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas, los cuales se plantean según la cronología técnica en los siguientes ítems.

- Aprobación de Hojas de Vida
- Aprobación de Estudios y diseños
- Implementación cartilla INVIAS
- Seguimiento afiliación personal
- Cantidades de obra
- Cotizaciones materiales o insumos para la construcción
- Aprobación compra materiales o insumos para la construcción
- Construcción Placa Huella
- Construcción Alcantarilla
- Liquidación de convenio

Sujeto al estado inicial de la vía indicado por la OAC y a la verificación del mismos teniendo en cuenta la topografía e informe estudio de suelos entregado por INVIAS, la interventoría elevara concepto en diseño de pavimentos indicando si es viable la construcción de sistema de estructura vial como lo es la Placa Huella o si en el punto o zona de construcción se debe construir otra estructura de pavimento.

Proyecto que involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO (1)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	4047 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	**DESDE**	**HASTA**
	21/12/2024	31/03/2025
REINICIO CONVENIO	5 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jacveredaelbarroalvarado2021@gmail.com	
CELULAR	3108037623	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el Barro convenio 2300-2024.

El día 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el Barro convenio 2300-2024.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

El día 28 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 29 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para las Veredas; El barro, Totarito, La Pradera, La Reforma y El Calabozo del CTO 3555-2024

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO - 4047-2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 08/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: LUZ MIRA MURILLO BUSTOS
CONVENIO No.: 4047 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — calidad en infraestructura — CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ❑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ❑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el Barro convenio 4047-2024.
*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS	
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)
Estudios y diseños	1			
* PLACA HUELLA	1			
* ALCANTARILLAS	1			
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100%			1	10,0%
Ejec	100%			1	10,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ (DISPONIBLE)
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____		N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solici tadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al i nicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*Socialización metodología social inicio de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4047DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100009005 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	30	6	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100099005 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.090.352,70	2	10	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.045.176,35	2	10	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.180.705,40	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037196

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	10	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100099005 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

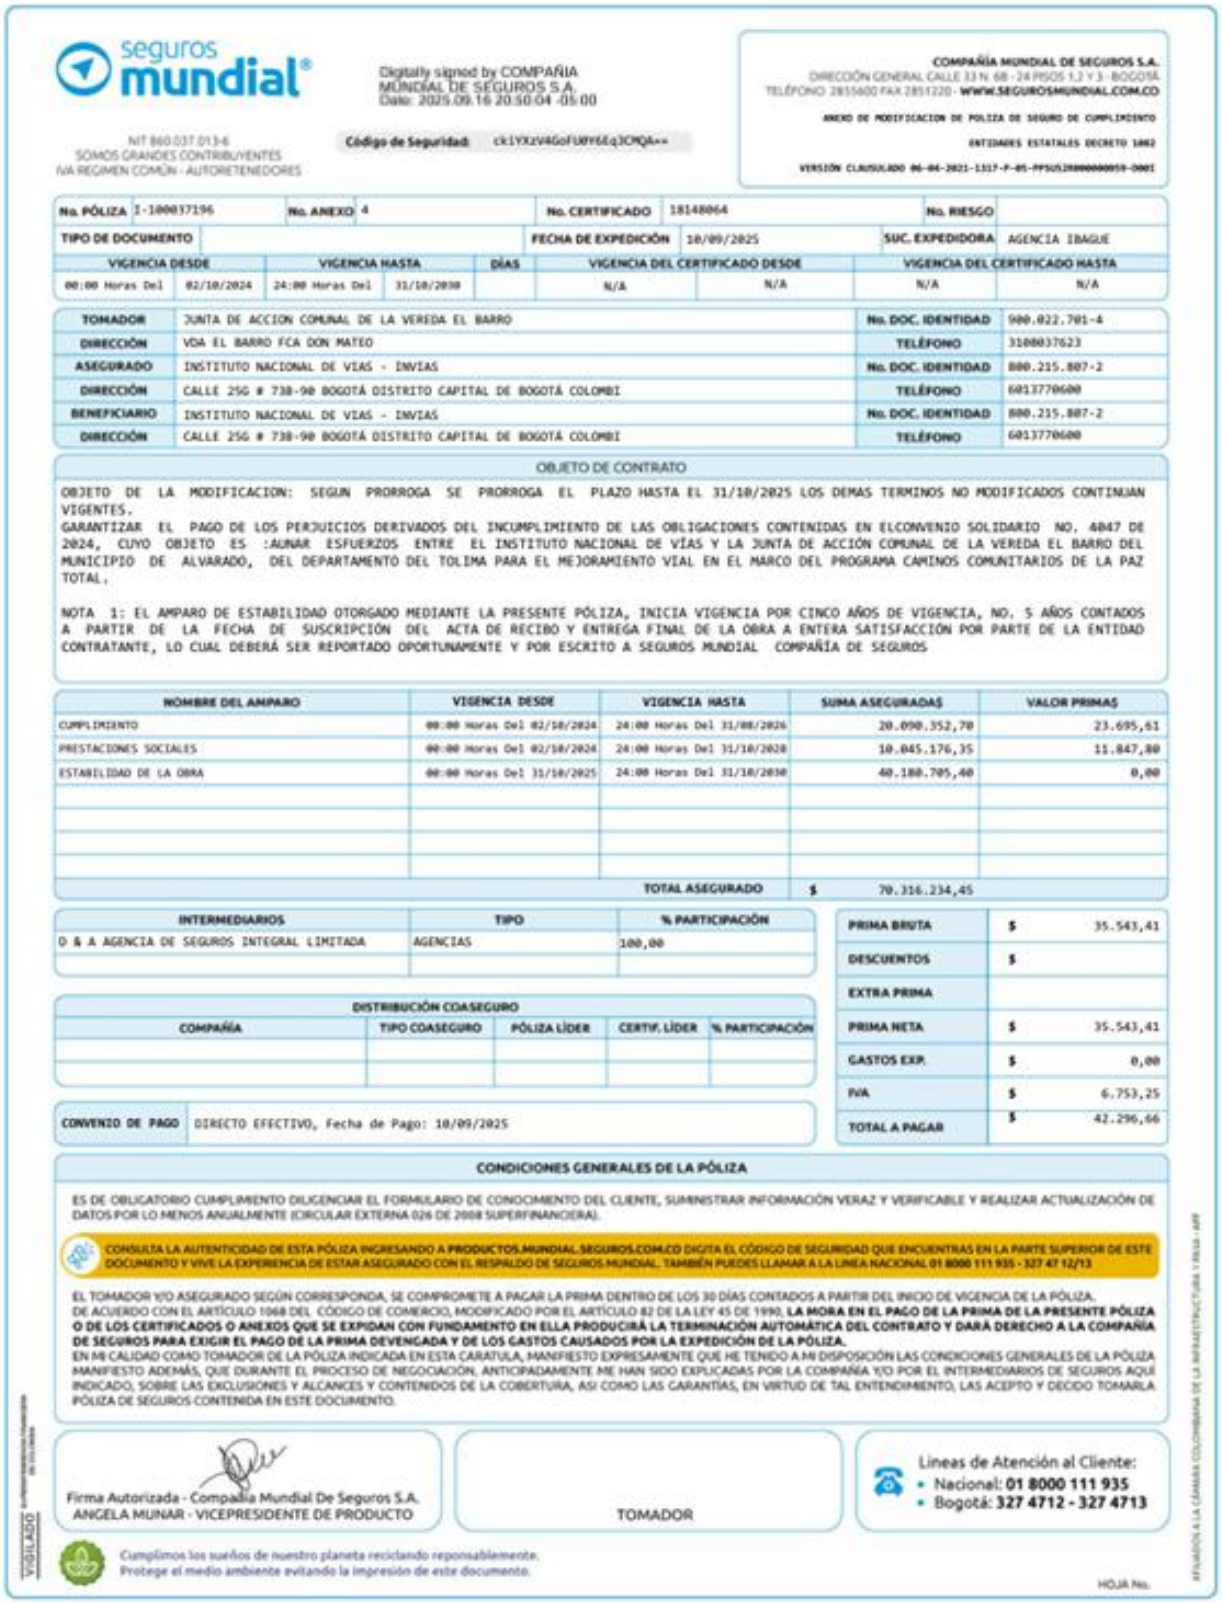

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:50:04 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ck1YXzV4GoFU8Yf6Eq3CMQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100037196	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148064	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	900.022.701-4
DIRECCIÓN	VDA EL BARRO FCA DON MATEO	TELÉFONO	3108037623
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025 LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELCONVENIO SOLIDARIO NO. 4047 DE 2024, CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑIA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.090.352,70	23.695,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/10/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.045.176,35	11.847,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.180.705,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.316.234,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.543,41
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.543,41
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.753,25
TOTAL A PAGAR	$	42.296,66

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

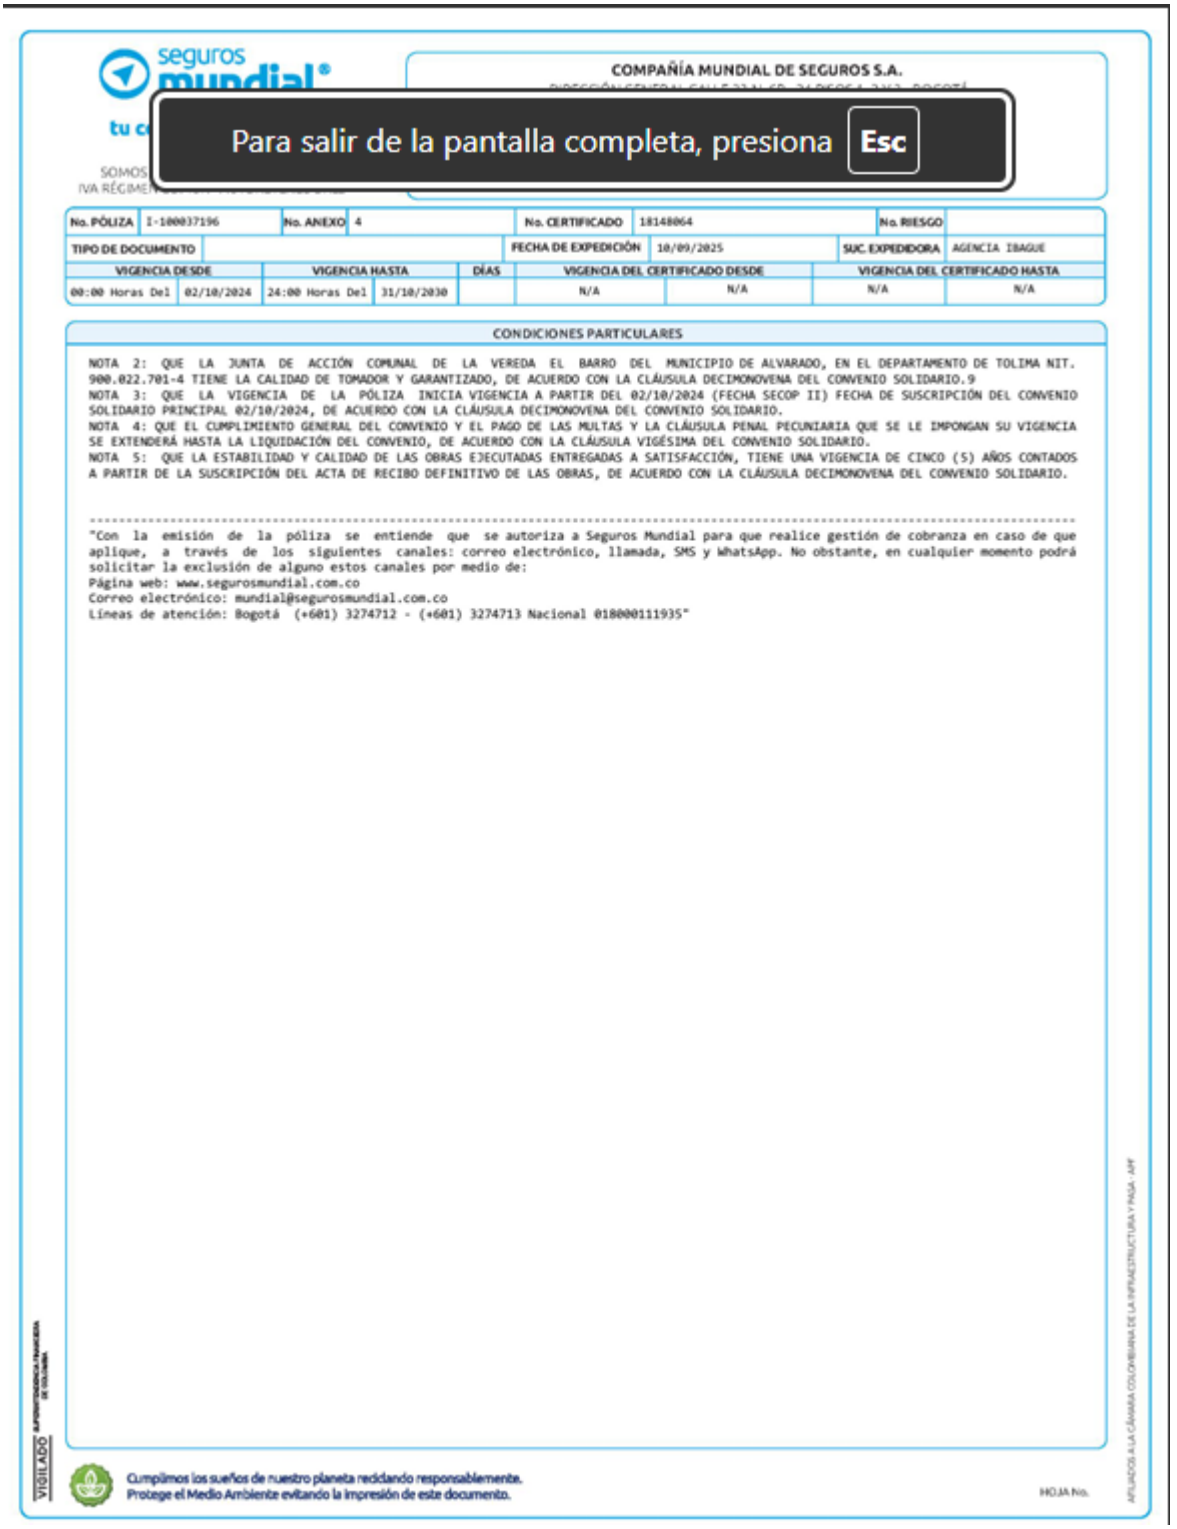

seguros mundial®

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Para salir de la pantalla completa, presiona Esc

No. PÓLIZA	I-100037196	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148064	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.022.701-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/10/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AMF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100037196** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **10/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

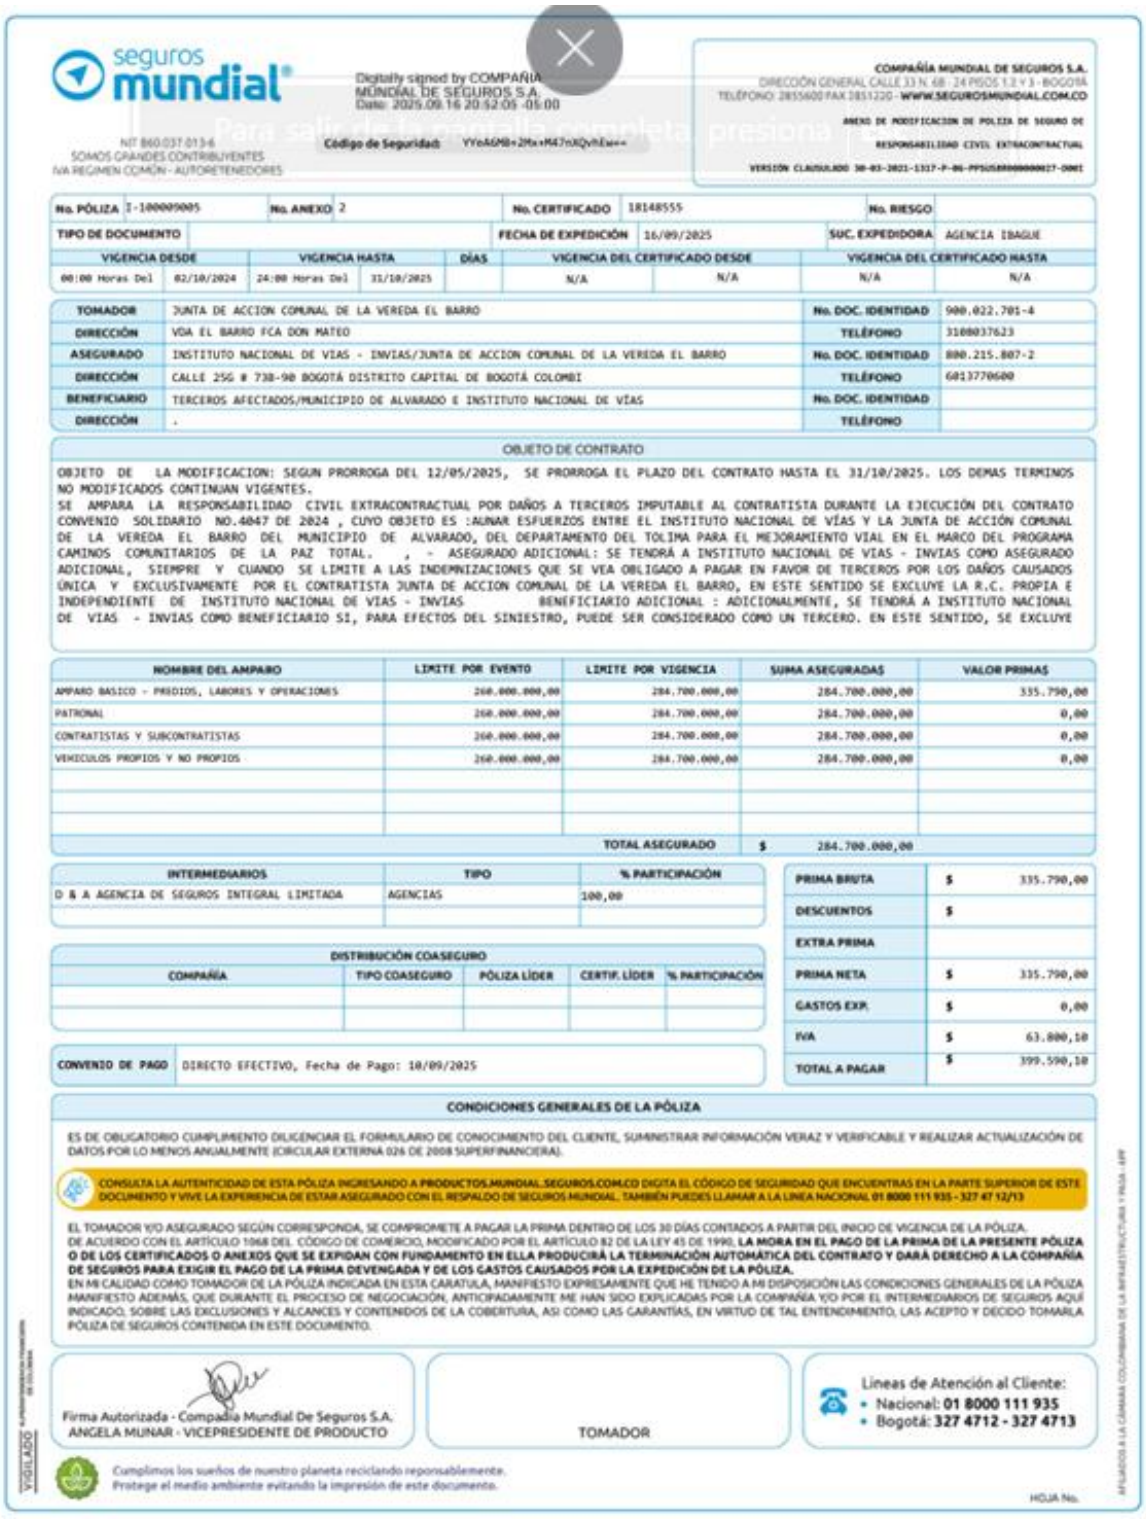

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:52:05 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: YYnA6MB+2Mx+M47nXQvREw==

Para saber cómo verificar la póliza completa presiona

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5R0000000127-D001

No. PÓLIZA	I-100009005	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	900.022.701-4
DIRECCIÓN	VDA EL BARRO FCA DON MATEO	TELÉFONO	3108037623
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ALVARADO E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4047 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.790,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.790,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.590,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100009005	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 900.022.701-4. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/10/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

HOJA No.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4047 -2024 JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos qu e indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4047 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO **NIT** 900022701_4

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	DESEMBOLSO INCIAL		14/08/2025	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
																			-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
															-				-	198.557.901,56	
TOTALES		-											-	-	-	-	-	-	-	198.557.901,56	
																			EXTRACTO	-	
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	198.557.901,56	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
9	REINTEGROS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4047 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366050001325 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.903.527,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO NIT 900022701 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.345.625,44	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.345.625,44	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 198.557.901,56

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM 5000000

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 23.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.000.000,00
2	MATERIALES	$ 116.021.318,56	$ -	$ -	$ -	$ 116.021.318,56
3	TRASPORTE	$ 26.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 26.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 24.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
6	PAGA	$ 4.536.583,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.536.583,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 198.557.901,56	$ -	$ -	$ -	$ 198.557.901,56

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ - $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **4047 - 2024** (Indicar número y año) — **EJECUTOR:** **JAC ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO ALVARADO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00	12%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 116.021.318,56	$ 116.021.318,56	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00	13%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	12%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA			$ 4.536.583,00	$ 4.536.583,00	2%
TOTAL					**$ 198.557.901,56**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO (2)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	4076 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	BERNEL GARZON CASTILLO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
VALOR INICIAL	$200.201.607	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	j.a.c.veredatotarito@gmail.com	
CELULAR	3132854628	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el Totarito convenio 4076-2024.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

El día 28 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 29 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para las Veredas; El barro, Totarito, La Pradera, La Reforma y El Calabozo del CTO 3555-2024

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ALVARADO-4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

4.1 INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día 7de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

JOYCO SOCIEDADES BIC
calidad en infraestructura
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 (Numeración consecutiva) del 1/08/2025 al 7/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO, DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: BERNEL GARZON CASTILLO
CONVENIO No.: 4076 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.020.160,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS. *El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	BERNEL GARZON CASTILLO		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.020.160,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: BERNEL GARZON CASTILLO
CONVENIO No. 4076 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.020.160,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 19 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el TOTARITO convenio 4076-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO, DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	BERNEL GARZON CASTILLO		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.201.607,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.607,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.020.160,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 28 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 29 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para las Veredas; El barro, Totarito, La Pradera, La Reforma y El Calabozo del CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora; Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — calidad en infraestructura — Empresa con propósito
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 161 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda Totarito, en el corredor vial que comunica la vereda Totarito sector La Chapa con central de mieles, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 1+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	BERNEL GARZON CASTILLO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.201.607,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.201.607,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.201.607	$ 200.201.607		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.201.607,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.020.160,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.020.160,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.020.160,70	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4076 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOTARITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.201.607,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.201.607,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 20.020.160,70	4 / 10 / 2024	31 / 10 / 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Dia / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4 / 10 / 2024	31 / 12 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	31 / 12 / 2024	31 / 12 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4 / 10 / 2024	31 / 12 / 2024
Otros			Dia / Mes / Año	Dia / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100009003 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.020.160,70	4	10	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4	10	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	10	2024	30	6	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 1000039003 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.020.160,70	4	10	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.010.080,35	4	10	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.040.321,40	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100037198

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	10	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 1000039003 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 22:57:37 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: o5fvI8N6cVxBh6xopKFXTw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5200000000019-0000

No. PÓLIZA	2-100037198	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148066	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.055.737-8
DIRECCIÓN	VDA TOTARITO FCA EL PLACER	TELÉFONO	3132856628
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4876 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/10/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.020.160,70	23.612,82
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/10/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.010.080,35	11.806,41
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.040.321,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.070.562,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.419,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.419,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.729,65
TOTAL A PAGAR	$	42.148,88

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100037198	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148066	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.055.737-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/10/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 04/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - AMP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100037198** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **10/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 22:58:54 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: uMkOuxWrvrue+ygCQIUcrwnx

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSB000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100009003	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148540	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.055.737-8
DIRECCIÓN	VDA TOTARITO FCA EL PLACER	TELÉFONO	3132854628
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ALVARADO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 20/12/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO NO.4076 DE 2024 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.790,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.790,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.590,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100009003	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148540	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/10/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 800.055.737-8. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 04/10/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 04/10/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5. 0 COMPONENTE FINANCIERO ALVARADO- 4076-2024 JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 4076 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO **NIT** 800055737 8

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	197.866.315,85	
5	ADMINISTRATIVOS		01/08/2024	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS.	BANCO AV VILLAS							-				-	197.866.315,85	
5	ADMINISTRATIVOS		01/08/2024	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		GASTOS FINANCIEROS ND IVA	MUNDIAL DE SEGUROS							-				-	197.866.315,85	
5	ADMINISTRATIVOS		01/08/2024	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS 4X1000	BANCO AV VILLAS							-				-	197.866.315,85	
5	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Poliza C y Ex)	MUNDIAL DE SEGUROS							-				-	197.866.315,85	
5	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES	BANCO AV VILLAS							-				-	197.866.315,85	
	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025	extracto bancario			ND 4x1000								-				-	197.866.315,85	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31/05/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/07/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/08/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		30/09/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/10/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		30/11/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/12/2024	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/01/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		28/02/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		31/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		30/04/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	ADMINISTRATIVOS		10/06/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Poliza C y Ex)								-				-	197.866.315,85	
	ADMINISTRATIVOS		10/06/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES								-				-	197.866.315,85	
	ADMINISTRATIVOS		10/06/2025	extracto bancario			ND 4x1000								-				-	197.866.315,85	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		30/06/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		01/08/2024	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		21/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000								-				-	197.866.315,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS		21/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000								-				-	197.866.315,85	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
															-				-	197.866.315,85	
TOTALES		-											-	-	-	-	-	-	-	197.866.315,85	
																			EXTRACTO	197.992.920,85	
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	- 126.605,00	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
9	REINTEGROS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4076 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366050001317 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.201.607,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO NIT 800055737 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.335.291,15	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.335.291,15	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.866.315,85

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.350.097,85	$ -	$ -	$ -	$ 115.350.097,85
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
6	PAGA	$ 4.516.218,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.516.218,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 197.866.315,85	$ -	$ -	$ -	$ 197.866.315,85

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 117.268,00 $ 1.675,35
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 117.268,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4076 - 2024 (Indicar número y año) — **EJECUTOR:** JAC DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO DEL MUNICIPIO ALVARADO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año) — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 115.350.097,85	$ 115.350.097,85	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA		$ -	$ 4.516.218,00	$ 4.516.218,00	2%
	TOTAL				**$ 197.866.315,85**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA (3)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	2271 – 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ANZOATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL	$200.514.428
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	veredasantabarbaraanzoategui@hotmail.com
CELULAR	316 8560383

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

El día 01 de agosto de 2025 comité operativo, inicio de obra lunes 04 de agosto en la vereda Santa Barbara del Municipio de Anzoátegui Tolima.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 la Junta comunal de la Vereda Santa Barbara del Municipio de Anzoátegui Tolima envía Hoja de vida del ingeniero residente.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 04 de agosto de 2025 firma acta de inicio Vereda Santa Barbara del Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfía Linda del Municipio de Casabianca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.

El día 12 de agosto de 2025 se envía control de calidad de materiales de construcción y prestación de diseño de mezcla por parte de la OAC de las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui Tolima

El día 12 de agosto de 2025 solicitud autorización y firma para pagos de retención en la fuente, para las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui, La Planada Municipio de Venadillo junto a otros gastos como transporte, en cuanto a la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Casabianca se envían dos pagos que fueron rechazados por el Banco AVVILLAS

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 13 de agosto de 2025 se envía recomendación en la instalación del acero de las riostras donde se instalo acero #4 y en los diseños geométricos es #3, por parte del Ingeniero Residente Edgar Ávila para la OAC, en la Vereda Santa Barbara en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 14 de agosto de 2025 segundo desembolso en la Vereda Santa Barbara y gastos varios en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 14 de agosto de 2025 se envían recomendaciones por la mala ejecución técnica a la OAC Santa Barbara del convenio 2271-2024.

El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

El día 19 de agosto de 2025 solicitud para desembolso #3 del convenio 2271-2024 Santa Barbara.

El día 21 de agosto de 2025 se envía documentación para desembolso Vereda Santa Helena, Pocharco, La Planada, Santa Barbara del Departamento del Tolima.

día 22 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC Vereda Santa Barbara convenio 2271-2024

El día 14 de agosto de 2025 segundo desembolso en la Vereda Santa Barbara y gastos varios en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 14 de agosto de 2025 se envían recomendaciones por la mala ejecución técnica a la OAC Santa Barbara del convenio 2271-2024.

El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

El día 19 de agosto de 2025 solicitud para desembolso #3 del convenio 2271-2024 Santa Barbara.

El día 21 de agosto de 2025 se envía documentación para desembolso Vereda Santa Helena, Pocharco, La Planada, Santa Barbara del Departamento del Tolima.

día 22 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC Vereda Santa Barbara convenio 2271-2024

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.

El día 27 de agosto de 2025 radicación solicitud no objeción etapa inicio de CTO 3355-2024 de los convenios 2660-2024, 2030-2024, 2052-2024, 2061-2024, 2123-2024, odograma Caminos Comunitarios de la Paz total- DPTO del Tolima

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024

El día 27 de agosto de 2025 se envía solicitud para reunión de seguimiento a los convenios solidarios Anzoátegui Tolima

de agosto de 2025 se envía recomendación de malas prácticas de ejecución técnica por parte del Ingeniero Residente Edgar Ávila para la OAC, en la Vereda Santa Barbara y Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 29 de agosto de 2025 el profesional financiero Henry Vanegas envía desembolso para nómina de las Veredas Santa Helena, Santa Barbara y Guineal Horizonte.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría junto a la oac firman orden de inicio y recepcióna las cotizaciones necesarias para realizar los respectivos desembolsos para la compra de mteriales.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de c

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y una alcantarilla ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.124.250,77	16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.537.846,78	13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.586.403,98	3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.124.250,77	16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.537.846,78	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.586.403,98	3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.124.250,77	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.537.846,78	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16% — Avance o Atraso Físico %: 3%
Meta Física Ejecutada %: 13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1,00	10,0%
					Ejec	100%			1,00	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	8%			0,08	5,6%
					Ejec	4%			0,04	2,8%
* Alcantarilla	1				Prog				-	
					Ejec				-	
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
VIBRO PARA CINCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	LA CAIMA ALVARADO TOLIMA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se continua con instalación de subbase compactada.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada.
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huellla..
*Se funden 35m de cuneta en ciclopedo y concreto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa amarre de hierro longitudinal y transversal de la placa huella
*Se programa instalación de subbase compactada.
*Se programa toma densidades a la sub base instalada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA
INTEGRANTES: RAMON DAVID FRANCO BEJARANO
CONVENIO No.: 2271 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 199.514.428,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 199.514.428,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.073.265,71	26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.883.462,72	24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.189.802,99	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.073.265,71	26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.883.462,72	24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.189.802,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.345.615,94	11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26%
Meta Física Ejecutada %: 24%
Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	23%			0,23	16,1%
					Ejec	20%			0,2	14,0%
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	
TROMPO 1 BULTO	1	1
V IBRO DE CONCRETO	1	1
Total	6	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor, *Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas). *Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



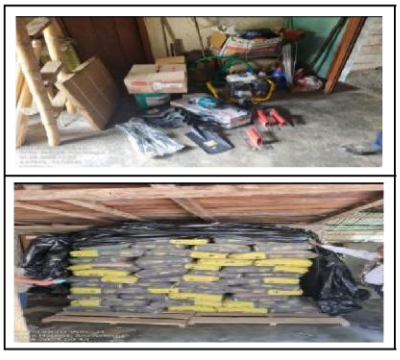



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y una alcantarilla ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.022.280,65	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70.229.078,66	35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.793.201,99	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.022.280,65	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.229.078,66	35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.793.201,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.138.817,93	11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 deMarzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 35%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	38%			0,38	26,6%
					Ejec	36%			0,36	25,2%
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
V IBRO DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella
*Instalación de subbase compactada

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



#¡VALOR!

#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y una alcantarilla ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO		
CONVENIO No.	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.971.295,59	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 89.781.492,60	45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.189.802,99	2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93.971.295,59	47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 89.781.492,60	45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.189.802,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.552.413,94	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 deMarzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47%
Meta Física Ejecutada % 45%
Avance o Atraso Físico % 2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	53%			0,53	37,1%
					Ejec	50%			0,5	35,0%
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
V IBRO DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se hace amarre de hierro longitudinal y transversal de la placa huella.
*Se realiza instalación de subbase compactada.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada.
* Se funden 5 losas d ela placa huella con un total de 13,5m fundidos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa amarre de hierro longitudinal y transversal de la placa huella
*Se programa instalación de subbase compactada
*Se programa toma densidades a la sub base instalada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI - TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 137 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Bárbara, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 137 m y una alcantarilla ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMON DAVID FRANCO BEJARANO			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	2271 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.920.310,53	58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112.127.108,54	56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.793.201,99	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.920.310,53	58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.127.108,54	56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.793.201,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.345.615,94	11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 deMarzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58% — Avance o Atraso Físico %: 1%
Meta Física Ejecutada %: 56%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	68%			0,68	47,6%
					Ejec	66%			0,66	46,2%
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
V IBRO DE CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto 100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se continua con instalación de subbase compactada.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada.
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huellla..
*Se funden 3 secciones de la placa huella con un total de 8,1m .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa amarre de hierro longitudinal y transversal de la placa huella
*Se programa instalación de subbase compactada
*Se programa toma densidades a la sub base instalada.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2271-2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL JJ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PULIDORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO PARA CONCRETO			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO							6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO												1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	74%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	26%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

EDGAR H. AVILA O.

Firma

Nombre: Edagar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.





4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 2271-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOHN ALZATE	2717753	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		JAC SANTA BARBARA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	NUEVA EPS		$ 65.300	PORVENIR		$ 83.600	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
2	ALISANDER CASALLAS	14224249																																		JAC SANTA BARBARA	$ 1.530.000,00	$ 106.500	V	NUEVA EPS		$ 191.300			$ -	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
3	RIGOBERTO CHARY	13975081																																		JAC SANTA BARBARA	$ 1.091.350,00	$ 76.000	V	SALUD TOTAL		$ 136.500	PORVENIR		$ 174.700	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
4	MAURICIO ESCANDON	12448216																																		JAC SANTA BARBARA	$ 450.000,00	$ 31.400	V	NUEVA EPS		$ 56.300	COLPENSIONES		$ 72.000	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
5	JORGE GARZON	13975083	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500																																JAC SANTA BARBARA	$ 1.233.700,00	$ 85.900	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 154.300	PORVENIR		$ 197.400	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
6	WILBAR JIMENEZ	1067840611																																		JAC SANTA BARBARA	$ 94.900,00	$ 6.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 11.900	PORVENIR		$ 15.200	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
7	BRANDON MENDIVELSO	1110088673	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500																																JAC SANTA BARBARA	$ 1.091.350,00	$ 76.000	V	SALUD TOTAL		$ 136.500	COLPENSIONES		$ 174.700	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
8	EDUIN PARRA	1007531141	OFICIAL	$ 1.800.000																																JAC SANTA BARBARA	$ 1.020.000,00	$ 71.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 127.500	PORVENIR		$ 163.200	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
9	JORGE RIOS	70252069	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500,00																																JAC SANTA BARBARA	$ 616.850,00	$ 43.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 77.200			$ -	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
10	JOHAN QUINTERO	1088298392	INGENIERO RESIDENTE																																	JAC SANTA BARBARA	$ 949.000,00	$ 66.100	V										
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

EDGAR H. AVILA O.

Firma _____
Nombre: EDGAR AVILA
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.







Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 809002290	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	VEREDA SANTA BARBARA	ANZOATEGUI-TOLIMA	3168560383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-08	2025-09			E	2025/09/19				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	2717753	ALZATE JOHN	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$65,300	CCF48	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200
2	CC	14224249	CASALLAS ALBANDER		0	$0	$0	EPS037	17	$1,530,000	$191,300	CCF48	17	$1,530,000	$61,200	14-11	17	$1,530,000	$106,500	17	$1,530,000	$76,500
3	CC	13975081	CHARRY RIGOBERTO	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$136,500	CCF48	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
4	CC	12448216	ESCANDON MAURICIO	25-14	5	$450,000	$72,000	EPS037	5	$450,000	$56,300	CCF48	5	$450,000	$18,000	14-11	5	$450,000	$31,400	5	$450,000	$22,500
5	CC	13975083	GARZON JORGE	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$154,300	CCF48	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$1,233,700	$61,800
6	CC	1067840611	JIMENEZ WIUBAR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$11,900	CCF48	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$94,900	$4,800
7	CC	1110088673	MENDIVELSO BRANDON	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$136,500	CCF48	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
8	CC	1007531141	PARRA EDUIN	230301	17	$1,020,000	$163,200	EPS041	17	$1,020,000	$127,500	CCF48	17	$1,020,000	$40,800	14-11	17	$1,020,000	$71,000	17	$1,020,000	$51,000
9	CC	70252069	RIOS JORGE		0	$0	$0	EPS037	13	$616,850	$77,200	CCF48	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
Total	**Afiliados(9)**					$5,503,250	$880,800			$7,650,100	$956,800			$7,650,100	$306,200			$7,650,100	$532,900		$7,650,100	$383,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$880,800	$0	$0	$880,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$246,700	$0	$0	$246,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$634,100	$0	$0	$634,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$532,900	$0	$0	$532,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$532,900	$0	$0	$532,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$306,200	$0	$0	$306,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	$306,200	$0	$0	$306,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$956,800	$0	$0	$956,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$390,100	$0	$0	$390,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$293,700	$0	$0	$293,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$273,000	$0	$0	$273,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$229,900	$0	$0	$229,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$229,900	$0	$0	$229,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$153,300	$0	$0	$153,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$153,300	$0	$0	$153,300
TOTAL				9	$3,059,900	$0	$0	$3,059,900

2025/09/08 12:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809002290	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	VEREDA SANTA BARBARA	ANZOATEGUI-TOLIMA	3168560383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08		9491567132	Y	2025/09/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1088298392	QUINTERO JHOAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	20	$949,000	$66,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$949,000	$66,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,100	$0	$0	$66,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$66,100	$0	$0	$66,100
TOTAL				**1**	**$66,100**	**$0**	**$0**	**$66,100**

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2271-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: EDGAR H. AVILA O.
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2271-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1.01	20/08/2025	LOSA PLACA HUELLA	INVIAS 410	PROO+126-129 LOSA 43	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
1.02	20/08/2025	REFORZADA MEZLCA ARGOS ESTRUCTURAL	INVIAS 410	PROO+126-129 LOSA 43	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
2.01	22/08/2025	CUNETA L.D LOSA 44	INVIAS 410	PROO+127-130 LOSA 44	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
2.02	22/08/2025	CUNETA L.D LOSA 44	INVIAS 410	PROO+127-130 LOSA 45	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
3.01	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+111-114 5 LOSAS	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
3.02	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+111-114 5 LOSAS	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
4.01	27/08/2025	CUENA L.I LOSA 33-34-35	INVIAS 410	PROO+114-117	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
4.02	27/08/2025	CUENA L.I LOSA 33-34-35	INVIAS 410	PROO+114-117	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
5.01	28/08/2025	LOSA PLACA HUELLAS	INVIAS 410	PROO+084-087	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
5.02	28/08/2025	LOSA PLACA HUELLAS	INVIAS 410	PROO+084-087	6	21MPA			SIN RESULTADO DEL ENSAYO, RESULTADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

EDGAR H. AVILA O.

Firma:
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Firma:
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2271-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1.01	20/08/2025	LOSA PLACA HUELLA	INVIAS 410	PROO+126-129 LOSA 43	6	21MPA	17,8 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
1.02	20/08/2025	REFORZADA MEZLCA ARGOS ESTRUCTURAL	INVIAS 410	PROO+126-129 LOSA 43	6	21MPA	19.0 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
2.01	22/08/2025	CUNETA L.D LOSA 44	INVIAS 410	PROO+127-130 LOSA 44	6	21MPA	18.8 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
2.02	22/08/2025	CUNETA L.D LOSA 44	INVIAS 410	PROO+127-130 LOSA 44	6	21MPA	17.1MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
3.01	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+111-114 LOSAS	6	21MPA	18.7 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
3.02	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+111-114 LOSAS	6	21MPA	17.4 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
4.01	27/08/2025	CUENA L.I LOSA 33-34-35	INVIAS 410	PROO+114-117 33-34-35	6	21MPA	10.8 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
4.02	27/08/2025	CUENA L.I LOSA 33-34-35	INVIAS 410	PROO+114-117 33-34-35	6	21MPA	11.4 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
5.01	28/08/2025	LOSA PLACA HUELLAS	INVIAS 410	PROO+084-087	6	21MPA	18.1 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
5.02	28/08/2025	LOSA PLACA HUELLAS	INVIAS 410	PROO+084-087	6	21MPA	17.3 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

EDGAR H. AVILA O.

Firma:
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Firma:
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2271 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.589.383,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.589.383,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO(INICIAL_)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	11	7	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	11	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES (INICIAL)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	31	3	2025	31	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	30	6	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.442,80	2	9	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.721,40	2	9	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.885,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034804

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008349 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7KSoTh4Z/NyegT97NvC93A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-0001

No. PÓLIZA	I-10003480	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146301	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.290-3
DIRECCIÓN	VDA SANTA BARBARA	TELÉFONO	3168560683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770680
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770680

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2271 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.051.442,80	17.496,94
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.025.721,40	8.844,61
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.102.885,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.180.049,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.341,55
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.341,55
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.004,89
TOTAL A PAGAR	$	31.346,44

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-180034804	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146381	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 889.002.298-3 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASFI

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034804** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañia en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

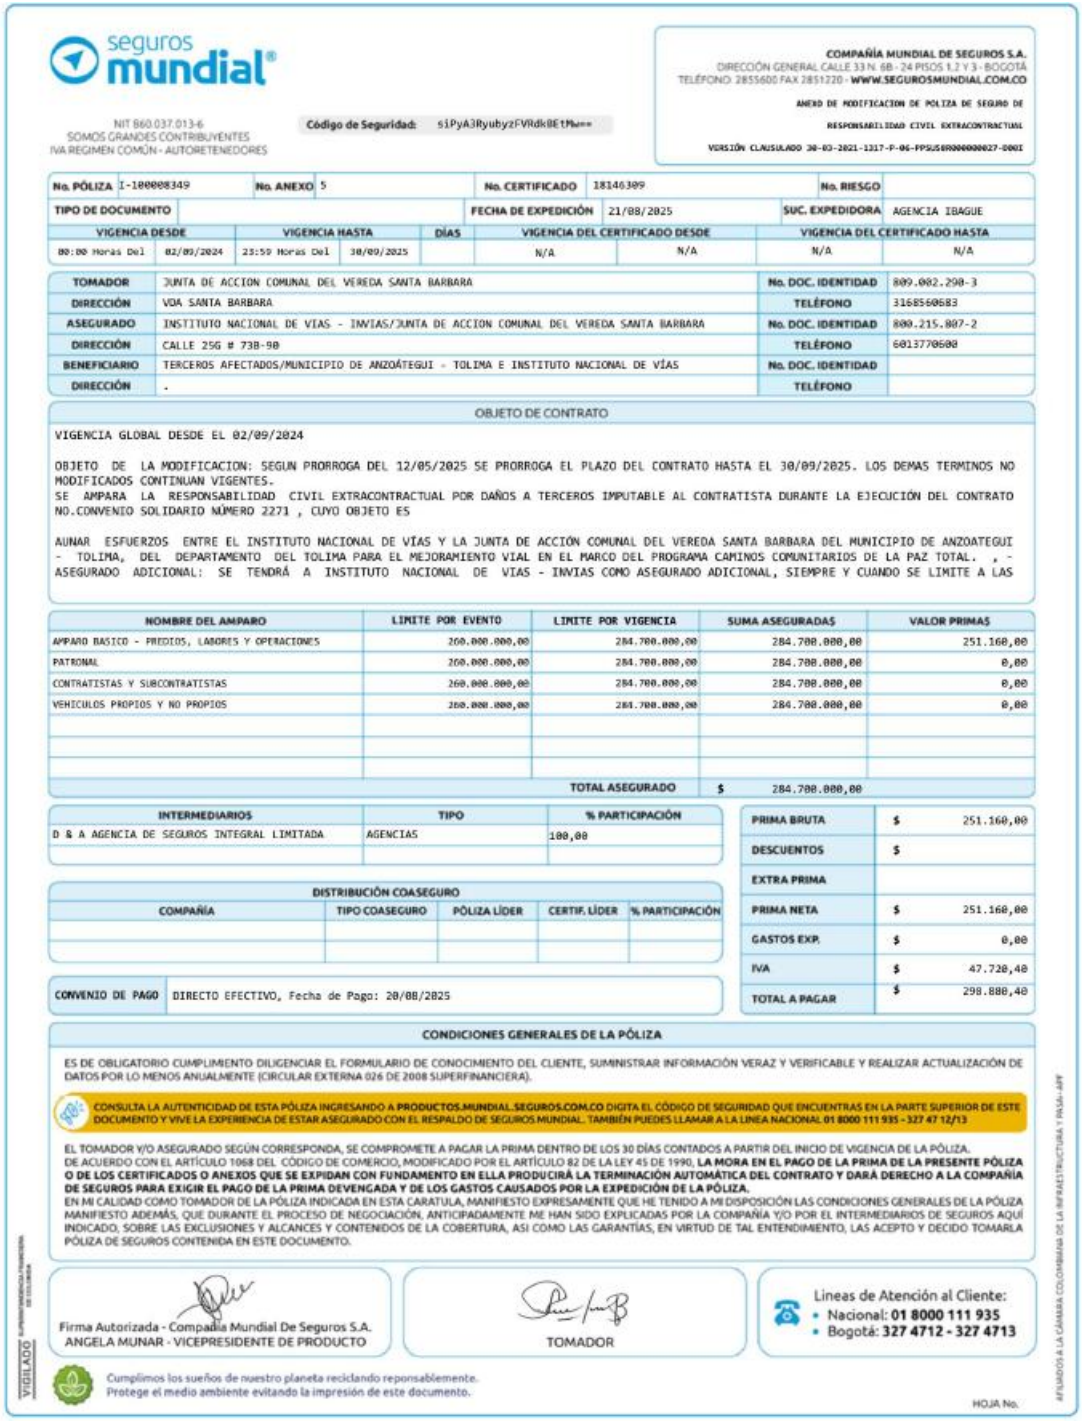

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: siPyA3Ryuby2FVRdk8EtPw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008349	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146389	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	23:59 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	809.002.290-3
DIRECCIÓN	VDA SANTA BARBARA	TELÉFONO	3168560683
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI - TOLIMA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2271 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	251.160,00
PATRONAL	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	251.160,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	251.160,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.728,40
TOTAL A PAGAR	$	298.888,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA-ART

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008349	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146309	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	23:59 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.002.290-3 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 11/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

JOYCO CII Centro de Investigación e Ingeniería — calidad en infraestructura	INFORME DE ENSAYO	FORMATO	FL31 - 11
	RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) (INV E – 142:2013)		


NOMBRE CLIENTE	CONSORCIO VIAL J.J.	INFORME ID No.	0001 - 0001 - 2025
DIRECCIÓN CLIENTE	MÓDULO T, LOCAL A04, ARKE CENTRO, IBAGUÉ TOLIMA	ORDEN INTERNA (OT) No.	0001
OBRA/PROYECTO	RED TERCIARIA DEL TOLIMA	FECHA DE ENTRADA MUESTRA	2025-08-22
CONTACTO	ING. HECTOR MIGUEL DIAZ	FECHA (S) DE ENSAYO (S)	2025-08-23
LOCALIZACIÓN	SUB BASE GRANULAR LA CAIMA	FECHA DE EMISIÓN	2025-08-24
MÉTODO DE ENSAYO	INV E 142:2013	MUESTRA No.	SB0 - 0001 - 2025
LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO	CARRERA 27 # 49 - 96 BARRIO PRADERA ALTA	FECHA DE MUESTREO	2025-08-20
CONDICIÓN DEL ITEM	SUB BASE GRANULAR	PLAN Y MÉTODO DE MUESTREO USADOS POR EL LABORATORIO U OTROS ORGANISMOS	NO REGISTRA
DESCRIPCIÓN MUESTRA	MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR, LA CAIMA ALVARADO TOLIMA		

Método de compactación	C	Peso del martillo (lbf)	10	Altura de caída (cm)	45,72	Diámetro molde (cm)	15,24
Peso unitario del agua a 20 °C (kN/m³)	9,789	No. de capas	5	Golpes por capa	56	Altura muestra (cm)	11,64
Método de preparación de la muestra	Seca	Tipo de martillo	Manual				

DETERMINACIÓN DEL ENSAYO						
Prueba	No.	1	2	3	4	
Molde	No.	1	2	3	4	
Masa del suelo húmedo + molde	g	10.753	11.079	11.209	11.153	
Masa del molde de compactación	g	6.050	6.050	6.050	6.050	
Masa del suelo compactado	g	4.703	5.029	5.159	5.103	
Volumen del molde	cm³	2.123	2.123	2.123	2.123	
Densidad húmeda	(g/cm³)	2,215	2,369	2,430	2,404	
Contenido de humedad	%	3,0	5,2	7,1	9,2	
Densidad seca	(g/cm³)	2,151	2,252	2,269	2,201	
Peso unitario seco	(kN/m³)	21,09	22,08	22,25	21,58	

CÁLCULO DE CONTENIDO DE HUMEDAD (% W)						
Recipiente	No.	1	2	3	4	
Masa recipiente+suelo húmedo	g	328,7	423,6	444,1	467,2	
Masa recipiente	g	66,7	64,2	65,1	63,3	
Masa recipiente + suelo seco	g	321,1	405,7	419,0	433,2	
Masa de agua	g	7,6	17,9	25,1	34,0	
Masa del suelo seco	g	254,4	341,5	353,9	369,9	
Contenido de humedad	%	3,0	5,2	7,1	9,2	

CURVA DE SATURACIÓN						
Humedad de saturación	%	8,3	6,2	5,8	7,2	---
Peso unitario seco	kN/m³	21,1	22,1	22,3	21,6	0,000

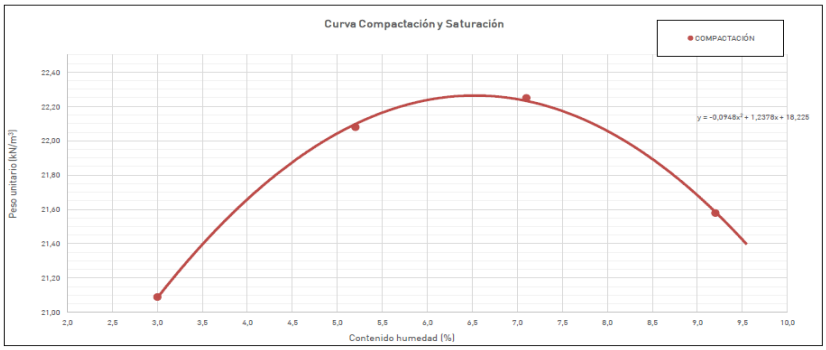

RELACIÓN PESO UNITARIO - HUMEDAD	
Gravedad Específica Ponderada	2,62
Peso unitario seco máximo (kN/m³)	22,27
Densidad Máxima (kg/m³)	2271
Humedad de laboratorio óptima (%)	6,5
P_{PG}: Porcentaje fracción gruesa (%)	26
P_{FE}: Porcentaje fracción de ensayo (%)	74
Peso unitario seco máximo corregido del material total, incluyendo las fracciones fina y de sobretamaños (kN/m³)	24,24
Humedad de laboratorio óptima corregida (%)	6,2

MODIFICACIONES AL INFORME: Este informe no presenta modificaciones.

ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES AL MÉTODO: Este informe no presenta adiciones, desviaciones o exclusiones al método de ensayo.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Los resultados del presente reporte corresponden especificamente a los items sometidos a ensayo.
2. Los resultados del presente informe sólo son válidos con la firma autorizada.
3. Los resultados del presente informe no deben ser reproducidos sin la debida autorización escrita de Joyco S.A.S. Excepto cuando se reproducen en su totalidad.
4. El laboratorio Joyco S.A.S. determina la incertidumbre de los ensayos realizados y se reporta cuando el cliente lo especifique en la solicitud de servicio.
5. La información marcada con [*] en el presente informe, fue proporcionada por el cliente y por lo tanto el laboratorio Joyco S.A.S. no es responsable de la misma.
6. Los resultados marcados con [**] en el presente informe provienen de proveedores externos.
7. El laboratorio Joyco S.A.S. no es responsable de la etapa de muestreo del ítem sometido a ensayo, por lo tanto, los resultados del presente informe se aplican a la muestra como se recibió.
8. El laboratorio Joyco S.A.S. proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma del ensayo realizado, cuando el cliente lo especifique en la solicitud de servicio; la cual contempla la incertidumbre de la medición estimada por el laboratorio.

INFORME APROBADO POR:

EDGAR FABIAN LIBERATO MELO
LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

Centro de Investigación e Ingeniería - Laboratorio Calarcá - Carrera 27 # 49 - 96, Celular: 3046468484, Calarcá - Colombia
Email: laboratorista.andino@joyco.com.co

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2271 – 2024 JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2271 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA **NIT** 809002290 3

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	DESEMBOLSO INCIAL		08/08/2024	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION DE OBRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.896.127,18	
5	ADMINISTRATIVOS		00/01/1900	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					132.670,00		132.670,00				132.670,00	197.763.457,18	
7	GASTOS BANCARIOS		00/01/1900	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.009,98		15.009,98				15.009,98	197.748.447,20	
5	ADMINISTRATIVOS		00/01/1900	extracto bancario			PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					326.406,14		326.406,14				326.406,14	197.422.041,06	
7	GASTOS BANCARIOS		00/01/1900	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.713,15		15.713,15				15.713,15	197.406.327,91	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18.720,17	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.425.048,08	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	901,28	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.425.949,36	
9	REINTEGROS FINANCIEROS	345.721,86	31/08/2025	extracto bancario			REINTEGROS FINANCIEROS	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.771.671,22	
7	GASTOS BANCARIOS		18/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					472.920,63		472.920,63				472.920,63	197.298.750,59	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		ACEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	G Y J FERRETERIAS S A	800130426				31.753.219,00		31.753.219,00				31.753.219,00	165.545.531,59	
2	MATERIALES		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		CEMENTO ARGOS 42,5KG	PROCEMENTOS GASTELBONDO BARRERA Y CIA	800049896				21.221.603,00		21.221.603,00				21.221.603,00	144.323.928,59	
3	TRANSPORTES		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		TRANSPORTE CEMENTO	LILIA RAQUEL MARTINEZ DE GASTELBONDO	20311310				2.024.550,00		2.024.550,00				2.024.550,00	142.299.378,59	
2	MATERIALES		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		TUBO DE CEMENTO REFORZADO 36"	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS	90166714 9				2.097.000,00		2.097.000,00				2.097.000,00	140.202.378,59	
5	ADMINISTRATIVOS		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	JULIAN STIVEN BARRETO PADILLA	1110575710				1.654.039,00		1.654.039,00				1.654.039,00	138.548.339,59	
5	ADMINISTRATIVOS		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		COMPRA VALLA	JUAN DIEGO GOMEZ MARIN	1234641040				200.000,00		200.000,00				200.000,00	138.348.339,59	
2	MATERIALES		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		COMPRA MATERIALES PETREOS	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA S.A.S.	900237153				16.338.391,00		16.338.391,00				16.338.391,00	122.009.948,59	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		ALQUILER DE EQUIPOS	FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS	901309862				9.180.711,00		9.180.711,00				9.180.711,00	112.829.237,59	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		18/07/2025		DESEMBOLSO #1		ALQUILER FORMALETA METALICA	LUZ HELIDA AVILA NAVARRETE	65729989				1.343.995,00		1.343.995,00				1.343.995,00	111.485.242,59	
3	TRANSPORTES		15/08/2025		DESEMBOLSO #2		TRASNPORTE JULIO GUTIERREZ						564.300,00		564.300,00				564.300,00	110.920.942,59	
2	MATERIALES		15/08/2025		DESEMBOLSO #2		MATERIALES COMPRA ELEMENTOS PLASTICO DUBERLEY SIERRA						140.000,00		140.000,00				140.000,00	110.780.942,59	
3	TRANSPORTES		15/08/2025		DESEMBOLSO #2		TRASNPORTE OSCAR JIMENEZ						247.500,00		247.500,00				247.500,00	110.533.442,59	
3	TRANSPORTES		15/08/2025		DESEMBOLSO #2		TRASNPORTE APERTURA CAJA MENOR GUILLERMO ARENAS						1.773.000,00		1.773.000,00				1.773.000,00	108.760.442,59	
7	GASTOS BANCARIOS		15/08/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					57.400,00		57.400,00				57.400,00	108.703.042,59	
5	ADMINISTRATIVOS		21/08/2025		DESEMBOLSO #3		DESEMBOLSO PAGO NOMINA BRANDON MENDIVELSO						402.573,00		402.573,00				402.573,00	108.300.469,59	
3	TRANSPORTES		21/08/2025		DESEMBOLSO #3		DESEMBOLSO TRASNPORTE RETROEX JOAQUIN SIERRA						4.406.400,00		4.406.400,00				4.406.400,00	103.894.069,59	
3	TRANSPORTES		21/08/2025		DESEMBOLSO #3		DESEMBOLSO TRASNPORTE VIBRO Y TUBERIA MAYRA MONSALVE						1.405.800,00		1.405.800,00				1.405.800,00	102.488.269,59	
5	ADMINISTRATIVOS		21/08/2025		DESEMBOLSO #3		DESEMBOLSO PAGO NOMINA JORGE GARZON						956.096,00		956.096,00				956.096,00	101.532.173,59	
2	MATERIALES		21/08/2025		DESEMBOLSO #3		DESEMBOLSO MATERIALES COMPRA MADERAS YURI APONTE						810.600,00		810.600,00				810.600,00	100.721.573,59	
7	GASTOS BANCARIOS		21/08/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					71.750,00		71.750,00				71.750,00	100.649.823,59	
2	MATERIALES		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO COMPRA MATERIALES ???						2.572.666,00		2.572.666,00				2.572.666,00	98.077.157,59	
5	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO PAGO NOMINA						553.523,00		553.523,00				553.523,00	97.523.634,59	
5	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO PAGO NOMINA						400.000,00		400.000,00				400.000,00	97.123.634,59	
5	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO PAGO NOMINA - LIQUIDACION MAURICIO ESCANDON						669.340,00		669.340,00				669.340,00	96.454.294,59	
3	TRANSPORTES		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO TRASNPORTE CAMA BAJA MAYRA MONSALVE						579.150,00		579.150,00				579.150,00	95.875.144,59	
2	MATERIALES		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO COMPRA MEDIO CERCO						350.000,00		350.000,00				350.000,00	95.525.144,59	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO ALQUILER VIBRO						2.880.000,00		2.880.000,00				2.880.000,00	92.645.144,59	
5	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO EXAMENES ELECTROCAR DIOGRAMA						147.000,00		147.000,00				147.000,00	92.498.144,59	
5	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025		DESEMBOLSO #4		DESEMBOLSO PAGO NOMINA						654.177,00		654.177,00				654.177,00	91.843.967,59	
7	GASTOS BANCARIOS		29/08/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					129.150,00		129.150,00				129.150,00	91.714.817,59	
															-				-	91.714.817,59	
													-		-				-	91.714.817,59	
															-				-	91.714.817,59	
															-				-	91.714.817,59	
TOTALES		365.343,31											106.546.652,90	-	106.546.652,90	-	-	-	106.546.652,90	-	

	EXTRACTO	91.714.858,51
DIF(EXTRAC-SALDO)	- 40,92	
	-	- 40,92
GASTOS BANCARIOS	258.300,00	
GASTOS BANCARIOS	258.340,92	
	-	
	-	
		-

SUBTOTALES

1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	45.157.925,00
2	MATERIALES	43.530.260,00
3	TRANSPORTES	11.000.700,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	6.095.824,14
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	761.943,76
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.621,45
9	REINTEGROS FINANCIEROS	345.721,86
TOTAL DE SUBTOTALES		**106.546.652,90**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2271 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29557 - 1 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.514.428,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA 809002290 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 132.670,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 326.406,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 3.077.376,96	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.896.127,18

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ 10.524.706,00	$ 7.286.400,00	$ 17.811.106,00	$ 3.188.894,00
2	MATERIALES	$ 116.226.961,20	$ 71.410.213,00	$ 3.873.266,00	$ 75.283.479,00	$ 40.943.482,20
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ 2.024.550,00	$ 2.796.750,00	$ 4.821.300,00	$ 25.178.700,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 3.635.709,00	$ 3.635.709,00	$ 17.364.291,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.133.533,98	$ 2.797.997,81	$ 1.831.676,86	$ 4.629.674,67	$ 503.859,31
6	PAGA	$ 4.535.632,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.535.632,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	
				$ -	$ -	
	TOTALES	$ 197.896.127,18	$ 86.757.466,81	$ 19.423.801,86	$ 106.181.268,67	$ 91.714.858,51

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 18.720,17

$ 901,28
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 19.621,45
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/08/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2271 - 2024** **EJECUTOR:** **JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 10.524.706,00	$ 7.286.400,00	$ 3.188.894,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 71.410.213,00	$ 3.873.266,00	$ 40.943.482,20	$ 116.226.961,20	59%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 2.024.550,00	$ 2.796.750,00	$ 25.178.700,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 3.635.709,00	$ 17.364.291,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 472.383,47	$ 2.325.614,34	$ 1.831.676,86	$ 503.859,31	$ 5.133.533,98	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.535.632,00	$ 4.535.632,00	2%
	TOTAL					**$ 197.896.127,18**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	**2306 - 2024**	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RAMIREZ GOMEZ	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$200.589.383	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	**DESDE**	**HASTA**
	20/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE	
CORREO ELECTRONICO	veredahatilloanzoategui@gmail.com	
CELULAR	3142058558	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadministrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO (4)

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EJ HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.058.938,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASCI		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.058.938,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS. *El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	4078 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.058.938,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					
*										

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.058.938,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Anzoátegui del departamento de Tolima en la vereda el Hatillo, en el corredor vial denominado Vereda El Hatillo entrada a la vereda la Unión que tiene una longitud de 0.30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Intersección vía secundaria donde inicia el corredor vial a intervenir hacia la vereda La Unión, comenzando por una pendiente superior al 10% , y punto final de referencia PR0+300 donde finaliza la proyección de la placa huella por ejecutar después de una curva pronunciada, esto conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Tolima del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	4076 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.589.383,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.589.383,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.589.383	$ 200.589.383		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.589.383,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.058.938,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.058.938,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.058.938,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

*

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TAL EMPLEOS GENERADOS:		
PLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
PLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
PLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

o se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

TA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

nal: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
as: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	8	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2306 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEL HATILLO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.589.383,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.589.383,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	11	7	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	11	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.058.938,30	2	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.029.469,15	2	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.117.876,60	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	11	7	2024	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008347 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:04:48 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: [illegible]

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 5082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU5240000000059-0001

No. PÓLIZA	I-100034802	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.759-0
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	TELÉFONO	3142858558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2306 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.058.938,30	23.658,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.029.469,15	11.829,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.117.876,68	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.206.284,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.487,84
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.487,84
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.742,69
TOTAL A PAGAR	$	42.230,53

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034882	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148383	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.759-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 11/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISGA - AIPF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034802** y endoso, 5 cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **11/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co

Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:06:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UprRycm+op+Nn0hUERRGFw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008347	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.759-0
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	**TELÉFONO**	3142858558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2306 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.790,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.790,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.590,10

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA: AMP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008347	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148549	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE; JC TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO JI; PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.001.759-8. Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 11/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 11/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA ARP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI 2306 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2306 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI **NIT** 809001759 0

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	197.970.674,82	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 325,31	31/03/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.971.000,13	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.627,32	30/04/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.972.627,45	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.680,79	31/05/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.974.308,24	
5	ADMINISTRATIVOS		13/06/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Poliza C y Ex)						630.245,23		630.245,23				630.245,23	197.344.063,01	
5	ADMINISTRATIVOS		13/06/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS (1X$14.350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	197.329.713,01	
5	ADMINISTRATIVOS		13/06/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 2.578,38		2.578,38				2.578,38	197.327.134,63	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.624,16	30/06/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.328.758,79	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.675,32	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.330.434,11	
9	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 2.578,38	13/06/2025	extracto bancario			REINTEGRO DEVOLUCION IMP FINANCIERO 4X1000								-				-	197.333.012,49	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.675,35	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
													-		-				-	197.334.687,84	
TOTALES		11.186,63											647.173,61	-	647.173,61	-	-	-	647.173,61	197.323.501,21	
																			EXTRACTO	197.334.687,84	
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	- 11.186,63	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	647.173,61
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.608,25
9	REINTEGROS FINANCIEROS	2.578,38
TOTAL DE SUBTOTALES		**647.173,61**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2306 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-795 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.589.383,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI NIT 809001759 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.708,18	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.618.708,18	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.970.674,82

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 114.946.840,24	$ -	$ -	$ -	$ 114.946.840,24
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.496.691,89	$ 643.591,35	$ 4.253,73	$ 647.845,08	$ 4.848.846,81
6	PAGA	$ 4.527.468,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.527.468,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 197.971.000,13	$ 643.591,35	$ 4.253,73	$ 647.845,08	$ 197.323.155,05

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 6.932,90

$ 1.675,35 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 8.608,25 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2306 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JAC DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 114.946.840,24	$ 114.946.840,24	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 641.916,03	$ 1.675,32	$ 4.253,73	$ 4.848.846,81	$ 5.496.691,89	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.527.468,00	$ 4.527.468,00	2%
	TOTAL					**$ 197.971.000,13**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA (5)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	2366 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.716.333
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	jacsantahelenaanzoategui@gmail.com
CELULAR	3223911395

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 comité operativo, inicio de obra lunes 04 de agosto en la vereda Santa Helena del Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 04 de agosto de 2025 firma acta de inicio Vereda Santa Helena del Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 05 de agosto de 2025 la JAC envía hoja de vida del maestro de obra para la Vereda Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 06 de agosto de 2025 la JAC de la Vereda Santa Helena del municipio de Anzoátegui Tolima envía documentos para desembolso #2.

El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfía Linda del Municipio de Casabianca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 12 de agosto de 2025 se envía control de calidad de materiales de construcción y prestación de diseño de mezcla por parte de la OAC de las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui Tolima.

El día 12 de agosto de 2025 solicitud autorización y firma para pagos de retención en la fuente, para las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui, La Planada Municipio de Venadillo junto a otros gastos como transporte, en cuanto a la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Casabianca se envían dos pagos que fueron rechazados por el Banco AVVILLAS

El día 12 de agosto de 2025 se envía una no conformidad de los tubos de concreto a la JAC de la Vereda Santa Helena del Municipio de Anzoátegui Tolima, por parte del Ingeniero Residente de Interventoría Edgar Ávila.

El día 14 de agosto de 2025 solicitud asociación de cuentas Vereda Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui y la Planada en el municipio Venadillo Departamento del Tolima.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría junto a la oac firman orden de inicio y recepcióna las cotizaciones necesarias para realizar los respectivos desembolsos para la compra de mteriales.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ANZOATEGUI-2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

(Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.124.250,77	16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28.331.048,78	14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.793.201,99	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.124.250,77	16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.331.048,78	14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.793.201,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (0,00)	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.793.202,00	1%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025

VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16%
Meta Física Ejecutada % 14%

Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	8%			0,08	5,6%
					Ejec	6%			0,06	4,2%
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	
TROMPO 1 BULTO	1	1
V IBRO DE CONCRETO	1	1
Total	6	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 118 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva) ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□	
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL: $ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.073.265,71	26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 50.676.664,71	25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 1.396.601,00	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.073.265,71	26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.676.664,71	25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 1.396.601,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.345.615,93	11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 26%
Meta Física Ejecutada % 25%
Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	23%			0,23	16,1%
					Ejec	22%			0,22	15,4%
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
VIRBRO PARA CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC, para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD	
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL: $ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.022.280,65	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70.229.078,66	35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.793.201,99	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.022.280,65	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.229.078,66	35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.793.201,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.552.413,95	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 37%
Meta Física Ejecutada % 35%
Avance o Atraso Físico % 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	38%			0,38	26,6%
					Ejec	36%			0,36	25,2%
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
VIBRO PARA CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ----------

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----------
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ----------

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ----------
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ----------
AVALUOS APROBADOS: ----------
PREDIOS ADQUIRIDOS: ----------

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se continua con instalación de subbase compactada.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huellla.
*Fundida en concreto para placa huella y cuneta .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella
*Fundida de placa huella en concreto y cuneta

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS□		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.971.295,59	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.178.093,60	46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.793.201,99	1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93.971.295,59	47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.178.093,60	46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 2.793.201,99	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47% — Avance o Atraso Físico % 1%
Meta Física Ejecutada % 46%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	53%			0,53	37,1%
					Ejec	51%			0,51	35,7%
* Alcantarilla	1				Prog					
*					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
VIBRO PARA CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 137 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Se continua con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Se continua con instalación de subbase compactada.
*Se realiza toma densidades a la sub base instalada
*Se realiza instalación y amarre de hierro para placa huellla.
*Se inicia actividad de fundida en concreto para placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella
*Fundida de placa huella en concreto.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar,el alcance meta física generado por INVIAS de 118 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Anzoátegui Tolima, ubicado en sector rural vereda Santa Helena, determinada como área de producción económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 20 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 118 m y 1 alcantarilla,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA NIT 809.001.758-3			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	NANCY BIATRIZ MORA VELANDIA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	2366 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.514.428,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.514.428,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.514.428	$ 199.514.428		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.514.428,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.920.310,53	58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114.920.310,53	58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.920.310,53	58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 114.920.310,53	58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.949.014,94	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.742.216,93	12%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 58%
Meta Física Ejecutada % 58%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog	68%			0,68	47,6%
					Ejec	68%			0,68	47,6%
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR 8 TON	1	1
CIZAYA	1	1
TRONZADORA	1	1
TROMPO 1 BULTO	1	1
VIBRO PARA CONCRETO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 130 ML y una alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se presenta por parte de la OAC. renuncia de su ing. residente, por lo cual envían una nueva hoja de vida para el cargo, la cual es revisada y aceptada por la interventoría.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE #¡VALOR! MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2366-2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL JJ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PULIDORA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO PARA CONCRETO			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA			MUNICIPIO ANZOATEGUI-VEREDA SANTA HELENA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO							6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL EN REPARACIÓN							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO							1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	74%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	26%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

EDGAR H. AVILA O.
Firma
Nombre: Edagar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

238

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 — **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 2271-2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOHN ALZATE	2717753	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x	JAC SANTA HELENA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	NUEVA EPS		$ 65.300	PORVENIR		$ 83.600	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
2	ALISANDER CASALLAS	14224249				JAC SANTA HELENA	$ 1.530.000,00	$ 106.500	V	NUEVA EPS		$ 191.300			$ -	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
3	RIGOBERTO CHARY	13975081				JAC SANTA HELENA	$ 1.091.350,00	$ 76.000	V	SALUD TOTAL		$ 136.500	PORVENIR		$ 174.700	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
4	MAURICIO ESCANDON	12448216				JAC SANTA HELENA	$ 450.000,00	$ 31.400	V	NUEVA EPS		$ 56.300	COLPENSIONES		$ 72.000	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
5	JORGE GARZON	13975083	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500		JAC SANTA HELENA	$ 1.233.700,00	$ 85.900	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 154.300	PORVENIR		$ 197.400	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
6	WIUBAR JIMENEZ	1067840611				JAC SANTA HELENA	$ 94.900,00	$ 6.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 11.900	PORVENIR		$ 15.200	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
7	BRANDON MENDIVELSO	1110088673	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500		JAC SANTA HELENA	$ 1.091.350,00	$ 76.000	V	SALUD TOTAL		$ 136.500	COLPENSIONES		$ 174.700	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
8	EDUIN PARRA	1007531141	OFICIAL	$ 1.800.000		JAC SANTA HELENA	$ 1.020.000,00	$ 71.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 127.500	PORVENIR		$ 163.200	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
9	JORGE RIOS	70252069	AYUDANTES DE OBRA	$ 1.423.500,00		JAC SANTA HELENA	$ 616.850,00	$ 43.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 77.200			$ -	COMFATOLIMA	$ 153.000	$ 229.900	
10	JOHAN QUINTERO	1088298392	INGENIERO RESIDENTE			JAC SANTA HELENA	$ 949.000,00	$ 66.100	V										
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los paaos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

EDGAR H. AVILA O.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: EDGAR AVILA
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

239

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2366-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: EDGAR H. AVILA O.
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

240

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2366-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
				A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA					
				B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
1	22/08/2025	SUBBASE GRANULAR	INV E 161	PROO+028 L.I	1	95%	96,2%	SI	CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DEL 95% DE COMPACTACION.
2	22/08/2025	SUBBASE GRANULAR	INV E 161	PROO+060 L.D	1	95%	95%	SI	CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DEL 95% DE COMPACTACION.
3	22/08/2025	SUBBASE GRANULAR	INV E 161	PROO+100 EJE	1	95%	96.5%	SI	CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DEL 95% DE COMPACTACION.
1.01	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+087-090	6	21 MPA	15.8 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
1.02	26/08/2025	LOSA PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+087-090	6	21 MPA	16.7 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
2.01	29/08/2025	LOSA 21 PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+060-063	6	21 MPA	14.1 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.
2.02	29/08/2025	LOSA 21 PLACA HUELLA REFORZADA	INVIAS 410	PROO+060-063	6	21 MPA	14.3 MPA	SI	ESTE DISEÑO DE MEZCLA SE FALLA A LOS 7 Y 28 DIAS.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

EDGAR H. AVILA O.

Firma:
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Firma:
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

241

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2366 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 06/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.716.333,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.716.333,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	16	7	2024	31	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.035.816,65	16	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	16	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	6	2025	30	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.071.633,30	2	9	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.035.816,65	2	9	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.143.266,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034908

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 284.700.000,00	2	9	2024	30	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008379 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o

Firma
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: zmMfqdbF7/RGwlI0Z5Bhvw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034908	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.758-3
DIRECCIÓN	FCA EL PROGRESA VDA SANTA HELENA	**TELÉFONO**	3223911395
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	**TELÉFONO**	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2366 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.071.633,30	17.514,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.035.816,65	8.853,51
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.143.266,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.250.716,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.368,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.368,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.009,93
TOTAL A PAGAR	$	31.378,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Nancy Mora V
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034908	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT.809.001.758-3 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 16/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 16/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034908** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2** , expedida por la Compañía en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co

Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA


JOYCO CII Centro de Investigación e Ingeniería — calidad en infraestructura	INFORME DE ENSAYO	FORMATO	FL31 - 11
	RELACIONES HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) (INV E – 142:2013)		

NOMBRE CLIENTE	CONSORCIO VIAL J.J.	INFORME ID No.	0001 - 0001 - 2025
DIRECCIÓN CLIENTE	MÓDULO T, LOCAL A04, ARKE CENTRO, IBAGUÉ TOLIMA	ORDEN INTERNA (OT) No.	0001
OBRA/PROYECTO	RED TERCIARIA DEL TOLIMA	FECHA DE ENTRADA MUESTRA	2025-08-22
CONTACTO	ING. HECTOR MIGUEL DIAZ	FECHA (S) DE ENSAYO (S)	2025-08-23
LOCALIZACIÓN	SUB BASE GRANULAR LA CAIMA	FECHA DE EMISIÓN	2025-08-24
MÉTODO DE ENSAYO	INV E 142:2013	MUESTRA No.	SBG - 0001 - 2025
LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO	CARRERA 27 # 49 - 96 BARRIO PRADERA ALTA	FECHA DE MUESTREO	2025-08-20
CONDICIÓN DEL ITEM	SUB BASE GRANULAR	PLAN Y MÉTODO DE MUESTREO USADOS POR EL LABORATORIO U OTROS ORGANISMOS	NO REGISTRA
DESCRIPCIÓN MUESTRA	MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR, LA CAIMA ALVARADO TOLIMA		

Método de compactación	C	Peso del martillo (lbf)	10	Altura de caída (cm)	45,72	Diámetro molde (cm)	15,24
Peso unitario del agua a 20 °C (kN/m³)	9,789	No. de capas	5	Golpes por capa	56	Altura muestra (cm)	11,64
Método de preparación de la muestra	Seca	Tipo de martillo	Manual				

DETERMINACIÓN DEL ENSAYO						
Prueba	No.	1	2	3	4	
Molde	No.	1	2	3	4	
Masa del suelo húmedo + molde	g	10.753	11.079	11.209	11.153	
Masa del molde de compactación	g	6.050	6.050	6.050	6.050	
Masa del suelo compactado	g	4.703	5.029	5.159	5.103	
Volumen del molde	cm³	2.123	2.123	2.123	2.123	
Densidad húmeda	(g/cm³)	2,215	2,369	2,430	2,404	
Contenido de humedad	%	3,0	5,2	7,1	9,2	
Densidad seca	(g/cm³)	2,151	2,252	2,269	2,201	
Peso unitario seco	(kN/m³)	21,09	22,08	22,25	21,58	
CÁLCULO DE CONTENIDO DE HUMEDAD (% W)						
Recipiente	No.	1	2	3	4	
Masa recipiente+suelo húmedo	g	328,7	423,6	444,1	467,2	
Masa recipiente	g	66,7	64,2	65,1	63,3	
Masa recipiente + suelo seco	g	321,1	405,7	419,0	433,2	
Masa de agua	g	7,6	17,9	25,1	34,0	
Masa del suelo seco	g	254,4	341,5	353,9	369,9	
Contenido de humedad	%	3,0	5,2	7,1	9,2	

CURVA DE SATURACIÓN						
Humedad de saturación	%	8,3	6,2	5,8	7,2	---
Peso unitario seco	kN/m³	21,1	22,1	22,3	21,6	0,000

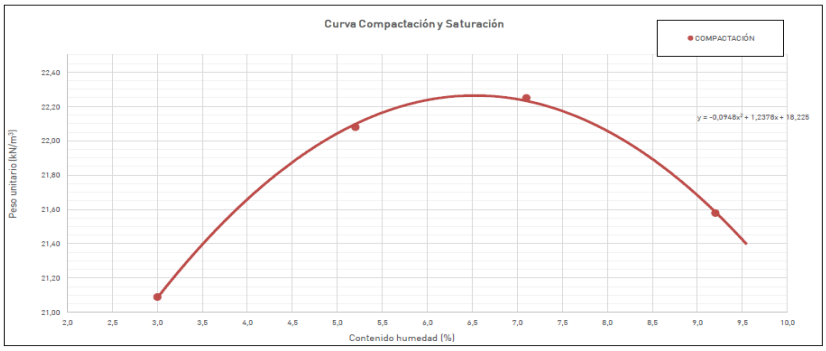

RELACIÓN PESO UNITARIO - HUMEDAD	
Gravedad Específica Ponderada	2,62
Peso unitario seco máximo (kN/m³)	22,27
Densidad Máxima (kg/m³)	2271
Humedad de laboratorio óptima (%)	6,5
P_{FG}: Porcentaje fracción gruesa (%)	26
P_{FE}: Porcentaje fracción de ensayo (%)	74
Peso unitario seco máximo corregido del material total, incluyendo las fracciones fina y de sobretamaños (kN/m³)	24,24
Humedad de laboratorio óptima corregida (%)	6,2

MODIFICACIONES AL INFORME: Este informe no presenta modificaciones.

ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES AL MÉTODO: Este informe no presenta adiciones, desviaciones o exclusiones al método de ensayo.

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Los resultados del presente reporte corresponden específicamente a los ítems sometidos a ensayo.
2. Los resultados del presente informe sólo son válidos con la firma autorizada.
3. Los resultados del presente informe no deben ser reproducidos sin la debida autorización escrita de Joyco S.A.S. Excepto cuando se reproducen en su totalidad.
4. El laboratorio Joyco S.A.S. determina la incertidumbre de los ensayos realizados y se reporta cuando el cliente lo especifique en la solicitud de servicio.
5. La información marcada con [*] en el presente informe, fue proporcionada por el cliente y por lo tanto el laboratorio Joyco S.A.S. no es responsable de la misma.
6. Los resultados marcados con [**] en el presente informe provienen de proveedores externos.
7. El laboratorio Joyco S.A.S. no es responsable de la etapa de muestreo del ítem sometido a ensayo, por lo tanto, los resultados del presente informe se aplican a la muestra como se recibió.
8. El laboratorio Joyco S.A.S. proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma del ensayo realizado, cuando el cliente lo especifique en la solicitud de servicio; la cual contempla la incertidumbre de la medición estimada por el laboratorio.

INFORME APROBADO POR:

EDGAR FABIAN LIBERATO MELO
LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

Centro de Investigación e Ingeniería - Laboratorio Calarcá - Carrera 27 # 49 - 96, Celular: 3046468484, Calarcá - Colombia
Email: laboratorista.andino@joyco.com.co

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ANZOATEGUI- 2366 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2366 - 2024 (Indicar número y año) — **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA — NIT 809001758_3

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	DESEMBOLSO INCIAL		08/08/2024	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION DE OBRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	198.113.486,85	
5	ADMINISTRATIVOS		31/03/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					150.645,00		150.645,00				150.645,00	197.962.841,85	
7	GASTOS BANCARIOS		31/03/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.009,98		15.009,98				15.009,98	197.947.831,87	
5	ADMINISTRATIVOS		31/05/2025	extracto bancario			PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					326.437,12		326.437,12				326.437,12	197.621.394,75	
7	GASTOS BANCARIOS		31/05/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.713,15		15.713,15				15.713,15	197.605.681,60	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.143,88	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.625.825,48	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.048,31	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.626.873,79	
9	REINTEGROS FINANCIEROS	293.492,49	31/08/2025	extracto bancario			REINTEGROS FINANCIEROS	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.920.366,28	
5	ADMINISTRATIVOS		17/07/2025				COMPRA VALLA	JUAN DIEGO GOMEZ					200.000,00		200.000,00				200.000,00	197.720.366,28	
2	MATERIALES		17/07/2025				COMPRA DE MADERA	JUAN CARLOS LONDOÑO					2.069.280,00		2.069.280,00				2.069.280,00	195.651.086,28	
5	ADMINISTRATIVOS		17/07/2025				COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	JULIAN BARRETO					1.654.039,00		1.654.039,00				1.654.039,00	193.997.047,28	
2	MATERIALES		17/07/2025				COMPRA DE MATERIALES PETREOS	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS					12.647.592,00		12.647.592,00				12.647.592,00	181.349.455,28	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		17/07/2025				ALQUILER FORMALETA	LUZ AVILA					1.343.995,00		1.343.995,00				1.343.995,00	180.005.460,28	
3	TRANSPORTES		17/07/2025				TRANSPORTE DE CEMENTO	LILIA MARTINEZ					1.588.950,00		1.588.950,00				1.588.950,00	178.416.510,28	
2	MATERIALES		17/07/2025				COMPRA TUBOS	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS					2.097.000,00		2.097.000,00				2.097.000,00	176.319.510,28	
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA		17/07/2025				ALQUILER DE EQUIPOS	FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS					9.180.711,00		9.180.711,00				9.180.711,00	167.138.799,28	
2	MATERIALES		17/07/2025				COMPRA ACEROS Y FERRETERIA	G Y J FERRETERIAS SA					25.286.688,00		25.286.688,00				25.286.688,00	141.852.111,28	
2	MATERIALES		17/07/2025				COMPRA DE CEMENTO	PROCEMENTOS CASTELBONDO BARRERA Y CIA					16.655.586,00		16.655.586,00				16.655.586,00	125.196.525,28	
7	GASTOS BANCARIOS		17/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					143.500,00		143.500,00				143.500,00	125.053.025,28	
3	TRANSPORTES		21/07/2025				TRASNPORTE MAQUINARIA	OSCAR JIMENEZ					247.500,00		247.500,00				247.500,00	124.805.525,28	
3	TRANSPORTES		21/07/2025				TRASNPORTE ACERO	JOHAN TOCORA					150.000,00		150.000,00				150.000,00	124.655.525,28	
2	MATERIALES		21/07/2025				COMPRA ELEMENTOS PLASTICOS	DUBERLEY SIERRA					140.000,00		140.000,00				140.000,00	124.515.525,28	
3	TRANSPORTES		21/07/2025				TRASNPORTE APERTURA CAJA MENOR Y RETENCION JULIO	NANCY MORA					1.319.000,00		1.319.000,00				1.319.000,00	123.196.525,28	
7	GASTOS BANCARIOS		21/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					57.400,00		57.400,00				57.400,00	123.139.125,28	
5	ADMINISTRATIVOS		29/07/2025				PAGO NOMINA	NANCY MORA					1.308.354,00		1.308.354,00				1.308.354,00	121.830.771,28	
5	ADMINISTRATIVOS		29/07/2025				PAGO NOMINA	JHON ARENAS					1.308.354,00		1.308.354,00				1.308.354,00	120.522.417,28	
5	ADMINISTRATIVOS		29/07/2025				PAGO NOMINA	JUAN PABLO RINCON					553.523,00		553.523,00				553.523,00	119.968.894,28	
5	ADMINISTRATIVOS		29/07/2025				PAGO NOMINA	NOEL ARIAS					1.520.933,00		1.520.933,00				1.520.933,00	118.447.961,28	
5	ADMINISTRATIVOS		29/07/2025				PAGO NOMINA	RUSBEL MONDRAGON					804.267,00		804.267,00				804.267,00	117.643.694,28	
7	GASTOS BANCARIOS		29/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					71.750,00		71.750,00				71.750,00	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
															-				-	117.571.944,28	
TOTALES		314.684,68											80.856.227,25	-	80.856.227,25	-	-	-	80.856.227,25	117.257.259,60	
																			EXTRACTO	117.279.426,61	22.167,01
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	292.517,67	
																				117.279.426,71	292.517,57
																			GASTOS BANCARIOS	-	-
																				-	974,82

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	10.524.706,00
2	MATERIALES	58.896.146,00
3	TRANSPORTES	3.305.450,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	7.826.552,12
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	303.373,13
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.192,19
9	REINTEGROS FINANCIEROS	293.492,49
TOTAL DE SUBTOTALES		**80.856.227,25**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

250

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2366 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29558-9 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.716.333,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNIIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA 809001758 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 132.670,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 326.406,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 3.077.376,96	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 198.098.032,18

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ 10.524.706,00	$ -	$ 10.524.706,00	$ 10.475.294,00
2	MATERIALES	$ 115.426.593,95	$ 58.756.146,00	$ 140.000,00	$ 58.896.146,00	$ 56.530.447,95
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ 1.588.950,00	$ 397.500,00	$ 1.986.450,00	$ 28.013.550,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 5.495.431,00	$ 5.495.431,00	$ 15.504.569,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.151.260,90	$ 2.777.718,04	$ 1.153.609,20	$ 3.931.327,24	$ 2.219.933,66
6	PAGA	$ 4.535.632,00	$ -		$ -	$ 4.535.632,00
7	POLIZAS	$ -	$ -			
		$ 198.113.486,85	$ 73.647.520,04	$ 7.186.540,20	$ 80.834.060,24	$ 117.279.426,61

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 19.095,57

$ 1.048,31
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 20.143,88
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/08/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2366 - 2024**
(Indicar número y año)

EJECUTOR: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024**
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 10.524.706,00	$ -	$ 10.475.294,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 58.756.146,00	$ 140.000,00	$ 56.530.447,95	$ 115.426.593,95	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 1.588.950,00	$ 397.500,00	$ 28.013.550,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 5.495.431,00	$ 15.504.569,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 490.086,96	$ 2.287.631,08	$ 1.153.609,20	$ 2.219.933,66	$ 6.151.260,90	3%
6	PAGA	$ -	$ -		$ 4.535.632,00	$ 4.535.632,00	2%
	TOTAL					**$ 198.113.486,85**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA (6)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	3372 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO DIAZ GUZMAN	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.563.028	
FECHA DE INICIO	27/09/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	**DESDE**	**HASTA**
	19/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 DE ABRIL 2025	
PRORROGA 1	**DESDE**	**HASTA**
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jac.lapradera.armero@gmail.com	
CELULAR	3160533440	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.156.302,80	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades. *

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.156.302,80	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025

VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva) ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	N/A $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.156.302,80	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	x
EMISIONES:	SI	NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	MAURICIO DÍAZ GUZMÁN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3372- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.563.028,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.563.028,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.156.302,80	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	x
EMISIONES:	SI	NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ..... N/A .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 28 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 29 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para las Veredas; El barro, Totarito, La Pradera, La Reforma y El Calabozo del CTO 3555-2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

(Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 139 m de placa huella y2 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Armero Guayabal del departamento de Tolima en la vereda Pradera, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda la pradera con la vía secundaria punto canales hacia la zona urbana que tiene una longitud de atención de 0,403 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en alcantarilla existente finca la primavera y el punto final de referencia es el PR0+403 en la entrada finca Álvaro Barrero,

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PRADERO DEL MUNICIPIO DE ARMERO- GUAYABAL - TOLIMA
INTEGRANTES: MAURICIO DÍAZ GUZMÁN
CONVENIO No.: 3372- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.563.028,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.563.028,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.563.028	$ 201.563.028		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.563.028,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.156.302,80	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.156.302,80	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.156.302,80	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES: el convenio no requiere licencia ambiental

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: el convenio no requiere adquisicion de predios


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Socializacion metodologia social

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3372 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.563.028,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.563.028,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.605,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.606,60	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	5	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.156.302,80	27	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.078.151,40	27	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.312.606,60	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036084
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008702 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

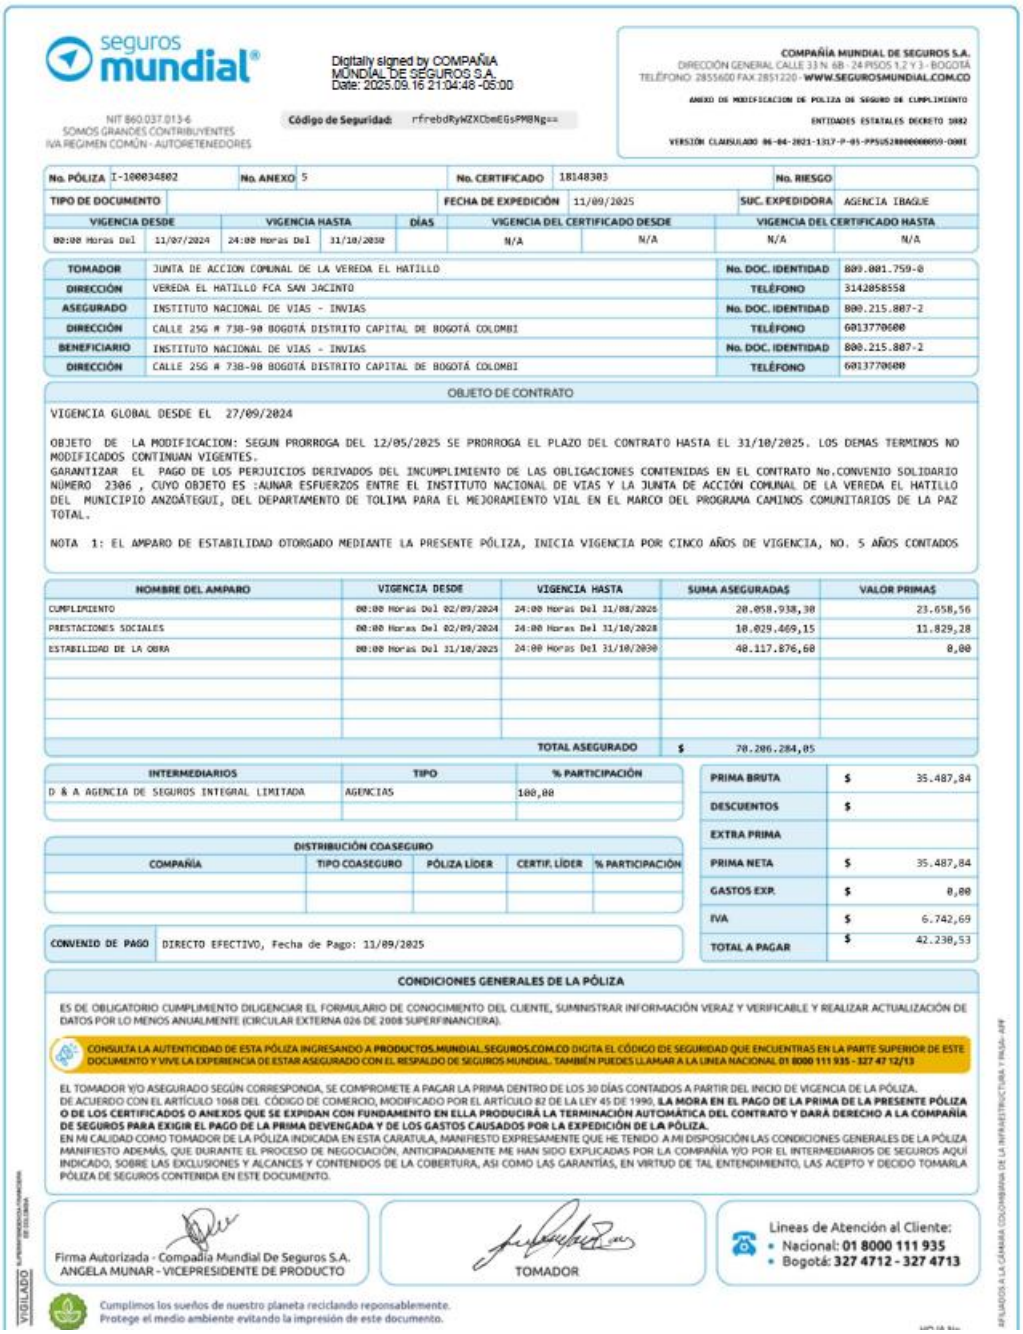

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:04:48 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU5280000000059-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: rfrebdRyWZXCbmEGsPMBNg==

No. PÓLIZA	I-100034802	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18148303	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.759-8
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	TELÉFONO	3142058558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2306 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.058.938,30	23.658,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.029.469,15	11.829,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.117.876,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.206.284,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	35.487,84
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	35.487,84
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.742,69
TOTAL A PAGAR	$	42.230,53

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA- AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036084	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148302	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809000547-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AMF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036084** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **11/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 21:06:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UprRycm+op+Nm0hUERRGFw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008347	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	18148549	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/09/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	**No. DOC. IDENTIDAD**	809.001.759-0
DIRECCIÓN	VEREDA EL HATILLO FCA SAN JACINTO	**TELÉFONO**	3142058558
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2306 , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI, DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	335.790,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	335.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	335.790,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	63.800,10
TOTAL A PAGAR	$	399.590,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOMETIDOS A LA CÁMARA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008702	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148548	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.000.547-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO ARMERO 3372-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3372 - 2024 (indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL NIT 809000547_1

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	199.094.685,11	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Poliza C y Ex)						431.581,50		431.581,50				431.581,50	198.663.103,61	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		GASTOS FINANCIEROS, (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	198.648.753,61	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 1.783,76		1.783,76				1.783,76	198.646.969,85	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.690,83	31/05/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.648.660,68	
9	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN	$ 215,02	31/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.648.875,70	
9	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN	$ 1.612,67	30/04/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.650.488,37	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.632,89	30/06/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.652.121,26	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.686,56	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.653.807,82	
9	REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	$ 1.783,76	20/05/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000								-				-	198.655.591,58	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.686,58	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.657.278,16	

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3372 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-795 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.563.028,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GUAYABAL NIT 809000547 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.468.342,89	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.468.342,89	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 199.094.685,11

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.938.968,11	$ -	$ -	$ -	$ 115.938.968,11
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.600.000,00	$ 444.258,41	$ 3.470,34	$ 447.728,75	$ 5.152.271,25
6	PAGA	$ 4.555.717,00	$ -		$ -	$ 4.555.717,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 199.094.685,11	$ 444.258,41	$ 3.470,34	$ 447.728,75	$ 198.646.956,36

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 6.837,97 $ 1.686,58
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 8.524,55
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3372 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PRADERA DEL MUNICIPO ARMERO GU

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PRADERA DEL MUNICIPIO ARMERO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555-2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 115.938.968,11	$ 115.938.968,11	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 442.571,85	$ 1.686,56	$ 3.470,34	$ 5.152.271,25	$ 5.600.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -		$ 4.555.717,00	$ 4.555.717,00	2%
	TOTAL					**$ 199.094.685,11**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA3359-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALOMA (7)

3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS.

CONVENIO	3359 - 2024	
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JORGE SICACHA PINZON	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.126.666	
FECHA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE 2024	
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	06 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CELULAR	3118850138	
CORREO ELECTRONICO	Jaclapaloma58@gmail.com	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.112.666,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MFPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 76202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda La Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.112.666,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 22 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 23 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para las Veredas, Los Alpes Cajamarca, La Paloma Cajamarca Tolima. *El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA
INTEGRANTES: JOSE JORGE SICACHA
CONVENIO No. 3359- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.126.666,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.126.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 08/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.112.666,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*No se registran actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.112.666,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 09/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 09/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 144 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda La paloma, en el corredor vial del tramo comprendido en la vía vereda la Paloma sector la "Guala" – Diamante que tiene una longitud de atención de 0,41 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en acceso finca el progreso y el punto final de referencia es el PR0+410 en alcantarilla existente en la finca el progreso parte baja

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOSE JORGE SICACHA			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3359- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.126.666,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.126.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.126.666	$ 201.126.666		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.126.666,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.112.666,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	20.112.666,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.112.666,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES: el convcenio no requiere la adquisicion d predios

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS. *El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	8	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3359 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PALOMA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.126.666,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.126.666,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.112.666,60	27	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.333,30	27	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.225.333,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036086

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 05/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008704 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 05/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.112.666,60	30	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.333,30	30	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.225.333,20	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100036086

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	30	9	2024	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263882-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:18:22 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 8+1594210qk8AyjNrHWPw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 6,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-0-05-PPSU520000000059-0001

No. PÓLIZA	I-100036086	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148065	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	No. DOC. IDENTIDAD	809.009.477-5
DIRECCIÓN	VDA LA PALOMA FCA EL ENCANTO	TELÉFONO	3118580138
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-50 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-50 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO 3359 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2025	20.112.666,60	29.700,62
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.056.333,30	14.753,88
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.225.333,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.394.333,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.454,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.454,50
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.446,36
TOTAL A PAGAR	$	52.900,86

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AIP

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036086	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148065	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 2: QUE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.009.477-5 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APORTES A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:19:29 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: B/IvB+RU3DM2IrERWT3wGw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000027-0001

No. PÓLIZA	1-100008704	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148556	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	No. DOC. IDENTIDAD	809.009.477-5
DIRECCIÓN	VDA LA PALOMA FCA EL ENCANTO	TELÉFONO	3118580138
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CAJAMARCA/INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 30/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3359 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	280.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.690,00
PATRONAL	280.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	280.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	280.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.690,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.690,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.051,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO


TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

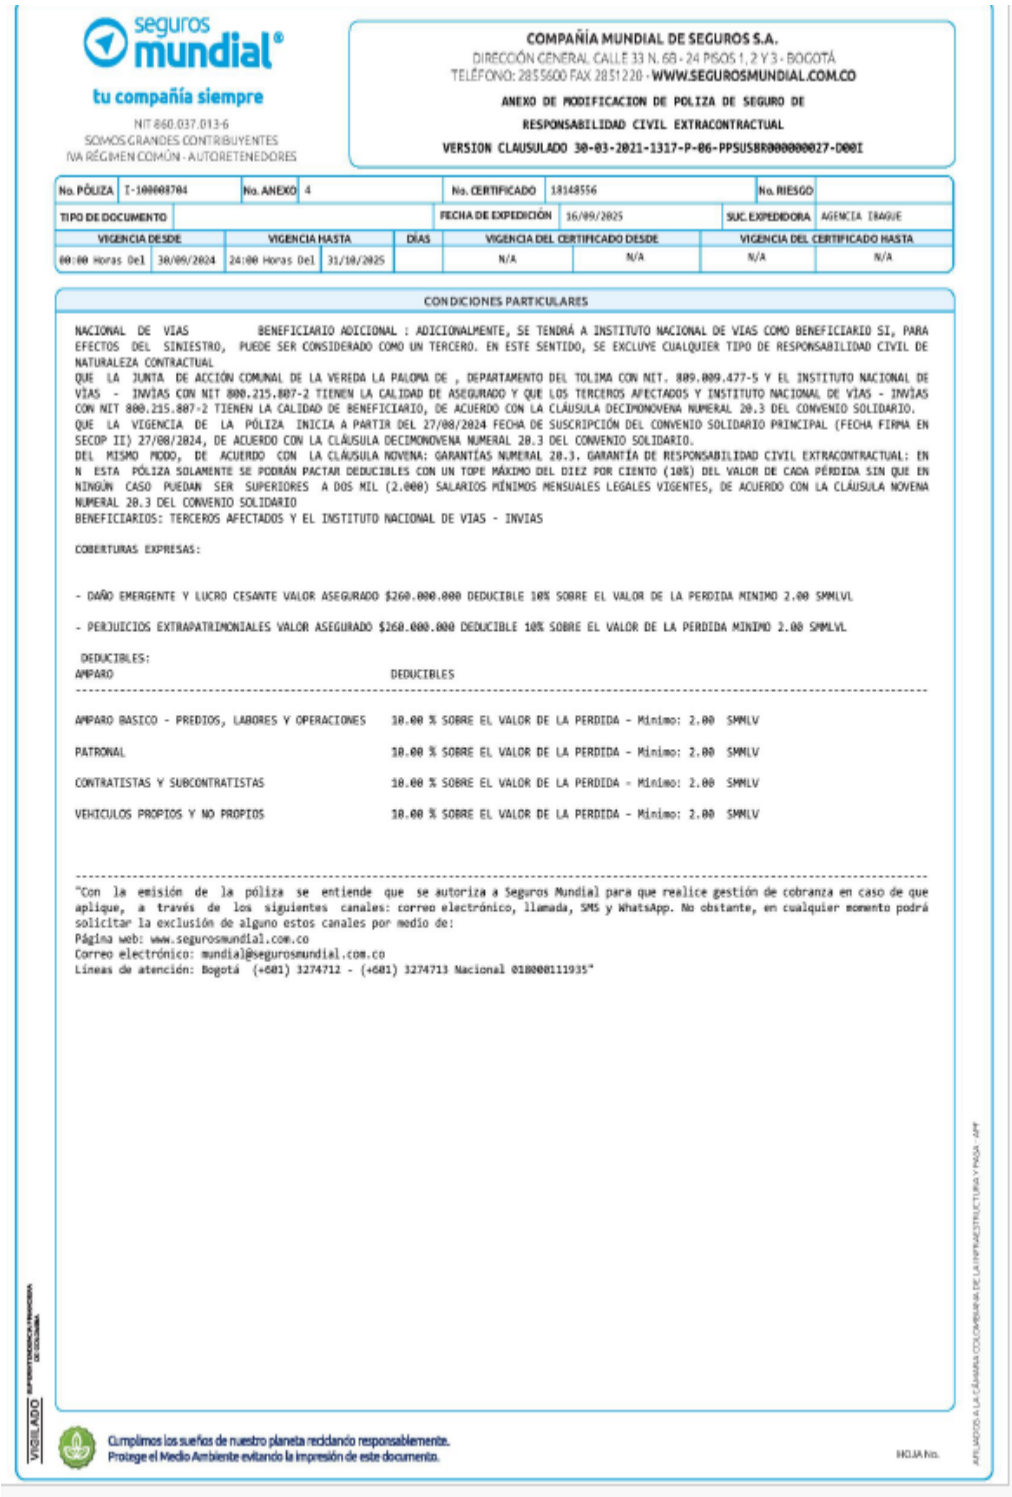

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008704	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148556	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DE , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.009.477-5 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACSA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1 (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3359 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PALOMA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Socialización metodologia social comunitaria , junto a seleccion proveedores. 2, Veeduria ciudadana para el proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
1. Presentación de asistentes OAC, Interventoria e INVIAS. 2. Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoria. 3, Aspectos area Tecnica. 4. Aspectos administrativos. 5. Aspectos area socioambiental. 6. Veeduria ciudadana y comité de participación ciudadana. 7. inquietudes o solicitudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión el día Sábado 23 de agosto del a la 2:00 pm
Se inicia la socialización con la bienvenida a cargo del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Señor (a) JOSE JORGE SICACHA PINZON, identificado con cedula N°. 6.007.866, agradeciendo la asistencia de las personas de la comunidad, así mismo, le da la palabra a la interventoría Consorcio Vial JJ.

1. Presentación de asistentes OAC, interventoría e INVIAS.

- Presidente de la Junta de Acción Comunal: JORGE SICACHA PINZON
- Director de la interventoría: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
- Ingeniero(a) residente: DIEGO FERNANDO SOLANILLA A.
- Contador (a): DERLY JOHANA SABOGAL CÉSPEDES

Contando con la asistencia de 13 personas.
Posteriormente se da lectura de la agenda con descripción del proyecto y del convenio.

2. Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoría.
Se expone que el CONVENIO 3359 - 2024, - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA, La iniciativa Caminos Comunitarios de la Paz Total, impulsada por el Gobierno Nacional de Colombia, busca mejorar la transitabilidad de las vías terciarias y caminos ancestrales, involucrando a las comunidades en la identificación de necesidades y la ejecución de obras. Su finalidad es fortalecer la conexión entre territorios, impulsar la economía rural, facilitar el acceso a servicios básicos y promover la participación ciudadana en la construcción de la paz.

3. Aspectos área técnica.
• Se tiene reconocimiento visual del área a intervenir, objeto de mejoramiento vial, en sistema constructivo placa huella.
• Se explica el sistema constructivo diseñado por los especialistas en pavimento y D. geométrico, indicando que el alcance proyectado sin contar con insumos técnicos de diseño no es viable, ya que la conformación de placa huella cuando existen ángulos de giro, pasa a abarcar en su mayor tramo una estructura de concreto rígido, lo cual conlleva a invertir mayor porcentaje de presupuesto, así mismo se indicó que otro motivo de disminución del alcance es que la proyección constructiva incluye tránsito para vehículos C2 y C3, lo cual genera que la subbase a extender tenga un espesor de 30 cm, situación que solo puede ser adquirida en canteras certificadas.
• Se exponen los diseños a la comunidad utilizando medio digital computadores, y celulares, que permiten interactuar con la comunidad y despejar sus dudas ante el sistema constructivo.

• Se exponen mecanismos para poder ampliar el alcance inicial planteado que inicialmente es de 144 ml con la construcción de una alcantarilla, siendo necesaria la gestión de la comunidad para que la alcaldía municipal los apoye prestándoles la maquinaria pesada, para las labores de excavación, cajeo y/o conformación de la vía.

4. Aspectos administrativos - previo a selección de proveedores

• Se entrega le indica a la veeduría y a la comunidad presente, que pueden apoyar al representante legal de la Organización de acción comunal, en el proceso de cotizaciones y que será de pleno conocimiento de la veeduría conformada previamente a esta visita, las cotizaciones presentadas a la interventoría.

5. Aspectos área socioambiental.
Plan de gestión social es el conjunto de actividades de información, atención a la comunidad y participación comunitaria, que se realizarán durante el inicio, la ejecución y cierre del Convenio Solidario.
Todas las actividades las realiza la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PALOMA, con el acompañamiento de la interventoría y la profesional social de la Dirección Territorial INVIAS.
Designación del Dignatario/a responsable de la gestión social durante el convenio Encargado de Liderar:
- Liderar la atención a PQRSF, la realización de socializaciones, y actividades con la comunidad en General.
- Proporcionar la información que requiera la interventoría en el desarrollo de actividades con la comunidad.
- Articularse con la interventoría inicio, Ejecución y Cierre del convenio.
- Manejar el buzón de PQRSF, ubicado en el lugar de fácil acceso de la comunidad.
- Atención oportuna a las soluciones que se realicen a la JAC.
- Convocatoria, Acta de reunión, listado de asistencia.
- Para la inauguración se puede realizar alguna de las siguientes actividades:
Olla comunitaria, Placa o valla comunitaria, Actividad deportiva, Muestra artística y cultural, Juntaza o Bazar, veeduría Ciudadana /Comité Participación Comunitaria.

Se deben tomar acciones y estrategias implementadas para minimizar el impacto negativo de la construcción en el medio ambiente. Esto implica la gestión de recursos, la prevención de la contaminación, la protección de la biodiversidad y la correcta disposición de residuos.

6. veeduría ciudadana y comité de participación ciudadana:
Se ratifica la veeduría en la VEREDA LA PALOMA del municipio de CAJAMARCA, Conformada en el marco del convenio con RESOLUCION N°. 46 conformada por:
CARGO ——— NOMBRE———— CEDULA ——— CEL.
- José Humberto Romero Sánchez – C.C. 4.564.844 - 3164278329
- Angel Osdualdo Carreño – C.C. 6.011.719 - 3124239122
- Maximiliano Carreño – C.C. 17.054.842 - 3204089112

Se realiza la descripción de la veeduría, es un sistema de control social que involucra a ciudadanos y organizaciones para supervisar la gestión pública y asegurar que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Las veedurías buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta inversión de los recursos públicos, cuyas funciones serán de:
- Vigilar procesos de planeación
- Vigilar la asignación de presupuestos
- Vigilar procesos de contratación-
- Fiscalizar la ejecución de obras e inversiones
- Recibir informes y sugerencias
- Solicitar información que permita verificar el cumplimiento
- Comunicar a la ciudadanía avances de procesos en desarrollo
- Remitir a las autoridades informes de control y vigilancia
- Denunciar hechos o actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

Se realiza la descripción de la veeduría, es un sistema de control social que involucra a ciudadanos y organizaciones para supervisar la gestión pública y asegurar que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Las veedurías buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta inversión de los recursos públicos, cuyas funciones serán de:
- Vigilar procesos de planeación
- Vigilar la asignación de presupuestos
- Vigilar procesos de contratación-
- Fiscalizar la ejecución de obras e inversiones
- Recibir informes y sugerencias
- Solicitar información que permita verificar el cumplimiento
- Comunicar a la ciudadanía avances de procesos en desarrollo
- Remitir a las autoridades informes de control y vigilancia
- Denunciar hechos o actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

Las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente:
-Retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.
-Solicitar beneficios o compensaciones por las funciones realizadas.
-Modificar o cambiar los objetivos o beneficiarios de los programas o proyectos.

7. inquietudes o solicitudes.
La interventoría resalta que es fundamental establecer un plan de divulgación, difusión con las veredas aledañas y empresas de transporte u otras instituciones que habiten, ocupen el paso por esta vía, ya que esta obra requiere un cierre total de la vía en el momento de la construcción de alcantarillas.
La interventoría reitera el PLAN DE INVERSION SOCIAL y la importancia de contar con una propuesta en la cual se puedan aplicar estos recursos; se resalta que debe ser con inmediatez. La comunidad manifiesta la instalación de un parque infantil en la escuela de la vereda.

8. OTROS
- AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRES: Se sugiere a la Junta de acción comunal realice tramite de permiso de servidumbres para la alcantarilla nueva, esto por ser nuevos pasos de conducción de agua con el fin de prevenir dificultades en el momento constructivo y posterior a este.
- MANEJO DE TRÁFICO: Se solicita comunicación por escrita y de diversos medios que permita dejar trazabilidad e implementar acciones mientras la obra se encuentra en ejecución, usualmente estas intervenciones generan incomodidades a las comunidades aledañas, por lo tanto, es fundamental estar al tanto todos los actores con el inicio y la ejecución del proyecto.

+

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2025 (Día / Mes / Año)

- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES: Se expone a la comunidad que estos materiales tienen una destinación específica para el proyecto por lo tanto todos debemos actuar como veedores para el cuidado y buen uso de estos, no es posible estos tomen otra destinación.
- CUENTA CONJUNTA Con el fin de dar claridad en cuanto al manejo del recurso, se informa a la comunidad que este presupuesto no está en el bolsillo del presidente de junta ni de los veedores, esto hace parte de una cuenta conjunta con el INVIAS, el cual tiene una destinación específica que no es diferente a cumplir el alcance del proyecto.
- PUNTO SAC Se establece la importancia en la elaboración de una cartelera con los correos electrónicos y números de contacto de los profesionales que intervienen a fin de dar claridad a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto. Se reitera que debe ser una cartelera en un lugar visible y debe contar con un buzón.
- PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL: Se deriva un compromiso y es el envío por parte de interventoría de un formato que facilite la formulación de la propuesta.
- SOCIALIZACION FINAL: Una vez el proyecto cumpla con un 95% de obra ejecutada se realiza la socialización final la cual se estima sea en celebración y oficialmente entrega a disfrute de la obra construida.
- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: Se expone a la comunidad asistente que los proyectos regularmente cuentan con un manual de mantenimiento el cual se espera la comunidad se apropie con el fin de dar una vida adecuada a la obra ejecutada y un mantenimiento a las alcantarillas de esta forma se garantiza la vida de lo realizado, resaltando el manejo adecuado de esta.

Se da por terminada la socialización siendo las 3:30 PM

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Envio del formato para el planteamiento de la propuesta del PIS		INTERVENTORIA
Elaboración e instalación de cartelera, buzon del punto de servicio de atención al ciudadano.		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)

NOTAS:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO	DIRECTOR	INTERVENTORIA - CONSORCIO VIAL JJ	
JOSE JORGE SICACHA PINZON	REPRESENTANTE LEGAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA	
JUAN PABLO BURITICÁ ARCILA	COMITE DE VEEDURIA	VEEDOR DE LA OBRA CIVIL PLACA HUELLA DE LA VEREDA LA PALOMA DE CAJAMARCA	

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3359 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3359 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA **NIT** 809009477 5

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	DESEMBOLSO INCIAL		14/08/2025	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	198.660.659,66	

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3355 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-803 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.139.384,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JJUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES NIT 800146951 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.466.074,44	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.466.074,44	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 198.673.309,56

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 116.117.592,56	$ -	$ -	$ -	$ 116.117.592,56
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.000.000,00	$ 444.124,00	$ 3.466,42	$ 447.590,42	$ 4.552.409,58
6	PAGA	$ 4.555.717,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.555.717,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 198.673.309,56	$ 444.124,00	$ 3.466,42	$ 447.590,42	$ 198.225.719,14

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 6.877,13 $ 1.683,01
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 8.560,14
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3359 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO CAJAMARCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 115.617.602,66	$ 115.617.602,66	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.410.615,00	$ 22.410.615,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ -	$ 109.617,00	$ 109.687,00	$ 5.390.383,00	$ 5.609.687,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.543.057,00	$ 4.543.057,00	2%
	TOTAL					**$ 199.180.961,66**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES (8)

3.1 INFORMACION ENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3355 - 2024	
OAC	UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ARIAS	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$201.139.384	
FECHA DE INICIO	27/09/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN 1	DESDE	HASTA
	21/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	18/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	06 DE MAYO 2025	06 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	jaccionveredalosalpes@gmail.com	
CELULAR	3214815769	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 08/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — calidad en infraestructura — Empresa con propósito
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUZ MIRA MURILLO BUSTOS			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	4047 - 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.903.527,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ -
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.903.527,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 Último Informe Semanal SI ❑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 196 m de placa huella y 2 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Alvarado del departamento del Tolima en la vereda El Barro, en el corredor vial que comunica la vereda El Barro al cruce de Anzoátegui, que tiene una longitud de atención de 2,0 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 en el cruce de Anzoátegui, y el punto final de referencia es PR 2+000 en el muro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial TOLIMA del Instituto Nacional de Vías. económica agropecuaria pequeña empresarial, donde el sector vial proyectado está situada a 21 km del casco urbano del municipio de Anzoátegui, con una longitud de 130 m y ,el proyecto involucra en responsabilidad de ejecución de obra civil a los Organismos de Acción Comunal, e igualmente en seguimiento y aprobación técnica por parte del Interventor Consorcio Vial JJ.

CONVENIO

CONTRATISTA: JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA EL BARRO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - TOLIMA
INTEGRANTES: LUZ MIRA MURILLO BUSTOS
CONVENIO No. 4047 - 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.903.527,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.903.527,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.903.527			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.903.527			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.903.527,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.090.352,70	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.090.352,70	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.090.352,70	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... — LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ..... NO ..... — LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

DISPONIBLE

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socializacion de inicio de Obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion



Socializacion



Scocializacion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 4/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 4/09/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA , DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta fisica generado por INVIAS de 165 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajamarca del departamento de Tolima en la vereda Los Alpes, en el corredor vial del tramo comprendido que conduce desde la vereda Altamira hasta la vereda los Alpes sector parte alta que tiene una longitud de atención de 0,51 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en finca san mateo y el punto final de referencia es el PR0+500 de la finca Victor Guerrero

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA		
INTEGRANTES:	FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ		
CONVENIO No.	3355- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.139.384,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	20/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.139.384,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	8/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.139.384			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.139.384			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.139.384,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.113.938,40	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.113.938,40	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.113.938,40	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.113.938,40	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.113.938,40	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.113.938,40	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA.	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3355 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.139.384,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.139.384,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	27 / 8 / 2024	31 / 10 / 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	27 / 8 / 2024	31 / 12 / 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31 / 12 / 2024	31 / 12 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27 / 8 / 2024	31 / 12 / 2024
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008703 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	27	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	27	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	5	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008703 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.113.938,40	12	5	2025	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.056.969,20	12	5	2025	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.227.876,80	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036085

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008703 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

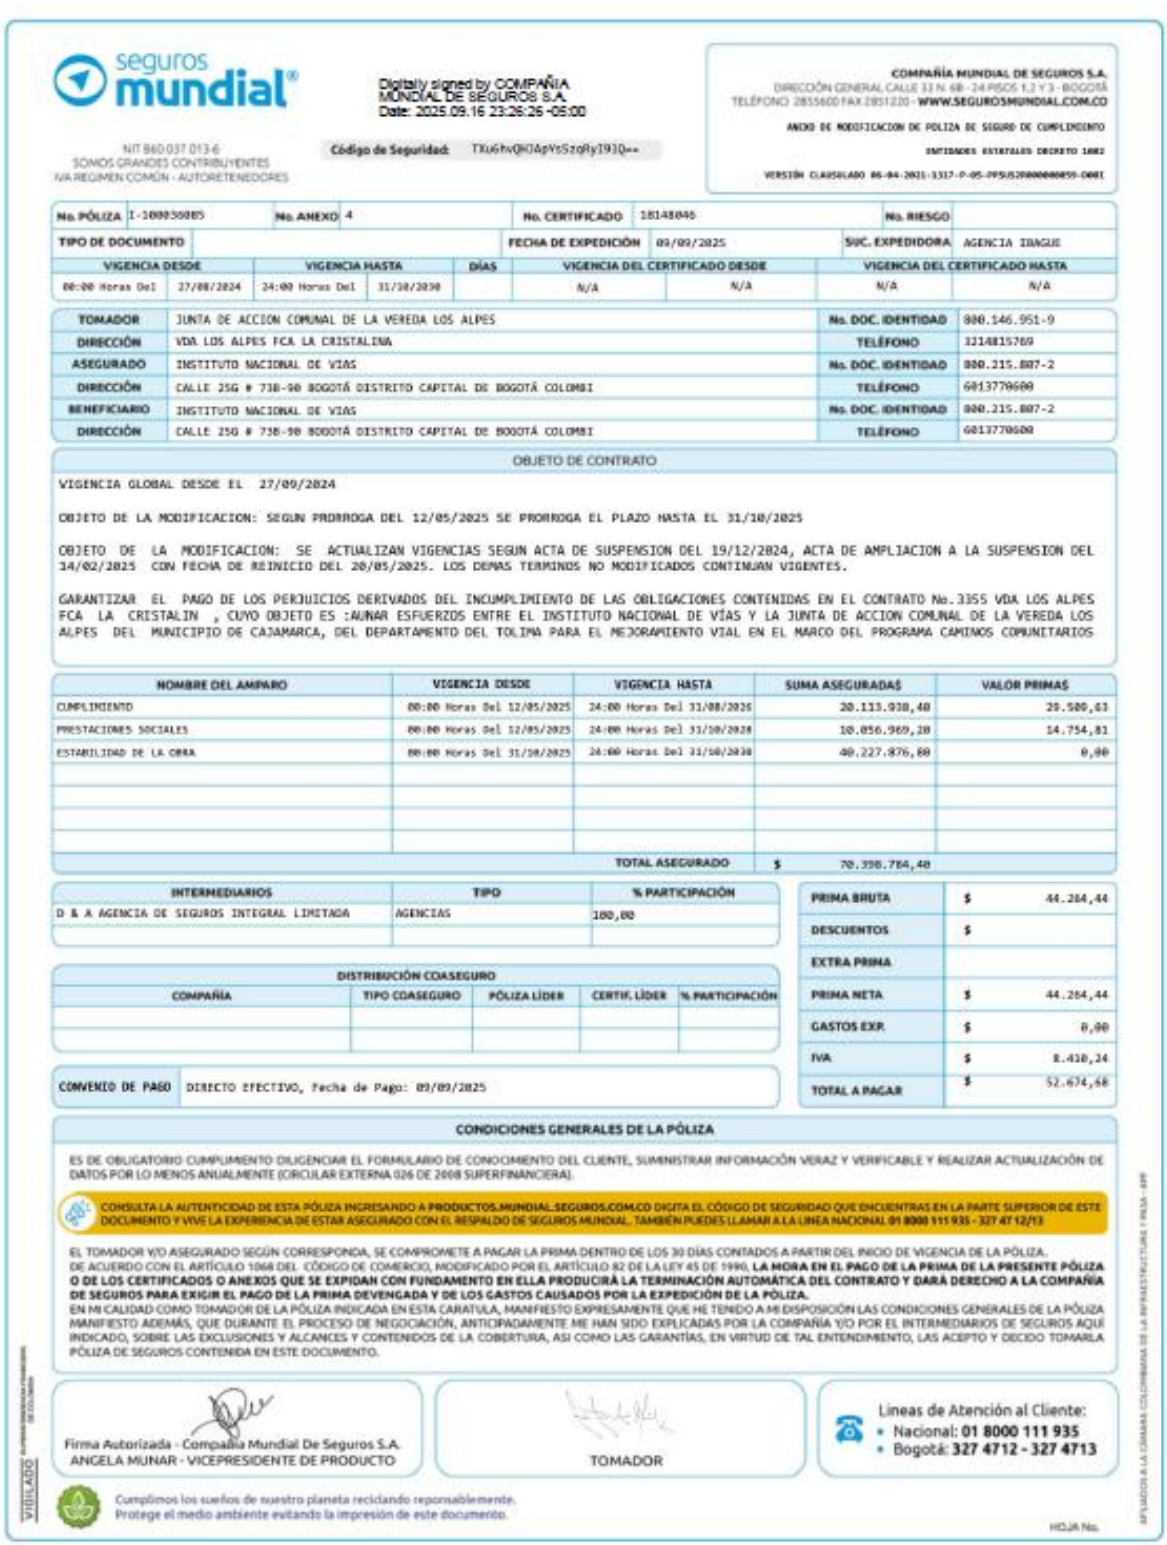

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:26:26 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: T3u6hvQkOApVsSzqRyI93Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU020000000859-0001

No. PÓLIZA	I-100056085	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148045	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.146.951-9
DIRECCIÓN	VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALINA	TELÉFONO	3214815769
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 19/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 28/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3355 VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALIN , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/08/2026	28.133.938,40	28.580,61
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.056.969,20	14.754,81
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.227.876,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 78.338.784,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.284,44
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.284,44
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.410,24
TOTAL A PAGAR	$	52.674,68

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036085	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148046	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800146951-9 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 27/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PICAZ - AIP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036085** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** , expedida por la Compañía en **09/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege al Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 23:30:29 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: I182VaUfSCLXsuDCJC2Hfw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-CODI

No. PÓLIZA	I-100008703	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148554	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.146.951-9
DIRECCIÓN	VDA LOS ALPES FCA LA CRISTALINA	TELÉFONO	3214815769
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADO/MUNICIPIO DE CAJAMARCA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 19/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 20/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3355 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.698,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.698,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.698,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.851,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA: AFP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-10000703	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148554	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. ,
- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 800.146.951-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 27/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 27/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AIP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/08/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 3355 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Socialización metodologia social comunitaria , junto a seleccion proveedores. 2, Veeduria ciudadana para el proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
1. Presentación de asistentes OAC, Interventoria e INVIAS. 2. Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoria. 3, Aspectos area Tecnica. 4. Aspectos administrativos. 5. Aspectos area socioambiental. 6. Veeduria ciudadana y comité de participación ciudadana. 7. inquietudes o solicitudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión el día Sábado 23 de agosto del a la 4:00 pm
Se inicia la socialización con la bienvenida a cargo del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Señor (a) FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ, identificado con cedula N°. 13.992.249, agradeciendo la asistencia de las personas de la comunidad, así mismo, le da la palabra a la interventoría Consorcio Vial JJ.

1. Presentación de asistentes OAC, interventoría e INVIAS.

- Presidente de la Junta de Acción Comunal: FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ
- Director de la interventoría: Víctor Hugo Sánchez Campuzano
- Ingeniero(a) residente: JUAN DAVID DIAZ SIERRA
- Contador (a): Diana Marcela Cardona A

Contando con la asistencia de 8 personas.
Posteriormente se da lectura de la agenda con descripción del proyecto y del convenio.

2. Generalidades del convenio solidario y contrato de interventoría.
Se expone que el CONVENIO 3355 - 2024, - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA, La iniciativa Caminos Comunitarios de la Paz Total, impulsada por el Gobierno Nacional de Colombia, busca mejorar la transitabilidad de las vías terciarias y caminos ancestrales, involucrando a las comunidades en la identificación de necesidades y la ejecución de obras. Su finalidad es fortalecer la conexión entre territorios, impulsar la economía rural, facilitar el acceso a servicios básicos y promover la participación ciudadana en la construcción de la paz.

3. Aspectos área técnica.
• Se tiene reconocimiento visual del área a intervenir, objeto de mejoramiento vial, en sistema constructivo placa huella.
• Se explica el sistema constructivo diseñado por los especialistas en pavimento y D. geométrico, indicando que el alcance proyectado sin contar con insumos técnicos de diseño no es viable, ya que la conformación de placa huella cuando existen ángulos de giro, pasa a abarcar en su mayor tramo una estructura de concreto rígido, lo cual conlleva a invertir mayor porcentaje de presupuesto, así mismo se indicó que otro motivo de disminución del alcance es que la proyección constructiva incluye tránsito para vehículos C2 y C3, lo cual genera que la subbase a extender tenga un espesor de 30 cm, situación que solo puede ser adquirida en canteras certificadas.
• Se exponen los diseños a la comunidad utilizando medio digital computadores, y celulares, que permiten interactuar con la comunidad y despejar sus dudas ante el sistema constructivo.

• Se exponen mecanismos para poder ampliar el alcance inicial planteado que inicialmente es de 165 ml con la construcción de una alcantarilla, siendo necesaria la gestión de la comunidad para que la alcaldía municipal los apoye prestándoles la maquinaria pesada, para las labores de excavación, cajeo y/o conformación de la vía.

4. Aspectos administrativos - previo a selección de proveedores

• Se entrega le indica a la veeduría y a la comunidad presente, que pueden apoyar al representante legal de la Organización de acción comunal, en el proceso de cotizaciones y que será de pleno conocimiento de la veeduría conformada previamente a esta visita, las cotizaciones presentadas a la interventoría.

5. Aspectos área socioambiental.
Plan de gestión social es el conjunto de actividades de información, atención a la comunidad y participación comunitaria, que se realizarán durante el inicio, la ejecución y cierre del Convenio Solidario.
Todas las actividades las realiza la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES, con el acompañamiento de la interventoría y la profesional social de la Dirección Territorial INVIAS.
Designación del Dignatario/a responsable de la gestión social durante el convenio Encargado de Liderar:
- Liderar la atención a PQRSF, la realización de socializaciones, y actividades con la comunidad en General.
- Proporcionar la información que requiera la interventoría en el desarrollo de actividades con la comunidad.
- Articularse con la interventoría inicio, Ejecución y Cierre del convenio.
- Manejar el buzón de PQRSF, ubicado en el lugar de fácil acceso de la comunidad.
- Atención oportuna a las soluciones que se realicen a la JAC.
- Convocatoria, Acta de reunión, listado de asistencia.
- Para la inauguración se puede realizar alguna de las siguientes actividades:
Olla comunitaria, Placa o valla comunitaria, Actividad deportiva, Muestra artística y cultural, Juntaza o Bazar, veeduría Ciudadana /Comité Participación Comunitaria.

Se deben tomar acciones y estrategias implementadas para minimizar el impacto negativo de la construcción en el medio ambiente. Esto implica la gestión de recursos, la prevención de la contaminación, la protección de la biodiversidad y la correcta disposición de residuos.

6. veeduría ciudadana y comité de participación ciudadana:
Se ratifica que el comité participativo comunitario en la VEREDA LOS ALPES del municipio de CAJAMARCA, Conformada en el marco del convenio por:
CARGO ——— NOMBRE———— CEDULA ——— CEL.
- Diana Marcela Bogotá – C.C. 1.110.458.828
- Wilson Eduardo Palacio Tamayo – C.C. 1.035.830.748
- Engracia León Palencia – C.C. 24.129.950
- Nelson Enrique Ángel León – CC. 1.105.611.520
- Senén Ángel Lagos – CC. 4.266.060

Se realiza la descripción de la veeduría, es un sistema de control social que involucra a ciudadanos y organizaciones para supervisar la gestión pública y asegurar que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Las veedurías buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta inversión de los recursos públicos, cuyas funciones serán de:
- Vigilar procesos de planeación
- Vigilar la asignación de presupuestos
- Vigilar procesos de contratación-
- Fiscalizar la ejecución de obras e inversiones
- Recibir informes y sugerencias
- Solicitar información que permita verificar el cumplimiento
- Comunicar a la ciudadanía avances de procesos en desarrollo
- Remitir a las autoridades informes de control y vigilancia
- Denunciar hechos o actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

Las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente:
-Retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.
-Solicitar beneficios o compensaciones por las funciones realizadas.
-Modificar o cambiar los objetivos o beneficiarios de los programas o proyectos.

7. inquietudes o solicitudes.
La interventoría resalta que es fundamental establecer un plan de divulgación, difusión con las veredas aledañas y empresas de transporte u otras instituciones que habiten, ocupen el paso por esta vía, ya que esta obra requiere un cierre total de la vía en el momento de la construcción de alcantarillas.
La interventoría reitera el PLAN DE INVERSION SOCIAL y la importancia de contar con una propuesta en la cual se puedan aplicar estos recursos; se resalta que debe ser con inmediatez. La comunidad manifiesta la instalación de un parque infantil en la escuela de la vereda.

8. OTROS
- AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRES: Se sugiere a la Junta de acción comunal realice tramite de permiso de servidumbres para la alcantarilla nueva, esto por ser nuevos pasos de conducción de agua con el fin de prevenir dificultades en el momento constructivo y posterior a este.
- MANEJO DE TRÁFICO: Se solicita comunicación por escrita y de diversos medios que permita dejar trazabilidad e implementar acciones mientras la obra se encuentra en

FECHA 23/08/2025 (Día / Mes / Año)

ejecución, usualmente estas intervenciones generan incomodidades a las comunidades aledañas, por lo tanto, es fundamental estar al tanto todos los actores con el inicio y la ejecución del proyecto.
- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES: Se expone a la comunidad que estos materiales tienen una destinación específica para el proyecto por lo tanto todos debemos actuar como veedores para el cuidado y buen uso de estos, no es posible estos tomen otra destinación.
- CUENTA CONJUNTA Con el fin de dar claridad en cuanto al manejo del recurso, se informa a la comunidad que este presupuesto no está en el bolsillo del presidente de junta ni de los veedores, esto hace parte de una cuenta conjunta con el INVIAS, el cual tiene una destinación específica que no es diferente a cumplir el alcance del proyecto.
- PUNTO SAC Se establece la importancia en la elaboración de una cartelera con los correos electrónicos y números de contacto de los profesionales que intervienen a fin de dar claridad a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto. Se reitera que debe ser una cartelera en un lugar visible y debe contar con un buzón.
- PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL: Se deriva un compromiso y es el envío por parte de interventoría de un formato que facilite la formulación de la propuesta.
- SOCIALIZACION FINAL: Una vez el proyecto cumpla con un 95% de obra ejecutada se realiza la socialización final la cual se estima sea en celebración y oficialmente entrega a disfrute de la obra construida.
- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: Se expone a la comunidad asistente que los proyectos regularmente cuentan con un manual de mantenimiento el cual se espera la comunidad se apropie con el fin de dar una vida adecuada a la obra ejecutada y un mantenimiento a las alcantarillas de esta forma se garantiza la vida de lo realizado, resaltando el manejo adecuado de esta.

Se da por terminada la socialización siendo las 5:30 PM

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Envio del formato para el planteamiento de la propuesta del PIS		INTERVENTORIA
Elaboración e instalación de cartelera, buzon del punto de servicio de atención al ciudadano.		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)

NOTAS:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO	DIRECTOR	INTERVENTORIA - CONSORCIO VIAL JJ	
FRANCISCO JAVIER ARIAS MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA	
Diana Marcela Bogotá	COMITE DE VEEDURIA	VEEDOR DE LA OBRA CIVIL PLACA HUELLA DE LA VEREDA LOS ALPES DE CAJAMARCA	

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CAJAMARCA 3355 – 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3355 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES **NIT** 800146951 9

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3						-				-	198.673.309,56	
	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025				DB Transferencia (Poliza C y Ex)						431.501,76		431.501,76				431.501,76	198.241.807,80	
	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025				GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	198.227.457,80	
	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025				GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 1.783,41		1.783,41				1.783,41	198.225.674,39	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.687,25	31/05/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.227.361,64	
	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 268,21	31/03/2025				REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.227.629,85	
	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 1.609,26	30/04/2025				REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.229.239,11	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.629,43	30/06/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.230.868,54	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.682,98	31/07/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.232.551,52	
	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 1.783,41	20/05/2025				REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000								-				-	198.234.334,93	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.683,01	31/08/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	198.236.017,94	

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3359 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 366070001958 **BANCO** BANCO AGRARIO SUCURSAL: BANCO AGRARIO
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.126.666,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JJUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA NIT 809009477 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.466.006,34	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.466.006,34	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 198.660.659,66

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.617.602,66	$ -	$ -	$ -	$ 115.617.602,66
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.410.615,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.410.615,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.609.687,00	$ 109.617,00	$ 109.687,00	$ 219.304,00	$ 5.390.383,00
6	PAGA	$ 4.543.057,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.543.057,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 199.180.961,66	$ 109.617,00	$ 109.687,00	$ 219.304,00	$ 198.961.657,66

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 879.440,00
$ 117.971,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 997.411,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/08/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3355 - 2024** **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALPES DEL MUNICIPIO CAJAMARCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 116.117.592,56	$ 116.117.592,56	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 442.441,02	$ 1.682,98	$ 3.466,42	$ 4.552.409,58	$ 5.000.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.555.717,00	$ 4.555.717,00	2%
	TOTAL					**$ 198.673.309,56**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE (9)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2121 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	AMIRO CELIS ALVAREZ
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.513.076
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PRORROGA 3	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	jacveredahoyocaliente@gmail.com
CELULAR	3202655689.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 07 de agosto de 2025 la JAC de la Vereda Hoyo Caliente del Municipio de Casabianca Tolima envía hoja de vida del ingeniero residente.

El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfía Linda del Municipio de Casabianca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 22 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC Vereda Hoyo Caliente convenio 2121-2024.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

El día 25 de agosto de 2025 se envía autorización de firmas para aprobación de desembolsos a las Veredas, Hoyo caliente, Llano de la Virgen y Cuatromil.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

EL periodo de junio es comprendido en 4 semanas desde el día4 de julio hasta el día 31 de julio 2025

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4
INTEGRANTES: RAMIRO CELIS ALVAREZ
CONVENIO No.: 2121 de 2024 — VALOR INICIAL: 199,513,076.00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: 199,513,076.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.124.039,86	16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.537.673,73	13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.124.039,86	16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.537.673,73	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.124.039,86	16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.537.673,73	13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16% — Avance o Atraso Físico %: 3%
Meta Física Ejecutada %: 13%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	8%			0,08	5,6%
					Ejec	4%			0,04	2,8%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 110 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa firma de acta de inicio 8 de agosto del 2025.
*Se programa continuar con el corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Amarre de hierro longitudinal placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ

(Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS ☐
CONVENIO No.	2121 de 2024	CONTRATO No.	3555 DE 2024
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	FECHA DE INICIO:	02/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025
VALOR INICIAL:	$ 199,513,076.00	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	VALOR ACUMULADO:	$ -
		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.072.912,84	26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.883.138,24	24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.072.912,84	26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.883.138,24	24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.948.872,98	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.759.098,38	8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 26% — Avance o Atraso Físico % 2%
Meta Física Ejecutada % 24%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base — Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	23%			0,23	16,1%
					Ejec	20%			0,2	14,0%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción					Equipo Mínimo		Total Disponible
VOLQUETA					1		
EQUIPO DE TOPOGRAFIA					1		
Total					2		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 110 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC, para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC. *Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal. *Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor, *Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera. *Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70262 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.021.785,82	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 68.832.011,22	35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.021.785,82	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.832.011,22	35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.897.745,96	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.707.971,36	8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37%
Meta Física Ejecutada %: 35%
Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector	1	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%				1	10,0%
					Ejec	100%				1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	38%				0,38	26,6%
					Ejec	35%				0,35	24,5%
* ALCANTARILLAS	1				Prog						
					Ejec						
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto 100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 110 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC, para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Entrega de diseño de mezcla

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.970.658,80	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82.797.926,54	42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93.970.658,80	47%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.797.926,54	42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.846.618,94	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 51.673.886,68	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025

PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 47% — Avance o Atraso Físico %: 6%
Meta Física Ejecutada %: 42%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	53%			0,53	37,1%
					Ejec	45%			0,45	31,5%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo		Total Disponible
VOLQUETA	1		
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1		
Total	2		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	X

OBSERVACIONES:: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 110 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC, para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del representante legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 110 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Hoyo Caliente, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4
INTEGRANTES: RAMIRO CELIS ALVAREZ
CONVENIO No.: 2121 de 2024 — VALOR INICIAL: 199,513,076.00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: 199,513,076.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO: 02/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO: 199,513,076.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 114.919.531,78 — 58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 100.953.616,46 — 51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 114.919.531,78 — 58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 100.953.616,46 — 51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 83.795.491,92 — 11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 69.829.576,60 — 4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 525.364.579,00 — 26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 525.364.579,00 — 26,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 26.456.869,20 — 1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 26.456.869,20 — 1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58% — Avance o Atraso Físico %: 7%
Meta Física Ejecutada %: 51%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	68%			0,68	47,6%
					Ejec	58%			0,58	40,6%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1	
MEZCLADORA 1 BULTO	1	
Total	3	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
* Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones
comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra, en cuanto al alcance el INVIAS propuso mediante una visita un soporte presupuestal con corte al año 2024 la construcción de 110 ML y 1 alcantarilla, en fecha actual julio del 2025.
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados, es de recalcar que sin la firma de este documento no se podrá afiliar el personal.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2121-2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL JJ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA		1 1/2	MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PULIDORA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO PARA CONCRETO			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MARTILLO DEMOLEDOR			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CORTADORA CONCRETO			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA HOYOCALIENTE								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TOTAL ACTIVO											9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL EN REPARACIÓN											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO											0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	89%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	11%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA RETROEXCAVADORA Y EL VIBROCOMPACTADOR FUERON PRESTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:Diego Alejandro Suarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-318156 CND

EDGAR H. AVILA O.
Firma
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

349

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 — **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 2121-2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PABLO ANTONIO PATIÑO TIQUE	5882985		$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 949.000,00	$ 66.100,00	V	NUEVA EPS	34613190	$ 949.000	COLPENSIONES		$ 151.900	COMFENALCO	$ 19.000	$ 28.500	
2	HENRY SANCHEZ PERDOMO	6017701		$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 1.200.000,00	$ 83.600,00	V	SALUD TOTAL	34613190	$ 1.200.000	PORVENIR		$ 192.000	COMFENALCO	$ 24.000	$ 36.000	
3	YENDERZON MAYORGA MILLAN	14139472		$ 2.700.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 1.800.000,00	$ 125.300,00	V	FAMISANAR	34613190	$ 1.800.000	PORVENIR		$ 288.000	COMFENALCO	$ 36.000	$ 54.000	
4	RICARDO VARGAS GARZON	934419635		$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 569.400,00	$ 39.700,00	V	NUEVA EPS	34613190	$ 569.400	PORVENIR		$ 91.200	COMFENALCO	$ 11.400	$ 17.100	
5	JORGE ELIAS ANGEL ECHEVERRY	1006063530		$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 949.000,00	$ 66.100,00	V	ASMET SALUD	34613190	$ 949.000	PROTECCION		$ 151.900	COMFENALCO	$ 1.900	$ 28.500	
6	JEAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOSA	1007554454		$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 949.000,00	$ 66.100,00	V	NUEVA EPS	34613190	$ 949.000	PORVENIR		$ 151.900	COMFENALCO	$ 19.000	$ 28.500	
7	EDUARD NIRAY VANEGAS QUINTERO	1108121362		$ 1.423.500	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC HOYO CALIENTE	$ 949.000,00	$ 66.100,00	V	ASMET SALUD	34613190	$ 949.000	PORVENIR		$ 151.900	COMFENALCO	$ 19.000	$ 28.500	
8																			
9															$ -				
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

EDGAR H. AVILA O.

Firma
Nombre: EDGAR AVIKA
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

350

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 809001418	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-152	CRA 2 2 13		3102557447			JACVEREDAHOYOCALIENTE@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34613190	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.276.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	34613190	2025-09-04	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5882985	PATIÑO TIQUE PABLO ANTONIO	1.423.500	F	X															0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	949.000	151.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	949.000	118.700	COMFENALCO-CCF50	949.000	38.000	949.000	66.100	0,06960	949.000	19.000	28.500	0	0	01	0	422.200	N	5429001
2	CC 6017701	SANCHEZ PERDOMO HENRY	1.800.000	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.200.000	150.000	COMFENALCO-CCF50	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	1.200.000	24.000	36.000	0	0	01	0	533.600	N	5429001
3	CC 14139472	MAYORGA MILLAN JOSE YENDERZON	2.700.000	F	X	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.800.000	225.000	COMFENALCO-CCF50	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	1.800.000	36.000	54.000	0	0	01	0	800.300	N	5429001
4	CC 93419635	VARGAS GARZON RICARDO	1.423.500	F	X	X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	569.400	71.200	COMFENALCO-CCF50	569.400	22.800	569.400	39.700	0,06960	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	253.400	N	5429001
5	CC 1006063330	ANGEL ECHEVERRY JORGE ELIAS	1.423.500	F	X															0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	949.000	151.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	949.000	118.700	COMFENALCO-CCF50	949.000	38.000	949.000	66.100	0,06960	949.000	19.000	28.500	0	0	01	0	422.200	N	5429001
6	CC 1007554454	RODRIGUEZ ESPINOSA JEAN CARLOS	1.423.500	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	949.000	151.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	949.000	118.700	COMFENALCO-CCF50	949.000	38.000	949.000	66.100	0,06960	949.000	19.000	28.500	0	0	01	0	422.200	N	5429001
7	CC 1108121362	VANEGAS QUINTERO EDUARD NIRAY	1.423.500	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	949.000	151.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	949.000	118.700	COMFENALCO-CCF50	949.000	38.000	949.000	66.100	0,06960	949.000	19.000	28.500	0	0	01	0	422.200	N	5429001

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2121-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:Diego Alejandro Suarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-318156 CND

Firma: EDGAR H. AVILA O.
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

352

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2121 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/08/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.513.076,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.513.076,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 260.000.000,00	2	9	2024	30	6	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde			Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde			Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde			Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	7	5	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	7	5	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

ICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde			Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	5	7	2024	30	6	2025
Otros					Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
					Desde				Hasta		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024		30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024		30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	9	2025		30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
					Desde				Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024		30	9	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma: _____

Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: c+sdEnUbqCF71I+VHk1M1w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034560	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146303	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.418-4
DIRECCIÓN	VEREDA HOYO CALIENTE FINCA EL RODEO	TELÉFONO	3202655689
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2121 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.051.307,60	17.496,83
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.025.653,80	8.748,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.102.615,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.179.576,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.244,83
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.244,83
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.986,52
TOTAL A PAGAR	$	31.231,35

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Ramiro Calis Alvarez
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034560	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18146303	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.418-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034560** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **20/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co

Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

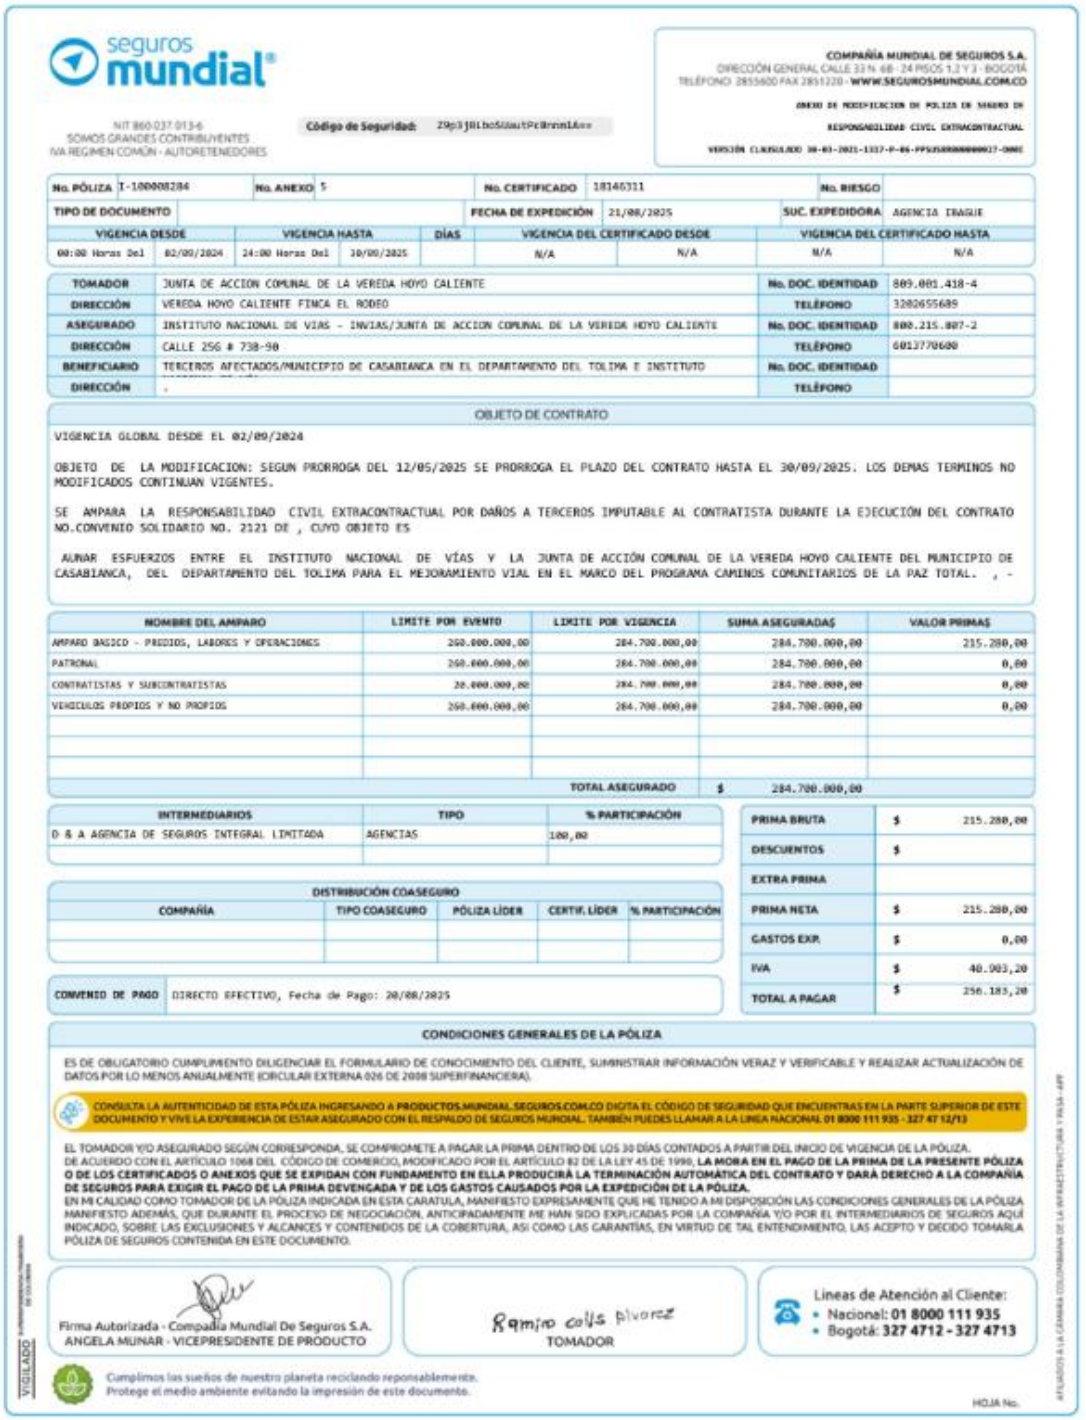

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 29p3jBLboSUaUtPcBnnnlA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSSSRRRRRRRR17-0000

No. PÓLIZA	T-100008284	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.418-4
DIRECCIÓN	VEREDA HOYO CALIENTE FINCA EL RODEO	TELÉFONO	3202655689
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770680
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E INSTITUTO	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NO. 2121 DE , CUYO OBJETO ES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , -

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	215.280,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	215.280,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	215.280,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	40.903,20
TOTAL A PAGAR	$	256.183,20

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Ramiro Celis Alvarez
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008284	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. . 809.001.418-4 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

5.1 ACTAS DE COMITÉ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	Pag 1 de 2.

FECHA: 08-08-2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 2121 -2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Reunión en comite operativo de manera presencial con la OAC, se aprueban contratos OAC, se verifican materiales y equipos en obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

*Aprobacion contratos OAC, *Implantación topografica
*Firma Acta de inicio de obra.
*Recomendación sobre acopio y almacenamiento material
*cotización, diseño de mezcla (3) cotizaciones 3000 PSI y ~~3000 PSI~~.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se realiza lectura del acta anterior, Asistencia de representante legal OAC, Ing. Residente OAC, Maestro OAC, por interventoria Ing. Residente EDGAR Avila y Inspector de laboratorio, se realizan contratos OAC, se firma acta de inicio con fecha 08-08-2025, se realizan recomendaciones de almacenamiento de materiales y equipos, calidad y aseguramiento de la resistencia del concreto, implantacion diseño geometrico en obra.

COMPROMISOS PACTADOS

Aprobacion contratos OAC	08-08-2025	Interventoria
Acta de inicio de obra	08-08-2025	Interventoria.
cotizacion 3 proveedores		
diseño concreto 3000 PSI y 2000 PSI	14-08-2025	OAC
Juego planos fisicos obra.	11-08-2025	OAC.
Reprogramación de obra	14-08-2025.	OAC

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ramiro Celis Alvarez	pte. Hoyo. calzada	OAC	Ramiro Celis Alvarez
Jose yorderzon Mayorga	Maestro obra	OAC.	Yorderzon Mayorga
Diego Alexander Sierra	Ing. Residente	OAC.	
Edgar H. AulAO.	Ing. Residente	consorcio vial JJ	EDGAR H AULAO.
Pablo E Meuder	Inspector Laboral	consorcio Vial JJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN	VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

En HOYO CALIENTE - CASABIANCA (Indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron Ramiro Celis Alvares (Presidente OAC), Victor hugo Sanchez Campuzano (Director de Interventoría), Edgar Humberto Avila Orjuela (Residente de Interventoría), Diego Alexander Suarez Quimbayo (Residente de OAC), Julia Mercedes Cardozo (Contador OAC)

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y suscribir el acta de inicio de ejecución de las actividades contractuales contratadas en el marco del Convenio No. 2121 de 2024 y de Interventoría No. 3555 de 2024 .

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PLAZO DEL CONVENIO SOLIDARIO: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO SOLIDARIO: 3 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año) (Oficio No. _____)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO SOLIDARIO: 30 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR TOTAL CONVENIO SOLIDARIO (IVA INCLUIDO): $ 200.513.076,00 (Valor total del contrato de obra en números)

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA (Nombre o razón social de la Junta de Acción Comunal)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ (Nombre o razón social del interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del convenio solidario y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS INICIO DE EJECUCION:

1. Estudios y Diseños.
1.1 El organismo de Acción Comunal manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA SUBRASANTE Y SUBBASE GRANULAR		1		CBR 6,46
VOL II	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA				

2. Plan de Compras
2.1 El organismo de acción comunal manifiesta que el plan de Compras inicial se realiza conforme a las cotizaciones realizadas en el sector de influencia.

RUBRO No	DESCRIPCIÓN RUBRO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MATERIALES	G Y J FERRETERIAS S A	UNIDADES	1	40,186,812.00	$ 40.186.812,00
5	ADMINISTRATIVO	MACRODOTAMOS S.A.S	UNIDADES	1	1,797,429.00	$ 1.797.429,00
5	ADMINISTRATIVO	LAUAREANO CATAÑO BURITICA	UNIDADES	1	2,275,666.00	$ 2.275.666,00
5	ADMINISTRATIVO	VITALITEC SAS	UNIDADES	1	647,920.00	$ 647.920,00
2	MATERIALES	DIACEMENTO S.A.S	UNIDADES	1	21,278,970.00	$ 21.278.970,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	11/08/2025 (Día / Mes / Año)

2	MATERIALES	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS	UNIDADES	1	8,725,762.42	$	8.725.762,42
2	MATERIALES	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTI	UNIDADES	1	2,242,625.00	$	2.242.625,00
6	ADMINISTRATIVO	FABIO ANDRES PALACIOS MACHADO	UNIDADES	1	1,485,000.00	$	1.485.000,00
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	HUGO ORLANDO CHACUA DELGADO	UNIDADES	1	20,621,000.00	$	20.621.000,00
3	TRANSPORTE	NESTOR ELIAS ATUESTA ACOSTA	UNIDADES	1	9,836,640.00	$	9.836.640,00
	TOTAL					$	109.097.824,42

3. Plan de Inversión. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 20.621.000,00			$ 20.621.000,00	$ 26.840.000,00	14%
2	MATERIALES	$ 72.434.169,42			$ 72.434.169,42	$ 83.203.200,07	42%
3	TRASPORTE	$ 9.836.640,00			$ 9.836.640,00	$ 21.372.000,00	11%
4	MANO DE OBRA	$ -			$ -	$ 30.886.991,00	16%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.206.015,00			$ 6.206.015,00	$ 28.531.400,13	14%
6	PAGA	$ -			$ -	$ 4.525.254,00	2%
7	POLIZAS	$ -			$ -	$ 2.500.000,00	1%
	TOTAL	$ 109.097.824,42	$ -	$ -	$ 109.097.824,42	$ 197.858.845,20	100%

4. Cronograma de Actividades

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió por parte de la Junta de acción Comunal el cronograma Inicial de actividades contractuales conforme a los pliegos de condiciones, minuta del convenio y demás documentos adoptados por e Instituto para el desarrollo de estas actividades.

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)

1. MEPI-MN1-IN-1-FR-5 (ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)
2. MEPI-MN1-IN-2-FR-1 (PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO)
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha 6/08/2025 La junta de acción Comunal e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o de multas establecidos en el convenio solidario.
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CONFORMAN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO CONFORME EL PLIEGO DE CONDICIONES, MINUTA DEL CONVENIO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADOPTADOS POR EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta de inicio de ejecución quienes en ella intervinieron:

Firma: Ramiro Celis Alvarez
Nombre: Ramiro Celis Alvares
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-257182

Firma:
Nombre: Diego Alexander Suarez Colmbayo
Residente OAC
Matrícula Profesional No. 25202-318156 CND

Firma: EDGAR H. Avila O.
Nombre: Edgar Humberto Avila Orjuela
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Firma:
Nombre: Julia Mercedes Cardozo
Contadora vereda Hoyo Caliente
Matrícula Profesional No.: 88137-T

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

365

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

2121 - 2024 (Indicar número y año) — **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE — NIT 809001418 4

INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	31/07/2024	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION DE OBRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.858.845,20	
	01/08/2024	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					4.718,80		4.718,80				4.718,80	197.854.126,40	
	21/03/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					91.010,00		91.010,00				91.010,00	197.763.116,40	
	21/03/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					14.771,44		14.771,44				14.771,44	197.748.344,96	
	30/04/2025	extracto bancario			PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					284.172,33		284.172,33				284.172,33	197.464.172,63	
	20/05/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.544,09		15.544,09				15.544,09	197.448.628,54	
20.373,72	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.469.002,26	
740,67	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.469.742,93	
1.056.734,00	31/08/2025	extracto bancario			Devolucion de pago no coincide tercero	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	198.526.476,93	
1.634,33	01/08/2025	extracto bancario			devoluciones de impuestos del 4 x 1000	BANCO AV VILLAS					-		-				-	198.528.111,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO TRASNPORTE FABIO PALACIOS						1.485.000,00		1.485.000,00				1.485.000,00	197.043.111,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO MATERIALES LAUREANO CATAÑO						2.275.666,00		2.275.666,00				2.275.666,00	194.767.445,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO ALQUILER HUGO CHACUA						20.621.000,00		20.621.000,00				20.621.000,00	174.146.445,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO CEMENTO DIACEMENTOS SAS						21.278.970,00		21.278.970,00				21.278.970,00	152.867.475,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO TRASNPORTE NESTOR ATUESTA						9.836.640,00		9.836.640,00				9.836.640,00	143.030.835,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO MATERIALES GYJ FERRETERIAS SA						40.186.812,00		40.186.812,00				40.186.812,00	102.844.023,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO DOTACION MACRODOTAMOS SAS						1.797.429,00		1.797.429,00				1.797.429,00	101.046.594,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO MATERIALES PREFABRICADOS DE C O SAS						2.242.625,00		2.242.625,00				2.242.625,00	98.803.969,26	
	28/07/2025				DESEMBOLSO MATERIALES TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS						8.725.762,42		8.725.762,42				8.725.762,42	90.078.206,84	
	28/07/2025				DESEMBOLSO EXAMENES MEDICOS VITALITEC SAS						647.920,00		647.920,00				647.920,00	89.430.286,84	
	17/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					143.500,00		143.500,00				143.500,00	89.286.786,84	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA JORGE ANGEL						$ 0,00		-				-	89.286.786,84	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA JOSE MAYORGA						$ 1.878.800,00		1.878.800,00				1.878.800,00	87.407.986,84	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA EDUARDO VANEGAS						$ 1.056.734,00		1.056.734,00				1.056.734,00	86.351.252,84	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA HENRY PERDOMO						$ 989.866,67		989.866,67				989.866,67	85.361.386,17	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA JEAN CARLOS RODRIGUEZ						$ 1.056.734,00		1.056.734,00				1.056.734,00	84.304.652,17	
	27/08/2025				DESEMBOL PAGO NOMINA PABLO PATIÑO						$ 1.056.734,00		1.056.734,00				1.056.734,00	83.247.918,17	
	17/07/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					86.100,00		86.100,00				86.100,00	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
													-				-	83.161.818,17	
1.079.482,72											115.776.509,75	-	115.776.509,75	-	-	-	115.776.509,75	82.082.335,45	
																	EXTRACTO	82.104.343,50	- 22.008,05
																	DIF(EXTRAC-SALDO)	82.104.343,50	
10.858.682,42																		-	83.161.818,17
51.820.881,00																	GASTOS BANCARIOS	-	-
22.863.625,00																			-
-																			
29.968.687,00																			
-																			
264.634,33																			
21.114,39																			
1.058.368,33	-																		
115.776.509,75																			

366

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2121 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-514 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.513.076,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA 809001418 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	NTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIM	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 132.670,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 326.406,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 3.077.376,96	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.894.775,18

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ 20.621.000,00	$ -	$ 20.621.000,00	$ 379.000,00
2	MATERIALES	$ 115.237.866,00	$ 74.709.835,42	$ -	$ 74.709.835,42	$ 40.528.030,58
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ 11.321.640,00	$ -	$ 11.321.640,00	$ 18.678.360,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 7.095.602,67	$ 7.095.602,67	$ 13.904.397,33
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.095.725,20	$ 2.977.798,28	$ 85.359,33	$ 3.063.157,61	$ 3.032.567,59
6	PAGA	$ 4.525.254,00	$ -		$ -	$ 4.525.254,00
7	POLIZAS	$ -				
		$ 197.858.845,20	$ 109.630.273,70	$ 7.180.962,00	$ 116.811.235,70	$ 81.047.609,50

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 19.633,05

$ 740,67
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 20.373,72
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2121 - 2024** (Indicar número y año)

EJECUTOR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ 20.621.000,00	$ -	$ 379.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ 74.709.835,42	$ -	$ 40.528.030,58	$ 115.237.866,00	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ 11.321.640,00	$ -	$ 18.678.360,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 7.095.602,67	$ 13.904.397,33	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 392.140,44	$ 2.585.657,84	$ 85.359,33	$ 3.032.567,59	$ 6.095.725,20	3%
6	PAGA	$ -	$ -		$ 4.525.254,00	$ 4.525.254,00	2%
	TOTAL					**$ 197.858.845,20**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2206 - 2024
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO VALENCIA CASTAÑO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.951.148
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
CORREO ELECTRONICO	juntadeaccioncomunallaporfia@gmail.com
CELULAR	3202655689.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 03 de agosto de 2025 la Junta de la Vereda Porfía linda en el Municipio de Casabianca Tolima, envía hoja de vida del maestro.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 07 de agosto de 2025 la JAC de la Vereda Porfía Linda del Municipio de Casabianca Tolima envía hoja de vida del ingeniero residente.

El día 08 de agosto de 2025 Banco AVVILLAS envía formatos de desembolsos para las Veredas Porfía Linda en el Municipio de Casabianca, Cuatro mil en el Municipio de Villarica, Chípalo Municipio de Piedras en el Departamento Tolima.

El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas, Santa Barbara, Santa Helena del Municipio de Anzoátegui, Hoyo Caliente, Porfía Linda del Municipio de Casabianca, La Planada, Guineal Horizonte del municipio de Ortega en el Departamento del Tolima.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 12 de agosto de 2025 solicitud autorización y firma para pagos de retención en la fuente, para las Veredas Santa Barbara, Santa Helena en el Municipio de Anzoátegui, La Planada Municipio de Venadillo junto a otros gastos como transporte, en cuanto a la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Casabianca se envían dos pagos que fueron rechazados por el Banco AVVILLAS.

El día 14 de agosto de 2025 la JAC envía solicitud para pagos por transferencia de la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Avianca Tolima.

El día 19 de agosto de 2025 solicitud para desembolso de la Vereda Porfía Linda en el Municipio de Casabianca.

El día 19 de agosto de 2025 solicitud para desembolso #3 del convenio 2206-2024 Porfía Linda.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

El día 22 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC Vereda Porfía Linda convenio 2206-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfía Linda, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio, El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.124.039,86	16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 25.537.673,73	13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.124.039,86	16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.537.673,73	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.124.039,86	16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.537.673,73	13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16%
Meta Física Ejecutada % 13%
Avance o Atraso Físico % 3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	8%			0,08	5,6%
					Ejec	4%			0,04	2,8%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 114 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*El día 03 de agosto de 2025 la Junta de la Vereda Porfía linda en el Municipio de Casabianca Tolima, envía hoja de vida del maestro.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 08 de agosto de 2025 se realiza de plan inversión social para las veredas Porfía Linda del Municipio de Casabianca.
*El día 08 de agosto de 2025 Banco AVVILLAS envía formatos de desembolsos para las Veredas Porfía Linda en el Municipio de Casabianca,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se programa firma acta de inicio para 13 agosto.
*Se programa realizar retiro de capa orgánica.
*Se programa corte, figuración, instalación y amarre de hierro.
*Entrega de diseño de mezcla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEFI-MN1.-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Socializacion metodologia comunitaria	Socializacion metodologia comunitaria	Socializacion metodologia comunitaria

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ

(Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfía Linda, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio, El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ	INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 52.072.912,84	26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 47.883.138,24	24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 52.072.912,84	26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.883.138,24	24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 52.072.912,84	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.883.138,24	8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 26%
Meta Física Ejecutada %: 24%
Avance o Atraso Físico %: 2%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	23%			0,23	16,1%
					Ejec	20%			0,2	14,0%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	
EQUIPO TOPOGRAFIA	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 114 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Nivelación e instalación de formaleta
*Entrega cotizaciones diseño de mezcla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfía Linda, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio, El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.021.785,82	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 68.832.011,22	35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.021.785,82	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.832.011,22	35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 73.021.785,82	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 68.832.011,22	8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37% — Avance o Atraso Físico %: 2%
Meta Física Ejecutada %: 35%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	38%			0,38	26,6%
					Ejec	35%			0,35	24,5%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	
EQUIPO TOPOGRAFIA	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 114 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 17 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 8 de agosto por las partes o por los directamente relacionados.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor,
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Nivelación e instalación de formaleta
*Entrega cotizaciones diseño de mezcla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Nivelación de la subrasante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Nivelación e instalación de formaleta
*Entrega cotizaciones diseño de mezcla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 114 m de placa huella y 1 alcantarillas para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Casabianca Tolima, ubicado en sector rural vereda Porfía Linda, donde el sector vial proyectado está situada menos de 6.1 km del casco urbano del municipio, El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA HOYO CALIENTE NIT. 809.001.418-4			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	RAMIRO CELIS ALVAREZ			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS⊡		
CONVENIO No.	2121 de 2024	VALOR INICIAL:	199,513,076.00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	199,513,076.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	199,513,076.00	199,513,076.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	199,513,076.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 114.919.531,78	58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100.953.616,46	51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.919.531,78	58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.953.616,46	51%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 114.919.531,78	#¡REF!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.953.616,46	#¡REF!

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58% — Avance o Atraso Físico %: 7%
Meta Física Ejecutada %: 51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog	68%			0,68	47,6%
					Ejec	58%			0,58	40,6%
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA	1	
EQUIPO TOPOGRAFIA	1	
MEZCLADORA 1 BULTO	1	
Total	3	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SEGUN EL DECRETO 1076 DEL 2015 EL PROYECTO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se APROBADAS. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: El contrato de obra no contempla adquisiciones prediales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Convenio en estado: ejecución
*Fecha de prorroga y finalización :30/09/2025
*Pago de garantías hasta 30/06/2025
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%, determinado meta física a construir de 118 ml y 1 alcantarilla
*Se realiza la trazabilidad para presentación de cotizaciones comité de aprobación de selección de proveedores propuestas por el OAC 3 de julio del 2025
*Se envió al banco AV-VILLAS formato de asociación de cuenta de proveedores y pago a proveedores de obra para suministro de material en obra.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Elaboración de cantidades de obra y presupuesto:100%.
*Se realizo el desembolso por parte del banco AV VILLAS para compra de materiales y alquiler de equipos.
*Se remite al ing. residente de la OAC. para que se haga seguimiento para entrega de materiales en obra.
*Se verifica la asistencia del represéntate legal de la OAC, representante legal de veeduría, Ingeniero residente y contador de la OAC, por parte de interventoría ingeniero residente, topógrafo, trabajadora social, se realiza la aprobación de contratos del personal de la OAC.
*Se firma acta de inicio fecha 4 de agosto por las partes o por los directamente relacionados.
*Se hace la recomendación de alzar y tapar el hierro, se verifican materiales y equipos en obra, se hace énfasis en la resistencia del concreto se les explica a todos la relación Agua / Cemento y de la importancia que es aplicar la medida del agua exacta según el diseño de mezcla, este diseño de mezcla la OAC debe entregar las tres cotizaciones de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI, para aprobar el proveedor.
*Se realiza inspección topográfica en busca de BM de referenciación sin encontrar alguno en obra, por lo cual se realizara un nuevo levantamiento por la interventoría para implementar el diseño, se realizó la actividad de instalación del punto de atención del PQRS, buzón y cartelera.
*Se hace implantación topográfica diseño geométrico, (niveles, ejes, curvas).
*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Retiro de capa vegetal, nivelación de subrasante.
*Nivelación de la subrasante.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Corte y figurado de hierro para viga riostra, cuneta, placa huella.
*Nivelación e instalación de formaleta
*Entrega cotizaciones diseño de mezcla.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2206-2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL JJ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA		1 1/2	MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PULIDORA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO PARA CONCRETO			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA ELECTRICA			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MARTILLO DEMOLEDOR			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CORTADORA CONCRETO			MUNICIPIO CASABIANCA-VEREDA PORFIALINDA																				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL ACTIVO																				8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			TOTAL EN REPARACIÓN																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO																				0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	81%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	19%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA RETROEXCAVADORA Y EL VIBROCOMPACTADOR FUERON PRESTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Diego Alejandro Suarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-318156 CND

Firma
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

381

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024
CONTRATISTA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIO No: 2206-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
NOMBRE ARL: SURA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL EDUARDO OSPINA CORNELIO	6818108	MAESTRO	$ 2.700.000	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 990.000,00	$ 69.000	V	SALUD TOTAL		$ 123.800	PORVENIR	34618417	$ 158.400	COMFENALCO	$ 19.800	$ 29.700	
2	DARWIN FELIPE MURILLO LAVERDE	1006927361	AYUDANTE	$ 1.423.500	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	SALUD TOTAL		$ 65.300	PORVENIR	34618417	$ 83.600	COMFENALCO	$ 10.500	$ 15.700	
3	LUIS FELIPE GUTIERREZ GARCIA	1088536652	AYUDANTE	$ 1.423.500	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	ESC ASMET		$ 65.300	PORVENIR	34618417	$ 83.600	COMFENALCO	$ 10.500	$ 15.700	
4	GERSON DAVID TARAZONA MORA	1096192124	AYUDANTE	$ 1.423.500	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	NUEVA EPS		$ 65.300	PORVENIR	34618417	$ 83.600	COMFENALCO	$ 10.500	$ 15.700	
5	ANDRES CAMILO GIRALDO CARVAJAL	1108120165	AYUDANTE	$ 1.423.500	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	NUEVA EPS		$ 65.300	PORVENIR	34618417	$ 83.600	COMFENALCO	$ 10.500	$ 15.700	
6	JUAN ISRAEL CARVAJAL PEÑA	1108120776	AYUDANTE	$ 1.423.500	20 a 31: X X X X X X X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 521.950,00	$ 36.400	V	ESC ASMET		$ 65.300	PORVENIR	34618417	$ 83.600	COMFENALCO	$ 10.500	$ 15.700	
7	ANDRES OLMEDO ALVAREZ VARGAS	1116203703	OFICIAL	$ 1.800.000	25 a 31: X X X X X X	JAC PORFIA LINDA	$ 360.000,00	$ 25.100	V	NUEVA EPS		$ 45.000	PORVENIR	34618417	$ 57.600	COMFENALCO	$ 7.200	$ 10.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Victor Hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Firma EDGAR H. AVILA O.
Nombre: EDGAR AVIKA
Ingeniero residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

382

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 3555-2024 **CONTRATISTA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/08/2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2206-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre:Diego Alejandro Suarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-318156 CND

Firma: EDGAR H. AVILA O.
Nombre: Edgar Avila
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

383

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2206 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 04/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.951.148,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.951.148,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO (INICIAL)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	5	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	31	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	31	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	31	3	2025	31	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECO 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 284.700.000,00	2	9	2024	31	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	6	2025	30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECC 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	5	7	2024	30	6	2030
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.095.114,80	5	7	2024	30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.047.557,40	5	7	2024	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.190.229,60	30	9	2025	30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034669

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	5	9	2024	30	9	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008313 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma
Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

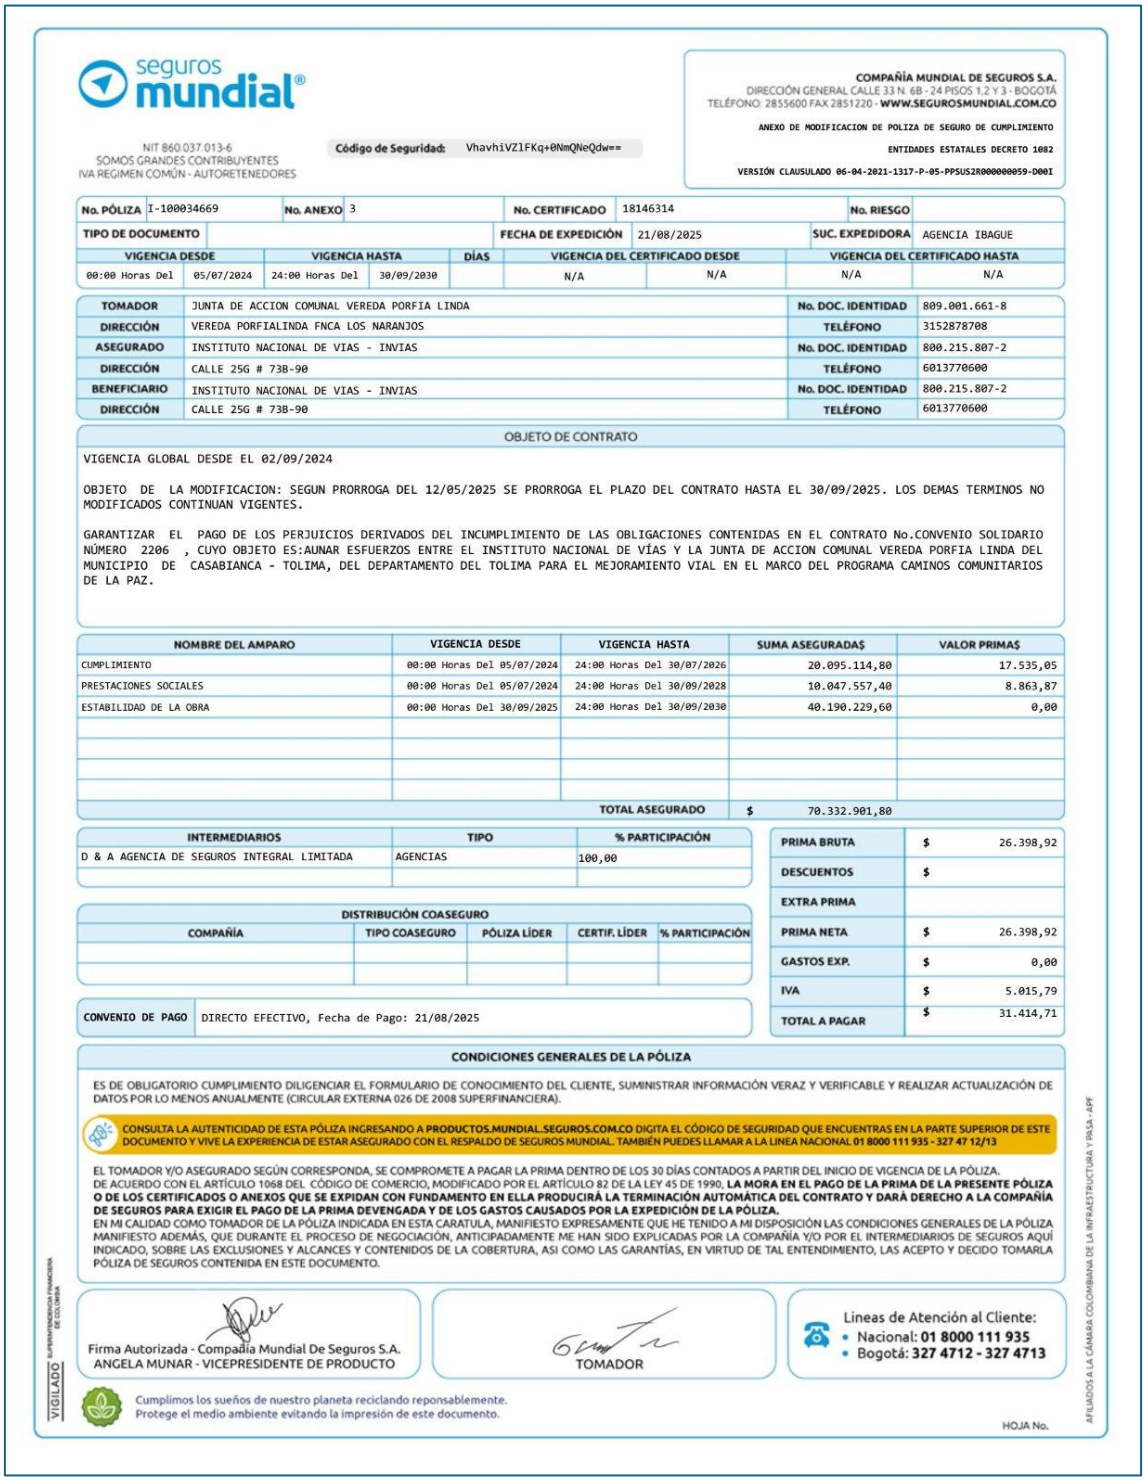

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: VhavhiVZlFKq+0NmQNeQdw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034669	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18146314	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.661-8
DIRECCIÓN	VEREDA PORFIALINDA FNCA LOS NARANJOS	TELÉFONO	3152878708
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2206 , CUYO OBJETO ES:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 30/07/2026	20.095.114,80	17.535,05
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/07/2024	24:00 Horas Del 30/09/2028	10.047.557,40	8.863,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/09/2025	24:00 Horas Del 30/09/2030	40.190.229,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.332.901,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	26.398,92
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.398,92
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.015,79
TOTAL A PAGAR	$	31.414,71

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASPF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034669	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18146314	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/07/2024	24:00 Horas Del	30/09/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 809.001.661-8 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 05/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 05/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034669** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **21/08/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **22** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co

Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: OpIUllXNCtJKITk987YRQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008313	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146316	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA	No. DOC. IDENTIDAD	809.001.661-8
DIRECCIÓN	VEREDA PORFIALINDA FNCA LOS NARANJOS	TELÉFONO	3152878708
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE CASABIANCA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/09/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2206 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	251.160,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	251.160,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	251.160,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	47.720,40
TOTAL A PAGAR	$	298.880,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/08/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIPF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008313	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	18146316	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/09/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 809.001.661-8 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 05/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 05/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - APF

HOJA No.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CASABIANCA 2121 - 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE COMITÉ OPERATIVO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20-08-2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 2208 -2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Reunion en comite operativo de manera presencial con la Organización de Acción comunal, se reciben los contratos del ingeniero residente, contador, maestro para su verificación y aprobación. Se verifica los materiales y equipos en obra, se verifica la entrega y aprobación de estudios y diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
*Firma de Acta de inicio
*cotizacion diseño de mezcla 3000 PSI y 2000 PSI (3) tres cotizaciones.
* implementación topografica informe geometrico.
* recomendacion Acopio de materiales y almacenamiento
*verificacion cortelera y Buzon PQRS.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
se realiza lectura del acta anterior, Asistencia del representante legal OAC, Ingeniero residente OAC, Maestro OAC, Contadora OAC, Ingeniero residente interventoria, inspector de laboratorio, trabajador social, se entrega dotación al personal de obra, se Firma acta de inicio con fecha 20-08-25 se realiza recomendaciones de almacenamiento de equipos y materiales, calidad y aseguramiento de la resistencia del concreto, implementación informe geometrico topografia, en obra se verifica la instalación de cortelera con la informacion requerida y buzon pqrs. se inicia obra con flejado de hierro.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	20-08-2025
FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Aprobacion contratos OAC		
cotizacion Diseño 3000 PSI y 2000 PSI	28-08-2025	OAC
Juego planos fisico. obra.	25-08-2025	OAC
Refrigeramiento de obra	28-08-2025	OAC
Firma Acta de inicio Total.	20-08-2025	interventoria

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el convenio ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Julian Cuadros	Contadora	JAC Portalundo	
Luis Felipe	ayudante		Luis Felipe
Juan Carvajal	ayudante		
Felipe Murillo	ayudante		felipe m.
Andres Camilo Giraldo	ayudante		
Guillermo	Pavimentador	JAC PORTALUNDO	
Juan Pablo	Proveedor		
James Restrepo	Proveedor		James Restrepo
Berson David	ayudante		David
Diego Alexander S.	Ing: Residente		

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

EDGAR H AVILA Ing. RESIDENTE CONSORCIO VIAL JJ EDGAR H AVILA.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN

CODIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 2
FECHA	20/08/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

En PORFIA LINDA - CASABIANCA (indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron Ramiro Celis Alvares (Presidente OAC), Victor hugo Sanchez Campuzano (Director de Interventoría), Edgar Humberto Avila Orjuela (Residente de Interventoría), Diego Alexander Suarez Quimbayo (Residente de OAC), Julia Mercedes Cardozo (Contador OAC)

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y suscribir el acta de inicio de ejecución de las actividades contractuales contratadas en el marco del Convenio No. 2206 de 2024 y de Interventoría No. 3555 de 2024.

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PLAZO DEL CONVENIO SOLIDARIO: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO SOLIDARIO: 3 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año) (Oficio No.)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO SOLIDARIO: 30 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR TOTAL CONVENIO SOLIDARIO (IVA INCLUIDO): $ 200.513.076,00 (Valor total del contrato de obra en números)

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA (Nombre o razón social de la Junta de Acción Comunal)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ (Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del convenio solidario y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS INICIO DE EJECUCION:

I. Estudios y Diseños.
I.1 El organismo de Acción Comunal manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA SUBRASANTE Y SUBBASE GRANULAR		1		CBR 6,46
VOL II	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA				

2. Plan de Compras
2.1 El organismo de acción comunal manifiesta que el plan de Compras inicial se realiza conforme a las cotizaciones realizadas en el sector de influencia.

RUBRO No	DESCRIPCIÓN RUBRO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MATERIALES	ACEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	KILOGRAMO	1125	$ 30.906,34	$ 34.769.630,00
3	TRANSPORTES	TRANSPORTES	UNIDADES	3	$ 4.752.000,00	$ 14.256.000,00
2	MATERIALES	MATERIALES (TUBOS)	UNIDADES	5	$ 448.550,00	$ 2.242.750,00
2	MATERIALES	MATERIALES Y HERRAMIENTAS (Varios)	UNIDADES	1	$ 27.825.000,00	$ 27.825.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION	UNIDADES	42	$ 42.785,71	$ 1.797.000,00

395

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	2 de 2
FECHA	20/08/2025 (Día / Mes / Año)

5	ADMINISTRATIVOS	EXAMENES MEDICOS	UNIDADES	10	$ 64.800,00	$	648.000,00
2	MATERIALES	COMPRA MATERIALES PETREOS	UNIDADES	358	$ 25.349,17	$	9.075.002,42
1	EQUIPO Y MAQUINARIA	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDADES	1	$ 20.966.400,00	$	20.966.400,00
		TOTAL				$	111.579.782,42

3. Plan de inversión. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 20.966.400,00			$ 20.966.400,00	$ 26.840.000,00	14%
2	MATERIALES	$ 73.912.382,42			$ 73.912.382,42	$ 83.203.200,07	42%
3	TRASPORTE	$ 14.256.000,00			$ 14.256.000,00	$ 21.372.000,00	11%
4	MANO DE OBRA	$ 79.726.980,64			$ 79.726.980,64	$ 30.886.991,00	16%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 2.445.000,00			$ 2.445.000,00	$ 28.531.400,13	14%
6	PAGA	$ 4.500.000,00			$ 4.500.000,00	$ 4.525.254,00	2%
7	POLIZAS	$ 2.072.192,47			$ 2.072.192,47	$ 2.500.000,00	1%
	TOTAL	$ 197.878.955,53	$ -	$ -	$ 197.878.955,53	$ 197.858.845,20	100%

4. Cronograma de Actividades

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió por parte de la Junta de acción Comunal el cronograma Inicial de actividades contractuales conforme a los pliegos de condiciones, minuta del convenio y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades.

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)

1. MEPI-MN1-IN-1-FR-5 (ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)
2. MEPI-MN1-IN-2-FR-1 (PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO)
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha 20/08/2025 La junta de acción Comunal e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o de multas establecidos en el convenio solidario.
CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE CONFORMAN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO CONFORME EL PLIEGO DE CONDICIONES, MINUTA DEL CONVENIO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADOPTADOS POR EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta de inicio de ejecución quienes en ella intervinieron:

Firma:
Nombre: Ramiro Celis Alvares
Representante Legal OAC

Firma: EDGAR H. AVILA O.
Nombre: Edgar Humberto Avila Orjuela
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-119166 CND

Firma:
Nombre: Victor hugo Sanchez Campuzano
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 70202-257182

Firma:
Nombre: Julia Mercedes Cardozo
Contadora vereda Hoyo Caliente
Matrícula Profesional No. 88137-T

Firma:
Nombre: Diego Alexander Suarez Quimbayo
Residente OAC
Matrícula Profesional No. 25202-318156 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

396

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2121 - 2024 (Indicar número y año) — **EJECUTOR:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE — NIT 809001418_4

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	DESEMBOLSO INCIAL		26/08/2024	extracto bancario			desembolso realizado por INVIAS PARA EJECUCION DE OBRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	198.337.666,70	
7	GASTOS BANCARIOS		00/01/1900	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					4.718,80		4.718,80				4.718,80	198.332.947,90	
5	ADMINISTRATIVOS		21/03/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					132.238,00		132.238,00				132.238,00	198.200.709,90	
7	GASTOS BANCARIOS		21/03/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					14.771,44		14.936,35				14.936,35	198.185.773,55	
5	ADMINISTRATIVOS		30/04/2025	extracto bancario			PAGO DE POLIZAS A MUNDIAL DE SEGUROS	MUNDIAL DE SEGUROS					326.473,17		326.473,17				326.473,17	197.859.300,38	
7	GASTOS BANCARIOS		20/05/2025	extracto bancario			GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y 4 X 1000	BANCO AV VILLAS					15.544,09		15.713,29				15.713,29	197.843.587,09	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.373,72	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.863.960,81	
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	740,67	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS acumulados ,	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.864.701,48	
0	ADMINISTRATIVOS		11/08/2025				DESEMBOLSO PARA EXAMINES	VITALEC SAS	900996582				648.000,00		648.000,00				648.000,00	197.216.701,48	
0	MATERIALES		11/08/2025				DESEMBOLSO COMPRA MATERIALES FERRETERIA	LAUREANO CATAÑO BURITICA	6028019				27.825.000,00		27.825.000,00				27.825.000,00	169.391.701,48	
0	MATERIALES		11/08/2025				DESEMBOLSO COMPRA MATERIALES HIERRO	G Y J FERRETERIA SA	800130426				34.769.630,00		34.769.630,00				34.769.630,00	134.622.071,48	
0	MATERIALES		11/08/2025				DESEMBOLSO COMPRA DE TUBOS	PREFABRICADOS DE CEMENTO OPTIMO SAS	901667149				2.242.750,00		2.242.750,00				2.242.750,00	132.379.321,48	
0	TRANSPORTES		11/08/2025				DESEMBOLSO TRANSPORTE DE TUBOS	FABIO ANDRES PALACIOS CAMACHO	93411427				1.188.000,00		1.188.000,00				1.188.000,00	131.191.321,48	
0	MATERIALES		11/08/2025				DESEMBOLSO COMPRA MATERIALES CANTERA	TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS	900237153				9.075.002,42		9.075.002,42				9.075.002,42	122.116.319,06	
0	ADMINISTRATIVOS		11/08/2025				DESEMBOLSO COMPRA DOTACIONES	MACRODOTAMOS SAS	901589266				1.797.000,00		1.797.000,00				1.797.000,00	120.319.319,06	
0	TRANSPORTES		11/08/2025				DESEMBOLSO TRANSPORTE MATERIALES	ELVER LAVERDE ARCILA	5863379				8.910.000,00		8.910.000,00				8.910.000,00	111.409.319,06	
0	ADMINISTRATIVOS		11/08/2025				GASTOS FINANCIEROS. (8x$14,350) COMISIONES						114.800,00		114.800,00				114.800,00	111.294.519,06	
0	EQUIPO Y HERRAMIENTA		19/08/2025				DESEMBOLSO ALQUILER DE EQUIPOS	DIEGO ALEJANDRO CHACUA	1005716837				20.966.400,00		20.966.400,00				20.966.400,00	90.328.119,06	
0	TRANSPORTES		19/08/2025				DESEMBOLSO TRANSPORTE CANTERAS	HUGO NELSON FLOREZ CARDONA	75078626				4.158.000,00		4.158.000,00				4.158.000,00	86.170.119,06	
0	ADMINISTRATIVOS		19/08/2025				GASTOS FINANCIEROS. (2x$14,350) COMISIONES						28.700,00		28.700,00				28.700,00	86.141.419,06	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	MIGUEL OSPINA	6018108				984.133,33		984.133,33				984.133,33	85.157.285,73	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	DARWIN MURILLO	1005927361				553.527,33		553.527,33				553.527,33	84.603.758,40	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	ANDRES ALVEREZ	1116203703				371.200,00		371.200,00				371.200,00	84.232.558,40	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	JUAN CARVAJAL	1108120776				553.527,33		553.527,33				553.527,33	83.679.031,07	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	GERSON TORAZONA	1096192124				553.527,33		553.527,33				553.527,33	83.125.503,74	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	LUIS GUTIERREZ	1088536652				553.527,33		553.527,33				553.527,33	82.571.976,41	
0	ADMINISTRATIVOS		29/08/2025				DESEMBOLSO PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 AGOSTO	ANDRES GIRALDO	1108120165				553.527,33		553.527,33				553.527,33	82.018.449,08	
0	ADMINISTRATIVOS	1.088,96	31/08/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	82.019.538,04	
0	ADMINISTRATIVOS	-	31/08/2025				GASTOS FINANCIEROS. (7x$14,350) COMISIONES						100.450,00		100.450,00				100.450,00	81.919.088,04	
0															-				-	81.919.088,04	
0															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
															-				-	81.919.088,04	
TOTALES		22.203,35											116.440.447,90	-	116.440.782,01	-	-	-	116.440.782,01	81.896.884,69	

				EXTRACTO	82.104.343,50 - 207.458,81
				DIF(EXTRAC-SALDO)	82.104.343,50 - 81.919.088,04
				GASTOS BANCARIOS	- - -

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	20.966.400,00
2	MATERIALES	73.912.382,42
3	TRANSPORTES	14.256.000,00
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	7.270.631,15
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	35.368,44
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.114,39
9	REINTEGROS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		**116.440.782,01**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

397

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2206 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401-295-506 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.951.148,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA 809001661 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 132.670,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 326.405,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 3.077.376,96	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 198.332.847,18

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 20.966.400,00	$ 20.966.400,00	$ 33.600,00
2	MATERIALES	$ 116.164.302,62	$ -	$ 73.912.382,42	$ 73.912.382,42	$ 42.251.920,20
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ 14.256.000,00	$ 14.256.000,00	$ 15.744.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 4.122.969,98	$ 4.122.969,98	$ 16.877.030,02
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.635.400,08	$ 477.905,90	$ 2.685.892,60	$ 3.163.798,50	$ 2.471.601,58
6	PAGA	$ 4.537.964,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.537.964,00
7	POLIZAS	$ -				
		$ 198.337.666,70	$ 477.905,90	$ 115.943.645,00	$ 116.421.550,90	$ 81.916.115,80

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 19.800,74 $ 1.088,96
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 20.889,70
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión qúe se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2206 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA -TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 20.966.400,00	$ 33.600,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 73.912.382,42	$ 42.251.920,20	$ 116.164.302,62	59%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 14.256.000,00	$ 15.744.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ 4.122.969,98	$ 16.877.030,02	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 476.226,05	$ 1.679,85	$ 2.685.892,60	$ 2.471.601,58	$ 5.635.400,08	3%
6	PAGA	$ -	$ -		$ 4.537.964,00	$ 4.537.964,00	2%
	TOTAL					**$ 198.337.666,70**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN (11)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	2122 - 2024
OAC	UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL	ROBER PIO ROJAS TORRES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL	$200.274.651
FECHA DE INICIO	2/09/2024
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO PRORROGA 1	HASTA EL 31 DE MARZO 2025
PLAZO PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PLAZO PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	Juntallanovirgen@gmail.com
CELULAR	3224661751.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS. El día 01 agosto de 2025 se envía solicitud de visita especialista hidráulica y/o hidrología para martes 05 de agosto a las Veredas Llano de la Virgen Coello Tolima, Chípalo Piedras Tolima. Y para el 06 de agosto Vereda la Aurora del Municipio de Rioblanco.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024

El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.

El día 13 de agosto de 2025 revisión y aprobación de firma para desembolso Llano de la Virgen en el Municipio de Coello Tolima.

El día 14 de agosto de 2025 se envían soportes para respectivo desembolso de la vereda Llano de la Virgen Municipio de Coello Tolima

El día 20 de agosto de 2025 la JAC Llano de la virgen del Municipio de Coello envía solicitud de inicio físico de obra y otros.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Actualmente la interventoría envia las cantidades de obra al representante legal e ingeniero residente de la oac y/o convenio interadmistrativo, para poder dar inicio a l estudio de mercado

.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.927.465,10	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,00	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA		
VIBRO COMPACTADOR 8 TON		
CIZAYA		
TRONZADORA		
TROMPO 1 BULTO		
V IBRO DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 01 agosto de 2025 se envía solicitud de visita especialista hidráulica y/o hidrología para martes 05 de agosto a las Veredas Llano de la Virgen Coello Tolima, Chipalo Piedras Tolima. Y para el 06 de agosto Vereda la Aurora del Municipio de Rioblanco.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — calidad en infraestructura — Empresa con propósito
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS☐		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.927.465,10	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,00	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (...)	Avance Físico	Tramo y/o	Tramo y/o	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA		
VIBRO COMPACTADOR 8 TON		
CIZAYA		
TRONZADORA		
TROMPO 1 BULTO		
V IBRO DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado..
*El día 13 de agosto de 2025 revisión y aprobación de firma para desembolso Llano de la Virgen en el Municipio de Coello Tolima.
*El día 14 de agosto de 2025 se envían soportes para respectivo desembolso de la vereda Llano de la Virgen Municipio de Coello Tolima.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.927.465,10	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,00	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA		
VIBRO COMPACTADOR 8 TON		
CIZAYA		
TRONZADORA		
TROMPO 1 BULTO		
V IBRO DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 20 de agosto de 2025 la JAC Llano de la virgen del Municipio de Coello envía solicitud de inicio físico de obra y otros.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla.El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comunal –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.927.465,10	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,00	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
*Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA		
VIBRO COMPACTADOR 8 TON		
CIZAYA		
TRONZADORA		
TROMPO 1 BULTO		
VIBRO DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO — DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 25 de agosto de 2025 se envía autorización de firmas para aprobación de desembolsos a las Veredas, Hoyo caliente, Llano de la Virgen y Cuatromil.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04-'09-25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04-'09-25 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. RENZO GUTIERREZ

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 171 m de placa huella y 1 alcantarilla para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio y de intervención, hace parte del municipio de Coello Tolima, ubicado en sector rural vereda Llano de la virgen, el primer tramo de vía con una longitud de 76 m, un segundo tramo de vía de 40 m el tercer tramo con una longitud de 55 m y 1 alcantarilla,El proyecto genera las condiciones de inversión para el programa de ejecución de obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial entre el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS y los Organismos de Acción Comural –OAC, atendiendo la necesidad de mejorar tramos viables visiblemente más afectados del sector, contribuyendo al desarrollo de movilidad planteado por caminos comunitarios para la Paz, enfocando en obras civiles de mejoramiento como la construcción de placa huella y alcantarillas

CONVENIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT. 900.000.673-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ROBER PIO ROJAS TORRES			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SASD		
CONVENIO No.	2122 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 199.274.651,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	02/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 199.274.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.020.943.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CCONVENIO POR VIGENCIA:

CONVENIO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.274.651	$ 199.274.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.020.943.666	$ 1.999.824.498		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 21.119.168	$ 270.616.581		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.999.824.498	$ 1.729.207.917		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.274.651,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.927.465,10	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.927.465,10	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.927.465,10	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,00	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 30 de Marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			0,1	10,0%
					Ejec	100%			0,1	10,0%
* Construccion de Placa huella (acero)	1				Prog					
					Ejec					
* Alcantarilla	1				Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA		
VIBRO COMPACTADOR 8 TON		
CIZAYA		
TRONZADORA		
TROMPO 1 BULTO		
V IBRO DE CONCRETO		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:EL CONVENIO NO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ..... N/A .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....
.....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*Se realiza socializacion de metodologia.
* se realiza topografia del terreno (nivelacion).
*Se realiza descapote.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social



Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social



Vereda Llano la virgen, socializacion metodologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 2122 DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.274.651,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.274.651,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.027.465,10	2	7	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.013.732,55	2	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.054.930,20	2	7	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034542

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/07/2024

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024		30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024		30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025		30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024		31	3	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	7	5	2024		30	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	7	5	2024		30	6	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	6	2025		30	6	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

ICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGE Desde				Hast		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	5	7	2024		30	6	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo			% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
					Desde				Hasta		
Cumplimiento			10%	$ 20.051.307,60	2	9	2024		30		2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					Día	Mes	Año				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%	$ 10.025.653,80	2	9	2024		30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%	$ 40.102.615,20	30	9	2025		30	9	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100034560

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
					Desde				Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				$ 284.700.000,00	2	9	2024		30	9	2025
Otros					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100008284 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma: _____
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.13 16:49:36 -05:00

Código de Seguridad: NiKf8jOfaIqdntkwldKbug==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034542	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18138019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.000.673-1
DIRECCIÓN	VDA LLANO DE LA VIRGEN FCA VILLA POLA	**TELÉFONO**	3224661751
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 21/03/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2122 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/04/2026	20.027.465,10	14.650,23
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/09/2024	24:00 Horas Del 30/06/2028	10.013.732,55	5.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2025	24:00 Horas Del 30/06/2030	40.054.930,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.096.127,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	19.650,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	19.650,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.733,54
TOTAL A PAGAR	$	23.383,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100034542	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18138019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/07/2024	24:00 Horas Del	30/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN , EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 900.000.673-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 02/07/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100034542** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **08/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **13** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.13 16:50:46 -05:00

Código de Seguridad: vQXMpG03xRVRAkmKG107vQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008279	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18138020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.000.673-1
DIRECCIÓN	VDA LLANO DE LA VIRGEN FCA VILLA POLA	**TELÉFONO**	3224661751
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	3219524750
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE COELLO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA E INSTITUTO NACIONAL DE	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 02/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 21/03/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 30/06/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2122 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	212.940,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	212.940,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	212.940,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	40.458,60
TOTAL A PAGAR	$	253.398,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008279	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18138020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	02/09/2024	24:00 Horas Del	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

QUE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. . 900.000.673-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS - INVÌAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 02/07/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 02/07/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO COELLO 2122 – 2024 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO No. 2122 - 2024 (Indicar número y año)

EJECUTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN NIT 900000673_1

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Desembolso						Presupuesto inicial								-				-	197.789.643,30	
8	ADMINISTRATIVOS	$ 972,74	14/08/2024	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.790.616,04	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.621,88	31/08/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.792.237,92	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.675,30	30/09/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.793.913,22	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.621,91	31/10/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.795.535,13	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.675,33	30/11/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.797.210,46	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.679,30	31/12/2024				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.798.889,76	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.517,12	31/01/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.800.406,88	
	ADMINISTRATIVOS		28/02/2025				DB Transferencia (Poliza C y Ex)						$ 89.990,00		89.990,00				89.990,00	197.710.416,88	
	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025				GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	197.696.066,88	
	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025				GASTOS FINANCIEROS 4X1000						$ 417,36		417,36				417,36	197.695.649,52	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.679,15	26/03/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.697.328,67	
	ADMINISTRATIVOS		31/03/2025				REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS								-				-	197.697.328,67	
	ADMINISTRATIVOS		26/03/2025				REINTEGRO DEVOLUCION 4X1000								-				-	197.697.328,67	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.625,15	10/04/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.698.953,82	
	ADMINISTRATIVOS		30/04/2025				DB Transferencia (Poliza C y Ex)						$ 276.782,00		276.782,00				276.782,00	197.422.171,82	
	ADMINISTRATIVOS		27/05/2025				GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	197.407.821,82	
	ADMINISTRATIVOS		27/05/2025				ND 4x1000						$ 1.164,53		1.164,53				1.164,53	197.406.657,29	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.678,19	27/05/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.408.335,48	
	ADMINISTRATIVOS		31/05/2025				REINTEGRO DEVOLUCION 4X1000								-				-	197.408.335,48	
	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025				REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS								-				-	197.408.335,48	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.622,90	09/06/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.409.958,38	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.676,26	30/06/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	197.411.634,64	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.107,13	31/07/2025				Devolucion Imp. 4X1000								-				-	197.412.741,77	
	ADMINISTRATIVOS	$ 188.160,00	27/05/2025				REINTEGRO OPERACION NO EXITOSA								-				-	197.600.901,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA ELEMENTOS DOTACIONES	MACRODOTAMOS SAS	901589266				$ 1.771.847,00		1.771.847,00				1.771.847,00	195.829.054,77	
	EQUIPO Y HERRAMIENTA		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA ELEMENTOS FERRETERI	MAURICIO CONDE	93131413				$ 26.190.669,00		26.190.669,00				26.190.669,00	169.638.385,77	
	MATERIALES		20/08/2025				DESEMBOLSOS TRANSPORTE DE MATERIALES	DIEGO ACEVEDO	1070612955				$ 2.875.950,00		2.875.950,00				2.875.950,00	166.762.435,77	
	MATERIALES		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA MATERIALES PETREOS	TRITURADOS DEL TOLIMA LTDA	800178816				$ 1.468.477,00		1.468.477,00				1.468.477,00	165.293.958,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSOS APERTURA CAJA MENOR	ROBER ROJAS	93131885				$ 300.000,00		300.000,00				300.000,00	164.993.958,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA DE VALLA	ADRIANA CARRILLO	1082125082				$ 90.000,00		90.000,00				90.000,00	164.903.958,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSOS TRANSPORTE DIGNATARIO	ROBER ROJAS	93131885				$ 400.000,00		400.000,00				400.000,00	164.503.958,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSOS EXAMENES MEDICOS	ASSOMET ASESORES SAS	900599216				$ 188.160,00		188.160,00				188.160,00	164.315.798,77	
	EQUIPO Y HERRAMIENTA		20/08/2025				DESEMBOLSOS ALQUILER MAQUINAS	ANGELA SAAVEDRA	1031150431				$ 10.992.000,00		10.992.000,00				10.992.000,00	153.323.798,77	
	MATERIALES		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA DE AGREGADOS	AGREGADOS EL MANA PB SAS	901204999				$ 6.183.720,00		6.183.720,00				6.183.720,00	147.140.078,77	
	MATERIALES		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA DE MADERA	CARLOS PERDOMO	106917811				$ 1.230.000,00		1.230.000,00				1.230.000,00	145.910.078,77	
	MATERIALES		20/08/2025				DESEMBOLSOS COMPRA DE CEMENTO	CEMENTO ARGOS	890100251				$ 32.668.178,00		32.668.178,00				32.668.178,00	113.241.900,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				GASTOS FINANCIEROS. (12X$14,350) COMISIONES						$ 172.200,00		172.200,00				172.200,00	113.069.700,77	
	ADMINISTRATIVOS		20/08/2025				DESEMBOLSO						$ 188.160,00		188.160,00				188.160,00	112.881.540,77	
	ADMINISTRATIVOS	$ 1.398,92	25/08/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS								-				-	112.882.939,69	
	ADMINISTRATIVOS		31/08/2025				GASTOS FINANCIEROS. (12X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	112.868.589,69	
			31/08/2025												-				-	112.868.589,69	
															-				-	112.868.589,69	
															-				-	112.868.589,69	
															-				-	112.868.589,69	
TOTALES		209.711,28											85.130.764,89	-	85.130.764,89	-	-	-	85.130.764,89	27.947.536,08	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	37.182.669,00
2	MATERIALES	44.426.325,00
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	3.521.770,89
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		**85.130.764,89**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

423

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 2122 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 40512709-3 **BANCO** AV VILLAS ESPINAL SUCURSAL: AV VILLAS ESPINAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.274.651,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA 900000673_1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA DEL MUNICIPIO VENADILLO-TOLIMA,	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.618.300,82	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 132.670,00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ 326.406,14	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 3.077.376,96	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.656.350,18

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ 10.992.000,00	$ 10.992.000,00	$ 10.008.000,00
2	MATERIALES	$ 114.486.549,77	$ -	$ 67.741.044,00	$ 67.741.044,00	$ 46.745.505,77
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ 2.875.950,00	$ 2.875.950,00	$ 27.124.050,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.785.729,27	$ 352.186,42	$ 2.934.050,95	$ 3.286.237,37	$ 2.499.491,90
6	PAGA	$ 4.518.337,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.518.337,00
7	POLIZAS	$ -				
		$ 197.790.616,04	$ 352.186,42	$ 84.543.044,95	$ 84.895.231,37	$ 112.895.384,67

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 18.072,49 $ 1.398,92
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 19.471,41
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**.

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/08/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **2122 - 2024** **EJECUTOR:** **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ 10.992.000,00	$ 10.008.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ 67.741.044,00	$ 46.745.505,77	$ 114.486.549,77	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 2.875.950,00	$ 27.124.050,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 350.510,16	$ 1.676,26	$ 2.934.050,95	$ 2.499.491,90	$ 5.785.729,27	3%
6	PAGA	$ -	$ -		$ 4.518.337,00	$ 4.518.337,00	2%
	TOTAL					**$ 197.790.616,04**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3515 - 2024	
OAC	ASOCIACON DE CABILDOS INIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	DARIO BOTACHE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	201.550.463	
FECHA DE INICIO	11/10/2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	23/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	presidenciaacit2017@gmail.com	
CELULAR	3124000009	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria

El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.

El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.

El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.

El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024

El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia del convenio JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024.

El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024, Mesas de Inca convenio 3421-2024, El Rosario convenio 3340-2024, Tamirco 3016-2024, Camino Real convenio 3247-2024, Anacarco convenio 3148-2024, El Tambo convenio 3194-2024, Rincón Anchique convenio 3167-2024, Alto del Gualí convenio 3422-2024, Alfonso Carillo convenio 2716-2024, El Diamante convenio 2854-2024, La Aurora convenio 2676-2024, San Francisco convenio 2663-2024, Los Lirios convenio 2833-2024, El Calabozo convenio 4093-

2024, Hato Viejo convenio 4031-2024, La Reforma convenio 4787-2024, Caracolí convenio 3399-2024, Rio Lindo convenio 2452-2024.

El día 23 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 28 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para la Asociación de Cabildos Indígenas, Natagaima Tolima.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interv.entoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (12)

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No.: 3515- 2024
FECHA DE INICIO: 27/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024
FECHA DE INICIO: 08/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.155.046,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al Inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JOYCO SOCIEDADES BIC — calidad en infraestructura — Empresa con propósito
CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No.: 3515- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 08/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.155.046,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA:	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No.: 3515- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ -
FECHA DE INICIO: 08/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.155.046,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
*El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA: ..... NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
INTEGRANTES: DARIO BOTACHE
CONVENIO No.: 3515- 2024 — VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 08/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.155.046,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.
*Socializacion metodologia social. para inicio de obra

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO

CONTRATISTA:	LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.		
INTEGRANTES:	DARIO BOTACHE		
CONVENIO No.	3515- 2024	VALOR INICIAL:	$ 201.550.463,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 201.550.463,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	08/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.550.463			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.550.463			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 201.550.463,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.155.046,30	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.155.046,30	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.155.046,30	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....

FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....

AVALÚOS APROBADOS: .....

PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO

Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3515 DE 2024 **CONTRATISTA:** LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.550.463,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.550.463,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.155.046,30	4	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.523,15	4	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.310.092,60	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036423

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	9	9	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.155.046,30	4	9	2024	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.077.523,15	4	9	2024	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.310.092,60	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036423

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	4	9	2024	31	10	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008791 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:19:08 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: W8I9rcF+it7doksypbGSng==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS280000000059-CODI

No. PÓLIZA	I-100036423	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.235.798-1
DIRECCIÓN	CR 3 1 22 ESQ	**TELÉFONO**	3172791036
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-98 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	**TELÉFONO**	6013770600

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 11/10/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRÓRROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 23/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 223/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.3515 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 31/08/2026	20.155.046,30	29.569,94
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	10.077.523,15	14.784,97
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	40.310.092,60	8,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 70.542.662,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.354,91
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.354,91
GASTOS EXP.	$	8,00
IVA	$	8.427,43
TOTAL A PAGAR	$	52.782,34

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Dario Fernando Botacio Tique
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA- AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036423	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148019	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT), EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 800.235.798-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 04/09/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 04/09/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036423** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **09/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036423** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **09/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:20:38 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: wdP1XPyeGO22by1FBO8eWw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 20-03-2021-1317-P-06-PPSUSER2000000027-D001

No. PÓLIZA	I-100008791	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148023	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.235.798-1
DIRECCIÓN	CR 3 1 22 ESQ	TELÉFONO	3172791036
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE COVAIMA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 11/10/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRÓRROGA DEL 12/05/2025 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION DEL 23/12/2024, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL 14/02/2025 CON FECHA DE REINICIO DEL 223/05/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.3515 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.690,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	417.690,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.690,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.051,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Dario fernando Botache Tique
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	1-100008791	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	18148023	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (ACIT) , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 800.235.798-1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 04/09/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 04/09/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3515 – 2024 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3515 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA **NIT** 800235798 1

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	809002290-3				-		-					199.123.516,29	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Poliza C y Ex)						542.761,07		542.761,07				542.761,07	198.580.755,22	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Poliza C y Ex)		GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	198.566.405,22	
5	ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 2.228,44		2.228,44				2.228,44	198.564.176,78	
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.690,71	31/05/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.565.867,49	
5	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 268,82	31/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.566.136,31	
	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 1.666,67	30/04/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.567.802,98	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.632,21	30/06/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.569.435,19	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.685,85	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.571.121,04	
	REINTEGROS FINANCIEROS	$ 2.228,44	20/05/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000						-		-				-	198.573.349,48	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.685,88	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
													-		-				-	198.575.035,36	
TOTALES		10.858,58											559.339,51	-	559.339,51	-	-	-	559.339,51	198.564.176,78	
																			EXTRACTO	198.575.035,36	
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	- 10.858,58	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	559.339,51
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.694,65
9	REINTEGROS FINANCIEROS	4.163,93
TOTAL DE SUBTOTALES		**559.339,51**

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

449

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3515 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29589- 4 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 201.550.463,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA NIT 800235798 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.426.946,71	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.426.946,71	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 199.123.516,29

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
2	MATERIALES	$ 115.568.163,29	$ -	$ -	$ -	$ 115.568.163,29
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 6.000.000,00	$ 555.766,95	$ 3.914,32	$ 559.681,27	$ 5.440.318,73
6	PAGA	$ 4.555.353,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.555.353,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 199.123.516,29	$ 555.766,95	$ 3.914,32	$ 559.681,27	$ 198.563.835,02

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 6.944,26 $ 1.685,88
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 8.630,14
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA **31/08/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3515 - 2024** **EJECUTOR:** **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA**
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO COYAIMA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 115.568.163,29	$ 115.568.163,29	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 554.081,10	$ 1.685,85	$ 3.914,32	$ 5.440.318,73	$ 6.000.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.555.353,00	$ 4.555.353,00	2%
	TOTAL					**$ 199.123.516,29**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA (13)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3421 - 2024	
OAC	COMUNIDAD INIGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN	
OBJETO	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$200.248.396	
FECHA DE INICIO	27/SEPTIEMBRE 2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	19/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	31 DE OCTUBRE 20258	
CORREO ELECTRONICO	Cabildopijaomesasdeinca@gmail.com	
CELULAR	3155640675	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria

El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.

El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.

El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.

El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.

Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.
INTEGRANTES: LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN
CONVENIO No. 3421- 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No. 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 08/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.248.396,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.024.839,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....

FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....

AVALÚOS APROBADOS: .....

PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEFI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA,		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS	
CONVENIO No.	3421- 2024	VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.248.396,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.024.839,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ	
INTEGRANTES:	LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN		INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS	
CONVENIO No.	3421- 2024	VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.248.396,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.024.839,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.
2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024, Mesas de Inca convenio 3421-2024,

*El día 21 de agosto de

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA:  NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA,			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3421- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.248.396,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.248.396,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.248.396,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.024.839,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el Item de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024 *El día 26 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 27 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para la Cabildo Indígena de la comunidad Mesas de Inca, Municipio Coyaima Tolima.
*. Socialización metodología social inicio de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion metologia social



Socializacion metologia social



Socializacion metologia social

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA _____ NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ

(Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Teniendo en cuenta la visita a campo y verificacion de las actividades a realizar, el alcance meta física generado por INVIAS de 151 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que ge

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima departamento del Tolima en el cabildo indígena mesas de inca, en el corredor vial denominado loma alta, con una longitud de 4,7 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+0000 Rio magdalena, y el punto final de referencia es PR4+700 cruce hacia mesas de san juan.

CONVENIO

CONTRATISTA: COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA.
INTEGRANTES: LUIS EDUARDO NEUTO JOVEN
CONVENIO No.: 3421- 2024 — VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00
FECHA DE INICIO: 27/09/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 11/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ
INTEGRANTES: JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS
CONTRATO No.: 3555 DE 2024 — VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: 08/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.248.396			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.248.396			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.248.396,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.024.839,60	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.024.839,60	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.024.839,60	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____ NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____ NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____ NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____ NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____ NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____ NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____ NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.

4.3PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIALCONTRATO DE OBRA

Luego de comité No. 1 se realiza envió de archivos que soportan los formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1 acta comité de operativo - aprobación personal.

Por otra parte, luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

4. 4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Al no contar con las etapas previas debidamente surtidas que den pie a dar inicio de obra del convenio, no se tiene en cuenta el estado general del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo reportado, no se han realizado ensayos de laboratorio que permitan realizar control de calidad en material para la obra.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3421 DE 2024 **CONTRATISTA:** CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/09/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.248.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.248.396,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO (INICIAL)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.024.839,60	29	8	2024	31	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.012.419,80	29	8	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.049.679,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036162

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	29	8	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008724 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.024.839,60	27	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.012.419,80	27	9	2024	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.049.679,20	31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036162

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	5	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008724 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20.024.839,60	12	5	2026	31	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.012.419,80	12	5	2025	31	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.049.679,20	31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100036162

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	27	9	2024	31	10	2025
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100008724 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: HENRRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
Matrícula Profesional No.: 263892-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

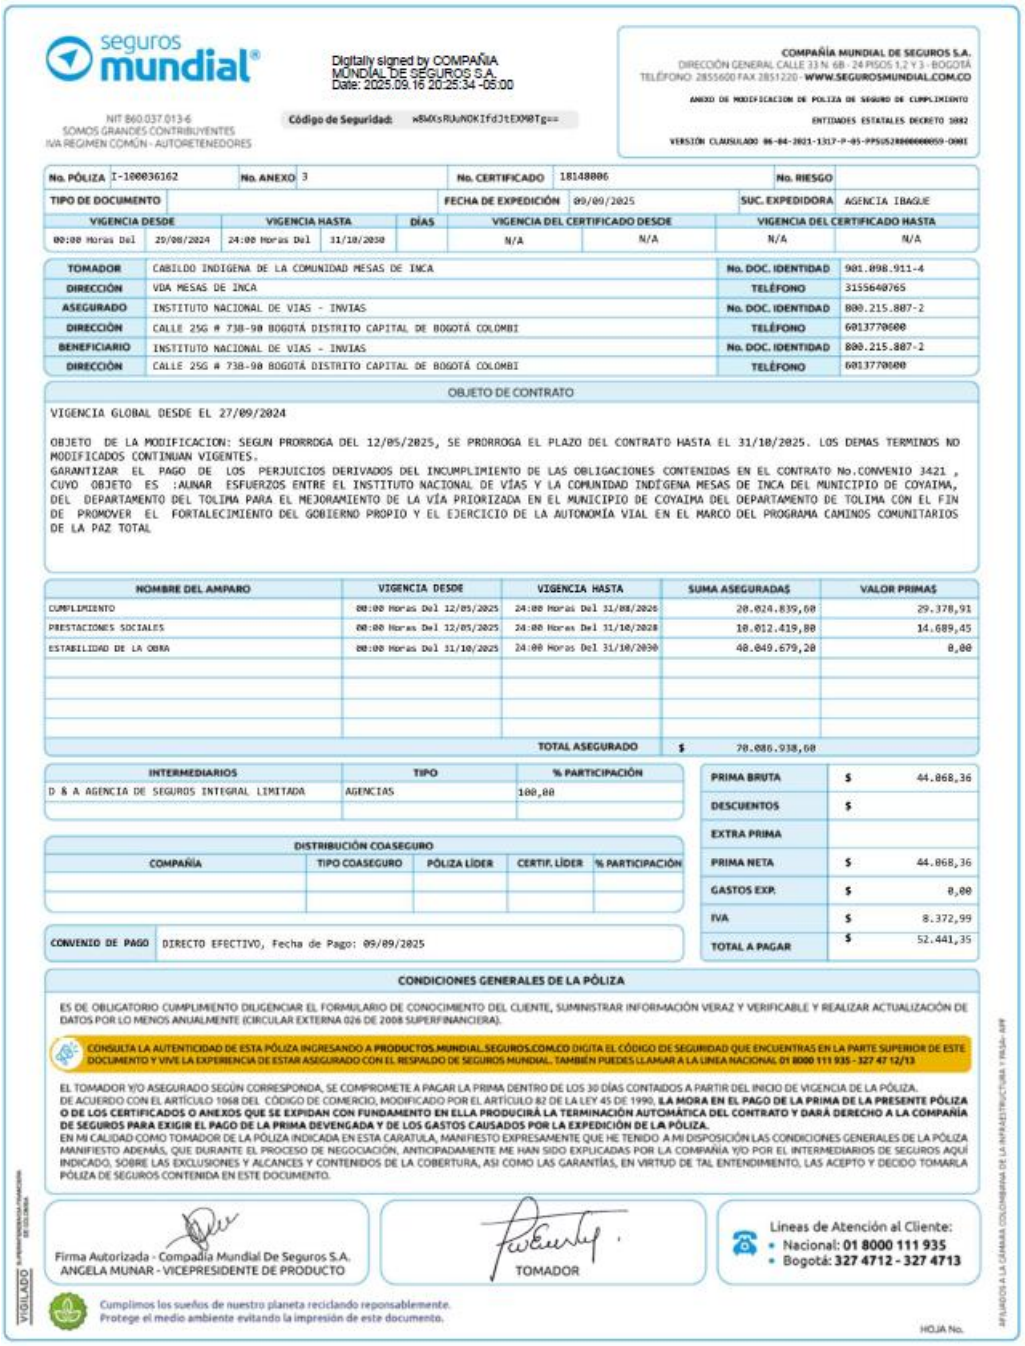

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:25:34 -05:00

Código de Seguridad: w8WXsRUuNOKIfdJtEXMBTg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52800000059-0001

No. PÓLIZA	I-100036162	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148006	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA	No. DOC. IDENTIDAD	901.098.911-4
DIRECCIÓN	VDA MESAS DE INCA	TELÉFONO	3155640765
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770400

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONVENIO 3421 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/08/2026	28.024.839,60	29.378,91
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/05/2025	24:00 Horas Del 31/10/2028	18.012.419,80	14.689,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/10/2025	24:00 Horas Del 31/10/2030	48.049.679,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 78.086.938,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.868,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.868,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.372,99
TOTAL A PAGAR	$	52.441,35

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA



seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100036162	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	18148006	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/08/2024	24:00 Horas Del	31/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS DE VIGENCIA, NO. 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOTA 2: QUE LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA O, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA NIT. 901.098.911-4 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.9

NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 29/08/2024 (FECHA SECOP II) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 29/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 4: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

NOTA 5: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100036162** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **09/09/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **16** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co
Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
@SegurosMundial

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.16 20:27:08 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 5akZeDcrq38vAohNViK1ZQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-01-3025-1317-P-06-PPS15000000027-0001

No. PÓLIZA	I-100008724	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148031	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA	No. DOC. IDENTIDAD	901.098.911-4
DIRECCIÓN	VDA MESAS DE INCA	TELÉFONO	3155640765
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS/CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B-90 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ COLOMBI	TELÉFONO	6013770600
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS/MUNICIPIO DE COYAIMA E INSTITUTO NACIONAL DE VÍA	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA GLOBAL DESDE EL 27/09/2024

OBJETO DE LA MODIFICACION: SEGUN PRORROGA DEL 12/05/2025, SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/10/2025. LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CONVENIO 3421 , CUYO OBJETO ES :AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDÍGENA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	417.698,00
PATRONAL	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D & A AGENCIA DE SEGUROS INTEGRAL LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	417.698,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	417.698,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	79.361,10
TOTAL A PAGAR	$	497.851,10

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100008724	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	18148031	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/09/2024	24:00 Horas Del	31/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

QUE LA COMUNIDAD INDIGENA MESAS DE INCA , DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON NIT. 901.098.911-4 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO Y QUE LOS TERCEROS AFECTADOS Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS CON NIT 800.215.807-2 TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA A PARTIR DEL 29/08/2024 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL (FECHA FIRMA EN SECOP II) 29/08/2024, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DECIMONOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN N ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

COBERTURAS EXPRESAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO $260.000.000 DEDUCIBLE 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2.00 SMMLVL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo reportado, el proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para estudios y diseños, junto al perfeccionamiento de convenio, por ende, el seguimiento al plan de calidad de contrato de obra está sujeto a la suscripción del acta de inicio de la obra de mejoramiento vial planteada.

4.8 ACTAS

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños, luego de que se surtan estos comités se dejara registro en actas de reunión.

5.0 COMPONENTE FINANCIERO CONVENIO COYAIMA 3421 – 2024 CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA DEL TOLIMA

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Se deja referencia que, a la fecha, se han realizado reuniones virtuales en proceso de orientar a las OAC, comunidades y/o resguardos indígenas, se plantea realizar comité de obra cuando se cuente con los insumos que indiquen preaprobación de estudios y diseños.

5.2 AUXILIAR DETALLADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONVENIO No. 3421 - 2024 (Indicar número y año) **EJECUTOR:** CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA **NIT** 901098911 4

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	Presupuesto inicial			extracto bancario			Presupuesto inicial	JUNTA DE ACCION COMUNAL	809002290-3				-		-				-	197.793.711,64	
5	DB Transferencia (Polza C y Ex)		20/05/2025	extracto bancario			DB Transferencia (Polza C y Ex)						$ 437.814,63		437.814,63				437.814,63	197.355.897,01	
5	GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES		20/05/2025	extracto bancario	DB Transferencia (Polza C y Ex)		GASTOS FINANCIEROS. (1X$14,350) COMISIONES						$ 14.350,00		14.350,00				14.350,00	197.341.547,01	
5	GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000		20/05/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 1.808,66		1.808,66				1.808,66	197.339.738,35	
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.679,87	31/05/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.341.418,22	
5	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN	$ 320,43	31/03/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.341.738,65	
	GASTOS FINANCIEROS RETEFUENTE		31/03/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS RETEFUENTE						$ 22,43		22,43				22,43	197.341.716,22	
	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN	$ 1.602,14	30/04/2025	extracto bancario			REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.343.318,36	
	GASTOS FINANCIEROS RETEFUENTE		30/04/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS RETEFUENTE						$ 112,15		112,15				112,15	197.343.206,21	
	GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000		25/06/2025	extracto bancario			GASTOS FINANCIEROS ND 4x1000						$ 0,54		0,54				0,54	197.343.205,67	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.622,15	30/06/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.344.827,82	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.675,46	31/07/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.346.503,28	
	REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	$ 1.808,66	21/05/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000						-		-				-	197.348.311,94	
	REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	$ 0,54	25/06/2025	extracto bancario			REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS 4X1000						-		-				-	197.348.312,48	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.675,48	31/08/2025	extracto bancario			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-		-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
															-				-	197.349.987,96	
TOTALES		10.384,73											454.108,41	-	454.108,41	-	-	-	454.108,41	197.339.603,23	
																			EXTRACTO	197.349.987,96	
																			DIF(EXTRAC-SALDO)	- 10.384,73	

SUBTOTALES		
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
2	MATERIALES	-
3	TRANSPORTES	-
4	MANO DE OBRA	-
5	ADMINISTRATIVOS	-
6	PAGA	-
7	GASTOS BANCARIOS	-
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.652,96
9	REINTEGROS FINANCIEROS	-
TOTAL DE SUBTOTALES		-

Firma:
Nombre: **HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ**
PROFESIONAL FINANCIERO 1
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

475

5.3 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3421 - 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No. 401.29588- 6 **BANCO** AV VILLAS IBAGUE SUCURSAL: AV VILLAS IBAGUE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.248.396,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JCABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA -TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA NIT 901098911 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3555 DE 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JJ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SECOP		DICIEMBRE DEL 2024	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIPIO DE ANZOATEGUI - TOLIMA	$ 1.000.000,00	APORTE DE LA OAC
EXPIDE INVIAS		DICIEMBRE DEL 2024	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 1.454.684,36	PAGO DE POLIZA PARA INICIO DE CONTRATO
AV VILLAS		MARZO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
AV VILLAS		MAYO DEL 2025	BANCO AV VILLAS	$ -	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
				$ 2.454.684,36	

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

$ 197.793.711,64

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL CONVENIO POR ÍTEM **5000000**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 22.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00
2	MATERIALES	$ 114.776.136,64	$ -	$ -	$ -	$ 114.776.136,64
3	TRASPORTE	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
4	MANO DE OBRA	$ 21.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00
5	ADMINISTRATIVOS	$ 5.500.000,00	$ 450.559,28	$ 3.484,68	$ 454.043,96	$ 5.045.956,04
6	PAGA	$ 4.517.575,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.575,00
7	POLIZAS	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
		$ 197.793.711,64	$ 450.559,28	$ 3.484,68	$ 454.043,96	$ 197.339.667,68

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) $ 6.900,05 $ 1.675,48
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 8.575,53
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -
0	$ -				$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre de la Organización de Acción Comunal.**

Firma:
Nombre: HENRY ALBERTO VANEGAS CRUZ
PROFESIONAL FINANCIERO
CONSORCIO VIAL JJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5.4 PLAN DE INVERSION Y DESEMBOLSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: **31/08/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TOLIMA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. **3421 - 2024** (Indicar número y año) **EJECUTOR:** **CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE CCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESAS DE INCA DEL MUNICIPIO COYAIMA-TOLIMA,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **3555-2024** (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JJ

JUSTIFICACIÓN:

5

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO .

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ -	$ -	$ -	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	11%
2	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ 114.776.136,64	$ 114.776.136,64	58%
3	TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	15%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00	11%
5	ADMINISTRATIVOS	$ 448.883,82	$ 1.675,46	$ 3.484,68	$ 5.045.956,04	$ 5.500.000,00	3%
6	PAGA	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.575,00	$ 4.517.575,00	2%
	TOTAL					**$ 197.793.711,64**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DAGOBERTO JUNIOR JIMENEZ ZAMBRANO
Profesional financiero II
Matrícula Profesional No.: 176307-T

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

3.0 INFORMACION DEL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO (14)

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONVENIOS

CONVENIO	3340 - 2024	
OAC	COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO BARRIOS VIUCHE	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
VALOR INICIAL	$200.493.740	
FECHA DE INICIO	27/SEPTIEMBRE 2024	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	
SUSPENSIÓN	DESDE	HASTA
	19/12/2024	31/03/2025
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	19/02/2025	31/05/2025
REINICIO CONVENIO	25 ABRIL 2025	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	07 DE MAYO 2025	30 DE JUNIO 2025
FECHA DE TERMINACION	HASTA 30 DE JUNIO 2025	
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE 2025	
CORREO ELECTRONICO	comunidadindigenaelrosario@outlook.com	
CELULAR	3124000009	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.

Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS

El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria

El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.

El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.

El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios.

El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.

El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.

El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

El día 21 de agosto de 2025 modificación por prórroga para nueva vigencia de los convenios: JAC el Cabildos Indígenas convenio 3515-2024, Mesas de Inca convenio 3421-2024, El Rosario convenio 3340-2024, Tamirco 3016-2024, Camino Real convenio 3247-2024, Anacarco convenio 3148-2024, El Tambo convenio 3194-2024, Rincón Anchique convenio 3167-2024, Alto del Gualí convenio 3422-2024, Alfonso Carillo convenio 2716-2024, El Diamante convenio 2854-2024, La Aurora convenio 2676-2024, San Francisco convenio 2663-2024, Los Lirios convenio 2833-2024, El Calabozo convenio 4093-2024, Hato Viejo convenio 4031-2024, La Reforma convenio 4787-2024, Caracolí convenio 3399-2024, Rio Lindo convenio 2452-2024.

El día 26 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 28 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para la **Comunidad Indígena el rosario**, Municipio Coyaima Tolima.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, no se presenta la necesidad de inclusión de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría recepciona los informes y resultados de los ensayos de laboratorio y topografía emitidos para OAC, resguardo y/o comunidad indígena.
Actualmente la interventoría inicia con proceso de verificación de soportes técnicos, para elaborar diseño de pavimento y diseño geométrico del mejoramiento vial a construir.

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO COYAIMA 3340 – 2024 COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO

4.1INFORME MENSUAL SEMANAL

INFORME	PERIODO	
SEMANA 40	1/08/2025	07/08/2025
SEMANA 41	08/08/2025	14/08/2025
SEMANA 42	15/08/2025	21/08/2025
SEMANA 43	22/06/2025	28/08/2025
SEMANA 44	29/08/2025	04/09/2025

CONSORCIO VIAL JJ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 40 del 01/08/2025 al 07/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 156 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la "Y" y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden.

CONVENIO

CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA ROSARIO, MUNICIPIO DE COYAIMA		
INTEGRANTES:	ARMANDO BARRIOS VIUCHE		
CONVENIO No.	3340- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.493.740,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.493.740,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.493.740			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.493.740			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.493.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.049.374,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 419.537.102,20	20,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 01 de agosto de 2025 respuesta de solicitud radicación cuenta del mes de junio 2025 CTO de Tolima red terciaria a INVIAS.
*Se envía correo de relación de convenios que cuentan con la prolongación de diseño de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS CTO 3555 2024 de Tolima red terciaria para INVIAS.
*El día 04 de agosto de 2025 reunión virtual para seguimiento CTO 3555 2024 por parte del Ingeniero Juan David Torres Sanabria.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía orden de traslado de equipos de densidades.
*El día 05 de agosto de 2025 se envía solicitud aprobación de ingreso del personal financiero, inspector SST y profesional social.
*El día 07 de agosto de 2025 reunión virtual para socialización preaprobación y aprobación de estudios

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 41 del 08/08/2025 al 14/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 156 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la "Y" y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden.

CONVENIO

CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA ROSARIO, MUNICIPIO DE COYAIMA		
INTEGRANTES:	ARMANDO BARRIOS VIUCHE		
CONVENIO No.	3340- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.493.740,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.493.740,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.493.740			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.493.740			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.493.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.049.374,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 445.993.971,40	22,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 11 de agosto de 2025 se envían pólizas actualizadas del CTO 3555-2024.
*El día 12 de agosto de 2025 se envía solicitud de certificados de calidad para tuberías de concreto reforzado.
*El día 14 de agosto de 2025 se envía acta de compromiso de reunión virtual sobre los diseños de extensión en diseño de pavimento y diseño geométrico al CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 42 del 15/08/2025 al 21/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 156 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la "Y" y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden.

CONVENIO

CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA ROSARIO, MUNICIPIO DE COYAIMA		
INTEGRANTES:	ARMANDO BARRIOS VIUCHE		
CONVENIO No.	3340- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.493.740,00
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.493.740,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.493.740			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.493.740			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.493.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.049.374,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 472.450.840,60	23,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 20 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria y programación de reunión para selección de proveedores.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 43 del 22/08/2025 al 28/08/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 156 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la "Y" y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA ROSARIO, MUNICIPIO DE COYAIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ARMANDO BARRIOS VIUCHE			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3340- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.493.740,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.493.740,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.493.740			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.493.740			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.493.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.049.374,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 498.907.709,80	24,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10%
Meta Física Ejecutada % 10%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 25 de agosto de 2025 se realiza reunión virtual de seguimiento al CTO INTERVENTORIA 3555-2024 por parte de INVIAS.
* El día 26 de agosto de 2025 se envía carta de no siniestro para autorización y firma digital para realizar la modificación de las pólizas de las prórrogas de los convenios.
*El día 26 de agosto de 2025 se envía solicitud para socialización metodología social comunitaria para el día 28 de agosto y programación de reunión para selección de proveedores para la Comunidad Indígena el rosario, Municipio Coyaima Tolima.
*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.
*El día 27 de agosto de 2025 solicitud ampliación a la suspensión del convenio 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matrícula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA — SEMANA No.: 44 del 29/08/2025 al 04/09/2025 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: INGENIERO RENZO GUTIERREZ (Numeración consecutiva)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ROSARIO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Alcance meta física generado por INVIAS de 156 m de placa huella para la proyección del actual convenio, que será replanteado de acuerdo a los soportes técnicos de diseños y a las cantidades de obras que genere.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Coyaima del departamento de Tolima en la comunidad indígena Rosario, en el corredor vial denominado La Miel que tiene una longitud de 3,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 +000 en la "Y" y el punto final de referencia es el PR3+200 en el baden.

CONVENIO				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COMUNIDAD INDÍGENA ROSARIO, MUNICIPIO DE COYAIMA			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JJ		
INTEGRANTES:	ARMANDO BARRIOS VIUCHE			INTEGRANTES:	JOYCO SAS BIC & JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS		
CONVENIO No.	3340- 2024	VALOR INICIAL:	$ 200.493.740,00	CONTRATO No.	3555 DE 2024	VALOR INICIAL:	
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	08/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 200.493.740,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONVENIO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.493.740			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.493.740			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO	$ 200.493.740,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.049.374,00	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.049.374,00	10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.049.374,00	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 525.364.579,00	26,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.456.869,20	1,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 17/06/2025
PERIODO FACTURADO: 01 al 31 de marzo de 2025
VALOR FACTURA: $ 32.824.579,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 10% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1				Prog	100%			1	10,0%
					Ejec	100%			1	10,0%
* PLACA HUELLA	1				Prog					
					Ejec					
* ALCANTARILLAS	1				Prog					
					Ejec					
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:
Las Hojas de vida del personal de apoyo técnico y operativo que acompañara a la Organización de Acción Comunal, fueron solicitadas y se encuentran en proceso de aprobación. Por otra parte luego de que se logre el perfeccionamiento del convenio, junto a la aprobación de los modelos de contrato de personal, se solicitara los documentos de seguridad social, que estarán sujetos al inicio de Obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:


VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

*El día 27 de agosto de 2025 reunión de seguimiento contractual CTO 3555-2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: .....
NOMBRE: VICTOR HUGO SANCHEZ CAMPUZANO
Matricula Profesional No.: TLM 70202 - 257182

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se encuentra en análisis de soportes técnicos para diseño, por ende a la fecha no se ha invertido presupuesto para el ítem maquinaria y equipos.
