INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

INFORME FINAL

19 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 110.2010.376.2025

CONSTRUCCIÓN DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE).

RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
R/L **C&C INGENIARK S.A.S**
Nit. 900.557.241-4
C.C. 74.810.428
CEL: 3208099418
DIR: Calle 5 No 6-46 Sabanalarga Cas
EMAIL: gerenciacycingeniarksas@gmail.com

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

INFORME FINAL

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 110.2010.376.2025	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE).
VALOR DEL CONTRATO:	$ 197.820.555.oo
VALOR ADICIONAL:	N.A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.820.555.oo
CONTRATISTA:	C&C INGENIARK S.A.S
CORREO ELECTRONICO:	GERENCIACYCINGENIARKS.A.S@GMAIL.COM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIO	Diecinueve (19) de noviembre del 2025
PRORROGA:	N.A
SUSPENSIÓN:	N.A
TIEMPO:	N.A
REINICIO:	N.A
PLAZO	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre del 2025

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	YIMMER FERNANDO CARO

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	**SABANALARGA**	**VEREDA:**	**CAÑO BLANCO**
CORREGIMIENTO:	**N.A**	**BARRIO:**	**N.A**
COMUNA:	**N.A**		
COORDENADAS:	**4°55'57.64''N - 72°59'49.46''O**		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

DESCRIPCIÓN TRAMO A EJECUTAR

El objeto de este contrato tiene como finalidad mejorar la transitabilidad en las vías que conducen a las veredas altas del municipio de Sabanalarga Casanare, (caño blanco, palmichal y puerto nuevo.

- ✓ **VEREDA CAÑO BLANCO**

COORDENADAS:	4°55'57.62''N - 72°59'49.56''O

Para este tramo se tiene contemplado la construcción de 167 metros lineales de placa huella, que contempla el replanteo y localización para vías, del tramo donde se ejecutaran las actividades, excavaciones mecánicas con retiro y disposición final del material, estos para realizar en los 167 metros lineales de tramo de vía, la conformación de la banca, actividad que se realizara con maquinaria amarilla tipo motoniveladora, esta actividad se realiza con el suministro de material de cantera tipo sub-base granular seleccionada, se contempla la excavación manual para las riostras y las cunetas, y la movilización y desmovilización del equipo pesado.
Después de tener la vía totalmente conformada, se inicia con la instalación del acero de las placas huella tanto longitudinales como transversales, la instalación de la formaleta con dimensiones de 2.80 ml de larga y 0.90 metros lineales de ancha y un espesor de 0.15 metros, luego se fundirá la piedra pegad ubicada entre las placa huella, de esta manera se da habilitación a la vía, teniendo restricciones de tránsito, luego se realizara la construcción de las cuentas alternadas con la excavación manual de las riostras he instalación de solado y acero para terminar con la disposición del concreto.

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



TRAYECTO OCENSA. 167 ML

Google

INFORME LIQUIDACION

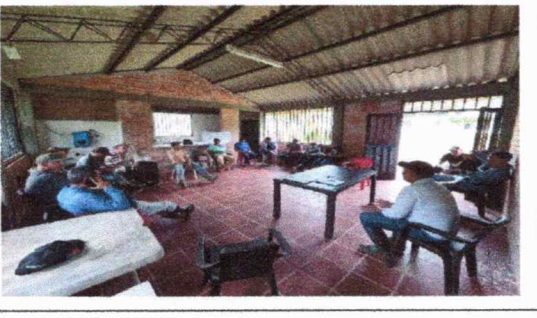
CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA
19/11/2025	ACTA DE INICIO	Secretaria de planeación obras publicas
30/12/2025	PARCIAL 1	Secretaria de planeación obras publicas
31/12/2025	ACTA DE TERMINACION	Secretaria de planeación obras publicas
3/03/2026	ACTA DE RECIBO	Secretaria de planeación obras publicas

Se realizó acompañamiento a la socialización del proyecto programada por la Administración Municipal

Se realizó acompañamiento a la socialización del proyecto programada por la Administración Municipal
 

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

2. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

El problema más representativo en la ejecución de las actividades fue básicamente la demora en la entrega de materiales por parte de la empresa Ocensa, materiales como la tabla el cemento indispensable para el arranque de la obra, teniendo en cuenta que el contrato tiene fecha de acta de inicio el 19 de noviembre del 2025, se recibió el 100% de los materiales el día 3 de diciembre 2025, lo que genero algo de retraso en la ejecución de las actividades proyectadas.
Para resolver esto nosotros disponemos del personal necesario para nivelar las actividades y así adelantar las actividades retrasadas en el desarrollo del proyecto.

Por el gran tránsito de volqueta en el sector, teniendo en cuenta que para nosotros es indispensable subir todo el material de construcción, cemento, gravilla, arena, subbase, relleno granular, etc., se presentó dificultades en el paso vehicular en el sector caño blanco donde las volquetas no podían pasar por el deterioro de la vía en este sector, fue necesario alquilar una maquina retrocargador para realizar actividades de mantenimiento de vía.

3. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	2
TORMENTA	2
LLUVIOSO	2
SOLEADO	36

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los datos diarios registrados en la bitácora de obra se puede establecer que durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 31 de diciembre se presentó buen tiempo, a excepción de 6 días en que se presentaron lluvias moderadas.

Para la ejecución del proyecto en la vereda el caño blanco, se tiene un estado del clima favorable, de 42 días laborables se tienen 36 días soleados permitiendo el rendimiento y ejecución de la obra, y se tienen 6 días de lluvia en las cuales se retrasaron las actividades las cuales fueron reprogramadas en los días siguientes, el porcentaje de días soleados es del 86% contra un porcentaje de lluvias del 14%.

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo a compresión en cilindros de concreto VEREDA CAÑO BLANCO	01-12-2025, TOMA DE CILINDROS. PARA CONCRETO DE LOZA PLACA RESISTENCIA 3000 PSI	NORMA DE ENSAYO INV E-410-12

INGENIERIA & LABORATORIO	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO Carrera 17 Nº 15-61 Tel. 098-638 3195 Cel. 3112878638 laboratoriowi@hotmail.com	Versión: 3 Código: R-OPE-05 Fecha De Aprobación: 30/07/2012

Interesado: C&C INGENIARK S.A.S — **Fecha Informe** 16 de diciembre de 2025

Proyecto: construcción de 167 metros de placa huella en la vereda caño blanco y mantenimiento de la vía hacia la vereda planadas, del municipio de Sabanalarga, Casanare, en el marco del convenio no 3600029 entre oleoducto central s.a. y municipio de Sabanalarga (Casanare).". — **Reporte** MEZCLAS DE PRUEBA


NORMA DE ENSAYO INV E-410-13

Muestra Nº	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad Días	Fuerza en kN	Fuerza en lbf	Diámetro mm	Área mm²	Esfuerzo Obtenido lbf/pg²	Esfuerzo Obtenido Mpa	Resistencia deseada P.S.I	Resistencia deseada Mpa	Resistencia Posible a 28 días lbf/pg²	Resistencia Posible a 28 días Mpa	% de Resistencia	Tipo de Falla	Elemento	Localización
1	01/12/2025	04/12/2025	3	120,08	26.995	100,0	7.854	2.217	15,29	3.000	27,6			55,4%	6	DOSIFICACION: 1,0-1,5-2,0 Grava 1" Arena producto de trituración, Cemento Holcim.	CANTERA LA MILAGROSA
1	01/12/2025	08/12/2025	7	176,24	39.620	100,0	7.854	3.255	22,44	3.000	27,6	3.681	32,3	81,4%	1		
1	01/12/2025	08/12/2025	7	171,65	38.588	100,0	7.854	3.170	21,86	3.000	27,6	3.577	31,6	79,2%	4		
1	01/12/2025	15/12/2025	14	220,73	49.622	100,0	7.854	4.076	28,10	3.000	27,6	3.728	32,6	101,9%	4		

INGENIERIA Y LABORATORIO Wladimir Castro Ing. Residente ABUAZUL CASANARE

WLADIMIR CASTRO
Tecnólogo en Obras Civiles

Observaciones;



TIPOS DE FALLA

5. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1.1. REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN PARA VÍAS

Se refiere este ítem a la ubicación de las estructuras a construir y sus zonas anexas que hacen parte integral de este proyecto, para el inicio de las labores correspondientes a confinamiento se ubicaran los ejes y se materializarán los puntos de referencia de forma tal que no se modifiquen en el transcurso de las excavaciones.

Para el desarrollo de la actividad debió disponer de una cuadrilla de albañilería, dotada con herramienta menor, durmientes y puntillas, con la cual deberá localizar e implantar el diseño in situ, dando manejo a pendientes, niveles y anchos correspondientes, dicha labor deberá asegurar la correcta ejecución de las actividades con las dimensiones y alineamientos necesarios, la unidad de medida para pago será el m2, todo de acuerdo a la verificación de la supervisión

ITEM 1.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA CON RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL

Esta actividad se realiza de acuerdo a la especificación y corresponde al trabajo de retiro de material con retroexcavadora. Se realizaron los movimientos de tierra necesarios para la adecuación de los niveles previstos para la construcción de la obra en los diferentes sectores donde se requirió de nivelación a máquina. Éstas se realizaron de acuerdo con las líneas y pendientes necearías en veneficio del proyecto.

ITEM 1.3. CONFORMACIÓN DE LA BANCA Y/O TERRAPLÉN (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN)

Este trabajo consistió en la rectificación del perfil de la vía, el adecuamiento de la capacidad de soporte, el perfilado de la superficie de la banca y el ensanche de la banca existente en donde se requirió. Los materiales deben cumplir con los requerimientos de estas especificaciones.

ITEM 1.4. RELLENO CON SUB BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA, COMPACTADA Y TRANSPORTADA

Una vez que a la superficie existente se le rectificó su perfil longitudinal, con pequeños rellenos, se procedió a compactar, extender y conformar y luego se repitió esta actividad una capa de subbase de 30 cm, cumpliendo la especiación general vigente en el Instituto Nacional de Vías.

La subbase deberá tener, COMO MÍNIMO, treinta (30) centímetros de espesor en todo el ancho de la sección transversal. Si la conformación de la superficie existente no permitió configurar el bombeo en las tangentes (-2%) y el peralte y su transición en las curvas (2%) ésta tarea se deberá efectuar al momento de construir la subbase. Lo anterior implica que la subbase tendría en la zona central de la calzada y en la parte externa de las curvas horizontales un espesor superior al mínimo de treinta centímetros (0,30 m).

ITEM 1.5. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

Esta actividad se realizó con el fin de tener la excavación para las riostras y cunetas una vez se instaló la sub base para la construcción de la placa huella.

Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento horizontal o vertical de calzadas existentes.

ITEM 1.6. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO

Esta actividad se refiere a la movilización de maquinaria pesada al sector del tramo de obra a ejecutar.

ITEM 2.1. LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 210 KG/CM2 - 3000 PSI E=0,15 M

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento, utilizados para la construcción de estructuras de la placa huella, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del supervisor. Se mezclo en sitio.

La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. - La longitud máxima de la placa-huella es de dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). Como el ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 m) la longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,0 m) y corresponde a la longitud del módulo en tangente. - El ancho de la placa-huella en tangente es de noventa centímetros (0,90 m). - Dependiendo de su deflexión y radio de curvatura las curvas horizontales pueden requerir placas-huella de anchos mayores. - El espesor de la placas-huella es de quince centímetros (0,15 m).

Las funciones de la placa-huella son: - Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos. - Canalizar la circulación vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la sección transversal no sometidas al paso de los ejes un material relativamente costoso como es

el concreto simple por uno más económico como lo es la piedra pegada (concreto ciclópeo). Lo anterior se traduce en una menor inversión.

ITEM 2.2. CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 KG/CM2 - 2000 PSI

Es el concreto que se utilizara para la protección del acero de las riostras, La cantidad de cemento definitiva siempre estará de acuerdo con el diseño de mezcla y la calidad de materiales que se utilicen. La resistencia de estos tipos de concreto no será menor a la especificada y estará de acuerdo con la resistencia de cilindros de concreto de las dimensiones descritas anteriormente.

ITEM 2.3. RIOSTRA O DIAFRAGMA CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM2-

La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. - El ancho de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m). - El espesor de la riostra es de treinta centímetros (0,30 m). Dicha riostra se apoya totalmente sobre la superficie existente, es decir en la superficie sobre la que se construye la subbase, previa la colocación de un solado de limpieza de cinco centímetros (0,05 m) de espesor.

- La longitud de la riostra es variable y se ajusta al ancho de la sección transversal sea ésta en tangente, en curva, en transición del sobreancho o en Zona de Cruce. Esta última es un tramo en tangente cuya sección transversal se ha ampliado para permitir el cruce de dos vehículos grandes como son los camiones.

ITEM 2.4. BERMA-CUNETA Y BORDILLO CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²

La Berma-cuneta son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados estructuralmente con la riostra. La razón de fundir monolíticamente la berma-cuneta y el bordillo es evitar la junta de construcción que se formaría en la frontera entre ambos elementos, junta que con el paso del tiempo se convertiría en una fisura que permitiría la infiltración del agua que correría por la berma-cuneta con el consecuente deterioro del pavimento.

Las funciones de la Berma-cuneta son: - Servir como franja de estacionamiento temporal en el caso de que un vehículo lo requiera por fallas totalmente. mecánicas u otra causa de fuerza mayor permitiendo que el flujo vehicular no se interrumpa - Permitir la recolección de las aguas lluvias y conducirlas hasta las alcantarillas y aliviaderos para su evacuación- Brindar confinamiento a la subbase.

ITEM 2.5. ACERO DE REFUERZO GRADO 60.

Se refiere este ítem a la cinta o huella que llevara una armadura o parrilla en acero arriba y abajo en las viguetas riostras con flejes en hierro, el refuerzo debe cumplir con todas las especificaciones planteadas e indicadas, su distribución debe de ser uniforme y de forma adecuada dentro de las placa huellas, con el fin de aumentarla resistencia de los mismos.

Una vez instalada la formaleta respectiva se procedió a instalar el acero de refuerzo cortado, figurado y amarrado en sitio. Se instaló la armadura o parrilla en ambos sentidos de las cintas, como también el acero de refuerzo para las viguetas intermedias que deberán fundirse monolíticamente con las franjas de huellas.

ITEM 2.6. PIEDRA PEGADA CONCRETO DE 2500 PSI, E=0.15 M.

Se colocó las franjas de piedra pegada, cuyo material se asimila a un concreto ciclópeo. El concreto incorporado en las franjas de piedra pegada tendrá una resistencia a los 28 días de 2500 Psi y su elaboración se hará según lo especificado.

La piedra pegada se colocó sobre la subbase granular una vez se encuentre fundida y fraguada la placa-huella, la riostra y la berma-cuneta circundante.

El trabajo consistió en colocar una capa de concreto simple de cinco centímetros (0,05 m) de espesor directamente sobre la subbase para luego colocar manualmente el agregado ciclópeo distribuyéndolo uniformemente. A continuación, se colocó el resto del concreto simple y manualmente hasta completar el agregado ciclópeo.
La piedra pegada es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m). Las funciones de la piedra pegada son: - Disminuir los costos de construcción del pavimento ya que es un material menos costoso que el concreto simple. - Propiciar la canalización del tránsito dado que la alta rugosidad que presenta la piedra pegada desestimula a los conductores a circular por fuera de las placas-huella que son los elementos diseñados para soportar los esfuerzos producidos por el paso de los vehículos. - Contribuir a la estética del camino.

ITEM 3.1. CONFORMACIONAL DE LÁ BANCA Y/O TERRAPLEN (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACION).

Se refiere a los trabajos de mantenimiento de vía, en la vereda planadas que hace parte de este contrato, donde se extendió unos viajes de material dispuestos por la empresa Ocensa en diferentes puntos los cuales nosotros como contratistas los utilizamos conformando la banca o vía realizando así mantenimiento de este sector.

ITEM 3.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO

Esta actividad se refiere a la movilización de maquinaria pesada al sector del tramo de obra a ejecutar.

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

PLACAS HUELLAS VEREDA CAÑO BLANCO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1,1	Replanteo y localización para vías	M2	835,00	$ 8.876,00	$ 7.411.460,00
1,2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	125,25	$ 24.988,00	$ 3.129.747,00
1,3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	M2	835,00	$ 1.244,00	$ 1.038.740,00
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	395,82	$ 19.829,00	$ 7.848.715,00
1,5	Excavación manual en conglomerado	M3	55,72	$ 52.552,00	$ 2.928.197,00
1,6	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	100,80	$ 40.715,00	$ 4.104.072,00
				SUB TOTAL CAPITULO	$ 26.460.931,00
2	PLACA HUELLAS				
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	42,34	$ 568.744,00	$ 24.080.621,00
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	M3	2,85	$ 258.560,00	$ 736.896,00
2,3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	17,10	$ 822.336,00	$ 14.061.946,00
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	43,63	$ 259.821,00	$ 11.335.990,00
2,5	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	7230,22	$ 1.008,00	$ 7.288.062,00
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	280,08	$ 199.197,00	$ 55.791.096,00
				SUB TOTAL CAPITULO	$ 113.294.611,00
3	CONFORMACION DE LA VIA VEREDA PLANADAS				
3,1	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	M2	3600,00	$ 1.244,00	$ 4.478.400,00
3,2	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	83,30	$ 40.715,00	$ 3.391.674,00
				SUB TOTAL CAPITULO	$ 7.870.074,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 147.625.516,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS AJUSTADO AL PESO	$ 147.625.516,00
			ADMINISTRACION	A= 28%	$ 41.335.172,00
			IMPREVISTO	I= 1%	$ 1.476.256,00
			UTILIDAD	U= 5%	$ 7.381.281,00
			TOTAL A.I.U	A.I.U.= 34%	$ 50.192.709,00
			TOTAL A.I.U REDONDEADO AL PESO	A.I.U.= 34%	$ 50.192.709,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U	$ 197.818.325,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U (Ajustado al peso)	$ 197.818.325,00
CIEN MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE					

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

6. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal	C&C INGENIARK S.A.S realiza la entrega de dotación y elementos de protección personal nuevo en obra. La supervisión a través de inspección visual diaria en obra y registros firmados verifica que todo el personal cuenta con la dotación y elementos de protección personal.

Anexo: FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

7. GESTION SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	22
Empleos directos generados:	6
Empleos indirectos generados:	16

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	22
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	20
Género	Femenino	2
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		22

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

8. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Señalización y demarcación en obras civiles	Se capacita al personal de obra sobre el Manejo de señalización	Capacitación concientización para personal de obra
Medidas de manejo para concreto	Para las actividades de concreto de resistencia 3000 PSI, realizo la manipulación del mezclado de concreto con los EPP necesarios y adecuados para la ejecución de esta actividad, evitando afectaciones en la piel e infecciones. De igual manera, dispuso maquinaria y equipos en buenas condiciones técnicas evitando accidentes o derrames que pudieran afectar los recursos naturales.	Manejo integral de materiales de construcción
Señalización en los frentes de trabajo	Se realiza la implementación de la señalización de obra, cerrando las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de la obra con cinta de demarcación; Además, se maneja con señalización vertical de tipo preventiva, reglamentaria e informativa, según lo establecido en el manual de señalización del Ministerio de Transporte del 2015.	Señalización frentes de obras y sitios temporales
	Se estableció un punto de servicio de atención al usuario (SAU) en la calle 5 # 6 – 46 centro. El SAU, se encuentra abierto en los horarios	

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

Instalación de servicio y atención al usuario (SAU)	de 7:00 am a 12:00 pm – 2:00pm a 5:00 pm; Aquí se atienden y responden las manifestaciones que se puedan presentar.	Atención a la comunidad
Información a las autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa e indirecta.	Para dar inicio a las actividades de obra, se realizó la socialización del proyecto del contrato 0274 de 2023, con el fin de comunicar a las autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las actividades que se iban a realizar, también se informó sobre las características técnicas del proyecto y sobre el requerimiento de mano de obra para el proyecto.	Información de divulgación

C. INFORME DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A	N.A	N.A	N.A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A	N.A	N.A	N.A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A	N.A	N.A	N.A

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

GARANTIAS: ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE RECIBO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	625 47 994000004259
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	3 de marzo de 2026
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/11/2025	06/05/2026	$ 19.782.055.50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labores	19/11/2025	06/01/2029	$ 19.782.055.50
Estabilidad y calidad de la obra	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,		$ 19.782.055.50

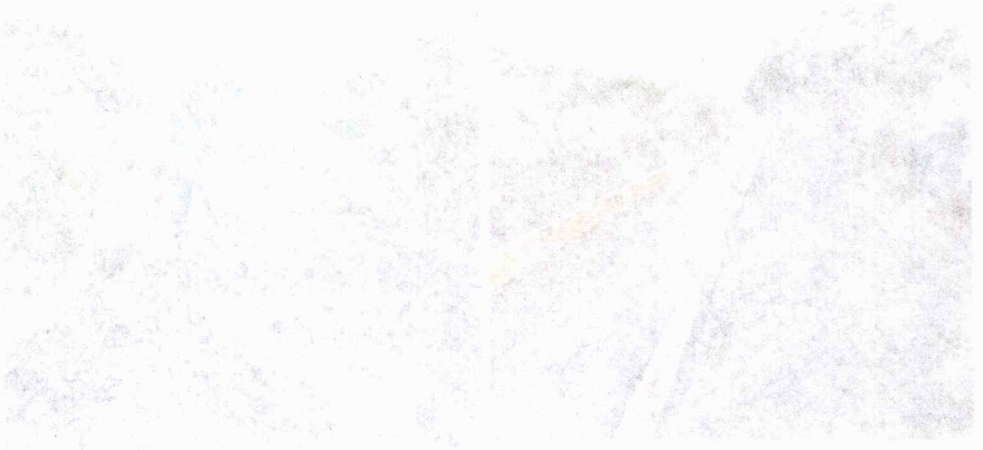
INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S


INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Replanteo y localización para vías	835.00 m2	100.00 %
1.1	  		
	OBSERVACIONES		
	proceso manual de replanteo de trasladar el diseño de unas placas hulla desde los planos al terreno, marcando puntos clave (ejes, bordes) con precisión usando instrumentos como estacas, hilos, para guiar la construcción, para asegurar que la obra se ajuste al proyecto.		

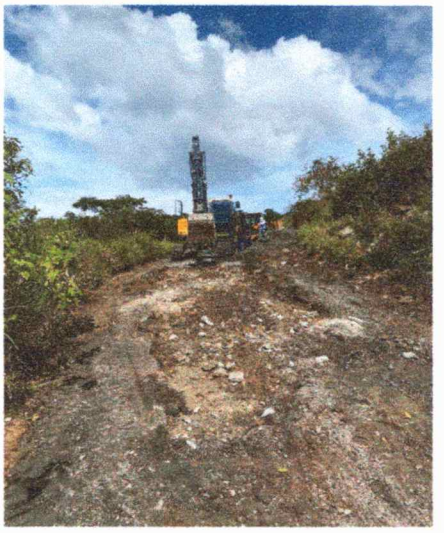




INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Excavación mecánica con retiro y disposición final	125.25 m3	100.00 %
1.2	 		
	OBSERVACIONES		
	Actividad necesaria para retirar el material suelto en la vía, y realizar la caja donde se depositará el material de mejoramiento subbase		

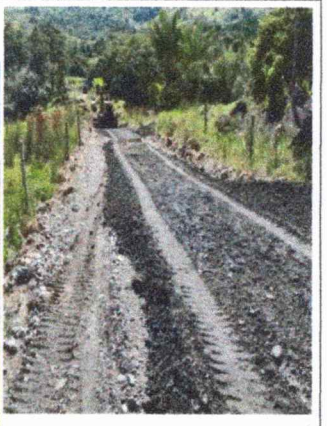
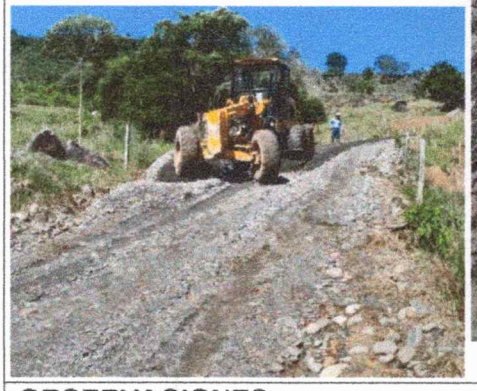
INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
1.3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	835.00 m2	100.00 %




OBSERVACIONES
Una vez realizado el relleno con material subbase, se procede a realizar la conformación de la vía con los equipos necesarios.

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
1.4	Relleno con subbase granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	395.82 m3	100.00 %
			
	OBSERVACIONES		
	Ya realizada la caja o excavación se procede a instalar la subbase seleccionada con la intención de realizar la conformación de la vía.		

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

	 
1.5	**OBSERVACIONES:** Actividad realizada manualmente para el retiro del material de excavación sobrante en las estructuras de las riostras y cunetas.

ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
	VEREDA CAÑO BLANCO	**EJECUTADO**	**%**
	Movilización y desmovilización de equipo pesado	100.80 km	100.00 %
1.6			
	OBSERVACIONES		
	Para la realización de este proyecto fue necesaria la movilización de maquinaria pesada como lo es le retroexcavadora.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	**VEREDA CAÑO BLANCO**	**EJECUTADO**	**%**
	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	42.34 M3	100.00 %
			
			
	OBSERVACIONES		
	Para la construcción de la Placa Huella en la superficie previamente acondicionada, se instalaron las formaletas de madera para garantizar que los elementos queden construidos con las secciones y espesores indicados. Se suministran he instalan todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma a los elementos, de acuerdo con lo mostrado en los planos.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

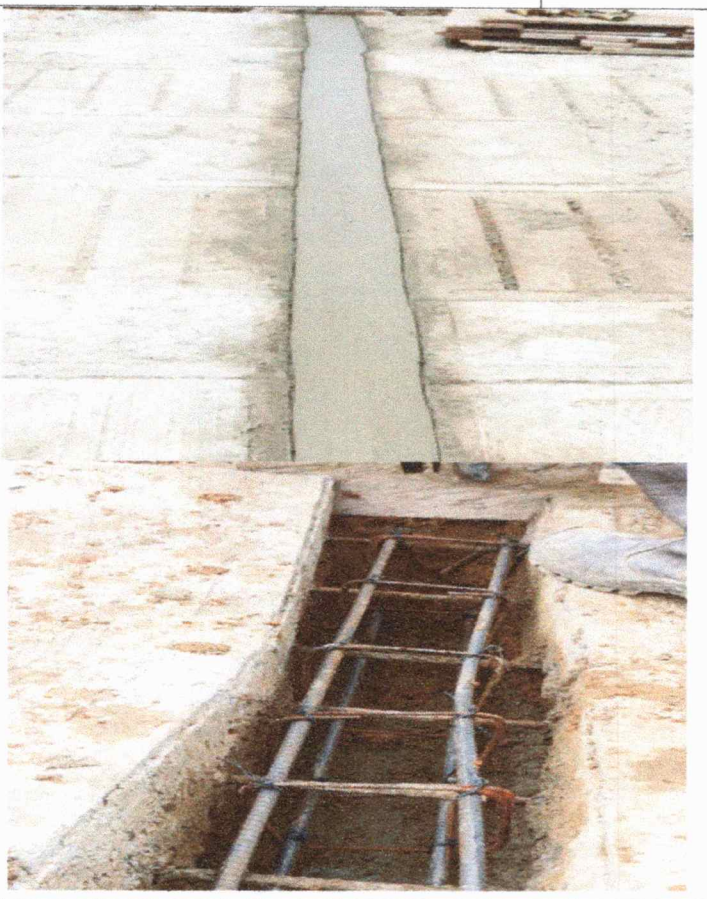
CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	**EJECUTADO**	**%**
	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	2.85 M3	100.00%
2.2	 		
	OBSERVACIONES		
	El solado para riostras (o vigas de cimentación) es una capa delgada de concreto pobre de 5 centímetros colocada en la base de la excavación. Sirve para nivelar el terreno, evitar la contaminación del concreto estructural con el suelo, facilitar el trazo de ejes y proteger el acero de la corrosión.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
2.3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	17.10 M3	100.00%
			
	OBSERVACIONES		
	Las riostras en las placas huellas son vigas transversales de concreto reforzado, de 20 cm de ancho x 30 cm alto, que confinan la sub-base, conectan los módulos de la vía y garantizan el trabajo monolítico del conjunto. Actúan como elementos de arriostramiento para la estabilidad, resistiendo esfuerzos y conectando el acero longitudinal.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.4	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	43.63 M3	100.00 %
			
			
	OBSERVACIONES		
	Para la construcción de la cuneta en la superficie previamente acondicionada, se instalaron las formaletas de madera para garantizar que los elementos queden construidos con las secciones y espesores indicados. Se suministran he instalan todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma a los elementos, de acuerdo con lo mostrado en los planos.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Acero de Refuerzo Grado 60	7230.22 KG	100.00 %
2.5	  		
	OBSERVACIONES		
	El acero de refuerzo en la placa huella es fundamental para resistir cargas, usándose varillas corrugadas que se integran con las vigas riostras; especificaciones comunes incluyen varillas #4 cada 15 cm longitudinalmente y #2 cada 30 cm transversalmente en las placas, asegurando el amarre monolítico entre placas y vigas para soportar el tráfico vehicular y mejorar la durabilidad del camino rural.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

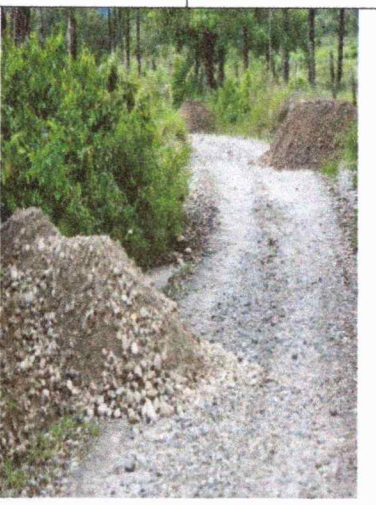
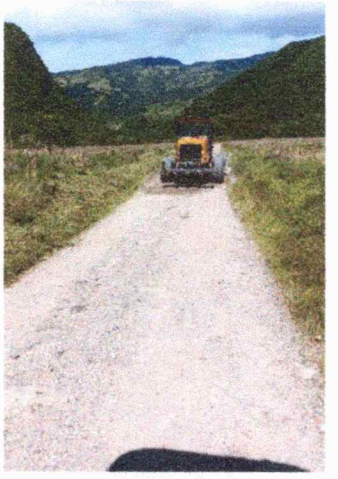
CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.6	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	280.08 M2	100.00%
	 		
	OBSERVACIONES		
	Se utiliza la piedra pegada en la contra huella, con la intención de disminuir costos en la estructura del proyecto, de tal manera que se combinan las franjas de concreto con las franjas en piedra pegada, dando así un acabado estético y funcional.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	**VEREDA CAÑO BLANCO**	**EJECUTADO**	**%**
	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	3600.00 m2	100.00 %
	  		
	OBSERVACIONES		
	Una vez realizado el relleno con material de relleno, se procede a realizar la conformación de la vía con los equipos necesarios.		

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.2	VEREDA CAÑO BLANCO	EJECUTADO	%
	Movilización y desmovilización de equipo pesado	83.3028 km	100.00 %
			
	OBSERVACIONES		
	Para la realización de este proyecto fue necesaria la movilización de maquinaria pesada como lo es le retroexcavadora.		



INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En este periodo se dio avance a la ejecución de la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)".**, con el fin de mejorar la accesibilidad de la vía para garantizar la fácil comunicación de los pobladores de las veredas altas con el casco urbano del municipio, objeto fundamental del contrato de obra pública No. 110.2010.376.2025.

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Acta de inicio.
- Acta de terminación
- Acta de visita previa para recibo definitivo de obra
- Acta de recibo a satisfacción de la comunidad
- Acta de recibo
- Aprobación de pólizas
- Cantidades ejecutadas
- Memorias de cálculo de obra
- Informe soporte de inversión de imprevistos
- Soportes de inversión de administración
- Acta de relación personal de obra
- Entrega de dotación y elementos de protección personal
- Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- copia de nominas
- Paz y salvo personal de nómina y subcontratistas.
- Paz salvo de aportes al fic
- Paz y salvo del proyecto emitido por la oficina de personería municipal

INGENIARK
C & C INGENIARK S.A.S

INFORME LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. :	110-2010-376-2025

- Bitácora de obra
- Factura o documento equivalente a factura
- Certificado de cuenta bancaria

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 03 días del mes marzo de 2026.

Ing Carlos vargas
Director de obra.

NIT: 900557241-4
gerenciacycingeniarksas@gmail.com 3208099418
Calle 5 No 6 -46 Sabanalarga Casanare

- ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**Código:** F- CT-121 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA No 110-2010-376-2025

OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S NIT-900,557,241-4
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
INTERVENTORIA:	N/A

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.	DESCIPCION			
RIVERA VALERO WILLIAM ARLEY	OBRERO	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	
PULIDO PARRA BRAYAN DAVID	OBRERO	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	
ANDRES CORTES MENDOZA	OBRERO	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	
OVER VALLEJO SANABRIA	OBRERO	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	
JHONNY BARRETO CUESTA	OBRERO	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	
CARLOS VARGAS BARRETO	DIRECTOR DE OBRA	Casco, guantes, gafas, camisa		Decreto 1072 de 2015	1/12/2025	

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibi los elementos de proteccion personal señalados
2. Los revise y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día 1/12/2025

Firma
Nombre: CARLOS VARGAS BARRETO.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-321352 CND

Firma
Nombre: YIMER FERNANDO CARO GAITAN
APOYO A LA SUPERVISION
N° Matrícula Profesional: 091037-0613068 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

• BITÁCORA DE OBRA

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **BITACORA DE OBRA**	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 19	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se firma acta de inicio del contrato 110-2010-376-2025.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Jueves 20	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se realiza reconocimiento del área de trabajo, se tiene comunicación con la empresa ocena para acordar la entrega de los materiales de construcción, los cuales son indispensables para dar inicio a las actividades de ejecución de la obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Viernes 21	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se realiza limpieza del área de trabajo, retiro de cercas, continuamos a la espera de la entrega de materiales de construcción, como lo son la tabla, cemento, acero, subbase etc. Es claro que sin estos materiales no se pueden iniciar las actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 22	Noviembre	2025	7:00am	11:00am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

no se tienen actividades registradas. Continuamos a la espera de los materiales de construcción.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 23	Noviembre	2025		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se laboro.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 24	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza reunión con el representante de Ocensa donde nos ponemos de acuerdo para la entrega de materiales, llegándose a la conclusión que la fecha de inicio de entrega de estos materiales será a partir del día tres (03) de diciembre del 2025, donde nosotros debemos organizar para realizar y optimizar el tiempo restante para cumplir los plazos de ejecución de la obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 25	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)



IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza socialización del proyecto con la comunidad de las veredas altas del municipio de Sabanalarga.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 26	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se registran actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Jueves 27	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se registran actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	viernes 28	Noviembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se registran actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 29	Noviembre	2025	7:00am	11:00am

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se registran actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **BITACORA DE OBRA**	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 30	Noviembre	2025		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se registran actividades

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 01	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se realizan las afiliaciones del personal con el que se va a ejecutar la obra, entrega de sus respectivos epp.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 02	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Replanteo y localizacion para vias	M2	se realiza replanteo donde se ejecutaran las obras	835	si	si
Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	se realiza la excavacion mecanica.	125,25	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez realizada la localización de las obras, se realiza replanteo he iniciamos con la excavación en el área de trabajo de manera controlada en todo el ancho y largo de la calzada, teniendo en cuenta 167 metros lineales de vía y 5 metros de ancho.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **BITACORA DE OBRA**	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 03	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	se recibe material subbase, de inmediato se inicia el proceso de extendido y conformación de la vía	125	si	si
Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	con los equipos necesarios se realiza conformación de la vía, se trabaja en todo los 167 metros lineales de vía.	415	si	si


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mantenimiento de víade acceso a la vereda caño blanco	por el gran tráfico presentado, por el transporte de material pétreo, se presenta hundimientos en la vía. exactamente al salir de la quebrada caño blanco, lo que implica transportar una retroexcavadora de llantas y solucionar el imprevisto

OBSERVACIONES GENERALES

realizada la excavación la empresa contratada para el suministro de los materiales pétreos dispuso de los equipos necesarios para la entrega del material subbase, con el cual estamos rellenando y conformando la vía.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Jueves 04	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	se recibe material subbase, de inmediato se inicia el proceso de extendido y conformación de la vía	125,5	si	si
Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	con los equipos necesarios se realiza conformación de la vía, se trabaja en todo los 167 metros lineales de vía.	420	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Mantenimiento de víade acceso a la vereda caño blanco	por el gran tráfico presentado, por el transporte de material pétreo, se presenta hundimientos en la vía, exactamente al salir de la quebrada caño blanco, lo que implica transportar una retroexcavadora de llantas y solucionar el imprevisto.

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la conformación de la vía, al mismo tiempo se da inicio a la instalación de formaleta y acero de refuerzo de las placas huella

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **BITACORA DE OBRA**	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Viernes 05	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	se tiene un buen tramo de formaleta instalada por lo cual se da inicio a la fundida de lozas de placa huella	11	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	690	si	si


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

iniciamos la instalación de acero de refuerzo y el vaciado de concreto para las losas de placa huella

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 06	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	se tiene un buen tramo de formaleta instalada por lo cual se continua con la fundida de lozas de placa huella	11	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	690	si	si


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos instalando formaleta, acero de refuerzo y fundiendo losas de concreto, se realiza limpieza de vía para garantizar el tránsito vehicular.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 07	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	se tiene un buen tramo de formaleta instalada por lo cual se continua con la fundida de lozas de placa huella	11	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	690	si	si
Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	en el sector de la vereda planadas, se tenía ya el material dispuesto, para realizar el mejoramiento de vía en este sector, el cual se realizó en el transcurso del día.	3600	si	si
Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	Km	se movilizo los equipos necesarios para realzar el mantenimiento de vía.	83,32	si	si



IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

teniendo la disponibilidad de la comunidad y haciendo lo posible para cumplir con las fechas programadas se están trabajando los días festivos, continuamos con la instalación de concreto para losas de huella y acero de refuerzo, se dio inicio y finalización al mantenimiento de vía en el sector planadas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 08	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	se tiene un buen tramo de formaleta instalada por lo cual se continua con la fundida de lozas de placa huella	9,34	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	686,51	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se da por terminado los trabajos de concreto en las placas hulla y de instalación de acero de refuerzo, iniciamos con la disposición de acero de refuerzo para las cunetas he ordenación de formaleta.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 09	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	7	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	292	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la instalación de concreto para las cunetas y al mismo tiempo la instalación de acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 10	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	7	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	292	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la instalación de concreto para las cunetas y al mismo tiempo la instalación de acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Jueves 11	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	7	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	292	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la instalación de concreto para las cunetas y al mismo tiempo la instalación de acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Viernes 12	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	7	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	292	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la instalación de concreto para las cunetas y al mismo tiempo la instalación de acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 13	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x	x		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	7	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	292	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

continuamos con la instalación de concreto para las cunetas y al mismo tiempo la instalación de acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 14	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR						
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 15	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	Continuams con los trabajos de instalacion de conreto para las cunetas	8,63	si	si
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	teniendo la formaleta de lozas de placa huella se instala acero de refuerzo	290,56	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se da terminación a la construcción de cunetas en ambos sectores, llegando a la alcantarilla de descole.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 16	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	inicias con los trabajos de instalacion del concreto en piedra pegada	47	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

iniciamos la instalación de piedra pegada o losa de contra huella.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 17	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	Continuamos con los trabajos de instalacion del concreto en piedra pegada	47	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuamos los trabajos de fundida de piedra pegada en la losa de contra huella

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	jueves 18	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	Continuamos con los trabajos de instalacion del concreto en piedra pegada	47	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuamos los trabajos de fundida de piedra pegada en la losa de contra huella

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Viernes 19	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	Continuamos con los trabajos de instalacion del concreto en piedra pegada	47	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuamos los trabajos de fundida de piedra pegada en la losa de contra huella y extremos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 20	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	Continuamos con los trabajos de instalacion del concreto en piedra pegada	47	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuamos los trabajos de fundida de piedra pegada en la losa de contra huella y extremos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 21	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR						
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 22	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	se finalizan los trabajos de piedra pegada tanto en el sentido contra huella como en los extremos	45,08	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Continuamos los trabajos de fundida de piedra pegada en la losa de contra huella

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 23	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion manual en conglomerado	M2	iniciamos los trabajos de excavación para la construcción de las vigas riostra de todo el sector	3	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

con esta actividad estaríamos iniciando las excavaciones para la construcción de las riostras o vigas, actividad que da culminación al contrato

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 24	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion manual en conglomerado	M2	Continuamos los trabajos de excavación para la construcción de las vigas riostra de todo el sector	3	si	si
	M3				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se continua con la excavacion de todas las riostras del sector de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Jueves 25	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR						
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **BITACORA DE OBRA**	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Viernes 26	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Excavacion manual en conglomerado	M2	Continuamos los trabajos de excavación para la construcción de las vigas riostra de todo el sector	3	si	si
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	M3	se funde solado para poder iniciar a instalar el acero de refuerzo	2,85	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se terminan los trabajos de excavación y se inicia a fundir el solado de limpieza para poder instalar el acero de refuerzo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Sabado 27	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	inciamos los trabajos de instalacion del acero de refuerzo para las riostras	1354	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se instala acero de refuerzo como una de las ultimas actividades de este proyecto para finalizar con la instalación del concreto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Domingo 28	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR						
MAESTRO						
OFICIAL						
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se trabajo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Lunes 29	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	continuamos los trabajos de instalacion del acero de refuerzo para las riostras	1354,64	si	si
Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	iniciamos trabajos de instalacion de concreto para las viga riostra	7	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se instala acero de refuerzo como una de las ultimas actividades de este proyecto para finalizar con la instalación del concret, iniciamos con la fundida de concreto para las riostras o vigas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Martes 30	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	finalizamos el vaciado de concreto para las riostras	10,1	si	si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se da por terminado el contrato en cad una de sus labores contratadas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	Carlos Vargas
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE BITACORA DE OBRA	**Código:** F- CT-116 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	110-2010-376-2025

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Sabanalarga	Miercoles 31	Diciembre	2025	7:00am	4 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contrato Obra N°	110-2010-376-2025	Contrato Interventoria N°	N/A
Objeto Proyeto	CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	Objeto Proyecto Interventoria	N/A
Tiempo de Ejecución	UN MES Y MEDIO (1.5) MESES	Tiempo de Ejecución	N/A

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1					
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
AYUDANTE						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO	2					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)


IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza limpiesa en todo el area de trabajo, dejnad el sector sin impactos ambientales y dejando listo para la entrega oficial de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS VARGAS	DIRECTOR DE OBRA	25202-137464 CND	
MONICA YULETH RODRIGUEZ TORRES	SUPERVISION	252022-19885 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

- ACTA DE TERMINACIÓN

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA
	31	12	2025

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.2010.376.2025

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No 2 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.2010.376.2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐ **OBRA TERMINADA** ☐

CONTRATO No		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☐	
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☑	SC-SG-SA-MC-016 DE 2025
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMINEITO DE LA VIA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VEREDA CAÑO BLANCO MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	
N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	
N/A	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31DE DICIEMBRE DE 2025

LAS PARTES:	
MUNICIPIO	CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Contratista
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **CONTRATISTA:C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS** de en calidad de Contratista y **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES.** Secretaria de Planeación y Obras Públicas en calidad de supervisor, para suscribir la presente acta de terminación del contrato de obra publica anteriormente citada, por el cumplimiento de la estipulación contractual.

SECOP

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.2010.376.2025
	31	12	2025		

TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☐

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A			
N/A			
N/A			

OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N/A				
	N/A				
	N/A				
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	$ 0.00

ESTADO FINANCIERO

Datos Generales		
Valor inicial del contrato	$	197.820.555,00
Valores adicionales		
Valor del contrato actualizado	$	197.820.555,00

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
N/A						
Total						

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el contratista dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento del objeto y terminación del plazo contractual.

Se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025.

Firma

C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS

Nombre

Contratista

Firma

MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES

Nombre

Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

- ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

LA COMUNIDAD

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09-08-2021 Página:

CONTRATO N°	**CONTRATO DE OBRA No 110-2010-376-2025**
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE 167 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAÑO BLANCO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA HACIA LA VEREDA PLANADAS, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO 3600029 ENTRE OLEODUCTO CENTRAL S.A. Y MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)
CONTRATISTA:	C&C INGENIARK S.A.S NIT-900,557,241-4
CORREO ELECTRONICO:	GERENCIACYCINGENIARKSAS@GMAIL.COM
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N.A
INTERVENTORÍA:	N.A
CORREO ELECTRONICO:	N.A
SUPERVISOR:	ING. MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
APOYO A LA SUPERVISION:	ING. YIMER FERNANDO CARO GAITAN

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Mes	12	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	19/11/2025			
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025			

PRORROGAS CONTRATO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		

PRORROGAS PROYECTO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES PROYECTO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° 376-2025	$ 197.820.555,00	$ -	$ 197.820.555,00
2				$ -
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		$ 197.820.555,00

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Mes	15	Días
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

El lugar de ejecución de la obra es en el municipio de Sabanalarga departamento de Casanare en la zona rural de la vereda caño blanco, beneficiando a las veredas altas del municipio y haciendo mejor la transitabilidad de este sector.
El alcance y meta física es la construccion de placas huella con sus respectivas cunetas, lo cual se realizo de acuerdo a lo contemplado en el contrato, el alcance y meta física se ejecuto al 100%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Una vez realizado recorrido de donde se desarrollaran las obras a ejecutarse, se da inicio al replanteo y localización para vías, para así tener reconocimiento del alcance del proyecto, acto seguido se realizan las excavaciones con la maquinaria necesaria para esta actividad, luego se realiza el relleno con material subbase clasificada, para continuar con la conformación de la vía, se compacta dejando el terreno totalmente apto para la instalación del solado y aceros, iniciamos instalando las formaletas para las secciones de placa huella sector izquierdo y derecho, en las cuales se instalaron los aceros requeridos y se fundieron con concreto de 3000 psi, luego continuamos con la instalación de la piedra pegada de unos de los sectores y la cuneta, de tal manera que no se interrumpiera el tránsito vehicular, luego se realizó el mismo procedimiento en el otro sector, dejando por último la excavación manual he instalación de solado y acero para las riostras, realizadas estas actividades, se realiza limpieza de todo el área de trabajo y al mismo la entrega oficial de la obra. para el mantenimiento de la vía planadas se realizó a la par de la construcción de las huellas donde se dispuso la maquinaria necesaria para realizar esta actividad, la cual se ejecutó sin contratiempos.

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO**	Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09-08-2021 Página:

CONTRATO N°	**CONTRATO DE OBRA No 110-2010-376-2025**

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:		**$ 147.626.315,00**					
% AIU	**34%**	% Administración	**28%**	% Imprevistos	1%	% Utilidad	**5%**
TOTAL AIU	**$ 50.192.947**	Total Administración	**$ 41.335.368,00**	Total Imprevistos	**$ 1.476.263,00**	Total Utilidad	**$ 7.381.316,00**

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Replanteo y localizacion para vias	M2	835,00	$ 8.876,00	$ 7.411.460,00
1,2	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final	M3	125,25	$ 24.988,00	$ 3.129.747,00
1,3	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	835,00	$ 1.244,00	$ 1.038.740,00
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	395,82	$ 19.829,00	$ 7.848.715,00
1,5	Excavacion manual en conglomerado	M3	55,72	$ 52.552,00	$ 2.928.197,00
1,6	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	KM	100,80	$ 40.715,00	$ 4.104.072,00
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	42,34	$ 568.744,00	$ 24.080.621,00
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	M3	2,85	$ 258.560,00	$ 736.896,00
2,3	Riostras o diatragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	17,10	$ 822.336,00	$ 14.061.946,00
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	43,63	$ 259.821,00	$ 11.335.990,00
2,5	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	7230,22	$ 1.000,00	$ 7.288.062,00
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	280,08	$ 199.197,00	$ 55.791.096,00
3,1	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	M2	3600,00	$ 1.244,00	$ 4.478.400,00
3,2	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	KM	83,30	$ 40.715,00	$ 3.391.674,00
SUBTOTAL OBRAS					**$ 147.625.616,00**

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09-08-2021 Página:

CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA No 110-2010-376-2025

LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS	$ 0,00
IVA LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS	$ 0,00
TOTAL LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICADOS	$ 0,00
PREDIAL	$ 0,00
IVA PREDIAL	$ 0,00
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTION AMBIENTAL	$ 0,00
IVA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 147.626.315,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	dic-25	acta parcial 1	$ 150.254.683,00		$ 150.254.683,00	$ 150.254.683,00
2						
N.. actas						
Pendiente por pagar o No ejecutado						
TOTALES						

CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La supervisiòn deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el AIM exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia **19/02/2026**

Firma

Nombre: RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA C&C INGENIARK S.A.S

Firma

Nombre:YIMER FERNANDO CARO GAITAN
APOYO A LA SUPERVISION
N° Matrícula Profesional: 091037-0613068 CND

Firma

Nombre: CARLOS VARGAS BARRETO.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-321352 CND

Firma

Nombre: MÓNICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS - SUPERVISORA

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar a la correspondiente Aseguradora para realizar la actualización de vigencias de las garantías.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
