	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN No2 PARA PAGO FINAL			
CONTRATO	**No. 110.2010.376.2025**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	***X***
PERIODO DE SEGUIMIENTO	19 de noviembre al 31 de diciembre de 2025	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	04 de marzo de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	No. 110.2010.376.2025
CONTRATISTA	**C&C INGENIARK S.A.S**
NIT / CC	900.557.241-4
REPRESENTANTE LEGAL	**RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	74.810.428 de Sabanalarga
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($197.820.555,00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: A) actas parciales: hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato mediante actas parciales, de acuerdo con el avance de obra, previa suscripción del acta de recibo parcial. B) acta final: un pago final correspondiente al saldo restante del valor facturado, que no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato previa suscripción del acta de recibo y liquidación final para efectos de cada pago.

	Las actas deberán ser suscritas por el interventor y/o supervisor del contrato, el contratista deberá adjuntar con los informes, las constancias del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, para el pago final además de la documentación referida anteriormente el contratista deberá presentar paz y salvos de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, Icbf y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2025
ACTA DE RECIBO	03 DE MARZO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	CUARENTA Y CINCO DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2. GARANTIAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	625 47 994000004259	13-11-2025/30-04-2026	ANEXO 2	19-11-2025 / 06-05-2026	$ 19.782.055.50

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625 47 994000004259	13-11-2025/30-12-2028	ANEXO 2	19-11-2025 / 06-01-2029	$ 19.782.055.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	625 47 994000004259	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	ANEXO 2	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	$ 19.782.055.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	625 47 994000001587	13-11-2025/30-12-2025	ANEXO 0	31-12-2025 / 06-01-2026	$ 284.700.000,00

3. GARANTIAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE RECIBO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	625 47 994000004259	19-11-2025 / 06-05-2026	ANEXO 3	19-11-2025 / 06-05-2026	$ 19.782.055.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625 47 994000004259	19-11-2025 / 06-01-2029	ANEXO 3	19-11-2025 / 06-01-2029	$ 19.782.055.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	625 47 994000004259	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	ANEXO 3	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	$ 19.782.055.50

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

PLACAS HUELLAS VEREDA CAÑO BLANCO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUTADO
1	OBRAS PRELIMINARES			
1,1	Replanteo y localización para vías	M2	835,00	100%
1,2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	125,25	100%
1,3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	M2	835,00	100%
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	395,82	100%
1,5	Excavación manual en conglomerado	M3	55,72	100%
1,6	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	100,80	100%
2	PLACA HUELLAS			
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	42,34	100%
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	M3	2.85	100%
2,3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	17.10	100%
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	43.63	100%
2,5	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	7230.22	100%
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	280.08	100%
3	CONFORMACION DE LA VIA VEREDA PLANADAS			
3.1	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	M2	3600	100 %
3.2	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	83.3	100%
TOTAL % OBRA				100%

5. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR			
					TOTAL	ANTICIPO	ACTA PARCIAL 1	LIQUIDACION
1423	13/11/2025	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.02	realizar el mantenimiento rehabilitación y/o mejoramiento de las vias del municipio de Sabanalarga (construcción de placas huellas)	TCRU	$ 197.820.555,00	N/A	$150.254.683,00	$ 47.563.462,00


6. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESA-LIENTE	POR MEJORAR
1	**OBRAS PRELIMINARES**	X		
1,1	Replanteo y localización para vías	X		
1,2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	X		
1,3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	X		
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	x		
1,5	Excavación manual en conglomerado	x		
1,6	Movilización y desmovilización de equipo pesado	X		
2	**PLACA HUELLA**			
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	X		
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	X		
2,3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	X		
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	X		
2.5	Acero de Refuerzo Grado 60			
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	X		
3	**CONFORMACION DE LA VIA VEREDA PLANADAS**			
3.1	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	X		
3.2	Movilización y desmovilización de equipo pesado	X		


Observaciones: Se realiza validación por sistema del pago de seguridad social, de los periodos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, se anexa soporte.


	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA **DEPARTAMENTO CASANARE** **INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

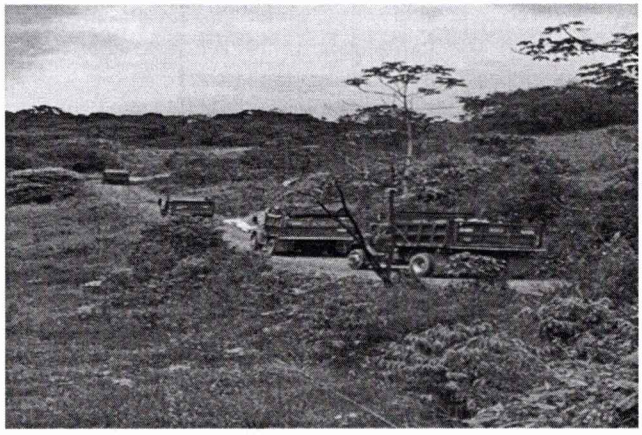




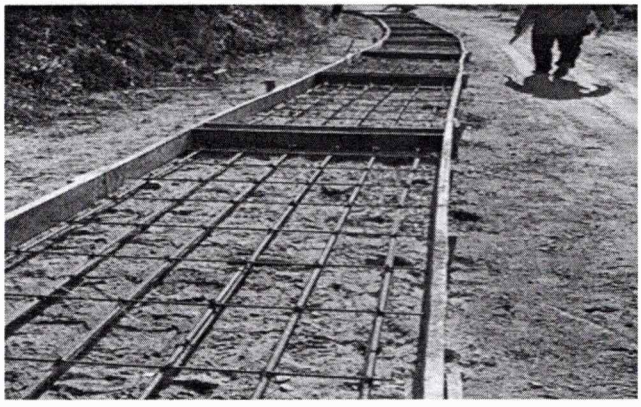


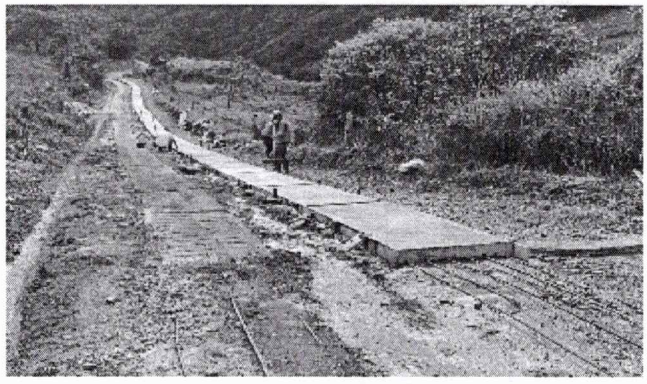



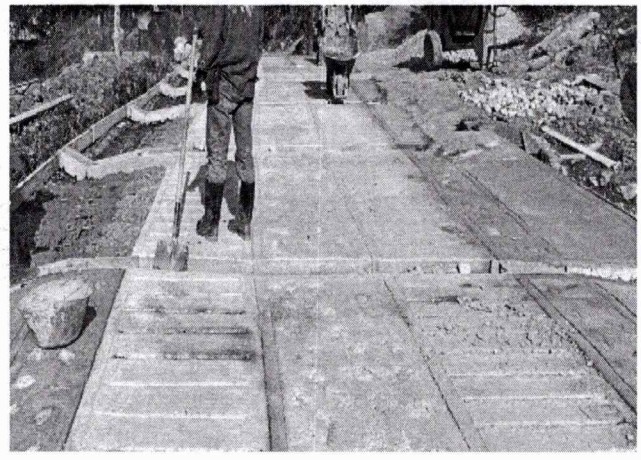

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA **DEPARTAMENTO CASANARE** **INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

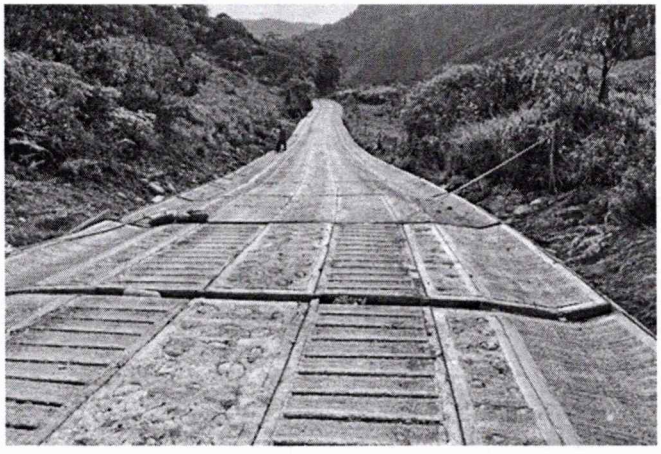
















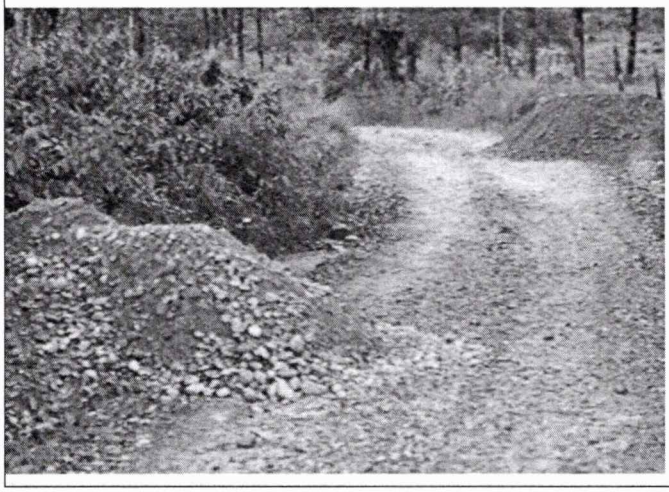



8. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor	Mónica Yulieth Rodríguez Torres
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Firma	Mónica Rodríguez T
Nombre de quien elaboró el informe	Yimer Fernando Caro Gaitan
Cargo	Profesional de Apoyo S.P.O.P
Firma	
