
CONSORCIO CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	**3601 DE 2022**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7**
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL 03**
CODIGO:	**IM-555-03**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ **No. De Revisiones**		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable de Elaboración	Nombre:	BIBIANA PATERNINA			
	Firma:				
	Fecha:	feb-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	feb-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	ANDRES CASTILLA MOLINA			
	Firma.				
	Fecha:	feb-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7


SAMANÁ


PENSILVANIA


BELALCÁZAR


MARULANDA


RISARALDA


PALESTINA


FILADELFIA




SUPÍA


RIOSUCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 03
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

IM – 555 – 03

ENERO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 03	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	 Bibiana Paternina Ingeniero Residente
REVISADO POR:	 Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
SAMANÁ	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OBRAS DE ARTE:** 0	**OBRAS DE ARTE:** 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
PENSILVANIA	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS 45
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 45
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 45
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 45

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 45

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 45
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 45
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 47
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 47
2.6.2 Seguimiento al plan de carga. 47

3 INTRODUCCIÓN 50

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 51

4.1 LOCALIZACIÓN 51
4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 52
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 52
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 52

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 52

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 52
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 54
5.2.1 Actividades Administrativas 54
5.2.2 Actividades Técnicas 54
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 54
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 54

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 55

6.1 INFORME SEMANAL 55
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 55
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 55
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 56
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 56
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 56
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 56
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 56
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 56
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 56
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 56
6.9.3 Actas de Comités 57
6.9.4 Actas de Reunión 57

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 57

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 57
7.1.1 Actividades Administrativas 57
7.1.2 Actividades Técnicas 57
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 57

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58

9 ANEXO 58

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 58
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 58
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 58
9.4 BITÁCORA 58

10 INTRODUCCIÓN 61

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 62

11.1 LOCALIZACIÓN 62
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 63
11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 63
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 64

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 64

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 64
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 66
12.2.1 Actividades Administrativas 66
12.2.2 Actividades Técnicas 66
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 66
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 66

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 67

13.1 INFORME SEMANAL 67
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 67
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 67
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 68
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 68
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 68
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 68
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 68
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 68
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 68
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 68
13.9.3 Actas de Comités 69
13.9.4 Actas de Reunión 69

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 69

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 69
14.1.1 Actividades Administrativas 69
14.1.2 Actividades Técnicas 69
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 69

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70

16 ANEXO 70

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 70

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 70
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 70
16.4 BITÁCORA 70

17 INTRODUCCIÓN 73

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 74

18.1 LOCALIZACIÓN 74
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 75
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 75
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 75

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 75

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 75
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 77
19.2.1 Actividades Administrativas 77
19.2.2 Actividades Técnicas 77
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 77
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 77

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 79

20.1 INFORME SEMANAL 79
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 79
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 79
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 79
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 80
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 80
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 80
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 80
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 80
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 80
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 80
20.9.3 Actas de Comités 80
20.9.4 Actas de Reunión 81

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 81

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 81
21.1.1 Actividades Administrativas 81
21.1.2 Actividades Técnicas 81
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 81

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82

23 ANEXO 82

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 82
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 82

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 82
23.4 BITÁCORA 82

24 INTRODUCCIÓN 85

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 86

25.1 LOCALIZACIÓN 86
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 87
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 87
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 87

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 87

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 87
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 89
26.2.1 Actividades Administrativas 89
26.2.2 Actividades Técnicas 89
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 89
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 89

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 91

27.1 INFORME SEMANAL 91
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 91
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 91
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 91
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 91
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 91
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 91
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 91
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 91
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 91
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 92
27.9.3 Actas de Comités 92
27.9.4 Actas de Reunión 92

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 92

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 92
28.1.1 Actividades Administrativas 92
28.1.2 Actividades Técnicas 92
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 93

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93

30 ANEXO 93

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 93
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 94
30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 94

30.4 BITÁCORA 94

31 INTRODUCCIÓN 97

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 98

32.1 LOCALIZACIÓN 98
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 99
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 99
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 99

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 99

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 99
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 101
33.2.1 Actividades Administrativas 101
33.2.2 Actividades Técnicas 101
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 101
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 102

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 102

34.1 INFORME SEMANAL 102
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 103
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 103
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 103
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 103
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 103
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 103
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 103
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 104
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 104
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 104
34.9.3 Actas de Comités 104
34.9.4 Actas de Reunión 104

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 104

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 104
35.1.1 Actividades Administrativas 104
35.1.2 Actividades Técnicas 105
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 105

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 105

37 ANEXO 106

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 106
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 106
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 106
37.4 BITÁCORA 106

38 INTRODUCCIÓN 109

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 110

39.1 LOCALIZACIÓN 110
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 111
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 111
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 111

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 111

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 111
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 113
40.2.1 Actividades Administrativas 113
40.2.2 Actividades Técnicas 113
40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 114
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 114

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 115

41.1 INFORME SEMANAL 115
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 115
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 115
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 115
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 116
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 116
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 116
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 116
41.9.3 Actas de Comités 116
41.9.4 Actas de Reunión 116

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 116

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 116
42.1.1 Actividades Administrativas 116
42.1.2 Actividades Técnicas 117
42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 117

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117

44 ANEXO 118

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 118
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 118
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 118
44.4 BITÁCORA 118

45 INTRODUCCIÓN 121

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 122

46.1 LOCALIZACIÓN 122
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 123
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 123
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 123

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 123

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 123
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 125
47.2.1 Actividades Administrativas 125
47.2.2 Actividades Técnicas 125
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 125
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 126

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 126

48.1 INFORME SEMANAL 126
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 127
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 127
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 127
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 128
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 128
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 128
48.9.3 Actas de Comités 128
48.9.4 Actas de Reunión 128

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 128

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 128
49.1.1 Actividades Administrativas 128
49.1.2 Actividades Técnicas 129
49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 129

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 129

51 ANEXO 130

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 130
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 130
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 130
51.4 BITÁCORA 130

52 INTRODUCCIÓN 133

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 134

53.1 LOCALIZACIÓN 134
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 135
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 135
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 135

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 135

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 135
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 137
54.2.1 Actividades Administrativas 137
54.2.2 Actividades Técnicas 137
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 137
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 137

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 138

55.1 INFORME SEMANAL 138
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 138
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 138
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 139
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 139
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 139
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 139
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 139
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 139
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 139
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 140
55.9.3 Actas de Comités 140
55.9.4 Actas de Reunión 140

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 140

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 140
56.1.1 Actividades Administrativas 140
56.1.2 Actividades Técnicas 141
56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 141

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 141

58 ANEXO 142

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 142
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 142
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 142
58.4 BITÁCORA 142

59 INTRODUCCIÓN 145

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 146

60.1 LOCALIZACIÓN 146

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 147
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 147
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 147

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 147

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 147
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 149
61.2.1 Actividades Administrativas 149
61.2.2 Actividades Técnicas 149
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 149
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 149

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 151

62.1 INFORME SEMANAL 151
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 151
62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 151
62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 151
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 151
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 151
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 151
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 151
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 151
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 151
62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 152
62.9.3 Actas de Comités 152
62.9.4 Actas de Reunión 152

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 152

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 152
63.1.1 Actividades Administrativas 152
63.1.2 Actividades Técnicas 152
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 152

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 153

65 ANEXO 153

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 153
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 153
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 154
65.4 BITÁCORA 154

66 INTRODUCCIÓN 157

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 158

67.1 LOCALIZACIÓN 158

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 159
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 159
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 159

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 159

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 159
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 161
68.2.1 Actividades Administrativas 161
68.2.2 Actividades Técnicas 161
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 161
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 162

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 162

69.1 INFORME SEMANAL 162
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 163
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 163
69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 163
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 163
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 163
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 163
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 163
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 164
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 164
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 164
69.9.3 Actas de Comités 164
69.9.4 Actas de Reunión 164

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 164

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 164
70.1.1 Actividades Administrativas 164
70.1.2 Actividades Técnicas 165
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 165

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 165

72 ANEXO 166

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 166
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 166
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 166
72.4 BITÁCORA 166

73 INTRODUCCIÓN 169

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 170

74.1 LOCALIZACIÓN 170

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 171
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 171
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 171

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 172

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 172
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 173
75.2.1 Actividades Administrativas 173
75.2.2 Actividades Técnicas 173
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 174
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 174

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 175

76.1 INFORME SEMANAL 175
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 175
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 175
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 175
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 175
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 176
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 176
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 176
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 176
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 176
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 176
76.9.3 Actas de Comités 177
76.9.4 Actas de Reunión 177

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 177

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 177
77.1.1 Actividades Administrativas 177
77.1.2 Actividades Técnicas 177
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 178

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 178

79 ANEXO 178

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 178
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 178
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 179
79.4 BITÁCORA 179

80 INTRODUCCIÓN 182

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 183

81.1 LOCALIZACIÓN 183

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 184
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 184
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 185

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 185

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 185
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 186
82.2.1 Actividades Administrativas 186
82.2.2 Actividades Técnicas 186
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 187
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 187

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 188

83.1 INFORME SEMANAL 188
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 188
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 188
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 188
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 188
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 188
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 189
83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 189
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 189
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 189
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 189
83.9.3 Actas de Comités 190
83.9.4 Actas de Reunión 190

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 190

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 190
84.1.1 Actividades Administrativas 190
84.1.2 Actividades Técnicas 190
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 190

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 191

86 ANEXO 191

86.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 191
86.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 191
86.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 191
86.4 BITÁCORA 191

87 INTRODUCCIÓN 194

88 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 195

88.1 LOCALIZACIÓN 195

88.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 196
88.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 196
88.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 196

89 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 196

89.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 196
89.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 198
89.2.1 Actividades Administrativas 198
89.2.2 Actividades Técnicas 198
89.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 198
89.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 198

90 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 199

90.1 INFORME SEMANAL 199
90.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 199
90.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 200
90.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
90.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 200
90.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 200
90.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
90.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
90.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 201
90.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 201
90.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 201
90.9.3 Actas de Comités 201
90.9.4 Actas de Reunión 201

91 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 201

91.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 201
91.1.1 Actividades Administrativas 201
91.1.2 Actividades Técnicas 201
91.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 202

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 202

93 ANEXO 202

93.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 202
93.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 202
93.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 202
93.4 BITÁCORA 203

94 INTRODUCCIÓN 206

95 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 207

95.1 LOCALIZACIÓN 207

95.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 208
95.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 208
95.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 208

96 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 209

96.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 209
96.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 210
96.2.1 Actividades Administrativas 210
96.2.2 Actividades Técnicas 210
96.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 210
96.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 211

97 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 211

97.1 INFORME SEMANAL 211
97.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 212
97.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 212
97.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 212
97.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 212
97.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 212
97.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 212
97.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 213
97.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 213
97.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 213
97.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 213
97.9.3 Actas de Comités 213
97.9.4 Actas de Reunión 213

98 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 213

98.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 213
98.1.1 Actividades Administrativas 213
98.1.2 Actividades Técnicas 214
98.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 214

99 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 214

100 ANEXO 215

100.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 215
100.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 215
100.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 215
100.4 BITÁCORA 215

101 INTRODUCCIÓN 218

102 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 219

102.1 LOCALIZACIÓN 219

102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 220
102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 220
102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 220

103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 221

103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 221
103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 222
103.2.1 Actividades Administrativas 222
103.2.2 Actividades Técnicas 223
103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 223
103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 223

104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 224

104.1 INFORME SEMANAL 224
104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 224
104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 224
104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 224
104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 224
104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 225
104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 225
104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 225
104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 225
104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 225
104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 225
104.9.3 Actas de Comités 227
104.9.4 Actas de Reunión 227

105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 227

105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 227
105.1.1 Actividades Administrativas 227
105.1.2 Actividades Técnicas 227
105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 228

106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 228

107 ANEXO 229

107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 229
107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 229
107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 229
107.4 BITÁCORA 229

108 INTRODUCCIÓN 232

109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 233

109.1 LOCALIZACIÓN 233

109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 234
109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 234
109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 234

110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 235

110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 235
110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 236
110.2.1 Actividades Administrativas 236
110.2.2 Actividades Técnicas 236
110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 237
110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 237

111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 238

111.1 INFORME SEMANAL 238
111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 238
111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 238
111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 238
111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 238
111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 239
111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 239
111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 239
111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 239
111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 239
111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 239
111.9.3 Actas de Comités 240
111.9.4 Actas de Reunión 240

112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 240

112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 240
112.1.1 Actividades Administrativas 240
112.1.2 Actividades Técnicas 240
112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 241

113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 241

114 ANEXO 242

114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 242
114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 242
114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 242
114.4 BITÁCORA 242

115 INTRODUCCIÓN 245

116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 246

116.1 LOCALIZACIÓN 246

116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 247
116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 247
116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 247

117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 247

117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 247
117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 249
117.2.1 Actividades Administrativas 249
117.2.2 Actividades Técnicas 249
117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 249
117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 249

118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 250

118.1 INFORME SEMANAL 250
118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 250
118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 250
118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 250
118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 251
118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 251
118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 251
118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 251
118.9.3 Actas de Comités 251
118.9.4 Actas de Reunión 251

119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 251

119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 251
119.1.1 Actividades Administrativas 251
119.1.2 Actividades Técnicas 251
119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 252

120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 252

121 ANEXO 252

121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 252
121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 252
121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 252
121.4 BITÁCORA 252

122 INTRODUCCIÓN 255

123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 256

123.1 LOCALIZACIÓN 256

123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 257
123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 257
123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 257

124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 257

124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 257
124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 259
124.2.1 Actividades Administrativas 259
124.2.2 Actividades Técnicas 259
124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 259
124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 259

125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 261

125.1 INFORME SEMANAL 261
125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 261
125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 261
125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 261
125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 261
125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 261
125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 261
125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 261
125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 261
125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 261
125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 261
125.9.3 Actas de Comités 262
125.9.4 Actas de Reunión 262

126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 262

126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 262
126.1.1 Actividades Administrativas 262
126.1.2 Actividades Técnicas 262
126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 262

127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 262

128 ANEXO 263

128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 263
128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 263
128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 263
128.4 BITÁCORA 263

129 INTRODUCCIÓN 266

130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 267

130.1 LOCALIZACIÓN 267

130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ... 268
130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 268
130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 269

131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO ... 269

131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ... 269
131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 271
131.2.1 Actividades Administrativas ... 271
131.2.2 Actividades Técnicas ... 271
131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 271
131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 271

132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 272

132.1 INFORME SEMANAL ... 272
132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 272
132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 273
132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 273
132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 273
132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 273
132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 273
132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 273
132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 273
132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 273
132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 274
132.9.3 Actas de Comités ... 274
132.9.4 Actas de Reunión ... 274

133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 274

133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ... 274
133.1.1 Actividades Administrativas ... 274
133.1.2 Actividades Técnicas ... 275
133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA ... 275

134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 275

135 ANEXO ... 276

135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 276
135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 276
135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 276
135.4 BITÁCORA ... 276

136 INTRODUCCIÓN ... 279

137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 280

137.1 LOCALIZACIÓN ... 280

137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 281
137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 281
137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 281

138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 281

138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 281
138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 283
138.2.1 Actividades Administrativas 283
138.2.2 Actividades Técnicas 283
138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 283
138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 283

139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 284

139.1 INFORME SEMANAL 284
139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 284
139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 284
139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 284
139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 284
139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 284
139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 284
139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 285
139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 285
139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 285
139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 285
139.9.3 Actas de Reunión 285

140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 285

140.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 285
140.1.1 Actividades Administrativas 285
140.1.2 Actividades Técnicas 286
140.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 286

141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 286

142 ANEXO 286

142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 286
142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 286
142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 286
142.4 BITÁCORA 287

143 INTRODUCCIÓN 290

144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 291

144.1 LOCALIZACIÓN 291
144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 292

144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 292
144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 292

145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 292

145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 292
145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 294
145.2.1 Actividades Administrativas 294
145.2.2 Actividades Técnicas 294
145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 294
145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 294

146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 295

146.1 INFORME SEMANAL 295
146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 295
146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 295
146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 295
146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 295
146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 295
146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 296
146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 296
146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 296
146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 296
146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 296
146.9.3 Actas de Reunión 296

147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 296

147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 296
147.1.1 Actividades Administrativas 296
147.1.2 Actividades Técnicas 296
147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 297

148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 297

149 ANEXO 297

149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 297
149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 297
149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 297
149.4 BITÁCORA 297

150 INTRODUCCIÓN 300

151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 301

151.1 LOCALIZACIÓN 301
151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 302
151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 302
151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 302

152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 302

152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 302
152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 304
152.2.1 Actividades Administrativas 304
152.2.2 Actividades Técnicas 304
152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 304
152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 304

153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 305

153.1 INFORME SEMANAL 305
153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 306
153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 306
153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 306
153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 306
153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 306
153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 306
153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 306
153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 306
153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 306
153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 306
153.9.3 Actas de Reunión 307

154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 307

154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 307
154.1.1 Actividades Administrativas 307
154.1.2 Actividades Técnicas 307
154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 307

155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 307

156 ANEXO 308

156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 308
156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 308
156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 308
156.4 BITÁCORA 308

157 INTRODUCCIÓN 311

158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 312

158.1 LOCALIZACIÓN 312
158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 313
158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 313
158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 313

159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 313

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 313

159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 315
159.2.1 Actividades Administrativas 315
159.2.2 Actividades Técnicas 315
159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 315
159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 315

160 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 316

160.1 INFORME SEMANAL 316
160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 316
160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 316
160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 316
160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 316
160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 316
160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 316
160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 317
160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 317
160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 317
160.9.3 Actas de Reunión 317

161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 317

161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 317
161.1.1 Actividades Administrativas 317
161.1.2 Actividades Técnicas 317
161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 317

162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 318

163 ANEXO 318

163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 318
163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 318
163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 318
163.4 BITÁCORA 318

164 INTRODUCCIÓN 321

165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 322

165.1 LOCALIZACIÓN 322
165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 323
165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 323
165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 323

166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 323

166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 323
166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 325
166.2.1 Actividades Administrativas 325

166.2.2 Actividades Técnicas 325
166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 325
166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 325

167 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 326

167.1 INFORME SEMANAL 326
167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 326
167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 326
167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 326
167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 326
167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 326
167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 326
167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 327
167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 327
167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 327
167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 327
167.9.3 Actas de Reunión 327

168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 327

168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 327
168.1.1 Actividades Administrativas 327
168.1.2 Actividades Técnicas 327
168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 327

169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 328

170 ANEXO 328

170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 328
170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 328
170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 328
170.4 BITÁCORA 328

171 INTRODUCCIÓN 331

172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 332

172.1 LOCALIZACIÓN 332
172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 333
172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 333
172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 333

173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 333

173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 333
173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 335
173.2.1 Actividades Administrativas 335
173.2.2 Actividades Técnicas 335
173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 335

173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 335

174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 336

174.1 INFORME SEMANAL 336
174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 336
174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 336
174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 336
174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 336
174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 336
174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 337
174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 337
174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 337
174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 337
174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 337
174.9.3 Actas de Reunión 337

175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 337

175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 337
175.1.1 Actividades Administrativas 337
175.1.2 Actividades Técnicas 338
175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 338

176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 338

177 ANEXO 338

177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 338
177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 338
177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 338
177.4 BITÁCORA 339

178 INTRODUCCIÓN 342

179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 343

179.1 LOCALIZACIÓN 343
179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 344
179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 344
179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 344

180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 344

180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 344
180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 346
180.2.1 Actividades Administrativas 346
180.2.2 Actividades Técnicas 346
180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 346
180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 346

181 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 347

181.1 INFORME SEMANAL 347
181.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 347
181.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 348
181.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 348
181.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 348
181.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 348
181.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 348
181.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 348
181.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 348
181.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 348
181.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 348
181.9.3 Actas de Reunión 349

182 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 349

182.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 349
182.1.1 Actividades Administrativas 349
182.1.2 Actividades Técnicas 349
182.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 349

183 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 349

184 ANEXO 350

184.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 350
184.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 350
184.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 350
184.4 BITÁCORA 350

185 INTRODUCCIÓN 353

186 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 354

186.1 LOCALIZACIÓN 354
186.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 355
186.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 355
186.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 355

187 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 355

187.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 355
187.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 357
187.2.1 Actividades Administrativas 357
187.2.2 Actividades Técnicas 357
187.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 357
187.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 357

188 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 359

188.1 INFORME SEMANAL 359
188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 359

188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 359
188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 359
188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 359
188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 359
188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 359
188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 359
188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 359
188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 359
188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 359
188.9.3 Actas de Reunión 360

189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 360

189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 360
189.1.1 Actividades Administrativas 360
189.1.2 Actividades Técnicas 360
189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 360

190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 360

191 ANEXO 361

191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 361
191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 361
191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 361
191.4 BITÁCORA 361

192 INTRODUCCIÓN 364

193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 365

193.1 LOCALIZACIÓN 365
193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 366
193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 366
193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 366

194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 366

194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 366
194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 368
194.2.1 Actividades Administrativas 368
194.2.2 Actividades Técnicas 368
194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 368
194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 368

195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 369

195.1 INFORME SEMANAL 369
195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 369
195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 369

195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 369
195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 369
195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 369
195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 370
195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 370
195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 370
195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 370
195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 370
195.9.3 Actas de Reunión 370

196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 370

196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 370
196.1.1 Actividades Administrativas 370
196.1.2 Actividades Técnicas 371
196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 371

197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 371

198 ANEXO 371

198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 371
198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 371
198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 371
198.4 BITÁCORA 372

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 51
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 52
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 62
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 63
ILUSTRACIÓN 5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 64
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 74
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 75
ILUSTRACIÓN 8 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 86
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 87
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 98
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 99
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 110
ILUSTRACIÓN 13 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 111
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 122
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 123
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 134
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 135
ILUSTRACIÓN 18 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 146
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 147
ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 158
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 159

Ilustración 22 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 170
Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 171
Ilustración 24 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 183
Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 184
Ilustración 26 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 195
Ilustración 27 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 196
Ilustración 28 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 207
Ilustración 29 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 208
Ilustración 30 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas). 219
Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 220
Ilustración 32 Localización del municipio de Marulanda (Caldas). 233
Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 234
Ilustración 34 Localización del municipio de Marulanda (Caldas). 246
Ilustración 35 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 247
Ilustración 36 Localización del municipio de Risaralda (Caldas). 256
Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 257
Ilustración 38 Localización del municipio de Risaralda (Caldas). 267
Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 268
Ilustración 40 Estado inicial del sector..... 269
Ilustración 41 Localización del municipio de Palestina (Caldas)..... 280
Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 281
Ilustración 43 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas). 291
Ilustración 44 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 292
Ilustración 45 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas). 301
Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 302
Ilustración 47 Localización del municipio de Supía (Caldas)..... 312
Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 313
Ilustración 49 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 323
Ilustración 50 Localización del municipio de Riosucio (Caldas)..... 332
Ilustración 51 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 333
Ilustración 52 Localización del municipio de Riosucio (Caldas)..... 343
Ilustración 53 Localización del municipio de Riosucio (Caldas)..... 354
Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 355
Ilustración 55 Localización del municipio de Riosucio (Caldas)..... 365
Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps..... 366

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir 9
Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría 45
Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría. 46
Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná. 54
Tabla 5 Personal Convenio Solidario 56
Tabla 6 Personal Convenio Solidario 68
Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná. 77

TABLA 8 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 79
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 89
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 101
TABLA 11 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 103
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 113
TABLA 13 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 115
TABLA 14 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 125
TABLA 15 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 127
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 137
TABLA 17 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 139
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 149
TABLA 19 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 161
TABLA 20 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 173
TABLA 21 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 175
TABLA 22 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 186
TABLA 23 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 188
TABLA 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 198
TABLA 25 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 200
TABLA 26 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 210
TABLA 27 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 212
TABLA 28 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 222
TABLA 29 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 224
TABLA 30 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 236
TABLA 31 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 238
TABLA 32 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 249
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 259
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 271
TABLA 35 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 273
TABLA 36 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 283
TABLA 37 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 294
TABLA 38 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 304
TABLA 39 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 314
TABLA 40 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS). 322
TABLA 41 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 324
TABLA 42 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 335
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 346
TABLA 44 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 357
TABLA 45 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 368

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal

ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO**
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL**
ANEXO 10.1	Informe Semanal

ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 11.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 11.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 11.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.7	Registro Fotográfico
ANEXO 11.8	Bitácora de obra
ANEXO 12	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA**
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 12.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 12.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 12.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 12.7	Registro Fotográfico
ANEXO 12.8	Bitácora de obra
ANEXO 13	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL**
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 14	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES**
ANEXO 14.1	Informe Semanal
ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15	**FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA**
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 15.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 15.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 15.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 15.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 15.7	Registro Fotográfico
ANEXO 15.8	Bitácora de obra
ANEXO 16	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL**
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 16.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 16.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 16.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 16.7	Registro Fotográfico
ANEXO 16.8	Bitácora de obra
ANEXO 17	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 18.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA**
ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 19.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 19.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 19.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 19.7	Registro Fotográfico
ANEXO 19.8	Bitácora de obra

ANEXO 20	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 20.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 21	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL**
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 26	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**
ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 27	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 28.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe de los especialistas
ANEXO 29.6	Actas de reunión
ANEXO 29.7	Informe financiero y presupuestal

ANEXO 29.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 29.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ
G A R A N T I A S	

Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$116.701.510,20	11/09/2024	30/06/2025
Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	30/06/2025
Prestaciones sociales	$233.403.020,40	11/09/2024	30/04/2028
Calidad del servicio	$350.104.530,60	31/12/2024	30/04/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informe de los especialistas. Ver Anexo 29.5.

1.3 INFORME DEL DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 29.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos

profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE CASTILLA MOLINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	ELVIRA FINOL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	GABRIELA TEJEDOR

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En este periodo se presentó el acta parcial de costos correspondiente al periodo del informe. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.7.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga.

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 29.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	51
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	52
1	**INTRODUCCIÓN**		54
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		55
2.1	Localización		55
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		56
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		56
2.4	Características técnicas del proyecto		56
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		56
3.1	Información general del contrato		56
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		58
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		58
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		58
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	433
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	444
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		60
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		61
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		47
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		61
7	**Conclusiones y recomendaciones**		61
8	**Anexos**		61
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 107,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.164.517,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

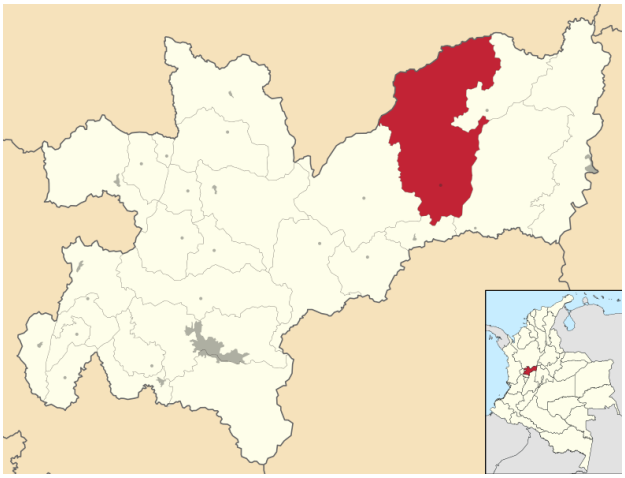


Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

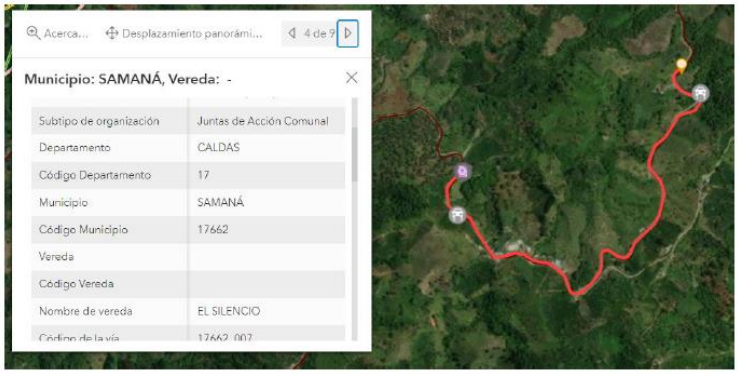


Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. Hasta el momento en que se dio la suspensión No. 1 de este convenio, la Interventoría se encontraba en la etapa de alistamiento realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8

TELÉFONO:	3107225125
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPESIÓN NO. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

5.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,75	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,51	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4063,44	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada

CARGO	PROFESIONAL
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la suspensión No. 1 del Convenio No. 2073 de 2024.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

6.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- La Interventoría mediante oficio CINP-555-121-0003 de fecha 2/1/25 solicita a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.

- La Interventoría mediante oficio CINP-555-149-0045 de fecha 2/1/25 le recuerda a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.

7.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio por parte de EL INSTITUTO.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	64
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	65
1	**INTRODUCCIÓN**		67
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		68
2.1	Localización		68
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		69
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		69
2.4	Características técnicas del proyecto		70
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		70
3.1	Información general del contrato		70
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		70
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		70
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		70
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		71
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	451
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	462
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		74
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		61
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		75
7	**Conclusiones y recomendaciones**		76
8	**Anexos**		76
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** nov-24

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 151,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.845.017,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

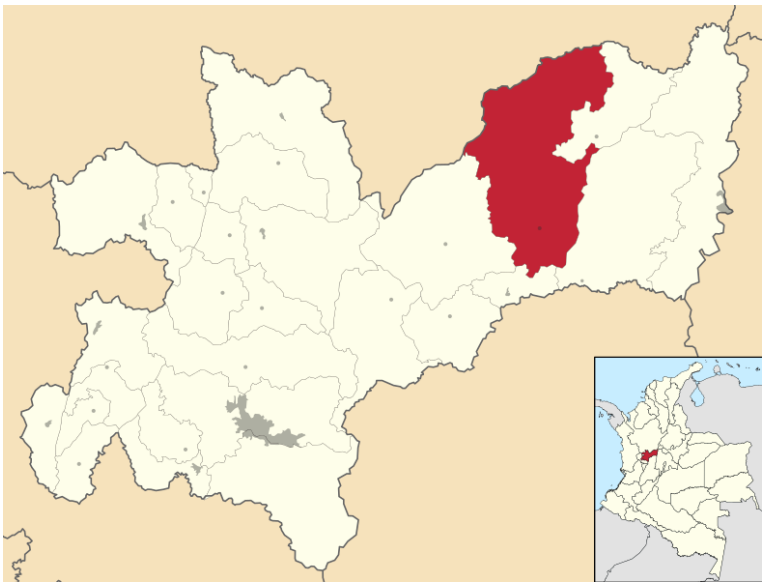


Ilustración 3 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

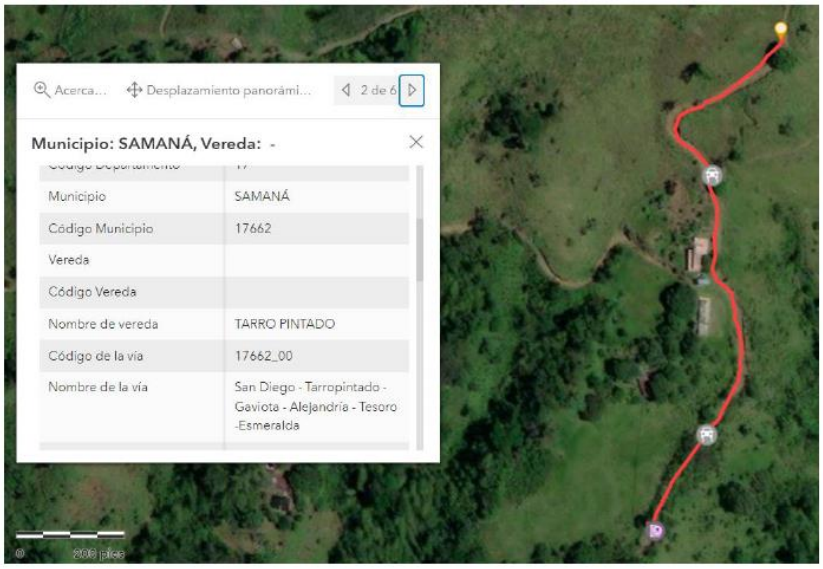


Ilustración 4 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 5 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 3/1/25 y 7/1/25 remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 4.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 13/1/25 y 16/1/25 remitió los documentos de para el desembolso no. 1, cartas de transferencia y demás soportes, y las subsanaciones a las observaciones realizadas por la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/1/25, solicita al INVIAS el Arte para la valla Informativa del proyecto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/1/25. solicita al Banco los extractos bancarios de la cuenta del proyecto.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 17/1/25 remitió los documentos ambientales solicitados por la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/1/25, 21/1/25 y 22/1/25 remitió la subsanación a las observaciones de los documentos para el desembolso No. 1.

12.2.2 Actividades Técnicas

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 29/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades técnicas realizadas en obra.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 29/1/25. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0

Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4.59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 29/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se encuentran en uso la maquinaria relacionada con el convenio.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López
Maestro de Obra	Luis Antonio Diosa Álvarez

Tabla 6 Personal Convenio Solidario

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2172 de 2024.

Al finalizar el periodo de este informe la OAC se encontraba en el trámite para pagar el costo de la modificación de las pólizas, para así recibir de la aseguradora la respectiva actualización de las pólizas.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

13.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

13.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-122-0004 de fecha 2/1/25 solicita a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-150-0046 de fecha 2/1/25 le recuerda a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-191-0117 de fecha 9/1/25 solicita a la JAC información ambiental.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-205-0152 de fecha 10/1/25 le recuerda a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.
- Realización de reunión del Comité Operativo: No. 4 3/1/25.

14.1.2 Actividades Técnicas

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 29/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades técnicas realizadas en obra.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los

rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta la subsanación de los documentos para el desembolso de recursos para la realización de la primera compra.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	78
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	79
1	**INTRODUCCIÓN**		81
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		82
2.1	Localización		82
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		83
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		83
2.4	Características técnicas del proyecto		83
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		83
3.1	Información general del contrato		83
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		85
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		85
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		85
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		87
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	469
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	480
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		88
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		85
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		89
7	**Conclusiones y recomendaciones**		89
8	**Anexos**		90
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 151,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: CASTILLA
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

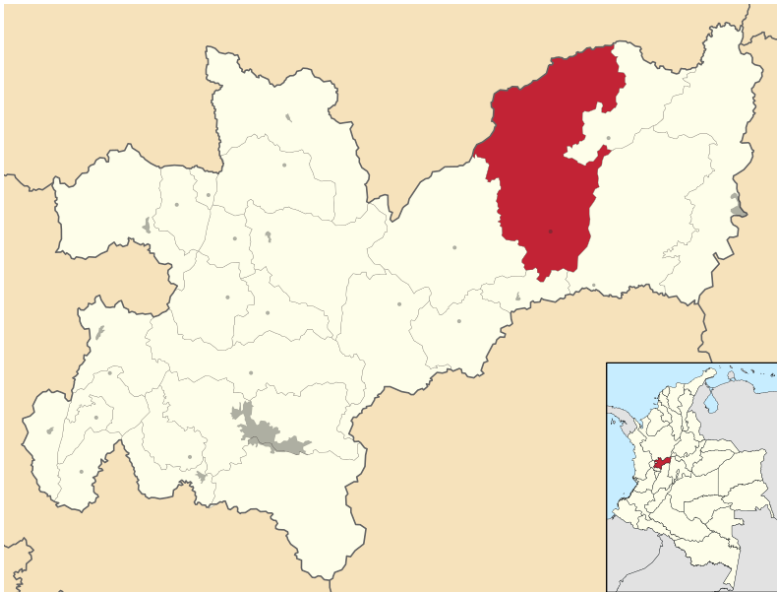


Ilustración 6 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

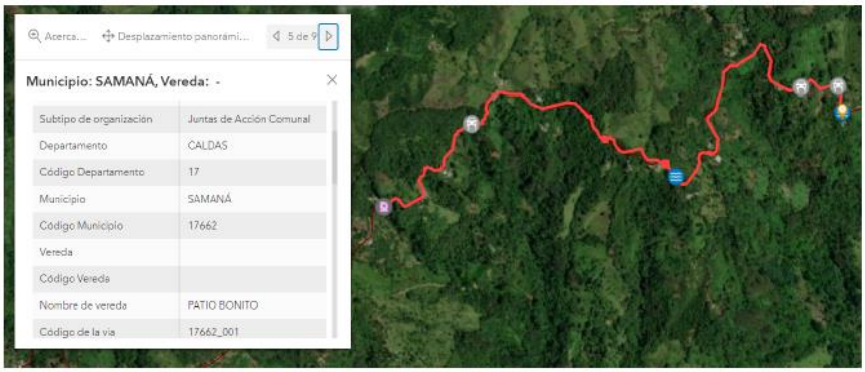


Ilustración 7 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Envió correo electrónico de fecha 2/1/25, en el que remite la hoja de vida de un ingeniero residente para revisión de la Interventoría.
- Envió correos electrónicos de fechas 14/1/25 y 16/1/25, en los que remite los documentos compromiso del comité operativo no. 2, cotizaciones, registro fotográfico, etc.
- Envió correo electrónico de fecha 14/1/25, la solicitud al INVIAS del arte de la valla informativa del proyecto.
- Envió correo electrónico de fecha 29/1/25, con información sobre el componente ambiental.

19.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,86	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	99,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	77,40	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	24,47	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,03	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III,	M	0%	0%	7,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	de 900 mm de diámetro interior					
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Johan Samuel Salazar
Contador	Alejandro García
Maestro de obra	Conrado Posada

Tabla 8 Personal Convenio Solidario

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2435 de 2024

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

20.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

20.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría mediante oficio CINP-555-123-005 de fecha 2/1/25 solicita a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-151-0047 de fecha 2/1/25 le recuerda a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-206-0153 de fecha 10/1/25 le recuerda a la JAC realizar el trámite de la Valla Informativa del proyecto.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-223-0256 de fecha 17/1/25 le recuerda a la JAC realizar el trámite de actualización de pólizas.
- La Interventoría mediante correo electrónico de fecha 17/1/25 hace envío del Acta de comité operativo No. 3 para su firma.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-236-0275 de fecha 17/1/25 solicita a la JAC remitir los documentos ambientales para el convenio.
- La Interventoría mediante oficio CINP–555–269–0388 de fecha 28/1/25 remite a la JAC instrucciones para la consignación de rendimientos financieros.
- Realización de reunión de Comité Operativo: No. 2 de fecha 10/1/25, No. 3 de fecha 16/1/25 y No. 4 de 29/1/25.

21.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	92
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	93
1	**INTRODUCCIÓN**		95
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		96
2.1	Localización		96
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		97
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		97
2.4	Características técnicas del proyecto		97
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		97
3.1	Información general del contrato		97
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		99
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		99
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		99
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		101
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	487
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	498
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		101
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		102
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		101
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		100
7	**Conclusiones y recomendaciones**		101
8	**Anexos**		101
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2159-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL CIRPIAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENCIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE REINICIO 01:	19/02/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO PRORROGA 01:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	111,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.898.462,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.898.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	135,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.711.788,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.581.354,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.105.320,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.398.462,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

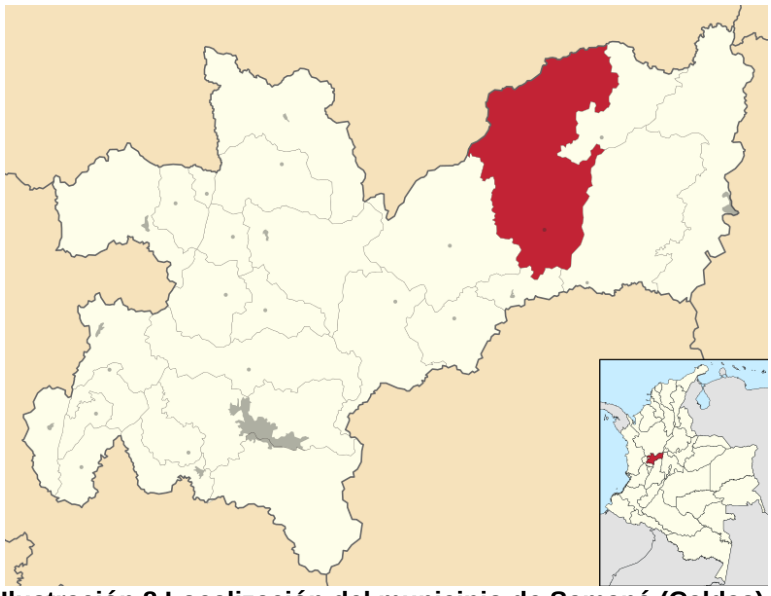


Ilustración 8 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 9 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 9 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 4.1.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la suspensión No. 1 del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-124-0006 de fecha 2/1/25 solicita a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-152-0048 de fecha 2/1/25 le recuerda a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	106
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	109
1	**INTRODUCCIÓN**		110
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		110
2.1	Localización		111
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		111
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		111
2.4	Características técnicas del proyecto		111
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		111
3.1	Información general del contrato		111
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		113
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		113
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		114
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		114
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	505
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	516
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		116
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		116
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		116
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		1354
7	**Conclusiones y recomendaciones**		117
8	**Anexos**		118
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2124-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL DORADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2025
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 154,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.674.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.674.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.603.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.174.007,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: CASTILLA
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

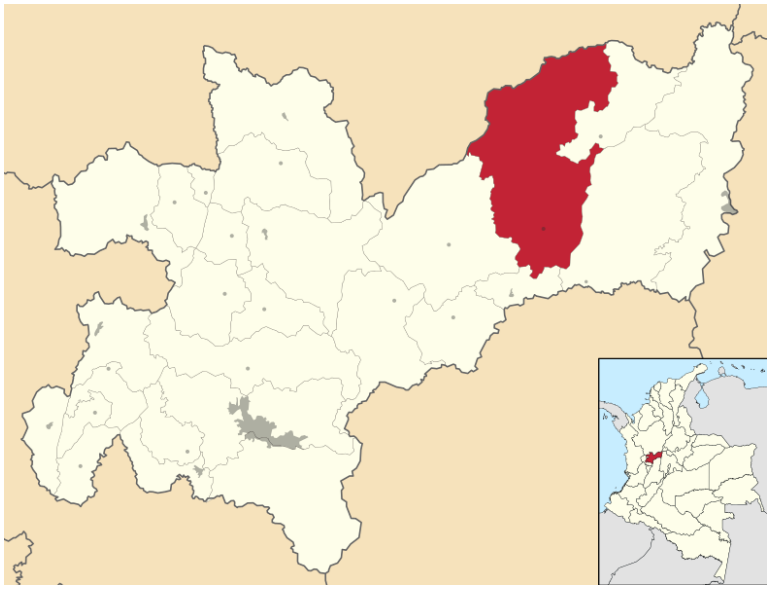


Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

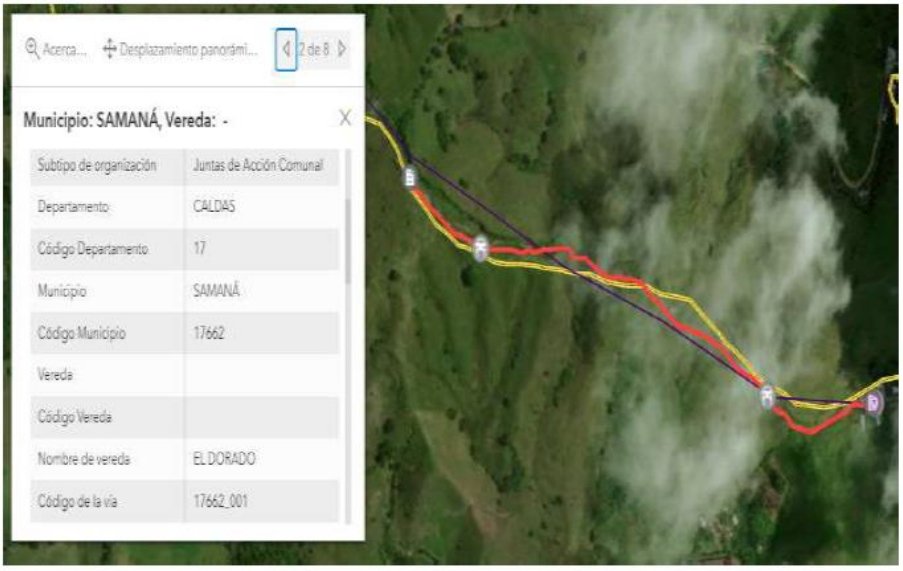


Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.067.401,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	31/12/2024	31/12/2029

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 10 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Realización de la reunión de socialización de la JAC, de fecha 11/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.
- Remitió mediante correo electrónico de fecha 8/1/25, los documentos compromiso del comité operativo no. 1.
- Remitió mediante correos electrónicos de fecha 13/1/25, 14/1/25 y 16/1/25, los documentos compromiso del comité operativo no. 2, cotizaciones, plan de compras, resumen del 40% inicial, y cantidades a ejecutar.
- Remitió mediante correos electrónicos de fechas 20/1/25, 21/1/25 y 23/1/25 los documentos para el desembolso No. 1.
- Remitió por medio de correo electrónico de fecha 30/1/25 el Acta de Inicio firmada.
- Remitió por medio de correo electrónico de fecha 30/1/25 solicitó al INVIAS el diseño de la Valla.
- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 2 de fecha 8/1/25, No. 3 de fecha 13/1/25 y No. 4 de fecha 29/1/25.

33.2.2 Actividades Técnicas

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 29/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades realizadas en obra, dado que se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras de fecha 29/01/25. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,5	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	91,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4223,7	0

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 29/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se encuentran en uso la maquinaria relacionada con el convenio.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 11 Personal Convenio Solidario

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2124 de 2024

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para este periodo.

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para este periodo.

34.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

34.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- Remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- Mediante oficio CINP-555-125-0007 de fecha 2/1/25 solicitó a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- Mediante oficio CINP-555-153-0049 de fecha 2/1/25 le recordó a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- Mediante oficio CINP-555-205-0152 de fecha 10/1/25 le solicitó a la JAC información ambiental.
- Mediante oficio CINP-555-207-0154 de fecha 10/1/25 le recordó a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.
- Mediante oficio CINP-555-219-0249 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC el espesor para el mejoramiento de la vía, debido al resultado del CBR.

- Mediante oficio CINP-555-224-0257 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC la actualización de las pólizas.
- Mediante correo electrónico de fecha 23/1/25 aprueba la documentación del desembolso No. 1.
- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 2 de fecha 8/1/25, No. 3 de fecha 13/1/25 y No. 4 de fecha 29/1/25.

35.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para este periodo.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, se encuentra pendiente el mejoramiento que se debe realizar al suelo de la zona a intervenir con la placa huella, por cuanto los resultados de capacidad de soporte del mismo, según los estudios realizados por el INVIAS, dio un valor inferior al 3%.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

- Debido a los resultados obtenidos del estudio de suelos que realizó EL INSTITUTO previo a la suscripción de este convenio, se requería el mejoramiento de la subrasante al obtenerse un C.B.R. menor al 3% que es el porcentaje mínimo de este parámetro para la estructura de la placa huella de acuerdo a lo indicado en la cartilla del INVIAS. A pesar de conocerse esta condición de la subrasante y la necesidad de mejoramiento, no se incluyeron recursos en el presupuesto del convenio para atender la obligación señalada en el Anexo Técnico que reza:

> *(…)*
> *"La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el organismo de acción comunal y/o comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales"*
> *(…)*

  Como tampoco se incluyó el mejoramiento requerido, esta situación fue tratada en las reuniones del 18 de noviembre de 2024 y el 24 de enero de 2025 en la DT Caldas de INVIAS. De acuerdo a esta última reunión la Interventoría remitió a EL INTITUTO, un concepto a través del oficio CINP–555–291–0450 del 31 de enero de 2025, por lo que estaríamos en espera de una decisión.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	120
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	121
1	**INTRODUCCIÓN**		123
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		124
2.1	Localización		124
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		125
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		125
2.4	Características técnicas del proyecto		125
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		125
3.1	Información general del contrato		125
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		127
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		128
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		128
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		129
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	523
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	534
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		130
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		130
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		131
7	**Conclusiones y recomendaciones**		131
8	**Anexos**		132
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 154,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.

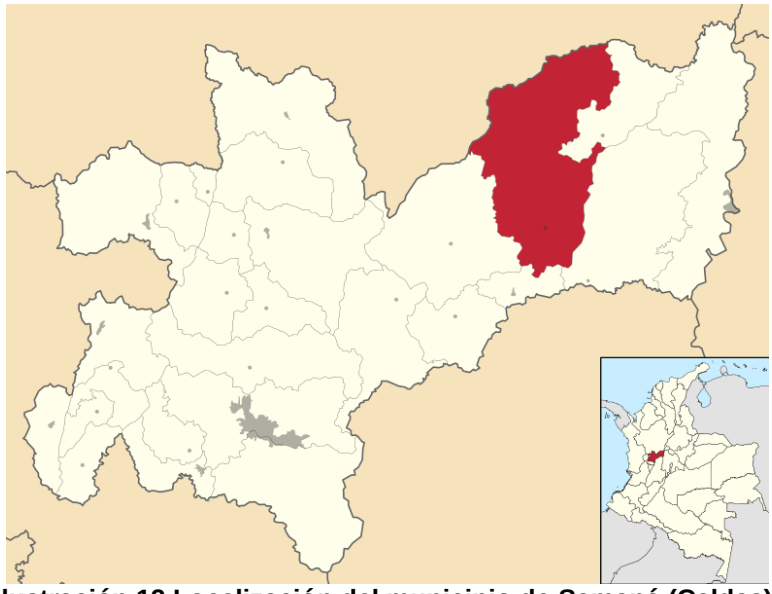


Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

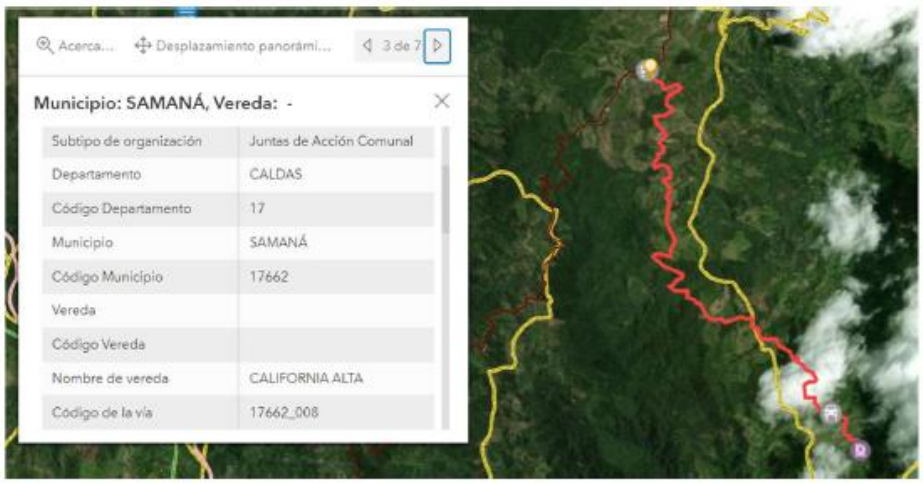


Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1

TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.153.386,00	26/06/2024	31/10/2025
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	26/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	26/06/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 12 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correos electrónicos de fecha 27/12/24, remitió el listado del personal a vincular con su certificación de residencia, cotizaciones y demás documentos compromiso del comité operativo no. 2.
- Por medio de correo electrónico de fecha 30/12/24, remitió cuenta de cobro de la contadora.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 3/1/25 y 9/1/25, remitió las cartas de transferencia con sus respectivos soportes para revisión de la Interventoría, para realizar la primera compra.
- Por medio de correo electrónico de fecha 9/1/25, remitió los permisos mineros y demás documentos compromiso del comité operativo no. 3.
- Por medio de correo electrónico de fecha 15/1/25, realizó la solicitud al banco de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto.
- Por medio de correo electrónico de fecha 16/1/25, remitió las subsanaciones del 40% para revisión de la Interventoría.
- Por medio de correos electrónicos de fecha 20/1/25 y 21/1/25, realiza la entrega de los documentos ambientales solicitados.
- Por medio de correo electrónico de fecha 20/1/25, realiza la solicitud del diseño de la valla al INVIAS.
- Por medio de correo electrónico de fecha 20/1/25, realiza la entrega del plan de compras No 1.
- Realización de la reunión del comité operativo: No. 3 de fecha 2/1/25.

40.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	118,6	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	92,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,6	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4243,9	0

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 13 Personal Convenio Solidario

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir..

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2058 de 2024

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

41.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

41.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- Mediante Oficio CINP-555-126-0008 de fecha 2/1/25, le solicitó a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- Mediante Oficio CINP-555-154-0050 de fecha 2/1/25, le recordó a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- Mediante oficio CINP-555-194-0120 de fecha 10/1/25 le solicitó a la JAC información ambiental.
- Mediante oficio CINP-555-208-0155 de fecha 10/1/25 le recordó a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.
- Mediante oficio CINP-555-218-0248 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC el espesor para el mejoramiento de la vía, debido al resultado del CBR.
- Mediante oficio CINP-555-225-0258 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC la actualización de las pólizas.
- Realización de la reunión del comité operativo: No. 3 de fecha 2/1/25.

42.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, se encuentra pendiente el mejoramiento que se debe realizar al suelo de la zona a intervenir con la placa huella, por cuanto los resultados de capacidad de soporte del mismo, según los estudios realizados por el INVIAS, dio un valor inferior al 3%.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Debido a los resultados obtenidos del estudio de suelos que realizó EL INSTITUTO previo a la suscripción de este convenio, se requería el mejoramiento de la subrasante al obtenerse un C.B.R. menor al 3% que es el porcentaje mínimo de este parámetro para la estructura de la placa huella de acuerdo a lo indicado en la cartilla del INVIAS. A pesar de conocerse esta condición de la subrasante y la necesidad de mejoramiento, no se incluyeron recursos en el presupuesto del convenio para atender la obligación señalada en el Anexo Técnico que reza:

  (…)
  "La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el organismo de acción comunal y/o comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales"
  (…)

  Como tampoco se incluyó el mejoramiento requerido, esta situación fue tratada en las reuniones del 18 de noviembre de 2024 y el 24 de enero de 2025 en la DT Caldas de INVIAS. De acuerdo a esta última reunión la Interventoría remitió a EL INTITUTO, un concepto a través del oficio CINP–555–291–0450 del 31 de enero de 2025, por lo que estaríamos en espera de una decisión.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	134
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	135
1	**INTRODUCCIÓN**		137
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		138
2.1	Localización		138
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		139
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		139
2.4	Características técnicas del proyecto		139
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		139
3.1	Información general del contrato		139
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		141
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		141
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		142
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		142
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	541
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	552
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		144
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		144
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		145
7	**Conclusiones y recomendaciones**		145
8	**Anexos**		146
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2119-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 154,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.002.573,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.002.573,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	156,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: DSTICLA
Nombre: ANDRES CASTILLA OSSINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.

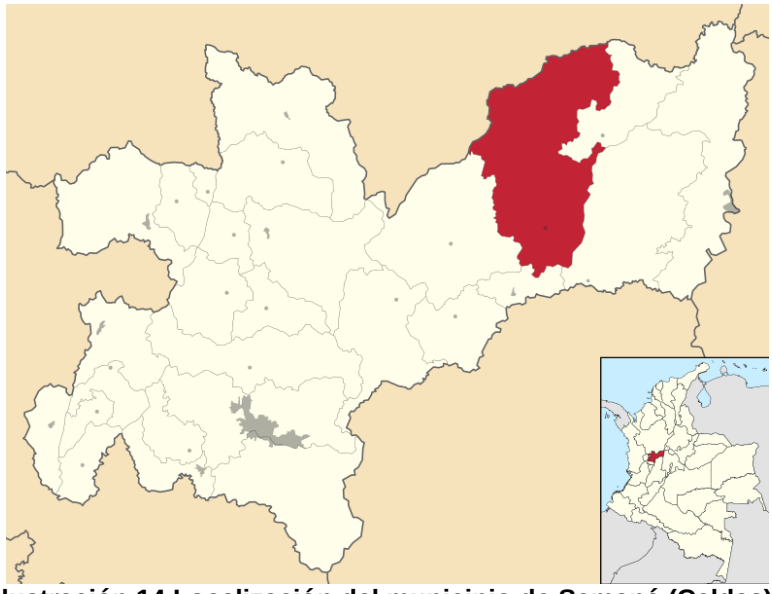


Ilustración 14 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 15 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 14 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Mediante correo electrónico de fecha 2/1/25, remitió la HV del Ingeniero residente, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.
- Mediante correos electrónicos de fechas 3/1/25 y 7/1/25, remitió la respuesta a la solicitud de extractos bancarios y rendimientos financieros.
- Mediante correo electrónico de fecha 13/1/25, remitió los contratos de prestación de servicios firmados.
- Mediante correos electrónicos de fechas 1/1/25, 15/1/25 y 16/1/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1.
- Mediante correo electrónico de fecha 13/1/25, solicitó al INVIAS el arte de la valla informativa del proyecto.
- Mediante correo electrónico de fecha 17/1/25, remitió la relación del personal y el plan de ingreso de este.
- Mediante correos electrónicos de fechas 24/1/25 y 28/1/25 remitió los documentos correspondientes al desembolso No. 1 y sus correcciones.

47.2.2 Actividades Técnicas

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 30/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades realizadas en obra.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras de fecha 30/01/25. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,6	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	119,3	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4375,9	0

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 30/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se encuentran en uso la maquinaria relacionada con el convenio.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 15 Personal Convenio Solidario

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2119 de 2024

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 30/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades realizadas en obra.

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para este periodo.

48.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- Por medio del Oficio CINP-555-120-0002 de fecha 2/1/25, le solicitó a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- Por medio del Oficio CINP-555-148-0044 de fecha 2/1/25, le recordó a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- Por medio del Oficio CINP-555-176-0072 de fecha 2/1/25, le remite a la JAC la aprobación de la HV del Ingeniero residente presentado.
- Por medio de oficio CINP-555-195-0121 de fecha 10/1/25 le solicitó a la JAC información ambiental.
- Por medio de oficio CINP-555-209-0156 de fecha 10/1/25 le recordó a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.

- Por medio de oficio CINP-555-221-0254 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC la actualización de las pólizas.
- Por medio de oficio CINP–555–266–0385 de fecha 28/1/25 remitió a la JAC instrucciones para la consignación de rendimientos financieros.
- Por medio de correo electrónico de fecha 28/1/25 remitió a la JAC instrucción para la nómina electrónica.
- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 7/1/25 y No. 2 de fecha 15/1/25.

49.1.2 Actividades Técnicas

Al suscribirse el Acta de Inicio el día 30/01/25, y teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, no se ven reflejadas las actividades realizadas en obra.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, del envío del cronograma de obra y demás documentación, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.2*.*
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	148
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	149
1	**INTRODUCCIÓN**		151
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		152
2.1	Localización		152
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		153
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		153
2.4	Características técnicas del proyecto		153
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		153
3.1	Información general del contrato		153
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		155
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		155
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		155
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		156
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	559
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	570
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		157
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		158
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		159
7	**Conclusiones y recomendaciones**		160
8	**Anexos**		160
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2173-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA MONTEBELLO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 151,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.229.002,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	149,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.
En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

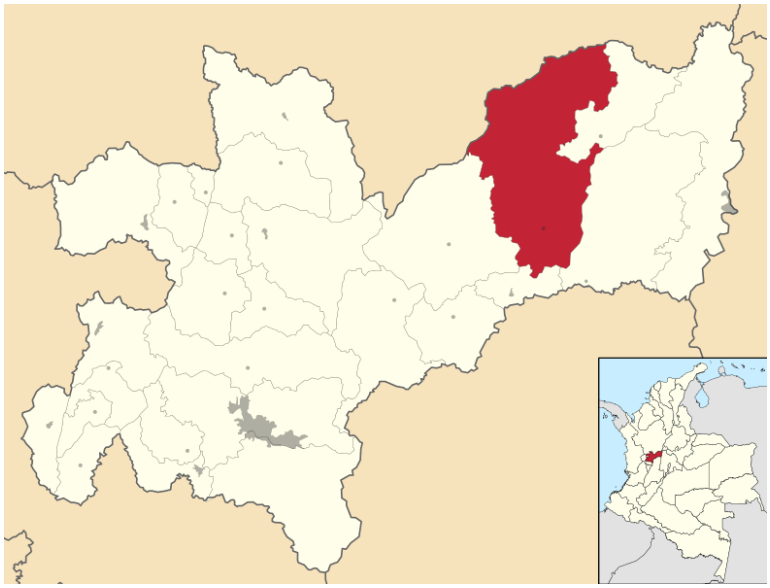


Ilustración 16 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

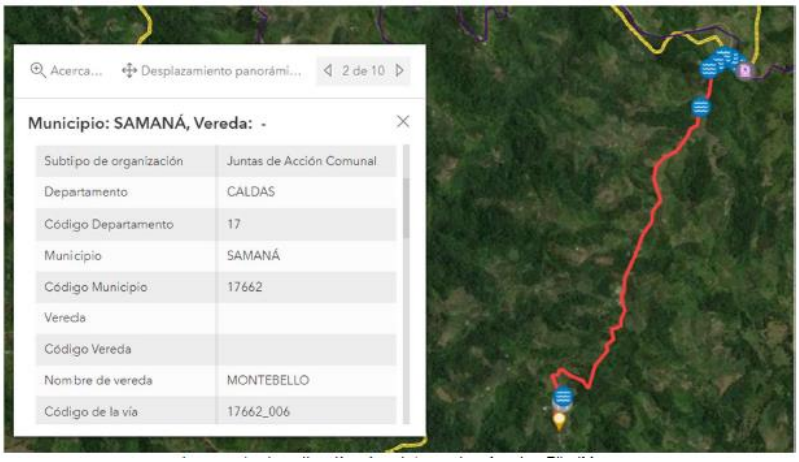


Ilustración 17 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7

TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.122.901,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 16 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 14/1/25, remitió los soportes para el desembolso del primer 40%.
- Por medio de correo electrónico de fecha 20/1/25 remitió el radicado solicitando el diseño para la valla ante el INVIAS.
- Por medio de correo electrónico de fecha 22/1/25 remitió el plan de inversión y el plan de compras No. 1 ajustados.
- Por medio de correo electrónico de fecha 25/1/25 remitió documentos correspondientes a la afiliación de los trabajadores.

54.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4125,4	0

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 17 Personal Convenio Solidario

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2173 de 2024

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

55.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

55.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- Por medio del Oficio CINP-555-127-0009 de fecha 2/1/25, le solicitó a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- Por medio del Oficio CINP-555-155-0051 de fecha 2/1/25, le recordó a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- Por medio de oficio CINP-555-196-0122 de fecha 10/1/25 le solicitó a la JAC información ambiental.
- Por medio oficio CINP-555-210-0157 de fecha 10/1/25 le recordó a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.
- Por medio de oficio CINP-555-220-0250 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC el espesor para el mejoramiento de la vía, debido al resultado del CBR.
- Por medio de oficio CINP-555-226-0259 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC la actualización de las pólizas.
- Por medio de oficio CINP–555–275–0394 de fecha 28/1/25 remite a la JAC instrucciones para la consignación de rendimientos financieros.

- Por medio de correo electrónico de fecha 28/1/25 remitió a la JAC instrucción para la nómina electrónica.

56.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. Para dar inicio a la obra, se encuentra pendiente la definición del mejoramiento del suelo de la zona a intervenir.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, se encuentra pendiente el mejoramiento que se debe realizar al suelo de la zona a intervenir con la placa huella, por cuanto los resultados de capacidad de soporte del mismo, según los estudios realizados por el INVIAS, dio un valor inferior al 3%**.**
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

- Debido a los resultados obtenidos del estudio de suelos que realizó EL INSTITUTO previo a la suscripción de este convenio, se requería el mejoramiento de la subrasante al obtenerse un C.B.R. menor al 3% que es el porcentaje mínimo de este parámetro para la estructura de la placa huella de acuerdo a lo indicado en la cartilla del INVIAS. A pesar de conocerse esta condición de la subrasante y la necesidad de mejoramiento, no se incluyeron recursos en el presupuesto del convenio para atender la obligación señalada en el Anexo Técnico que reza:

> *(…)*
> *"La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el organismo de acción comunal y/o comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales"*
> *(…)*

  Como tampoco se incluyó el mejoramiento requerido, esta situación fue tratada en las reuniones del 18 de noviembre de 2024 y el 24 de enero de 2025 en la DT Caldas de INVIAS. De acuerdo a esta última reunión la Interventoría remitió a EL INTITUTO, un concepto a través del oficio CINP–555–291–0450 del 31 de enero de 2025, por lo que estaríamos en espera de una decisión.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	162
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	163
1	**INTRODUCCIÓN**		165
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		166
2.1	Localización		166
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		167
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		167
2.4	Características técnicas del proyecto		167
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		167
3.1	Información general del contrato		167
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		169
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		169
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		169
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		171
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	577
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	588
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		171
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		172
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		172
7	**Conclusiones y recomendaciones**		173
8	**Anexos**		173
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 108,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.753.245,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.753.245,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.543.699,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.103.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			201.253.245,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

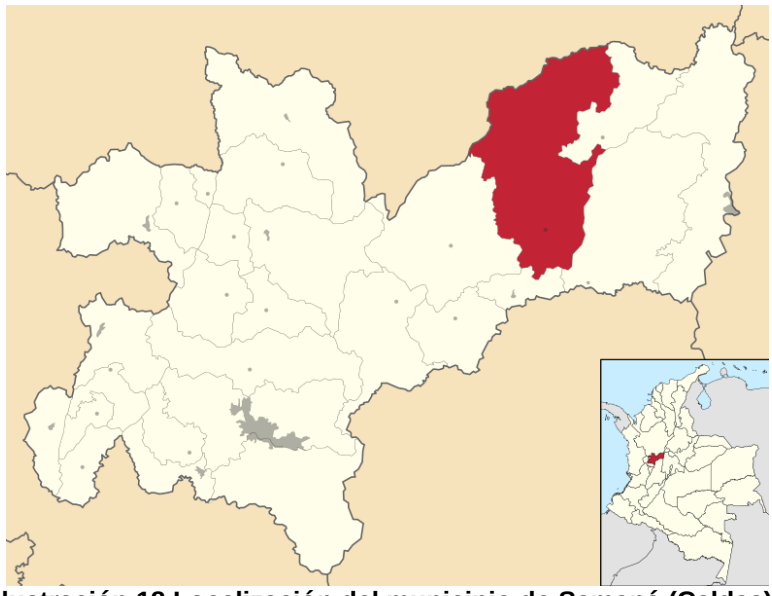


Ilustración 18 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

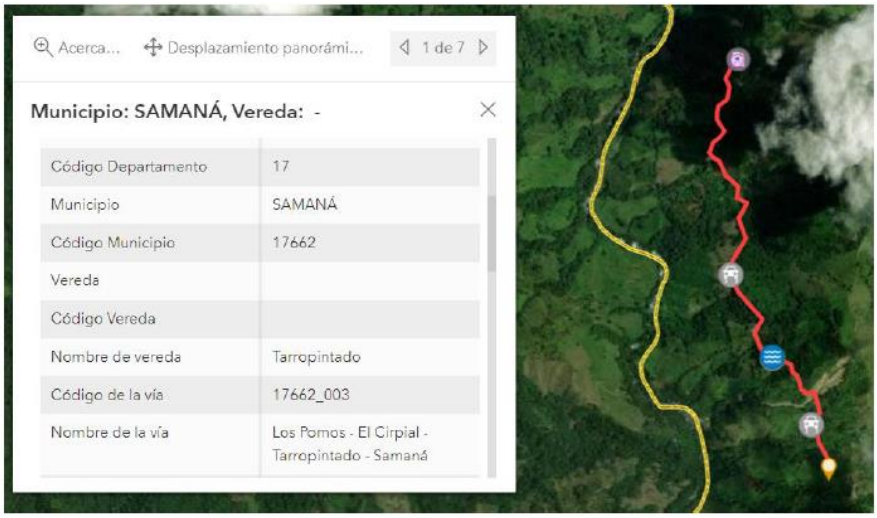


Ilustración 19 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO
NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 18 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

61.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Se evaluarán las acciones a realizar para la ejecución de obras en secuencia.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,8	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,9	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3463,8	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,40	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.
El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2524 de 2024

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

62.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

63.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la preparación para la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría se encuentra en la preparación para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	176
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	177
1	**INTRODUCCIÓN**		179
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		180
2.1	Localización		180
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		181
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		181
2.4	Características técnicas del proyecto		181
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		181
3.1	Información general del contrato		181
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		183
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		183
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		183
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		184
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	595
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	606
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		186
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		186
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		187
7	**Conclusiones y recomendaciones**		187
8	**Anexos**		188
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: IAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 121,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.855.760,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

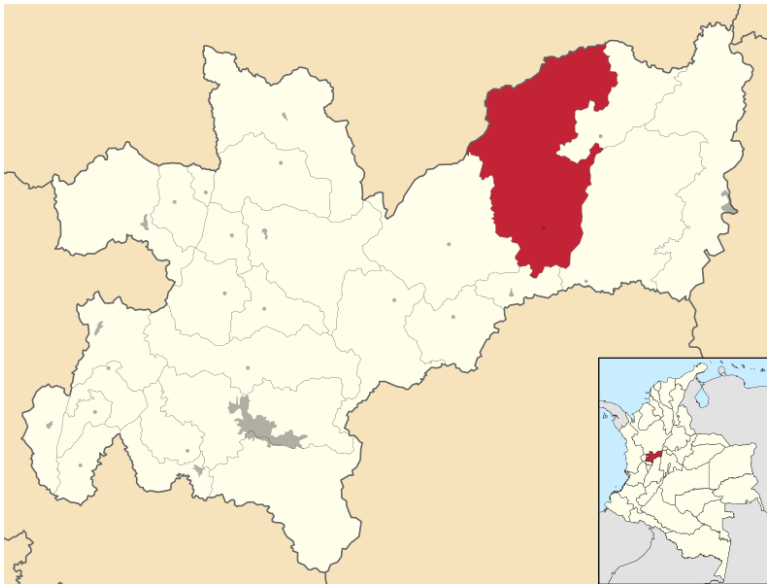


Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

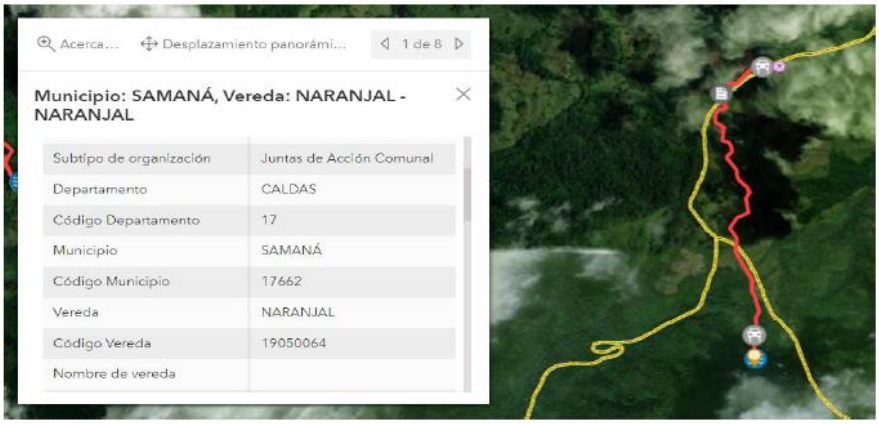


Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.135.576,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Patronal			

Tabla 19 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correos electrónicos de fecha 2/1/25 y 3/1/25, remitió HV y soportes del Ing. Residente.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 10/1/25, 14/1/25 y 15/1/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1 y no. 2.
- Por medio de correo electrónico de fecha 13/1/25, remitió las actas del comité operativo no. 1 y no. 2 debidamente firmadas.
- Por medio de correo electrónico de fecha 23/1/25 remitió a la interventoría el soporte de pago de las pólizas.
- Por medio de correo electrónico de fecha 23/1/25 remitió el plan de ingreso del personal y las cantidades de obra a solicitar en el primer desembolso.
- Por medio de correo electrónico de fecha 23/1/25 remitió el registro fotográfico del buzón de sugerencias para el convenio.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 25/1/25 y 27/1/25 remite a la interventoría documentos corregidos correspondientes al plan de compras No. 1.

68.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,3	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	111,7	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	86,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	27,5	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3969,1	0

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 10.1.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2175 de 2024.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

69.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

69.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- Por medio del Oficio CINP-555-129-0011 de fecha 2/1/25, le solicitó a la JAC los rendimientos financieros y extractos bancarios.
- Por medio del Oficio CINP-555-157-0053 de fecha 2/1/25, le recordó a la JAC la notificación sobre la novedad contractual a la aseguradora.
- Por medio del Oficio CINP-555-177-0073 de fecha 2/1/25, remitió aprobación del Ing. Residente propuesto.
- Por medio del Oficio CINP-555-197-0123 de fecha 10/1/25, le solicitó a la JAC información ambiental.
- Por medio del Oficio CINP-555-211-0158 de fecha 10/1/25, le recuerda a la JAC la solicitud del modelo de la valla informativa al INVIAS.

- Por medio de oficio CINP-555-227-0260 de fecha 17/1/25 le solicitó a la JAC la actualización de las pólizas.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 25/1/25 y 27/1/25 remitió a la JAC observaciones sobre los documentos presentados para el plan de compras No. 1.
- Por medio de oficio CINP-555-275-0394 de fecha 28/1/25 remitió a la JAC instrucciones para la consignación de los rendimientos financieros.
- Por medio de correo electrónico de fecha 28/1/25 remite a la JAC instrucción para la nómina electrónica.
- Realización de reuniones de comité operativo: No. 1 de fecha 2/1/25, No. 2 de fecha 10/1/25, No. 3 de fecha 14/1/25, No. 4 de fecha 22/1/25 y No. 5 de fecha 29/1/25.

70.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el inicio de la obra, se encuentra pendiente la remisión, por parte de la JAC, de los documentos necesarios para el desembolso de recursos con el fin de la realización de la primera compra de materiales.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad.

Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	190
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	191
1	**INTRODUCCIÓN**		193
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		194
2.1	Localización		195
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		195
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		195
2.4	Características técnicas del proyecto		195
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		196
3.1	Información general del contrato		196
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		197
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		198
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		198
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		199
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	613
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	624
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		200
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		201
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		202
7	**Conclusiones y recomendaciones**		202
8	**Anexos**		202
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		639
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		641

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	191
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDALA LINDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.682.607,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	146,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.207.048,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.182.607,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	17.634.812,55	17.634.812,55
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.338.750,00	2.338.750,00
VALOR EJECUTADO	**19.973.562,55**	**19.973.562,55**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 39.323.279,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.973.562,55
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	9,93%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de subrasante - 27/01/25



Suministro de agua y compacatción de subbase - 30/01/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

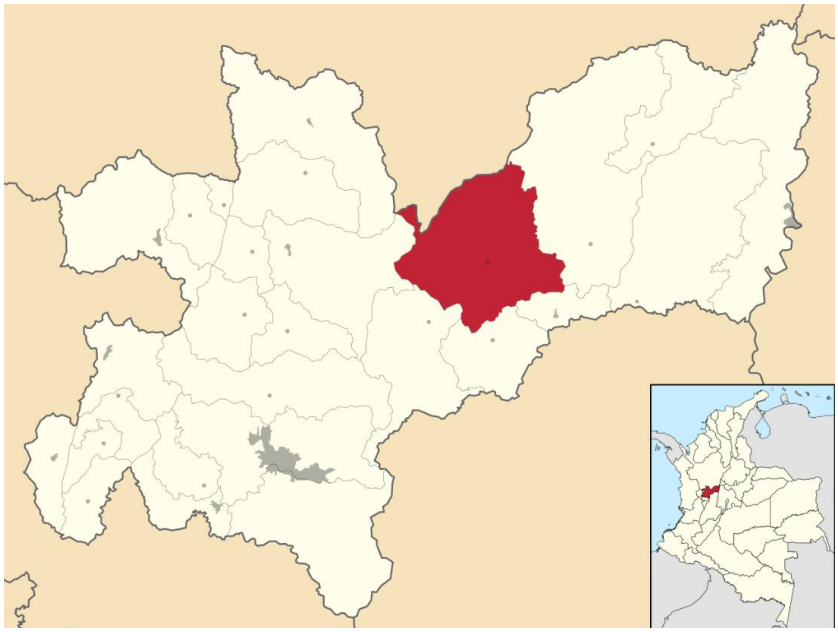


Ilustración 22 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

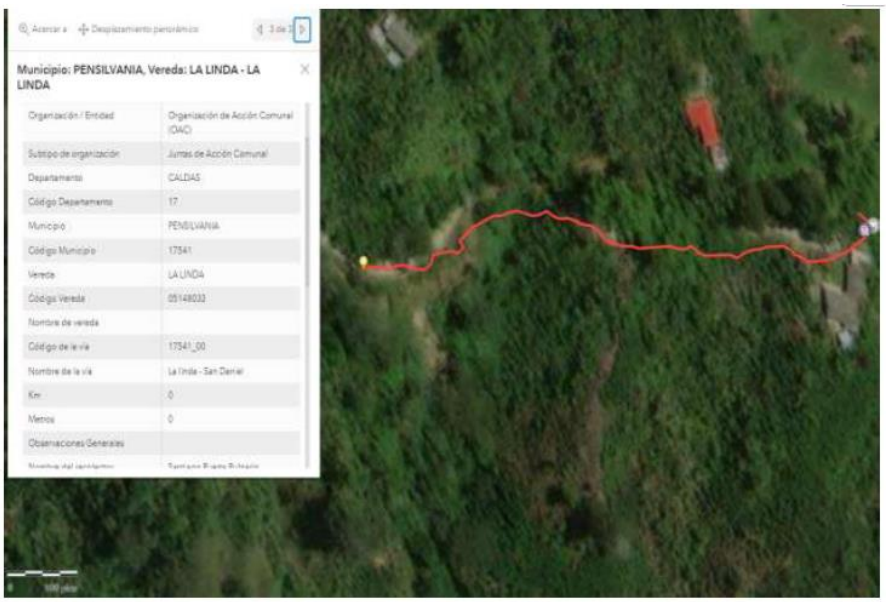


Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel , del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciara que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza	

de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Tabla 20 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Mediante correos electrónicos de fecha 7/1/25, remitió los formatos para el desembolso y demás documentación para la realización de la primera compra.
- Mediante correos electrónicos de fecha 14/1/25, remitió la relación del personal a vincular y su subsanación.
- Mediante electrónico de fecha 17/1/25 hace entrega de la documentación correspondiente al desembolso No 2.
- Mediante correo electrónico de fecha 21/1/25 solicita le sea aclarado el permiso para hacer el cierre de la vía a intervenir.
- Mediante correo electrónico de fecha 22/1/25 remite el Acta de inicio firmada.
- Mediante correo electrónico de fecha 21/1/25 solicita al INVIAS el diseño de la valla.

75.2.2 Actividades Técnicas

Se ejecutaron en el periodo las siguientes actividades acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 2,95 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	27%	20%	39.323.279,20
Ejecutado	18%	10%	19.973.562,55
Avance / Retraso	**9%**	**10%**	19.349.716,65

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	68,5%	4,3	2,95
2	Subbase Granular Clase C	M3	96%	57,1%	111,7	61.2
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	80,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	27,5	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3969,1	0

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 11.3.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 21 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 11.4.

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 11.5.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 11.6

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2227 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**CONVENIO 2227 - 2024**	**64 días**	**jue 2/01/25**	**dom 16/03/25**	**27%**	**18%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**jue 2/01/25**	**mar 7/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	jue 2/01/25	mar 7/01/25	100%	100%
4			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**59 días**	**mar 7/01/25**	**dom 16/03/25**	**24%**	**15%**
5			Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	mar 7/01/25	mar 21/01/25	100%	68%
6			Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	vie 31/01/25	96%	55%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 9/02/25	dom 16/03/25	0%	0%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 31/01/25	jue 6/03/25	0%	0%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 6/02/25	jue 6/03/25	0%	0%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de enero de 2025, la Inversión Programada fue de 39.323.279,20; la Inversión Ejecutada fue de 19.973.562,55. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 19.349.716,65.

76.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

76.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda La Linda, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de las reuniones de comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 17/12/24 y No. 3 de fecha 23/12/24.

77.1.2 Actividades Técnicas

El día 27 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentación para el desembolso No. 02. 2. Envío de resultados de laboratorio

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 2,95 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 18% e Inversión de 10% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml y Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $61.948.058,27 correspondiente al 31% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 90 días para el vencimiento del plazo del convenio.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 11.7.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 11.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	205
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	206
1	**INTRODUCCIÓN**		208
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		209
2.1	Localización		209
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		210
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		210
2.4	Características técnicas del proyecto		211
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		211
3.1	Información general del contrato		211
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		212
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		213
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		213
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		214
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	658
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	676
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	678
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	680
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	682
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	669
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		200
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		216
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		216
7	**Conclusiones y recomendaciones**		217
8	**Anexos**		217
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		684
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		686

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	206
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2140-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA RITA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 201.393.774,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.393.774,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.727.480,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.893.774,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	19.281.883,69	19.281.883,69
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.338.750,00	2.338.750,00
VALOR EJECUTADO	**21.620.633,69**	**21.620.633,69**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 41.028.109,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 21.620.633,69
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,82%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de subbase - 27/01/2025



Levantamiento topográfico - 29/01/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: CASTILLA
Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.

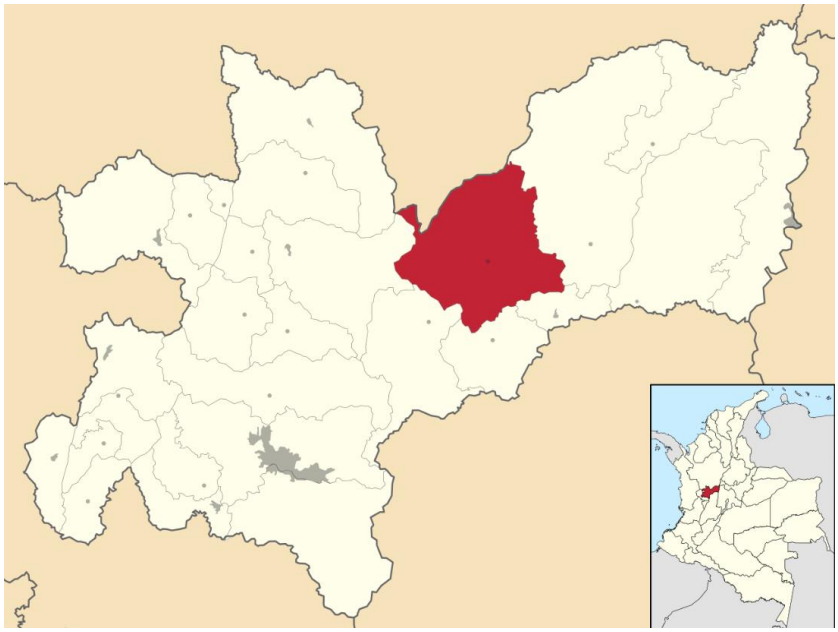


Ilustración 24 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

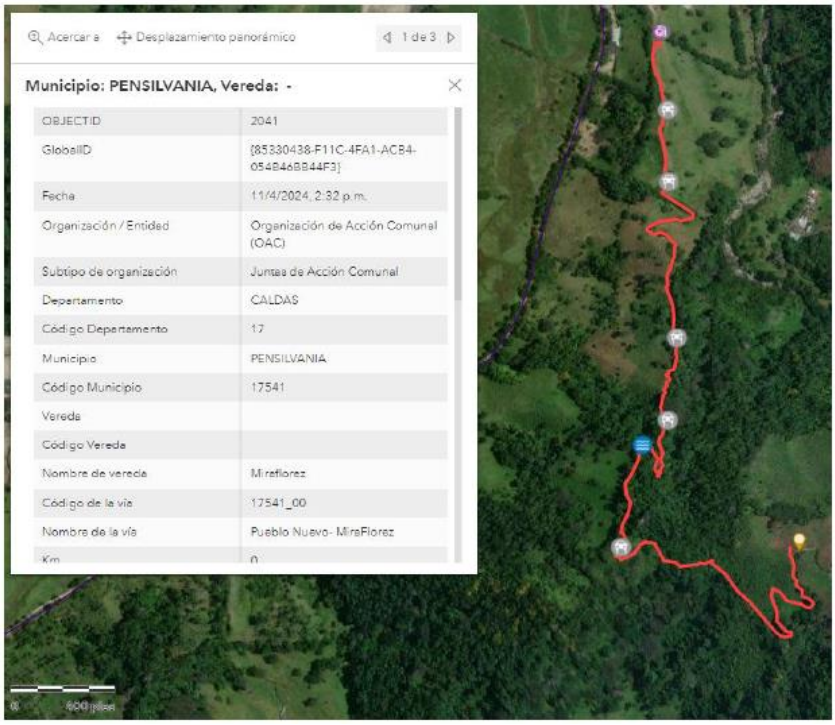


Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 22 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 13/1/25, remitió el listado del personal a vincular en obra.
- Por medio de correo electrónico de fecha 17/1/25, remitió los contratos del personal a vincular en obra y el cronograma actualizado.
- Por medio de correo electrónico de fecha 17/1/25, remitió los documentos correspondientes al desembolso No. 1.
- Por medio de correo electrónico de fecha 22/1/25, remitió el Acta de Inicio firmada.

82.2.2 Actividades Técnicas

Se ejecutaron en el periodo las siguientes actividades acumuladas:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 3,34 m3.

· Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	14%	20%	41.028.109,50
Ejecutado	25%	11%	21.620.633,69
Avance / Retraso	**11%**	**9%**	19.407.475,81

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100 %	68 %	4,31	2,95
2	Subbase Granular Clase C	M3	96 %	55 %	107,22	61,2
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	79,3	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	25,1	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3652,5	0

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 12.3.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	Jesús Alirio Ramírez

Tabla 23 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 12.4

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 12.5.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 12.6.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2140 de 2024 y su aprobación en SECOP

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**CONVENIO 2140 - 2024**	**59 días**	**mar 14/01/25**	**sáb 22/03/25**	**14%**	**25%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**lun 20/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**53 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 22/03/25**	**9%**	**21%**
5			Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	89%	84%
6			Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	10%	59%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	0%	0%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	0%	0%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	0%	0%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de enero 2025, la Inversión Programada fue de 41.028.109,50; la Inversión Ejecutada fue de 21.620.633,69. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 19.407.475,81.

83.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

83.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-097-5089 de fecha 3/12/24, remitió la aprobación de las hojas de vida de los profesionales enviados por la JAC.
- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- Realización de reunión del comité operativo No.1 de fecha 19/12/24.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Santa Rita, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

84.1.2 Actividades Técnicas

Se realizó supervisión y seguimiento a las siguientes actividades acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 3,34 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 14% e Inversión de 11% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 100 ml y Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $51.834.454,83 correspondiente al 26% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 90 días para el vencimiento del plazo del convenio.

86 ANEXO

86.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

86.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver anexo 12.7.

86.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

86.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 12.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	219
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	220
1	**INTRODUCCIÓN**		222
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		223
2.1	Localización		223
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		224
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		224
2.4	Características técnicas del proyecto		224
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		224
3.1	Información general del contrato		224
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		226
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		226
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		226
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		227
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	703
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	714
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		229
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		229
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		230
7	**Conclusiones y recomendaciones**		230
8	**Anexos**		230
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 150,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.655.581,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.655.581,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.155.580,85

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

87 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

88 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

88.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.

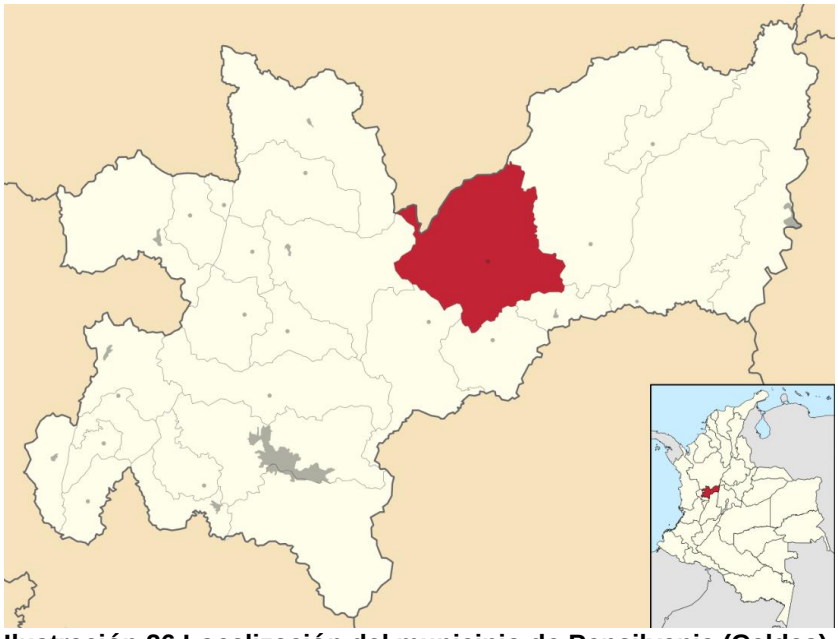


Ilustración 26 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

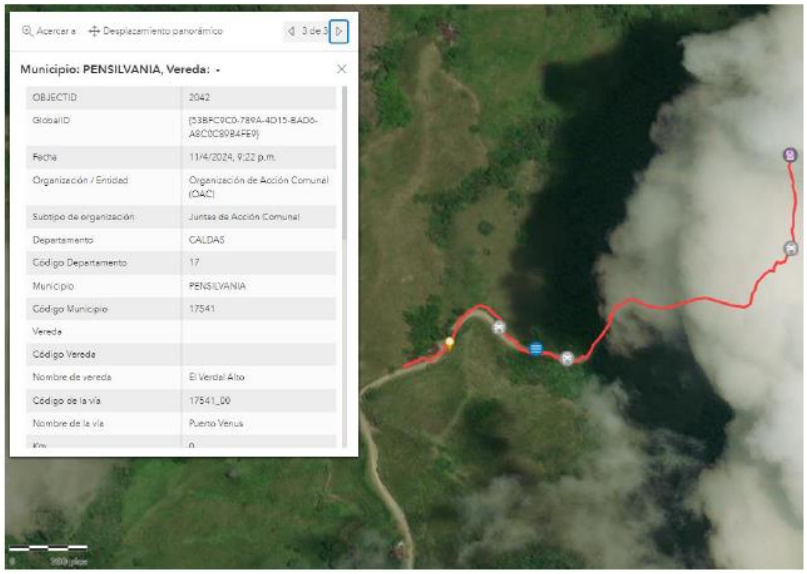


Ilustración 27 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

88.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

88.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

88.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

89 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.065.559,00	27/06/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	27/06/2024	31/12/2027

Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Tabla 24 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

89.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

89.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 17/1/25 remitió los documentos correspondientes a la contratación del Ingeniero Residente y el Contador.
- Por medio de correo electrónico de fecha 20/1/25 remitió los documentos correspondientes al primer desembolso.
- Por medio de correo electrónico de fecha 23/1/25 remitió los documentos correspondientes al primer desembolso en donde incluye los nuevos proveedores mencionados en el comité No. 3.
- Por medio de correo electrónico de fecha 30/1/25 remite los documentos correspondientes al ingreso del personal y el resumen del plan de compras No. 1

89.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

89.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

89.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	96,4	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	77,0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,3	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3554,0	0

90 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

90.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

90.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas
Maestro de Obra	Hernando De Los Ríos Franco

Tabla 25 Personal Convenio Solidario

90.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2077 de 2024

90.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

90.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

90.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

90.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

90.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

90.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

91 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

91.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

91.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda El Verdal, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

91.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

91.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el inicio de obra, se encuentra pendiente, por parte de la JAC, que se remitan los documentos correspondientes al desembolso de recursos para revisión por parte de la Interventoría, y realización de la primera compra.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

93 ANEXO

93.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

93.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

93.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

93.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	233
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	234
1	**INTRODUCCIÓN**		236
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		237
2.1	Localización		237
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		238
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		238
2.4	Características técnicas del proyecto		238
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		239
3.1	Información general del contrato		239
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		240
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		240
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		241
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		241
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	721
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	732
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		243
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		243
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		244
7	**Conclusiones y recomendaciones**		244
8	**Anexos**		245
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: N.A.
PLAZO PRORROGA 02: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 150,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.654.007,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: CASTILLA
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

94 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

95 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

95.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

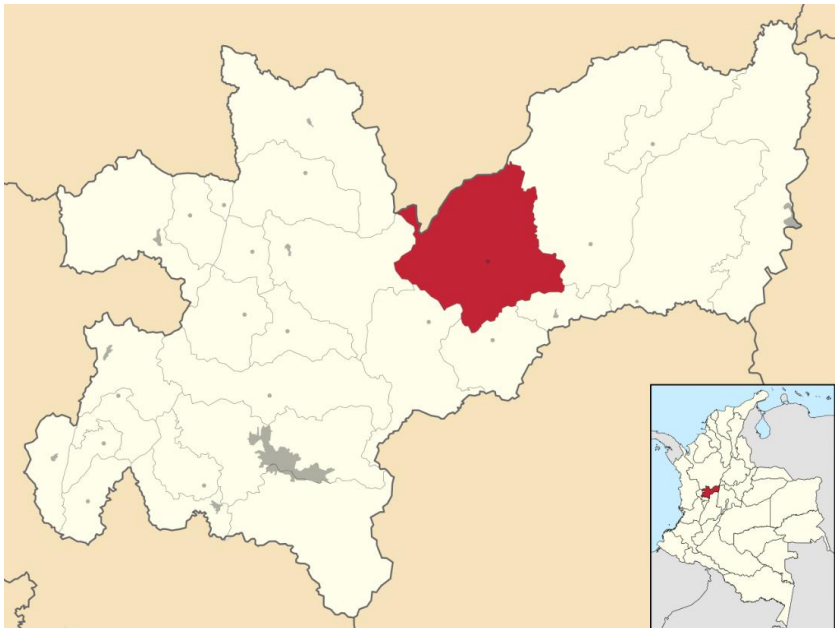


Ilustración 28 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

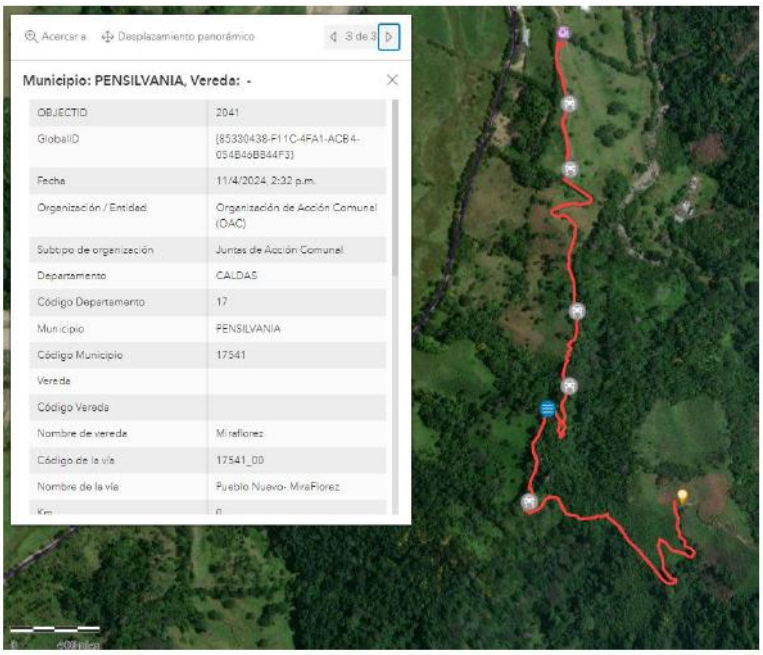


Ilustración 29 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

95.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

95.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

95.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

96 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407		
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.115.401,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	03/7/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 26 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

96.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

96.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 15/1/25, remitió la solicitud de cambio de personal para el proyecto.
- Por medio de correo electrónico de fecha 22/1/25 solicitó sea aprobada la hoja de vida del Ingeniero Residente.
- Por medio de correo electrónico de fecha 23/1/25 remitió la solicitud del diseño de la valla ante INVIAS.

96.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

96.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

96.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,4	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,5	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	91,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,1	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4223,7	0

97 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

97.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

97.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz
Maestro de Obra	José Uriel Bernal Gutiérrez

Tabla 27 Personal Convenio Solidario

97.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2169 de 2024

97.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

97.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

97.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

97.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

97.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

97.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

98 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

98.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

98.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Miraflores, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- Realización de reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 12/12/24 y No. 2 de fecha 27/12/24.

98.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento y no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

98.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

99 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para dar inicio a la etapa de ejecución de obra, hace falta el envío, por parte de la JAC, del plan de compras y la corrección del cronograma de obra, para aprobación de los mismos, compromisos que fueron adquiridos en el comité operativo No.3**.**
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

100 ANEXO

100.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

100.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

100.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

100.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	247
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	248
1	**INTRODUCCIÓN**		250
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		251
2.1	Localización		521
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		252
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		252
2.4	Características técnicas del proyecto		252
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		253
3.1	Información general del contrato		253
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		254
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		255
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		255
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		256
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	739
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	757
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	759
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	761
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	763
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	750
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		257
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		259
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		260
7	**Conclusiones y recomendaciones**		260
8	**Anexos**		261
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		765
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		767

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	248
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.055.145,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	115.518,75	115.518,75
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.002.676,00	3.002.676,00
VALOR EJECUTADO	**3.118.194,75**	**3.118.194,75**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 33.069.363,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.118.194,75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,57%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - 24/01/25 - Conformación subrasante



FOTO 2 - 28/01/25 - Conformación de subrasante

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

101 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

102 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

102.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

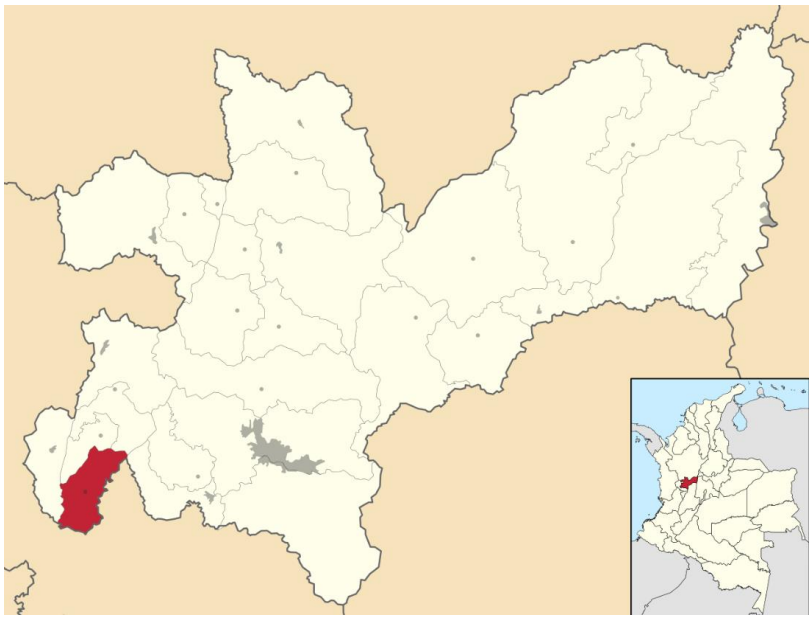


Ilustración 30 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

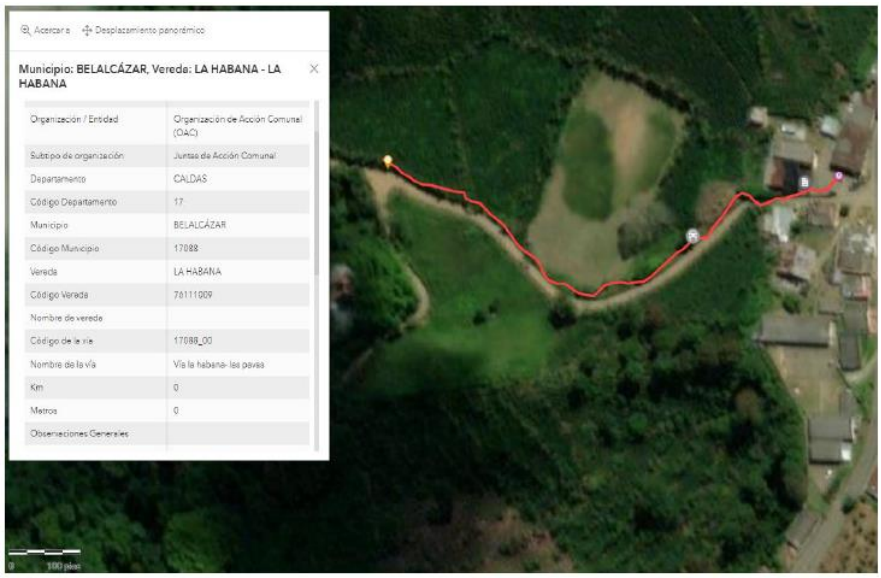


Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462		
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.055.515,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.027.758,00	04/7/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Tabla 28 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

103.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 8/1/25, remitió el plan de compras con cantidades a solicitar en la primera compra, para revisión de la Interventoría.
- Por medio de correo electrónico de fecha 13/1/25, remitió la solicitud de primera compra.
- Por medio de correo electrónico de fecha 13/1/25, solicitó al INVIAS el arte de la valla informativa del proyecto.
- Por medio de correos electrónicos de fecha 13/1/25, 14/1/25, 15/1/25 y 17/1/25, remitió los documentos compromiso de los comité operativo, resumen primera compra, relación del personal, cronograma de ingreso del personal, plan de compras, relación de proveedores, y sus respectivas correcciones.
- Por medio de correo electrónico de fecha 21/1/25 remite los documentos ambientales solicitados.
- Por medio de correo electrónico de fecha 24/1/25 remite los documentos para el desembolso No. 2.
- Por medio de correo electrónico de fecha 24/1/25 remite las pólizas actualizadas.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 28/1/25 y 29/1/25 remite los documentos para desembolso No. 3 y 4.

103.2.2 Actividades Técnicas

Se ejecutaron en el periodo las siguientes actividades acumuladas:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3.

103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	16%	17%	33.069.363,05
Ejecutado	8%	2%	3.118.194,75
Avance / Retraso	**-8%**	**-15%**	**-29.951.168,30**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	133,1	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	101,5	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	32,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4675,1	0

104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

104.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 15.3

104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Alzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez
Maestro de Obra	Juan Fernando Castaño Agudelo

Tabla 29 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 15.4.

104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 15.5.

104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 15.6.

104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**Proyecto Placas Huellas en concreto**	**73 días**	**jue 16/01/25**	**mar 15/04/25**	**16%**	**8%**
2	✓		INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
3			**ETAPA 1**	**30 días**	**jue 16/01/25**	**vie 21/02/25**	**39%**	**20%**
4			**Fase 1**	**14 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 1/02/25**	**83%**	**43%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
6			Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	70%	0%
7			**Fase 2**	**8 días**	**sáb 1/02/25**	**mar 11/02/25**	**0%**	**0%**
8			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	0%	0%
9			**Fase 3**	**8 días**	**mié 12/02/25**	**vie 21/02/25**	**0%**	**0%**
10			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	0%	0%
11			**ETAPA 2**	**23 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**0%**	**0%**
12			**Fase 4**	**7 días**	**vie 21/02/25**	**sáb 1/03/25**	**0%**	**0%**
13			Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	0%	0%
14			**Fase 5**	**8 días**	**sáb 1/03/25**	**mar 11/03/25**	**0%**	**0%**
15			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	0%	0%
16			**Fase 6**	**8 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**0%**	**0%**
17			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	0%	0%
18			**ETAPA 3**	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**0%**	**0%**
19			**Fase 7**	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**0%**	**0%**
20			Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	0%	0%
21			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	0%	0%
22			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	0%	0%
23			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	0%	0%
24			FIN	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	0%	0%

104.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de enero 2025, la Inversión Programada fue de 33.069.363,05; la Inversión Ejecutada fue de 3.118.194,75. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 29.951.168,30.

104.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

104.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

105.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda La Habana, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-108-5259 de fecha 19/12/24, remite a la JAC la aprobación de la hoja de vida remitida.

- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 18/12/24 y No. 3 de fecha 26/12/24.

105.1.2 Actividades Técnicas

El día 23 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentación para el desembolso

No. 01. 2. Revisión, aprobación y radicación de los documentos presentados para el desembolso No. 1.

El día 28 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentación para el desembolso No. 03. **2.** Informar cuando se logre la meta física de 80 ml de subbase compactada para coordinar ensayos. **3.** Revisión, aprobación y radicación de los documentos presentados para el desembolso No. 3.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3.

105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría no ha recibido del OAC, los extractos bancarios de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 8% e Inversión de 2% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $48.201.610,39 correspondiente al 24% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 90 días para el vencimiento del plazo del convenio.

107 ANEXO

107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver Anexo 15.7.

107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

107.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 15.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	263
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	264
1	**INTRODUCCIÓN**		267
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		268
2.1	Localización		268
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		269
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		269
2.4	Características técnicas del proyecto		269
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		270
3.1	Información general del contrato		270
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		271
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		272
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		271
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		273
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	778
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	795
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	798
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	800
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	802
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	789
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		274
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		275
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		276
7	**Conclusiones y recomendaciones**		276
8	**Anexos**		277
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		804
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		806

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.792.352,17**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	8.521.130,29	8.521.130,29
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.508.750,00	3.508.750,00
VALOR EJECUTADO	**12.029.880,29**	**12.029.880,29**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 17.747.882,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.029.880,29
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	5,96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Andres Felipe Castilla Molina

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

108 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

109.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.

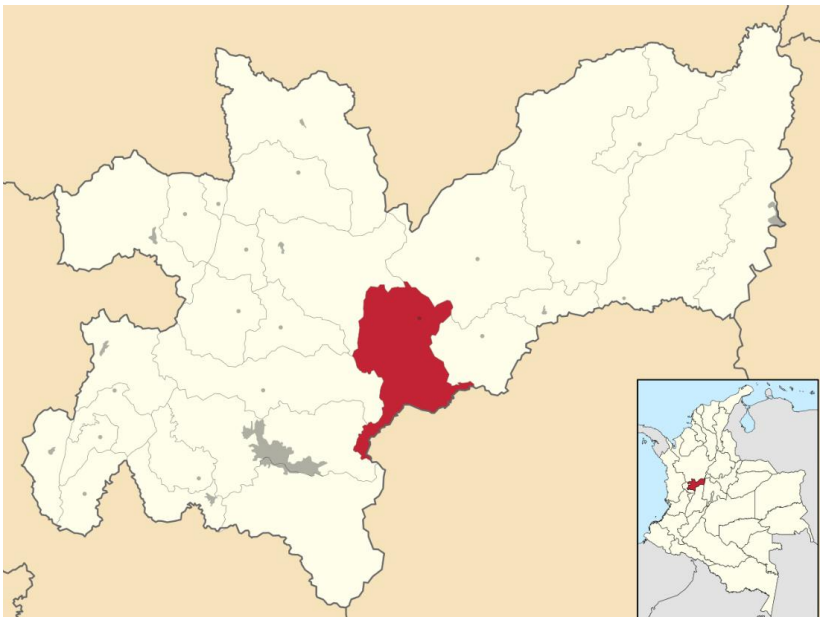


Ilustración 32 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

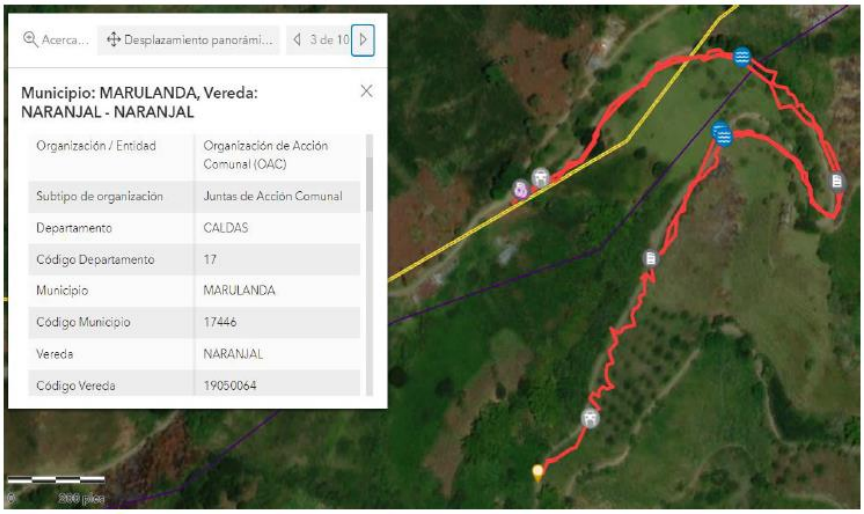


Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.

109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**

CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.329.236,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	20/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	28/06/2024	30/04/2025

Tabla 30 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

110.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correos electrónicos de fechas 8/1/25, 13/1/25 y 14/1/25, remitió las cotizaciones faltantes, y demás documentos compromiso de la reunión del comité operativo, para revisión y aprobación.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 15/1/25, remitió la documentación para realizar los pagos correspondiente al 40% de las compras.
- Por medio de correo electrónico de fecha 24/12/25 remitió documentos ambientales.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 24/12/25 y 30/1/25 remite documentos para desembolso No. 1.
- Por medio de correo electrónico de fecha 30/125 remitió extractos bancarios.
-

110.2.2 Actividades Técnicas

Se ejecutaron en el periodo las siguientes actividades acumuladas:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 32,12 m3.

110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	10%	9%	17.747.882,10
Ejecutado	6%	6%	12.029.880,29
Avance / Retraso	**-4%**	**-3%**	**-5.718.001,81**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	84%	4,5	3,78
2	Subbase Granular Clase C	M3	33%	28%	38,37	31,12
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	83,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto -	M3	0%	0%	28,6	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	40% Piedra para placa huella)					
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,5	0

111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

111.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 16.3.

111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Sergio Antonio Uribe
Contador	Daniela Hurtado Duque
Maestro de Obra	Alpio Gallego

Tabla 31 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 16.4.

111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 16.5.

111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 16.6.

111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2094 de 2024.

111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		**CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL**		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**9%**	**8%**
2		**INICIO**		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**9%**	**8%**
3		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	84%
4		Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	33%	28%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	0%	0%
6		Concreto Ciclópeo Resistencia 14 MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	0%	0%
7		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	0%	0%
8		**FINAL**		**0**	**0 días**	**mié 16/04/25**	**mié 16/04/25**	0%	0%

111.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de enero 2025, la Inversión Programada fue de 17.747.882,10; la Inversión Ejecutada fue de 12.029.880,29. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 5.718.001,81.

111.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

111.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6..

112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

112.1.1 Actividades Administrativas

- Realización de la reunión de socialización del proyecto a la JAC, de fecha 03/12/24, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS.
- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.
- La Interventoría por medio del Oficio CINP-555-109-5260 de fecha 19/12/24, remite la aprobación de las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Naranjal, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

112.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 03 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos

pendientes. **2.** Se propone brindar acceso a los profesionales del convenio al correo de la JAC.

El día 14 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml, cantidad ejecutada: 3,78 m3.

· Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 32,12 m3.

112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 6% e Inversión de 6% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 152 ml y Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 50 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $25.860.209,56 correspondiente al 13% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 90 días para el vencimiento del plazo del convenio.

114 ANEXO

114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 16.7.

114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

114.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 16.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	279
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	280
1	**INTRODUCCIÓN**		282
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		283
2.1	Localización		283
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		284
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		284
2.4	Características técnicas del proyecto		284
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		284
3.1	Información general del contrato		284
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		286
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		286
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		286
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		287
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		824
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		288
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		289
7	**Conclusiones y recomendaciones**		289
8	**Anexos**		289
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

115 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

116.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

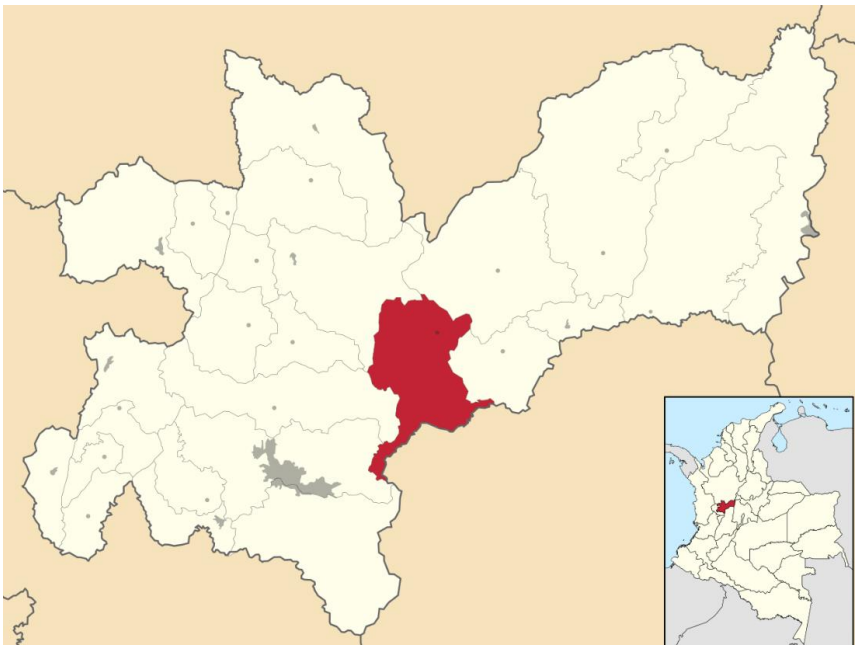


Ilustración 34 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

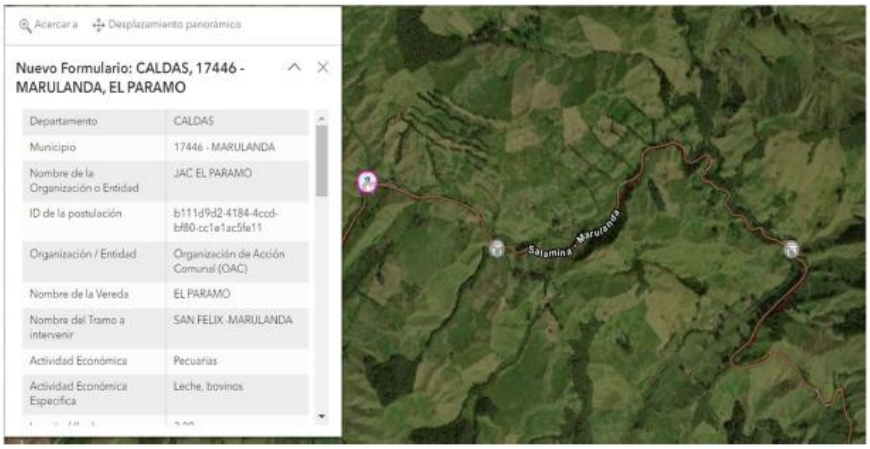


Ilustración 35 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2

TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 32 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

117.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

117.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,63	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,73	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	35,89	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4188,10	0

118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

118.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3551 de 2024

118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra No aplica para el periodo.

118.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo.

118.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

118.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

119.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

119.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

No aplica para este periodo.

120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del desembolso de los recursos para iniciar la etapa de alistamiento, solicitud, revisión y aprobación de las hojas de vida, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

121 ANEXO

121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

121.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	291
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	292
1	**INTRODUCCIÓN**		294
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		295
2.1	Localización		295
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		296
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		296
2.4	Características técnicas del proyecto		296
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		296
3.1	Información general del contrato		296
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		298
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		298
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		298
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		300
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N.A.
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		400
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		301
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		301
7	**Conclusiones y recomendaciones**		301
8	**Anexos**		302
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

122 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

123.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

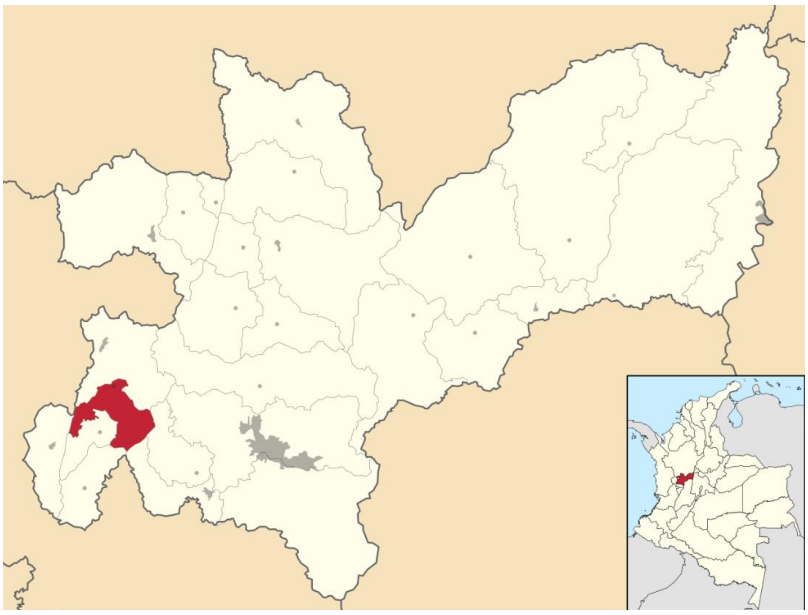


Ilustración 36 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

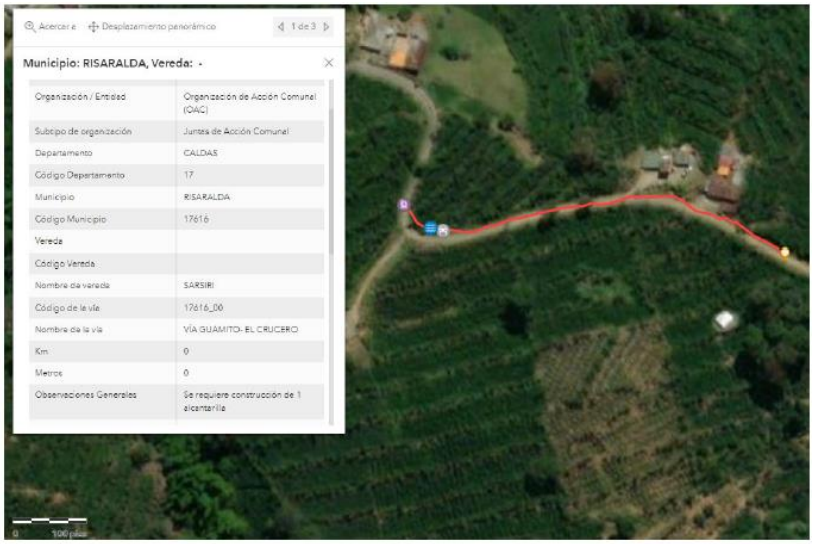


Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 33 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

124.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

124.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,52	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,56	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4075,54	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

125.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 18.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2176 de 2024

125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

125.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

125.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

125.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

126.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

126.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

No aplica para este periodo.

127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

128 ANEXO

128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

128.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** ene-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	304
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	305
1	**INTRODUCCIÓN**		307
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		308
2.1	Localización		308
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		309
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		309
2.4	Características técnicas del proyecto		310
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		310
3.1	Información general del contrato		310
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		312
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		312
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		312
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		313
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	838
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	856
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	858
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	860
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	862
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	849
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		314
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		315
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		316
7	**Conclusiones y recomendaciones**		316
8	**Anexos**		317
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		864
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		866

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	305
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS
PERIODO MES: ene-25

CONVENIO No.: 2187-2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 202.034.766,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	181,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.483.797,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.534.766,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	137.742,80	137.742,80
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.567.682,88	4.567.682,88
VALOR EJECUTADO	**4.705.425,68**	**4.705.425,68**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 15.679.220,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.705.425,68
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,35%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación subrasante - 24/01/25



Figuración de acero - 27/01/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

129 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

130.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.

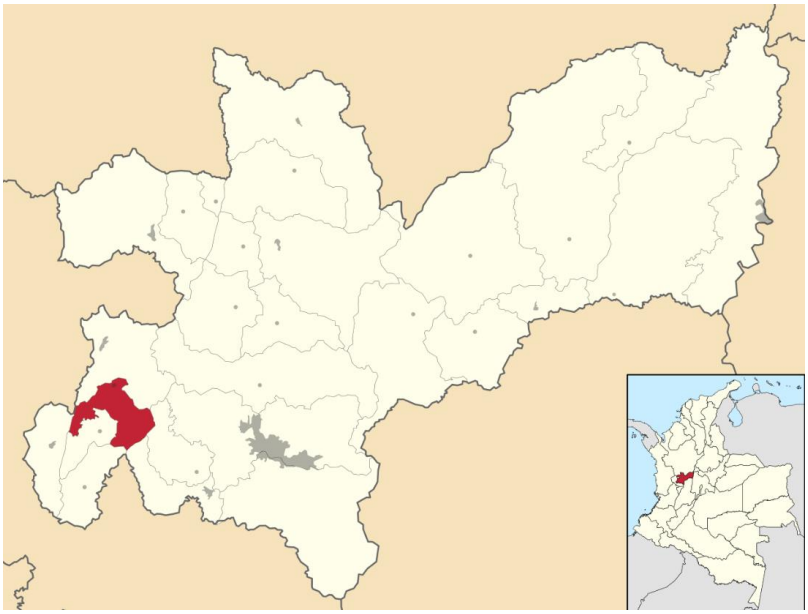


Ilustración 38 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

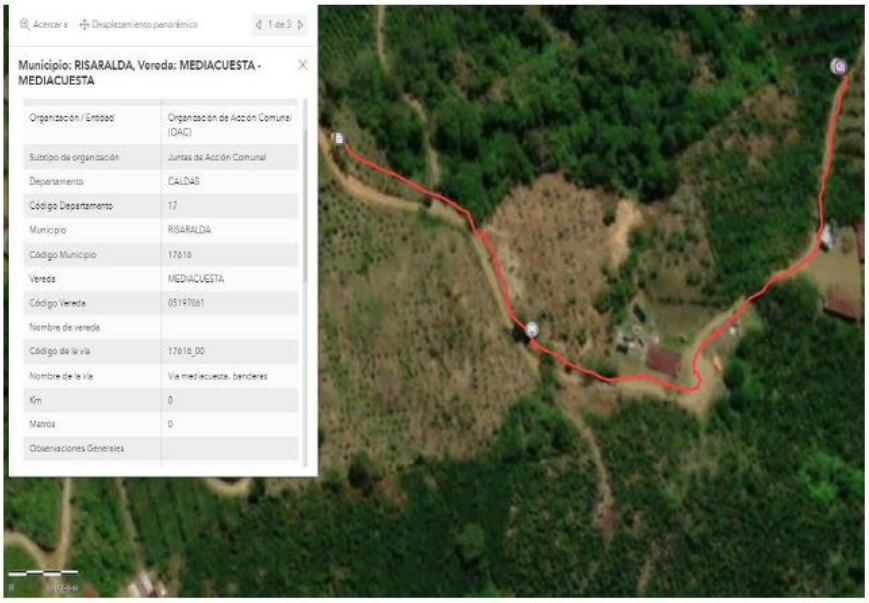


Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 40 Estado inicial del sector

130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9

TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 34 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

131.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- Por medio de correo electrónico de fecha 2/1/25, remitió la cotización para el plan de compras.
- Por medio de correo electrónico de fecha 3/1/25, remitió la respuesta a los extractos bancarios y rendimientos financieros solicitados por la Interventoría.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 7/1/25, 9/1/25 y 20/1/25, remitió los formatos ambientales, permisos de agua, listado de personal y demás documentación compromiso del comité operativo no. 3.
- Por medio de correos electrónicos de fechas 22/1/25, 28/1/25 y 29/1/25 remite documentos corregidos para el desembolso No. 1.

131.2.2 Actividades Técnicas

Se ejecutaron en el periodo las siguientes actividades acumuladas:

Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3.

131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	13%	8%	15.679.220,16
Ejecutado	6%	3%	4.705.425,68
Avance / Retraso	**-7%**	**-5%**	**-10.973.794,48**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	44%	100%	2,29	5,20
2	Subbase Granular Clase C	M3	60%	0%	81,42	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	7%	0%	100,4	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	7%	0%	31,4	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4949,7	0

132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

132.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 19.3.

132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado
Maestro de Obra	Guillermo Velázquez Blandón

Tabla 35 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 19.4.

132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 19.5.

132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 19.6.

132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2187 de 2024

132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA**	**61 días**	**lun 20/01/25**	**lun 14/04/25**	**13%**	**6%**
2			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA**	**61 días**	**lun 20/01/25**	**lun 14/04/25**	**13%**	**6%**
3	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	44%	100%
4	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	44%	100%
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	44%	100%
6			Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	60%	0%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	7%	0%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	7%	0%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	7%	0%

132.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de enero 2025, la Inversión Programada fue de 15.679.220,16; la Inversión Ejecutada fue de 4.705.425,68. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 10.973.794,48.

132.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

132.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

133.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 9, 10, 11, 12 y 13 por medio de los oficios CINP-555-180-0098, CINP-555-213-0201, CINP-555-237-0276, CINP-555-262-0363 y CINP-555-293-0457.

- Realización de las reuniones del comité operativo: No. 1 de fecha 11/12/24, No. 2 de fecha 17/12/24 y No. 3 de fecha 24/12/24.

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de Prórroga de la JAC Vereda Media Cuesta, debidamente suscrita para el trámite correspondiente.

133.1.2 Actividades Técnicas

El día 13 de enero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentación pendiente (Plan de ingreso del personal). **2.** Reunión No. 5 del Comité Operativo.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

· Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3.

133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se encuentra pendiente el mejoramiento que se debe realizar al suelo de la zona a intervenir con la placa huella, por cuanto los resultados de capacidad de soporte del mismo, según los estudios realizados por el INVIAS, dio un valor inferior al 3%.

- El avance físico de la obra es del 6% e Inversión de 3% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $42.756.820,13 correspondiente al 21% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 90 días para el vencimiento del plazo del convenio
- Debido a los resultados obtenidos del estudio de suelos que realizó EL INSTITUTO previo a la suscripción de este convenio, se requería el mejoramiento de la subrasante al obtenerse un C.B.R. menor al 3% que es el porcentaje mínimo de este parámetro para la estructura de la placa huella de acuerdo a lo indicado en la cartilla del INVIAS. A pesar de conocerse esta condición de la subrasante y la necesidad de mejoramiento, no se incluyeron recursos en el presupuesto del convenio para atender la obligación señalada en el Anexo Técnico que reza:

  (…)

  "La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el organismo de acción comunal y/o comunidad étnica, en el marco del desarrollo del convenio o contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales"

  (…)

  Como tampoco se incluyó el mejoramiento requerido, esta situación fue tratada en las reuniones del 18 de noviembre de 2024 y el 24 de enero de 2025 en la DT Caldas de INVIAS. De acuerdo a esta última reunión la Interventoría remitió a EL INTITUTO, un concepto a través del oficio CINP–555–291–0450 del 31 de enero de 2025, por lo que estaríamos en espera de una decisión.

135 ANEXO

135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta el registro fotográfico. Ver Anexo 19.7.

135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

135.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 19.8.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	319
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	320
1	**INTRODUCCIÓN**		322
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		323
2.1	Localización		323
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		324
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		324
2.4	Características técnicas del proyecto		324
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		324
3.1	Información general del contrato		324
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		326
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		326
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		326
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		327
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	876
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		328
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		328
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		329
7	**Conclusiones y recomendaciones**		329
8	**Anexos**		329
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.048.100,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.048.100,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.477.350,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.526.429,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.548.100,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

136 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

137.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.

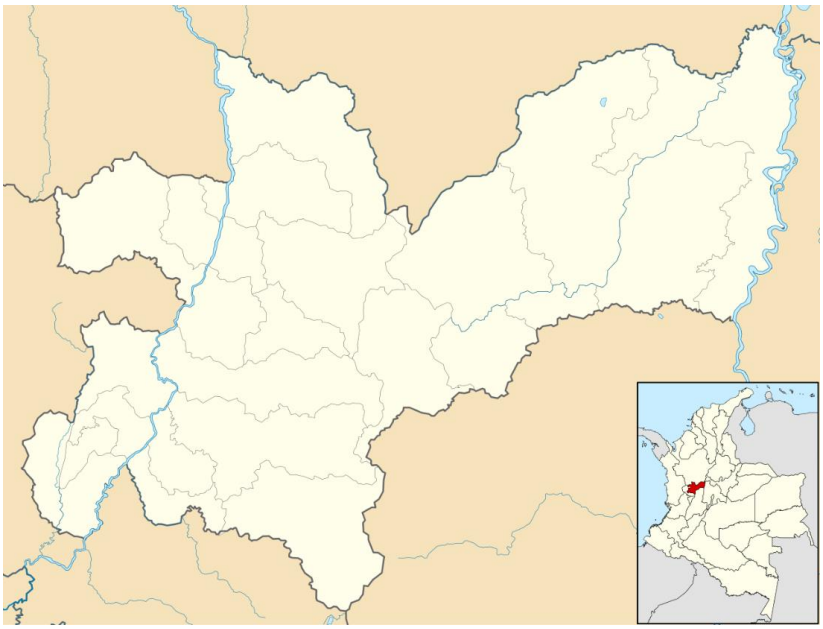


Ilustración 41 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

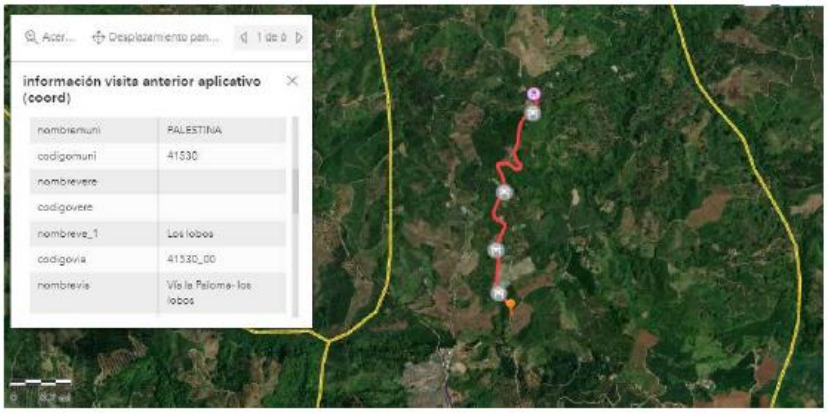


Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6

TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	02/03/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 36 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

138.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

138.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,85	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	127,45	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,76	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4782,63	0

139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

139.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3169 de 2024

139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

139.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

139.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

139.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

140.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

140.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

140.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

140.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

No aplica para este periodo.

141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

142 ANEXO

142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

142.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	332
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	333
1	**INTRODUCCIÓN**		335
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		336
2.1	Localización		336
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		337
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		337
2.4	Características técnicas del proyecto		337
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		337
3.1	Información general del contrato		337
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		339
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		339
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		339
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		340
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	883
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		772
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		772
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		342
7	**Conclusiones y recomendaciones**		342
8	**Anexos**		342
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.472.544,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.472.544,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.646.058,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.747.104,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.972.544,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

143 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

144.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

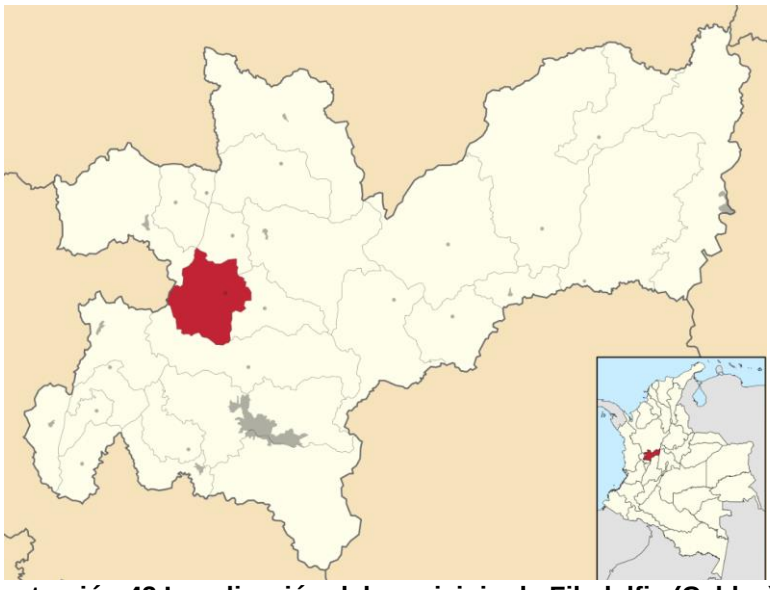


Ilustración 43 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

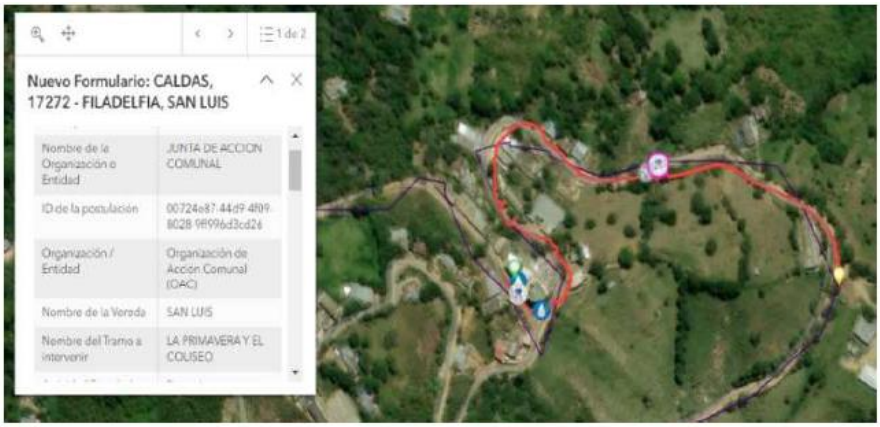


Ilustración 44 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8

TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 37 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

145.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

No aplica para el periodo.

145.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

146.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3530 de 2024

146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

146.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

146.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

146.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

147.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

147.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

No aplica para este periodo.

148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

149 ANEXO

149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

149.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	344
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	345
1	**INTRODUCCIÓN**		347
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		348
2.1	Localización		348
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		349
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		349
2.4	Características técnicas del proyecto		349
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		349
3.1	Información general del contrato		349
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		351
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		351
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		351
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		352
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	890
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		353
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		354
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		354
7	**Conclusiones y recomendaciones**		354
8	**Anexos**		355
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.949.712,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.949.712,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.349.316,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.600.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.499.917,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.449.712,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Dirección de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

150 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

151.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 45 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

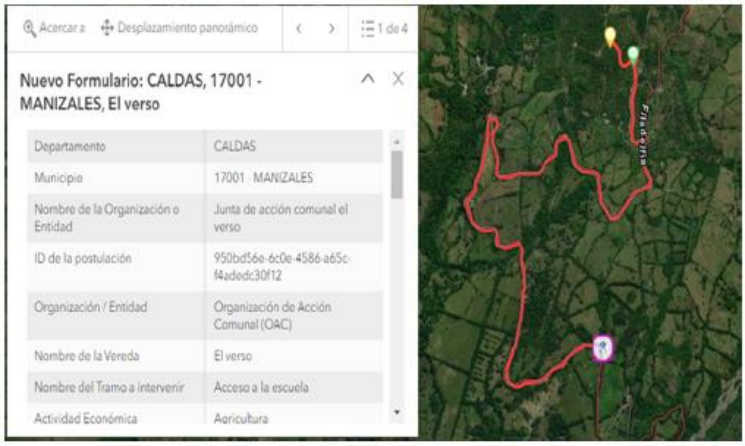


Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1

TELÉFONO:	3193164956
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 38 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

152.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

No aplica para el periodo.

152.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	70,17	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,90	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

153.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3652 de 2024

153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

153.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

153.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

153.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

154.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

154.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

No aplica para este periodo.

155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

156 ANEXO

156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

156.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	357
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	358
1	**INTRODUCCIÓN**		360
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		361
2.1	Localización		361
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		362
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		362
2.4	Características técnicas del proyecto		362
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		362
3.1	Información general del contrato		362
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		364
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		364
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		364
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		365
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	897
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		366
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		366
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		366
7	**Conclusiones y recomendaciones**		367
8	**Anexos**		367
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3622-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA ALTO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.471.038,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.471.038,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	163,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.089.476,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.562.684,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.318.878,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.971.038,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

ASTILLA

Firma
Nombre: ANDRES CASTAÑEDA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

157 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

158.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.

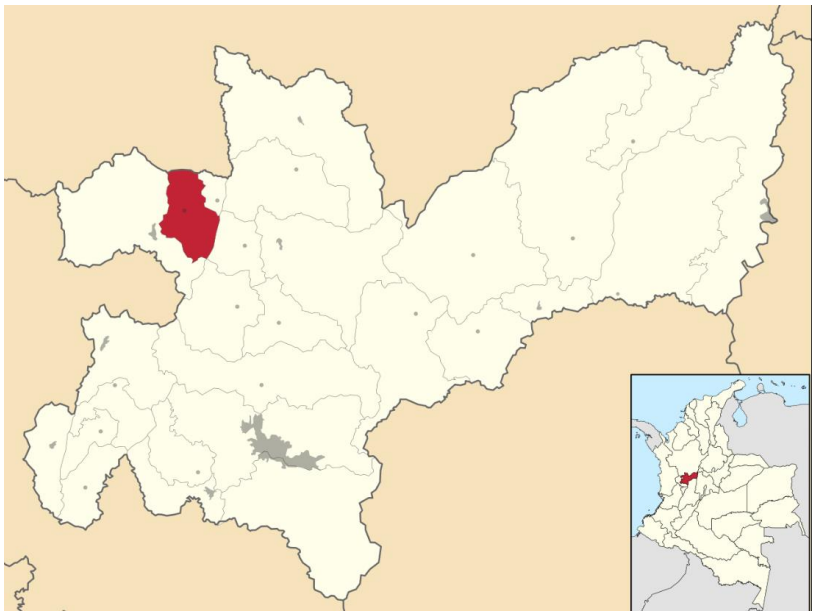


Ilustración 47 Localización del municipio de Supía (Caldas).

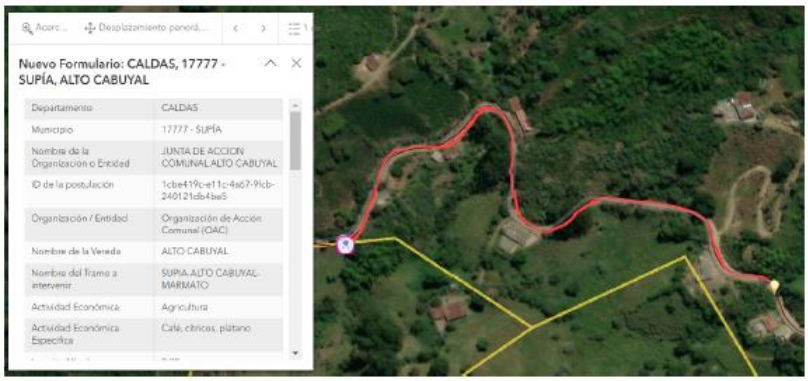


Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 39 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

159.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

159.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

160 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

160.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024

160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

160.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

160.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

160.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

161.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

161.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

163 ANEXO

163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

163.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	369
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	370
1	**INTRODUCCIÓN**		372
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		373
2.1	Localización		373
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		374
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		374
2.4	Características técnicas del proyecto		374
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		374
3.1	Información general del contrato		374
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		376
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		376
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		376
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		377
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	904
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		378
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		378
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		378
7	**Conclusiones y recomendaciones**		379
8	**Anexos**		379
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.464.740,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.464.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.402.534,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.990.130,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.964.740,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

164 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

165.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

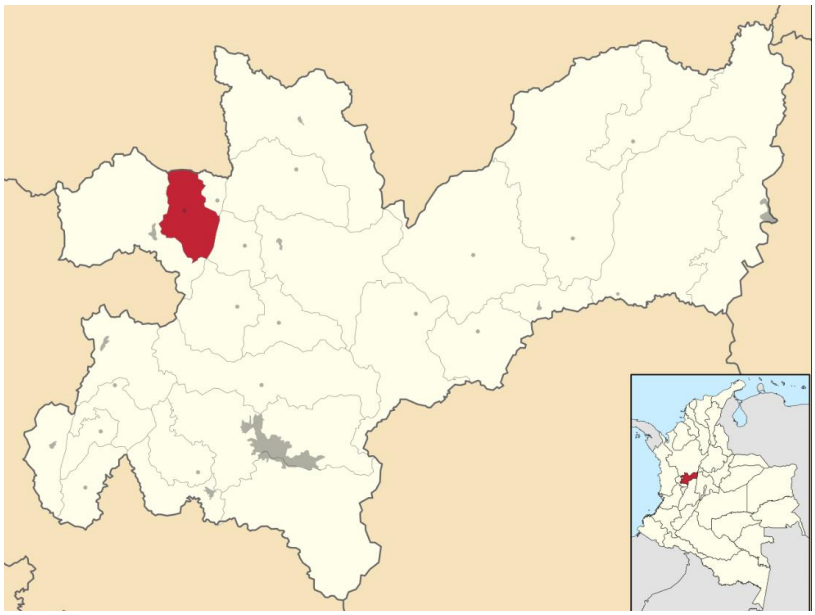


Tabla 40 Localización del municipio de Supía(Caldas).

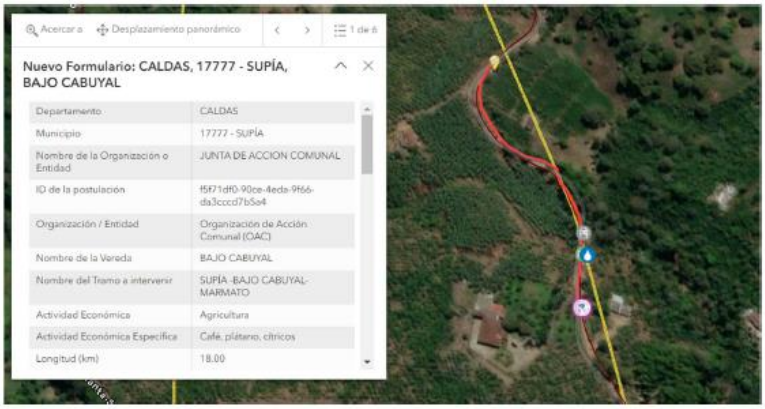


Ilustración 49 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Tabla 41 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

166.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

166.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

167 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

167.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3983 de 2024

167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

167.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

167.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

167.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

168.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

168.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

170 ANEXO

170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

170.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	381
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	382
1	**INTRODUCCIÓN**		384
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		385
2.1	Localización		385
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		386
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		386
2.4	Características técnicas del proyecto		386
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		386
3.1	Información general del contrato		386
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		388
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		388
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		388
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		389
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	911
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		390
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		390
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		391
7	**Conclusiones y recomendaciones**		391
8	**Anexos**		391
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO PRORROGA 01:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	41.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.460.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.460.667,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.263.198,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.129.573,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.960.667,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

171 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.
Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

172.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 50 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

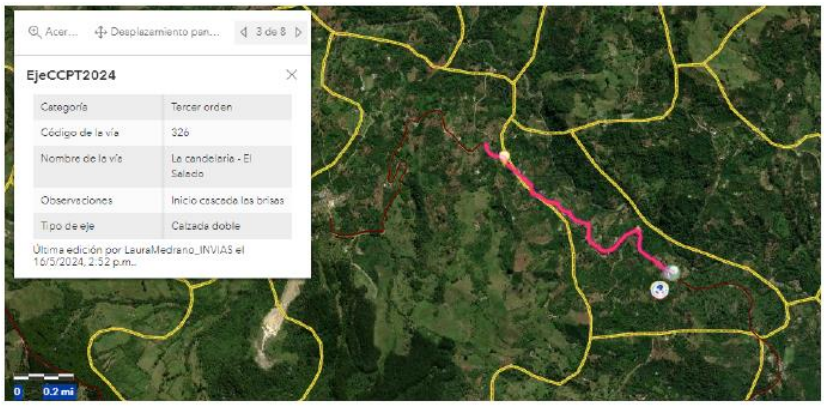


Ilustración 51 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.

CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 42 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

173.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

173.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

174.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3646 de 2024

174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

174.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

174.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

174.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

175.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

175.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

177 ANEXO

177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

177.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	394
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	395
1	**INTRODUCCIÓN**		397
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		398
2.1	Localización		398
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		399
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		399
2.4	Características técnicas del proyecto		399
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		399
3.1	Información general del contrato		399
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		401
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		401
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		401
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		402
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	918
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		403
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		404
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		404
7	**Conclusiones y recomendaciones**		404
8	**Anexos**		405
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	
	FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.487.839,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.487.839,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.145.376,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.987.839,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

178 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

179.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 52 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 43 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

180.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

180.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,28	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,30	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,64	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,51	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	29,10	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

181 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

181.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

181.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

181.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

181.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 2569 de 2024

181.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

181.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

181.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

181.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

181.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

181.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

181.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

182 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

182.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

182.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

182.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

182.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

183 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

184 ANEXO

184.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

184.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

184.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

184.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	407
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	408
1	**INTRODUCCIÓN**		410
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		411
2.1	Localización		411
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		412
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		412
2.4	Características técnicas del proyecto		412
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		412
3.1	Información general del contrato		412
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		414
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		414
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		414
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		416
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	925
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		416
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		417
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		417
7	**Conclusiones y recomendaciones**		417
8	**Anexos**		418
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3296-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

185 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

186 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

186.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 53 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

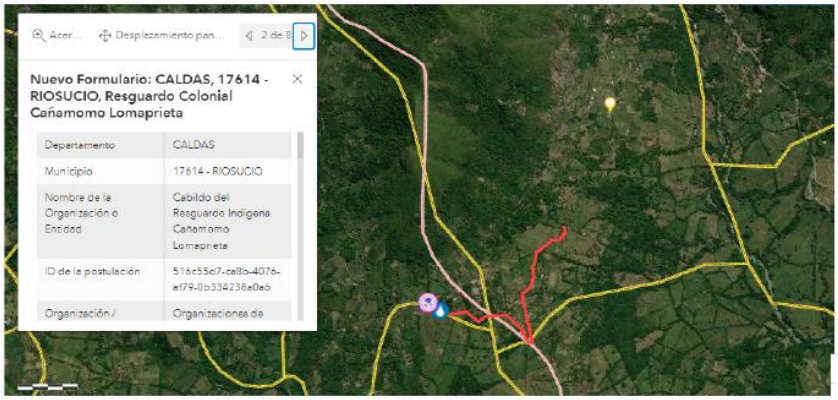


Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

186.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

186.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

186.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

187 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04

TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027

Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 44 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

187.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

187.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

187.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

187.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

187.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	36,35	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

188 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

188.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3286 de 2024

188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

188.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

188.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

188.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

189.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

189.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos

ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

191 ANEXO

191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

191.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	420
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	421
1	**INTRODUCCIÓN**		423
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		424
2.1	Localización		424
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		425
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		425
2.4	Características técnicas del proyecto		425
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		425
3.1	Información general del contrato		425
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		427
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		427
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		427
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		428
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	501
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		429
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	968
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1344
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		46
5.1	Información general del contrato		46
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		429
5.3	Informes especialistas y profesionales		1042
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		47
5.5	Informe matriz de riesgos.		47
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		47
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1350
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	939
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1348
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	948
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1354
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		430
7	**Conclusiones y recomendaciones**		430
8	**Anexos**		430
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		953
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO No.: 3595-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	7/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO PRORROGA 01:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	65,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.348.439,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.348.439,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	165,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.411.914,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.602.357,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			41.834.168,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.848.439,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: ASTILLA

Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

192 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 03, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

193.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.



Ilustración 55 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

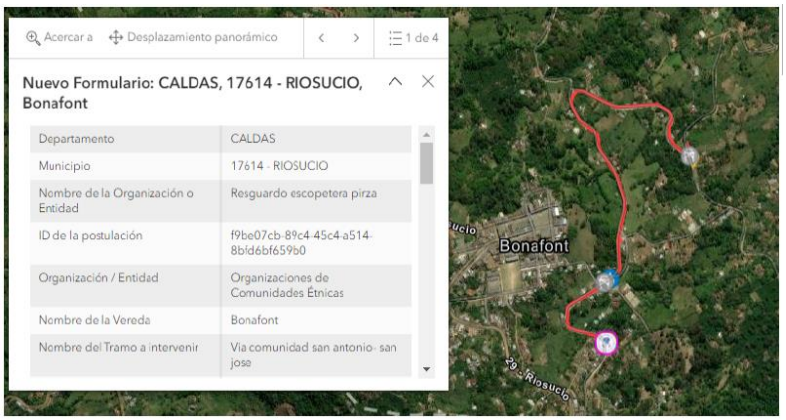


Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San
Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	07/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta

CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 45 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

194.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

194.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	138,85	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,61	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	42,96	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4648,36	0

195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

195.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento de la misma la suspensión No. 1 del Convenio No. 3595 de 2024

195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

195.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

195.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

195.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

196.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2024, remitió al INVIAS el Acta de suspensión de la JAC firmada por la Interventoría.

196.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

198 ANEXO

198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

198.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.
