


CONSORCIO CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	**3601 DE 2022**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7**
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL 06**
CODIGO:	**IM-555-06**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ **No. De Revisiones**		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable de Elaboración	Nombre:	ASTRID GAONA SOLER			
	Firma:				
	Fecha:	may-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	may-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	BIBIANA PATERNINA ESPITIA			
	Firma.				
	Fecha:	may-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



SAMANÁ



PENSILVANIA


BELALCÁZAR


MARULANDA


RISARALDA


PALESTINA


FILADELFIA



SUPÍA


RIOSUCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

IM – 555 – 06

ABRIL 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 06	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	
	Astrid Gaona Soler Ingeniero Residente
REVISADO POR:	
	Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OBRAS DE ARTE:** 0	**OBRAS DE ARTE:** 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS 47
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 47
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 48
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 48

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 48
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 49

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 49
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 49
2.6.2 Seguimiento al plan de carga 50

3 INTRODUCCIÓN 53

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 54

4.1 LOCALIZACIÓN 54
4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 55
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 55
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 55

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 55

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 55
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 57
5.2.1 Actividades Administrativas 57
5.2.2 Actividades Técnicas 57
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 57
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 57

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 58

6.1 INFORME SEMANAL 58
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 58
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 58
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 59
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 59
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 59
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 59
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 59
6.9.3 Actas de Comités 60
6.9.4 Actas de Reunión 60

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 60

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 60
7.1.1 Actividades Administrativas 60
7.1.2 Actividades Técnicas 60
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 60

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

9 ANEXO 61

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 61
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 62
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 62
9.4 BITÁCORA 62

10 INTRODUCCIÓN 65

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 66

11.1 LOCALIZACIÓN 66
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 67
11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 67
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 68

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 68

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 68
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 70
12.2.1 Actividades Administrativas 70
12.2.2 Actividades Técnicas 70
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 71
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 71

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 72

13.1 INFORME SEMANAL 72
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 72
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 72
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 73
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 73
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 74
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 74
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 74
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 74
13.9.3 Actas de Comités 74
13.9.4 Actas de Reunión 74

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 74

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 74
14.1.1 Actividades Administrativas 75
14.1.2 Actividades Técnicas 75
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 76

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76

16 ANEXO 77

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 77

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 77
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 77
16.4 BITÁCORA 77

17 INTRODUCCIÓN 80

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 81

18.1 LOCALIZACIÓN 81
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 82
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 82
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 83

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 83

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 83
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 85
19.2.1 Actividades Administrativas 85
19.2.2 Actividades Técnicas 86
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 86
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 86

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 88

20.1 INFORME SEMANAL 88
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 89
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 89
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 89
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 89
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 89
20.9.3 Actas de Comités 90
20.9.4 Actas de Reunión 90

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 90

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 90
21.1.1 Actividades Administrativas 90
21.1.2 Actividades Técnicas 91
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 91

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 92

23 ANEXO 92

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 92
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 92

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 92
23.4 BITÁCORA 92

24 INTRODUCCIÓN 95

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 96

25.1 LOCALIZACIÓN 96
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 97
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 97
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 98

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 98

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 98
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 99
26.2.1 Actividades Administrativas 99
26.2.2 Actividades Técnicas 99
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 99
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 100

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 101

27.1 INFORME SEMANAL 101
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 101
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 102
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 102
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 102
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 102
27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 102
27.9.4 Actas de Comités 102
27.9.5 Actas de Reunión 102

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 103

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 103
28.1.1 Actividades Administrativas 103
28.1.2 Actividades Técnicas 103
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 103

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103

30 ANEXO 104

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 104
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 104

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 104
30.4 BITÁCORA 104

31 INTRODUCCIÓN 107

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 108

32.1 LOCALIZACIÓN 108
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 109
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 109
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 110

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 110

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 110
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 112
33.2.1 Actividades Administrativas 112
33.2.2 Actividades Técnicas 112
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 113
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 113

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 114

34.1 INFORME SEMANAL 114
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 115
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 115
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 115
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 115
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 115
34.9.3 Actas de Comités 116
34.9.4 Actas de Reunión 116

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 116

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 116
35.1.1 Actividades Administrativas 116
35.1.2 Actividades Técnicas 117
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 117

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 118

37 ANEXO 118

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 118
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 118
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 118

37.4 BITÁCORA 118

38 INTRODUCCIÓN 121

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 122

39.1 LOCALIZACIÓN 122
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 123
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 123
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 123

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 123

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 123
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 125
40.2.1 Actividades Administrativas 125
40.2.2 Actividades Técnicas 125
40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 126
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 126

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 127

41.1 INFORME SEMANAL 127
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 127
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 127
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 128
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 128
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 128
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 128
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 128
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 128
41.9.3 Actas de Comités 129
41.9.4 Actas de Reunión 129

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 129

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 129
42.1.1 Actividades Administrativas 129
42.1.2 Actividades Técnicas 130
42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 130

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 131

44 ANEXO 131

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 131
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 131
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 131
44.4 BITÁCORA 131

45 INTRODUCCIÓN 134

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 135

46.1 LOCALIZACIÓN 135
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 136
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 136
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 137

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 137

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 137
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 139
47.2.1 Actividades Administrativas 139
47.2.2 Actividades Técnicas 139
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 140
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 140

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 141

48.1 INFORME SEMANAL 141
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 141
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 141
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 142
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 142
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 142
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 142
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 142
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 142
48.9.3 Actas de Comités 143
48.9.4 Actas de Reunión 143

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 143

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 143
49.1.1 Actividades Administrativas 143
49.1.2 Actividades Técnicas 143
49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 144

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 144

51 ANEXO 145

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 145
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 145
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 145
51.4 BITÁCORA 145

52 INTRODUCCIÓN 148

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 149

53.1 LOCALIZACIÓN 149
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 150
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 150
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 150

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 150

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 150
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 152
54.2.1 Actividades Administrativas 152
54.2.2 Actividades Técnicas 153
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 153
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 153

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 154

55.1 INFORME SEMANAL 154
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 154
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 154
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 155
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 155
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 155
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 155
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 155
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 156
55.9.3 Actas de Comités 156
55.9.4 Actas de Reunión 156

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 156

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 156
56.1.1 Actividades Administrativas 156
56.1.2 Actividades Técnicas 157
56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 157

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 158

58 ANEXO 158

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 158
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 158
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 158
58.4 BITÁCORA 158

59 INTRODUCCIÓN 161

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 162

60.1 LOCALIZACIÓN 162
60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 163
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 163
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 164

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 164

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 164
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 165
61.2.1 Actividades Administrativas 165
61.2.2 Actividades Técnicas 165
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 165
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 166

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 167

62.1 INFORME SEMANAL 167
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 167
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 167
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 167
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 168
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 168
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 168
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 168
62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 168
62.9.3 Actas de Comités 168
62.9.4 Actas de Reunión 168

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 168

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 168
63.1.1 Actividades Administrativas 169
63.1.2 Actividades Técnicas 169
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 169

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 169

65 ANEXO 170

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 170
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 170
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 170
65.4 BITÁCORA 170

66 INTRODUCCIÓN 173

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 174

67.1 LOCALIZACIÓN 174

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 175
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 175
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 176

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 176

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 176
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 178
68.2.1 Actividades Administrativas 178
68.2.2 Actividades Técnicas 178
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 179
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 179

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 180

69.1 INFORME SEMANAL 180
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 180
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 180
69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 180
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 180
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 181
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 181
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 181
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 181
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 181
69.9.3 Actas de Comités 181
69.9.4 Actas de Reunión 182

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 182

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 182
70.1.1 Actividades Administrativas 182
70.1.2 Actividades Técnicas 182
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 183

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 183

72 ANEXO 183

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 183
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 183
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 184
72.4 BITÁCORA 184

73 INTRODUCCIÓN 187

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 188

74.1 LOCALIZACIÓN 188

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 189
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 189
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 190

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 190

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 190
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 192
75.2.1 Actividades Administrativas 192
75.2.2 Actividades Técnicas 192
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 192
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 192

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 193

76.1 INFORME SEMANAL 193
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 193
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 193
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 194
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 194
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 194
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 194
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 194
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 195
76.9.3 Actas de Comités 195
76.9.4 Actas de Reunión 195

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 195

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 195
77.1.1 Actividades Administrativas 195
77.1.2 Actividades Técnicas 196
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 196

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 197

79 ANEXO 197

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 197
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 197
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 197
79.4 BITÁCORA 197

80 INTRODUCCIÓN 200

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 201

81.1 LOCALIZACIÓN 201

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 202
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 202
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 203

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 203

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 203
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 205
82.2.1 Actividades Administrativas 205
82.2.2 Actividades Técnicas 205
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 205
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 206

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 206

83.1 INFORME SEMANAL 206
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 207
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 207
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 207
83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 208
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 208
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 208
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 208
83.9.3 Actas de Comités 208
83.9.4 Actas de Reunión 208

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 209

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 209
84.1.1 Actividades Administrativas 209
84.1.2 Actividades Técnicas 209
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 210

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 210

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 210
85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 211
85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 211
85.4 BITÁCORA 211

86 INTRODUCCIÓN 214

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 215

87.1 LOCALIZACIÓN 215
87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 216
87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 216

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 217

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 217

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 217
88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 219
88.2.1 Actividades Administrativas 219
88.2.2 Actividades Técnicas 219
88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 220
88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 220

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 221

89.1 INFORME SEMANAL 221
89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 221
89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 221
89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 221
89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 221
89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 222
89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 222
89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 222
89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 222
89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 222
89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 222
89.9.3 Actas de Comités 223
89.9.4 Actas de Reunión 223

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 223

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 223
90.1.1 Actividades Administrativas 223
90.1.2 Actividades Técnicas 223
90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 224

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 224

92 ANEXO 225

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 225
92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 225
92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 225
92.4 BITÁCORA 225

93 INTRODUCCIÓN 228

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 229

94.1 LOCALIZACIÓN 229
94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 230
94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 231
94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 231

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 231

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 231
95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 233
95.2.1 Actividades Administrativas 233
95.2.2 Actividades Técnicas 233
95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 234
95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 234

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 235

96.1 INFORME SEMANAL 235
96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 235
96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 236
96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 236
96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 236
96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 236
96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 236
96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 236
96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 236
96.9.3 Actas de Comités 237
96.9.4 Actas de Reunión 237

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 237

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 237
97.1.1 Actividades Administrativas 237
97.1.2 Actividades Técnicas 237
97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 238

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 238

99 ANEXO 239

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 239
99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 239
99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 239
99.4 BITÁCORA 239

100 INTRODUCCIÓN 242

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 243

101.1 LOCALIZACIÓN 243
101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 244
101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 244
101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 245

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 245

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 245
102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 247
102.2.1 Actividades Administrativas 247
102.2.2 Actividades Técnicas 247
102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 248
102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 248

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 249

103.1 INFORME SEMANAL 249
103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 249
103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 250
103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 250
103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 250
103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 250
103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 250
103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 250
103.9.3 Actas de Comités 251
103.9.4 Actas de Reunión 252

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 252

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 252
104.1.1 Actividades Administrativas 252
104.1.2 Actividades Técnicas 252
104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 253

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 253

106 ANEXO 254

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 254
106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 254
106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 254
106.4 BITÁCORA 254

107 INTRODUCCIÓN 257

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 258

108.1 LOCALIZACIÓN 258
108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 259
108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 259
108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 260

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 260

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 260

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 262
109.2.1 Actividades Administrativas 262
109.2.2 Actividades Técnicas 262
109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 263
109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 263

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 264

110.1 INFORME SEMANAL 264
110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 264
110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 264
110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 265
110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 265
110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 265
110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 265
110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 265
110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 265
110.9.3 Actas de Comités 265
110.9.4 Actas de Reunión 266

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 266

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 266
111.1.1 Actividades Administrativas 266
111.1.2 Actividades Técnicas 266
111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 267

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 267

113 ANEXO 268

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 268
113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 268
113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 268
113.4 BITÁCORA 268

114 INTRODUCCIÓN 271

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 272

115.1 LOCALIZACIÓN 272
115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 273
115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 274
115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 274

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 274

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 274
116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 275

116.2.1 Actividades Administrativas 275
116.2.2 Actividades Técnicas 275
116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 276
116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 276

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 276

117.1 INFORME SEMANAL 276
117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 277
117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 277
117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 277
117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 277
117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 277
117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 277
117.9.3 Actas de Comités 278
117.9.4 Actas de Reunión 278

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 278

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 278
118.1.1 Actividades Administrativas 278
118.1.2 Actividades Técnicas 278
118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 278

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 278

120 ANEXO 280

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 280
120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 280
120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 280
120.4 BITÁCORA 280

121 INTRODUCCIÓN 283

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 284

122.1 LOCALIZACIÓN 284
122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 285
122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 286
122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 286

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 286

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 286
123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 287
123.2.1 Actividades Administrativas 287

123.2.2 Actividades Técnicas 287
123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 288
123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 288

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 289

124.1 INFORME SEMANAL 289
124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 289
124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 289
124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 289
124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 289
124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 290
124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 290
124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 290
124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 290
124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 290
124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 290
124.9.3 Actas de Comités 290
124.9.4 Actas de Reunión 290

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 290

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 290
125.1.1 Actividades Administrativas 291
125.1.2 Actividades Técnicas 291
125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 291

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 291

127 ANEXO 293

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 293
127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 293
127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 293
127.4 BITÁCORA 293

128 INTRODUCCIÓN 296

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 297

129.1 LOCALIZACIÓN 297
129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 298
129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 298
129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 299

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 299

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 299
130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 301
130.2.1 Actividades Administrativas 301
130.2.2 Actividades Técnicas 302

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 302
130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 302

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 303

131.1 INFORME SEMANAL 303
131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 303
131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 303
131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 303
131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 304
131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 304
131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 304
131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 304
131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 304
131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 304
131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 304
131.9.3 Actas de Comités 305
131.9.4 Actas de Reunión 305

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 305

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 305
132.1.1 Actividades Administrativas 305
132.1.2 Actividades Técnicas 306
132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 307

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 307

134 ANEXO 307

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 307
134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 308
134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 308
134.4 BITÁCORA 308

135 INTRODUCCIÓN 311

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 312

136.1 LOCALIZACIÓN 312
136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 313
136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 313
136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 314

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 314

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 314
137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 315
137.2.1 Actividades Administrativas 315
137.2.2 Actividades Técnicas 315
137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 315

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 316

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 316

138.1 INFORME SEMANAL 316
138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 316
138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 317
138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 317
138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 317
138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 317
138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 317
138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 317
138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 317
138.9.3 Actas de Reunión 318

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 318

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 318
139.1.1 Actividades Administrativas 318
139.1.2 Actividades Técnicas 318
139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 318

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 318

141 ANEXO 320

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 320
141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 320
141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 320
141.4 BITÁCORA 320

142 INTRODUCCIÓN 323

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 324

143.1 LOCALIZACIÓN 324
143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 325
143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 325
143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 326

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 326

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 326
144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 327
144.2.1 Actividades Administrativas 327
144.2.2 Actividades Técnicas 327
144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 327
144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 328

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 328

145.1 INFORME SEMANAL 328
145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 329
145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 329
145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 329
145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 329
145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 329
145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 329
145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 329
145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 329
145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 329
145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 329
145.9.4 Actas de Reunión 330

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 330

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 330
146.1.1 Actividades Administrativas 330
146.1.2 Actividades Técnicas 330
146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 330

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 330

148 ANEXO 331

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 331
148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 331
148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 331
148.4 BITÁCORA 331

149 INTRODUCCIÓN 334

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 335

150.1 LOCALIZACIÓN 335
150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 336
150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 337
150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 337

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 337

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 337
151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 338
151.2.1 Actividades Administrativas 338
151.2.2 Actividades Técnicas 338
151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 339
151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 339

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 340

152.1 INFORME SEMANAL 340

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 340
152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 340
152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 340
152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 340
152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 340
152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 341
152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 341
152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 341
152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 341
152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 341
152.9.3 Actas de Reunión 341

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 341

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 341
153.1.1 Actividades Administrativas 341
153.1.2 Actividades Técnicas 341
153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 342

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 342

155 ANEXO 343

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 343
155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 343
155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 344
155.4 BITÁCORA 344

156 INTRODUCCIÓN 347

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 348

157.1 LOCALIZACIÓN 348
157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 349
157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 349
157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 349

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 349

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 349
158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 351
158.2.1 Actividades Administrativas 351
158.2.2 Actividades Técnicas 351
158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 351
158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 351

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 352

159.1 INFORME SEMANAL 352
159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 352

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 352
159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 352
159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 352
159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 352
159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 353
159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 353
159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 353
159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 353
159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 353
159.9.3 Actas de Reunión 353

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 353

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 353
160.1.1 Actividades Administrativas 353
160.1.2 Actividades Técnicas 353
160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 354

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 354

162 ANEXO 355

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 355
162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 355
162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 355
162.4 BITÁCORA 355

163 INTRODUCCIÓN 358

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 359

164.1 LOCALIZACIÓN 359
164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 360
164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 360
164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 361

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 361

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 361
165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 362
165.2.1 Actividades Administrativas 362
165.2.2 Actividades Técnicas 362
165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 362
165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 362

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 363

166.1 INFORME SEMANAL 363
166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 363
166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 363

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 364
166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 364
166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 364
166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 364
166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 364
166.9.3 Actas de Reunión 364

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 365

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 365
167.1.1 Actividades Administrativas 365
167.1.2 Actividades Técnicas 365
167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 365

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 365

169 ANEXO 366

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 366
169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 366
169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 366
169.4 BITÁCORA 366

170 INTRODUCCIÓN 369

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 370

171.1 LOCALIZACIÓN 370
171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 371
171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 372
171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 372

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 372

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 372
172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 373
172.2.1 Actividades Administrativas 373
172.2.2 Actividades Técnicas 374
172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 374
172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 374

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 375

173.1 INFORME SEMANAL 375
173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 375
173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 375

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 375
173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 375
173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 375
173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 375
173.9.3 Actas de Reunión 376

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 376

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 376
174.1.1 Actividades Administrativas 376
174.1.2 Actividades Técnicas 376
174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 376

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 376

176 ANEXO 377

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 377
176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 377
176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 377
176.4 BITÁCORA 377

177 INTRODUCCIÓN 380

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 381

178.1 LOCALIZACIÓN 381
178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 382
178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 382
178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 383

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 383

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 383
179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 384
179.2.1 Actividades Administrativas 384
179.2.2 Actividades Técnicas 384
179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 384
179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 385

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 386

180.1 INFORME SEMANAL 386
180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 386
180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 386
180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 386
180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 386
180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 386
180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 386

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 387
180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 387
180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 387
180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 387
180.9.3 Actas de Reunión 387

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 387

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 387
181.1.1 Actividades Administrativas 387
181.1.2 Actividades Técnicas 387
181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 387

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 388

183 ANEXO 388

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 388
183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 388
183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 388
183.4 BITÁCORA 389

184 INTRODUCCIÓN 392

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 393

185.1 LOCALIZACIÓN 393
185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 394
185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 395
185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 395

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 395

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 395
186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 396
186.2.1 Actividades Administrativas 396
186.2.2 Actividades Técnicas 397
186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 397
186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 397

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 398

187.1 INFORME SEMANAL 398
187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 398
187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 398
187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 398
187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 398
187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 399
187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 399

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 399
187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 399
187.9.3 Actas de Reunión ... 399

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 399

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ... 399
188.1.1 Actividades Administrativas ... 399
188.1.2 Actividades Técnicas ... 400
188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO ... 400

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 400

190 ANEXO ... 400

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 400
190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 401
190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 401
190.4 BITÁCORA ... 401

191 INTRODUCCIÓN ... 404

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 405

192.1 LOCALIZACIÓN ... 405
192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ... 406
192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 407
192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 407

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO ... 407

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ... 407
193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 408
193.2.1 Actividades Administrativas ... 408
193.2.2 Actividades Técnicas ... 409
193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 409
193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 409

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 410

194.1 INFORME SEMANAL ... 410
194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 410
194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 410
194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 410
194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 410
194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 410
194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 410
194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 410
194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 410
194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 410
194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 410

194.9.3 Actas de Reunión 411

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 411

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 411
195.1.1 Actividades Administrativas 411
195.1.2 Actividades Técnicas 411
195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 411

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 411

197 ANEXO 413

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 413
197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 413
197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 413
197.4 BITÁCORA 413

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 54
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 55
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 66
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 67
ILUSTRACIÓN 5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 68
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 81
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 82
ILUSTRACIÓN 8 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL JAC PATIO BONITO 83
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 97
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 97
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 108
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 109
ILUSTRACIÓN 13 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 110
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 122
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 123
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 135
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 136
ILUSTRACIÓN 18 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 137
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 149
ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 150
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 163
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 163
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 175
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 175
ILUSTRACIÓN 25. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 176
ILUSTRACIÓN 26 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 189
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 189
ILUSTRACIÓN 28. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 190
ILUSTRACIÓN 29 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 201

Ilustración 30 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 202
Ilustración 31. Estado inicial de la vía 203
Ilustración 32 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 216
Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 216
Ilustración 34. Estado inicial de la vía 217
Ilustración 35 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas). 230
Ilustración 36 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 230
Ilustración 37. Estado inicial de la vía 231
Ilustración 38 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas). 243
Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 244
Ilustración 40. Estado inicial de la vía 245
Ilustración 41 Localización del municipio de Marulanda (Caldas). 258
Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 259
Ilustración 43. Estado inicial de la vía 260
Ilustración 44 Localización del municipio de Marulanda (Caldas). 273
Ilustración 45 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 273
Ilustración 46 Localización del municipio de Risaralda (Caldas). 285
Ilustración 47 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 285
Ilustración 48 Localización del municipio de Risaralda (Caldas). 298
Ilustración 49 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 298
Ilustración 50 Estado inicial del sector 299
Ilustración 51 Localización del municipio de Palestina (Caldas) 313
Ilustración 52 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 313
Ilustración 53 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas). 325
Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 325
Ilustración 55 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas). 336
Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 336
Ilustración 57 Localización del municipio de Supía (Caldas). 348
Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 349
Ilustración 59 Localización del municipio de Supía(Caldas) 360
Ilustración 60 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 360
Ilustración 61 Localización del municipio de Riosucio (Caldas). 371
Ilustración 62 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 371
Ilustración 63 Localización del municipio de Riosucio (Caldas). 382
Ilustración 64 Localización del municipio de Riosucio (Caldas). 394
Ilustración 65 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 394
Ilustración 66 Localización del municipio de Riosucio (Caldas). 406
Ilustración 67 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps 406

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir 9
Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría 47
Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría. 49
Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná. 57

TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 59
TABLA 6 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 72
TABLA 7 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 85
TABLA 8 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 88
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 99
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 112
TABLA 11 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 114
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 125
TABLA 13 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 127
TABLA 14 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 138
TABLA 15 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 141
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 152
TABLA 17 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 154
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 165
TABLA 19 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 177
TABLA 20 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 180
TABLA 21 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 192
TABLA 22 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 193
TABLA 23 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 204
TABLA 24 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 207
TABLA 25 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 218
TABLA 26 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 221
TABLA 27 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 233
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 235
TABLA 29 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 247
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 249
TABLA 31 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 261
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 264
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 275
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 287
TABLA 35 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 301
TABLA 36 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 303
TABLA 37 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 315
TABLA 38 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 327
TABLA 39 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 338
TABLA 40 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 351
TABLA 41 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 362
TABLA 42 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 373
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 384
TABLA 44 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 396
TABLA 45 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 408

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 2.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 2.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 2.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 2.7	Registro Fotográfico
ANEXO 2.8	Bitácora de obra
ANEXO 2.9	Informe financiero
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 3.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 3.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 3.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 3.7	Registro Fotográfico
ANEXO 3.8	Bitácora de obra
ANEXO 3.9	Informe financiero
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO**

ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 5.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 5.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 5.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 5.7	Registro Fotográfico
ANEXO 5.8	Bitácora de obra
ANEXO 5.9	Informe financiero
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 6.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 6.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 6.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 6.7	Registro Fotográfico
ANEXO 6.8	Bitácora de obra
ANEXO 6.9	Informe financiero
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 7.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 7.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 7.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 7.7	Registro Fotográfico
ANEXO 7.8	Bitácora de obra

ANEXO 7.9	Informe financiero
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 8.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 8.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 8.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 8.7	Registro Fotográfico
ANEXO 8.8	Bitácora de obra
ANEXO 8.9	Informe financiero
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL**
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 10.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 10.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 10.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 10.7	Registro Fotográfico
ANEXO 10.8	Bitácora de obra
ANEXO 10.9	Informe financiero
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Maquinaria y equipos

ANEXO 11.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 11.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 11.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.7	Registro Fotográfico
ANEXO 11.8	Bitácora de obra
ANEXO 11.9	Informe financiero
ANEXO 12	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA**
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 12.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 12.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 12.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 12.7	Registro Fotográfico
ANEXO 12.8	Bitácora de obra
ANEXO 12.9	Informe financiero
ANEXO 13	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL**
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 13.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 13.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 13.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 13.7	Registro Fotográfico
ANEXO 13.8	Bitácora de obra
ANEXO 13.9	Informe financiero
ANEXO 14	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES**
ANEXO 14.1	Informe Semanal

ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 14.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 14.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 14.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 14.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 14.7	Registro Fotográfico
ANEXO 14.8	Bitácora de obra
ANEXO 14.9	Informe financiero
ANEXO 15	**FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA**
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 15.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 15.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 15.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 15.7	Registro Fotográfico
ANEXO 15.8	Bitácora de obra
ANEXO 15.9	Informe financiero
ANEXO 16	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL**
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 16.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 16.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 16.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 16.7	Registro Fotográfico
ANEXO 16.8	Bitácora de obra
ANEXO 16.8	Informe financiero

ANEXO 17	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 18.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA**
ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 19.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 19.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 19.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 19.7	Registro Fotográfico
ANEXO 19.8	Bitácora de obra
ANEXO 19.9	Informe financiero
ANEXO 20	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 20.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 21	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL**
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 26	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**

ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 27	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 28.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe de los especialistas
ANEXO 29.6	Actas de reunión
ANEXO 29.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 29.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 29.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE

	EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/04/25
PRÓRROGA NO. 2	HASTA EL 30/05/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ

G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$116.701.510,20	11/09/2024	30/11/2025
Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	30/11/2025
Prestaciones sociales	$233.403.020,40	11/09/2024	30/05/2028
Calidad del servicio	$350.104.530,60	31/12/2024	30/04/2030

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 29.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 29.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024. Los días 19 de marzo de 2025, la Interventoría remitió el oficio CINP-555-533-1197 con la hoja de vida del Residente, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-017188 de fecha 21 de marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficioCINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, respectivamente, para revisión y aprobación.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ASTRID GAONA SOLER
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ

CARGO	NOMBRE
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	VALENTINA PÉREZ ISAZA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Acta Parcial de Costos No. 7 correspondiente al periodo del informe se remite a la Supervisión de forma paralela con dicho informe y en este informe se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.7.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjuntan las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica para para el Contrato No. 3601 de 2024.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 29.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	53
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	54
1	**INTRODUCCIÓN**		56
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		58
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		58
3.1	Información general del contrato		58
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		60
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		60
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		60
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		61
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	471
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	494
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		62
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		63
7	**Conclusiones y recomendaciones**		64
8	**Anexos**		64
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE REINICIO:	1/05/2025
PLAZO DE PRÓRROGA N 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	107,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.164.517,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

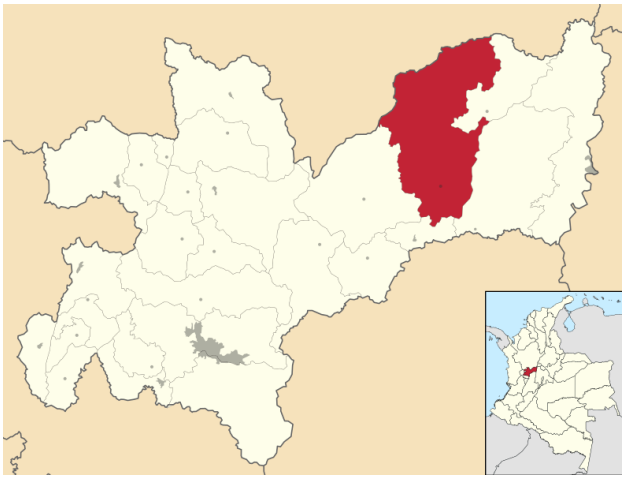


Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

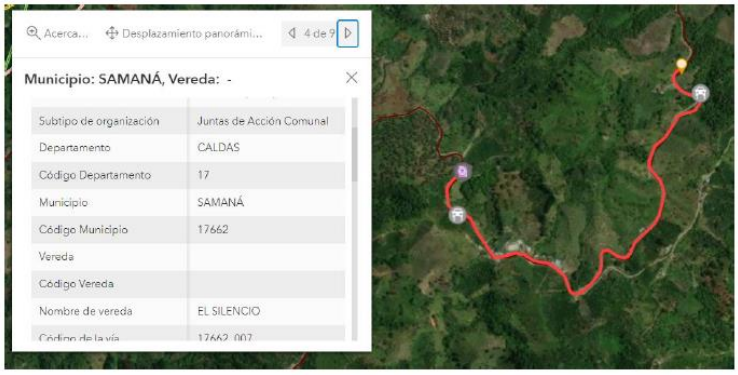


Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. Hasta el momento en que se dio la suspensión No. 1 de este convenio, la Interventoría se encontraba en la etapa de alistamiento realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPESIÓN NO. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/05/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 11 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

5.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

Si bien es cierto, el proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad, no es menos cierto que el proyecto correspondiente al Convenio Solidario No. 2227 de 2024 terminó la ejecución física el 28/03/2025 y era la causal de la suspensión que se dio desde el 20/12/24.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,75	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,51	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4063,44	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024. Este personal a pesar de estar

aprobado aún no se encuentra vinculado laboralmente dado que el Convenio se encuentra suspendido.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2073 de 2024.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

6.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.

7.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24 esta suspensión se venció el 30 de abril de 2025.

A pesar de haberse superado la causal de la suspensión la haber terminado la ejecución física del Convenio Solidario No. 2227 de 2024, la ejecución del Convenio No. 2073 de 2024, presenta otro inconveniente, esta vez relacionado con el C.B.R. de la subrasante que es del 2,2%, el cual está por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO y a la fecha de corte de este informe no hemos recibido por parte de INVIAS, el mejoramiento de la subrasante que permita cumplir con el CBR mínimo requerido.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y enero a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- Que a pesar de haberse superado la causal de la suspensión No. 1, al haber terminado la ejecución física del Convenio Solidario No. 2227 de 2024, el INSTITUTO esperó los términos del plazo de la suspensión que venció el 30 de abril de 2025.
- Que el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 presenta otro inconveniente, esta vez relacionado con el C.B.R. de la subrasante que es del 2,2%, el cual está por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO y a la fecha de corte de este informe no hemos recibido por parte de INVIAS, el mejoramiento de la subrasante que permita cumplir con el CBR mínimo requerido, lo que impedirá el inicio de la ejecución del proyecto de placa huella previsto en dicho convenio.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio por parte de EL INSTITUTO.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	67
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	68
1	**INTRODUCCIÓN**		70
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		71
2.1	Localización		71
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		72
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		72
2.4	Características técnicas del proyecto		73
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		73
3.1	Información general del contrato		73
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		75
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		76
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		76
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		77
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	487
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	502
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	504
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	506
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	511
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	513
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	510
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		79
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		79
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	79
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		79
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		81
7	**Conclusiones y recomendaciones**		81
8	**Anexos**		82
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		515
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		517

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 29/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.845.017,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	67.927.993	132.890.298,80
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.986.923,29	41.945.754,27
VALOR EJECUTADO	**84.914.915,84**	**174.836.053,07**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.188.268,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 174.836.053,07
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 87,77%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 1 - VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO -25/04/25



VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 2 - VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA - 29/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

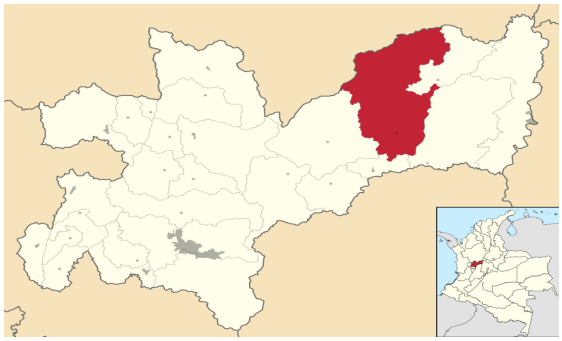


Ilustración 3 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

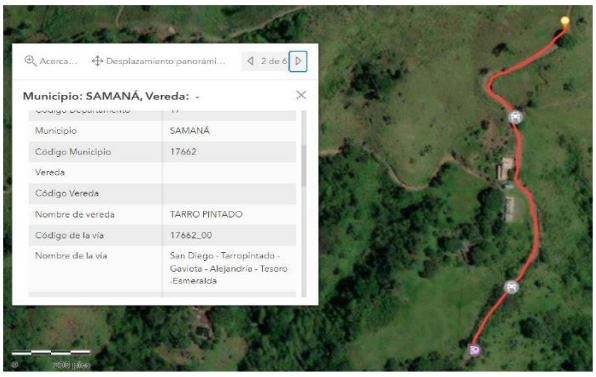


Ilustración 4 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 5 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros. De igual manera, se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 1	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el formato de auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió la propuesta de la inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió carta de transferencia pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el desembolso no. 9 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió solicitud de reintegro de rendimientos financieros del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/4/25, remitió los soportes del el plan de compras.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

12.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Subbase Granular Clase C, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, cantidad ejecutada: 13,68 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), cantidad ejecutada: 7,11 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), cantidad ejecutada: 558,56 m3.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 82,2 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.789, 44 m3.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.188.268,00
Ejecutado	100%	87,12%	174.836.053,07
Avance / Retraso	**0%**	**-12,13%**	**-24.352.214,93**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	110,16	110,16
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	82,2	82,2
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	23,35	23,35
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.789,44	3.789,44

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 2.3.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López
Maestro de Obra	Luis Antonio Diosa Álvarez

Tabla 6 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 2.4.

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.947.919 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 4.587.660 de fecha 07/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 8.109.428 de fecha 07/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 15.007.160 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 8.204.580 de fecha 09/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 34.000 de fecha 09/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 5.262.919 de fecha 13/03/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 22.974.515,00 de fecha 19/03/2025
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.679.081,00 de fecha 26/03/2025
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 23.491.818,35 de fecha 10/04/2025

Desembolso Total por valor de $ 163.299.079,87 correspondiente al 81,9% del valor del convenio. Ver Anexo 2.9

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 2.5.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 2.6

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo continuó sin presentar la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2172 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría reiteró a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

Al finalizar el periodo de este informe la OAC se encontraba en el trámite para pagar el costo de la modificación de las pólizas, para así recibir de la aseguradora la respectiva actualización de las pólizas.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1	✓		**Placa Huella San Diego**	**60 días**	**lun 13/01/25**	**lun 7/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
4	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
5	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%
6	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $199.188.268,00; la Inversión Ejecutada fue de $174.836.053,07. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $24.352.214,93.

13.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

13.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555-580-1390 de fecha 03/04/25, solicitó la contratación de un Ingeniero Residente de Obra para el Convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–595-1459 de fecha 9/4/25, remitió a la JAC el formato de inversión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–596-1472 de fecha 10/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–659-1688 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

14.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Rectificación de plan de compras por observaciones. 2. Aprobación plan de compras de manera parcial. 3. Soporte de desembolso.

El día 23 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Soporte de desembolso.

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Subbase Granular Clase C – 10,71 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, cantidad ejecutada: 13,68 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), cantidad ejecutada: 7,11 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), cantidad ejecutada: 558,56 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 82,2 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.789,44 Kg.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. Se recibió el reporte comprobante de operación del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de diciembre 2024. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de giro de rendimientos correspondiente a los meses de enero a marzo 2025.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 87% hasta el corte del presente periodo, teniendo en cuenta que se realizaron 144ml de placa huella con la estructura completa, con los recursos disponibles para la obra física. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 144 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 144 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 174.836.053,07 correspondiente al 87,12% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio, según la nueva prórroga.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 2.7.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 2.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	84
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	85
1	**INTRODUCCIÓN**		87
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		88
2.1	Localización		88
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		89
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		89
2.4	Características técnicas del proyecto		90
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		90
3.1	Información general del contrato		90
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		92
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		93
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		93
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		95
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	533
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	548
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	550
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	552
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	557
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	559
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	556
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		96
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		96
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	97
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		97
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		98
7	**Conclusiones y recomendaciones**		99
8	**Anexos**		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		561
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		563

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mar-25

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATO BONITO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	88.511.756	154.249.308,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.936.698,00	30.820.056,57
VALOR EJECUTADO	**104.448.454,34**	**185.069.364,57**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	201.982.844,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	185.069.364,57
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		91,63%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - VACIADO DE CONCRETO PARA PLACA HUELLA -28/04/25



FOTO 1 - CONCRETO PARA CUNETAS - 28/04/25

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202542871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

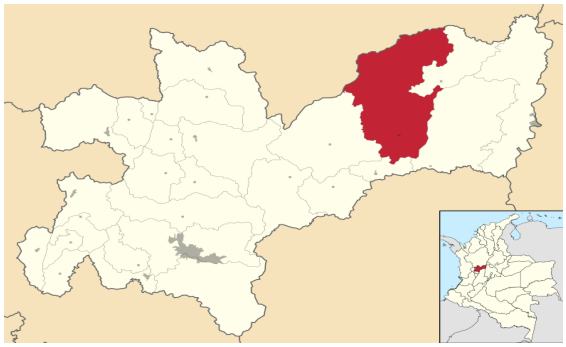


Ilustración 6 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

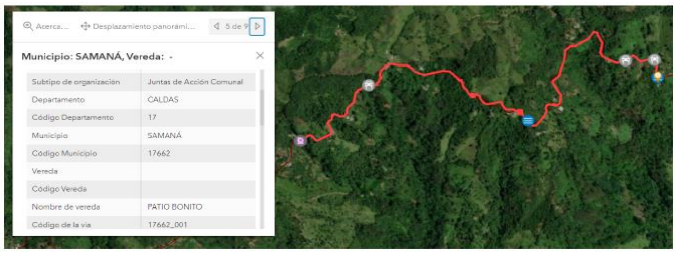


Ilustración 7 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 8 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 1:	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/05/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 2/4/25, remitió el quinto plan de cargas para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 2/4/25, remitió el auxiliar detallado del mes de febrero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el desembolso no. 5 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/4/25, remitió la nómina electrónica del mes de marzo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 14/4/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos del mes de marzo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 15/4/25 y 16/4/25, remitió el sexto plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/4/25, remitió solicitud de información estado desembolsos pendientes cuarto plan de compras.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió propuesta de inversión social para revisión de la interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió el plan de compras 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió documentos de la propuesta social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió el plan de compras 7 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió soportes de desembolsos faltantes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/4/25, remitió el plan de compras no. 8, para revisión de la Interventoría.

19.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, cantidad ejecutada: 0,74 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, cantidad ejecutada: 18,22 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), cantidad ejecutada: 5,91 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), cantidad ejecutada: 834,68 kg.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4,60 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118, 58 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	201.982.844,00
Ejecutado	100%	90,95%	185.069.364,57
Avance / Retraso	**0%**	**-8,31%**	**- 16.913.479,43**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,86	4,6
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	99,45	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	77,4	92,28
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	24,47	29,18
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.546,03	4.227,96
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 3.3.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García
Maestro de obra	Rogelio Loaiza

Tabla 8 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 3.4.

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 45.709.003 de fecha 20/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.219.378 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 2.313.650 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 23.212.472 de fecha 09/03/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.157.000,00 de fecha 19/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 34.850.708,00 de fecha 25/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 24.079.661,00 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 419.368,00 de fecha 25/03/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 23.566.760,21 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 13.896.760,00 de fecha 24/04/2025.
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 18.100.594,73 de fecha 25/04/2025.

Desembolso Total por valor de $ 198.396.214,81 correspondiente al 97,50% del valor del convenio. Ver Anexo 3.9

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 3.5.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 3.6

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo continuó sin presentar la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2435 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría reiteró a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1	✓	**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**lun 17/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**sáb 22/02/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**sáb 22/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	sáb 22/02/25	sáb 8/03/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	vie 28/02/25	lun 17/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	jue 6/03/25	mié 9/04/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	100%	100%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada acumulada fue de $ 201.982.844,00; la Inversión Ejecutada fue de $ 185.069.364,57. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que ejecutada por valor de $ 16.913.479,43.

20.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

20.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–609-1527 de fecha 11/4/25, notificó a la JAC el retraso en la obra.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–637-1633 de fecha 23/4/25, remitió a la JAC observaciones a la propuesta social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–660-1689 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

21.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Ajuste Plan de Compras 2. Envío de documentación para desembolso.

El día 15 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentación para desembolso.

El día 23 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Ajuste Plan de Compras 2. Envío de documentación para desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la

transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 100% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 155 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 185.069.364,57 correspondiente al 90,95% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 3.7.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 3.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	101
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	102
1	**INTRODUCCIÓN**		104
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		105
2.1	Localización		105
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		106
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		107
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		109
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		110
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	589
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	612
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		111
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		112
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		112
7	**Conclusiones y recomendaciones**		112
8	**Anexos**		123
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mar-25

CONVENIO No.: 2159-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL CIRPIAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENCIÓN 01: 2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1: 19/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1: 30/04/2025
FECHA AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1: 28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 2SUSPENSIÓN 1: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN : 10/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 111,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.898.462,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.898.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	135,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.711.788,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.581.354,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.105.320,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**200.398.462,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

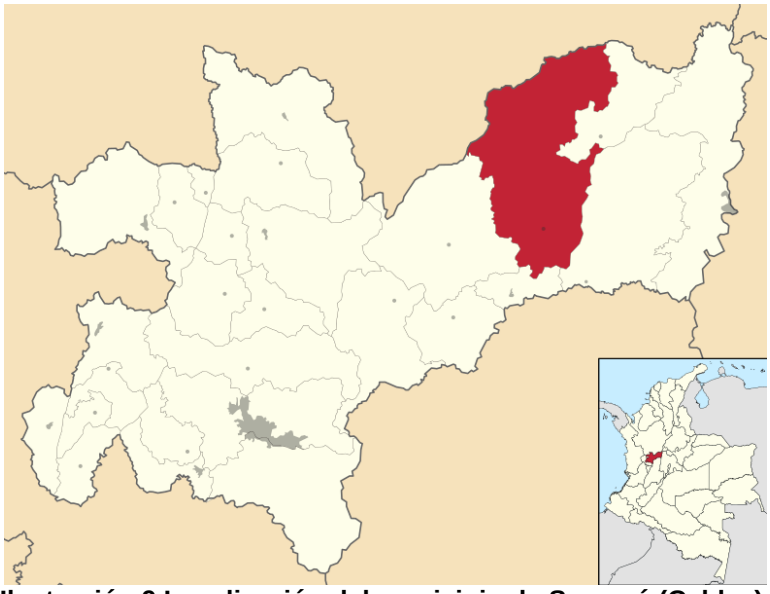


Ilustración 9 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 10 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/4/25
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/5/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	10/06/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 9 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de la ampliación 2 a la suspensión 1, para revisión de la Interventoría.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 4.1.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–666-1695 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de ampliación 2 a la suspensión 1 realizada por la JAC.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

  La Interventoría realizará la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría realizará la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan

aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	115
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	116
1	**INTRODUCCIÓN**		118
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		119
2.1	Localización		119
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		120
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		120
2.4	Características técnicas del proyecto		121
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		121
3.1	Información general del contrato		121
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		123
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		124
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		124
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		125
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	605
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	621
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	623
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	625
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	630
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	632
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	628
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		126
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		126
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	127
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		127
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		128
7	**Conclusiones y recomendaciones**		129
8	**Anexos**		129
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		634
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		636

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2124-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA EL DORADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2025
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 243,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.674.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.674.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.174.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	34.756.505	78.312.368,53
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.930.966,00	25.421.379,98
VALOR EJECUTADO	**52.687.471,41**	**103.733.748,51**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.174.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 103.733.749,51
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 52,08%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - CONCRETO PARA HUELAS - 25/04/2025



FOTO 2 - UBICACIÓN DE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO - 25/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

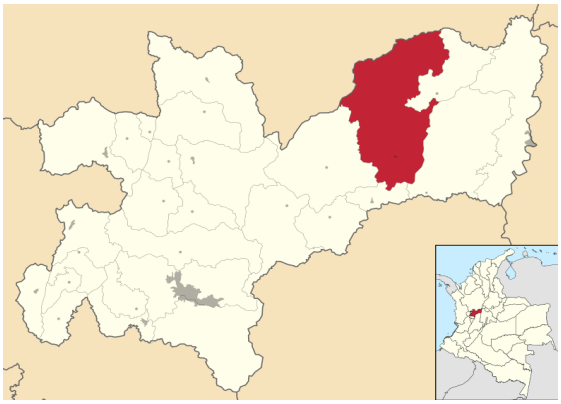


Ilustración 11 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 12 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 13 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 1:	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.067.401,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	30/04/2030	30/04/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$284.700.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Patronal			

Tabla 10 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el formato de auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 23/4/25 y 24/4/25, remitió plan de compras y correcciones para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/4/25, remitió documentación de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/4/25, remitió el informe de resultados basado en el nuevo CBR tramo 3.

33.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 111 ml, cantidad ejecutada: 3,24 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 55,08 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 17,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 43 ml, cantidad ejecutada: 7,99 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 816,76 kg.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 78,03 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 36,07 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 8,92 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 1.661,49 kg.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.174.007,00
Ejecutado	51%	51,69%	103.733.748,51
Avance / Retraso	**-49%**	**-47,56%**	**- 95.440.258,49**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	68%	115,52	78,03

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	39%	91,7	36,07
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	32%	28,05	8,92
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	39%	4.223,65	1.661, 49

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 5.3.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 11 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 5.4.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $55.537.787 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.587.660 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $3.221.014 de fecha 14/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $13.815.559 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.595.532 de fecha 06/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $60.000 de fecha 10/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $3.636.675 de fecha 13/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 10.304.766,00 de fecha 19/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 21.103.169,41 de fecha 04/04/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 47.001.876,72 de fecha 14/04/2025.

Desembolso Total por valor de $ 164.864.038,53 correspondiente al 82,16% del valor del convenio. Ver Anexo 5.9

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 5.5.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 5.6.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2124 de 2024.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	D. Calendario	Comienzo	Fin	% prog	% completado
0	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**49%**
1	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**49%**
2	Excavaciones varias sin Clasificar	4,41	M3	32	lun 13/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
3	Subbase Granular Clase C	115,52	M3	22	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	100%	68%
4	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	91,70	M3	64	vie 7/02/25	sáb 12/04/25	100%	39%
5	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	28,05	M3	53	jue 20/02/25	lun 14/04/25	100%	32%
6	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4.223,65	KG	65	lun 3/02/25	mié 9/04/25	100%	39%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de 2025, la Inversión Programada fue de $199.174.007,00; la Inversión Ejecutada fue de $103.733.748,51. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $95.440.258,49.

34.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

34.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–584-1414 de fecha 4/4/25, remitió a la JAC el formato de inversión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–586-1422de fecha 7/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–612-1414 de fecha 14/4/25, solicitó a la JAC los documentos para propuesta tecno-económica placa huella concreto MR42.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–633-1603 de fecha 14/4/25, solicitó documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–661-1690 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–645-1674 de fecha 28/4/25, solicitó a la JAC un informe sobre la situación de los tramos de la placa huella

35.1.2 Actividades Técnicas

El día 9 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

El día 24 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 78,03 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 36,07 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 8,92 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 1.661,49 kg.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de Julio a Diciembre 2024 y Febrero 2025, y se encuentra a la espera del giro de los meses de enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 51% e Inversión de 52% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 111 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 72 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 50 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) 43 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 50 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 103.733.748,51correspondiente al 51,7% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 5.7.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 5.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	131
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	132
1	**INTRODUCCIÓN**		134
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		135
2.1	Localización		135
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		136
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		136
2.4	Características técnicas del proyecto		136
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		136
3.1	Información general del contrato		136
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		138
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		139
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		139
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		140
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	673
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	689
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	691
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	693
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	630
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	632
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	696
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		141
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		141
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	141
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		142
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		143
7	**Conclusiones y recomendaciones**		144
8	**Anexos**		144
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		701
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		703

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 243,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	78.281.679	133.222.381,55
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.394.172,00	628.234,07
VALOR EJECUTADO	**96.675.850,52**	**133.850.615,62**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.033.857,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 133.850.615,62
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 66,91%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - ASEO EN PLACA HUELLA Y CONCRETO PARA BORDILLOS 25/04/2025



FOTO 2 - -VACIADO DE CONCRETO PARA BORDILLO - 25/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.

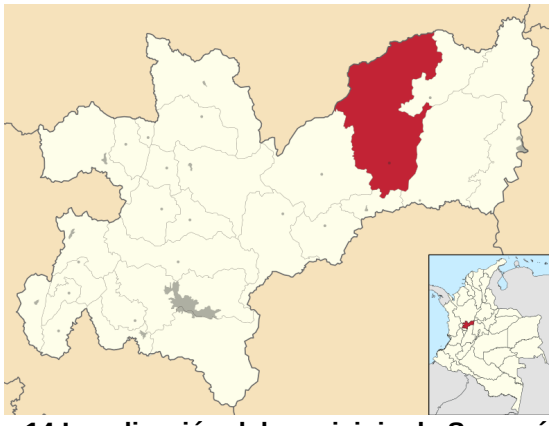


Ilustración 14 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

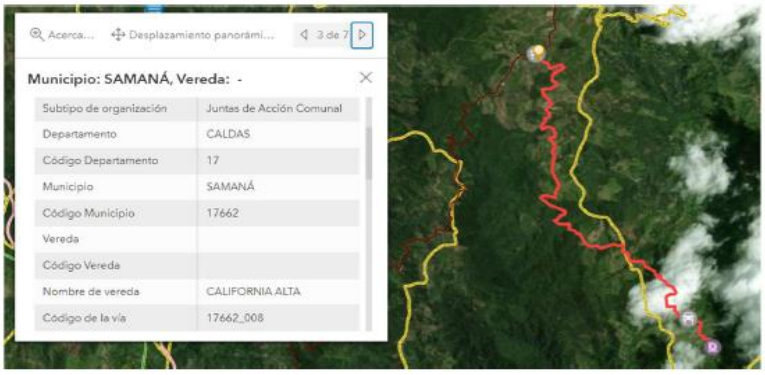


Ilustración 15 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1

TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2:	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.153.386,00	30/08/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	30/08/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	30/4/2025	30/04/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	26/06/2024	30/04/2025

Tabla 12 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, solicitó al banco Avvillas el extracto del mes de Marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, remitió cuenta de cobro del subsidio al dignatario.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el formato de auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió carta de transferencia pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió documentos del desembolso de rete fuente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió la hoja de vida del Ingeniero residente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió los documentos soporte del plan de cargas para desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/4/25, remitió documentación de desembolso, para revisión de la Interventoría
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

40.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 2,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35 ml, cantidad ejecutada: 26,78 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 41 ml, cantidad ejecutada: 10,87 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 57 ml, cantidad ejecutada: 9,98m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 42 ml, cantidad ejecutada: 1.149,95 kg.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	200.033.857,00
Ejecutado	66%	66,42%	133.850.615,62
Avance / Retraso	**-24%**	**-32,84%**	**-66.183.241,38**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,5
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	74%	118,58	87,98
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	60%	92,01	55,21

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	68%	28,64	19,40
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	60%	4.243,89	2.546,33

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 6.3.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 13 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 6.4.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.936.944 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 probado por valor de $ 4.587.660 de fecha 14/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 8.553.302 de fecha 25/02/2025.

5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 27.000 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.647.805 de fecha 13/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 24.531.906 de fecha 20/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $1.489.715 de fecha 28/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 105.054.051,07 correspondiente al 52,52% del valor del convenio. Ver Anexo 6.9

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 6.5.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 6.6

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 y 2 del Convenio No. 2058 de 2024.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1			**CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA**	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**66%**
2			**INICIO**	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**66%**
3	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
4			Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	74%
5			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	60%
6			Concreto Cidópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	68%
7			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	60%
8	✓		**FINAL**	**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $200.033.857,00; la Inversión Ejecutada fue de $133.850.615,62. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 66.183.241,38.

41.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

41.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555-582-1402 de fecha 03/04/25, solicitó la contratación de un Ingeniero Residente de Obra para el Convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–636-1632 de fecha 23/4/25, remitió a la JAC observaciones sobre la propuesta social presentada.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–649-1678 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

42.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la aprobación del plan de compras para el pago de nómina, compra de materiales de ferretería y formaleta. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

El día 23 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde Se aprueba el plan de compras por parte de los participantes del comité para pagos de nómina, alquiler de equipos, honorarios y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,5 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 115 ml, cantidad ejecutada: 87,98 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 93 ml, cantidad ejecutada: 55,21 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 108 ml, cantidad ejecutada: 19,40m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 93 ml, cantidad ejecutada: 2.546,33 kg.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio de 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte giro de los rendimientos del periodo 2024 hasta febrero 2025 al Tesoro Nacional, se encuentra a la espera del giro del mes de marzo 2025.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 66% e Inversión de 66% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 115 ml. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 93 ml. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 108 ml. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 93 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 133.850.615,62 correspondiente al 62,42% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 6.7.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 6.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	146
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	147
1	**INTRODUCCIÓN**		149
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		150
2.1	Localización		150
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		151
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		151
2.4	Características técnicas del proyecto		152
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		152
3.1	Información general del contrato		152
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		154
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		155
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		155
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		156
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	725
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	741
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	743
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	745
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	748
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	750
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	739
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		157
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		157
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	158
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		158
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		159
7	**Conclusiones y recomendaciones**		159
8	**Anexos**		169
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		752
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		754

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2119-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 243,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.002.573,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.002.573,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	156,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	42.946.650	160.854.630,30
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.806.250,00	33.659.182,94
VALOR EJECUTADO	**49.752.900,17**	**194.513.813,24**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201.502.573,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 194.513.813,24
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,53%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/04/25



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA 15/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.

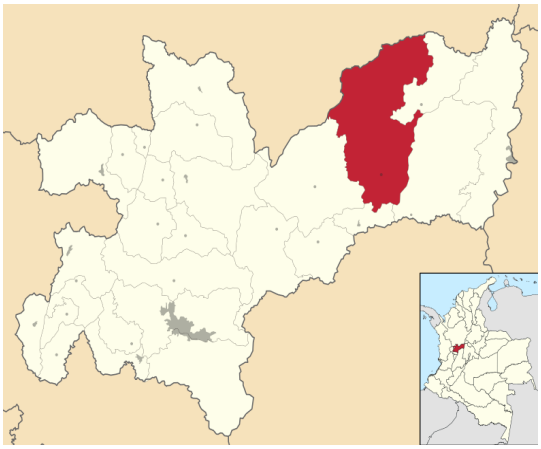


Ilustración 16 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 17 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.



Ilustración 18 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2:	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/05/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 14 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/4/25, remitió documentación SST solicitada por la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió carta de transferencia pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el desembolso no. 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió acta de reunión realizada en la Vereda.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió solicitud de desembolso no. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/4/25, remitió auxiliar detallado, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 25/4/25 y 28/4/25, remitió el plan de compras no. 8 y correcciones, sobre pagos pendientes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

47.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 23 ml, cantidad ejecutada: 0,68 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 23 ml, cantidad ejecutada: 17,6 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 65 ml, cantidad ejecutada: 39,71 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 73 ml, cantidad ejecutada: 13,68 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 41 ml, cantidad ejecutada: 31823,3 m3.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	201.502.573,00
Ejecutado	100%	95,82%	194.513.813,24
Avance / Retraso	**0%**	**3,44%**	**-6.988.759,76**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	5,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,34	136,94
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	95,32	109,37
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	33,55
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.375,92	5.021,09

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 7.3.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Mario Cárdenas
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 15 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 7.4.

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $49.763.368de fecha 07/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $10.065.922 de fecha 21/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $44.758.547 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $48.045.188 de fecha 13/03/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $3.119.882 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $2.246.646 de fecha 15/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $198.425 de fecha 19/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $10.860.988 de fecha 25/03/2025.

Desembolso Total por valor de $169.063.685,90 correspondiente al 83,90% del valor del convenio. Ver Anexo 7.9

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 7.5.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 7.6

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2119 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1	✓		**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**mar 21/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**dom 26/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	dom 26/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	sáb 1/02/25	mar 18/02/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 7/02/25	jue 13/03/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mié 12/02/25	jue 13/03/25	100%	100%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $201.502.573,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.513.813,24. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 6.988.759,76.

48.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

48.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555-581-1391 de fecha 03/04/25, solicitó la contratación de un Ingeniero Residente de Obra para el Convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–587-1423 de fecha 7/4/25, solicitó a la JAC documentación de cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–630-1628 de fecha 22/4/25, solicitó a la JAC documentos correspondientes a la liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–635-1628 de fecha 23/4/25, solicitó a la JAC documentos para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–651-1680 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

49.1.2 Actividades Técnicas

El día 04 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda Caracolí, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras para el pago de la nómina, pago de alquiler de equipos, compra de materiales y pago de honorarios del

Ingeniero residente. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 23 de marzo de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda Caracolí, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se aprobó el plan de compras. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 33,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5.021, 09 m3.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de febrero 2025.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 15/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40%

Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $194.513.813,24 correspondiente al 95,82% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 7.7.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 7.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	162
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	163
1	**INTRODUCCIÓN**		165
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		166
2.1	Localización		166
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		167
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		167
2.4	Características técnicas del proyecto		167
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		167
3.1	Información general del contrato		167
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		169
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		170
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		170
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		171
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	786
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	801
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	803
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	805
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	811
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	813
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	809
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		172
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		173
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	173
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		173
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		174
7	**Conclusiones y recomendaciones**		175
8	**Anexos**		175
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		815
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		817

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2173-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.229.002,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	149,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	69.924.954	118.282.714,32
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.591.291,00	35.018.568,90
VALOR EJECUTADO	**88.516.245,31**	**153.301.283,22**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.729.002,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 153.301.283,22
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 76,75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - FORMALETA PARA SOBREANCHO - 25/04/25



FOTO 2 - CONCRETO CICLOPEO PARA ENROCADO CENTRAL - 25/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

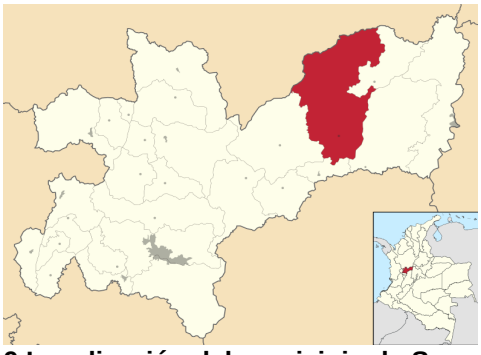


Ilustración 19 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

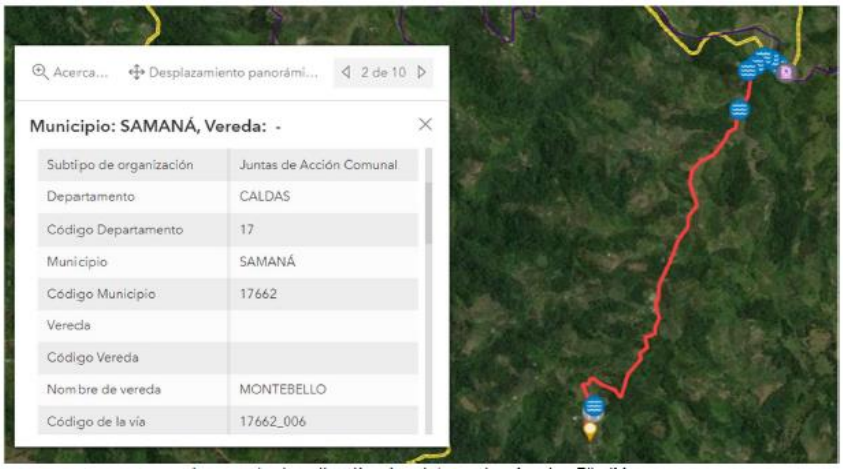


Ilustración 20 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.122.901,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	03/07/2024	31/12/2027

Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 16 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 2/4/25, remitió el auxiliar detallado del mes de febrero.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el desembolso no. 5 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 14/4/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió la solicitud de retención en la fuente mes de marzo e reteica.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 21/4/25, remitió soportes correspondientes al desembolso 6.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 22/4/25, remitió soportes correspondientes a los faltantes del desembolso 4.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/4/25, remitió plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 25/4/25, remitió soportes del desembolso 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 29/4/25, remitió plan de compras 8.

54.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 69 ml, cantidad ejecutada: 2,04 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 60 ml, cantidad ejecutada: 45,9 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 40,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 14,61 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 1.849,5 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.729.002,00
Ejecutado	78%	76,18%	153.301.283,22
Avance / Retraso	**-22%**	**- 23,07%**	**- 46.427.718,78**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	94%	113,99	107,1
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	72%	90,04	64,54
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	79%	28,05	22,14
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	72%	4125,38	2956,98

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 8.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 8.3.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 17 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 8.4.

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 47.162.934 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.620.194 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 14.638.851 de fecha 07/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.258.536 de fecha 18/03/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 23.059.752de fecha 25/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 104.744.985,65 correspondiente al 52,44% del valor del convenio. Ver Anexo 8.9

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 8.5.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 8.6

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2173 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1			**CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO**		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**78%**
2			**INICIO**		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**78%**
3	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
4			Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	94%
5			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	72%
6			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	79%
7			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	72%
8	✓		**FINAL**		**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $199.729.002,00, la Inversión Ejecutada fue de $153.301.283,22. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $46.427.718,78.

55.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

55.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–640-1638 de fecha 24/4/25, remitió a la JAC el formato de inversión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–641-1655 de fecha 24/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–662-1691 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

56.1.2 Actividades Técnicas

El día 03 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

El día 22 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina, alquiler de equipos y compra de materiales de ferretería. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 149 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 140 ml, cantidad ejecutada: 107,1 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 64,54 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 22,14 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 120 ml, cantidad ejecutada: 2956,98 m3.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no se recibieron los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 78% e Inversión de 76% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 149 ml. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 140 ml. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 120 ml. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 120 ml. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 120 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 153.301.283,22 correspondiente al 76,18% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 8.7.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 8.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	177
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	178
1	**INTRODUCCIÓN**		180
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		181
2.1	Localización		181
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		182
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		182
2.4	Características técnicas del proyecto		183
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		183
3.1	Información general del contrato		183
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		184
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		184
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		185
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		186
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	839
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	862
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		187
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		187
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		188
7	**Conclusiones y recomendaciones**		188
8	**Anexos**		189
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: 16C VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/3/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 18/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 10/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 108,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.753.245,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.753.245,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.543.699,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.103.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.253.245,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: SIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

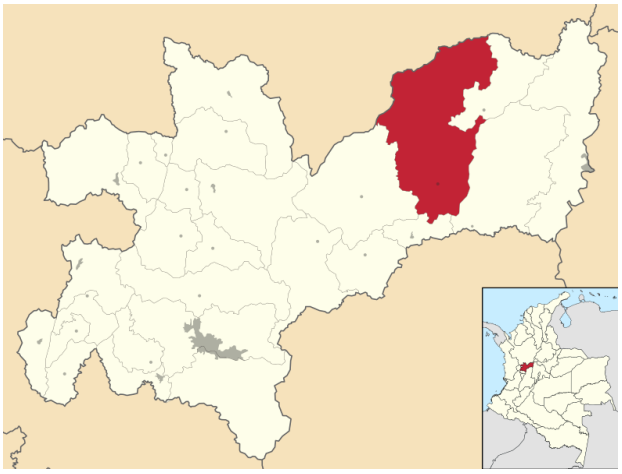


Ilustración 21 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

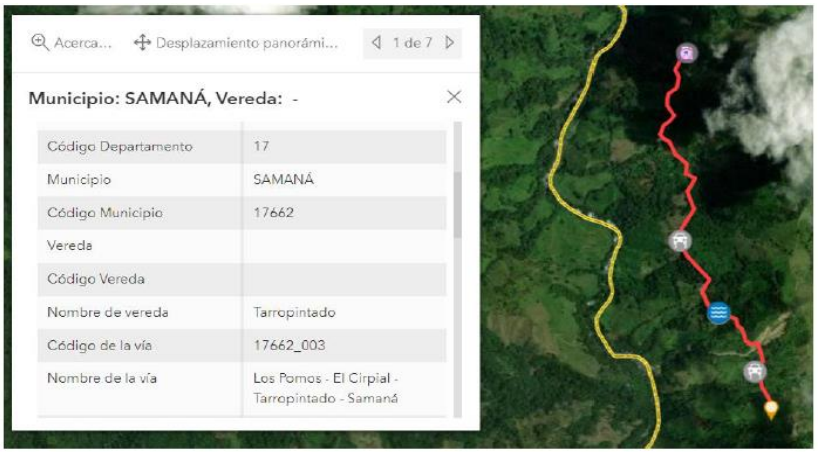


Ilustración 22 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO
NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/04/2025
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/05/2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	10/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 18 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de ampliación 2 a la suspensión 1, para revisión de la Interventoría.

61.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Se evaluarán las acciones a realizar para la ejecución de obras en secuencia.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,8	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,9	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3463,8	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	9,60	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,40	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las Ampliaciones a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2524 de 2024.

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

62.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–667-1696 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de ampliación 2 a la suspensión 1 realizada por la JAC.

63.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes de solicitud del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría preparará la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría preparará la reunión para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con

el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	191
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	192
1	**INTRODUCCIÓN**		194
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		195
2.1	Localización		195
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		196
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		196
2.4	Características técnicas del proyecto		197
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		197
3.1	Información general del contrato		197
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		199
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		200
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		200
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		201
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	855
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	870
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	872
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	874
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	876
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	878
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	878
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		202
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		202
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	202
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		203
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		204
7	**Conclusiones y recomendaciones**		204
8	**Anexos**		204
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		880
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		882

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.855.760,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	110.688.346	129.341.100,16
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.969.746,00	33.721.331,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**163.062.431,16**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 195.304.792,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 163.062.431,16
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 81,59%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - CONCRETO PARA CUNETAS - 29/04/25



FOTO 2 - CONCRETO Y ACERO PARA BORDILLOS Y CUNETAS - 28/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: EBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

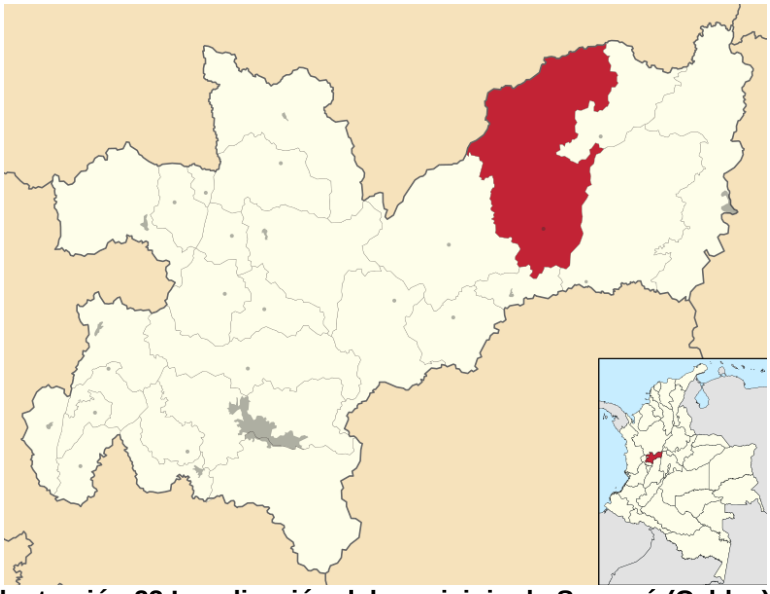


Ilustración 23 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

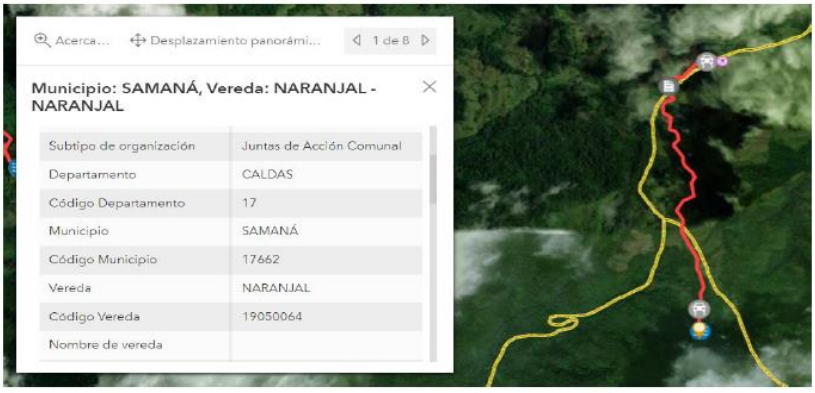


Ilustración 24 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia

es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 25. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL

	DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.135.576,00	02/09/2026	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	02/09/2026	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 19 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 2/4/25 y 3/4/25, remitió la solicitud de compras y su respectiva corrección.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/4/25, remitió documentación SST solicitada por la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 8/4/25, remitió el recibo de retenciones.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 8/4/25, remitió el desembolso no. 7 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/4/25, remitió el plan de compras 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/4/25, remitió el plan de compras 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 29/4/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros de marzo.

68.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 39,04 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 18,8 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1.788,82 m3.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	96,99%	195.304.792,00
Ejecutado	88%	80,98%	163.062.431,16
Avance / Retraso	**-12%**	**- 16,01%**	**- 32.242.360,84**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	80%	86,63	68,95
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	99%	27,45	27,26
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	80%	3.969,12	3158,98

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 10.1.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 10.3.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francy Elena Aristizábal González
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	Diego Márquez

Tabla 20 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 10.4.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 49.011.104 de fecha 10/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 4.608.800 de fecha 25/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 13.160.254 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 6.353.724 de fecha 10/03/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 14.360.988,00 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 17.669.304,25 de fecha 28/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 3.814.199,90 de fecha 31/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 114.849.233,62 correspondiente al 57,04% del valor del convenio. Ver Anexo 10.9

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 10.5.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 10.6

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2175 de 2024.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA**	**57 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**88%**
2	✓		Excavaciones varias sin clasificar	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	100%	100%
3	✓		Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	mié 5/02/25	100%	100%
4			Concreto reforzado resistencia 21MPA (Clase D) - Mezcla in situ para placa huella	35 días	jue 13/02/25	mié 9/04/25	100%	80%
5			Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPA (F) 60% concreto - 40% piedra para placa huella	30 días	lun 24/02/25	vie 11/04/25	100%	99%
6			Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	30 días	jue 6/02/25	mar 25/03/25	100%	80%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $195.304.792,00; la Inversión Ejecutada fue de $163.062.431,16. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $32.242.360,84.

69.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

69.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–666-1692 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

70.1.2 Actividades Técnicas

El día 4 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 21 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 68,95 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 145 ml, cantidad ejecutada: 3,158,98 m3.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría se encuentra a la espera del el soporte del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de febrero 2025.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 88% e Inversión de 81% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 145 ml. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 145 ml. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 145 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 163.062.431,16correspondiente al 80,98 % del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 10.7.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 10.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	206
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	207
1	**INTRODUCCIÓN**		209
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		210
2.1	Localización		210
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		211
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		211
2.4	Características técnicas del proyecto		212
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		212
3.1	Información general del contrato		212
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		214
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		214
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		214
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		215
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	906
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	922
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	929
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		216
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		217
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	217
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		217
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		218
7	**Conclusiones y recomendaciones**		219
8	**Anexos**		219
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDALA LINDA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 202.682.607,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	146,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.207.048,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.182.607,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	81.942.717,16	165.392.573,94
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.501.264,71	31.223.822,71
VALOR EJECUTADO	**91.443.981,87**	**196.616.396,65**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201.182.607,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 196.616.396,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 26 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

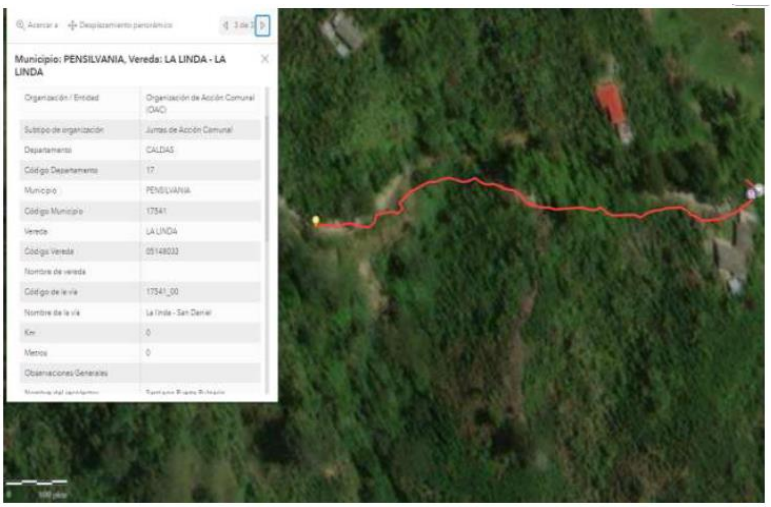


Ilustración 27 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000

en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciara que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 28. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/4/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 21 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/4/25, remitió el plan de compras no.7 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/4/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos financieros del mes de marzo.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 21/4/25 y 25/4/25, remitió documentación de cantidades finales y plan de compras 7 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió plan de compras para las actividades del PAGA.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	201.182.607,00

Ejecutado	100%	97,01%	196.616.396,65
Avance / Retraso	**0%**	**-2,25%**	**- 4.566.210,35**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	80,29	80,29
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3.969,12

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 22 Personal Convenio Solidario

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 28.185.246 de fecha 10/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 30.413.058 de fecha 22/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.533.588 de fecha 04/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 9.677.355 de fecha 11/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 144.600 de fecha 17/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 42.707.477 de fecha 26/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 8.670.450 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 1.099.373,18 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 12.923.150,00 de fecha 08/04/2025.

Desembolso Total por valor de $ 146.354.296,58 correspondiente al 73,20% del valor del convenio. Ver Anexo 11.9

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 11.3

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2227 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA			ACTIVIDADES ACUMULADAS				
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA			LONG. EJEC	CANT. PROG.	CANT. EJEC.	% PROG.	% EJEC.
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	146,00	4,31	4,31	100%	100%
2	320.3	Subbase Granular Clase C	146,00	111,69	111,69	100%	100%
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	146,00	80,29	80,29	100%	100%
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	146,00	27,45	27,45	100%	100%
5	640.10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	146,00	3.969,12	3.969,12	100%	100%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

76.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–593-1457 de fecha 9/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–511-1529 de fecha 11/4/25, remitió al JAC las actas de liquidación y entrega y recibo para diligenciamiento, revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–631-1601 de fecha 22/4/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–654-1683 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

77.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de balance financiero.

El día 8 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Conciliación cantidades finales

El día 14 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Conciliación cantidades finales

El día 16 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Conciliación cantidades finales

El día 22 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Conciliación cantidades finales

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios del periodo de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 28/03/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 80,29 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 27,45 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 3.969,12.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ $ 132.523.042,21 correspondiente al 65,8% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	221
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	222
1	**INTRODUCCIÓN**		224
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		225
2.1	Localización		225
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		226
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		226
2.4	Características técnicas del proyecto		227
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		227
3.1	Información general del contrato		227
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		229
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		229
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		230
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		230
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	925
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	941
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	943
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	945
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	949
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	951
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	948
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		232
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		232
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	232
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		233
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		234
7	**Conclusiones y recomendaciones**		234
8	**Anexos**		235
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		953
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		955

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	222
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2140-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA RITA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 201.393.774,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.727.480,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.893.774,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	48.182.195,41	157.339.419,61
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.578.523,00	37.852.496,00
VALOR EJECUTADO	**59.760.718,41**	**195.191.915,61**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.893.774,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 195.191.915,61
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,65%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 -OBRA FINALIZADA - 23/04/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 23/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.

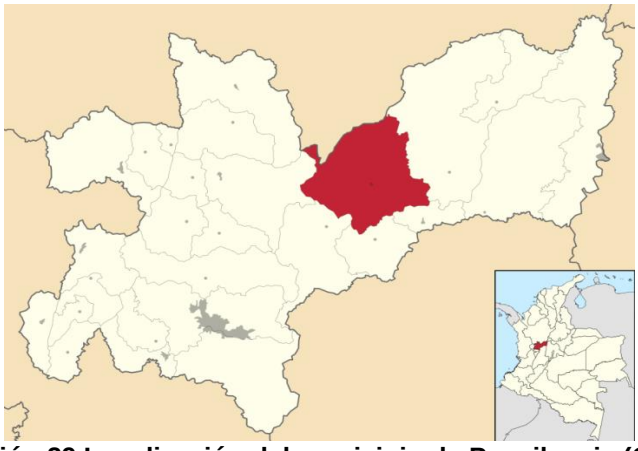


Ilustración 29 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

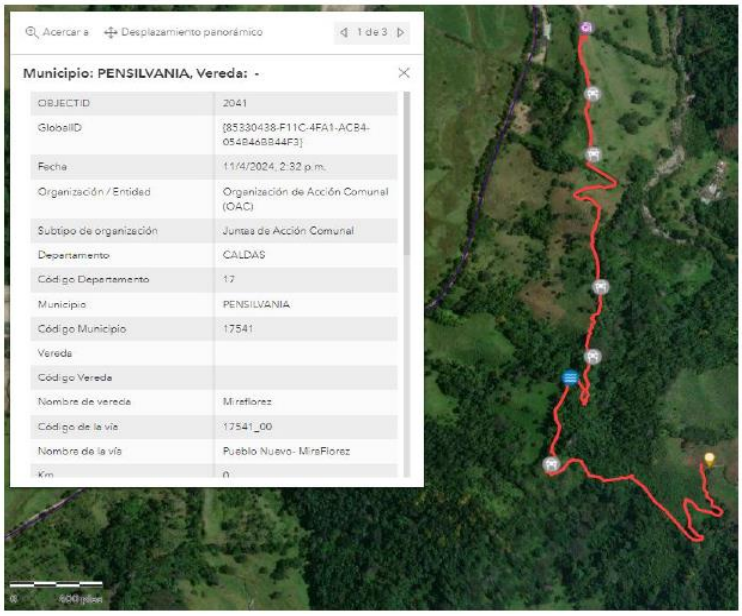


Ilustración 30 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 31. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 23 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/4/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió solicitud de desembolso de liquidación y nómina para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/4/25, remitió el desembolso correspondiente al pago de seguridad social.

82.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades ejecutadas por la JAC en este periodo corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 9 ml, cantidad ejecutada: 0,32 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 20 ml, cantidad ejecutada: 15,31 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 56 ml, cantidad ejecutada: 28,92 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 52 ml, cantidad ejecutada: 9,65 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 56 ml, cantidad ejecutada: 1331,12 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	199.893.774,00
Ejecutado	100%	96,92%	195.191.915,61
Avance / Retraso	**0%**	**- 2,33%**	**- 4.701.858,39**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	4,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	103,28	111,7
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	79,34	81,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	25,06	26,36
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.652,46	3766,09

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 12.3.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	Jesús Alirio Ramírez

Tabla 24 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 12.4

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 50.347.996 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 11.041.270 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 8.496.904 de fecha 13/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 47.615.438 de fecha 28/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 12.475.326 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 8.080.926,00 de fecha 02/04/2025.

Desembolso Total por valor de $130.091.733,83 correspondiente al 68,55% del valor del convenio. Ver Anexo 12.9

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 12.5.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 12.6.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2140 de 2024 y su aprobación en SECOP.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1	✓	**CONVENIO 2140 - 2024**	**59 días**	**mar 14/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**lun 20/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**53 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	100%	100%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de abril 2025, la Inversión Programada fue de 199.893.774,00; la Inversión Ejecutada fue de 195.191.915,61. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 4.701.858,39.

83.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

83.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 3/4/25, remitió respuesta a INVIAS sobre Información PAGOS OAC Santa Rita.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–634-1604 de fecha 22/4/25, solicitó documentación para cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–638-1634 de fecha 23/4/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación del convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–655-1684 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

84.1.2 Actividades Técnicas

El día 1 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del plan de compras corregido. 2. Envío de soportes.

El día 21 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del plan de compras corregido. 2. Envío de soportes.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 26,36 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3766,09 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibimos los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 26,36 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3766,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 195.191.915,61 correspondiente al 96,92% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver anexo 12.7.

85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

85.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 12.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	237
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	238
1	**INTRODUCCIÓN**		240
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		241
2.1	Localización		241
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		242
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		242
2.4	Características técnicas del proyecto		243
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		243
3.1	Información general del contrato		243
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		245
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		246
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		246
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		247
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	972
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	988
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	990
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	992
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	996
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	998
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	995
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		248
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		248
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	248
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		249
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		250
7	**Conclusiones y recomendaciones**		250
8	**Anexos**		251
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1000
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1002

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 239,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.500.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.500.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.155.580,85**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	37.626.334	150.231.118,47
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.419.388,21	31.311.792,88
VALOR EJECUTADO	**48.045.722,32**	**181.542.911,35**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.155.581,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 181.542.911,35
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 91,16%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL VERDAL
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025



VEREDA EL VERDAL
FOTO 2 -OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

86 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.



Ilustración 32 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

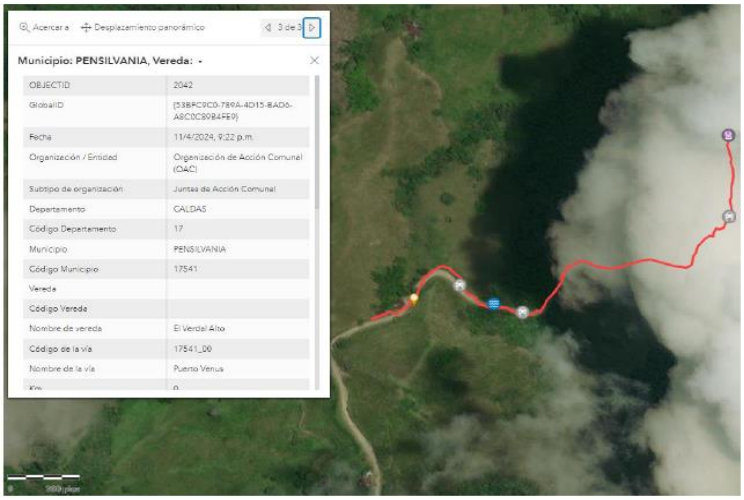


Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda

– Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 34. Estado inicial de la vía

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA,

	DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028	

Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.065.559,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	27/06/2024	30/04/2025

Tabla 25 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

88.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras no. 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió el plan de compras no. 6 pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 7/4/25 y 8/4/25, remitió propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 10/4/25, remitió los soportes de la primera nómina de abril para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/4/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos financieros del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/4/25, remitió Solicitud cambio cuenta bancaria trabajador.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 22/4/25 y 24/4/25, remitió plan de compras y corrección del mismo para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 25/4/25, remitió el plan de compras y sus correcciones para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la relación de desembolsos y proyección de compras final.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

88.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 4 ml, cantidad ejecutada: 0,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 4 ml, cantidad ejecutada: 3,06 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,3 ml, cantidad ejecutada: 29,5 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 17 ml, cantidad ejecutada: 3,31 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20.3 ml, cantidad ejecutada: 592,33 kg.

88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 4/2/25 para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.155.581,00
Ejecutado	100%	90,47%	181.542.911,35
Avance / Retraso	**0%**	**8,78%**	**17.612.669,65**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,67	3,79
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	96,39	99,45
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	99%	76,96	76,53
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	84%	90%	19,56	20,94
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	99%	3.553,97	3.534,23

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 13.3.

89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas
Maestro de Obra	Hernando De Los Ríos Franco

Tabla 26 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 14.4.

89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 52.452.837 de fecha 6/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 5.527.000 de fecha 26/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 10.934.800 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 43.572.000 de fecha 26/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 14/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 359.800,00 de fecha 28/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 16.648.400,00 de fecha 26/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 136.385.697,25 correspondiente al 59,94% del valor del convenio. Ver Anexo 14.9

89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 13.5.

89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 13.6

89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2077 de 2024.

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1			**CONVENIO 2077 - 2024**	**79,63 días**	**mar 21/01/25**	**mar 22/04/25**	**96%**	**95%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**74,63 días**	**lun 27/01/25**	**mar 22/04/25**	**96%**	**94%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	lun 27/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	20 días	dom 2/02/25	mar 25/02/25	100%	100%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	40 días	lun 3/03/25	jue 17/04/25	100%	99%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	29 días	jue 20/03/25	mar 22/04/25	84%	79%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	lun 10/02/25	mar 11/03/25	100%	98%

89.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el mes de abril de 2025, la Inversión Programada fue de $199.155.581,00; la Inversión Ejecutada fue de $181.542.911,35. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $17.612.669,65.

89.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

89.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

90.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–590-1446 de fecha 8/4/25, remitió a la JAC la sugerencia de solicitar el manejo ambiental de cauce a la entidad correspondiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–594-1458 de fecha 7/4/25, remitió a la JAC el formato de inversión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–597-1473 de fecha 10/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–639-1635 de fecha 23/4/25, solicitó documentación para la liquidación del convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–656-1685 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

90.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

El día 25 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 125,3 ml, cantidad ejecutada: 76,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125, ml, cantidad ejecutada: 3.534,23 kg.

90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 125,3 ml, cantidad ejecutada: 76,53 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 125, ml, cantidad ejecutada: 3.534,23 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 181.542.911,35 correspondiente al 90,47% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

92 ANEXO

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 13.7.

92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

92.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 13.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	253
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	254
1	**INTRODUCCIÓN**		256
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		257
2.1	Localización		257
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		258
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		258
2.4	Características técnicas del proyecto		259
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		259
3.1	Información general del contrato		259
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		261
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		262
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		262
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		263
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1016
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1025
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1027
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1029
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1043
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1045
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1039
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		264
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		264
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	265
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		265
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		266
7	**Conclusiones y recomendaciones**		266
8	**Anexos**		267
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1047
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1049

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	239,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.654.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	92.793.932	129.886.914,65
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.547.692,00	22.678.153,13
VALOR EJECUTADO	**110.341.624,44**	**152.565.067,78**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.654.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.565.067,78
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	76,41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA MIRAFLORES
FOTO 1 - CONCRETO PARA PLACA DE ACCESO - 25/04/24



VEREDA MIRAFLORES
FOTO 2 - UBICACIÓN DE FORMALETA PARA CONCRETO CICLOPEO - 29/04/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

93 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

94.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 35 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

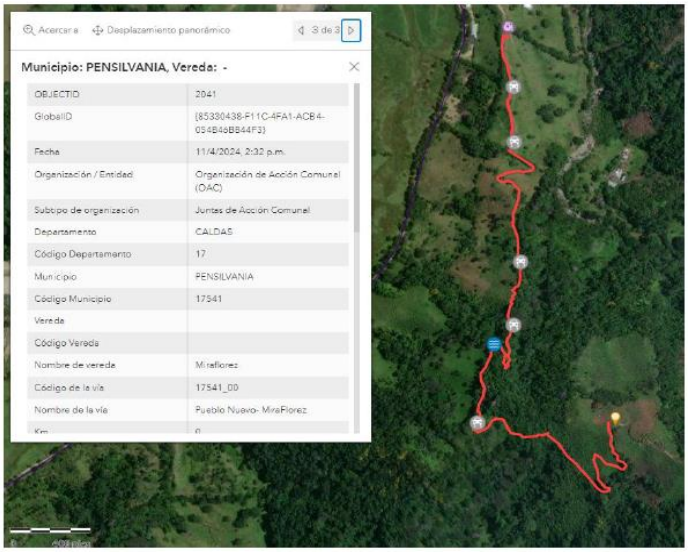


Ilustración 36 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.



Ilustración 37. Estado inicial de la vía

94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.115.401,00	03/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	03/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 27 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

95.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/4/25, remitió plan de compras no. 6 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió documento para desembolso pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 9/4/25, remitió el soportes del subsidio dignatario pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 10/4/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/4/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos financieros del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/4/25, remitió el plan de compras 7 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió el desembolso correspondiente al plan de compras 7.

95.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 105 ml, cantidad ejecutada: 80,32 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 68 ml, cantidad ejecutada: 56,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 98 ml, cantidad ejecutada: 18,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 68 ml, cantidad ejecutada: 1.868, 48 Kg.

95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.654.007,00
Ejecutado	83%	75,84%	152.565.067,78
Avance / Retraso	**-17%**	**- 23,41%**	**- 47.088.939,22**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	94%	115,52	108,63
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	69%	91,70	63,04
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	89%	28,05	25,08

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	69%	4.223,65	2.903,41

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 14.3.

96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz
Maestro de Obra	José Uriel Bernal Gutiérrez

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 14.4.

96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 33.767.250 de fecha 14/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 31.761.019 de fecha 18/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 1.839.500 de fecha 08/03/2025
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $9.761.760 de fecha 08/03/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 19.624.364,33 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 31.352.100,01 de fecha 09/04/2025.

8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.086.810,00 de fecha 09/04/2025.

Desembolso Total por valor de $ 143.083.663,32 correspondiente al 38,63% del valor del convenio. Ver Anexo 14.9

96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 14.5.

96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 14.6

96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2169 de 2024.

96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1			**CONVENIO 2169 - 2024**	**46 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**83%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**6 días**	**lun 10/02/25**	**dom 16/02/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
4			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**40 días**	**dom 16/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**82%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	100%	100%
6			Subbase Granular Clase C	30 días	dom 16/02/25	dom 23/03/25	100%	94%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	lun 24/02/25	lun 31/03/25	100%	69%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 28/02/25	jue 3/04/25	100%	89%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	sáb 22/02/25	dom 23/03/25	100%	69%

96.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril de 2025, la Inversión Programada fue de 199.654.007,00; la Inversión Ejecutada fue de 152.565.067,78. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 47.088.939,22.

96.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

96.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

97.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–613-1537 de fecha 14/4/25, remitió a la JAC el formato de inversión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–615-1561 de fecha 15/4/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–657-1686 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

97.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos con los pagos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: Documentos soporte para el desembolso.

El día 24 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el plan de compras por parte de la JAC, que contiene la nómina, seguridad social,

honorarios y material. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Documentos soporte para el desembolso

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142 ml, cantidad ejecutada: 108,63 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105 ml, cantidad ejecutada: 63,04 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 135 ml, cantidad ejecutada: 28,05 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 105 ml, cantidad ejecutada: 2.903,41 m3.

97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 83% e Inversión de 76% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142 ml, cantidad ejecutada: 108,63 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 105 ml, cantidad ejecutada: 63,04 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 135 ml, cantidad ejecutada: 28,05 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 105 ml, cantidad ejecutada: 2.903,41 m3..

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 152.565.067,78 correspondiente al 75,84% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

99 ANEXO

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 14.7.

99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

99.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 14.8.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	269
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	270
1	**INTRODUCCIÓN**		272
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		273
2.1	Localización		273
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		274
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		274
2.4	Características técnicas del proyecto		275
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		275
3.1	Información general del contrato		275
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		277
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		278
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		278
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		279
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1062
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1078
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1080
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1082
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1087
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1089
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1085
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		280
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		280
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	281
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		282
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		283
7	**Conclusiones y recomendaciones**		283
8	**Anexos**		284
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1091
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1093

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	270
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.555.145,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.055.145,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	95.596.524,68	152.947.068,39
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.242.502,00	37.161.946,33
VALOR EJECUTADO	**110.839.026,68**	**190.109.014,72**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.055.145,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 190.109.014,72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95,51%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - CONCRETO CICLOPEO PARA ENRONCADO CENTRAL - 29/04/25



FOTO 2 - CONCRETO PARA CUNETAS - 25/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

100 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

101.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 38 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

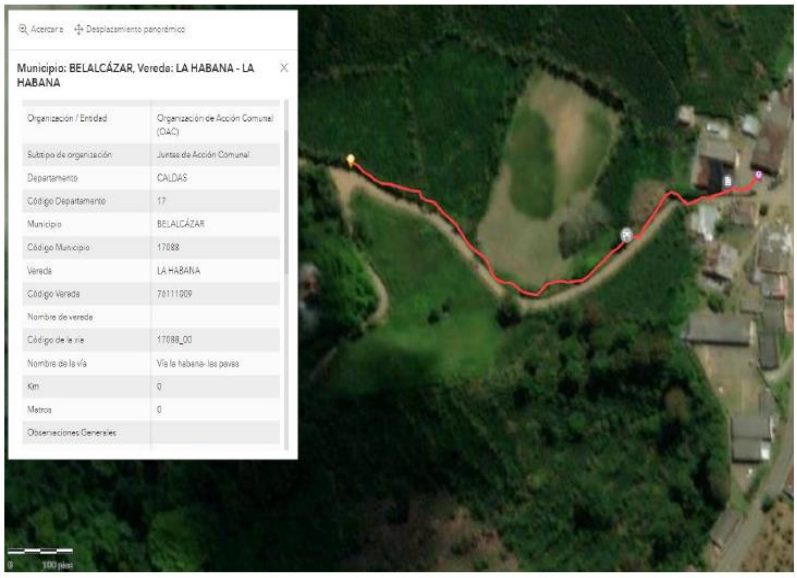


Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 40. Estado inicial de la vía

101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.055.515,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.027.758,00	04/7/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 29 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

102.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el formato de auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió hoja de vida del Ing. residente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 14/4/25 y 15/4/25, remitió el plan de compras no. 7 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió respuesta al oficio CINP-555-614-1560.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió plan de compras para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió solicitud de desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 28/4/25 y 29/4/25, remitió el plan de compras no. 9 para revisión de la Interventoría.

102.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 35 ml, cantidad ejecutada: 1,02 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 25,24 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 106 ml, cantidad ejecutada: 63,92 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 161 ml, cantidad ejecutada: 29,81 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 106 ml, cantidad ejecutada: 2.944,27 kg.

102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,25%	199.055.145,00
Ejecutado	99%	94,79%	190.109.014,72
Avance / Retraso	**-1%**	**-4,46%**	**-8.946.130,28**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	99%	133,11	131,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	98%	101,5	99,17
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	98%	32,22	31,48
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	98%	4.675,13	4.567,66

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 15.3

103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Álzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez
Maestro de Obra	Juan Fernando Castaño Agudelo

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 15.4.

103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $40.872.017 de fecha 20/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.095.148 de fecha 24/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $2.163.019 de fecha 30/01/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $198.000 de fecha 30/01/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $1.279.400 de fecha 06/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $10.676.213 de fecha 11/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 5.852.689 de fecha 24/02/2025
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 51.530.938 de fecha 11/03/2025.
9. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 1.178.000,00 de fecha 19/03/2025.
10. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 6.054.330,00 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 15.401.283,83 de fecha 10/04/2025.

Desembolso Total por valor de $ 139.311.570,37 correspondiente al 69,46% del valor del convenio. Ver Anexo 15.9

103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 15.5.

103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 15.6.

103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**Proyecto Placas Huellas en concreto**	**73 días**	**jue 16/01/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**99%**
2	✓		INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
3	✓		**ETAPA 1**	**30 días**	**jue 16/01/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
4	✓		**Fase 1**	**14 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 1/02/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
7	✓		**Fase 2**	**8 días**	**sáb 1/02/25**	**mar 11/02/25**	**100%**	**100%**
8	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
9	✓		**Fase 3**	**8 días**	**mié 12/02/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
10	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
11	✓		**ETAPA 2**	**23 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
12	✓		**Fase 4**	**7 días**	**vie 21/02/25**	**sáb 1/03/25**	**100%**	**100%**
13	✓		Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%
14	✓		**Fase 5**	**9 días**	**sáb 1/03/25**	**mar 11/03/25**	**100%**	**100%**
15	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
16	✓		**Fase 6**	**8 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
17	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
18			**ETAPA 3**	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**98%**
19			**Fase 7**	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**98%**
20			Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	99%
21			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	100%	98%
22			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	98%
23			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	100%	98%
24	✓		FIN	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	0%	100%

103.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril 2025, la Inversión Programada fue de 199.055.145,00; la Inversión Ejecutada fue de 190.109.014,72. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 8.946.130,28.

103.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

103.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

104.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555-579-1389 de fecha 03/04/25, solicitó la contratación de un Ingeniero Residente de Obra para el Convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–589-1445 de fecha 8/4/25, remitió a la JAC la aprobación de la hoja de vida del Ing residente presentado.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–608-1526 de fecha 11/4/25, notificó a la JAC el retraso en la obra.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–614-1560 de fecha 15/4/25, solicitó a la JAC documentos de la solicitud para cambio de inicio del tramo.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–652-1681 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

104.1.2 Actividades Técnicas

El día 4 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de nómina, seguridad social y compra de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

El día 14 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina del 16 al 31 de marzo. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Corregir plan de compras.

El día 21 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina del 16 al 31 de marzo. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 172 ml, cantidad ejecutada: 131,58 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 99,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 31,48 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4.567,66 kg.

104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 99% e Inversión de 95% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 172 ml, cantidad ejecutada: 131,58 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 170 ml, cantidad

ejecutada: 99,17 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 31,48 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 170 ml, cantidad ejecutada: 4.567,66 kg,

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 190.109.014,72 correspondiente al 94,79% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

106 ANEXO

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver Anexo 15.7.

106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

106.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 15.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	286
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	287
1	**INTRODUCCIÓN**		289
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		290
2.1	Localización		290
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		291
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		291
2.4	Características técnicas del proyecto		292
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		292
3.1	Información general del contrato		292
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		294
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		295
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		295
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		296
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1116
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1132
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1134
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1136
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1146
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1148
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1139
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		297
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		297
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	297
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		298
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		299
7	**Conclusiones y recomendaciones**		299
8	**Anexos**		300
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1150
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1152

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO VERSION PÁGINA

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.792.352,17**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	82.468.349,12	148.550.757,88
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.991.500,00	39.400.366,15
VALOR EJECUTADO	**98.459.849,12**	**187.951.124,03**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.588.523,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 187.951.124,03
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	93,14%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - CONCRETO PARA CUNETAS - 29/04/25



FOTO 2 - ARMADO DE ACERO PARA CUNETAS Y BORDILLOS - 28/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

107 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

108.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.



Ilustración 41 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

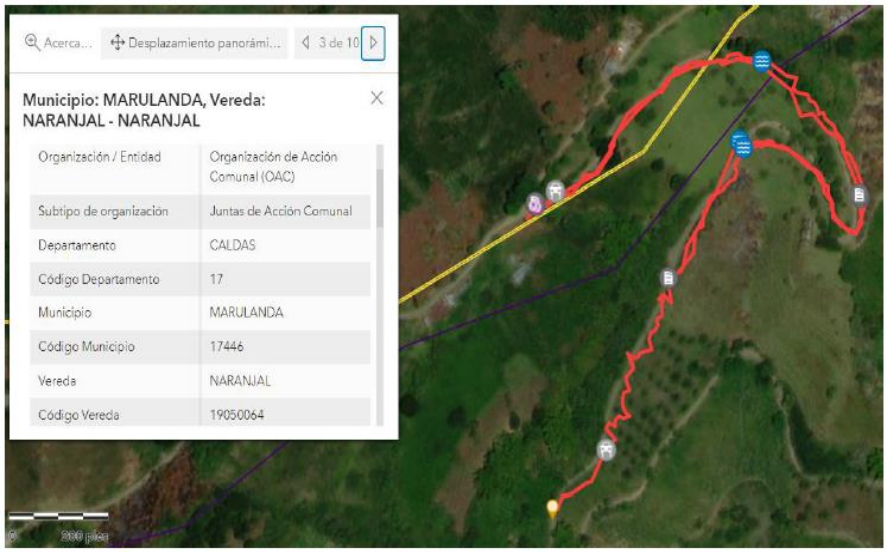


Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 43. Estado inicial de la vía

108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	$20.329.236,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	28/06/2024	30/04/2025

261 **Tabla 31 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.**

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

109.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, remitió subsanaciones de pagos pendientes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 1/4/25, remitió las nóminas electrónicas del mes de marzo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/4/25, remitió el plan de compras no. 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió el desembolso no. 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió plan de compras no. 6 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/4/25, remitió el desembolso no. 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 22/4/25, remitió el plan de compras y corrección para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/4/25, remitió solicitud de desembolso 9 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 25/4/25 y 30/4/25, remitió el plan de compras no. 11 y correcciones para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fechas 30/4/25, remitió los estados financieros de enero a abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 30/4/25, remitió el paz y salvo social.

109.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 49,59 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 46,31 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 76 ml, cantidad ejecutada: 16,65 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 72 ml, cantidad ejecutada: 2.287,34 kg.

109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	98,18%	199.588.523,60
Ejecutado	97%	92,45%	187.951.124,03
Avance / Retraso	**-3%**	**- 5,72%**	**- 11.637.399,57**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	117,05
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	94%	83,69	78,95
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	28,83
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	94%	4.133,51	3.899,64

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 16.3.

110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Yeison Rivera
Contador	Daniela Hurtado Duque
Maestro de Obra	Alpio Gallego

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 16.4.

110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $39.203.611 de fecha 30/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $1.750.000 de fecha 19/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $3.913.907 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $5.870.860 de fecha 12/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $1.975.800 de fecha 12/02/2025.
6, Desembolso 06 aprobado por valor de $34.341.128 de fecha 28/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 14.219.143 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 28.299.630,60 de fecha 26/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 129.585.152,99 correspondiente al 63,74% del valor del convenio. Ver Anexo 16.9

110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 16.5.

110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 16.6.

110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2094 de 2024.

110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL**		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**97%**
8	✓		**FINAL**		**0**	**0 días**	**mié 16/04/25**	**mié 16/04/25**	0%	100%
2			**INICIO**		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**97%**
3	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	100%
4	✓		Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	100%
5			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	94%
6	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
7			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	94%

110.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril 2025, la Inversión Programada fue de 199.588.523,60; la Inversión Ejecutada fue de 187.951.124,03. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 11.637.399,57.

110.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

110.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

111.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–653-1682 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

111.1.2 Actividades Técnicas

El día 04 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la seguridad social y la nómina de trabajadores. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras

El día 8 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

El día 22 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 117,05 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 78,95 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 28,83 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 3.899,64 kg.

111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Marzo de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos de agosto a diciembre 2024 al Tesoro Nacional, nos encontramos a la espera del soporte del giro de los meses de enero a marzo 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 97% e Inversión de 92% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 117,05 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 78,95 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 28,83 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 153 ml, cantidad ejecutada: 3.899,64 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 187.951.124,03 correspondiente al 92,45% del valor del convenio.

- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.

113 ANEXO

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 16.7.

113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

113.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 16.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	302
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	303
1	**INTRODUCCIÓN**		305
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		306
2.1	Localización		306
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		307
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		308
2.4	Características técnicas del proyecto		308
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		308
3.1	Información general del contrato		308
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		309
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		310
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		310
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		310
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1188
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		311
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		312
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		312
7	**Conclusiones y recomendaciones**		312
8	**Anexos**		314
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3551-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL PARAMO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MES/S
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 29/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

114 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

115.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 44 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

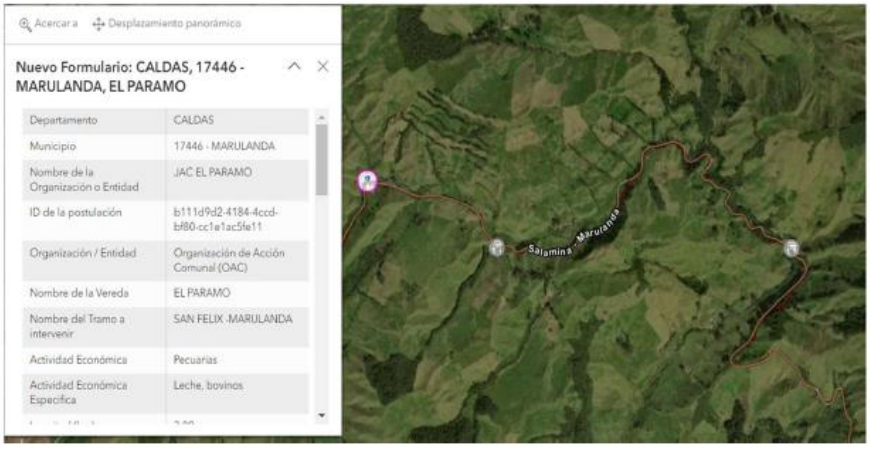


Ilustración 45 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2
TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN NO. 2	HASTA EL 30/5/25 28/4/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024

Tabla 33 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

116.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de suspensión, para revisión de la Interventoría.

116.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,63	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,73	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	35,89	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4188,10	0

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3551 de 2024

117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra No aplica para el periodo.

117.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo.

117.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

117.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

118.1.1 Actividades Administrativas

La Interventoría por medio de oficio CINP–555–670-1699 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de suspensión realizada por la JAC.

118.1.2 Actividades Técnicas

- La Interventoría realizó la reunión de socialización el día 06/03/25 en conjunto con la Profesional social de la Interventoría e INVIAS.

118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero y marzo 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en espera del reinicio del convenio para iniciar la etapa de alistamiento, solicitud, revisión y aprobación de las hojas de vida, una vez reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

1. *La Metodología Participativa Comunitaria MPC*

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

120 ANEXO

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

120.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	316
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	317
1	**INTRODUCCIÓN**		319
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		320
2.1	Localización		320
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		321
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		321
2.4	Características técnicas del proyecto		321
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		321
3.1	Información general del contrato		321
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		323
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		323
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		323
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		325
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1181
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		326
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		326
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		327
7	**Conclusiones y recomendaciones**		327
8	**Anexos**		329
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA REINICIO 01:	11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	95,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

121 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

122.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

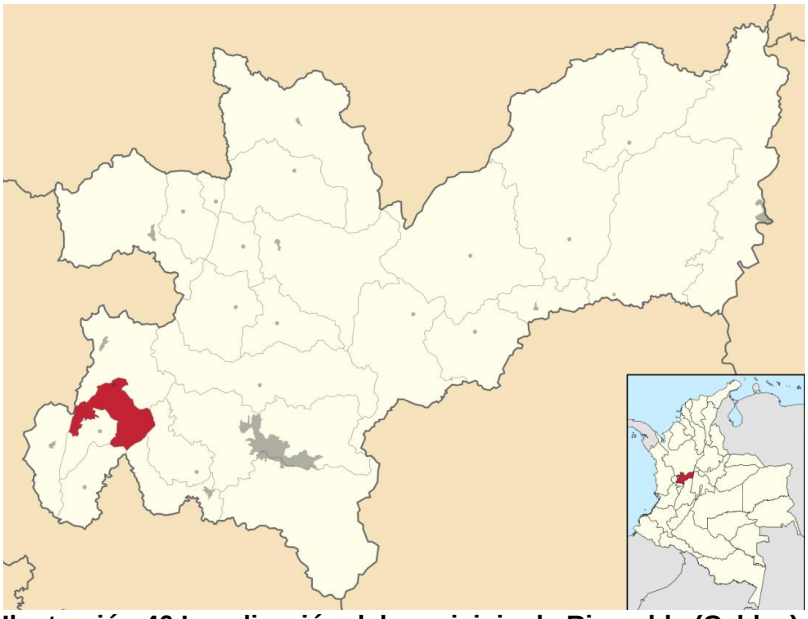


Ilustración 46 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

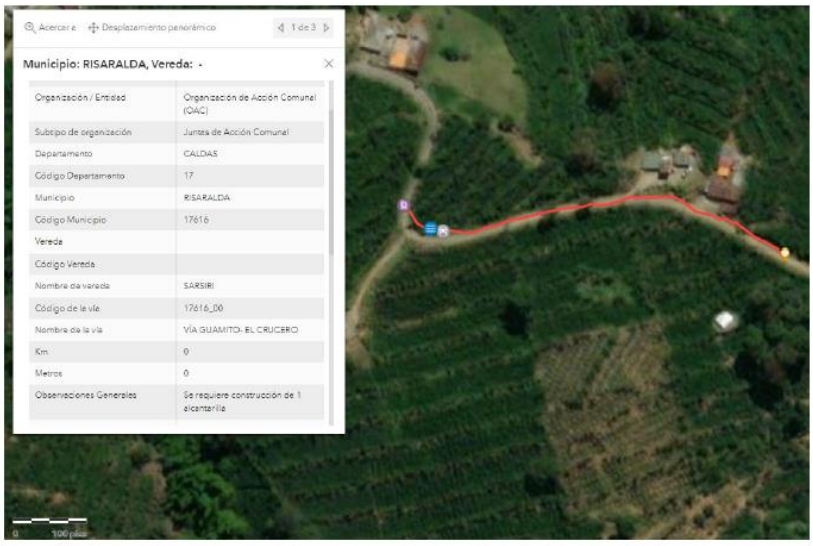


Ilustración 47 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA NO. 1	1 MES 28/4/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 34 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

123.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría

123.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,52	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,56	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4075,54	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0%	0%	0,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase F) - mezcla in situ					
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 18.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2176 de 2024

124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

124.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

124.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

124.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

125.1.1 Actividades Administrativas

La Interventoría por medio de oficio CINP–555–664-1693 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

125.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero y marzo 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del reinicio del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

> ***PLAN DE GESTIÓN SOCIAL***
>
> *C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL*
>
> *C2. Socializaciones*
>
> ***Socialización de inicio:*** *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*
>
> *C3. Participación comunitaria*
>
> *En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.*

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

2. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

127 ANEXO

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

127.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	331
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	332
1	**INTRODUCCIÓN**		334
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		335
2.1	Localización		335
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		336
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		336
2.4	Características técnicas del proyecto		337
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		337
3.1	Información general del contrato		337
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		339
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		340
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		340
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		341
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1188
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1204
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1206
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1208
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1211
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1213
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1211
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		342
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		342
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	343
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		343
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		345
7	**Conclusiones y recomendaciones**		345
8	**Anexos**		345
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1215
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1217

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	332
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2187-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN : 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 202.034.766,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	181,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.483.797,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.534.766,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	50.234.122,10	98.211.677,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.226.310,00	33.831.637,60
VALOR EJECUTADO	**66.460.432,10**	**132.043.314,77**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.534.766,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 132.043.314,77
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 65,85%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - UBICACIÓN DE FORMALETA - 29/04/25



FOTO 3 - COMPACTACIÓN DE SUBBASE- 25/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

128 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

129.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.



Ilustración 48 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

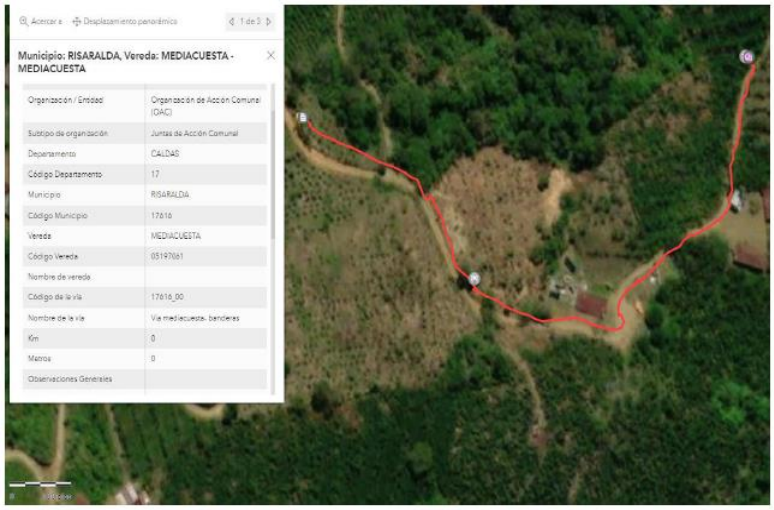


Ilustración 49 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado

Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 50 Estado inicial del sector

129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9
TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA NO. 2	1 MES 28/4/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027

Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Tabla 35 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

130.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 31/3/25, remitió modificación de desembolso según indicaciones.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 1/4/25 y 2/4/25, remitió plan de compras y subsanación para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/4/25, remitió documentos de desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/4/25, remitió el plan de compras no. 11 pendiente para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/4/25, remitió los presupuestos de alcantarilla y sumidero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/4/25, remitió el presupuesto de la alcantarilla.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió solicitud de desembolso de alquiler de equipos.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/4/25, remitió la autorización obras adicionales – Alcantarilla en K0+135.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/4/25, remitió solicitud de desembolso correspondiente al plan de compras 12.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/4/25, remitió el plan de compras 13 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/4/25, remitió plan de compras 13 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/4/25, remitió la solicitud de prórroga, para revisión de la Interventoría.

130.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 46 ml, cantidad ejecutada: 34,48 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 46 ml, cantidad ejecutada: 25,95 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 63 ml, cantidad ejecutada: 10,93 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 46 ml, cantidad ejecutada: 2.638,36 m3.

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	99,26%	200.534.766,00
Ejecutado	60%	65,36%	132.043.314,77
Avance / Retraso	**-40%**	**- 33,9%**	**- 68.491.451,23**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	5,20
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	70%	135,70	95,21
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	56%	100,35	56,55
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	56%	31,41	17,7

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	56%	4.949,68	2.789,32

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 19.3.

131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado
Maestro de Obra	Guillermo Velázquez Blandón

Tabla 36 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 19.4.

131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 41.980.856 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.021.533 de fecha 04/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.403.163 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 609.000 de fecha 14/02/2025.
5, Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.221.018de fecha 14/02/2025.
6, Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.778.860 de fecha 24/02/2025.
7.Desembolso 07 aprobado por valor de $ 13.843.532 de fecha 12/03/2025.
8.Desembolso 07 aprobado por valor de $ 35.512.326,96 de fecha 26/03/2025.

Desembolso Total por valor de $ 111.370.288,02 correspondiente al 55,12% del valor del convenio. Ver Anexo 19.9

131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 19.5.

131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 19.6.

131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2187 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1			**MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA**	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**60%**
2			**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA**	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**60%**
3	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
4	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
6			Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	70%
7			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	56%
8			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	56%
9			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	56%
10								
11								
12	✓			1 día?	lun 23/12/24	lun 23/12/24		100%

131.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el periodo de abril 2025, la Inversión Programada fue de 200.534.766,00; la Inversión Ejecutada fue de 132.043.314,77. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 68.491.451,23.

131.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

131.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

132.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 22, 23, 24 y 25 por medio de los oficios CINP-555-585-1416, CINP-555-607-1522, CINP-555-635-1628 y CINP–555–643–1665.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–591-1453 de fecha 8/4/25, presentó a la JAC los niveles topográficos que se tomaron el la visita a la obra.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–610-1528 de fecha 11/4/25, solicitó a la JAC documentos para la construcción de un canal con rejilla al inicio de la placa huella.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–658-1687 de fecha 28/4/25, remitió al INVIAS la solicitud de prórroga realizada por la JAC.

132.1.2 Actividades Técnicas

El día 01 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras.

El día 07 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 14 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 21 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 95,21 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 56,55 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 17,70 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 2.789,32 kg

132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 60% e Inversión de 65% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3, Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 95,21 m3, Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 56,55 m3, Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 17,70 m3, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 102 ml, cantidad ejecutada: 2.789,32 kg

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 132.043.314,77 correspondiente al 65,36% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 30 días para el vencimiento del plazo del convenio.
  Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.

134 ANEXO

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta el registro fotográfico. Ver Anexo 19.7.

134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

134.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 19.8.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	348
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	349
1	**INTRODUCCIÓN**		351
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		352
2.1	Localización		352
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		353
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		353
2.4	Características técnicas del proyecto		353
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		353
3.1	Información general del contrato		353
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		355
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		355
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		355
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		356
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1239
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		357
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		358
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		358
7	**Conclusiones y recomendaciones**		358
8	**Anexos**		359
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	17/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRÓRROGA 1:	28/05/2025
PLAZO PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.048.100,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.048.100,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.477.350,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.526.429,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.548.100,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

135 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

136.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.



Ilustración 51 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

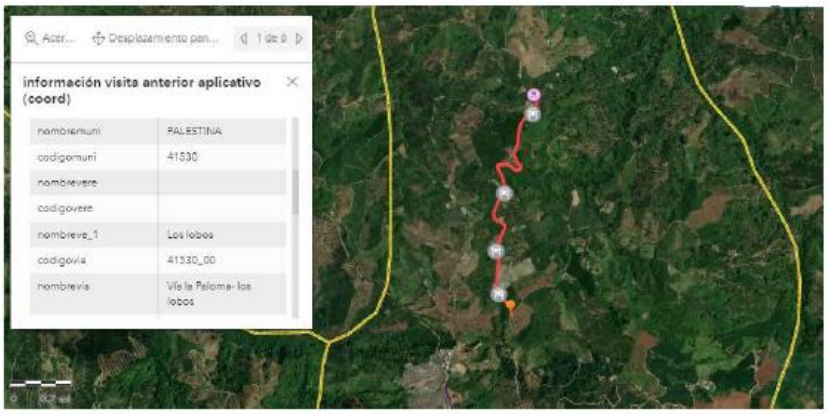


Ilustración 52 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROFA NO. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/05/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 37 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

137.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

137.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,85	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	127,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,76	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4782,63	0

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3169 de 2024

138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

138.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

138.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

138.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

139.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo

139.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, el extracto bancario del periodo de Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con*

el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

3. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con

el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

141 ANEXO

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

141.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.		FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	362
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	363
1	**INTRODUCCIÓN**		365
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		366
2.1	Localización		366
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		367
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		367
2.4	Características técnicas del proyecto		367
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		367
3.1	Información general del contrato		367
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		369
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		369
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		370
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		370
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1246
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		371
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		372
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		372
7	**Conclusiones y recomendaciones**		372
8	**Anexos**		373
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.472.544,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.472.544,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.646.058,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.747.104,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.972.544,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

142 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

143.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

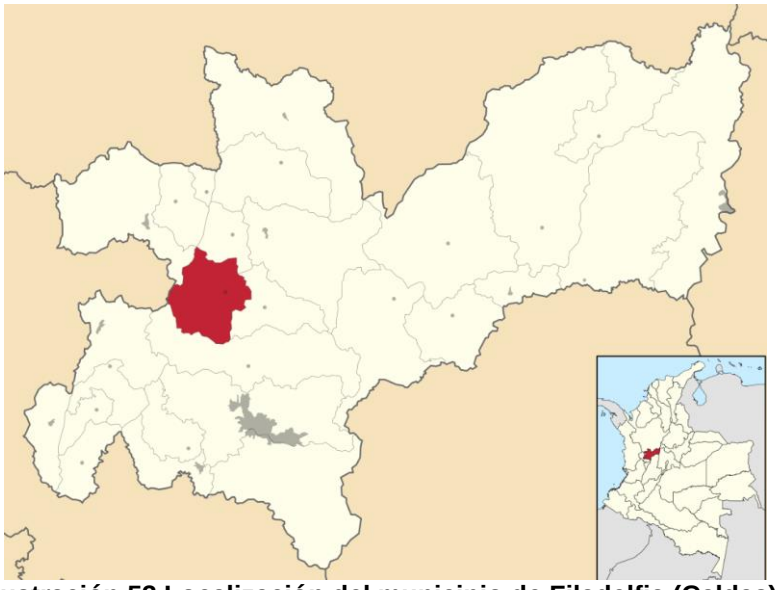


Ilustración 53 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

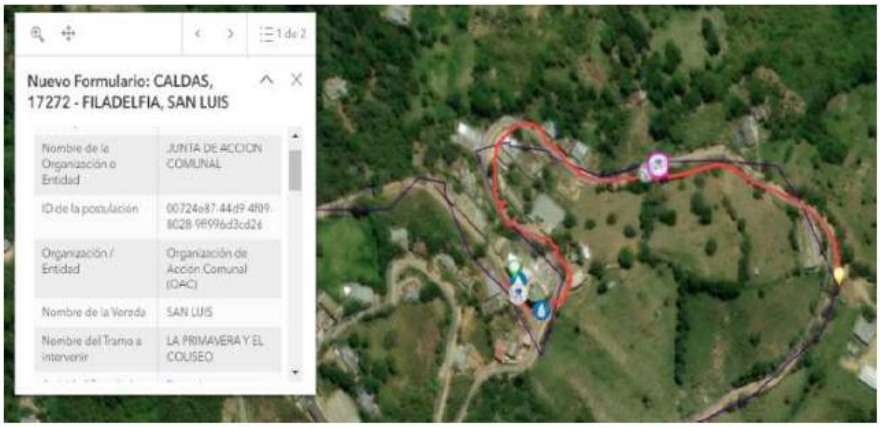


Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN NO. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 38 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

144.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

144.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3530 de 2024

145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

145.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

145.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

146.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

146.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, el extracto bancario del periodo de Marzo 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho

(28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

148 ANEXO

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

148.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	375
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	376
1	**INTRODUCCIÓN**		378
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		379
2.1	Localización		379
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		380
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		380
2.4	Características técnicas del proyecto		380
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		380
3.1	Información general del contrato		380
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		382
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		382
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		382
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		384
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1253
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		385
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		385
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		386
7	**Conclusiones y recomendaciones**		386
8	**Anexos**		387
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 76,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.949.712,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.949.712,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.349.316,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.600.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.499.917,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.449.712,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PEDRAZA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

149 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

150.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.

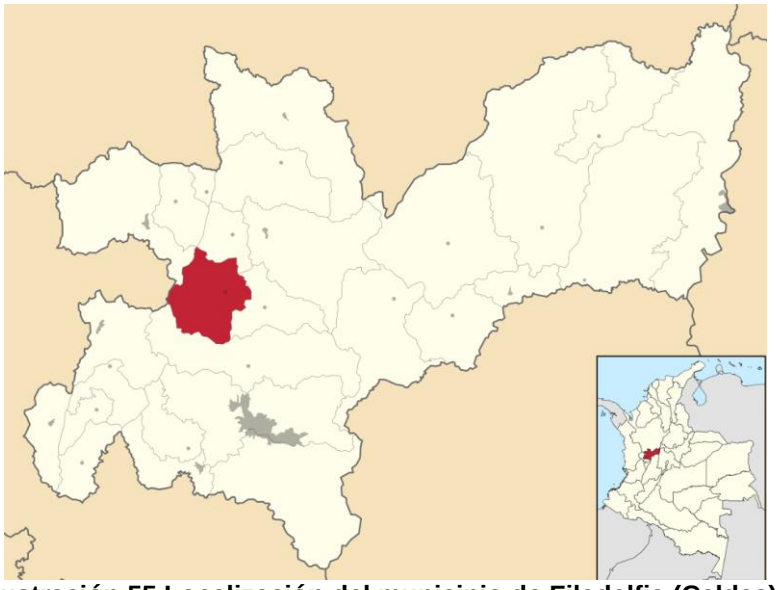


Ilustración 55 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

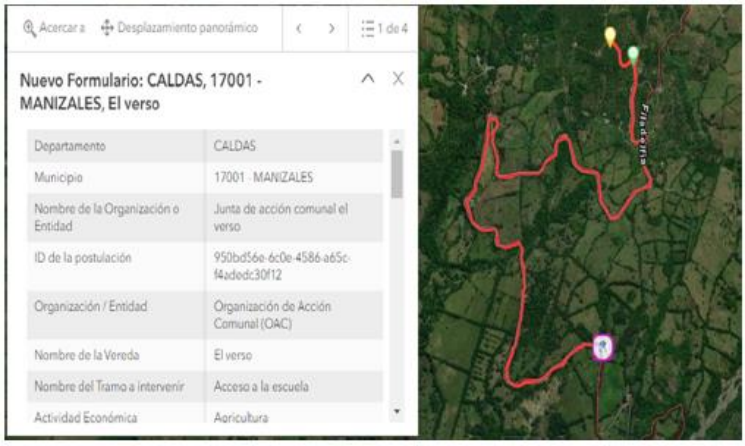


Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1
TELÉFONO:	3193164956
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIAIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN NO. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 39 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

151.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

151.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	70,17	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0%	0%	0,90	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase F) - mezcla in situ					
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3652 de 2024

152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

152.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

152.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

152.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

153.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

153.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero y Marzo 2025, se encuentra a la espera de los soportes del giro al Tesoro Nacional.

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del reinicio del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

4. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

155 ANEXO

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

155.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	390
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	391
1	**INTRODUCCIÓN**		393
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		394
2.1	Localización		394
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		395
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		395
2.4	Características técnicas del proyecto		395
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		395
3.1	Información general del contrato		395
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		397
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		397
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		397
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		398
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1260
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		399
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		399
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		400
7	**Conclusiones y recomendaciones**		400
8	**Anexos**		401
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3622-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: IAC VEREDA ALTO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.471.038,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.471.038,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	163,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.089.476,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.562.684,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.318.878,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.971.038,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONTRATO VENCIDO

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

156 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

157.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.

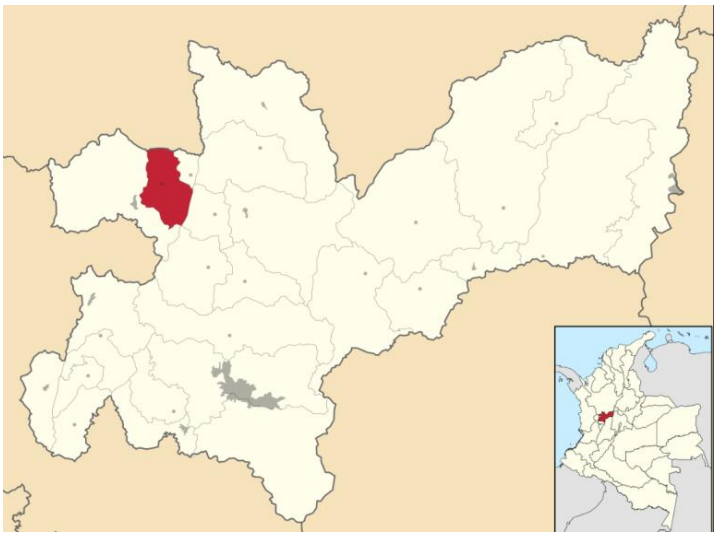


Ilustración 57 Localización del municipio de Supía (Caldas).

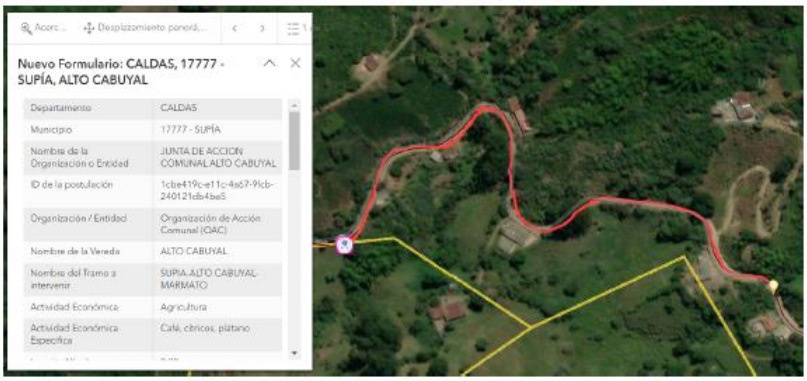


Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	VENCIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Patronal			

Tabla 40 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

158.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

158.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024

159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

159.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

159.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

159.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

160.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

160.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero y Marzo de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte del presente informe, el Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación conforme a la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, fue el 02/03/25.
- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025. A la fecha del presente informe, la OAC no presentó solicitud de prórroga para la ejecución del proyecto.

162 ANEXO

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

162.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	403
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	404
1	**INTRODUCCIÓN**		406
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		407
2.1	Localización		407
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		408
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		408
2.4	Características técnicas del proyecto		408
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		408
3.1	Información general del contrato		408
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		410
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		410
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		410
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		411
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1267
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		412
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		413
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		413
7	**Conclusiones y recomendaciones**		413
8	**Anexos**		414
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.464.740,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.464.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.402.534,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.990.130,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.964.740,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

163 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

164.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 59 Localización del municipio de Supía(Caldas).

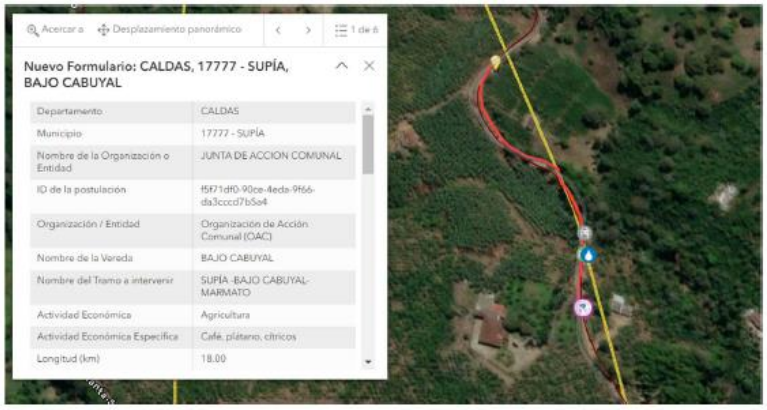


Ilustración 60 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN NO. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/5/25

DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928	

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Tabla 41 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

165.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

165.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3983 de 2024

166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

166.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

166.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

166.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

167.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

167.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

169 ANEXO

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

169.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	416
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	417
1	**INTRODUCCIÓN**		419
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		420
2.1	Localización		420
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		421
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		421
2.4	Características técnicas del proyecto		421
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		421
3.1	Información general del contrato		421
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		423
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		424
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		424
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		424
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1274
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		425
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		426
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		426
7	**Conclusiones y recomendaciones**		426
8	**Anexos**		427
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 91,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.460.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.460.667,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.263.198,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.129.573,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.960.667,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

170 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

171.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 61 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

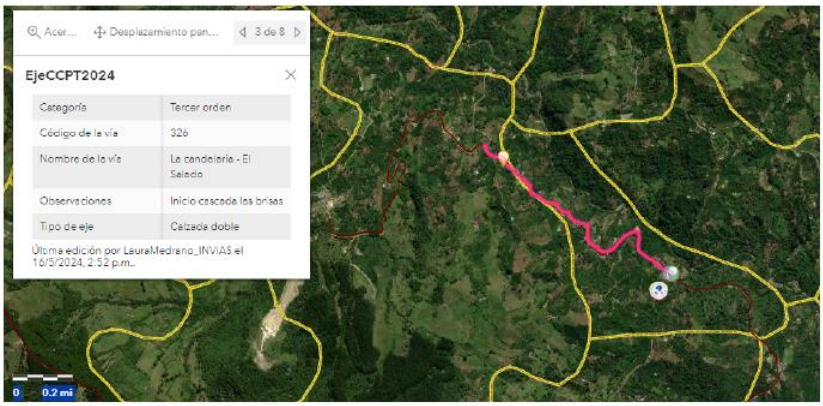


Ilustración 62 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 42 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

172.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

172.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3646 de 2024

173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

173.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

173.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

173.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

174.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

174.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancarios del mes de Marzo de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario del mes de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

176 ANEXO

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

176.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	429
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	430
1	**INTRODUCCIÓN**		432
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		433
2.1	Localización		433
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		434
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		434
2.4	Características técnicas del proyecto		434
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		434
3.1	Información general del contrato		434
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		436
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		436
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		437
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		438
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1281
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		439
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		439
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		439
7	**Conclusiones y recomendaciones**		440
8	**Anexos**		400
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 86,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.487.839,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.487.839,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.145.376,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.987.839,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

177 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

178.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 63 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/05/25

	28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 43 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

179.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

179.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,28	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,30	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,64	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,51	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	9,60	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	29,10	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2569 de 2024

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

180.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

180.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

180.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

181.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

181.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de Marzo de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

183 ANEXO

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

183.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 DEABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	443
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	444
1	**INTRODUCCIÓN**		446
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		447
2.1	Localización		447
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		448
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		448
2.4	Características técnicas del proyecto		448
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		448
3.1	Información general del contrato		448
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		450
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		450
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		451
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		452
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1288
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		453
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		453
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		454
7	**Conclusiones y recomendaciones**		454
8	**Anexos**		454
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1388
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3296-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 89,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

184 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

185.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 64 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

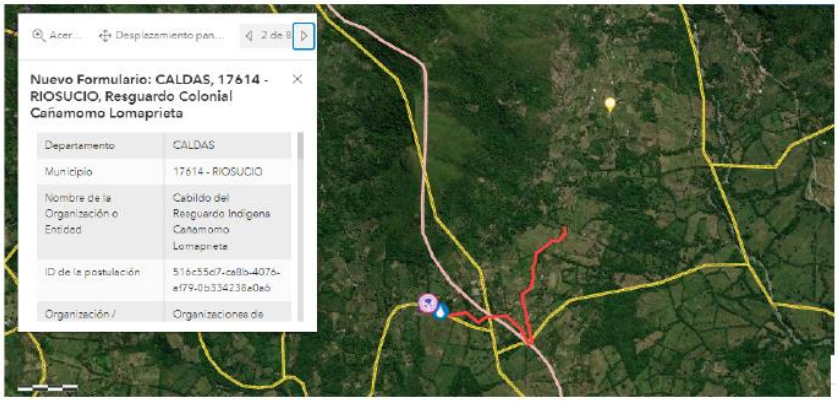


Ilustración 65 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04
TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 44 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

186.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

186.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	36,35	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3286 de 2024

187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

187.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

187.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

187.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

188.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

188.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de Marzo de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

190 ANEXO

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

190.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** 1 AL 30 ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	457
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	458
1	**INTRODUCCIÓN**		460
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		461
2.1	Localización		461
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		462
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		462
2.4	Características técnicas del proyecto		462
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		462
3.1	Información general del contrato		462
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		464
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		464
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		465
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		466
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1295
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		466
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1338
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1678
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		470
5.3	Informes especialistas y profesionales		1453
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		48
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1683
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1302
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1681
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1314
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1688
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		470
7	**Conclusiones y recomendaciones**		470
8	**Anexos**		471
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1320
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** abr-25

CONVENIO No.: 3595-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	7/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	89,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.348.439,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.348.439,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	165,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			153.411.914,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.602.357,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			41.834.168,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.848.439,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

191 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 06, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

192.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.



Ilustración 66 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

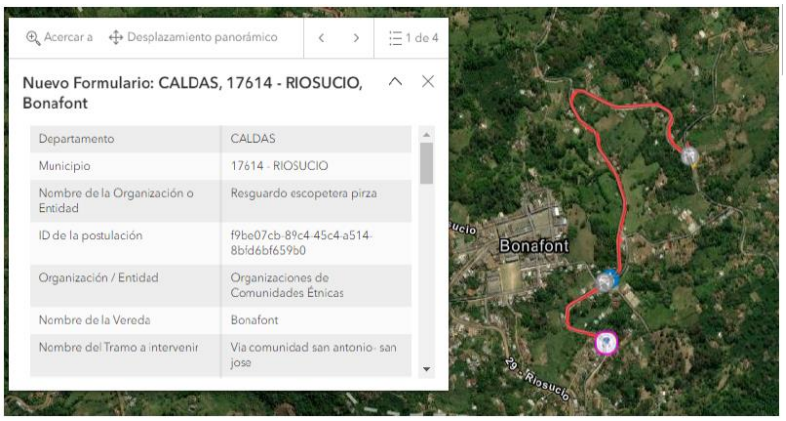


Ilustración 67 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	07/10/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 45 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

193.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

193.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	138,85	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,61	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	42,96	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4648,36	0

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3595 de 2024

194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

194.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

194.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

194.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

195.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

195.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio. La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de Marzo de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

5. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los diecisiete (17) que inicialmente contaban con recursos, tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. En el mes de febrero de 2025, el INSTITUTO resolvió la dificultad con el PAC para diez (10) convenios más, esto de acuerdo a los extractos bancarios del mes de febrero y marzo de 2025 recibidos. Por otro lado, cinco (5) de los veintiocho (28) están suspendidos y en el caso del convenio 3622 de 2024 se venció su plazo contractual ante el desinterés del OAC por la ejecución de dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

197 ANEXO

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

197.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.
