CONSORCIO CCSO	**HOJA DE CONTROL DE INFORMES**	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. : **3601 DE 2022**



ENTIDAD CONTRATANTE: **INVIAS**

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

TIPO DE INFORME: **INFORME MENSUAL 07**

CODIGO: **IM-555-07**

CONTROL DE REVISIONES

Responsables / No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsable de Elaboración	Nombre:	ASTRID GAONA SOLER			
	Firma:				
	Fecha:	jun-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	jun-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	BIBIANA PATERNINA ESPITIA			
	Firma.				
	Fecha:	jun-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



SAMANÁ


PENSILVANIA


BELALCÁZAR


MARULANDA


RISARALDA


PALESTINA


FILADELFIA


SUPÍA


RIOSUCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 07
PERIODO: DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2025

IM – 555 – 07

MAYO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 07	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	 Astrid Gaona Soler Ingeniero Residente
REVISADO POR:	 Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL SILENCIO** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL SILENCIO **LONG. CORR.:** 1,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 150 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**VÍA:** TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) **LONG. CORR.:** 0,35 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 144 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA PATIO BONITO**, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**VÍA:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SARDINAS **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148,51 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
SAMANÁ	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CALIFORNIA ALTA **LONG. CORR.:** 6,2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 139,5 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLI** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CARACOLI **LONG. CORR.:** 2,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 179 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 149 ML	**SECTOR:** MONTEBELLO **LONG. CORR.:** 2,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 142,8 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**OBRAS DE ARTE:** 0	**OBRAS DE ARTE:** 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE **ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO **LONG. CORR.:** 2 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 127 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** EL NARANJAL **LONG. CORR.:** 1,8 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 147 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA LINDA – SAN DANIEL **LONG. CORR.:** 0,26 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 148 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 135 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SANTA RITA BAJA **LONG. CORR.:** 0,69 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 126 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN **LONG. CORR.:** 0,51 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 130 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES **LONG. CORR.:** 1,4 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 174 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** LA HABANA – LAS PAVAS **LONG. CORR.:** 0,24 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 183 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA	**SECTOR:** NARANJAL - MONTEBONITO **LONG. CORR.:** 0,71 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**LONG. PLACA HUELLA.:** 155 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PARAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX **LONG. CORR.:** 3,38 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 146 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** GUAMITO – EL CRUCERO **LONG. CORR.:** 0,17 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 151 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 181 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** MEDIA CUESTA - BANDERAS **LONG. CORR.:** 0,64 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 156 ML **OBRAS DE ARTE:** 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS **LONG. CORR.:** 1,6 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 170 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
FILADELFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA **LONG. CORR.:** 0,532 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 158 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2	**SECTOR:** CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) **LONG. CORR.:** 0,322 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 141 ML **OBRAS DE ARTE:** 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,533 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 163 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA BAJO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE **LONG. CORR.:** 0,221 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 160 ML **OBRAS DE ARTE: 0**
RIOSUCIO	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0	**SECTOR:** RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) **LONG. CORR.:** 1,55 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 132 ML **OBRAS DE ARTE:** 0
	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS **PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO **LONG. CORR.:** 0,175 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 152 ML **OBRAS DE ARTE:** 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1	**SECTOR:** CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) **LONG. CORR.:** 4,5 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 140 ML **OBRAS DE ARTE:** 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y **EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**	**SECTOR:** ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) **LONG. CORR.:** 1,193 KM **TIPO PAV.:** PLACA HUELLA **LONG. PLACA HUELLA.:** 185 ML **OBRAS DE ARTE: 0**

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 46
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS 48
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 48
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 48
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS 48

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 48
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49
2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 50
2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 50
2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo. 50
2.6.2 Seguimiento al plan de carga 50

3 INTRODUCCIÓN 53

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 54

4.1 LOCALIZACIÓN 54
4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 55
4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 56
4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 56

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 56

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 56
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 58
5.2.1 Actividades Administrativas 58
5.2.2 Actividades Técnicas 58
5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 58
5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 58

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 59

6.1 INFORME SEMANAL 59
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 59
6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 60
6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 60
6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 60
6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 60
6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 60
6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 60
6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 60
6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 60
6.9.3 Actas de Comités 60
6.9.4 Actas de Reunión 61

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 61

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 61
7.1.1 Actividades Administrativas 61
7.1.2 Actividades Técnicas 61
7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 61

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 62

9 ANEXO 62

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 62
9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 62
9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 62
9.4 BITÁCORA 62

10 INTRODUCCIÓN 66

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 67

11.1 LOCALIZACIÓN 67
11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 68
11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 68
11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 69

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 69

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 69
12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 71
12.2.1 Actividades Administrativas 71
12.2.2 Actividades Técnicas 71
12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 72
12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 72

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 73

13.1 INFORME SEMANAL 73
13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 73
13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 74
13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 74
13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 74
13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 74
13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 74
13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 74
13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 74
13.9.3 Actas de Comités 75
13.9.4 Actas de Reunión 75

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 75

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 75
14.1.1 Actividades Administrativas 75
14.1.2 Actividades Técnicas 75
14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 76

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76

16 ANEXO 77

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 77

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 77
16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 77
16.4 BITÁCORA 77

17 INTRODUCCIÓN 80

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 81

18.1 LOCALIZACIÓN 81
18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 82
18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 82
18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 83

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 83

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 83
19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 85
19.2.1 Actividades Administrativas 85
19.2.2 Actividades Técnicas 85
19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 86
19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA .. 86

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 87

20.1 INFORME SEMANAL 87
20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 87
20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 87
20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 88
20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 88
20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 88
20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 89
20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 89
20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 89
20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 89
20.9.3 Actas de Comités 89
20.9.4 Actas de Reunión 89

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 89

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 89
21.1.1 Actividades Administrativas 90
21.1.2 Actividades Técnicas 90
21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 91

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91

23 ANEXO 92

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 92
23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 92

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 92
23.4 BITÁCORA 92

24 INTRODUCCIÓN 95

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 96

25.1 LOCALIZACIÓN 96
25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 97
25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 97
25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 98

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 98

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 98
26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 99
26.2.1 Actividades Administrativas 99
26.2.2 Actividades Técnicas 99
26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 99
26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 100

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 101

27.1 INFORME SEMANAL 101
27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 101
27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 101
27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 101
27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 102
27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 102
27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 102
27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 102
27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 102
27.9.4 Actas de Comités 102
27.9.5 Actas de Reunión 102

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 102

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 102
28.1.1 Actividades Administrativas 103
28.1.2 Actividades Técnicas 103
28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 103

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103

30 ANEXO 104

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 104
30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 104

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 104
30.4 BITÁCORA 104

31 INTRODUCCIÓN 107

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 108

32.1 LOCALIZACIÓN 108
32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 109
32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 109
32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 110

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 110

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 110
33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 112
33.2.1 Actividades Administrativas 112
33.2.2 Actividades Técnicas 112
33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 113
33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 113

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 114

34.1 INFORME SEMANAL 114
34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 114
34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 115
34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 115
34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 115
34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 116
34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 116
34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 116
34.9.3 Actas de Comités 116
34.9.4 Actas de Reunión 116

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 116

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 116
35.1.1 Actividades Administrativas 116
35.1.2 Actividades Técnicas 117
35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 118

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 118

37 ANEXO 119

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 119
37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 119
37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 119
37.4 BITÁCORA 119

38 INTRODUCCIÓN 122

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 123

39.1 LOCALIZACIÓN 123
39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 124
39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 124
39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 125

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 125

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 125
40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 126
40.2.1 Actividades Administrativas 126
40.2.2 Actividades Técnicas 127
40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 128
40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 128

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 129

41.1 INFORME SEMANAL 129
41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 129
41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 129
41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 129
41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 130
41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 130
41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 130
41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 130
41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 130
41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 130
41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 130
41.9.3 Actas de Comités 131
41.9.4 Actas de Reunión 131

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 131

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 131
42.1.1 Actividades Administrativas 131
42.1.2 Actividades Técnicas 132

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 133

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 133

44 ANEXO 134

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 134
44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 134
44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 134
44.4 BITÁCORA 134

45 INTRODUCCIÓN 137

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 138

46.1 LOCALIZACIÓN 138
46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 139
46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 139
46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 140

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 140

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 140
47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 142
47.2.1 Actividades Administrativas 142
47.2.2 Actividades Técnicas 142
47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 142
47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 143

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 143

48.1 INFORME SEMANAL 143
48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 144
48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 144
48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 144
48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 144
48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 145
48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 145
48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 145
48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 145
48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 145
48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 145
48.9.3 Actas de Comités 146
48.9.4 Actas de Reunión 146

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 146

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 146
49.1.1 Actividades Administrativas 146
49.1.2 Actividades Técnicas 146

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 147

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 147

51 ANEXO 147

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 147
51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 147
51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 148
51.4 BITÁCORA 148

52 INTRODUCCIÓN 151

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 152

53.1 LOCALIZACIÓN 152
53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 153
53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 153
53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 154

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 154

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 154
54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 155
54.2.1 Actividades Administrativas 155
54.2.2 Actividades Técnicas 156
54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 157
54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 157

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 157

55.1 INFORME SEMANAL 157
55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 158
55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 158
55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 158
55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 158
55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 159
55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 159
55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 159
55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 159
55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 159
55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 159
55.9.3 Actas de Comités 160
55.9.4 Actas de Reunión 160

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 160
56.1.1 Actividades Administrativas 160
56.1.2 Actividades Técnicas 160

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 161

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 162

58 ANEXO 163

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 163
58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 163
58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 163
58.4 BITÁCORA 163

59 INTRODUCCIÓN 166

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 167

60.1 LOCALIZACIÓN 167
60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 168
60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 168
60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 169

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 169

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 169
61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 170
61.2.1 Actividades Administrativas 170
61.2.2 Actividades Técnicas 171
61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 171
61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 171

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 172

62.1 INFORME SEMANAL 172
62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 172
62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 172
62.4 NFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 173
62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 173
62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 173
62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 173
62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 173
62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 173
62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 173

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 173
62.9.3 Actas de Comités ... 173
62.9.4 Actas de Reunión ... 173

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 174

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ... 174
63.1.1 Actividades Administrativas ... 174
63.1.2 Actividades Técnicas ... 174
63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ ... 174

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 174

65 ANEXO ... 175

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ... 175
65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ... 175
65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES ... 175
65.4 BITÁCORA ... 175

66 INTRODUCCIÓN ... 178

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 179

67.1 LOCALIZACIÓN ... 179
67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ... 180
67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR ... 180
67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 181

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO ... 181

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ... 181
68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ... 183
68.2.1 Actividades Administrativas ... 183
68.2.2 Actividades Técnicas ... 183
68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS ... 184
68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 184

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO ... 185

69.1 INFORME SEMANAL ... 185
69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 185
69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO ... 185
69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 186
69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ... 186
69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ... 186
69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 186
69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 186
69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 186
69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo ... 186
69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. ... 187

69.9.3 Actas de Comités 187
69.9.4 Actas de Reunión 187

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 187

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 187
70.1.1 Actividades Administrativas 187
70.1.2 Actividades Técnicas 188
70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ 189

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 190

72 ANEXO 190

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 190
72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 190
72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 190
72.4 BITÁCORA 190

73 INTRODUCCIÓN 193

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 194

74.1 LOCALIZACIÓN 194
74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 195
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 195
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 196

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 196

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 196
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 198
75.2.1 Actividades Administrativas 198
75.2.2 Actividades Técnicas 198
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 198
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 198

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 199

76.1 INFORME SEMANAL 199
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 199
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 199
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 199
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 200
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 200
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 200
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 200
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 200
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 201
76.9.3 Actas de Comités 201

76.9.4 Actas de Reunión 201

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 201

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 201
77.1.1 Actividades Administrativas 201
77.1.2 Actividades Técnicas 202
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 202

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 202

79 ANEXO 203

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 203
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 203
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 203
79.4 BITÁCORA 203

80 INTRODUCCIÓN 206

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 207

81.1 LOCALIZACIÓN 207
81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 208
81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 209
81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 209

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 209

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 209
82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 211
82.2.1 Actividades Administrativas 211
82.2.2 Actividades Técnicas 211
82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 212
82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 212

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 212

83.1 INFORME SEMANAL 212
83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 213
83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 213
83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 213
83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 213
83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 213
83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 213
83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 214
83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 214
83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 214
83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 214
83.9.3 Actas de Comités 214
83.9.4 Actas de Reunión 214

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 215

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 215
84.1.1 Actividades Administrativas 215
84.1.2 Actividades Técnicas 215
84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 216

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 216

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 217
85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 217
85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 217
85.4 BITÁCORA 217

86 INTRODUCCIÓN 220

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 221

87.1 LOCALIZACIÓN 221
87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 222
87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 222
87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 223

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 223

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 223
88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 225
88.2.1 Actividades Administrativas 225
88.2.2 Actividades Técnicas 225
88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 225
88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 226

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 226

89.1 INFORME SEMANAL 226
89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 226
89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 227
89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 227
89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 227
89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 227
89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 227

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 228
89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 228
89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 228
89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 228
89.9.3 Actas de Comités 228
89.9.4 Actas de Reunión 228

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 229

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 229
90.1.1 Actividades Administrativas 229
90.1.2 Actividades Técnicas 229
90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 230

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 230

92 ANEXO 231

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 231
92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 231
92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 231
92.4 BITÁCORA 231

93 INTRODUCCIÓN 234

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 235

94.1 LOCALIZACIÓN 235
94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 236
94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 237
94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 237

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 237

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 237
95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 239
95.2.1 Actividades Administrativas 239
95.2.2 Actividades Técnicas 239
95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 240
95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 240

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 241

96.1 INFORME SEMANAL 241
96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 241
96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 241
96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 241
96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 242
96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 242
96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 242
96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 242
96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 242
96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 242
96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 242
96.9.3 Actas de Comités 243
96.9.4 Actas de Reunión 243

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 243

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 243
97.1.1 Actividades Administrativas 243
97.1.2 Actividades Técnicas 244
97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA 245

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 245

99 ANEXO 246

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 246
99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 246
99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 246
99.4 BITÁCORA 246

100 INTRODUCCIÓN 249

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 250

101.1 LOCALIZACIÓN 250
101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 251
101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 252
101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 252

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 252

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 252
102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 254
102.2.1 Actividades Administrativas 254
102.2.2 Actividades Técnicas 254
102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 255
102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 255

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 256

103.1 INFORME SEMANAL 256
103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 256
103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 256
103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 256
103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 257
103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 257
103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 257
103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 257
103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 257
103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 257
103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 258
103.9.3 Actas de Comités 259
103.9.4 Actas de Reunión 259

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 259

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 259
104.1.1 Actividades Administrativas 260
104.1.2 Actividades Técnicas 260
104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR 261

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 262

106 ANEXO 262

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 262
106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 262
106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 262
106.4 BITÁCORA 262

107 INTRODUCCIÓN 265

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 266

108.1 LOCALIZACIÓN 266
108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 267
108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 268
108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 268

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 268

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 268

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 270
109.2.1 Actividades Administrativas 270
109.2.2 Actividades Técnicas 271
109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 271
109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 272

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 272

110.1 INFORME SEMANAL 272
110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 272
110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 272
110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 273
110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 273
110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 273
110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 273
110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 274
110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 274
110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 274
110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 274
110.9.3 Actas de Comités 274
110.9.4 Actas de Reunión 274

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 274

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 274
111.1.1 Actividades Administrativas 275
111.1.2 Actividades Técnicas 275
111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 276

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 276

113 ANEXO 278

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 278
113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 278
113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 278
113.4 BITÁCORA 278

114 INTRODUCCIÓN 281

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 282

115.1 LOCALIZACIÓN 282
115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 283
115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 284
115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 284

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 284

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 284
116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 285
116.2.1 Actividades Administrativas 285
116.2.2 Actividades Técnicas 286
116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 286
116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 286

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 287

117.1 INFORME SEMANAL 287
117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 287
117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 287
117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 287
117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 287
117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 287
117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 287
117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 288
117.9.3 Actas de Comités 288
117.9.4 Actas de Reunión 288

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 288

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 288
118.1.1 Actividades Administrativas 288
118.1.2 Actividades Técnicas 288
118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA 288

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 288

120 ANEXO 290

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 290
120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 290
120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 290
120.4 BITÁCORA 290

121 INTRODUCCIÓN 293

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 294

122.1 LOCALIZACIÓN 294
122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 295
122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 296
122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 296

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 296

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 296
123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 297
123.2.1 Actividades Administrativas 297
123.2.2 Actividades Técnicas 298
123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 298
123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 298

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 299

124.1 INFORME SEMANAL 299
124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 299
124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 300
124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 300
124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 300
124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 300
124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 300
124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 300
124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 300
124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 300
124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 300
124.9.3 Actas de Comités 300
124.9.4 Actas de Reunión 301

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 301

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 301
125.1.1 Actividades Administrativas 301
125.1.2 Actividades Técnicas 301
125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 301

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 301

127 ANEXO 303

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 303
127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 303
127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 303
127.4 BITÁCORA 303

128 INTRODUCCIÓN 306

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 307

129.1 LOCALIZACIÓN 307

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 308
129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 308
129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 309

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 309

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 309
130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 311
130.2.1 Actividades Administrativas 311
130.2.2 Actividades Técnicas 312
130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 312
130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 312

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 313

131.1 INFORME SEMANAL 313
131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 313
131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 313
131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 314
131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 314
131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 314
131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 314
131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 315
131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 315
131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 315
131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 315
131.9.3 Actas de Comités 315
131.9.4 Actas de Reunión 315

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 316

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 316
132.1.1 Actividades Administrativas 316
132.1.2 Actividades Técnicas 316
132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA 318

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 318

134 ANEXO 319

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 319
134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 319
134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 319
134.4 BITÁCORA 319

135 INTRODUCCIÓN 322

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 323

136.1 LOCALIZACIÓN 323

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 324
136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 324
136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 325

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 325

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 325
137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 326
137.2.1 Actividades Administrativas 326
137.2.2 Actividades Técnicas 327
137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 327
137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 327

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 328

138.1 INFORME SEMANAL 328
138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 328
138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 328
138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 328
138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 328
138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 328
138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 329
138.9.3 Actas de Reunión 329

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 329

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 329
139.1.1 Actividades Administrativas 329
139.1.2 Actividades Técnicas 329
139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA 330

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 330

141 ANEXO 331

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 331
141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 331
141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 331
141.4 BITÁCORA 331

142 INTRODUCCIÓN 334

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 335

143.1 LOCALIZACIÓN 335
143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 336

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 336
143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 337

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 337

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 337
144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 338
144.2.1 Actividades Administrativas 338
144.2.2 Actividades Técnicas 338
144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 338
144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 339

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 339

145.1 INFORME SEMANAL 339
145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 339
145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 340
145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 340
145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 340
145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 340
145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 340
145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 340
145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 340
145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 340
145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 340
145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones 340
145.9.4 Actas de Reunión 341

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 341

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 341
146.1.1 Actividades Administrativas 341
146.1.2 Actividades Técnicas 341
146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 341

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 341

148 ANEXO 342

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 342
148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 342
148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 342
148.4 BITÁCORA 342

149 INTRODUCCIÓN 345

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 346

150.1 LOCALIZACIÓN 346
150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 347
150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 348

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 348

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 348

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 348
151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 349
151.2.1 Actividades Administrativas 349
151.2.2 Actividades Técnicas 349
151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 350
151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 350

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 351

152.1 INFORME SEMANAL 351
152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 351
152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 351
152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 351
152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 351
152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 351
152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 352
152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 352
152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 352
152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 352
152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 352
152.9.3 Actas de Reunión 352

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 352

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 352
153.1.1 Actividades Administrativas 352
153.1.2 Actividades Técnicas 352
153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA 353

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 353

155 ANEXO 354

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 354
155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 354
155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 355
155.4 BITÁCORA 355

156 INTRODUCCIÓN 358

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 359

157.1 LOCALIZACIÓN 359
157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 360
157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 360
157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 361

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 361

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 361
158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 362
158.2.1 Actividades Administrativas 362
158.2.2 Actividades Técnicas 362
158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 362
158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 362

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 363

159.1 INFORME SEMANAL 363
159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 363
159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 363
159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 364
159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 364
159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 364
159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 364
159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 364
159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 364
159.9.3 Actas de Reunión 364

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 365

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 365
160.1.1 Actividades Administrativas 365
160.1.2 Actividades Técnicas 365
160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 365

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 365

162 ANEXO 366

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 366
162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 366
162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 366
162.4 BITÁCORA 366

163 INTRODUCCIÓN 369

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 370

164.1 LOCALIZACIÓN 370
164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 371
164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 371
164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 372

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 372

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 372
165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 373

165.2.1 Actividades Administrativas 373
165.2.2 Actividades Técnicas 373
165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 373
165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 374

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 374

166.1 INFORME SEMANAL 374
166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 374
166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 375
166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 375
166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 375
166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 375
166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 375
166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 375
166.9.3 Actas de Reunión 376

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 376

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 376
167.1.1 Actividades Administrativas 376
167.1.2 Actividades Técnicas 376
167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA 376

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 376

169 ANEXO 377

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 377
169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 377
169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 377
169.4 BITÁCORA 377

170 INTRODUCCIÓN 380

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 381

171.1 LOCALIZACIÓN 381
171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 383
171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 383
171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 383

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 383

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 383
172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 385
172.2.1 Actividades Administrativas 385
172.2.2 Actividades Técnicas 385

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 385
172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 385

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 386

173.1 INFORME SEMANAL 386
173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 386
173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 386
173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 387
173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 387
173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 387
173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 387
173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 387
173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 387
173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 387
173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 387
173.9.3 Actas de Reunión 387

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 388

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 388
174.1.1 Actividades Administrativas 388
174.1.2 Actividades Técnicas 388
174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 388

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 388

176 ANEXO 389

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 389
176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 389
176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 389
176.4 BITÁCORA 389

177 INTRODUCCIÓN 392

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 393

178.1 LOCALIZACIÓN 393
178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 394
178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 395
178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 395

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 395

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 395
179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 397
179.2.1 Actividades Administrativas 397
179.2.2 Actividades Técnicas 397
179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 397
179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 397

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 399

180.1 INFORME SEMANAL 399
180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 399
180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 399
180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 399
180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 399
180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 399
180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 399
180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 399
180.9.3 Actas de Reunión 400

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 400

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 400
181.1.1 Actividades Administrativas 400
181.1.2 Actividades Técnicas 400
181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 400

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 401

183 ANEXO 401

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 401
183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 401
183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 401
183.4 BITÁCORA 401

184 INTRODUCCIÓN 404

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 405

185.1 LOCALIZACIÓN 405
185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 406
185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 407
185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 407

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 407

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 407
186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 408
186.2.1 Actividades Administrativas 409
186.2.2 Actividades Técnicas 409
186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 409
186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 409

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 410

187.1 INFORME SEMANAL 410

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 410
187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 410
187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 411
187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 411
187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 411
187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 411
187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 411
187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 411
187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 411
187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 411
187.9.3 Actas de Reunión 411

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 412

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 412
188.1.1 Actividades Administrativas 412
188.1.2 Actividades Técnicas 412
188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 412

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 412

190 ANEXO 413

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 413
190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 413
190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 413
190.4 BITÁCORA 413

191 INTRODUCCIÓN 416

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 417

192.1 LOCALIZACIÓN 417
192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 419
192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR 419
192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 419

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO 419

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 419
193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 421
193.2.1 Actividades Administrativas 421
193.2.2 Actividades Técnicas 421
193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 421
193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 421

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO 422

194.1 INFORME SEMANAL 422
194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO 422

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO 422
194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 422
194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 422
194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 422
194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO 423
194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO 423
194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 423
194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 423
194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra. 423
194.9.3 Actas de Reunión 423

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 423

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 423
195.1.1 Actividades Administrativas 423
195.1.2 Actividades Técnicas 424
195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 424

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 424

197 ANEXO 426

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 426
197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA 426
197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES 426
197.4 BITÁCORA 426

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 55
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 55
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 68
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 68
ILUSTRACIÓN 5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 69
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 82
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 82
ILUSTRACIÓN 8 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL JAC PATIO BONITO 83
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 97
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 97
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 109
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 109
ILUSTRACIÓN 13 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 110
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 124
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 124
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 139
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 139
ILUSTRACIÓN 18 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL 140
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 153

ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 153
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 168
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 168
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS). 180
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 180
ILUSTRACIÓN 25. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 181
ILUSTRACIÓN 26 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 195
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 195
ILUSTRACIÓN 28. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 196
ILUSTRACIÓN 29 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 208
ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 208
ILUSTRACIÓN 31. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 209
ILUSTRACIÓN 32 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 222
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 222
ILUSTRACIÓN 34. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 223
ILUSTRACIÓN 35 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS). 236
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 236
ILUSTRACIÓN 37. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 237
ILUSTRACIÓN 38 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS). 251
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 251
ILUSTRACIÓN 40. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 252
ILUSTRACIÓN 41 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 267
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 267
ILUSTRACIÓN 43. ESTADO INICIAL DE LA VÍA..... 268
ILUSTRACIÓN 44 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS). 283
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 283
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 295
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 295
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). 308
ILUSTRACIÓN 49 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 308
ILUSTRACIÓN 50 ESTADO INICIAL DEL SECTOR..... 309
ILUSTRACIÓN 51 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS)..... 324
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 324
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 336
ILUSTRACIÓN 54 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 336
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS). 347
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 347
ILUSTRACIÓN 57 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS). 360
ILUSTRACIÓN 58 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 360
ILUSTRACIÓN 59 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS)..... 371
ILUSTRACIÓN 60 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 371
ILUSTRACIÓN 61 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 382
ILUSTRACIÓN 62 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 382
ILUSTRACIÓN 63 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 394
ILUSTRACIÓN 64 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 406
ILUSTRACIÓN 65 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS..... 406

ILUSTRACIÓN 66 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS). 418
ILUSTRACIÓN 67 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS 418

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR 9
TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47
TABLA 3 PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 49
TABLA 4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 58
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 60
TABLA 6 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 73
TABLA 7 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 85
TABLA 8 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 88
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 99
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 112
TABLA 11 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 114
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 126
TABLA 13 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 129
TABLA 14 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 141
TABLA 15 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 144
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 155
TABLA 17 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 158
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 170
TABLA 19 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ. 182
TABLA 20 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 185
TABLA 21 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 198
TABLA 22 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 199
TABLA 23 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 211
TABLA 24 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 213
TABLA 25 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 225
TABLA 26 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 227
TABLA 27 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA. 239
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 241
TABLA 29 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR. 254
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 256
TABLA 31 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 270
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 273
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA. 285
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 297
TABLA 35 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA. 311
TABLA 36 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO 313
TABLA 37 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA. 326
TABLA 38 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 338
TABLA 39 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA. 349
TABLA 40 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA. 362

TABLA 41 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA..... 373
TABLA 42 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 385
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO..... 396
TABLA 44 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO. 408
TABLA 45 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO..... 420

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO**
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 2.4	Registro Fotográfico
ANEXO 2.5	Informe financiero
ANEXO 3	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO**
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 3.4	Registro Fotográfico
ANEXO 3.5	Informe financiero
ANEXO 4	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL**
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO**
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Maquinaria y equipos

ANEXO 5.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 5.5	Informe financiero
ANEXO 5.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 5.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 5.8	Registro Fotográfico
ANEXO 5.9	Bitácora de obra
ANEXO 6	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA**
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 6.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 6.5	Informe financiero
ANEXO 6.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 6.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 6.8	Registro Fotográfico
ANEXO 6.9	Bitácora de obra
ANEXO 7	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ**
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 7.4	Registro Fotográfico
ANEXO 7.5	Informe financiero
ANEXO 8	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO**
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 8.4	Personal control Aportes y Seguridad Social

ANEXO 8.5	Informe financiero
ANEXO 8.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 8.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 8.9	Registro Fotográfico
ANEXO 8.9	Bitácora de obra
ANEXO 9	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO**
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10	**FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL**
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 10.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 10.5	Informe financiero
ANEXO 10.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 10.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 10.8	Registro Fotográfico
ANEXO 10.9	Bitácora de obra
ANEXO 11	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA**
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.4	Informe financiero
ANEXO 12	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA**
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 12.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 12.4	Informe financiero
ANEXO 13	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL**
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 13.4	Informe financiero
ANEXO 14	**FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES**
ANEXO 14.1	Informe Semanal
ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 14.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 14.4	Informe financiero
ANEXO 15	**FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA**
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 15.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 15.5	Informe financiero
ANEXO 15.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 15.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 15.8	Registro Fotográfico
ANEXO 15.9	Bitácora de obra
ANEXO 16	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL**
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Ensayos de laboratorio
ANEXO 16.4	Informe financiero

ANEXO 17	**FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO**
ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI**
ANEXO 18.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19	**FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA**
ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 19.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 19.5	Informe financiero
ANEXO 19.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 19.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 19.8	Registro Fotográfico
ANEXO 19.9	Bitácora de obra
ANEXO 20	**FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS**
ANEXO 20.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 21	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS**
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	**FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO**
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL**
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	**FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL**
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA**
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 26	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II**
ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 27	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA**
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	**FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA**
ANEXO 28.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29	**FORMATOS INTERVENTORÍA**
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe de los especialistas
ANEXO 29.6	Actas de reunión
ANEXO 29.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 29.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 29.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/05/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ

G A R A N T I A S

Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL
ANEXO 4 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$116.701.510,20	11/09/2024	30/11/2025
Buen manejo del anticipo	$196.136.992,00	11/09/2024	30/11/2025
Prestaciones sociales	$233.403.020,40	11/09/2024	30/05/2028
Calidad del servicio	$350.104.530,60	31/12/2024	30/04/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 29.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 29.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024. Los días 19 de marzo de 2025, la Interventoría remitió el oficio CINP-555-533-1197 con la hoja de vida del Residente, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-017188 de fecha 21 de marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficioCINP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, respectivamente, para revisión y aprobación.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ASTRID GAONA SOLER

CARGO	NOMBRE
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	VALENTINA PÉREZ ISAZA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Acta Parcial de Costos No. 8 correspondiente al periodo del informe se remite a la Supervisión de forma paralela con dicho informe y en este informe se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.7.

Hasta la fecha de corte de este informe después de haber transcurrido siete (7) meses del plazo contractual, EL INSTITUTO solo ha cancelado al Consorcio CCSO el valor correspondiente al Acta de Costos No. 2 del periodo noviembre de 2024, haciendo que la Interventoría termine financiando la ejecución del Contrato No. 3601 de 2024.

Al finalizar el mes de mayo de 2025, EL INSTITUTO solo ha cancelado $42 millones de los $900 millones que se llevan ejecutado, donde se puede ver claramente que el Consorcio se ha visto afectado en el flujo de caja y teniendo que pagar el impuesto IVA de cada factura presentada sin recibir el valor de dichas facturas.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjuntan las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica para el Contrato No. 3601 de 2024.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 29.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	53
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	54
1	**INTRODUCCION**		57
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		58
2.1	Localización		58
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		59
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		60
2.4	Características técnicas del proyecto		60
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		60
3.1	Información general del contrato		60
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		62
3.3	Seguimiento Items no previstos		62
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		62
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	484
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	495
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		64
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		65
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		65
7	**Conclusiones y recomendaciones**		66
8	**Anexos**		66
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2073-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 30/4/25
FECHA DE REINICIO:	1/05/2025
PLAZO DE PRÓRROGA N 01:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	107,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.837.169,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.837.169,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	150,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.164.517,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

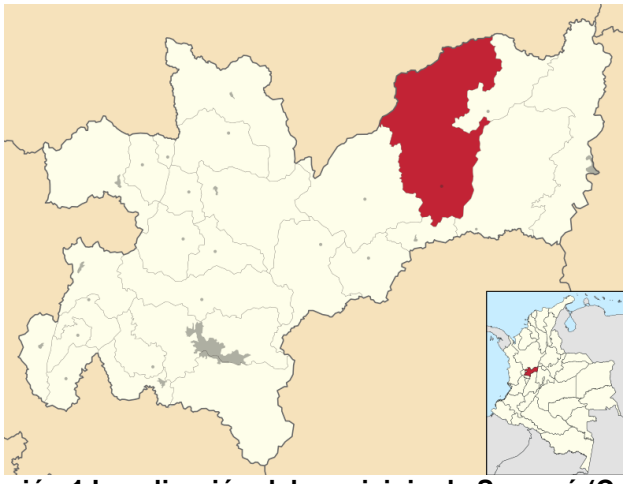


Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

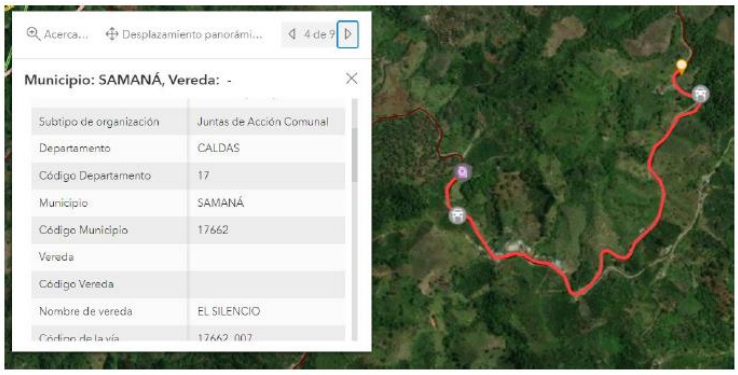


Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 3 Inventario y estado inicial

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

	EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPESIÓN No. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/2025
SUSPESIÓN No. 2	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/06/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 02/05/25, remitió las hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/05/25, remitió los contratos de los profesionales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió las cotizaciones y el primer plan de compras, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/05/25, los documentos solicitados en el comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el primer plan de compras para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

5.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario no ha dado inicio a la etapa de ejecución a lo que se le suma la solicitud de Suspensión No. 2, por lo que el proyecto no presenta avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,75	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,51	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4063,44	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024. Este personal a pesar de estar aprobado aún no se encuentra vinculado laboralmente dado que el Convenio se encuentra suspendido.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada

CARGO	PROFESIONAL
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales que se han dado del Convenio No. 2073 de 2024, esto a pesar de los requerimientos de la Interventoría.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

6.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

6.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–683-1776 de fecha 05/05/25, remitió la aprobación de hojas de vida remitidas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–721-1852 de fecha 06/05/25 solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–687-1796 de fecha 05/05/25, solicitó al INVIAS aclaración con el tema del CBR.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–810-2197 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–838-2235 de fecha 29/05/25, remitió a la JAC condiciones del tramo a intervenir.

7.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

A pesar de haberse superado la causal de la suspensión al haber terminado la ejecución física del Convenio Solidario No. 2227 de 2024, la ejecución del Convenio No. 2073 de 2024, presenta otro inconveniente, esta vez relacionado con el C.B.R. de la subrasante que es del 2,2%, el cual está por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO y a la fecha de corte de este informe no hemos recibido por parte de INVIAS, el tipo de mejoramiento que se le va aplicar a la subrasante que permita cumplir con el CBR mínimo requerido.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y enero a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL

INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que a pesar de haberse superado la causal de la suspensión No. 1, al haber terminado la ejecución física del Convenio Solidario No. 2227 de 2024, el INSTITUTO esperó los términos del plazo de la suspensión que venció el 30 de abril de 2025.
- Que el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 presenta otro inconveniente, esta vez relacionado con el C.B.R. de la subrasante que es del 2,2%, el cual está por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO y a la fecha de corte de este informe no hemos recibido por parte de INVIAS, el mejoramiento de la subrasante que permita cumplir con el CBR mínimo requerido, lo que impedirá el inicio de la ejecución del proyecto de placa huella previsto en dicho convenio.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio por parte de EL INSTITUTO.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	68
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	69
1	**INTRODUCCION**		71
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		72
2.1	Localización		72
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		73
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		73
2.4	Características técnicas del proyecto		74
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		75
3.1	Información general del contrato		75
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		77
3.3	Seguimiento Items no previstos		78
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		78
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		79
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	503
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	522
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	520
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	514
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		80
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		80
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	81
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		81
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		82
7	**Conclusiones y recomendaciones**		82
8	**Anexos**		82
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		522
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS | **PERIODO MES:** mayo-25

CONVENIO No.: 2172-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$	200.688.268,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$	-
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$	200.688.268,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	-

270,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO | **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.845.017,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		132.880.125,86
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.643.173,22	47.588.927,49
VALOR EJECUTADO	**5.643.173,22**	**180.469.053,35**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	200.688.268,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	180.469.053,35
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		89,93%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA



VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
FOTO 2 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de Suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que, de ser aceptada, las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025..

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

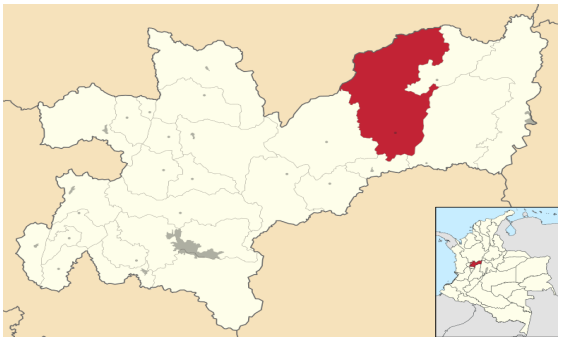


Ilustración 4 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

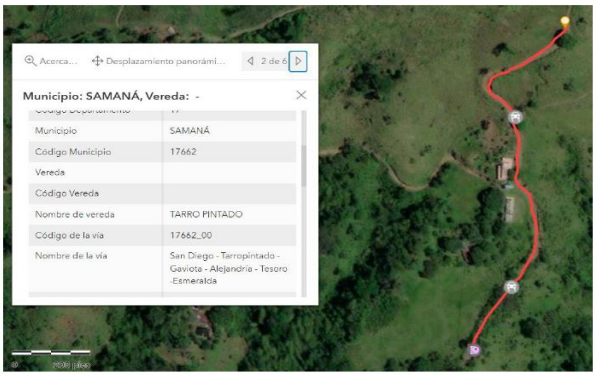


Ilustración 5 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 6 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros. De igual manera, se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, remitió el plan de compras, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 08/05/25, remitió formatos financieros, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió solicitud de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió solicitud reintegro de los rendimientos financieros del mes de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió solicitud de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

12.2.2 Actividades Técnicas

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.688.268,00
Ejecutado	100%	89,93%	180.469.053,34
Avance / Retraso	**0%**	**-10,07%**	**-20.219.214,66**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	120,87	110,16
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	93,84	85,53
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	23,35

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4326,09	3.942,77

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López

Tabla 6 Personal Convenio Solidario

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.947.919 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 4.587.660 de fecha 07/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 8.109.428 de fecha 07/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 15.007.160 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.204.580 de fecha 09/03/2025.
6. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 34.000 de fecha 09/03/2025.
7. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 5.262.919 de fecha 13/03/2025
8. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 22.974.515,00 de fecha 19/03/2025
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 16.679.081,00 de fecha 26/03/2025
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 23.491.818,35 de fecha 10/04/2025
11. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 13.430.506,00 de fecha 14/05/2025

11. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 1.247.999,43 de fecha 27/05/2025

Desembolso Total por valor de $177.986.023,61 correspondiente al 89% del valor del convenio. Ver Anexo 2.5

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 2.3

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo continuó sin presentar la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2172 de 2024.

Al finalizar el periodo de este informe la OAC se encontraba en el trámite para pagar el costo de la modificación de las pólizas, para así recibir de la aseguradora la respectiva actualización de las pólizas.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1		**Placa Huella San Diego**	**60 días**	**lun 13/01/25**	**lun 7/04/25**	**100%**	**100%**
2		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
4		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%
6		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 200.688.268,00; la Inversión Ejecutada fue de $180.469.053,34. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $20.219.214,66

13.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

13.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–746-1986 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–780-2119 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–811-2198 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

14.1.2 Actividades Técnicas

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Tarropintado San Diego, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría,

donde se presentó el balance final por las partes JAC e Interventoría, para definir si se tenían inconsistencias en el cierre contable final y las cantidades de Obra ejecutadas e insumos utilizados a lo largo del todo el proyecto. El cierre se dio a satisfacción.

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. Se recibió el reporte comprobante de operación del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de diciembre 2024 y Marzo 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de giro de rendimientos correspondiente a los meses pendientes de 2025.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 89.93% hasta el corte del presente periodo, teniendo en cuenta que se realizaron 144ml de placa huella con la estructura completa, con los recursos disponibles para la obra física. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	83
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	84
1	**INTRODUCCION**		87
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		88
2.1	Localización		88
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		89
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		89
2.4	Características técnicas del proyecto		90
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		90
3.1	Información general del contrato		90
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		92
3.3	Seguimiento Items no previstos		93
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		93
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		94
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	530
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	551
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	547
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	541
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		96
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		96
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	96
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		96
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		98
7	**Conclusiones y recomendaciones**		98
8	**Anexos**		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		535
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2435-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA PATIO BONITO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.482.844,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.482.844,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	130,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.249.308,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.982.844,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		154.249.308,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.922.146,85	43.742.203,42
VALOR EJECUTADO	**8.922.146,85**	**197.991.511,42**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 203.482.844,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.991.511,42
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA



FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202542871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

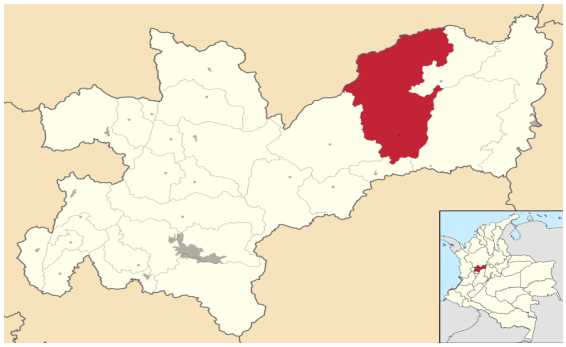


Ilustración 7 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

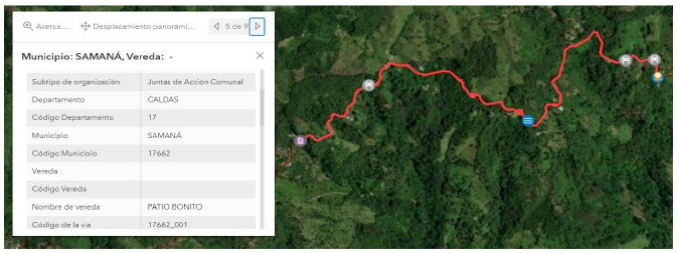


Ilustración 8 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 9 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			

Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 02/05/25, remitió documentos de la propuesta de inversión social, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió la nómina electrónica del mes de Abril de 2025.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 06/05/25, remitió el auxiliar financiero del mes de abril, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 09/05/25 y 14/5/25, remitió planes de compra, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 12/5/25, remitió desembolsos, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/5/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 14/5/25, remitió contratos de prestación de servicios actualizados.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

19.2.2 Actividades Técnicas

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4,60 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118, 58 m3.

- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.482.844,00
Ejecutado	100%	97,3%	197.991.511,42
Avance / Retraso	**0%**	**-2,7%**	- 5.491.332,58

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,86	4,6
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	99,45	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	77,4	92,28
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	24,47	29,18

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.546,03	4.227,96
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García

Tabla 8 Personal Convenio Solidario

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 45.709.003 de fecha 20/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.219.378 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 2.313.650 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 23.212.472 de fecha 09/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 5.157.000,00 de fecha 19/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 34.850.708,00 de fecha 25/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.079.661,00 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 419.368,00 de fecha 25/03/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.566.760,21 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.896.760,00 de fecha 24/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 18.100.594,73 de fecha 25/04/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.533.916,00 de fecha 27/05/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 532.533,00 de fecha 27/05/2025.

Ver Anexo 3.5

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 3.3

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo continuó sin presentar la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2435 de 2024.

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1	✓	**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**lun 17/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**sáb 22/02/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**sáb 22/02/25**	**vie 18/04/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	sáb 22/02/25	sáb 8/03/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	vie 28/02/25	lun 17/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	jue 6/03/25	mié 9/04/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	100%	100%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada acumulada fue de $ 203.482.844,00; la Inversión Ejecutada fue de $ 197.991.511,42. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que ejecutada por valor de $ 5.491.332,58.

20.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

20.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–680-1766 de fecha 02/05/25, solicitó a la JAC documentación para la etapa de liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–682-1775 de fecha 05/05/25, remitió a la JAC formato de inversión social para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–693-1815 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–709-1839 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–690-1812 de fecha 05/05/25, remitió al INVIAS el plan de Inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–743-1983 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–767-2058 de fecha 20/05/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social PT2 para su aprobación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–781-2120 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–812-2199 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

21.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final por las partes JAC e Interventoría, para definir si se tenían inconsistencias en el cierre contable final y las cantidades de Obra ejecutadas e insumos utilizados a lo largo del todo el proyecto. El cierre se dio a satisfacción.

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, solo hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional del mes de Marzo 2025.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97,3% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.991.511,42 correspondiente al 97,3% del valor del convenio.
- Que desde el 06 de mayo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 3.4.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	100
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	101
1	**INTRODUCCION**		104
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		105
2.1	Localización		105
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		106
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		106
2.4	Características técnicas del proyecto		107
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		107
3.1	Información general del contrato		107
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Items no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		109
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		110
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	557
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	568
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		111
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		111
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		111
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		112
7	**Conclusiones y recomendaciones**		112
8	**Anexos**		123
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo 25

CONVENIO No.: 2159-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL CIRPIAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	20/12/2024
PLAZO SUSPENCIÓN 01:	2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	19/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	30/04/2025
FECHA AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	30/05/2025
FECHA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:	27/05/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:	21/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	111,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.898.462,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.898.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	135,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.711.788,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.581.354,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.105.320,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**200.398.462,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024-ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL,** MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 3 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

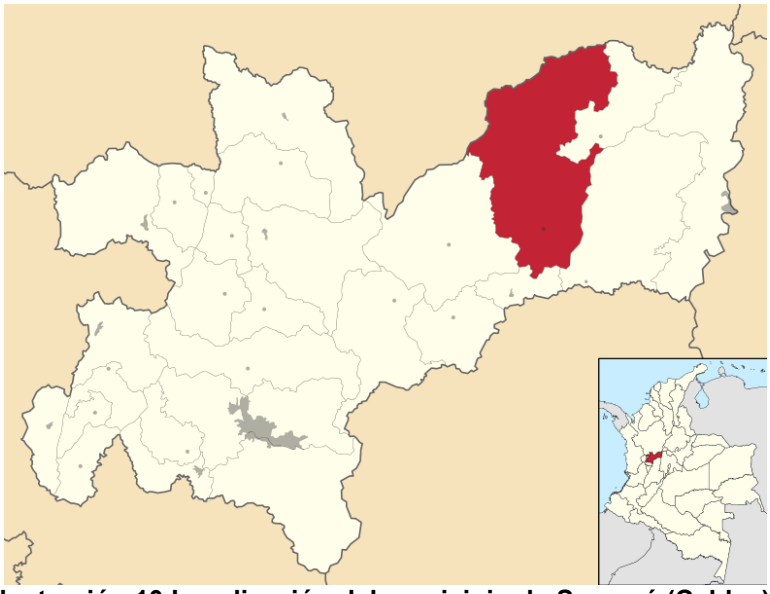


Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.898.462,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/5/25

AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/06/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 9 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de ampliación 3 a la suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 4.1.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la última novedad contractual del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–715-1846 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–827-2215 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- La Interventoría realizará la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría realizará la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	114
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	115
1	**INTRODUCCION**		118
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		119
2.1	Localización		119
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		120
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		120
2.4	Características técnicas del proyecto		121
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		121
3.1	Información general del contrato		121
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		123
3.3	Seguimiento Items no previstos		124
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		124
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		125
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	575
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	589
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	591
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	593
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	597
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	599
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	586
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		127
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		127
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	127
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		127
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		129
7	**Conclusiones y recomendaciones**		129
8	**Anexos**		130
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		601
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		603

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2124-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL DORADO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2025
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	273,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.674.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.674.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.174.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	59.755.110	138.067.478,90
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.930.966,00	40.158.124,00
VALOR EJECUTADO	**77.686.076,37**	**178.225.602,90**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.674.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 178.225.602,90
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	88,81%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA



FOTO 2 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

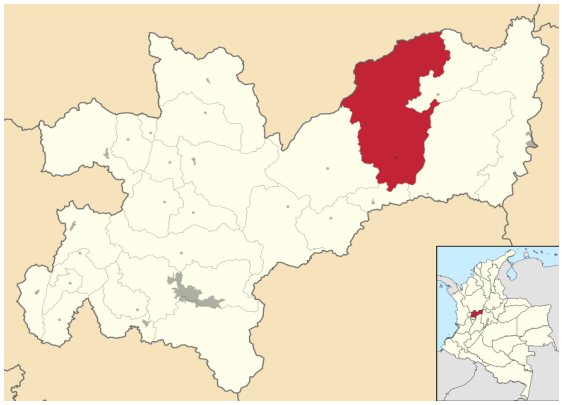


Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 14 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.067.401,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.033.701,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.134.802,00	30/04/2030	30/04/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 10 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió el informe de resultados basado en el nuevo CBR tramo 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 08/05/25, remitió documentos de seguimiento para aprobación de desembolsos.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 09/05/25, remitió solicitud devolución de recursos, para la firma de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió solicitud de reintegro de rendimientos del mes de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/05/25, remitió plan de compras, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió solicitud de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió plan de compras de liquidaciones, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

33.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 16 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.674.007,00
Ejecutado	100%	88,81%	178.225.602,90
Avance / Retraso	**0%**	**11.19%**	**22.448.404,10**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	113,76
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,7	81,56
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	27,62
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3.756,53

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 5.3.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 11 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 5.4.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $55.537.787 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.587.660 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $3.221.014 de fecha 14/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $13.815.559 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.595.532 de fecha 06/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $60.000 de fecha 10/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $3.636.675 de fecha 13/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 10.304.766,00 de fecha 19/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 21.103.169,41 de fecha 04/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 47.001.876,72 de fecha 14/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 22.662.110,71 de fecha 02/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 9.534.555 de fecha 30/05/2025.

Ver Anexo 5.5

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 5.6.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 5.7.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2124 de 2024.

De la Prórroga No. 2, el OAC no ha presentado las respectivas pólizas que evidencie que dicha prórroga está debidamente legalizada, esto a pesar del requerimiento que en su momento realizó la Interventoría.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	D. Calenda	Comienzo	Fin	% prog	% completado
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			**91**	**lun 13/01/25**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4,41	M3	32	lun 13/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	115,52	M3	22	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	91,70	M3	64	vie 7/02/25	sáb 12/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	28,05	M3	53	jue 20/02/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4.223,65	KG	65	lun 3/02/25	mié 9/04/25	100%	100%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $200.674.007,00; la Inversión Ejecutada fue de $178.225.602,90. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $22.448.404,10

34.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

34.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–710-1840 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–745-1985 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–771-2070 de fecha 20/05/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–784-2123 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–813-2200 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

35.1.2 Actividades Técnicas

El día 20 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

El día 23 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

Desde el 1 al 16 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de Julio a Diciembre 2024 y Febrero a Marzo 2025, y se encuentra a la espera del giro del mes de enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 88,81% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $178.225.602,90 correspondiente al 88,81% del valor del convenio.

- Que desde el 07 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 5.8.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 5.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	131
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	132
1	**INTRODUCCION**		135
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		136
2.1	Localización		136
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		137
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		137
2.4	Características técnicas del proyecto		138
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		138
3.1	Información general del contrato		138
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		140
3.3	Seguimiento Items no previstos		141
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		141
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		142
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	620
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	634
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	636
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	638
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	642
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	644
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	631
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		143
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		143
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	144
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		144
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		146
7	**Conclusiones y recomendaciones**		146
8	**Anexos**		147
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		646
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		648

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2058-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	273,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.533.857,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.533.857,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	155,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	18.648.795	151.871.177,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		42.444.423,32
VALOR EJECUTADO	**18.648.795,45**	**194.315.600,32**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.533.857,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.315.600,32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,42%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.



Ilustración 15 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

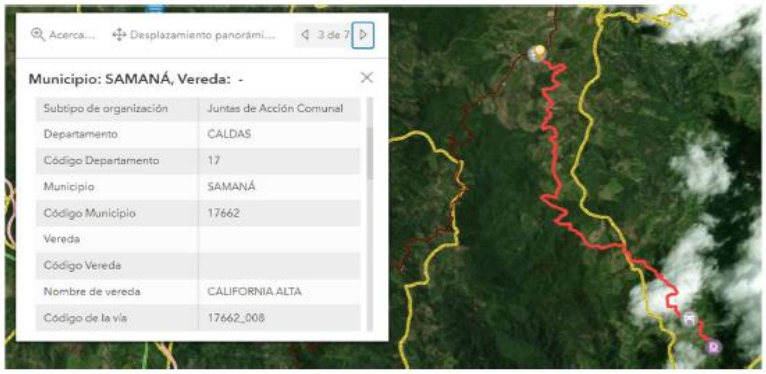


Ilustración 16 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada

La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.533.857,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES

	28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.153.386,00	30/08/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.076.693,00	30/08/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.306.772,00	30/4/2025	30/04/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	26/06/2024	30/04/2025

Tabla 12 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 02/05/25 y 05/05/25, remitió plan de compras y corrección, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, remitió documentación de la propuesta de inversión social, para revisión de la Interventoría.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, solicitud de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 09/05/25 y 12/5/25, remitió plan de compra y corrección, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/05/25, remitió solicitud desembolso, para la revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió solicitud de reintegro de rendimientos del mes de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió plan de compras, para la revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/05/25, remitió comprobante de pago de pólizas respecto a la novedad contractual.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió documentación relacionada al comité operativo, para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

40.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 17 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.533.857,00
Ejecutado	100%	96,42%	194.315.600,32
Avance / Retraso	**0%**	**3,58%**	**7.218.256,68**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	118,58	106,72
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	92,01	88,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	25,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.243,89	3.819,5

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 6.3.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 13 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 6.4.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 58.936.944 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 03 probado por valor de $ 4.587.660 de fecha 14/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 8.553.302 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 27.000 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.647.805 de fecha 13/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 24.531.906 de fecha 20/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $1.489.715 de fecha 28/03/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $182.000 de fecha 09/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 42.507.598,07 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 16.167.261,73 de fecha 29/04/2025.
12. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 9.933.473,17 de fecha 22//05/2025.
13. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 5.411.484,67 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 179.251.149,91 correspondiente al 89% del valor del convenio. Ver Anexo 6.5.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 6.6.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 6.7

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo se encuentran pendientes las pólizas correspondiente a la Prórroga No. 2, además del respectivo paz y salvo y resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO de las Prórrogas No. 1 y 2 del Convenio No. 2058 de 2024.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL	**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $201.533.857,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.315.600,32. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 7.218.256,68.

41.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

41.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–698-1827 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–731-1919 de fecha 12/05/25, remitió el formato de inversión social para revisión y firma de la JAC.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–741-1981 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–776-2101 de fecha 21/05/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–786-2125 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–799-2185 de fecha 27/05/25, solicitó a la JAC los documentos para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–814-2201 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–835-2232 de fecha 29/05/25, remitió a la JAC condiciones del recibo de la obra.

42.1.2 Actividades Técnicas

El día 5 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la aprobación del plan de compras para el pago de nómina, compra de materiales de ferretería y formaleta. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde Se aprueba el plan de compras por parte de los participantes del comité para pagos de nómina, alquiler de equipos, honorarios y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

Desde el 1 al 17 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio de 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte giro de los rendimientos del periodo 2024 hasta Marzo 2025 al Tesoro Nacional, se encuentra a la espera del giro del mes de Abril 2025.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 17 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,42% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.315.600,32 correspondiente al 96,42% del valor del convenio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 6.8.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 6.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	148
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	149
1	**INTRODUCCION**		152
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		153
2.1	Localización		153
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		154
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		154
2.4	Características técnicas del proyecto		155
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		155
3.1	Información general del contrato		155
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		157
3.3	Seguimiento Items no previstos		157
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		158
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		158
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	662
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	684
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	680
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	673
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		157
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		157
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	158
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		161
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		162
7	**Conclusiones y recomendaciones**		162
8	**Anexos**		162
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		682
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2119-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLÍ

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	09/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	273.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 203.002.573,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 203.002.573,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	156,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		153.194.886,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.476.483,00	41.135.665,94
VALOR EJECUTADO	**7.476.483,00**	**194.330.551,94**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 203.002.573,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.330.551,94
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/04/25



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA 15/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor; Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.

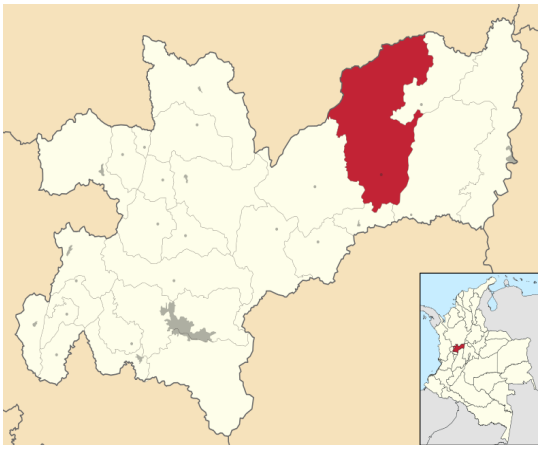


Ilustración 17 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 18 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.



Ilustración 19 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 203.002.573,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 14 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 06/05/25, remitió la solicitud de traslado de los rendimientos de marzo y abril.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–740-1980 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió documentación de cierre socioambiental solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió documentación SST solicitada.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

47.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.002.573,00
Ejecutado	100%	95,73%	194.330.551,94
Avance / Retraso	**0%**	**4,27%**	**-8.672.021,06**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	5,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,34	136,94
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	95,32	109,37
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	33,55
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.375,92	5.021,09

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, no se relaciona porque la Obra terminó el 15 de abril de 2025.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Mario Cárdenas
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 15 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 7.4.

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $49.763.368 de fecha 07/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $10.065.922 de fecha 21/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $44.758.547 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $48.045.188 de fecha 13/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $3.119.882 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $2.246.646 de fecha 15/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $198.425 de fecha 19/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $10.860.988 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 17.875.733,66 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.900.599,00 de fecha 25/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 866.600,00 de fecha 06/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 195.859.275,42 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 7.5

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 7.6

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza, se encuentra pendiente el respectivo paz y salvo y la resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO de la póliza de Cumplimiento correspondiente la Prórroga No. 1, y la póliza y demás soportes correspondiente la Prórroga No. 2.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1	✓	**CONVENIO 2119 - 2024**	**53 días**	**mar 21/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓	**ETAPA REVISION**	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓	Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4	✓	**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**48 días**	**dom 26/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	dom 26/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	sáb 1/02/25	mar 18/02/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 7/02/25	jue 13/03/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mié 12/02/25	jue 13/03/25	100%	100%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $203.002.573,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.330.551,94. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $ 8.672.021,06

48.9.3 Actas de Comités

No aplica para el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–700-1829 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–789-2128 de fecha 22/05/25, remitió a la JAC formatos ambientales para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–815-2202 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

49.1.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.

- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de febrero 2025.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 15/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 95.73% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $194.330.551,94

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 7.8.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 7.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	164
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	165
1	**INTRODUCCION**		168
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		169
2.1	Localización		169
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		170
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		170
2.4	Características técnicas del proyecto		171
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		171
3.1	Información general del contrato		171
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		173
3.3	Seguimiento Items no previstos		174
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		174
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		174
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	688
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	705
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	707
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	709
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	714
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	716
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	699
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		176
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		176
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		177
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		178
7	**Conclusiones y recomendaciones**		179
8	**Anexos**		180
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		718
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		720

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2173-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.229.002,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	149,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	27.947.060	146.229.774,46
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.581.628,90	48.600.197,80
VALOR EJECUTADO	**41.528.689,04**	**194.829.972,26**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.229.002,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.829.972,26
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,82%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de $201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

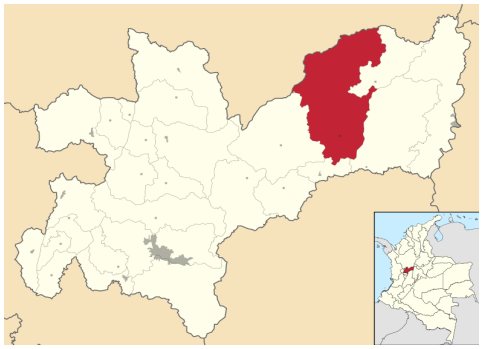


Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

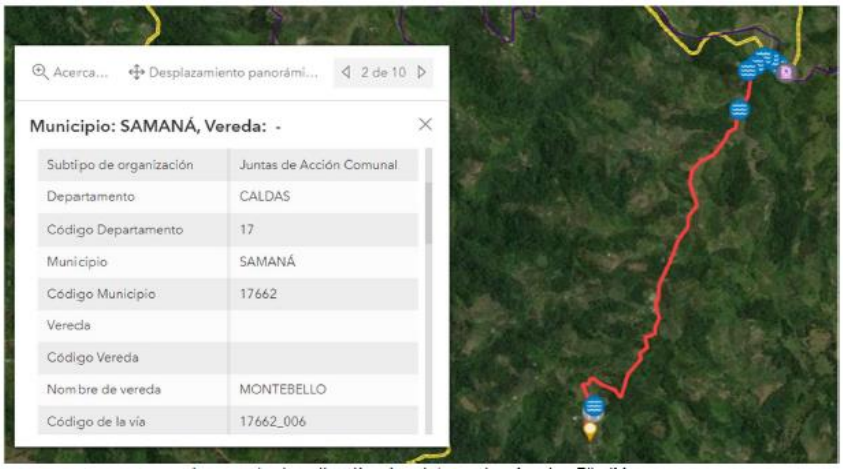


Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.122.901,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.061.451,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.245.801,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 16 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió plan de compras 9.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, solicitud de desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 09/05/25, remitió la nómina electrónica.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/05/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos financieros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió la retención en la fuente de abril.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/05/25, remitió el desembolso no. 8 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió documentos de pagos faltantes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/05/25, remitió plan de compras 10, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el desembolso no. 8 para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

54.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 21 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.229.002,00
Ejecutado	100%	96,82%	194.829.972,26
Avance / Retraso	**0%**	**- 3,18%**	**- 6.399.029,74**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,23
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	113,99	109,25
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	90,04	82,72
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,88
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4125,38	3.789,81

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 8.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 8.3.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 17 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 8.4.

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 47.162.934 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 13.620.194 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 14.638.851 de fecha 07/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.258.536 de fecha 18/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 23.059.752 de fecha 25/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 40.090.690,63 de fecha 25/03/2025.
7. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 237.849,49 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 513.766,89 de fecha 25/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 21.546.278,88 de fecha 02/05/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 375.100,00 de fecha 22/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 91.111,76 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 167.603.465,25 correspondiente al 84% del valor del convenio. Ver Anexo 8.5

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 8.6.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 8.7

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo se encuentran pendientes las pólizas correspondiente a la Prórroga No. 2, además de los respectivos paz y salvo y la resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 y 2 del Convenio No. 2173 de 2024.

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO		**65 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL		**0 días**	**vie 11/04/25**	**vie 11/04/25**	0%	100%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $201.229.002,00, la Inversión Ejecutada fue de $194.829.972,26. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $6.399.029,74.

55.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

55.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–711-1841 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–742-1982 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–787-2126 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–798-2184 de fecha 27/05/25, solicitó a la JAC los documentos para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–816-2203 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

56.1.2 Actividades Técnicas

El día 07de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina, alquiler de equipos y compra de materiales de ferretería. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

Desde el 1 al 21 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de

los recursos de este convenio, sin embargo, no se recibieron los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, ya la Interventoría había solicitado a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual, sin que esta Interventoría tenga conocimiento de acciones que haya emprendido la Entidad.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 21 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,82% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.829.972,26 correspondiente al 96,82% del valor del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.

- Que desde el 24 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 8.8.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 8.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	181
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	182
1	**INTRODUCCION**		185
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		186
2.1	Localización		186
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		187
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		187
2.4	Características técnicas del proyecto		188
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		188
3.1	Información general del contrato		188
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		189
3.3	Seguimiento Items no previstos		190
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		191
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		191
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	733
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	744
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		192
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		193
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		193
7	**Conclusiones y recomendaciones**		193
8	**Anexos**		194
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2524-2024

OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/3/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 18/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/5/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 27/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 198,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 202.753.245,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 202.753.245,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ JUANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	127,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.543.699,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.103.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.253.245,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarro Pintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

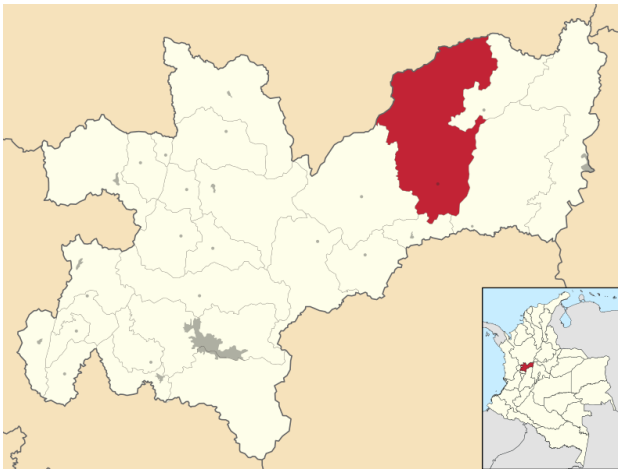


Ilustración 22 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

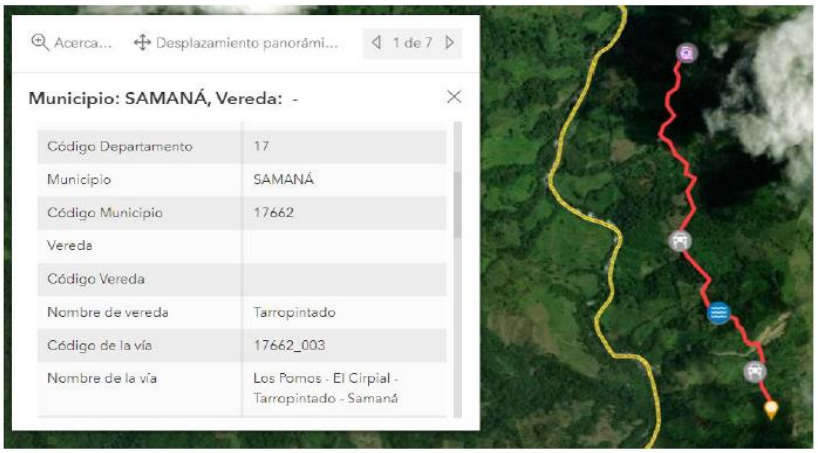


Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO
NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2524-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/04/2025
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/05/2025

REANUDACIÓN	19/5/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 18 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/05/25, remitió solicitud de reinicio del convenio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió hojas de vida del personal profesional, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió hojas de vida del personal, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

61.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,8	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,9	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3463,8	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,40	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.4 NFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2524 de 2024.

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

62.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

62.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–716-1847 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–758-2027 de fecha 15/05/25, remitió respuesta a la solicitud de reinicio del convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–768-2067 de fecha 20/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–772-2097 de fecha 21/05/25, remitió aprobación a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–817-2204 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

63.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes de solicitud del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	195
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	196
1	**INTRODUCCION**		199
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		200
2.1	Localización		200
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		201
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		201
2.4	Características técnicas del proyecto		202
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		202
3.1	Información general del contrato		202
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		204
3.3	Seguimiento Items no previstos		205
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		205
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		206
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	751
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	768
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	770
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	772
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	778
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	780
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	762
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		207
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		208
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		208
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		210
7	**Conclusiones y recomendaciones**		211
8	**Anexos**		211
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		782
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		784

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2175-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	270,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.355.760,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.355.760,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	146,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.698.936,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.855.760,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	110.688.346	160.773.936,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.969.746,00	33.721.331,00
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**194.495.267,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.355.760,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.495.267,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,59%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 13/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

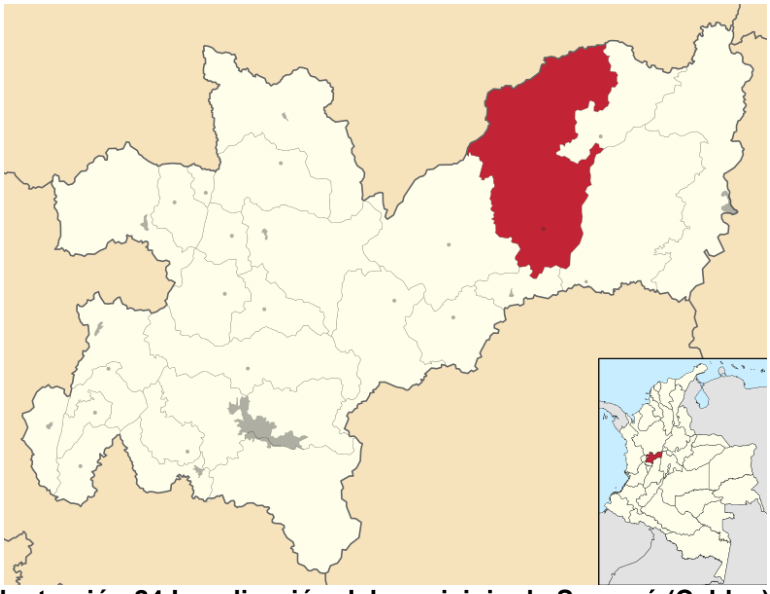


Ilustración 24 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

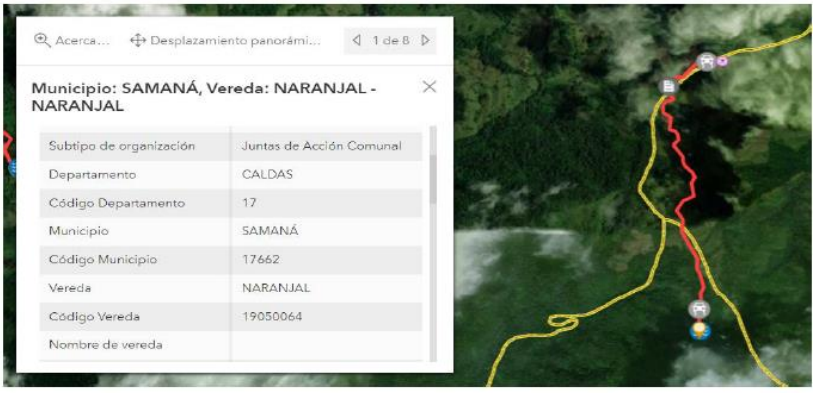


Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia

es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 26. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL

	DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.135.576,00	02/09/2026	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.067.788,00	02/09/2026	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.271.152,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 19 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 2/05/25, 05/05/25 y 07/05/25, remitió el plan de compras y sus correcciones, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió el paz y salvo social.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, solicitó el comprobante para el pago de la póliza correspondiente a la prórroga no. 2.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 12/05/25 y 15/5/25, remitió plan de compras y correcciones, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió el acta de descole.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió solicitud de reintegro de rendimientos financieros de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/05/25, remitió auxiliar detallado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió desembolso de liquidaciones de trabajadores, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/05/25, remitió el acta de descole.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 19/05/25, remitió plan de compras, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió subsanación del pago de maestro de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/05/25, solicitó comité extraordinario.

68.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.355.760,00
Ejecutado	100%	96,6%	194.495.267,00
Avance / Retraso	**0%**	**- 3.4%**	**- 6.860.493,00**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	86,63	81,05
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,26
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3713,57

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 10.1.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 10.3.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francy Elena Aristizábal González
Contador	Sandra Milena Ramírez Diaz
Maestro de Obra	Diego Márquez

Tabla 20 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 10.4.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 49.011.104 de fecha 10/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 4.608.800 de fecha 25/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 13.160.254 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 6.353.724 de fecha 10/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 14.360.988,00 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 17.669.304,25 de fecha 28/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 3.814.199,90 de fecha 31/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 23.658.441,47 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 27.406.000,26 de fecha 02/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.900.403,36 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 8.353.704,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 186.110.842,71 correspondiente al 93% del valor del convenio. Ver Anexo 10.5

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 10.6.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 10.7

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2175 de 2024.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**57 días**	**lun 13/01/25**	**vie 11/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin clasificar	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	mié 5/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21MPA (Clase D) - Mezcla in situ para placa huella	35 días	jue 13/02/25	mié 9/04/25	100%	100%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPA (F) 60% concreto - 40% piedra para placa huella	30 días	lun 24/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 6/02/25	mar 25/03/25	100%	100%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $201.355.760,00; la Inversión Ejecutada fue de $194.495.267,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $6.860.493,00.

69.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

69.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–722-1857 de fecha 07/05/25, solicitó a la JAC documentación para la etapa de liquidación.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–712-1842 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–736-1973 de fecha 13/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–744-1984 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–783-2122 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.

70.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final de las partes JAC e Interventoría. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Revisar por parte de la JAC algunas inconsistencias contables.

El día 12 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se verificó el cumplimiento de los compromisos del comité 14. Se llegó a la conciliación final.

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 16 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 19 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 17 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se

revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 28 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 18 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná e Interventoría, donde se informó a la JAC, el estado de las ordenes de desembolsos y los pagos pendientes debidos a temas de falta de subsanación a observaciones de la Interventoría.

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría se encuentra a la espera del el soporte del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de marzo 2025.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,6% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada:147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 194.495.267,00 correspondiente al 96,6 % del valor del convenio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 10.8.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 10.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	212
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	213
1	**INTRODUCCION**		216
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		217
2.1	Localización		217
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		218
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		218
2.4	Características técnicas del proyecto		219
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		219
3.1	Información general del contrato		219
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		221
3.3	Seguimiento Items no previstos		221
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		221
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		222
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	793
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	814
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	812
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	805
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		223
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		224
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		224
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		225
7	**Conclusiones y recomendaciones**		225
8	**Anexos**		226
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2227-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDALA LINDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 202.682.607,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.682.607,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	146,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.207.048,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.182.607,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	81.942.717,16	165.392.573,94
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.501.264,71	31.223.822,71
VALOR EJECUTADO	**91.443.981,87**	**196.616.396,65**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 202.682.607,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.616.396,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 27 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

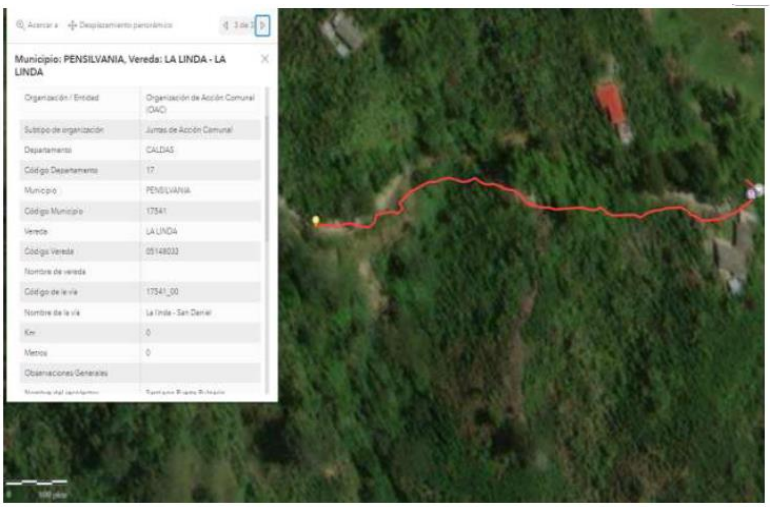


Ilustración 28 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000

en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciara que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 29. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.682.607,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN NO. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Tabla 21 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 02/05/25, remitió el balance de obra
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 16/05/25, remitió desembolso y corrección para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	202.682.607,00
Ejecutado	100%	97,01%	196.616.396,65

Avance / Retraso	**0%**	**-2,99%**	**- 6.066.210,35**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	80,29	80,29
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3.969,12

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt

Tabla 22 Personal Convenio Solidario

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 28.185.246 de fecha 10/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 30.413.058 de fecha 22/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 12.533.588 de fecha 04/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 9.677.355 de fecha 11/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 144.600 de fecha 17/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 42.707.477 de fecha 26/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 8.670.450 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 1.099.373,18 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 12.923.150,00 de fecha 08/04/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 6.800.806,00 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 39.045.088,99 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 4.555.500,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 196.755.691,57 correspondiente al 97% del valor del convenio. Ver Anexo 11.4

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 11.3

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2227 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA			ACTIVIDADES ACUMULADAS				
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA			LONG. EJEC	CANT. PROG.	CANT. EJEC.	% PROG.	% EJEC.
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	146,00	4,31	4,31	100%	100%
2	320.3	Subbase Granular Clase C	146,00	111,69	111,69	100%	100%
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	146,00	80,29	80,29	100%	100%
4	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	146,00	27,45	27,45	100%	100%
5	640.10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	146,00	3.969,12	3.969,12	100%	100%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

76.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–703-1832 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–59-2028 de fecha 15/05/25, solicitó a la JAC el desembolso de la OPC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–737-1977 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–777-2116 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–804-2190 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

77.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de soportes plan de compras OPC.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios del periodo de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 28/03/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97,01% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 80,29 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 27,45 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 3.969,12.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 196.616.396,65 correspondiente al 97,01% del valor del convenio.
- A pesar de haberse obtenido la No Objeción de la OPC por parte del Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el OAC se demoró en presentar los documentos en

debida forma y con la completitud necesaria que permitiera a esta Interventoría aprobar el desembolso apara ejecutar la OPC.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	227
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	228
1	**INTRODUCCION**		231
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		232
2.1	Localización		232
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		233
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		233
2.4	Características técnicas del proyecto		234
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		234
3.1	Información general del contrato		234
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		236
3.3	Seguimiento Items no previstos		237
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		237
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		237
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	819
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	839
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	837
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	830
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		239
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		239
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		240
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		241
7	**Conclusiones y recomendaciones**		241
8	**Anexos**		242
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO **228**
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2140-2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA RITA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 201.393.774,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 201.393.774,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.727.480,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.893.774,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	408.277,52	157.747.697,13
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.223.523,00	40.076.019,00
VALOR EJECUTADO	**2.631.800,52**	**197.823.716,13**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.393.774,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.823.716,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,23%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 -OBRA FINALIZADA - 23/04/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 23/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de $201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.



Ilustración 30 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

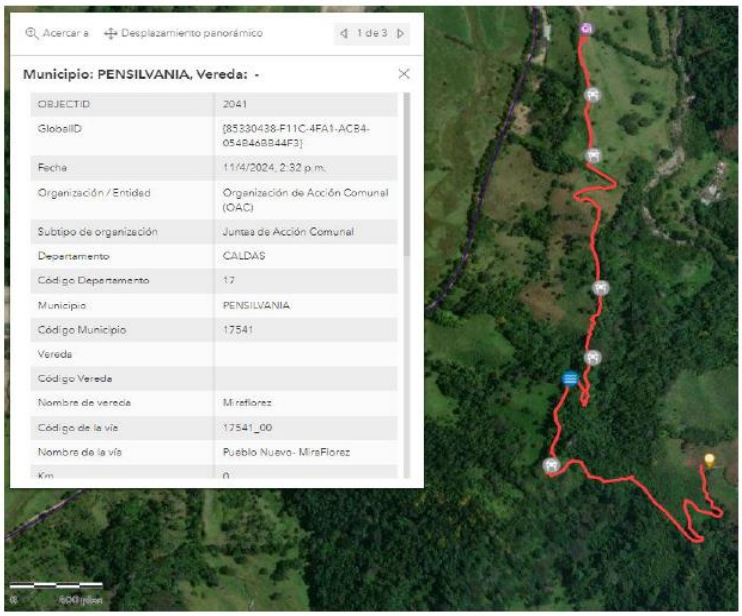


Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 32. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0

TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.393.774,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.139.378,00	02/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.069.689,00	02/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.278.755,00	31/12/2024	30/04/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 23 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió respuesta de corpocaldas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el primer plan de compras final para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

82.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.393.774,00
Ejecutado	100%	98,23%	197.823.716,13
Avance / Retraso	**0%**	**- 1,77%**	**- 3.570.057,87**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	4,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	103,28	111,7
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	79,34	81,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	25,06	27,1
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.652,46	3766,09

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt

Tabla 24 Personal Convenio Solidario

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 50.347.996 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 11.041.270 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 8.496.904 de fecha 13/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 47.615.438 de fecha 28/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 12.475.326 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 11.617.026,00 de fecha 02/04/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.946.782,00 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 2.314.200,00 de fecha 06/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 160.854.941,83 correspondiente al 79% del valor del convenio. Ver Anexo 12.4

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 12.3.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2140 de 2024 y su aprobación en SECOP.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1	✓		**CONVENIO 2140 - 2024**	**59 días**	**mar 14/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
2	✓		**ETAPA REVISION**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**lun 20/01/25**	**100%**	**100%**
3	✓		Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4	✓		**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA**	**53 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 22/03/25**	**100%**	**100%**
5	✓		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
6	✓		Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	100%	100%
7	✓		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
9	✓		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	100%	100%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 201.393.774,00; la Inversión Ejecutada fue de 197.823.716,13. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 3.570.057,87.

83.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

83.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–676-1762 de fecha 02/05/25, remitió a la JAC respuesta a la situación de la cota en la que se encuentra la batea.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–704-1833 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–749-1989 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–790-2129 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación ambiental pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–805-2192 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

84.1.2 Actividades Técnicas

El día 22 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final de las partes JAC e Interventoría. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Revisar por parte de la JAC algunas inconsistencias contables.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 9 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se verificó el cumplimiento de los compromisos del comité 8. Se llegó a la conciliación final.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.

- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibimos los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,23% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 197.823.716,13 correspondiente al 98,23% del valor del convenio.

- Que desde el 28 de marzo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

85.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	243
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	244
1	**INTRODUCCION**		247
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		248
2.1	Localización		248
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		249
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		249
2.4	Características técnicas del proyecto		250
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		250
3.1	Información general del contrato		250
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		252
3.3	Seguimiento Items no previstos		252
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		253
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		253
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	843
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	859
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	857
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	854
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		255
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		255
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		256
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		257
7	**Conclusiones y recomendaciones**		257
8	**Anexos**		258
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	269,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.500.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1.500.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	126,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.143.902,85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.155.580,85**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	3.922.651	154.153.769,62
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.613.138,21	34.924.931,09
VALOR EJECUTADO	**7.535.789,36**	**189.078.700,71**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.655.581,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 189.078.700,71
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	94,23%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL VERDAL
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025



VEREDA EL VERDAL
FOTO 2 -OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

86 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.



Ilustración 33 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

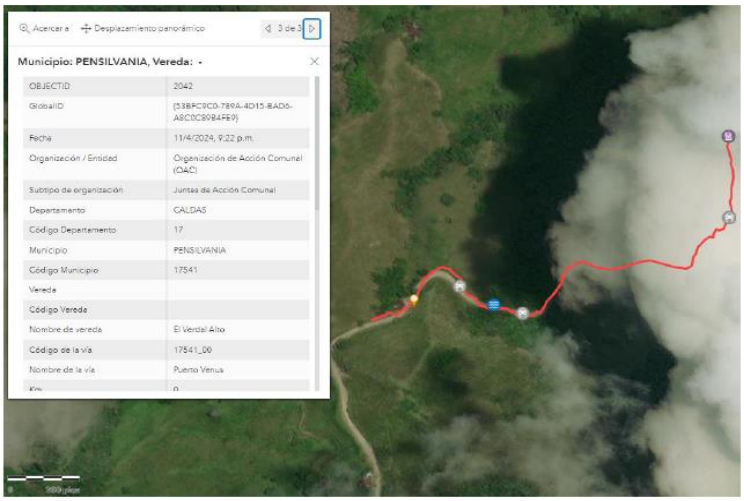


Ilustración 34 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda

– Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 35. Estado inicial de la vía

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA,

	DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	$20.065.559,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.032.781,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.131.117,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	27/06/2024	30/04/2025

Patronal			

Tabla 25 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

88.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, remitió plan de compras corregido, para revisión de la Interventoría
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/05/25, remitió desembolso para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió libro auxiliar, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

88.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 4/2/25 para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.655.581,00
Ejecutado	100%	94,23%	189.078.700,71
Avance / Retraso	**0%**	**5,77%**	**-11.576.880,29**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,67	3,79
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	96,39	99,45
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	76,96	79,40
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	23,28	20,94
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.553,97	3.666,79

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas

Tabla 26 Personal Convenio Solidario

89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 52.452.837 de fecha 6/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 5.527.000 de fecha 26/02/2025.
3. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 10.934.800 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 43.572.000 de fecha 26/02/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860 de fecha 14/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 359.800,00 de fecha 28/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.648.400,00 de fecha 26/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 14/04/2025.
9. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 13.555.891,00 de fecha 06/05/2025.
10. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 35.656.560,43 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.489.008,68 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 14.4

89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 13.3

89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo se encuentra pendiente la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2077 de 2024.

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
CONVENIO 2077 - 2024	**79,63 días**	**mar 21/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**5 días**	**mar 21/01/25**	**dom 26/01/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**74,63 días**	**lun 27/01/25**	**mar 22/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	lun 27/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 2/02/25	mar 25/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	40 días	lun 3/03/25	jue 17/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	29 días	jue 20/03/25	mar 22/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	lun 10/02/25	mar 11/03/25	100%	100%

89.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de $200.655.581,00; la Inversión Ejecutada fue de $189.078.700,71. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de $11.576.880,29.

89.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

89.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

90.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–677-1763 de fecha 02/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–705-1834 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–747-1987 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–778-2117 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–747-1987 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–806-2193 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

90.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de soportes

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 94,23% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 189.078.700,71 correspondiente al 94,23% del valor del convenio.

- Que desde el 10 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

92 ANEXO

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

92.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	259
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	260
1	**INTRODUCCION**		263
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		264
2.1	Localización		264
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		265
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		265
2.4	Características técnicas del proyecto		266
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		266
3.1	Información general del contrato		266
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		268
3.3	Seguimiento Items no previstos		269
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		269
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		263
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	864
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	884
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	882
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	875
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		271
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		271
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		272
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		274
7	**Conclusiones y recomendaciones**		274
8	**Anexos**		275
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA MIRAFLORES

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	3/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE PRORROGA 01:	26/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	269,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.154.007,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.154.007,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**199.654.007,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	11.150.065	141.036.979,47
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.336.134,29	44.014.287,42
VALOR EJECUTADO	**32.486.199,11**	**185.051.266,89**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 201.154.007,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.051.266,89
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	91,99%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

0,00

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA MIRAFLORES
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24



VEREDA MIRAFLORES
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

93 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

94.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 36 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

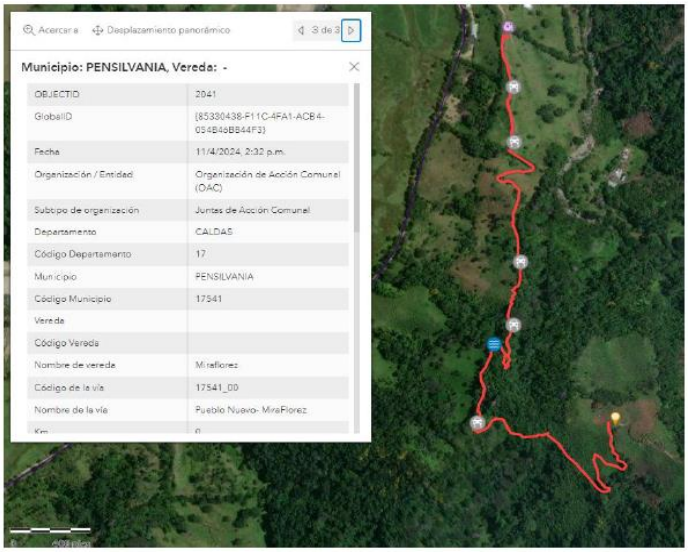


Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.



Ilustración 38. Estado inicial de la vía

94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.154.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.115.401,00	03/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.057.701,00	03/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.230.802,00	30/04/2025	30/04/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 27 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

95.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió la solicitud de reintegro de los rendimientos de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, remitió el auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió el auxiliar detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió libro auxiliar, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el primer plan de compras 8 para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

95.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	201.154.007,00
Ejecutado	100%	91,99%	185.051.266,89
Avance / Retraso	**0%**	**- 8,01%**	**- 16.102.740,11**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,12

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	107,87
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,70	85,63
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,19
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3943,94

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz
Maestro de Obra	José Uriel Bernal Gutiérrez

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 33.767.250 de fecha 14/02/2025.
2. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 31.761.019 de fecha 18/02/2025.

3. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 1.839.500 de fecha 08/03/2025
4. Desembolso 06 aprobado por valor de $9.761.760 de fecha 08/03/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 6.890.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 19.624.364,33 de fecha 26/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 31.352.100,01 de fecha 09/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 8.086.810,00 de fecha 09/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 400.000,00 de fecha 10/04/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 40.720.859,24 de fecha 02/05/2025.
11. Desembolso 16 aprobado por valor de $ 7.943.681,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.148.203,56 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 14.4

96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 14.5.

96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 14.6

96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2169 de 2024.

96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
CONVENIO 2169 - 2024	**46 días**	**lun 10/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
ETAPA REVISION	**6 días**	**lun 10/02/25**	**dom 16/02/25**	**100%**	**100%**
Preliminares	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	**40 días**	**dom 16/02/25**	**jue 3/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	30 días	dom 16/02/25	dom 23/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	lun 24/02/25	lun 31/03/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 28/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	sáb 22/02/25	dom 23/03/25	100%	100%

96.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 201.154.007,00; la Inversión Ejecutada fue de 185.051.266,89. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión de $16.102.740,11.

96.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

96.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

97.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–706-1836 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–747-1987 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–775-2100 de fecha 21/05/25, solicitó a la JAC documentación para la liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–785-2124 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–807-2194 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–840-2237 de fecha 29/05/25, remitió a la JAC condiciones del tramo a intervenir.

97.1.2 Actividades Técnicas

El día 21 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos con los pagos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: Envío de documentos soporte para el desembolso.

El día 23 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde las partes presentaron el balance final del Proyecto. Se establecieron los siguientes compromisos: 1. Ajustar inconsistencias contables

El día 26 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde las partes presentaron el balance final del Proyecto. Se llegó a conciliación final.

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, solo hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional del mes de febrero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 91,99% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 185.051.266,89 correspondiente al 91,99% del valor del convenio.

- Que desde el 15 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

99 ANEXO

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

99.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	276
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	277
1	**INTRODUCCION**		280
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		281
2.1	Localización		281
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		282
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		282
2.4	Características técnicas del proyecto		283
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		283
3.1	Información general del contrato		283
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		285
3.3	Seguimiento Items no previstos		286
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		286
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		287
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	888
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	907
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	909
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	911
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	915
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	917
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	900
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		288
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		289
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		290
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		290
7	**Conclusiones y recomendaciones**		292
8	**Anexos**		293
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		919
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		921

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	277
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2200-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 200.555.145,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.555.145,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**199.055.145,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		150.982.674,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.218.232,17	42.380.178,50
VALOR EJECUTADO	**5.218.232,17**	**193.362.852,50**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 200.555.145,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 193.362.852,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

100 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

101.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 39 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

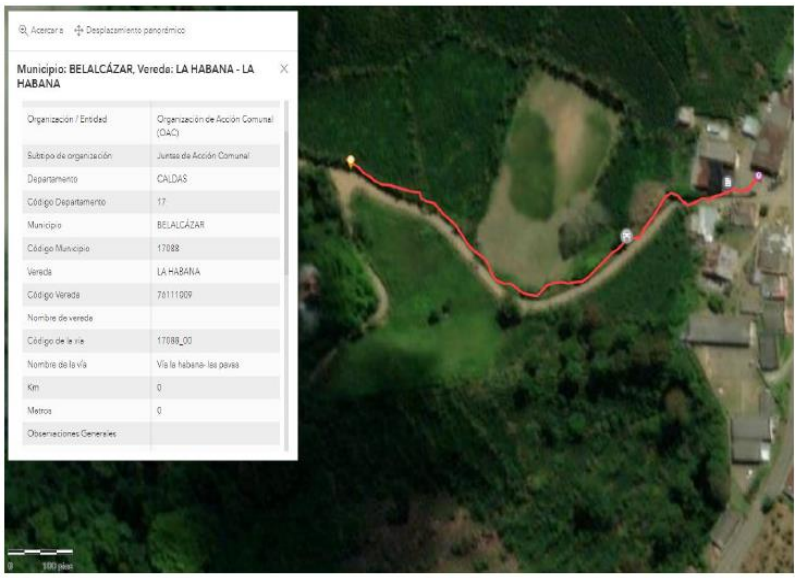


Ilustración 40 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 41. Estado inicial de la vía

101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.555.145,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	$20.055.515,00	04/07/2024	30/04/2026

Prestaciones sociales	$10.027.758,00	04/7/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.111.029,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Tabla 29 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

102.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 06/05/25 y 07/05/25, remitió el plan de compras no. 10 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 05/05/25 y 08/05/25, remitió las solicitudes de desembolso no. 09 y 10 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 14/05/25, remitió el plan de compras y corrección para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/05/25, remitió las prórrogas de los contratos de prestación de servicios.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió un desembolso revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió propuesta OPC para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

102.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 10 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	200.555.145,00
Ejecutado	100%	96,41%	193.362.852,50
Avance / Retraso	**0%**	**-3,59%**	**-7.192.292,50**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	133,11	140
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	101,5	106,75
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	32,22	33,89
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.675,13	4.916,95

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 15.3

103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Álzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez
Maestro de Obra	Juan Fernando Castaño Agudelo

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 15.4.

103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $40.872.017 de fecha 20/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $4.095.148 de fecha 24/01/2025.

3. Desembolso 03 aprobado por valor de $2.163.019 de fecha 30/01/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $198.000 de fecha 30/01/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $1.279.400 de fecha 06/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $10.676.213 de fecha 11/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 5.852.689 de fecha 24/02/2025
8. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 51.530.938 de fecha 11/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 1.178.000,00 de fecha 19/03/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 6.054.330,00 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 15.401.283,83 de fecha 10/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 6.708.140,00 de fecha 24/04/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de $ 11.578.473,52 de fecha 24/04/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de $ 10.928.118,05 de fecha 06/05/2025.
15. Desembolso 18 aprobado por valor de $ 16.185.256,00 de fecha 14/05/2025.
16. Desembolso 19 aprobado por valor de $ 7.799.953,00 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 192.500.978,63 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 15.5

103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 15.6.

103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 15.7.

103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024. Se encuentra pendiente la póliza y paz y salvo de la Prórroga No. 2, y la respectivas resoluciones de aprobación por parte EL INSTITUTO de la Prórroga No. 1 y 2.

103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
Proyecto Placas Huellas en concreto	**73 días**	**jue 16/01/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
ETAPA 1	**30 días**	**jue 16/01/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Fase 1	**14 días**	**jue 16/01/25**	**sáb 1/02/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
Fase 2	**8 días**	**sáb 1/02/25**	**mar 11/02/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
Fase 3	**8 días**	**mié 12/02/25**	**vie 21/02/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
ETAPA 2	**23 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Fase 4	**7 días**	**vie 21/02/25**	**sáb 1/03/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%

Fase 5	**8 días**	**sáb 1/03/25**	**mar 11/03/25**	**100%**	**100%**
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
Fase 6	**8 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**100%**	**100%**
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
ETAPA 3	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Fase 7	**20 días**	**vie 21/03/25**	**mar 15/04/25**	**100%**	**100%**
Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	100%	100%

103.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 200.555.145,00; la Inversión Ejecutada fue de 193.362.852,50. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 7.192.292,50.

103.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

103.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

104.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–701-1830 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–735-1972 de fecha 13/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–747-1990 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–755-2003 de fecha 14/05/25, remitió a la JAC una observación social de la propuesta de inversión presentada.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–757-2005 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación de liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–767-2057 de fecha 20/05/25, solicitó a la JAC explicaciones sobre las grietas y fisuras prematuras en la placa huella.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–782-2121 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–794-2153 de fecha 26/05/25, remitió a la JAC los resultados de resistencia obtenidos.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–796-2155 de fecha 26/05/25, remitió a la JAC el formato de inversión social versión 2 para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–800-2186 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el plan de inversión social de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–801-2187 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.
-

104.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de nómina, seguridad social y compra de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

El día 14 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Corregir plan de compras.

El día 15 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 16 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

Desde el 1 al 10 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la

transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 10 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,41% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 193.362.852,50 correspondiente al 96,41% del valor del convenio.
- Que el OAC solo vino a presentar la documentación de la OPC a finales de este periodo, lo que permitió radicar en el INVIAS para la No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

106 ANEXO

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver Anexo 158.

106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

106.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 15.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	294
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	295
1	**INTRODUCCION**		298
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		299
2.1	Localización		299
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		300
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		300
2.4	Características técnicas del proyecto		301
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		301
3.1	Información general del contrato		301
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		303
3.3	Seguimiento Items no previstos		304
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		305
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		305
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	930
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	950
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	948
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	941
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		307
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		307
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		307
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		309
7	**Conclusiones y recomendaciones**		309
8	**Anexos**		311
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2094-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN : 30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00

VALOR INICIAL : $ 203.292.352,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**201.792.352,17**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	4.571.344,12	153.122.102,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.594.633,85	42.995.000,00
VALOR EJECUTADO	**8.165.977,97**	**196.117.102,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 203.292.353,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 196.117.102,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

107 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

108.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.



Ilustración 42 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

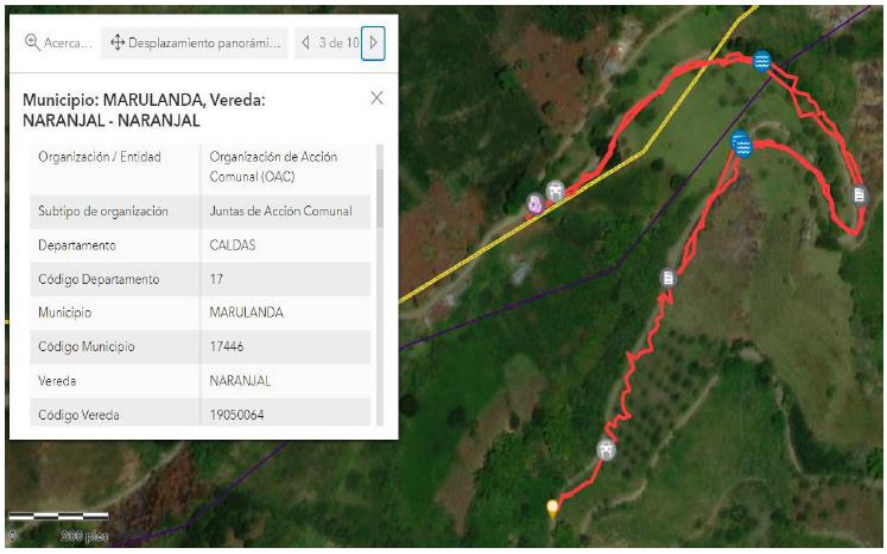


Ilustración 43 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 44. Estado inicial de la vía

108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$203.292.353,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			

Cumplimiento	$20.329.236,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	$10.164.618,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	$40.658.471,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$284.700.000,00	28/06/2024	30/04/2025

Tabla 31 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

109.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 02/05/25, remitió informe de relación de pago.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió desembolso no. 10 para la revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, remitió desembolso no. 11 para la revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió la nómina del mes de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, solicitó reunión de comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 08/05/25, remitió documento relacionando los pagos realizados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió las prórrogas de los contratos de prestación de servicios.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/05/25, remitió plan de compras no. 14 para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió libro de auxiliar detallado del mes de abril.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió documentación SST solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió el plan de compras no. 14, para revisión de la Interventoría.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el plan de compras 15 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el plan de compras 12 para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/05/25, remitió respuesta de CORPOCALDAS por solicitud de paz y salvo.

109.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 2 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	203.292.353,00
Ejecutado	100%	96,47%	196.117.102,00
Avance / Retraso	**0%**	**- 3,53%**	**- 7.175.251**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	83,69	85,34
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	29,21
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.133,51	4.215,09

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Yeison Rivera
Contador	Daniela Hurtado Duque
Maestro de Obra	Alpio Gallego

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $39.203.611 de fecha 30/01/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de $1.750.000 de fecha 19/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de $3.913.907 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de $5.870.860 de fecha 12/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de $1.975.800 de fecha 12/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de $34.341.128 de fecha 28/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 14.219.143 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 28.299.630,60 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 25.488.017,00 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 38.197.174,23 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 12.584.560,00 de fecha 25/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de $ 7.075.014,00 de fecha 22/05/2025.

Ver Anexo 16.4

110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 16.3.

110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo se encuentran pendientes las pólizas, paz y salvo y respectivas aprobaciones por parte del INSTITUTO correspondientes a la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2094 de 2024.

110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
FINAL		**0**	**0 días**	**mié 16/04/25**	**mié 16/04/25**	0%	100%
INICIO		**0**	**65 días**	**jue 16/01/25**	**mié 16/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%

110.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 203.292.353,00; la Inversión Ejecutada fue de 196.117,102. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 7.175.251,6.

110.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

110.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

111.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–684-1781 de fecha 02/05/25, solicitó a la JAC documentación para la etapa de liquidación.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–691-1813 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–702-1831 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–739-1979 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–779-2118 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–802-2188 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.
-

111.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la seguridad social y la nómina de trabajadores. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

Desde el 1 al 2 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Abril de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos de agosto a diciembre 2024 al Tesoro Nacional, nos encontramos a la espera del soporte del giro de los meses de enero a abril 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 2 de mayo de 2025

- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,47% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 196.117,102 correspondiente al 96,47% del valor del convenio.

- Que desde el 26 de marzo de 2025 estaba radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC y solo hasta el 23 de mayo de 2025. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió casi todo dicho plazo fue cuando se obtuvo la No Objeción de la OPC, por lo que al corte de este informe no fue posible su ejecución, por lo que se va a requerir más tiempo.

113 ANEXO

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

113.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	312
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	313
1	**INTRODUCCION**		316
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		317
2.1	Localización		317
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		318
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		319
2.4	Características técnicas del proyecto		319
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		319
3.1	Información general del contrato		319
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		320
3.3	Seguimiento Items no previstos		321
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		321
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		322
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	953
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		322
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		323
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		323
7	**Conclusiones y recomendaciones**		323
8	**Anexos**		325
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 3551-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL PARAMO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 29/5/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02: 27/05/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3691-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FISICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor; Dirección Territorial

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

114 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

115.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 45 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

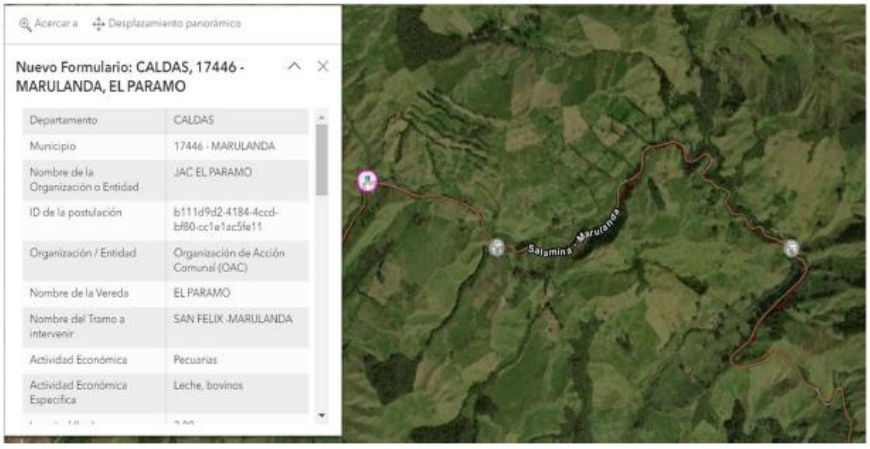


Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2
TELÉFONO:	3126652893
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$$203.033.492,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/5/25 28/4/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024

Tabla 33 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

116.2.1 Actividades Administrativas

- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC, para revisión de la Interventoría.

116.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,63	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,73	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	35,89	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4188,10	0

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3551 de 2024

117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra No aplica para el periodo.

117.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo.

117.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

117.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

118.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–826-2214 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC.

118.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a abril 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en espera del reinicio del convenio para iniciar la etapa de alistamiento, solicitud, revisión y aprobación de las hojas de vida, una vez reinicie el proyecto.

- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

1. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente "*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*", obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029 del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

120 ANEXO

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

120.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	326
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	327
1	**INTRODUCCION**		330
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		331
2.1	Localización		331
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		332
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		333
2.4	Características técnicas del proyecto		333
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		333
3.1	Información general del contrato		333
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		335
3.3	Seguimiento Items no previstos		335
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		335
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		336
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	960
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	969
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		337
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		338
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		338
7	**Conclusiones y recomendaciones**		338
8	**Anexos**		340
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ ~~LILIANA TIBATÁ~~

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2176-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SARCIRI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 203.689.907,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 203.689.907,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	151,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	154.212.580,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

121 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

122.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

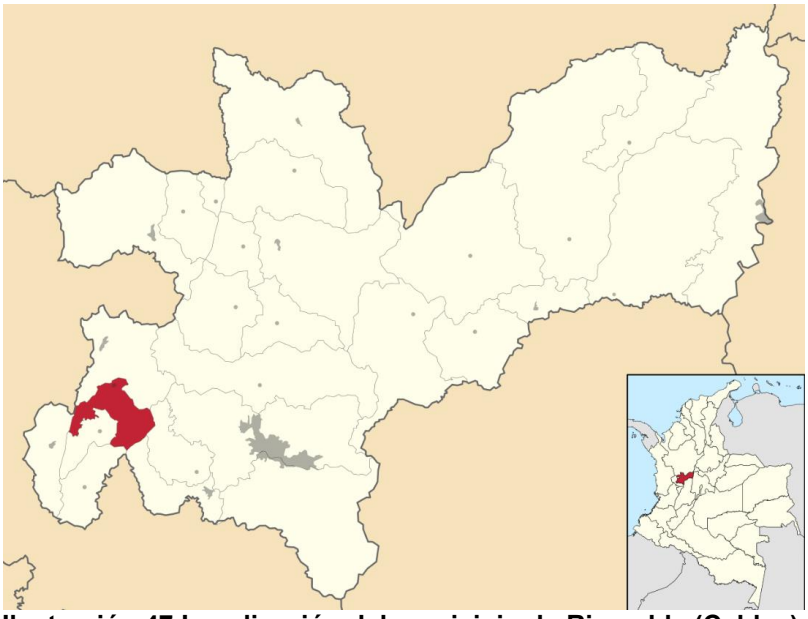


Ilustración 47 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

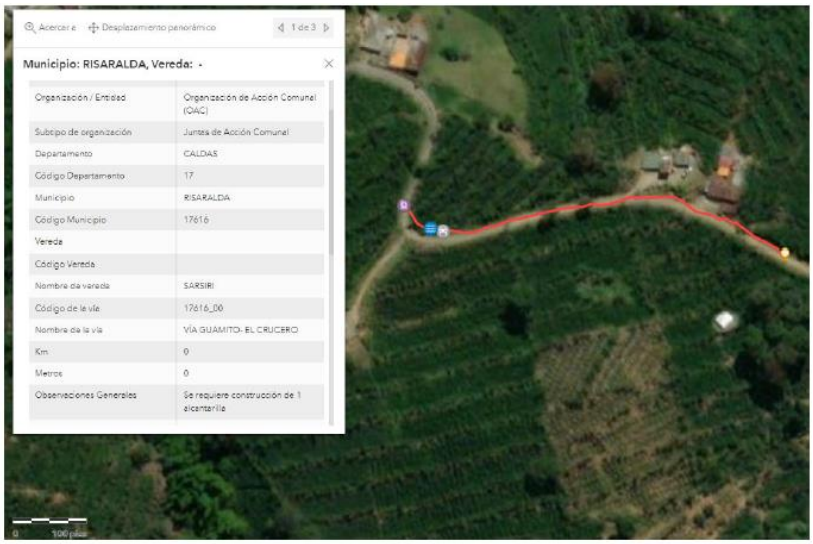


Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 34 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

123.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/25/25, remitió las hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 09/05/25, remitió documentos compromiso del comité operativo no. 2.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió examen médico del Ingeniero residente.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 20/05/25, remitió aclaración sobre la elección de las hojas de vida.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió el modelo de los contratos del maestro y obreros, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

123.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,52	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,56	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4075,54	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 18.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2176 de 2024

124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

124.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

124.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

124.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

125.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–713-1843 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–769-2068 de fecha 20/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–809-2196 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

125.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero y marzo 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de los extractos bancarios pendientes y del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del reinicio del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

2. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

127 ANEXO

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

127.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	341
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	342
1	**INTRODUCCION**		345
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		346
2.1	Localización		346
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		347
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		347
2.4	Características técnicas del proyecto		348
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		348
3.1	Información general del contrato		348
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		350
3.3	Seguimiento Items no previstos		351
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		351
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		352
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	976
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	994
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	996
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	998
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1002
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1004
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	987
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		354
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		354
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		355
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		357
7	**Conclusiones y recomendaciones**		357
8	**Anexos**		358
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1006
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1008

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	342
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 2187-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00

VALOR INICIAL :	$ 202.034.766,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 202.034.766,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	181,00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.483.797,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**200.534.766,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	32.348.943,55	130.560.620,72
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.154.329,48	43.985.967,08
VALOR EJECUTADO	**42.503.273,03**	**174.546.587,80**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 202.034.766,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 174.546.587,80
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	86,39%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025



FOTO 3 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

128 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI”N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

129.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.



Ilustración 49 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

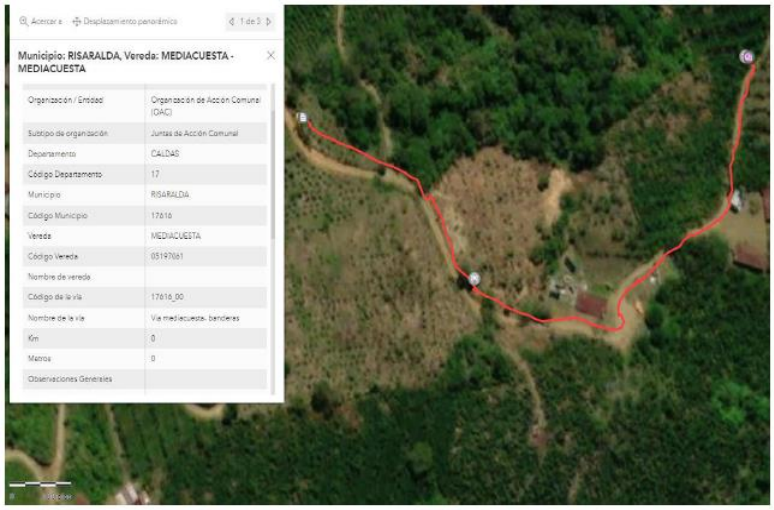


Ilustración 50 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado

Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 51 Estado inicial del sector

129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9
TELÉFONO:	3147931894
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			

Cumplimiento	$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Tabla 35 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

130.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 02/05/25, remitió plan de compras 14 y su corrección, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 06/05/25, remitió el desembolso, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 09/05/25 y 14/5/25, remitió plan de compras, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/05/25, remitió desembolso de ferretería para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/05/25, informe detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 16/05/25 y 21/5/25, remitió plan de compra 16 y 17, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/05/25, remitió informe detallado para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió el plan de compras 18 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 27/05/25, remitió el desembolso de plan de compras 17 y 18 para revisión y aprobación.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 1 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

130.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 23 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	100%	100%	202.034.766,00

Ejecutado	100%	86,39%	174.546.587,80
Avance / Retraso	**0%**	**- 13,61%**	**- 27.488.178,20**

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	4,48
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	135,70	116,96
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	100,35	86,49
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	31,41	27,07
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.949,68	4.266,02

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 19.3.

131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado
Maestro de Obra	Guillermo Velázquez Blandón

Tabla 36 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 19.4.

131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de $ 41.980.856 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de $ 1.021.533 de fecha 04/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de $ 7.403.163 de fecha 06/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de $ 609.000 de fecha 14/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de $ 5.221.018 de fecha 14/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de $ 5.778.860 de fecha 24/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de $ 13.843.532 de fecha 12/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de $ 35.512.326,96 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de $ 16.824.512,57 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de $ 13.083.737,50 de fecha 24/04/2025.
11. Desembolso 11 aprobado por valor de $ 2.919.645,10 de fecha 06/05/2025.
12. Desembolso 12 aprobado por valor de $ 8.650.649,00 de fecha 13/05/2025.
13. Desembolso 13 aprobado por valor de $ 8.616.844,27 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de $ 161.465.676,46 correspondiente al 80% del valor del convenio. Ver Anexo 19.5

131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 19.6.

131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 19.7.

131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo de la Prórroga No. 1, además se encuentran pendientes las pólizas, paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2187 de 2024.

131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	**81 días?**	**lun 23/12/24**	**lun 14/04/25**	**100%**	**100%**
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%

131.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 202.034.766,00; la Inversión Ejecutada fue de 174.546.587,80. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 27.488.178,20.

131.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

131.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

132.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–707-1837 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–756-2004 de fecha 14/05/25, remitió a la JAC la situación de las grietas prematuras en la placa huella.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–787-2126 de fecha 22/05/25, solicitó a la JAC documentación para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–797-2183 de fecha 27/05/25, solicitó a la JAC los documentos para el cierre socioambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–818-2205 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

132.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 17 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras.

El día 5 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 18 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 19 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío plan de compras corregido.

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 20 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 14 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 21 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras.

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 22 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 21 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 23 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío plan de compras corregido.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 24 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

Desde el 1 al 23 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23 de mayo de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 86,4% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de $ 174.546.587,80 correspondiente al 86,4% del valor del convenio.

- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.

Que desde el 26 de marzo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sim embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

134 ANEXO

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta el registro fotográfico. Ver Anexo 19.8.

134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

134.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 19.9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	359
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	360
1	**INTRODUCCION**		363
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		364
2.1	Localización		364
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		365
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		365
2.4	Características técnicas del proyecto		366
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		366
3.1	Información general del contrato		366
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		367
3.3	Seguimiento Items no previstos		368
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		368
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		369
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1027
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1036
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		369
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		370
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		371
7	**Conclusiones y recomendaciones**		371
8	**Anexos**		372
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 3169-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	HASTA EL 10/4/25
FECHA DE PRÓRROGA 1:	28/05/2025
PLAZO PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/5/25
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.048.100,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.048.100,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	170,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	151.477.350,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.544.321,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.526.429,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.548.100,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

135 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

136.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.



Ilustración 52 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

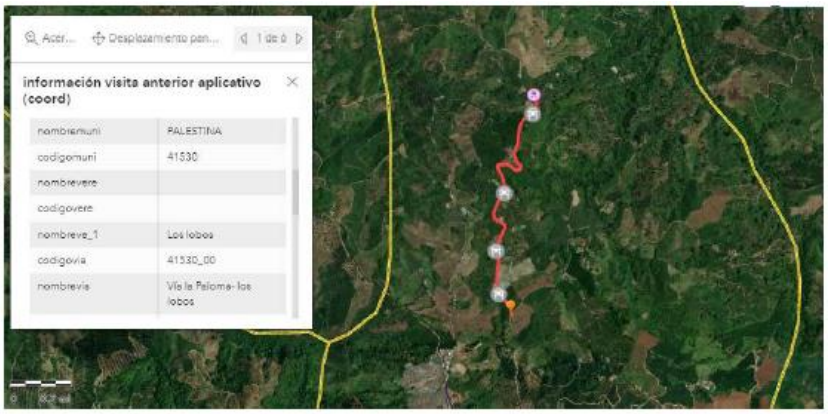


Ilustración 53 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25

	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 37 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

137.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/05/25, remitió hoja de vida del Ingeniero Residente, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 19/05/25, remitió hoja de vida del Ingeniero Residente, contador maestro de obra y ayudantes, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/05/25, remitió hoja de vida del maestro de obra, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

137.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el proyecto se encuentra en etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,85	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	127,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,76	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4782,63	0

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3169 de 2024

138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

138.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

138.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

138.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

139.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–695-1824 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–753-2001 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC acciones ante el retraso en la etapa de alistamiento.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–764-2053 de fecha 19/05/25, remitió observaciones a las hojas de vida presentadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–773-2098 de fecha 21/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–803-2189 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

139.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

3. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

141 ANEXO

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

141.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.		FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	373
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	374
1	**INTRODUCCION**		377
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		378
2.1	Localización		378
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		379
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		379
2.4	Características técnicas del proyecto		380
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		380
3.1	Información general del contrato		380
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		381
3.3	Seguimiento Items no previstos		381
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		382
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		382
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1043
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		383
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		384
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		384
7	**Conclusiones y recomendaciones**		384
8	**Anexos**		385
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 3530-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA SAN LUIS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 30/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/4/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72.00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.472.544,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.472.544,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	158,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.646.058,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.579.382,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.747.104,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.972.544,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor; Dirección Territorial

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

142 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No.1 suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

143.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

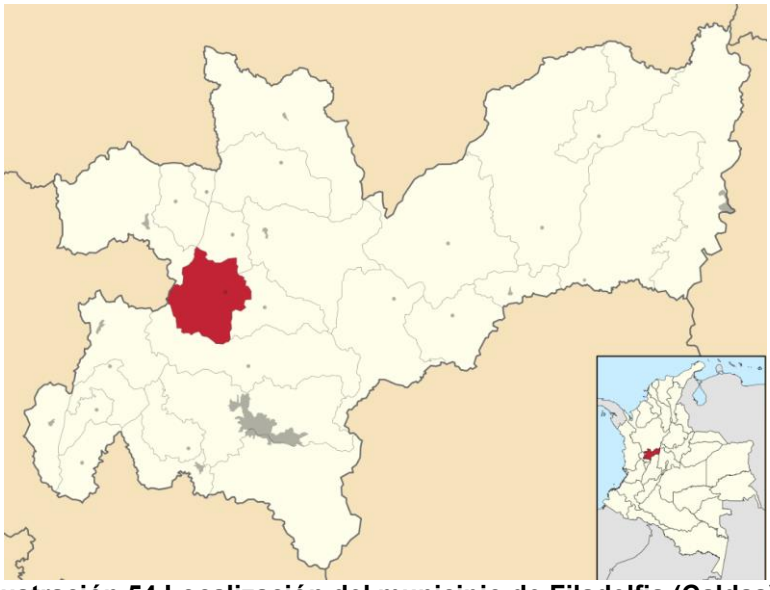


Ilustración 54 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

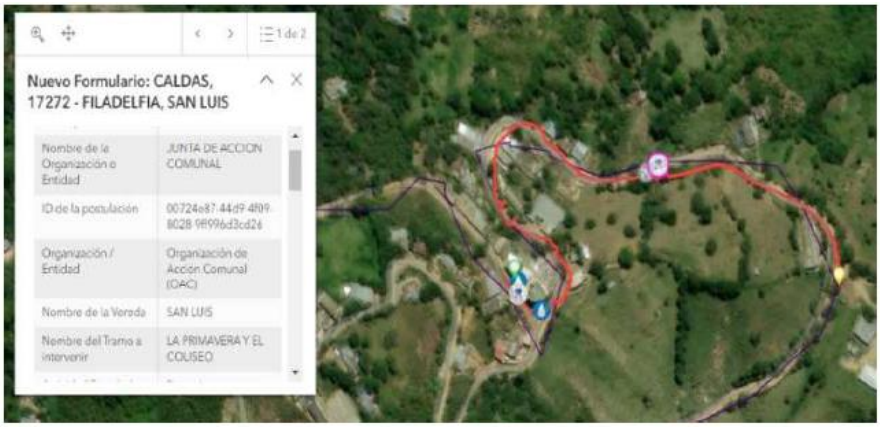


Ilustración 55 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.472.544,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	N.A.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392	

Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 38 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

144.2.1 Actividades Administrativas

- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC, para revisión de la Interventoría.

144.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3530 de 2024

145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

145.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

145.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

146.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–824-2212 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC.

146.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a abril 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente "*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*", obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-

583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029 del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

148 ANEXO

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

148.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	386
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	387
1	**INTRODUCCION**		390
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		391
2.1	Localización		391
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		392
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		393
2.4	Características técnicas del proyecto		393
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		393
3.1	Información general del contrato		393
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		394
3.3	Seguimiento Items no previstos		395
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		395
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		397
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1050
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		397
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		397
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		398
7	**Conclusiones y recomendaciones**		398
8	**Anexos**		399
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 3652-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.949.712,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.949.712,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	141,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	153.349.316,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.600.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.499.917,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.449.712,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

149 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

150.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.

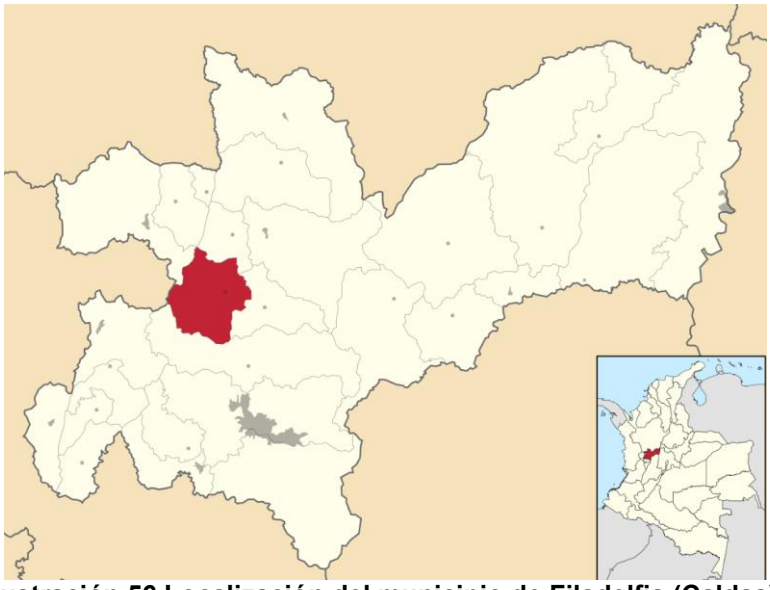


Ilustración 56 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

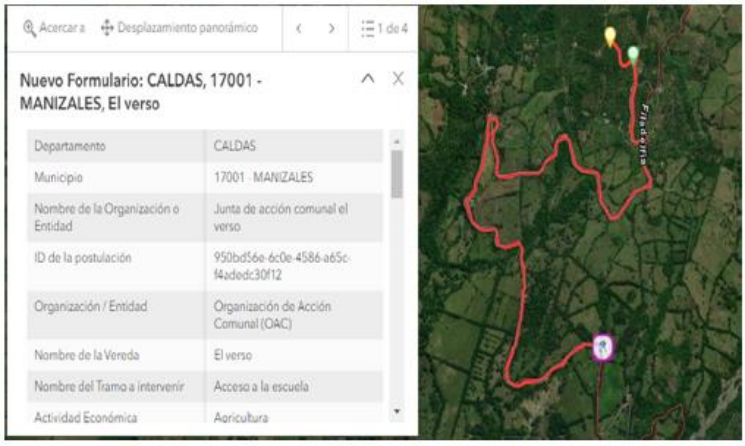


Ilustración 57 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1
TELÉFONO:	3193164956
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 201.949.712,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 39 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

151.2.1 Actividades Administrativas

- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC, para revisión de la Interventoría.

151.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	70,17	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0%	0%	0,90	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase F) - mezcla in situ					
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3652 de 2024

152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

152.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

152.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

152.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

153.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–825-2213 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC.

153.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Abril 2025, se encuentra a la espera de los soportes del giro al Tesoro Nacional.

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del reinicio del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones, metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

4. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente "*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*", obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029 del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

155 ANEXO

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

155.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	401
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	402
1	**INTRODUCCION**		405
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		406
2.1	Localización		406
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		407
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		407
2.4	Características técnicas del proyecto		408
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		408
3.1	Información general del contrato		408
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		409
3.3	Seguimiento Items no previstos		409
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		409
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		410
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1057
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		411
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		412
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		412
7	**Conclusiones y recomendaciones**		412
8	**Anexos**		413
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo-25

CONVENIO No.: 3622-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA ALTO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 2/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N A
PLAZO PRORROGA 01: N A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N A
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.471.038,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.471.038,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	163,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.089.476,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.562.684,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.318.878,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.971.038,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONTRATO VENCIDO

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

156 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

157.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.



Ilustración 58 Localización del municipio de Supía (Caldas).

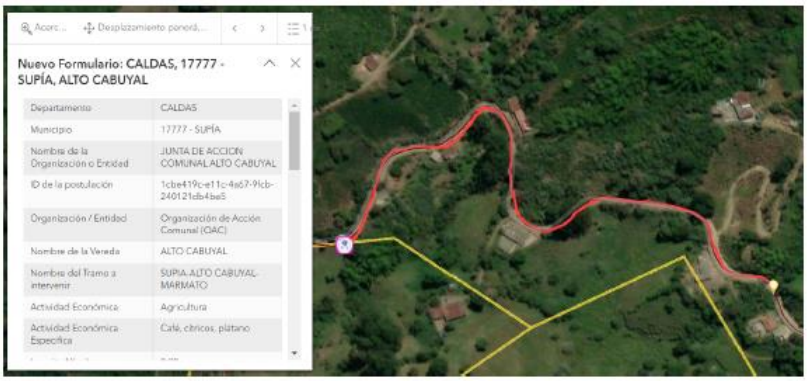


Ilustración 59 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	VENCIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 40 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

158.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

158.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se vencido.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)

Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3622 de 2024

159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

159.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

159.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

159.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

160.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

160.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte del presente informe, el Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación conforme a la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, fue el 02/03/25.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025.
- Que EL INSTITUTO a pesar de saber que el OAC no tenía ningún interés en continuar con la ejecución del Convenio Solidario No. 3622 de 2024, al no prorrogar la suspensión No. 1, procedió a realizar el giro de los recursos.
- A la fecha de corte de este informe, EL INSTITUTO no ha indicado como se va a proceder con este convenio que está vencido, no hubo ejecución de las obras contempladas en dicho convenio y tiene los recursos en la cuenta corriente, solicitud que realizó la Interventoría a través del oficio CINP-555-475-0948 del 4 de marzo de 2025.

162 ANEXO

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

162.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	414
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	415
1	**INTRODUCCION**		418
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		419
2.1	Localización		419
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		420
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		420
2.4	Características técnicas del proyecto		421
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		421
3.1	Información general del contrato		421
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		422
3.3	Seguimiento Items no previstos		422
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		423
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		423
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1064
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		412
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		425
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		425
7	**Conclusiones y recomendaciones**		425
8	**Anexos**		426
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo 25

CONVENIO No.: 3983-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 29/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.464.740,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.464.740,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	160,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.402.534,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.572.076,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.990.130,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.964.740,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

163 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

164.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 60 Localización del municipio de Supía(Caldas).

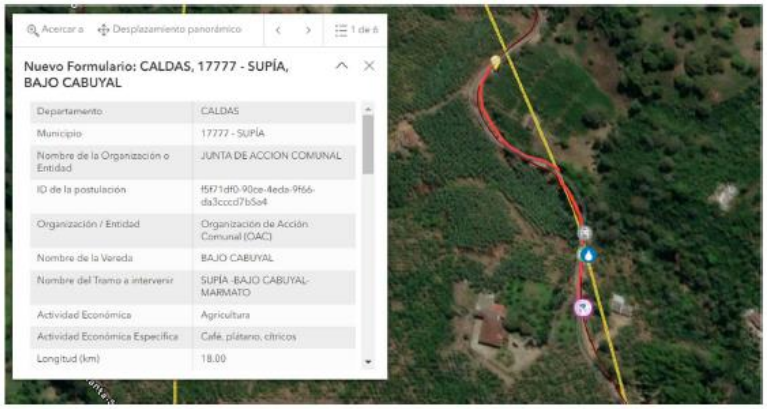


Ilustración 61 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.464.740,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.464.740,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Tabla 41 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

165.2.1 Actividades Administrativas

- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC, para revisión de la Interventoría.

165.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3983 de 2024

166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

166.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

166.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

166.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

167.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–823-2211 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de ampliación a la suspensión de la JAC.

167.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de abril de 2025, se encuentra a la espera del resto de extractos pendientes y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente "*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*", obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029

del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

169 ANEXO

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

169.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	427
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	428
1	**INTRODUCCION**		431
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		432
2.1	Localización		432
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		434
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		434
2.4	Características técnicas del proyecto		434
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		434
3.1	Información general del contrato		434
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		436
3.3	Seguimiento Items no previstos		436
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		436
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		436
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1274
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		438
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		439
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		439
7	**Conclusiones y recomendaciones**		439
8	**Anexos**		440
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo 25

CONVENIO No.: 3646-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL LA MONTAÑA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	41,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.460.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.460.667,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	132,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.263.198,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.129.573,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.960.667,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

170 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

171.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 62 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

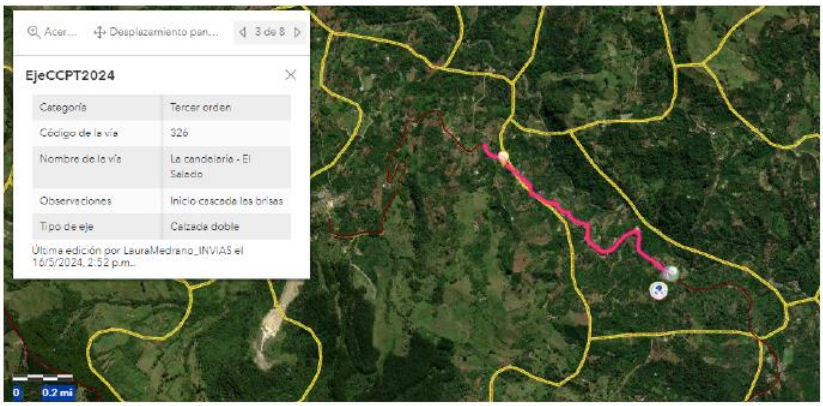


Ilustración 63 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 64 Estado inicial de la vía

171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 23/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de	

Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencias**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 42 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

172.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/05/25, remitió hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

172.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3646 de 2024.

173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

173.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

173.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

173.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

174.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–714-1844 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–754-2002 de fecha 14/05/25, solicitó a la JAC acciones ante el retraso en la etapa de alistamiento.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–751-1990 de fecha 14/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–768-2067 de fecha 20/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–819-2206 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC

174.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario de los meses de Febrero a Abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

176 ANEXO

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

176.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	441
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	442
1	**INTRODUCCION**		445
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		446
2.1	Localización		446
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		447
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		448
2.4	Características técnicas del proyecto		448
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		448
3.1	Información general del contrato		448
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		450
3.3	Seguimiento Items no previstos		450
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		451
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		453
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1087
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1096
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		452
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		453
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		453
7	**Conclusiones y recomendaciones**		454
8	**Anexos**		454
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo-25

CONVENIO No.: 2569-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.487.839,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.487.839,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	152,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	151.145.376,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.987.839,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mainsual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

177 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

178.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 65 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 66 Estado inicial de la vía

178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN NO. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 43 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

179.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 05/25/25, 06/05/25 y 08/05/25, remitió las hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 09/05/25, remitió hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 13/05/25, remitió documentos compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 09/05/25, remitió hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 13/05/25, remitió documentos compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 26/05/25, remitió los entregables solicitados en el comité operativo.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/05/25, remitió Hoja de Vida ingeniero Residente para revisión y aprobación.

179.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en etapa de alistamiento. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,28	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,30	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,64	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,51	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	29,10	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2569 de 2024

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

180.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

180.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

180.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

181.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–699-1828 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–686-1795 de fecha 05/05/25, solicitó al INVIAS aclaración con el tema del CBR.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–727-1899 de fecha 09/05/25, remitió aprobación a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–727-1899 de fecha 09/05/25, remitió aprobación a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–808-2195 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

181.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

183 ANEXO

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

183.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 31 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	455
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	456
1	**INTRODUCCION**		459
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		460
2.1	Localización		460
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		461
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		462
2.4	Características técnicas del proyecto		462
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		462
3.1	Información general del contrato		462
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		464
3.3	Seguimiento Items no previstos		464
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		465
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		466
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1103
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1112
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		466
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		467
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		467
7	**Conclusiones y recomendaciones**		167
8	**Anexos**		168
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** may-25

CONVENIO No.: 3296-2024

OBJETO: ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	3/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.533.766,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.533.766,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	140,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	151.238.149,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.537.144,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.258.473,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.033.766,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

184 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de $199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

185.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 67 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

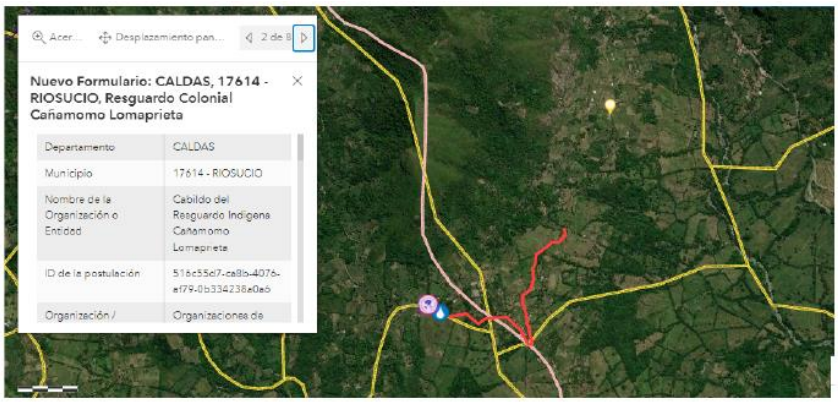


Ilustración 68 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomaprieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04
TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 44 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

186.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/25/25, remitió las hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

186.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en etapa de alistamiento.
El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto -	M3	0%	0%	36,35	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	40% Piedra para placa huella)					
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3286 de 2024

187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

187.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

187.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

187.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

188.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–696-1825 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–688-1797 de fecha 05/05/25, solicitó al INVIAS aclaración con el tema del CBR.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–729-1901 de fecha 09/05/25, remitió observaciones a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–752-2000 de fecha 14/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–729-1901 de fecha 09/05/25, remitió observaciones a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–752-2000 de fecha 14/05/25, remitió respuesta a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–820-2208 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

188.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de Marzo de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

190 ANEXO

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

190.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024 **Contratista:** RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024 **Interventoría:** CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** 1 AL 27 DE MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	469
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	470
1	**INTRODUCCION**		473
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		474
2.1	Localización		474
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		476
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		476
2.4	Características técnicas del proyecto		476
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		476
3.1	Información general del contrato		476
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		478
3.3	Seguimiento Items no previstos		478
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		479
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		480
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1295
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		480
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1163
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1421
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		480
5.3	Informes especialistas y profesionales		1297
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		50
5.5	Informe matriz de riesgos.		50
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1426
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1135
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1424
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1145
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		50
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	50
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1431
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		481
7	**Conclusiones y recomendaciones**		481
8	**Anexos**		482
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1151
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
	VERSION	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** mayo 25

CONVENIO No.: 3595-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO:	7/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025
FECHA DE PRORROGA 01:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	65,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.348.439,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.348.439,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CCSO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	165,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	-	-
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	153.411.914,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.602.357,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.834.168,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.848.439,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	**0,00**	**0,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

191 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de $201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de $1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 07, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 27 de mayo de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

192.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo

entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.



Ilustración 69 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

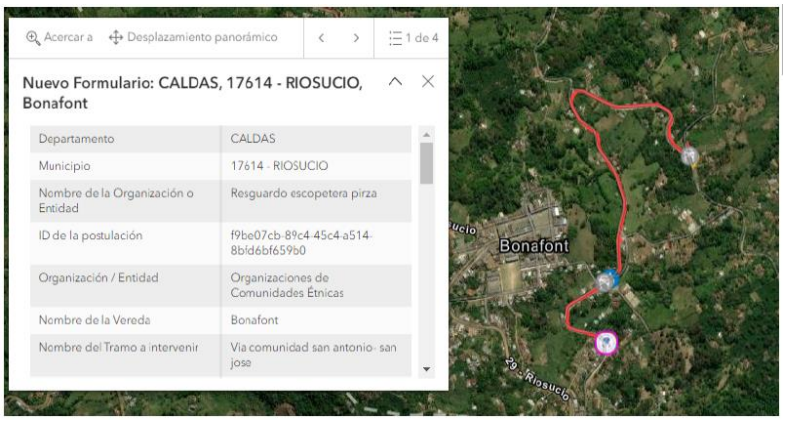


Ilustración 70 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Futbol El Carmelo (Vía Comunidad San
Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.
De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	07/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	21/6/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463

Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 45 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

193.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 05/05/25, remitió el informe del resultado CBR.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 07/05/25, solicitó un replanteo de tramos.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 12/05/25, 13/5/25 y 15/5/25, remitió correcciones de las hojas de vida, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/05/25, remitió borrador de contratos, para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 20/05/25, 21/5/25 y 22/5/25, remitió documentación socioambiental y SST solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/05/25, remitió cotizaciones, para revisión de la Interventoría.
- El día 27/05/25, se recibió la solicitud de suspensión 2 de la JAC, para revisión de la Interventoría.

193.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario en la etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión ($)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	**0%**	**0%**	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	138,85	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,61	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	42,96	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4648,36	0

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3595 de 2024

194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

194.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

194.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

194.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

195.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 26, 27, 28, 29 y 30 por medio de los oficios CINP-555-681-1767, CINP-555-730-1902, CINP-555-763-2044 y CINP–555–846–2246.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–697-1826 de fecha 06/05/25, solicitó a la JAC documentación contractual pendiente.

- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–723-1858 de fecha 07/05/25, solicitó a la INVIAS aval a la propuesta realizada por el Resguardo sobre la construcción de la placa solamente en el tramo 1.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–728-1900 de fecha 09/05/25, remitió observaciones a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–732-1920 de fecha 12/05/25, remitió aprobación a las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–765-2054 de fecha 19/05/25, remitió la aprobación de las HV enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP–555–821-2209 de fecha 27/05/25, remitió al INVIAS el aval de la solicitud de suspensión de la JAC.

195.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de febrero a abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- Respecto a las socializaciones que se deben realizar en cada uno de los Convenios Solidarios, nos permitimos señalar lo indicado en los documentos que hacen parte de los Convenios así:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

C. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

C2. Socializaciones

Socialización de inicio: *una vez se suscriba la orden de inicio, se realizará reunión con la comunidad y actores sociales del territorio con el objetivo de informar las características del Convenio Solidario o Interadministrativo y el Contrato de Interventoría.*

C3. Participación comunitaria

En la socialización de inicio, la Interventoría informará y convocará a los asistentes e interesados a la conformación del Comité de Participación Comunitaria o la veeduría ciudadana, indicando las funciones,

metodología de trabajo y los requisitos e impedimentos para hacer parte de esta, durante la ejecución de los Convenios Solidarios o Interadministrativos.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA VIAL

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

5. La Metodología Participativa Comunitaria MPC

Los 5 Espacios de Trabajo

Espacio de Trabajo 1: Socialización Inicial

Esta comprende:

- *Convocatoria*
- *Preparación del lugar.*
- *Presentación del convenio*
- *Presentación de la Metodología Participativa Comunitaria–MPC*
- *Conformación de veeduría o comité de participación comunitaria*
- *Conformación del Comité Operativo.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización está dentro de las obligaciones que se tienen en los Convenios Solidarios, por lo que estas se deben realizar solo cuando los convenios estén activos.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente "*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*", obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029 del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

197 ANEXO

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

197.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.
