REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 05

PERIODO

OCTUBRE 2025

ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S.

ELABORÓ	**REVISÓ**
PEDRO MAURICIO BELTRÁN	R.L. LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	R.L. ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN. 4
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 Localización. 6
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios en la ejecución del proyecto. 6
2.3 Inventario y estado inicial de la vía 6
2.4 Características técnicas del proyecto 26
3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA 28
3.1 Información general del contrato. 28
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 45
3.2.1 Balances y alcances 45
3.2.2 Comités Operativos de inicio 45
3.2.3 Compra de insumos y alquiler de equipos 46
3.2.4 Contratación de personal 46
3.2.5 Inicio y ejecución de obras 46
3.2.6 Gestión del componente social 47
3.2.7 Socializaciones de Inicio 47
3.2.8 Comités de participación ciudadana 47
3.2.9 Plan de Gestión Social (PIS) 47
3.2.10 Componentes financieros 47
3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 48
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra 49
5 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA 49
5.1 Información general del contrato 49
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 50
5.2.1 Gestión administrativa y seguimiento financiero 50
5.2.2 Control técnico y aseguramiento de la calidad 51
5.2.3 Verificación geotécnica, estructural y vial 51
5.2.4 Gestión social y atención a la comunidad 51

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

5.2.5 Gestión y cumplimiento ambiental 52
5.2.6 Supervisión general de obra 52
5.3 Informes especialistas y profesionales. 52
5.4 Informe del programa Anual de Caja – PAC 53
5.5 Informe matriz de riesgo 54
6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría. 54
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 55
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 56
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 57
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. 58
6.5 Seguimiento de Plan de Calidad Contrato de Interventoría. 59
6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 60
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 61
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 62
6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 63
7 Conclusiones y recomendaciones 64
8 ANEXOS 65

1 INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ha estructurado el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, una estrategia orientada a atender y mejorar la red vial terciaria y secundaria del país. Este programa busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo las condiciones de transitabilidad y promoviendo la participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, organizaciones sociales y la comunidad en general.

A través de esta iniciativa, se impulsa el desarrollo de la economía rural y popular, fomentando la generación de empleo local, la activación de dinámicas económicas propias del territorio y el fortalecimiento del sentido de pertenencia por las obras comunitarias. De igual manera, el programa contribuye a robustecer el tejido social mediante procesos colaborativos que involucran a las comunidades en la identificación de necesidades, priorización de intervenciones y ejecución de los proyectos. En este marco, se define una primera línea de intervención basada en la ejecución de obras menores mediante convenios solidarios celebrados con los Organismos de Acción Comunal, conforme a lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994 y en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, así como a través de contratos suscritos con comunidades étnicas. Este enfoque reconoce a las comunidades como actores fundamentales del proceso, al otorgarles un rol participativo y activo en la gestión y ejecución de las obras de mejoramiento vial.

En virtud de esto, el INVIAS suscribió el Contrato 3565 de 2024, cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4. En este sentido, el presente informe mensual de interventoría tiene como finalidad evaluar las actividades desarrolladas por los contratistas de obra durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, abarcando los componentes técnico, administrativo, financiero, legal, social y ambiental. De igual forma, expone las acciones de apoyo, seguimiento y supervisión adelantadas por el equipo de interventoría, brindando a la entidad contratante una visión precisa y oportuna sobre el avance, estado y desarrollo de los contratos y obras a cargo.

Que con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización.



NORTE: MUNICIPIO DE CALAMAR.
SUR: MUNICIPIO DE EL RETORNO.
ESTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
OESTE: DEPARTAMENTO DEL META.

San José del Guaviare está localizado en la región amazónica de Colombia y es la capital del departamento del Guaviare. Presenta una extensión de aproximadamente 16.769 Km², que representa el 0,93% del territorio nacional. Limita con los municipios de Calamar, Miraflores y El Retorno, y cuenta con una amplia riqueza ambiental, cultural e hídrica. Su localización estratégica lo convierte en el principal centro urbano y de servicios de la región.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios en la ejecución del proyecto.

El Instituto Nacional de Vías celebra convenios solidarios con diferentes Organismos de Acción Comunal y/o contratos con Comunidades Étnicas en los siguientes Municipios del departamento de Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. En los cuales se busca contribuir a la transformación de los territorios, a través de, obras de mantenimiento y/o de mejoramiento de la infraestructura de vías terciarias y sus condiciones de transitabilidad. Favoreciendo al desarrollo de la economía rural y popular mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de la economía, generando sentido de pertenencia por estas obras comunitarias de infraestructura y fortaleciendo el tejido social dentro de las comunidades.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía


Convenio Solidario N°2107-2024 Vereda La Reforma.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda la Reforma, en el corredor vial que comunica “Villanuvia - unilla" en el tramo de la Vereda la Reforma que tiene una longitud de atención de 0,20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Arenero", y el punto final de referencia es PR00+200 "Los chorros", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.




Convenio Solidario N°2144-2024 Vereda La Marina 1.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda La Marina Uno, en el corredor vial que comunica a las veredas de La Marina- La Esperanza- Buenavista – La Vorágine – Santa Barba – La Unilla y Cerritos, en una longitud de atención de 1,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 lindante Marina y la Esperanza, y el punto final de referencia es PR01+000 vía San José del Guaviare- El Retorno. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.

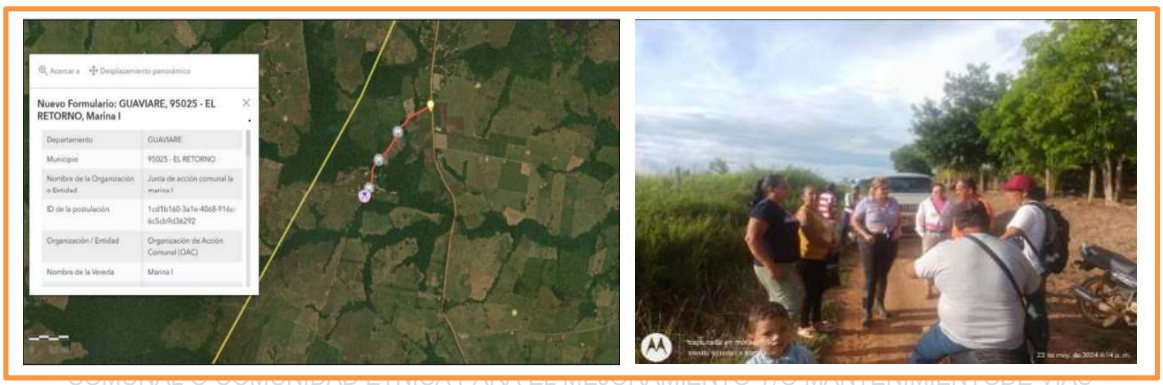

Convenio Solidario N°2147-2024 Vereda Alto Cachama

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento de Guaviare en la vereda Alto Cachama, en el corredor vial denominado “La Tabla – Alto Cachama- el Porvenir” que tiene una longitud de atención de 3,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00 +000 denominado como Indalecio, y el punto final de referencia es PR 03+000 en la bodega Cachama Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.

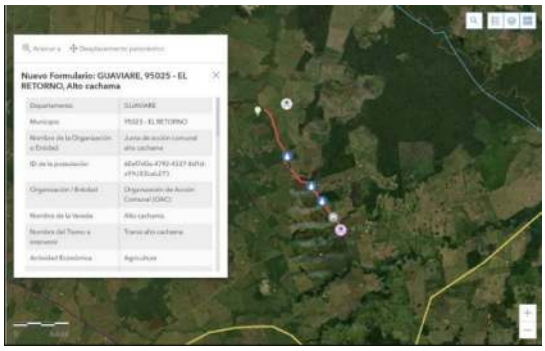



Convenio Solidario N°2177-2024 Vereda El Tablazo.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda el Tablazo, en el corredor vial que comunica “las veredas de El Tablazo, San Lucas, Mirolindo, Brisas del Palmar y La Reforma" en el tramo de la Vereda el Tablazo que tiene una longitud de atención de 1,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Loma doña Elisa", y el punto final de referencia es PR01+000 "Buenos Aires", Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2180-2024 Vereda Palmeras 1.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda Palmeras I, en el corredor vial que comunica de Palmeras uno, Palmeras dos, San Isidros hasta la Nueva Primavera que tiene una longitud de atención de 2,90 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 el macano, y el punto final de referencia es PR02+900 caseta comunal. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías



Convenio Solidario N°2188-2024 Vereda San Isidro Dos.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda San Isidro Dos, en el corredor vial que comunica “las veredas San Isidros dos, Danubio y Chaparra Medio” que tiene una longitud de atención de 2,90 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Caño Esmeralda, y el punto final de referencia es PR02+900 Necedero, Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2251-2024 Vereda Caño Raya Bajo.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda Caño Raya Bajo, en el corredor vial que comunica “La Marina, Caño Raya Bajo, Potosí alto y bajo de El Retorno" en el tramo de la Vereda Caño Raya Bajo que tiene una longitud de atención de 1,90 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Entrada vereda Caño Raya Bajo". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

Convenio Solidario N°2565-2024 Vereda El Danubio.

Convenio Solidario N°2352-2024 Vereda La Floresta.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda la Floresta, en el corredor vial que comunica "La Vorágine, La Floresta y Esmeralda" en el tramo de la Vereda la Floresta que tiene una longitud de atención de 2,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 finca la 24, y el punto final de referencia es PR02+000 loma Arismendi. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2359-2024 Vereda San Antonio.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento de Guaviare en la vereda San Antonio, en el corredor vial denominado "vía que comunica a las veredas de Triunfo Uno, el Encanto y Caño Bonito" en el tramo de la vereda San Antonio que tiene una longitud de atención de 7,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Ye caño Bonito – el Triunfo, y el punto final de referencia es PR07+000 Salida de san Antonio. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2362-2024 Vereda Bajo Jordán.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Retorno del departamento de Guaviare en la vereda Bajo Jordán, en el corredor vial denominado “vía Jordán – Alto Jordán” que tiene una longitud de atención de 2,20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en el punto denominado “Caño Raya”, y el punto final de referencia es PR02+200 denominado “Rosa Camacho”. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2565-2024 Vereda El Danubio.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda El Danubio, en el corredor vial que comunica “San Isidro uno, El Danubio y San Isidro Dos de El Retorno" en el tramo de la Vereda el Danubio que tiene una longitud de atención de 6,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Balneario el Delfín", y el punto final de referencia es PR06+500 "Inicio vía San Isidro II". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2589-2024 Vereda La Gaitana.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Calamar del departamento del Guaviare en la vereda La Gaitana en el tramo comprendido en la vía que comunica las veredas de La Gaitana - las Damas, que tiene una longitud de intervención de 5,350 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 la vía a las Damas y el punto final de referencia es PR 5+350 límite entre la Gaitana y Damas. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2590-2024 Vereda La Oriental.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José Del Guaviare del departamento del Guaviare en la vereda La Oriental, en el corredor vial que comunica “la Vereda La Oriental" en el tramo de la Vereda La Oriental que tiene una longitud de atención de 6,40 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Cruce de la abeja", y el punto final de referencia es PR06+400 "Caño Limón". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2601-2024 Vereda Agua Bonita Alta.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Calamar del departamento del Guaviare en la vereda Agua Bonita Alta en el tramo que comunica las veredas de Altamira- Agua Bonita Alta – El Progreso, que tiene una longitud de intervención



Convenio Solidario N°2604-2024 Vereda Boquerón.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José Del Guaviare del departamento del Guaviare en la vereda Boquerón, en el corredor vial que comunica “El Boquerón" en el tramo de la Vereda Boquerón que tiene una longitud de atención de 3,40 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Tramo vial Caño Blanco 2 - Boquerón", y el punto final de referencia es PR03+400 "Entrada Caño Blanco". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2626-2024 Vereda Cerro Azul.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José Del Guaviare del departamento del Guaviare en la vereda Cerro Azul, en el corredor vial que comunica “la vereda Cerro Azul - Alpes" en el tramo de la Vereda Cerro Azul que tiene una longitud de atención de 3,10 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Ye de Cerro Azul", y el punto final de referencia es PR03+100 "Puente Quemado". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2628-2024 Vereda Caño Raya Alto.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda Caño Raya Alto, en el tramo comprendido en la vía que comunica a la vereda de Caño Raya Alto que tiene una longitud de atención de 1,40 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Entrada finca Alirio Cubides", y el punto final de referencia es PR01+400 "Cruce a la Esperanza". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2628-2024 Vereda San Isidro.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda San Isidro, en el corredor vial que comunica “las veredas San Isidro vía Chaparral" en el tramo de la Vereda San Isidro que tiene una longitud de atención de 3,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Caño Esmeralda", y el punto final de referencia es PR03+000 "La Virgen", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2704-2024 ASOJUNTAS San José del Guaviare


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare del departamento del Guaviare en las veredas Agua Bonita, vieja Oriental y Santa Rosa, en el corredor vial comprendido “entre el anillo Agua Bonita – Vieja Oriental – Santa Rosa" que tiene una longitud de atención de 3,84 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Trocha ganadera", y el punto final de referencia es PR03+840 "Yamid", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2724-2024 Vereda Caño Mosco.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José Del Guaviare del departamento del Guaviare en la vereda Caño Mosco, en el corredor vial que comunica “Buenos Aires- Guacamayas- Puerto Flórez (Caño Mosco)" en el tramo de la

Vereda Caño Mosco que tiene una longitud de atención d e 3,5 0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0 0+000 " Centro p obla do de centro Flórez ", y el punto final de referencia es PR0 3+500 "Puente Belio", con forme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.

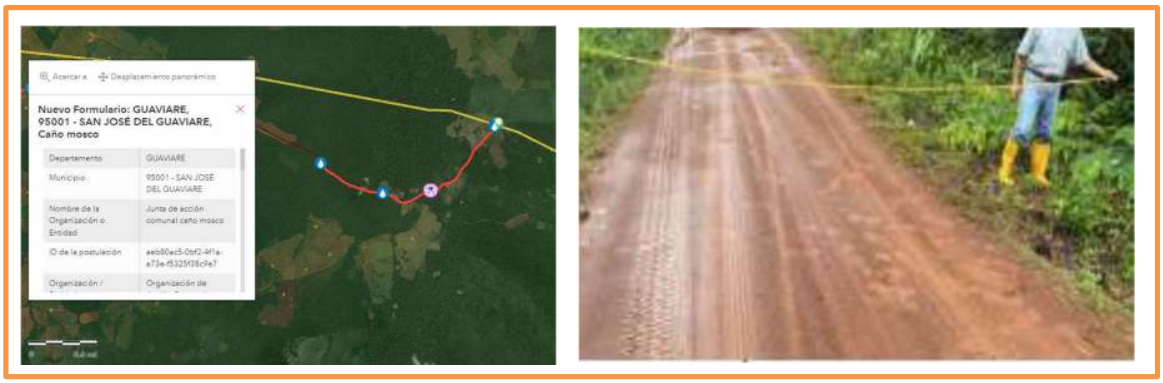

Convenio Solidario N°2725-2024 Vereda San Juan.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Calamar del departamento del Guaviare en la vereda San Juan, en el tramo nombrado subida mata de bambú que está comprendido entre la vía que conecta la Vereda San Juan con la vía Nacional, que tiene una longitud de intervención de 0,204 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 árbol de bambú de la loma y el punto final de referencia es PR 0+204 árbol Mohino, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2780-2024 Vereda Unión Alta.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda Unión Alta, en el corredor vial que comunica "a las veredas Unión Alta – Unión Baja", que tiene una longitud de atención de 2,5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Finca el paisa", y el punto final de referencia es PR02+500 "Cruce de la escuela", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.





Convenio Solidario N°2792-2024 Vereda Brisas del Palmar.


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda Brisas del Palmar, en el corredor vial que comunica "a las veredas de Tablazo- San Lucas - Termales" que tiene una longitud de atención de 1,80 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Límite Brisas - Colinas", y el punto final de referencia es PR01+800 "Límite Fredy Piedraita", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.





Convenio Solidario N°2796-2024 Vereda Tierra Negra.


El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Calamar del departamento del Guaviare en la vereda Tierra Negra, del tramo comprendido en la vía que comunica las veredas de Tierra Negra – La Gaitana , con una longitud de atención de 3,3 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 el Jardín y el punto final de referencia es PR 3+300 Caño frito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.

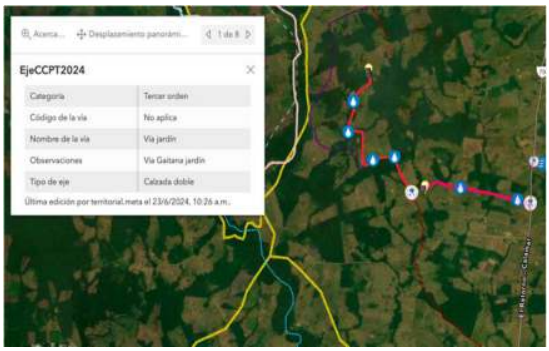



Convenio Solidario N°2826-2024 ASOJUNTAS El Retorno.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en las veredas Betania – Palmeras uno – Unión Alta, en el corredor vial que comunica “Macano - Betania – Palmeras uno – Unión Alta " que tiene una longitud de atención de 2,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "La Ceiba", y el punto final de referencia es PR02+500 "Vía nacional", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.

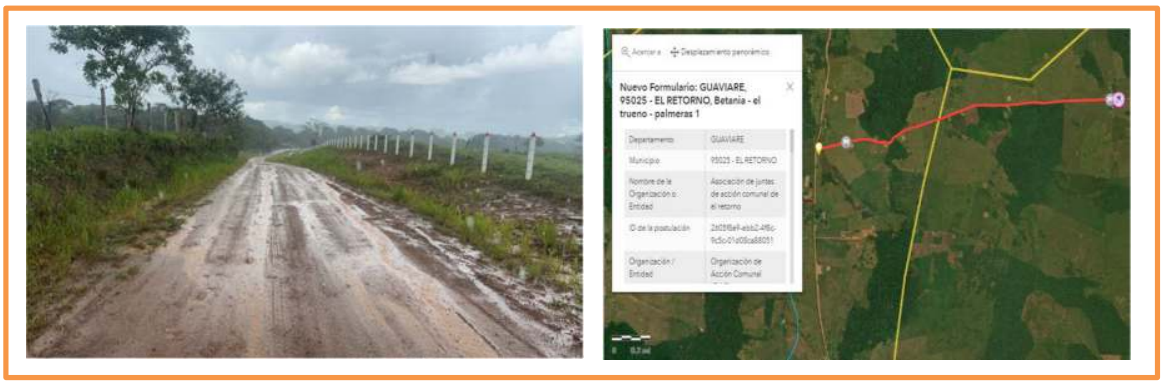

Convenio Solidario N°2830-2024 Vereda El Porvenir.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, específicamente en la vereda el Porvenir, dentro del corredor vial que conecta la vereda “Porvenir – Progreso”. El tramo objeto de intervención corresponde a la vereda El Porvenir, con una longitud aproximada de 2.0 km, tomando como punto inicial de referencia el PR00+000 conocido como “El alto del Porvenir”, y como punto final el PR02+000 denominado “La Orqueta”. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2835-2024 Vereda La Leona.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San José Del Guaviare, en el departamento del Guaviare, específicamente en la Vereda La Fuga, dentro del corredor vial que conecta “La Fuguita – La Leona – Simón Bolívar”. El tramo objeto de intervención corresponde a la vereda La Leona, con una longitud aproximada de 1.5km, tomando como punto inicial de referencia el PR00+000 conocido como “Cruce la leona” y como punto final el PR01+500 denominado “Finca Eliseo Beltrán”. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2837-2024 Vereda Buena Vista.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Retorno del departamento del Guaviare en la vereda Buena Vista, en el corredor vial que comunica “a las veredas de la Esperanza – Vorágine – Santa Barbara", que tiene una longitud de atención de 2,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Los mangos", y el punto final de referencia es PR02+000 "Escuela Buena Vista", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°2966-2024 Vereda Alto Jordán.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, específicamente en la vereda el Alto Jordán, dentro del corredor vial que conecta la vereda "Alto jordán – Cerritos". El tramo objeto de intervención corresponde a la vereda Alto Jordán, con una longitud aproximada de 2.0 km, tomando como punto inicial de referencia el PR00+000 conocido como "Subida de Mauricio", y como punto final el PR02+000 denominado "Cauchera de Darío". Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°3012-2024 Vereda La Fuga.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San José Del Guaviare, en el departamento del Guaviare, específicamente en la vereda La Fuga, dentro del corredor vial que conecta "La Fuguita – La Oriental – San Cristóbal – Puerto Ospina". El tramo objeto de intervención corresponde a la vereda La Fuga, con una longitud aproximada de 0.755km, tomando como punto inicial de referencia el PR00+000 conocido como "La Universidad de la Amazonia" y como punto final el PR00+755 denominado "Los gatos".

Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°3173-2024 Vereda El Retiro.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San José Del Guaviare, en el departamento del Guaviare, específicamente en la vereda El Retiro, dentro del corredor vial que conecta “Playa Guio – Laguna Negra”. El tramo objeto de intervención corresponde a la vereda La Fuga, con una longitud aproximada de 1 km, tomando como punto inicial de referencia el PR00+000 conocido como “entrada ecoguaviare” y como punto final el PR01+000 denominado “Laguna negra”. Esta información corresponde al levantamiento de campo realizado por el equipo técnico de la Dirección Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°3497-2024 Vereda Agua Bonita.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José Del Guaviare del departamento del Guaviare en la vereda Agua Bonita, en el corredor vial "Trocha ganadera – vereda Agua Bonita" que tiene una longitud de atención de **1,70 km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Puente Caño en puntillado", y el punto final de referencia es PR01+700 "Entrada Basurero", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



Convenio Solidario N°4323-2024 Resguardo Indígena El Refugio.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare en el Resguardo Indígena El Refugio, en la vía identificada con código 75GV51 que tiene una longitud de atención de **2,15 Km**, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 "cruce de la vía con la vía del complejo recreo deportivo tercer tiempo", y el punto final de referencia es PR2+150 "ingreso al centro poblado del resguardo indígena El Refugio", conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Meta del Instituto Nacional de Vías.



2.4 Características técnicas del proyecto

El proyecto de infraestructura vial objeto de la interventoría comprende la ejecución de 33 convenios comunitarios orientados al mejoramiento de la transitabilidad rural mediante la construcción de placas huella, alcantarillas de drenaje menor y box culvert en diferentes veredas del departamento del Guaviare. La distribución territorial de los convenios es la siguiente:

- 19 convenios en el municipio de El Retorno
- 10 convenios en el municipio de San José del Guaviare
- 4 convenios en el municipio de Calamar

Estos convenios se enfocan en intervenir tramos críticos de la red vial terciaria, priorizados por su deterioro, niveles de accesibilidad, afectaciones por escorrentía superficial y necesidad de garantizar movilidad continua a las comunidades rurales.

Placas Huella

Las obras de placa huella proyectadas y ejecutadas bajo los convenios presentan las siguientes características técnicas:

- Construcción de losas de concreto con resistencia especificada de 3.000 psi, conforme a la Cartilla de Obras Menores del INVIAS.
- Espesores de losa ajustados entre 12 y 15 cm, según condiciones de pendiente y tránsito local.
- Inclusión de riostras de confinamiento, bordillos laterales y cunetas cuando las condiciones topográficas lo requieren.
- Base granular compactada y controlada mediante ensayos de densidad, asegurando soporte adecuado para la losa.

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

- Acero de refuerzo verificado en campo conforme a planos y especificaciones entregadas a las juntas de acción comunal.

Alcantarillas

Las alcantarillas instaladas en los diferentes convenios cumplen la función de manejo de aguas superficiales y drenaje transversal, con las siguientes especificaciones:

- Tubos de concreto reforzado o PVC corrugado, según disponibilidad local y condiciones hidráulicas.
- Diámetros entre 18” y 36”, definidos de acuerdo con caudales estimados y geometría del cauce.
- Instalación con control de pendiente, nivelación y emboquilles en concreto para garantizar adecuada operación hidráulica.
- Rellenos compactados en capas y verificados mediante ensayos de densidad in situ.

Box Culvert

En los sectores donde los caudales o anchos del cauce superan la capacidad de una alcantarilla convencional, se proyectaron y ejecutaron estructuras tipo box culvert, cuyas características incluyen:

- Secciones rectangulares prefabricadas o fundidas en sitio.
- Alturas y anchos variables según el diseño hidráulico, típicamente entre 1.0 m y 1.5 m.
- Cimentaciones verificadas mediante revisión topográfica y validación con los resultados del estudio geotécnico.
- Refuerzo en acero conforme a la cartilla de tipologías y revisión del especialista estructural.
- Consideraciones geotécnicas generales

- La interventoría verificó en campo la aplicabilidad de los estudios de suelo suministrados para cada convenio, destacando:
- En convenios con CBR ≥ 3 %, la subrasante fue apta y no requirió mejoramientos adicionales.
- En sectores con CBR < 3 %, se realizaron mejoramientos locales entre 30 y 60 cm, utilizando:
- Material granular tipo subbase estabilizado con cemento o cal, o
- Refuerzo con malla triaxial para mejorar la distribución de cargas.
- Todos los rellenos fueron sometidos a ensayos de densidad y compactación, garantizando su adecuado comportamiento estructural.

3 INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato.

Convenio Solidario N°2107-2024 Vereda La Reforma.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-037-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2107-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Reforma
NIT:	900.774.335-8.
VALOR DEL CONTRATO:	$200.582.106 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	183 días
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042337

Convenio Solidario N°2144-2024 Vereda La Marina 1.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-065-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2144-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARINA 1 DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Marina 1
NIT:	901.064.925-0
VALOR DEL CONTRATO:	$201.498.566 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	182 días
FECHA DE INICIO:	2 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100011299

Convenio Solidario N°2147-2024 Vereda Alto Cachama

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-068-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2147-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CACHAMA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Cachama
NIT:	901.197.137-4
VALOR DEL CONTRATO:	$200.613.385 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	182 días
FECHA DE INICIO:	2 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia

PÓLIZA No:	CV-100011305

Convenio Solidario N°2177-2024 Vereda El Tablazo.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-090-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2177-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda El Tablazo
NIT:	901.104.677-1
VALOR DEL CONTRATO:	$200.837.303 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	178 días
FECHA DE INICIO:	3 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042590

Convenio Solidario N°2180-2024 Vereda Palmeras 1.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-093-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2180-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALMERAS 1 DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Palmeras 1
NIT:	901.068.356-8
VALOR DEL CONTRATO:	$202.675.311 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	181 días
FECHA DE INICIO:	03 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia

PÓLIZA No:	CV-100042514

Convenio Solidario N°2188-2024 Vereda San Isidro Dos.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-098-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2188-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO DOS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro Dos
NIT:	901.650.898-3
VALOR DEL CONTRATO:	$199.716.629 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	177 días
FECHA DE INICIO:	04 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042549

Convenio Solidario N°2251-2024 Vereda Caño Raya Bajo.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-147-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2251-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO RAYA BAJO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Raya Bajo
NIT:	901.207.072-9.
VALOR DEL CONTRATO:	$200.147.890 COP

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

PLAZO DEL CONTRATO:	176 días
FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042603

Convenio Solidario N°2352-2024 Vereda La Floresta.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-223-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2352-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Floresta
NIT:	901.015.680-2
VALOR DEL CONTRATO:	$201.193.823 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	173 días
FECHA DE INICIO:	11 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042794

Convenio Solidario N°2359-2024 Vereda San Antonio.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-228-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2359-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda San Antonio
NIT:	901.725.812-4
VALOR DEL CONTRATO:	$201.468.755 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	172 días
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No.	CV-100011375

Convenio Solidario N°2362-2024 Vereda Bajo Jordán.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-230-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2362-2024
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bajo Jordán del municipio de El Retorno, del departamento del Guaviare, para el mejoramiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Bajo Jordán
NIT:	901.104.677-1
VALOR DEL CONTRATO:	$199.148.492 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	172 días
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100042784

Convenio Solidario N°2565-2024 Vereda El Danubio.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-386-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2565-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal Vereda El Danubio

NIT:	901.632-813-1
VALOR DEL CONTRATO:	$200.739.304 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	161 días
FECHA DE INICIO:	19 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043016

Convenio Solidario N°2590-2024 Vereda La Oriental.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-411-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2590-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Oriental
NIT:	900.990.603-2
VALOR DEL CONTRATO:	$200.784.621 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	165 días
FECHA DE INICIO:	19 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043075

Convenio Solidario N°2589-2024 Vereda La Gaitana.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-410-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2589-2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GAITANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Gaitana
NIT:	901.832.923-1
VALOR DEL CONTRATO:	$203.198.233 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	165 días
FECHA DE INICIO:	19 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043094

Convenio Solidario N°2601-2024 Vereda Agua Bonita Alta.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-420-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2601-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BONITA ALTA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal Vereda Agua Bonita Alta
NIT:	901.833.780-1
VALOR DEL CONTRATO:	$209.374.797 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	158 días
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043076

Convenio Solidario N°2604-2024 Vereda Boquerón.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-423-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2604-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Boquerón
NIT:	901.162.916-4.
VALOR DEL CONTRATO:	$199.306.276 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	162 días
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043080

Convenio Solidario N°2626-2024 Vereda Cerro Azul.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-441-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2626-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Azul
NIT:	901.375.829-6
VALOR DEL CONTRATO:	$200.692.620 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	162 días
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043079

Convenio Solidario N°2628-2024 Vereda Caño Raya Alto.

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-443-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2628-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO RAYA ALTO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Raya Alto
NIT:	901.201.725-2
VALOR DEL CONTRATO:	$199.528.125 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	158 días
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043081

Convenio Solidario N°2628-2024 Vereda San Isidro.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-470-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2671-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro
NIT:	901.200.770-1
VALOR DEL CONTRATO:	$201.536.274 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	151 días
FECHA DE INICIO:	23 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043077

Convenio Solidario N°2724-2024 Vereda Caño Mosco.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-509-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2724-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAÑO MOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Mosco
NIT:	901.195.724-9
VALOR DEL CONTRATO:	$200.074.492 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	156 días
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043084

Convenio Solidario N°2725-2024 Vereda San Juan.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-510-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2725-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juan
NIT:	900.885.856-1
VALOR DEL CONTRATO:	$201.148.605 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	160 días
FECHA DE INICIO:	24 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043091

Convenio Solidario N°2704-2024 ASOJUNTAS San José del Guaviare.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-489-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2724-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de San José del Guaviare
NIT:	901.123.506-1
VALOR DEL CONTRATO:	$199.447.553 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	160 días
FECHA DE INICIO:	24 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043420

Convenio Solidario N°2780-2024 Vereda Unión Alta.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-557-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2780-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNION ALTA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Unión Alta
NIT:	901.104.677-1
VALOR DEL CONTRATO:	$200.191.138 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	158 días
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043179

Convenio Solidario N°2792-2024 Vereda Brisas del Palmar.

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-563-2024
CONVENIO SOLIDARIO No	2792-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Brisas del Palmar
NIT:	901.118.813-8
VALOR DEL CONTRATO:	$201.922.709 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	158 días
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043165

Convenio Solidario N°2796-2024 Vereda Tierra Negra.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-567-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2796-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA NEGRA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Tierra Negra
NIT:	901.292.773-5
VALOR DEL CONTRATO:	$202.204.589 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	158 días
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043205

Convenio Solidario N°2837-2024 Vereda Buena Vista.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-606-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2837-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Buena Vista
NIT:	901.744.736-3
VALOR DEL CONTRATO:	$201.999.661 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	155 días
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043223

Convenio Solidario N°2830-2024 Vereda El Porvenir.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-600-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2830 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda El Porvenir
NIT:	900.629.585-2
VALOR DEL CONTRATO:	$201.095.231 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	145 días
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043239

Convenio Solidario N°2826-2024 ASOJUNTAS El Retorno.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-591-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2826-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de El Retorno
NIT:	900.008.034-1.
VALOR DEL CONTRATO:	$199.486.026 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	155 días
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043254

Convenio Solidario N°2835-2024 Vereda La Leona.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-607-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2835-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LEONA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Leona
NIT:	901.014.418 -4
VALOR DEL CONTRATO:	$199.668.974 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	154 días
FECHA DE INICIO:	29 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043256

Convenio Solidario N°2966-2024 Vereda Alto Jordán.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-681-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	2966-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO JORDAN DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Jordán
NIT:	900.988.937 - 0
VALOR DEL CONTRATO:	$199.421.877 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	141 días
FECHA DE INICIO:	2 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043383

Convenio Solidario N°3012-2024 Vereda La Fuga.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-707-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	3012-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FUGA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda La Fuga
NIT:	900.922.076-0
VALOR DEL CONTRATO:	$200.222.980 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	142 días
FECHA DE INICIO:	6 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043422

Convenio Solidario N°3173-2024 Vereda El Retiro.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-798-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	3173-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda El Retiro
NIT:	900.037.614-7
VALOR DEL CONTRATO:	$202.909.427 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	140 días
FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100043559

Convenio Solidario N°3497-2024 Vereda Agua Bonita.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CS-872-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	3497-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Agua Bonita
NIT:	900.045.116-4
VALOR DEL CONTRATO:	$199.754.129 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	120 días
FECHA DE INICIO:	2 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100044014

Convenio Solidario N°4323-2024 Resguardo Indígena El Refugio.

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

PROCESO DE LICITACIÓN:	SPSC-CD-CII-067-2024
CONVENIO SOLIDARIO No:	4323-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS Y EL RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA DE OBRA:	Resguardo Indígena El Refugio
NIT:	901.058.647-3
VALOR DEL CONTRATO:	$192.578.988 COP
PLAZO DEL CONTRATO:	41 días
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
DIRECCIÓN:	Calle 25 G No. 73B-90, Bogotá D.C., Colombia
PÓLIZA No:	CV-100046335

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo evaluado, las Juntas de Acción Comunal de los 33 convenios en ejecución (19 en El Retorno, 10 en San José del Guaviare y 4 en Calamar) desarrollaron las siguientes actividades, las cuales fueron verificadas y acompañadas por el equipo de Interventoría:

3.2.1 Balances y alcances

Las Juntas presentaron la información técnica y financiera correspondiente al avance de obra, la cual fue revisada y validada por la interventoría para garantizar coherencia entre actividades ejecutadas, cantidades de obra y recursos utilizados.

3.2.2 Comités Operativos de inicio

Se realizo la coordinación y programación de los comités operativos de inicio de las juntas, con acompañamiento integral del área financiera, para una revisión exhaustiva de las órdenes

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

de compra, la idoneidad de los proveedores, la interventoría superviso ajustes técnicos y autorizo el desembolso de los recursos a las OAC para la posterior adquisición materiales, alquiler de equipos y maquinaria a los proveedores escogidos, garantizando que el inicio de las actividades fuese con transparencia y calidad.

3.2.3 Compra de insumos y alquiler de equipos

Las Juntas adelantaron la adquisición de materiales, insumos y herramientas necesarios para la ejecución de placa huella, alcantarillas y box culvert, así como el alquiler de maquinaria de apoyo. La interventoría verificó la calidad de los materiales recibidos y su correspondencia con las especificaciones técnicas.

3.2.4 Contratación de personal

Se formalizó la vinculación del personal requerido para obra, incluyendo la realización de exámenes de ingreso, entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP), y afiliación a los sistemas de seguridad social. Estas actividades fueron verificadas por el componente SST de la interventoría.

3.2.5 Inicio y ejecución de obras

En los frentes de obra activos se ejecutaron actividades como:

- Conformación de calzadas y adecuación de la subrasante
- Figurado y armado de acero de refuerzo
- Encofrados para losas y cabezales
- Fundidas de concreto para placas huella, vigas riostras y módulos de alcantarillas
- En el caso de las alcantarillas: excavación, instalación de tubería, construcción de cabezones en concreto y conformación de rellenos compactados

"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

3.2.6 Gestión del componente social

Se realizaron actividades de acercamiento comunitario, recolección de cotizaciones, elaboración del plan de gestión social y atención de solicitudes e inquietudes de la comunidad.

3.2.7 Socializaciones de Inicio

Se realizaron las socializaciones de inicio con cada una de las juntas donde se dio a conocer aspectos del convenio como recursos, duración, obras, y métodos de participación ciudadana.

3.2.8 Comités de participación ciudadana

Se realizaron los Comités de Participación Ciudadana los cuales constituyen el mecanismo formal mediante el cual la comunidad interviene en la toma de decisiones del convenio. En cada sesión participan el presidente de la junta, el veedor elegido por la comunidad y la interventoría, todos con voz y voto. Este comité es el encargado de evaluar, seleccionar y aprobar los proveedores, así como de autorizar las órdenes de compra necesarias para la ejecución de las obras, garantizando transparencia, control social y una adecuada administración de los recursos del proyecto.

3.2.9 Plan de Gestión Social (PIS)

Se adelanto la gestión de la recopilación de la información de las OAC para la formalizacion de las entregas iniciales del plan de inversión social (PIS)

3.2.10 Componentes financieros

Alguna Juntas efectuaron pagos de nómina, seguridad social, retenciones y realizaron la devolución de rendimientos financieros, todo bajo verificación y seguimiento del equipo financiero de la interventoría.

Como resultado de estas actividades, los convenios presentan avances diferenciados que oscilan entre el 05 % y el 30 %, dependiendo de las condiciones particulares de cada frente de obra. Si bien algunos convenios han presentado retrasos por limitaciones de suministro de

insumos, disponibilidad de maquinaria y afectaciones por lluvias, las actividades programadas continúan ejecutándose conforme a la planificación general del proyecto.

3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A corte del presente mes, el avance físico de los convenios se encuentra entre el 10 % y el 30%, reflejando un progreso continuo en la construcción de placas huella, alcantarillas y box culvert en los tres municipios del Guaviare. La interventoría ha mantenido presencia constante en los frentes de obra y ha verificado el cumplimiento de especificaciones técnicas, ambientales, sociales y financieras de acuerdo con los lineamientos del proyecto.

Estado general observado:

- Los 33 convenios se encuentran en ejecución activa.
- La mayoría de frentes avanzan conforme a lo programado en los cronogramas iniciales.
- Algunos convenios presentan demoras por:
- Falta de disponibilidad de materiales específicos en la zona
- Limitaciones temporales de maquinaria
- Brusquedad de personal

Acciones a seguir por parte de la Interventoría:

1. Seguimiento a la calidad en la compra de materiales e insumos.
2. Continuar con el acompañamiento técnico diario, verificando la correcta ejecución de conformación de calzadas, estructuras de concreto, drenajes y rellenos compactados.
3. Supervisar la calidad de materiales y procesos, asegurando que cumplan con las especificaciones de diseño y normativa aplicable.
4. Validar los balances y alcances mensuales, garantizando la correspondencia entre lo ejecutado y lo reportado por las Juntas.

5. Fortalecer los procesos administrativos y financieros, asegurando el cumplimiento de pagos, seguridad social, manejo de recursos y registro de movimientos bancarios.
6. Apoyar la gestión social, manteniendo comunicación con las comunidades y atendiendo inquietudes que puedan afectar el desarrollo de los convenios.
7. Monitorear permanentemente el cronograma, para prevenir retrasos acumulados y asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

Este capítulo se diligencia con los informes de cada Organización de Acción Comunal u Organización Comunal Étnica, los cuales son entregados el día 15 del presente mes, dado que la información financiera se emite hasta después de esta fecha.

5 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

PROCESO DE LICITACIÓN:	CO1.SLCNTR.15566296
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº:	3565 de 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4
CONTRATISTA DE OBRA:	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S

NIT:	901264150-8
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.014.395.039.00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 de diciembre del 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de octubre del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	27 de diciembre de 2024 (Periodo: 27/12/2024 hasta 16/05/2025).
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	16 de mayo de 2025 16/05/2025 hasta 12/08/2025
PRORROGA 1	TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA CON PRORROGA No.01:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA 2	UN (1) MES Y UN (1) DIA.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA CON PRORROGA No.02:	01 DE DICIEMBRE DE 2025
DIRECCIÓN:	CL 74 No. 15 - 80 INT 2 OFC 612 - BOGOTÁ D.C.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	96-44-101199269

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

La interventoría desarrolló un conjunto integral de actividades técnicas, administrativas, sociales y ambientales orientadas a garantizar la correcta ejecución de los 33 convenios a cargo, asegurando la transparencia en el uso de los recursos, la calidad de las obras y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el INVIAS y las normas vigentes. Las principales acciones ejecutadas fueron las siguientes:

5.2.1 Gestión administrativa y seguimiento financiero

- Realización y acompañamiento de los comités de participación ciudadana, garantizando la vinculación activa de la comunidad en el seguimiento de cada convenio.
- Revisión y verificación de los balances de obra, alcances y presupuestos presentados por las Juntas de Acción Comunal.
- Programación y realización de comités operativos para aprobación de los desembolsos para inicios de obra.

- Control del desembolso de los recursos asignados a cada convenio, supervisando los movimientos en las cuentas bancarias autorizadas y verificando la correcta destinación de los fondos.

5.2.2 Control técnico y aseguramiento de la calidad

- Entrega del diseño de mezcla para la producción de concretos utilizados en placas huella, aletas, cabezales y estructuras de drenaje.
- Ejecución de control de calidad en obra, incluyendo:
- topografía inicial de referencia,
- topografía de localización y replanteo de las estructuras,
- verificación de alineamientos, niveles y espesores,
- seguimiento a la correcta implementación del diseño de mezcla.
- Supervisión de la calidad de materiales, procesos constructivos y actividades de obra civil ejecutadas en los 33 frentes.

5.2.3 Verificación geotécnica, estructural y vial

- Supervisión especializada mediante la participación de los profesionales estructural, geotécnico y vial, quienes emitieron conceptos técnicos formales para cada uno de los 33 convenios, evaluando:
- condiciones del terreno,
- capacidad portante,
- adecuación de los diseños,
- compatibilidad con las obras proyectadas.

5.2.4 Gestión social y atención a la comunidad

- Atención y acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal y a los habitantes de cada vereda, resolviendo inquietudes sociales, técnicas y administrativas relacionadas con la ejecución de las obras.

- Facilitación de la comunicación entre comunidad, contratistas y entidades territoriales.

5.2.5 Gestión y cumplimiento ambiental

- Elaboración de la caracterización ambiental para cada convenio, identificando las particularidades y restricciones del entorno.
- Acompañamiento permanente a las JAC en los procesos ambientales, incluyendo:
- manejo adecuado de materiales,
- control de residuos,
- protección de fuentes hídricas,
- medidas de prevención y mitigación según la normatividad ambiental aplicable.

5.2.6 Supervisión general de obra

- Control, vigilancia y acompañamiento durante los inicios, avances y ejecución final de las obras de placa huella, alcantarillas, drenajes y demás estructuras contempladas en cada convenio.
- Verificación de que los procesos constructivos se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas, el cronograma, los presupuestos aprobados y las metas de calidad definida

5.3 Informes especialistas y profesionales.

Para garantizar la solidez técnica y la conformidad de las obras con los lineamientos establecidos por el INVIAS y las normas vigentes, la interventoría contó con el apoyo de los especialistas estructural, geotécnico y vial, quienes realizaron las revisiones correspondientes y emitieron los conceptos técnicos para cada convenio.

Es importante señalar que los informes elaborados por cada especialidad se presentan de manera independiente, debido a la profundidad técnica requerida y a la necesidad de registrar formalmente las observaciones, verificaciones y recomendaciones propias de cada disciplina.

Estos documentos que incluyen análisis de diseños, revisión de condiciones de campo, verificación de parámetros técnicos y conceptos finales fueron entregados oportunamente a la Entidad y forman parte integral del expediente de interventoría, complementando el presente informe general.

5.4 Informe del programa Anual de Caja – PAC

El Programa Anual de Caja (PAC) correspondiente al contrato de interventoría se elaboró a partir del Plan de Cargas, entendido como el documento base donde se consolida la programación del personal, los costos directos, los honorarios de los especialistas, los costos variables y la proyección mensual de los recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades técnicas, administrativas, sociales y ambientales asociadas a los 33 convenios en seguimiento.

El PAC permite organizar y prever el flujo de recursos mes a mes, asegurando que las actividades de interventoría cuenten con la disponibilidad presupuestal necesaria para atender la verificación de obras, el acompañamiento territorial, la revisión documental, la atención a las comunidades y la emisión de conceptos especializados en las áreas estructural, geotécnica y vial.

Así mismo, garantiza que la ejecución financiera esté alineada con los hitos del contrato, los frentes de obra activos y la carga operativa que demanda cada convenio.

Para efectos del presente informe, el PAC se presenta de manera integrada al Plan de Cargas, el cual consolida la programación de costos desde noviembre de 2024 hasta diciembre de 2025 y sirve como sustento técnico y financiero para la estimación del flujo de caja anual.

Dicho plan se incorpora en este capítulo mediante la imagen correspondiente, donde se visualiza la distribución de recursos proyectada para el periodo contractual.

La información contenida en el Plan de Cargas refleja la priorización y dinámica real del contrato, mostrando la relación entre la disponibilidad del equipo técnico, las dedicaciones mensuales, los ajustes derivados de las actas de costos y la atención simultánea de los 33 convenios ejecutados por las Juntas de Acción Comunal.

En conjunto, el PAC y el Plan de Cargas aseguran un control financiero adecuado, una ejecución coherente con la planificación operativa y la trazabilidad de los recursos asignados a la interventoría durante todo el periodo evaluado.

5.5 Informe matriz de riesgo.

La gestión del riesgo asociada a la ejecución de las obras fue abordada mediante la elaboración de las matrices de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para cada uno de los convenios intervenidos.

Dado que el análisis de riesgos requiere un tratamiento especializado y detallado, la interventoría presenta estas matrices de manera independiente, dentro de los informes específicos de SST que se entregan para cada convenio.

Estos documentos incluyen la identificación de peligros, la valoración del riesgo, las medidas de control propuestas y el seguimiento correspondiente durante la ejecución. Por su nivel de detalle y su carácter técnico, las matrices de riesgo forman parte del expediente de interventoría a través de los informes SST, complementando la información contenida en este informe general.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría.

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/11/25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct - 25

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3565-2024

INTERVENTORÍA: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS - AGP S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. (2107-24)(2144-24)(2147-24)(2177-24)(2180-24)(2188-24)(2251-24)(2352-24)(2359-24)(2362-24)(2565-24)(2589-24)(2590-24)(2601-24)(2604-24)(2626-24)(2628-24)(2671-24)(2704-24)(2724-24)(2725-24)(2792-24)(2796-24)(2780-24)(2826-24)(2830-24)(2835-24)(2837-24)(2966-24)(3012-24)(3173-24)(3497-24)(4323-24).

CONTRATISTA: OAC: LA REFORMA, LA MARINA 1, ALTO CACHAMA, EL TABLAZO, PALMERAS 1, SAN ISIDRO II, CAÑO RAYA BAJO, LA FLORESTA, SAN ANTONIO, BAJO JORDAN, EL DANUBIO, LA GAITANA, LA ORIENTAL, AGUA BONITA ALTA, EL BOQUERON, CERRO AZUL, CAÑO RAYA ALTO, SAN ISIDRO 1, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, CAÑO MOSCO, SAN JUAN, BRISAS DEL PALMAR, TIERRA NEGRA, UNION ALTA, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, EL PORVENIR, LA LEONA, BUENA VISTA, ALTO JORDAN, LA FUGA, EL RETIRO, AGUA BONITA Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MARCA FOTON-MODELO 2020- 2776CC -PLACAS GZO322	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MARCA JAC-MODELO 2023- 1999CC -PLACAS LQV855	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACIÓN TOTAL	TOPCON GTS 246NW SERIAL V20519 (24-01-26)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	TOPCON AT-B4 SERIAL X54986 (24-01-26)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Durante el periodo del presente mes de OCTUBRE 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de OBRA.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Fecha de mantenimiento camionetas 30 de AGOSTO de 2025

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Ing. PEDRO MAURICIO BELTRAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-0339

Firma
Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565 DE 2024 **INTERVENTOR:** ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No.: (2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24) (2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24) (2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24) (2147-24)(2352-24)(2362-24)(2830-24) (2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24) (2966-24)(2826-24)(2780-24)(2724-24) (2590-24 (2604-24)(2626-24)(3497-24) (2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24) (4323-24) **CONTRATISTA:** OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO,LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR,BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes OCTUBRE 2025 (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Pedro Mauricio Beltran Dulcey	91.158.371	Directora de obra	$ 7.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 7.400.000	$ 515.040	V	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 296.000	PROTECCION	9494180240	$ 1.184.000	$ 296.000	$ -	$ -	
2	Luz Angela Jaramillo Diaz	1.098.720.597	Residente de Interventoria	$ 5.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 5.400.000	$ 375.840	V	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 216.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 864.000	$ 216.000			
3	Diego Orlando Herrera Delgado	1.101.684.080	Residente de Interventoria	$ 5.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 5.400.000	$ 375.840	V	SALUD TOTAL	9494180240	$ 216.000	PROTECCION	9494180240	$ 864.000	$ 216.000			
4	German David Pardo Madera	91.538.070	Ingeniero de Alistamiento	$ 3.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.300.000	$ 229.680	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494180240	$ 132.000	PROTECCION	9494180240	$ 528.000	$ 132.000			
5	Brayan Alexander Meyer Ruiz	1.019.018.462	Auxiliar de Ingenieria	$ 3.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.300.000	$ 229.680	V	SANITAS	9494180240	$ 132.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 528.000	$ 132.000			
6	Ingris Margarita Coronado Fragozo	56.078.904	Profesional Social	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	V	CAJACOPI	9494180240	$ 156.000	PORVENIR	9494180240	$ 624.000	$ 156.000	$ -	$ -	
7	Kelly Johana Prada Majin	1.061.768.305	Profesional Social	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	V	SANITAS	9494180240	$ 156.000	PORVENIR	9494180240	$ 624.000	$ 156.000			
8	Ana Maria Solano Diaz	1.098.620.998	Profesional ambiental	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	V	SANITAS	9494180240	$ 156.000	PORVENIR	9494180240	$ 624.000	$ 156.000	$ -	$ -	
9	Zayra Johana Bautista Varela	1.098.668.541	Profesional ambiental	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	V	SANITAS	9494180240	$ 156.000	PORVENIR	9494180240	$ 624.000	$ 156.000			
10	Dayana Katherine Rodriguez	1.098.712.006	Profesional Financiero	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	I	SALUD MIA EPS	9494180240	$ 156.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 624.000	$ 156.000	$ -	$ -	
11	Nancy Yulieth Gonzelez vega	1.098.665.065	Profesional Financiero	$ 3.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 3.900.000	$ 271.440	I	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 156.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 624.000	$ 156.000			
12	Yerson Hernando Sierra Perez	1.123.439.731	Apoyo Social	$ 2.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 2.300.000	$ 160.080	V	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 92.000	PORVENIR	9494180240	$ 368.000	$ 92.000			
13	Steffany Xiomara Velez Lozano	1.120.581.329	Apoyo Social	$ 2.300.000,00	X X X X X X X X X X X X	40%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 920.000	$ 64.032	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494180240	$ 36.800	PROTECCION	9494180240	$ 147.200	$ 36.800			
14	Roque Andres Osorio Dulcey	13.862.188	Inspector SST	$ 2.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 2.300.000	$ 160.080	V	SALUD MIA EPS	9494180240	$ 92.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 368.000	$ 92.000			
15	Yerly Rocio Blandor Valderrama	1.117.544.211	Inspector SST	$ 2.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 2.300.000	$ 160.080	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494180240	$ 92.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 368.000	$ 92.000			
16	Jhon Alejandro Charria Ruiz	1.006.723.325	Inspector SST	$ 2.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	23%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 529.000	$ 36.818	V	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 21.160	PORVENIR	9494180240	$ 84.640	$ 21.160			
17	Jerson Villamizar	1.098.752.434	Inspector de obra	$ 2.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494180240	$ 80.000	PROTECCION	9494180240	$ 320.000	$ 80.000			
18	Nathalia Cordoba	1.018.491.568	Inspector de obra	$ 2.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 80.000	PORVENIR	9494180240	$ 320.000	$ 80.000			
19	Yannpoll Santiago Duran Perez	1.095.909.663	Tecnico Administrativo	$ 1.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S	$ 1.400.000	$ 97.440	I	NUEVA E.P.S.	9494180240	$ 56.000	COLPENSIONES	9494180240	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	

| | | |

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565 DE 2024 **INTERVENTOR:** ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2025 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: (2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24) (2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24) (2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24) (2147-24)(2352-24)(2362-24)(2830-24) (2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24) (2966-24)(2826-24)(2780-24)(2724-24) (2590-24 (2604-24)(2626-24)(3497-24) (2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24) (4323-24)

CONTRATISTA: OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO,LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR,BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	966524	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Principal	$ 2.014.395.039,00	$ 1.738.888.183,00
			TOTAL			**$ 2.014.395.039,00**	**$ 1.738.888.183,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.014.395.039,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
ACTA No. 1	NOVIEMBRE/2024	$ 41.963.160,00	$ 7.973.000,00	49.936.160,00			-	966524 Septiembre- 26-2024	$ 1.964.458.879,00	$ 1.964.458.879,00	2/07/2025	**ACTA 01**
ACTA No. 2	DICIEMBRE/2025	$ 46.614.720,00	$ 8.856.797,00	55.471.517,00			-	966524 Septiembre- 26-2025	$ 1.908.987.362,00	$ 1.908.987.362,00	2/07/2025	**ACTA 02**
ACTA No. 3	AGOSTO/2025	$ 8.750.888,00	$ 1.662.667,00	10.413.555,00			-	966524 Septiembre- 26-2025	$ 1.898.573.807,00	$ 1.898.573.807,00	16/10/2025	**ACTA 03**
ACTA No. 4	SEPTIEMBRE/2025	$ 134.189.600,00	$ 25.496.024,00	159.685.624,00			-	966524 Septiembre- 26-2025	$ 1.738.888.183,00	$ 1.738.888.183,00	16/10/2025	**ACTA 04**
ACTA No. 5	OCTUBRE/2025	$ 229.112.207,00	$ 43.531.319,00	272.643.526,00			-	966524 Septiembre- 26-2025	$ 1.466.244.657,00	$ 1.466.244.657,00	27/11/2025	**ACTA 05**
TOTALES		**460.630.575,00**	**87.519.807,00**	**548.150.382,00**		**-**	**-**		**$ 1.466.244.657,00**	**$ 1.466.244.657,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 194.086.400,00	$ 36.876.416,00	$ 230.962.816,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos,Alquiler equipos, Oficina)	$ 35.025.807,00	$ 6.654.903,00	$ 41.680.710,00
VALOR TOTAL	$ 229.112.207,00	$ 43.531.319,00	$ 272.643.526,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
Representante Legal
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
Matricula Profesional No.:A05242004-43261339

Firma
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038
Territorial: META

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024 **INTERVENTOR:** ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS - AGP S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 17/10/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2,014,395,039.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,014,395,039.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 201,439,503.90	17	10	24	5	6	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 402,879,007.80	17	10	24	5	6	25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 402,879,007.80	17	10	24	5	2	28
Calidad del servicio	30%	$ 604,318,511.70	5	2	25	5	2	30

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191894

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/10/2024

6.5 Seguimiento de Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/11/25
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4

INTERVENTOR: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS - AGP S.A.S.

FECHA DE INICIO: 17/10/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (2107-24)(2144-24)(2147-24)(2177-24)(2180-24)(2188-24)(2251-24)(2352-24)(2359-24)(2362-24)(2565-24)(2589-24)(2590-24)(2601-24)(2604-24)(2626-24)(2628-24)(2671-24)(2704-24)(2724-24)(2725-24)(2792-24)(2796-24)(2780-24)(2826-24)(2830-24)(2835-24)(2837-24)(2966-24)(3012-24)(3173-24)(3497-24)(4323-24).
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: OAC: LA REFORMA, LA MARINA 1, ALTO CACHAMA, EL TABLAZO, PALMERAS 1, SAN ISIDRO II, CAÑO RAYA BAJO, LA FLORESTA, SAN ANTONIO, BAJO JORDAN, EL DANUBIO, LA GAITANA, LA ORIENTAL, AGUA BONITA ALTA, EL BOQUERON, CERRO AZUL, CAÑO RAYA ALTO, SAN ISIDRO 1, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, CAÑO MOSCO, SAN JUAN, BRISAS DEL PALMAR, TIERRA NEGRA, UNION ALTA, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, EL PORVENIR, LA LEONA, BUENA VISTA, ALTO JORDAN, LA FUGA, EL RETIRO, AGUA BONITA Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO X--- APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de NOVIEMBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO --------x---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO --------x---- No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: _____ FECHA PROXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de NOVIEMBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de OCTUBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de NOVIEMBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de OCTUBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/11/25
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de OCTUBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	**TOPCON GTS246NW**	V20519	24-jul-25	1255 (24/07/25	24-ene-26	
2	NIVEL AUTOMATICO	**TOPCON AT-B4**	X54986	24-jul-25	1244 (24/07/25	24-ene-26	

OBSERVACIONES:

Durante el periodo del mes de OCTUBRE de 2025, el CONVENIO SOLIDARIO CONTINUA con actividades de obra.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Ing. PEDRO MAURICIO BELTRAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 682021-0339

Firma N.A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-250038CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1 1 de 1
		PÁGINA	1

FECHA: 15/09/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año) ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS COMVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDAD ÈTNICA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTODE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

JUSTIFICACIÓN:
N/A
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NOMINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000,00	$ 22.200.000,00	6,92%
2	NOMINA RESIDENTES DE INTERVENTORIA	$ 10.800.000,00	$ 10.800.000,00	$ 10.800.000,00	$ 32.400.000,00	10,10%
3	NOMINA INGENIEROS AUXILIARES DE INTERVENTORIA	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	$ 19.800.000,00	6,17%
4	NOMINA PROFESIONAL FINANCIERO	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 23.400.000,00	7,29%
5	NOMINA PROFESIONALES AMBIENTALES	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 23.400.000,00	7,29%
6	NOMINA PROFESIONALES SOCIALES	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00	$ 23.400.000,00	7,29%
7	NOMINA INSPECTOR SST	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00	$ 20.700.000,00	6,45%
8	NOMINA INSPECTORES	$ 20.000.000,00	$ 50.500.000,00	$ 50.459.212,00	$ 120.959.212,00	37,70%
9	NOMINA PROFESIONALES APOYO SOCIAL	$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00	$ 13.800.000,00	4,30%
10	NOMINA TECNICO ADMINISTRATIVO	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 4.200.000,00	1,31%
11	HONORARIOS ESPECIALISTA PAVIMENTOS O VIAS	$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00	$ 8.850.000,00	2,76%
12	HONORARIOS ESPECIALISTA GEOTECNISTA	$ 2.950.000,00	$ 1.829.000,00	$ 2.950.000,00	$ 7.729.000,00	2,41%
TOTAL		**$ 87.000.000,00**	**$ 116.379.000,00**	**$ 117.459.212,00**	**$ 320.838.212,00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
Representante Legal ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S
Interventor
Matrícula Profesional No.: A05242004-43261339

Firma:
Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND
Territorial: META

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/11/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4

INTERVENTOR: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS - AGP S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: 4674 DE 4/10/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBI 2565-2024 CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DANUBIO**

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/24 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.014.395.039,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.014.395.039,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/12/24 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: ######## (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 13/08/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de		AÑO 2024				AÑO 2025 AGP														TOTAL	
											NOVIEMBRE		DICIEMBRE		MES		MES		MES		MES		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 29.600.000					0,83	$ 6.142.000	0,86	$ 6.364.000									0,53	$ 3.922.000	1,00	$ 7.400.000	1,00	$ 7.400.000	1,00	$ 7.400.000	5,22	$ 38.628.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.100.000,00	$ 300.000,00	8,00	$ 43.200.000					0,25	$ 1.350.000	0,86	$ 4.644.000									1,06	$ 5.724.000	2,00	$ 10.800.000	2,00	$ 10.800.000	2,00	$ 10.800.000	8,17	$ 44.118.000,00
		ingeniero auxiliar	$ 3.000.000,00	$ 300.000,00	8,00	$ 26.400.000					0,90	$ 2.970.000	0,86	$ 2.838.000									1,06	$ 3.498.000	2,00	$ 6.600.000	2,00	$ 6.600.000	2,00	$ 6.600.000	8,82	$ 29.106.000,00
		profesional financiero	$ 3.900.000,00		8,00	$ 31.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -									1,06	$ 4.134.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	7,06	$ 27.534.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.900.000,00		8,00	$ 31.200.000					0,25	$ 975.000	0,50	$ 1.950.000									1,06	$ 4.134.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	7,81	$ 30.459.000,00
		Profesional Social	$ 3.900.000,00		8,00	$ 31.200.000		########			0,25	$ 975.000	0,50	$ 1.950.000									1,06	$ 4.134.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	2,00	$ 7.800.000	7,81	$ 30.459.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 47.200.000																								$ -
		Especialista en Pavimento y/o Vias	$ 5.900.000,00		1,00						0,41	$ 2.419.000	0,34	$ 2.006.000									0,53	$ 3.127.000	0,50	$ 2.950.000	0,50	$ 2.950.000	0,50	$ 2.950.000	2,78	$ 16.402.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.900.000,00		1,00						0,00	$ -	0,00	$ -									0,53	$ 3.127.000	0,50	$ 2.950.000	0,50	$ 2.950.000	0,50	$ 2.950.000	2,03	$ 11.977.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.900.000,00		1,00						0,50	$ 2.950.000	0,00	$ -									0,53	$ 3.127.000	0,31	$ 1.829.000	0,00	$ -	0,50	$ 2.950.000	1,84	$ 10.856.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.900.000,00		1,00						0,00	$ -	0,00	$ -									0,53	$ 3.127.000	0,00	$ -	0,32	$ 1.888.000	0,50	$ 2.950.000	1,35	$ 7.965.000,00
		PERSONAL TECNICO																												$ -
		Inspector SST	$ 2.300.000,00		10,50	$ 24.150.000					0,00	$ -	0,00	$ -									1,50	$ 3.450.000	3,00	$ 6.900.000	3,00	$ 6.900.000	3,00	$ 6.900.000	10,50	$ 24.150.000,00
		Inspector	$ 2.000.000,00		129,50	$ 259.000.000					0,000	$ -	0,00	$ -									17,00	$ 34.000.000	33,00	$ 66.000.000	33,00	$ 66.000.000	33,00	$ 66.000.000	116,00	$ 232.000.000,00
		Apoyo Social	$ 2.300.000,00		8,00	$ 18.400.000					0,00	$ -	0,00	$ -									1,06	$ 2.438.000	2,00	$ 4.600.000	2,00	$ 4.600.000	2,00	$ 4.600.000	7,06	$ 16.238.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												$ -
		Técnico Administrativo	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000					0,00	$ -	0,00	$ -									0,53	$ 742.000	1,00	$ 1.400.000	1,00	$ 1.400.000	1,00	$ 1.400.000	3,53	$ 4.942.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 547.150.000**						**$ 17.781.000,00**		**$ 19.752.000,00**										**$ 78.684.000,00**		**$ 134.829.000,00**		**$ 134.888.000,00**		**$ 138.900.000,00**		**$ 524.834.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**						**2,36**		**2,36**										**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1.291.274.000**						**$ 41.963.160**		**$ 46.614.720**										**$ 185.694.240,00**		**$ 318.196.440,00**		**$ 318.335.680,00**		**$ 327.804.000,00**		**$ 1.238.608.240**
		GRUPO 2 COSTOS VARIABLES																												

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024 GRUCOING NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	MES H-M	MES VALOR	MES H-M	MES VALOR	MES H-M	MES VALOR	MES H-M	MES VALOR	AÑO 2025 AGP AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		COSTOS VARIABLES: el pago de costos variables, se realiza en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del supervisor del contrato de interventoría.	$ 322.818.500,00	SEGÚN AVANCE DE OBRA	100%	$ 322.818.500																	21%	$ 67.791.885	30%	$ 96.845.550	30%	$ 96.845.550	19%	$ 61.335.515	1,00	$ 322.818.500,00
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (A2) =(B)				**$ 322.818.500,00**						**$ -**		**$ -**																	**$ 322.818.500,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS= (A) + (B) =©				**$ 1.614.092.500,00**						**$ 41.963.160**		**$ 46.614.720**																	**$ 1.561.426.740,00**
		VEEDURIA TECNICA CIUDADANA (GASTO REMMBOLSABLE) =(D)				**$ 1.200.000,00**																									**$ 1.200.000,00**
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)				**$ 77.476.440,00**																									**$ 130.142.200,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E) = (F)				**$ 1.692.768.940,00**						**$ 41.963.160**		**$ 46.614.720**																	**$ 1.692.768.940,00**
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 321.626.099,00**						**$ 7.973.000**		**$ 8.856.797**																	**$ 321.626.099,00**
	*	COSTO TOTAL = (F) + (G)				**$ 2.014.395.039,00**						**$ 49.936.160**		**$ 55.471.517**																	**$ 2.014.395.039,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se solicita prorroga del contrato **hasta el 30 de noviembre de 2025**.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes períodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada período del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **ABG. LILIAN GARCIA GRAZZIANI**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: A05242004-43261339

Firma:
Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional / 25202-250038CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 Conclusiones y recomendaciones

- El seguimiento técnico y las visitas de campo realizadas durante el periodo evaluado permitieron verificar que las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones contractuales, garantizando que los procesos constructivos avanzaran de manera ordenada, segura y con coherencia frente a los diseños aprobados.
- Las evidencias documentales, fichas técnicas y registros fotográficos recopilados demuestran que la calidad de los materiales utilizados y los procedimientos constructivos empleados cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la normativa aplicable y por las condiciones particulares del proyecto.
- El avance físico observado es consistente con la programación vigente, identificándose oportunidades de mejora en la planeación operativa, sin que estas representen un riesgo crítico para la continuidad o funcionalidad de las actividades ejecutadas bajo los convenios revisados.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer la coordinación entre contratista, interventoría y comités de participación para asegurar que las decisiones técnicas y administrativas se tomen oportunamente, evitando retrasos o reprocesos en la ejecución.
- Implementar un control más estricto sobre la disponibilidad de materiales y recursos, de manera que se mantenga la continuidad del avance y se reduzca la variabilidad en los tiempos de ejecución.
- Actualizar y ajustar la programación de actividades según las condiciones reales de campo observadas, priorizando las intervenciones que garanticen la estabilidad, durabilidad y funcionalidad de las obras proyectadas.

8 ANEXOS
