	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	13 de abril de 2026				
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	7/03/2026	Y EL	6/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (06) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	289.712.052,15
PROCESO No.:	CI-008-2025		FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01310 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 DE MAYO DE 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ONZAGA		LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ONZAGA	
NIT CONTRATISTA:	890.208.148-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	<Insertar link del proceso contractual >		APOYO SUPERVISIÓN	SAUL ANTONIO CORTES DURAN - Contratista SPL	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	7/11/2025	7/11/2025	6/05/2026	6 MESES		6/05/2026	Si	Se da inicio a l,as actividades del convenio
Prórroga No. 1	16/03/2026	7/05/2025	6/08/2026	3 MESES		6/08/2026	NO	El municipio solicitó una prórroga por 3 meses por dificultades presentadas


	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 289.712.052,15					
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00					
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 289.712.052,15					
VALOR PAGADO:	$ 83.133.125,00					
VALOR POR PAGAR:	$ 206.578.927,15					
% POR PAGAR	71,30%					
% AVANCE FINANCIERO	28,70%	TOTAL DE ADICIONES			$	-

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	19 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 83.133.125,00
TOTAL		$ 83.133.125,00

3. CURVA "S"

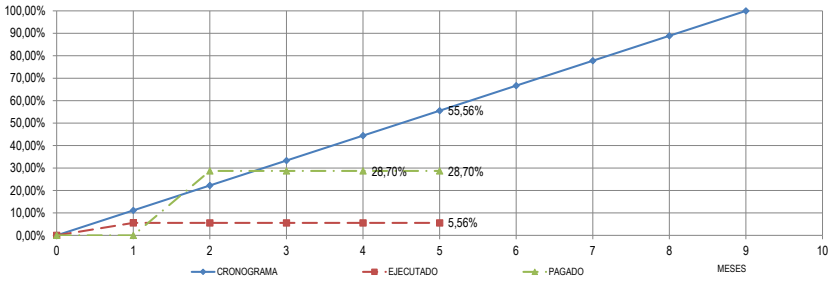

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	11,11%	5,56%	0,00%
2	22,22%	5,56%	28,70%
3	33,33%	5,56%	28,70%
4	44,44%	5,56%	28,70%
5	55,56%	5,56%	28,70%
6	66,67%		
7	77,78%		
8	88,89%		
9	100,00%		

PROGRAMADO	55,56%	
EJECUTADO	5,56%	
ATRASOS	-50,00%	
DESEMPEÑO		0,10
% PAGADO A LA FECHA	28,70%	
Pendiente por Ejecutar total	$	206.578.927,15
% POR CANCELAR A LA FECHA	71,30%	
Índice de avance financiero		5,17

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorí

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS convocó al municipio, mediante oficio No. SPL-419.2026, a una mesa de trabajo virtual con el fin de revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realizo Mesa Técnica No. 2 el 24 de Marzo de 2026 con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio de Onzaga,en la cual el municipio manifestó su compromiso de adelantar la publicación del proceso contractual correspondiente a los contratos derivados del convenio para dar inicio a la contratación

Durante el presente periodo se adelantó el trámite de la Prórroga No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 01310-2025, una vez revisada la solicitud presentada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Onzaga, se consideró viable su aprobación por el término de tres (3) meses

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 OFICIO No. SPL.419.2026 REMITIDO AL MUNICIPIO	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 COMITÉ TECNICO No. 2	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
 PRÓRROGA No.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01310 DE 2025	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
