INFORME DE MENSUAL INTERVENTORIA No. 5
CONTRATO 5034-2023

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL" PROGRAMA CAMINOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PAVAS, VEREDA LOS ESTADOS, VEREDA SABANA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, CONVENIO CON JUNTAS DE ACCION COMUNAL HATONUEVO

INTERVENTOR:
G&G INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR:
ING. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

ABRIL, 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3191, 4536, 3078, 3732 del 2023 **Contratista:** LAS PAVAS, VEREDA LOS ESTADOS, VEREDA SABANA EN MEDIO, AOJUNTAS HATONUEVO

Contrato de Interventoría No. 5034-2023 **Interventoría:** G&G INGENIEROS S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PAVAS, LOS ESTADOS, SABANA EN MEDIO, ASOJUNTAS HATONUEVO DE LOS MUNICIPIOS BARRANCAS - HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** 1-30 ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	ANEXOS PDF
1	**INTRODUCCIÓN**		7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	ANEXOS PDF
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	13
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	13
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	14
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	14
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	14
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	ANEXOS PDF
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		ANEXOS PDF
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra		
	• Actas de Reunión		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		38
5.1	Información general del contrato		38
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		39
5.3	Informes especialistas y profesionales		39
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		40
5.5	Informe matriz de riesgos.		40
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		40
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		40
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	40
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	40
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	ANEXOS PDF
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	ANEXOS PDF
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	41
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		41
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	ANEXOS PDF
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		42
8	**Anexos**		43
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. CONVENIO 3191-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PAVAS 7
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1.1. ..... *7*
2.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.2.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial *9*
2.2.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada *9*
2.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO 10
2.3.1. Información general del convenio *10*
2.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas *10*
2.3.3. Valores ejecutados *11*
2.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría *11*
2.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS. 12
2.4.2. Maquinaria y equipo convenios *12*
2.4.3. Personal y control de aportes convenios *12*
2.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 13
2.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra *13*
2.5.2. Estado general del tiempo *13*
2.5.3. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO *13*
2.5.4. Garantías del convenio *13*
2.5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA *13*
2.5.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL *13*
2.5.7. ..... *13*
2.5.8. Actas de comité de obra o actas de reunión *13*
3. CONVENIO 4536-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS ESTADOS 15
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
3.1.1. Localización del Corredor a intervenir *15*
3.1.5. Características técnicas del proyecto *17*
3.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 17
3.2.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial *17*
3.2.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada *17*
3.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO 18
3.3.1. Información general del convenio *18*
3.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas. *18*
3.3.3. Valores ejecutados *19*
3.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría *19*

3.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS 20
3.4.1. Informes Semanal 20
3.4.2. Maquinaria y equipo convenios 20
3.4.3. Personal y control de aportes convenios 20
3.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 21
3.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 21
3.5.2. Estado general del tiempo 21
3.5.3. Garantías del convenio 21
3.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 21
3.7. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 21
3.8. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA O ACTAS DE REUNIÓN 21
4. CONVENIO 3078-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SABANA EN MEDIO 23
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 23
4.1.1. Localización del Corredor a intervenir 23
4.1.2. Inventario y estado inicial sitio de las obras 24
4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS 24
4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 25
4.5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 25
4.5.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial 25
4.5.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada 25
4.6. INFORMACIÓN DEL CONVENIO 26
4.6.1. Información general del convenio 26
4.6.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas 26
4.6.3. Etapa de Revision de Estudios y Diseños 26
4.6.4. Valores ejecutados 27
4.6.5. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría 27
4.7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA ZONA A INTERVENIR. 27
4.8. CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE VEEDURÍA. 27
4.9. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO. 27
4.10. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS 27
4.10.1. Informes Semanal 27
4.10.2. Maquinaria y equipo convenios 27
4.10.3. Personal y control de aportes convenios 28
4.11. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 28
4.11.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 28
4.11.2. Estado general del tiempo 28
4.11.3. Garantías del convenio 28
5. CONVENIO 3732-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAÑADEROS 30
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 30
5.1.1. Localización del Corredor a intervenir 30

5.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales ... 31
5.1.3. MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 31
5.1.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS ... 31
5.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 32
5.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ... 32
5.2.2. Descripción / Alcance y meta física Inicial ... 32
5.2.3. Descripción / Alcance y meta física actualizada ... 32
5.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO ... 33
5.3.1. Información general del convenio ... 33
5.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas ... 33
5.3.3. Etapa de Revision de Estudios y Diseños ... 33
5.3.4. Valores ejecutados ... 33
5.3.5. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría ... 34
5.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS ... 34
5.4.1. Informes Semanal ... 34
5.4.2. Maquinaria y equipo convenios ... 34
5.4.3. Personal y control de aportes convenios ... 35
5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ... 35
5.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra ... 35
5.5.2. Estado general del tiempo ... 35
5.5.3. Garantías del convenio ... 35
5.5.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ... 35
5.5.5. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ... 35
5.5.6. Actas de comité de obra o actas de reunión ... 36
6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 37
6.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ... 37
6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ... 38
6.1.2. Actividades específicas realizadas por la interventoría ... 38
6.2. INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS ... 38
6.3. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC ... 38
6.3.1. Plan Anual de Caja Contrato de Obra ... 38
6.3.2. Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría ... 39
6.3.3. INFORME MATRIZ DE RIESGOS ... 39
6.3.4. INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS ... 39
6.4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA ... 39
6.4.1. EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA ... 39
6.5. PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 39
6.5.1. Control Personal de Interventoría ... 39
6.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ... 39
6.6.1. Informe financiero y presupuestal ... 39
6.6.2. Actas de Costos de Interventoría ... 40

6.7. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 40
6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA ... 40
6.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 40
6.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría. 40
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41
9. ANEXOS 42

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el informe n°5 del contrato de interventoría 5034 de 2023 que tiene como objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

El plan de gobierno por el cual fue contratado es Caminos comunitario para La Paz al que se le fue asignado como Supervisor del Contrato de interventoría el ingeniero DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ INVIAS. En el marco de la ejecución de los Contratos de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental para los Convenios Solidarios N.º 3191, N.º 4536, N.º 3078 y N.º 3732 Departamento de la Guajira, cuyo objetivo es el mejoramiento de vías terciarias, se presenta este informe. En el documento se detalla la gestión llevada a cabo por el contratista interventor durante en cada una de las actividades, así como las acciones tomadas por la interventoría para asegurar el cumplimiento de los pliegos de condiciones y las responsabilidades frente al contratante Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Los proyectos que están siendo supervisados por la Interventoría buscan mejorar y mantener las vías rurales del país, las cuales son esenciales para la conexión del campo colombiano. De conformidad con el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993 sobre la contratación de la Administración Pública, y considerando el monto del presupuesto oficial para los convenios solidarios de los municipios de barrancas y Hatonuevo -la Guajira en las veredas las pavas, sabana en medio, los estados y bañaderos, se presentan en este informe los avances en el cumplimiento de los objetivos establecido.

2. CONVENIO 3191-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PAVAS

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.

El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso para estas comunidades
por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3191 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda las pavas municipio de barrancas, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $200.168.754 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1.2. Localización vereda las pavas



Las Pavas es una localidad en Municipio de Barrancas, La Guajira y tiene una altitud de 1.085 metros. Las Pavas está situada circa de la localidad San Esteban y Proteína.

2.1.3. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

2.1.4. MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Barrancas del departamento de La Guajira, la Vereda las pavas , cuenta con un corregimiento cercano como lo es san pedro La ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial .

2.1.5. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

El tramo por intervenir corresponde a 170 m de material afirmado en estado regular según lo presupuestado inicialmente. Este no tiene una adecuada conformación se está a la espera de entrega de estudios y diseños para confirmar la cantidad total de mejoramiento que se ejecutara.





Estado inicial de vía -vereda las pavas -Barrancas la Guajira

2.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpieza s de alcantarillas	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box Culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRANCAS	JAC VEREDA LAS PAVAS	1,65	0	0	170	0	0	0	0

2.2.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (km)	Limpiezas de alcantarillas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRANCAS	JAC VEREDA LAS PAVAS	1,65							

Metafísica actualizada

para el periodo que abarca el presente informe, la JAC inicio la etapa de estudios y diseños, por lo que la metafísica actualizada no ha sido determinada.

2.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

2.3.1. Información general del convenio

CONVENIO SOLIDARIO:	3191-2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PAVAS- BARRANCAS LA GUAJIRA
REP. LEGAL	ESNEYDER ANTONIO PINTO
NIT:	901.288.959
VALOR DEL CONTRATO:	$200.168.754
ORDEN DE INICIO:	27/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2023
REANUDACIÓN No.1	18/01/2024
PRORROGA No.1	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191 - 2023-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2024

2.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas

Para el periodo que abarca el presente informe, el convenio se encuentra en etapa de revisión de estudios de topografía y de suelo seguidamente, se procederá a realizar ajuste de estudios y diseños. Y serán aprobados por parte de la interventoría.

2.3.3. Valores ejecutados

			EJECUTADO			SALDO
DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BASICO DE OBRA	145.578.911,00	145.578.911,00	0	0	0	145.578.911,00
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.367.367,00	4.367.367,00	0	0	0	4.367.367,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.222.476,00	49.222.476,00	0	0	0	49.222.476,00
TOTAL	200.168.754,00	200.168.754,00	0	0	0	200.168.754,00

2.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Una vez se establezca el primer comité operativo e inicien con los pagos a proveedores, esta información será relacionada en los siguientes formatos: No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS", "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIO"

En este periodo reportado se realizó el seguimiento y acompañamiento en las siguientes actividades:

- Socialización del proyecto en la zona a intervenir.
- Conformación de comité de veeduría.
- Conformación del comité operativo.
- Toma de muestras de suelo en campo.
- Visitas del comité topográfico.
- Revisión de cotizaciones presentadas por el OAC.
- Participación de reunión de seguimiento junto con la supervisión.
- Autorización de desembolsos a proveedores para revisión y ajuste de estudios y diseños.
- Requerimientos de plan de inversiones, plan de compra y programación de obra, contratos de prestación de servicio y socialización del convenio.

2.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS.

2.4.1.1. Informes Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

• Semana 1: Desde el 01 de abril de 2024 al 04 de abril de 2024.
• Semana 2: Desde el 05 de abril de 2024 al 11 de abril de 2024
• Semana 3: Desde el 12 de abril de 2024 al 18 de abril de 2024.
• Semana 4: Desde el 19 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024.
• Semana 5: Desde el 26 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024.

2.4.2. Maquinaria y equipo convenios

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.4.3. Personal y control de aportes convenios

2.4.3.1. Control del Personal de convenios

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	JOSE MARQUEZ	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
2	ROSMIRA OJEDA	CONTADOR	01/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
3	NELSON GONZALES	TESORERO	01/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

2.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Aun no se han iniciado los comités operativos para pagos y desembolsos por lo tanto no se anexa (MEPI- MN1-IN-15-FR-8).

2.5.2. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.
No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.5.3. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo que abarca el presente informe no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN15-FR-11 Correspondiente a resultado de los ensayos de laboratorio efectuados durante el periodo, debido a que se tomaron muestras, pero no se han obtenido resultados.

2.5.4. Garantías del convenio

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN- 15-FR-12.

2.5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.5.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal

2.5.7. Actas de comité de obra o actas de reunión

realizó comité de socialización del proyecto el día 24 de febrero del 2024, en el cual se le explico a la comunidad todos los pasos a seguir para realizar el proyecto a satisfacción de acuerdo con los requerimientos del instituto nacional de vías, INVIAS.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5
	JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO	G&G INGENIEROS S.A.S	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			

FECHA	REUNION/COMITÉ	DESCRIPCION
24/02/2024	**socialización de convenio**	Se realizó la socialización del Convenio 3191-2023 por parte de Invías e Interventoría a la vereda las pavas Se definieron las personas que conformaran el comité operativo.

3. CONVENIO 4536-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS ESTADOS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.
El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso para estas comunidades
por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4536 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda los estados municipio de barrancas, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $200.257.364 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

3.1.1. Localización del Corredor a intervenir



Los estados es una localidad en Municipio de Barrancas, La Guajira y tiene una altitud de 1.085 metros. Las Pavas está situada circa de la localidad San Esteban y Proteína.

3.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

3.1.3. MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Barrancas del departamento de La Guajira, la vereda los estados , No cuenta con corregimientos cercanos , La ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial.

3.1.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

El tramo por intervenir corresponde a 140 m de material afirmado en estado regular según lo presupuestado inicialmente. Este no tiene una adecuada conformación se está a la espera de entrega de estudios y diseños para confirmar la cantidad total de mejoramiento que se ejecutara.



Estado inicial de vía -vereda los estados -Barrancas la Guajira

3.1.5. Características técnicas del proyecto

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZAS DE ALCANTARILLAS	ROCERIA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS	BOX CULVER T	BOX CULVERT	MUROS EN GAVIONES	CUNETAS
0	0	140	1	0	0	0	0

Tabla 4. Características técnicas del convenio Fuente: Presupuesto del convenio.

3.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.2.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpiezas de alcantarillas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRANCAS	JAC VEREDA LOS ESTADOS	12,7	0	0	140	1	0	0	0

Tabla 5. Metafísica inicial Fuente: Presupuesto estimado del convenio.

3.2.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpieza s de alcantarillas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRANCAS	JAC VEREDA LOS ESTADOS	12,7							

Tabla 6. metafísica actualizada para el periodo que abarca el presente informe, la JAC inicio la etapa de estudios y diseños, por lo que la metafísica actualizada no ha sido determinada.

3.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

3.3.1. Información general del convenio

CONVENIO SOLIDARIO:	4536-2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ESTADOS- BARRANCAS LA GUAJIRA
REP. LEGAL	ANAIRIS MONTES ROJAS
NIT:	900.547.008-1
VALOR DEL CONTRATO:	$200.257.364
ORDEN DE INICIO:	28/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2023
REANUDACIÓN No.1	18/01/2024
PRORROGA No.1	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191 - 2023-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2024

3.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas.

Para el periodo que abarca el presente informe, el convenio se encuentra en etapa de revisión de estudios de topografía y de suelo seguidamente, se procederá a realizar ajuste de estudios y diseños. Y serán aprobados por parte de la interventoría.

3.3.3. Valores ejecutados

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BASICO DE OBRA	145.664.608		0	0	0	145.664.608
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.369.938		0	0	0	4.369.938
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.222.818		0	0	0	49.222.818
TOTAL	200.257.364		0	0	0	200.257.364

3.3.4. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Una vez se establezca el primer comité operativo e inicien con los pagos a proveedores, esta información será relacionada en los siguientes formatos: No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS", "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS.

En este periodo reportado se realizó el seguimiento y acompañamiento en las siguientes actividades:

- Socialización del proyecto en la zona a intervenir
- Conformación de comité de veeduría
- Conformación del comité operativo
- Toma de muestras de suelo en campo
- Visitas del comité topográfico
- Revisión de cotizaciones presentadas por el OAC
- Participación de reunión de seguimiento junto con la supervisión.
- Autorización de desembolsos a proveedores para revisión y ajuste de

estudios y diseños.

- ❖ Requerimientos de plan de inversiones, plan de compra y programación de obra, contratos de prestación de servicio y socialización del convenio.

3.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

3.4.1. Informes Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

• Semana 1: Desde el 01 de abril de 2024 al 04 de abril de 2024.
• Semana 2: Desde el 05 de abril de 2024 al 11 de abril de 2024
• Semana 3: Desde el 12 de abril de 2024 al 18 de abril de 2024.
• Semana 4: Desde el 19 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024.
• Semana 5: Desde el 26 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024.

3.4.2. Maquinaria y equipo convenios

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

3.4.3. Personal y control de aportes convenios

*3.4.3.1. **Control del Personal de convenios***

Para el periodo de febrero de 2024, Interventoría aprobó la vinculación del personal de la JAC, la cuales realizaron contrato de prestación de servicios el personal aprobado, relacionado a continuación con:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	ROSMIRA OJEDA	CONTADOR	01/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
2	LEIVER GOMEZ	MAESTRO DE OBRA	01/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

3.4.3.2. Control de aportes legales y seguridad social convenios

Para el periodo que abarca el presente informe no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN15-FR-6 correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social del personal vinculado por parte del OAC, debido a que el inicio del personal fue el 29 de abril.

3.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Aun no se han iniciado los comités operativos para pagos y desembolsos por lo tanto no se anexa formato (MEPI-MN1-IN-15-FR-8).

3.5.2. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

3.5.3. Garantías del convenio

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN- 15-FR-12.

3.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente

3.7. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal

3.8. Actas de comité de obra o actas de reunión

realizó comité de socialización del proyecto el día 26 de febrero del 2024, en el cual se le explico a la comunidad todos los pasos a seguir para realizar el proyecto a satisfacción de acuerdo a los requerimientos del instituto nacional de vías, INVIAS.

<table>
<tr><td rowspan="3">
</td><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</td><td rowspan="3">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5</td></tr>
<tr><td>JAC: LAS PAVAS, SABANA EN MEDIO, LOS ESTADOS Y HATONUEVO</td><td>G&G INGENIEROS S.A.S</td></tr>
<tr><td>CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3191-2023, 4536-2023, 3078-2023, 3732-2023</td><td>CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5034 de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</td></tr>
</table>

FECHA	REUNION/COMITÉ	DESCRIPCION
26/02/2024	socialización de convenio	Se realizó la socialización del Convenio 4536-2023 por parte de Invías e Interventoría a la vereda los estados Se definieron las personas que conformaran el comité operativo.

4. CONVENIO 3078-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SABANA EN MEDIO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.
El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso para estas comunidades
por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3078 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda sabana en medio municipio de barrancas, Departamento de La Guajira, a la fecha aún no ha se han reflejado los recursos asignados por un valor de $196.812.797 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

4.1.1. Localización del Corredor a intervenir



Sabana en medio es una localidad en Municipio de Barrancas, La Guajira y tiene una altitud de 1.085metros. Las Pavas está situada circa de la localidad San Esteban y Proteína.

4.1.2. Inventario y estado inicial sitio de las obras

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC ya que a la fecha no se han consignado los recursos al convenio.

4.2. MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Barrancas del departamento de La Guajira, la vereda sabana en medio , No cuenta con corregimientos cercanos , pero si esta aledaña al complejo carbonífero de mina (CERREJON) la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial .

4.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

El tramo por intervenir corresponde a 170 m de material afirmado en estado regular según lo presupuestado inicialmente. Este no tiene una adecuada conformación se está a la espera de entrega de estudios y diseños para confirmar la cantidad total de mejoramiento que se ejecutara.



Estado inicial de vía -vereda Sabana en medio -Barrancas la Guajira

4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZAS DE ALCANTARI LLAS	ROCERIA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS	BOX CULVER T	BOX CULVERT	MUROS EN GAVION ES	CUNETAS
0	0	170	1	0	0	0	0

Tabla 7. Características técnicas del convenio Fuente: Presupuesto del convenio

4.5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.5.1. Descripción / Alcance y meta física Inicial

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpieza s de alcantari llas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantari lla	Box culve rt	Muros en gavione s	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRA NCAS	JAC VEREDA SABANA EN MEDIO	1,8	0	0	170	0	0	0	0

Tabla 8. Metafísica inicial Fuente: Presupuesto estimado del convenio

4.5.2. Descripción / Alcance y meta física actualizada

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpieza s de alcantari llas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRA NCAS	JAC VEREDA SABANA EN MEDIO	1,8							

Tabla 9. metafísica actualizada para el periodo que abarca el presente informe, la JAC ESTA A LA ESPERA DE DESEMBOLSOS DE RECURSOS.

4.6. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.6.1. Información general del convenio

CONVENIO SOLIDARIO:	3078-2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA EN MEDIO- BARRANCAS LA GUAJIRA
REP. LEGAL	YALENIS JOSEFA MEDINA SARMIENTO
NIT:	901.665.719-9
VALOR DEL CONTRATO:	$196.812.197
ORDEN DE INICIO:	20/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2023
REANUDACIÓN No.1	18/01/2024
PRORROGA No.1	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191 - 2023-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2024

4.6.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas

Para el periodo que abarca el presente informe, no se han ejecutado obras de mejoramiento.

4.6.3. Etapa de Revision de Estudios y Diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC no cuenta con estudios de topografía y diseños ya que aún no se ha realizado el desembolso de recursos.

4.6.4. Valores ejecutados

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BASICO DE OBRA						
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
TOTAL	196.812.797					196.812.797

4.6.5. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

En este periodo reportado se realizó el seguimiento y acompañamiento en las siguientes actividades:

- Socialización del proyecto en la zona a intervenir.
- Conformación de comité de veeduría.
- Conformación del comité operativo.

4.7. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.7.1. Informes Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

• Semana 1: Desde el 01 de abril de 2024 al 04 de abril de 2024.
• Semana 2: Desde el 05 de abril de 2024 al 11 de abril de 2024
• Semana 3: Desde el 12 de abril de 2024 al 18 de abril de 2024.
• Semana 4: Desde el 19 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024.
• Semana 5: Desde el 26 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024.

4.7.2. Maquinaria y equipo convenios

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión y aun no se han asignado recursos.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

4.7.3. Personal y control de aportes convenios

4.7.3.1. ***Control del Personal de convenios***

Para el periodo de febrero de 2024, Interventoría aprobó la vinculación del personal de la JAC, la cuales realizaron contrato de prestación de servicios el personal aprobado, relacionado a continuación con:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	ROSMIRA OJEDA	CONTADOR	SIN DEFINIR	PRESTACION DE SERVICIOS

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

4.8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.8.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Aun no se han iniciado los comités operativos para pagos y desembolsos ya que el convenio no ha recibido recursos por lo tanto no se anexa (MEPI-MN1-IN-15-FR-8).

4.8.2. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.
No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO"

4.8.3. Garantías del convenio

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN- 15-FR-12.

4.8.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

4.8.5. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal

4.8.6. Actas de comité de obra o actas de reunión

realizó comité de socialización del proyecto el día 26 de febrero del 2024, en el cual se le explico a la comunidad todos los pasos a seguir para realizar el proyecto a satisfacción de acuerdo a los requerimientos del instituto nacional de vías, INVIAS.


FECHA	REUNION/COMITÉ	DESCRIPCION
26/02/2024	socialización de convenio	Se realizó la socialización del Convenio -3078 2023 por parte de Invías e Interventoría a la vereda sabana en medio Se definieron las personas que conformaran el comité operativo.

5. CONVENIO 3732-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAÑADEROS

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.
El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso para estas comunidades
por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3732 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda los bañaderos municipio de Hatonuevo, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $195.608.093 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

5.1.1. Localización del Corredor a intervenir

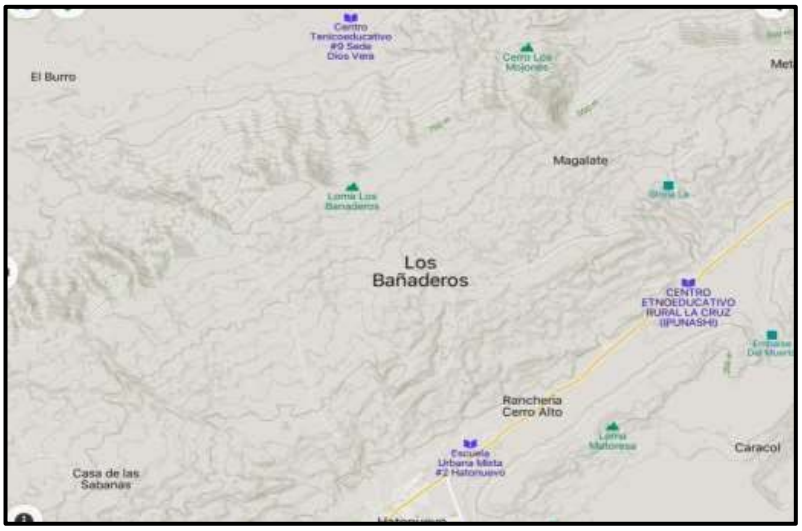

Los Bañaderos es una localidad en Hatonuevo, La Guajira. Los Bañaderos está situada circa de la aldea ranchería Cerro Alto y de la localidad Magalate.

5.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

5.1.3. MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Hatonuevo del departamento de La Guajira, la Vereda los bañaderos , no cuenta con corregimientos cercanos pero si es de constante acceso ya que cerca esta una base militar La ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial.

5.1.4. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

El tramo por intervenir corresponde a 170 m de material afirmado en estado regular según lo presupuestado inicialmente. Este no tiene una adecuada conformación se está a la espera de entrega de estudios y diseños para confirmar la cantidad total de mejoramiento que se ejecutara.



Estado inicial vereda los bañaderos

5.2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZAS DE ALCANTARILLAS	ROCERIA (HA)	PLACA HUELLA (ML)	ALCANTARILLAS	BOX CULVERT	BOX CULVERT	MUROS EN GAVIONES	CUNETAS
0	0	170	0	0	0	0	0

Tabla 10. Características técnicas del convenio Fuente: Presupuesto del convenio.

5.2.2. Descripción / Alcance y meta física Inicial

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municipio	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km	Limpiezas de alcantarillas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRANCAS	JAC VEREDA LOS BAÑADEROS	1,8	0	0	170	0	0	0	0

Tabla 11. Características técnicas del convenio Fuente: Presupuesto del convenio.

5.2.3. Descripción / Alcance y meta física actualizada

				MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO				
Departamento	Municip io	Acción Comunal	Longitud del corredor (Km)	Limpiezas de alcantarillas (UND)	Rocerías	Placa huella (m)	Alcantarilla	Box culvert	Muros en gaviones	Cunetas
LA GUAJIRA	BARRA NCAS	JAC VEREDA LOS BAÑADEROS	1,8							

Tabla 12. Metafísica actualizada para el periodo que abarca el presente informe, la JAC inicio la etapa de estudios y diseños, por lo que la metafísica actualizada no ha sido determinada.

5.3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

5.3.1. Información general del convenio

CONVENIO SOLIDARIO:	3732-2023
CONTRATISTA:	JUNTADE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE HATONUEVO
REP. LEGAL	ALBEIRO JOSE LOZANO RODRIGUEZ
NIT:	900.034.978-9
VALOR DEL CONTRATO:	$195.608.093
ORDEN DE INICIO:	20/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2023
REANUDACIÓN No.1	18/01/2024
PRORROGA No.1	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3191 - 2023-PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR TRES (3) MESES
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2024

5.3.2. Descripción de actividades ejecutadas en el período y acumuladas

Para el periodo que abarca el presente informe, no se han ejecutado obras de mejoramiento.

5.3.3. Etapa de Revision de Estudios y Diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, el convenio se encuentra en etapa de revisión de estudios de topografía y de suelo seguidamente, se procederá a realizar ajuste de estudios y diseños. Y serán aprobados por parte de la interventoría.

5.3.4. Valores ejecutados

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BASICO DE OBRA	143.481.280,0					143.481.280,0
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.304.378,0					4.304.378,0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.822.375,0					46.822.375,0
TOTAL	195.608.033,0					195.608.033,0

5.3.5. Estado de avance y acciones a seguir por la interventoría

Una vez se establezca el primer comité operativo e inicien con los pagos a proveedores, esta información será relacionada en los siguientes formatos: No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS", "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS.

En este periodo reportado se realizó el seguimiento y acompañamiento en las siguientes actividades:

- Socialización del proyecto en la zona a intervenir
- Conformación de comité de veeduría
- Conformación del comité operativo
- Toma de muestras de suelo en campo
- Visitas del comité topográfico
- Revisión de cotizaciones presentadas por el OAC
- Participación de reunión de seguimiento junto con la supervisión.
- Autorización de desembolsos a proveedores para revisión y ajuste de estudios y diseños.
- Requerimientos de plan de inversiones, plan de compra y programación de obra, contratos de prestación de servicio y socialización del convenio.

5.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

5.4.1. Informes Semanal.

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

• Semana 1: Desde el 01 de abril de 2024 al 04 de abril de 2024.
• Semana 2: Desde el 05 de abril de 2024 al 11 de abril de 2024
• Semana 3: Desde el 12 de abril de 2024 al 18 de abril de 2024.
• Semana 4: Desde el 19 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024.
• Semana 5: Desde el 26 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024.

5.4.2. Maquinaria y equipo convenios

Durante el periodo del presente informe no se tiene maquinaria en obra, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra con elaboración y entrega de documentos iniciales y revisión. No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

5.4.3. Personal y control de aportes convenios

5.4.3.1. Control del Personal de convenios

Para el periodo de febrero de 2024, Interventoría aprobó la vinculación del personal de la JAC, la cuales realizaron contrato de prestación de servicios el personal aprobado, relacionado a continuación con:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	ALFREDO SIERRA	CONTADOR	01/04/2024	PRESTACION DE SERVICIOS

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5.5.1. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Aun no se han iniciado los comités operativos para pagos y desembolsos por lo tanto no se anexa (MEPI- MN1-IN-15-FR-8).

5.5.2. Estado general del tiempo.

Durante el mes de abril de 2024, no se realizaron actividades en obra, por lo que el registro de bitácora por parte del residente de obra no contiene el reporte de horas lluvia.
No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

5.5.3. Garantías del convenio

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN- 15-FR-12.

5.5.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

5.5.5. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal

5.5.6. Actas de comité de obra o actas de reunión

realizó comité de socialización del proyecto el día 28 de febrero del 2024, en el cual se le explico a la comunidad todos los pasos a seguir para realizar el proyecto a satisfacción de acuerdo con los requerimientos del instituto nacional de vías, INVIAS.

FECHA	REUNION/COMITE	DESCRIPCION
28/02/2024	socialización de convenio	Se realizó la socialización del Convenio 3732-2023 por parte de Invías e Interventoría a la vereda los bañaderos Se definieron las personas que conformaran el comité operativo.

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO DE SELECCIÓN:	IP-DT-GUA-015-2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	5034-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/12/2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN LOS MUNICIPIOS BARRANCAS-HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONTRATISTA:	G&G INGENIEROS SAS
NIT:	800.208.226-4
VALOR INICIAL:	$77.675.231,00
VALOR ADICIONAL:	$0
ORDEN DE INICIO:	27/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
SUSPENSIÓN No.1:	30/12/2023
REANUDACIÓN No.1	18/01/2024
PRORROGA No.1	18/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2024
DIRECCIÓN:	BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 Primer piso
TELEFONO:	6662421
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

6.1.2. Actividades específicas realizadas por la interventoría

Seguimiento a la conformación de veeduría

- Confirmación de comité operativo del convenio
- Revisión de cotizaciones allegados por el OAC
- Participación de reunión de seguimiento junto con la supervisión.
- Autorización de desembolsos a proveedores para revisión y ajuste de estudios y diseños.
- Requerimientos de plan de inversiones, plan de compra y programación de obra, contratos de prestación de servicio y socialización del convenio.

6.2. INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

Informe técnico.
En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se remite informe mensual de cada convenio.

Informe social
En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron actividades en el área social, se anexa informe.

Informe ambiental
En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades en el área ambiental.

Informe SST
En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades en el área de SST, debido a que, a la fecha, no han adelantado las actividades de obra.

Informes especialistas
En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades por parte de los especialistas, debido a que la JAC le inició la etapa de revisión de estudios y diseños, y no ha sido entregado los respectivos informes.

6.3. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

6.3.1. Plan Anual de Caja Contrato de Obra

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

6.3.2. Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

6.3.3. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A corte del presente informe no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

6.3.4. INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A la fecha del presente informe no se cuenta con información del aplicativo que se debe gestionar

6.4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA

6.4.1. EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

Para el período que abarca el presente informe no diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 correspondiente a equipo ya que a la fecha no se encuentran equipos vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

6.5. PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.5.1. Control Personal de Interventoría

El personal aprobado que laboró durante todo el periodo exigido por el INVIAS se discrimina de la siguiente manera:

No.	Nombre	Cargo
1.	JORGE LUIS GAMARRA	Director Interventoría
2.	SIXTA ESTEFANY HERNANDEZ	Residente de Interventoría
3.	EVIANTHNEY MAGALLANES	Social interventoría
4.	PAULINA DAZA VENCE	Ing. ambiental interventoría

6.6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.6.1. Informe financiero y presupuestal

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

6.6.2. Actas de Costos de Interventoría

Acta No	Mes/Año de ejecución	Valor sin IVA	Valor IVA	Valor Total ejecutado Acumulado Acta	Saldo del contrato
1	Diciembre 23			77.675.231	77.675.231
2	Enero24			77.675.231	77.675.231
3	Febrero 24			77.675.231	77.675.231
4	Marzo 24			77.675.231	77.675.231
5	Abril 24	$ 11.699.268	$ 2.222.861	$ 13.922.129	63.753.111

6.7. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

6.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría.

El contrato de interventoría no cuenta con anticipo, por lo que no aplica el seguimiento de inversión del anticipo.

7. Control de correspondencia

Fecha	Referencia-Radicado	Asunto	Envía	Recibe
01/04/2024	Email	Ingreso del personal	Interventoría	Supervisión
10/04/2024	Email	Invitación-capacitación social	supervisión	interventoría
16/04/2024	Email	Compromisos-capacitación social	supervisión	interventoría
23/04/2024	Email	Solicitud de prorrogas	interventoría	supervisión
26/04/2024	Email	Formatos para aprobación de estudios y diseños	supervisión	interventoría

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se elabora informe de interventoría N. 5 del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril del 2024, en el cual se conformaron las veedurías y comités operativos, se autorizó el personal, de los convenios y se encuentra en etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños. Para el próximo periodo se conceptuarán estos mismo y se prevé el arranque físico de la obra.

De acuerdo con el avance del proyecto de interventoría se tiene un avance programado del 41.7 y ejecutado del 17.9%, lo que nos indica que presentamos retrasos en lo ejecutado.

Para el convenio N.º 3078 – 2023 aún no se cuenta con los recursos designados para dar ejecución.

Se realizo junto la Socialización de los proyectos, haciendo énfasis en el beneficio que traerá para la comunidad aledaña el mejoramiento de los caminos vecinales, sin pasar por alto señalar las afectaciones transitorias de la movilidad, y resaltar los riesgos durante la ejecución, en cumplimiento de lo establecido.

La interventoría fue clara al momento de brindar toda la información correspondiente a las JAC sobre el proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones que imparte el instituto nacional de vías, INVIAS.

9. ANEXOS
