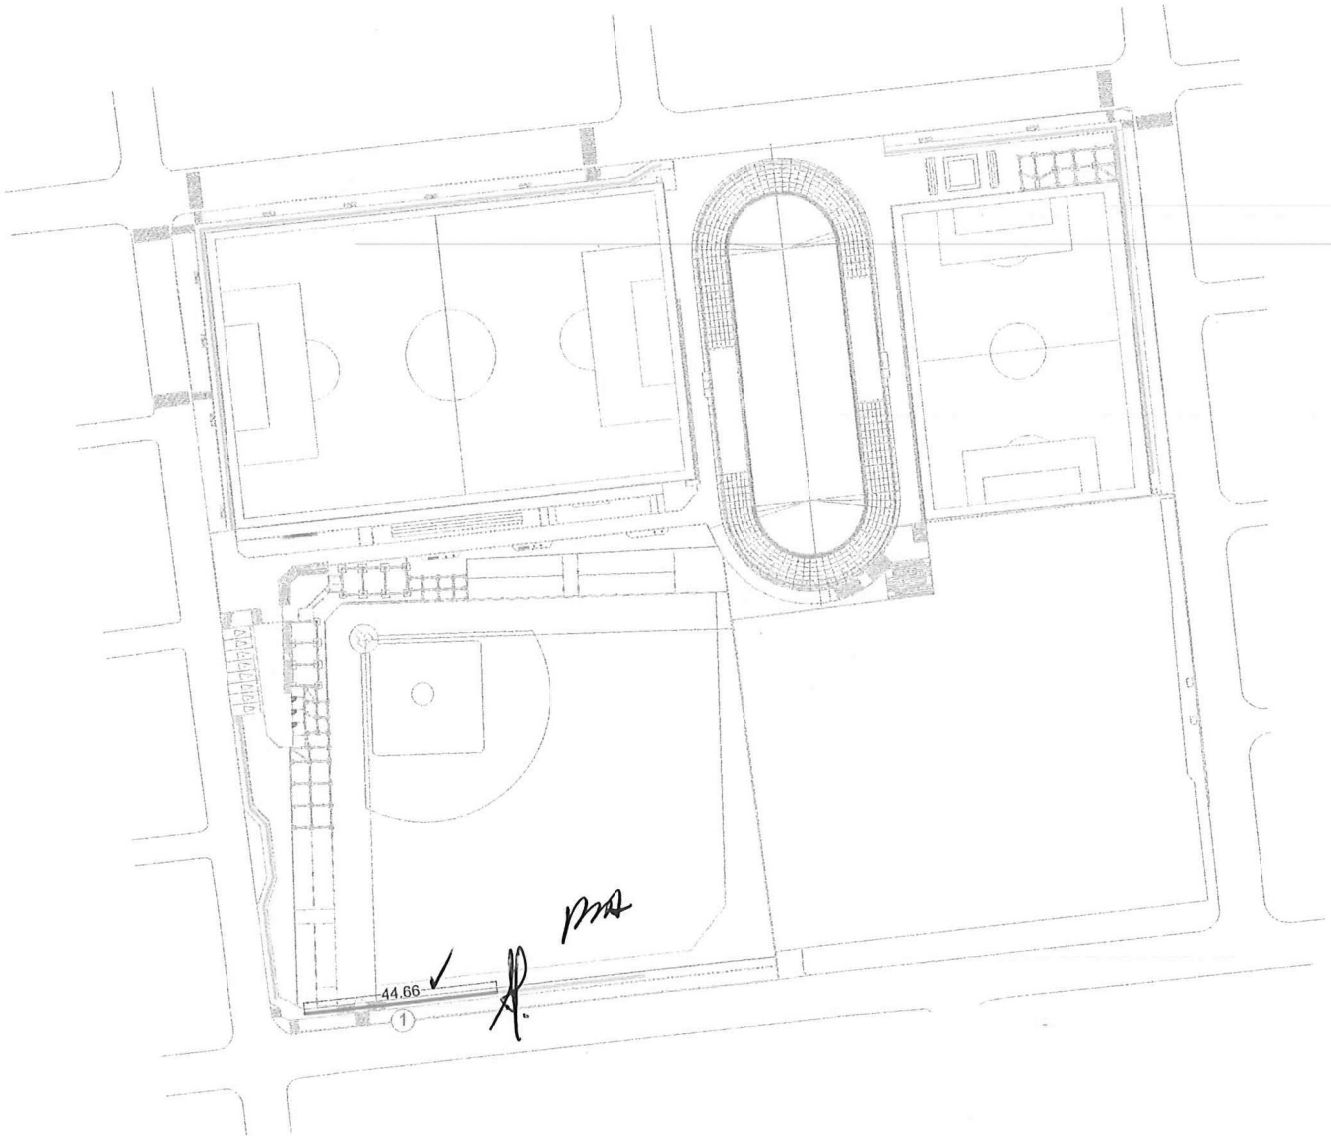


NP- 53. LOSETA GUÍA PREFABRICADA 0.20 x 0.20 mts PARA ANDENES PERIMETRALES

Acumulado Presente acta

CPDP 061


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP - 71	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PUNTO DE ANCLAJE EPOXICO DIAM < 5/8"

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

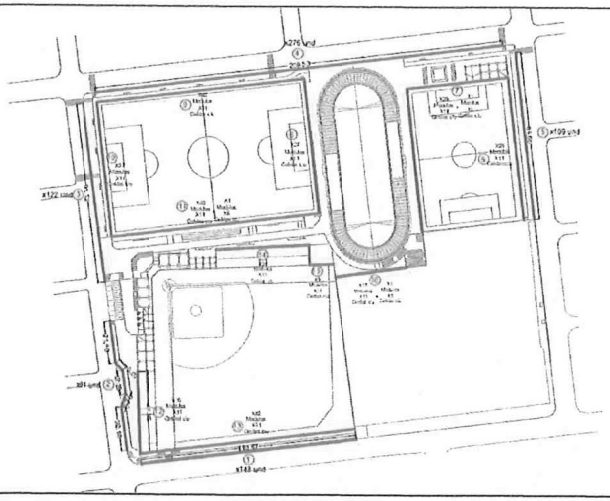

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
ZONA 1	BEISBOL / CRA 6B				1.00	128.00	128.00		
ZONA 2	BEISBOL / CALLE 38B				1.00	91.00	91.00		
ZONA 3	FUTBOL NO. 01 / CALLE 38B				1.00	122.00	122.00		
ZONA 4	CARRERA 7C				1.00	276.00	276.00		
ZONA 5	CALLE 36B				1.00	109.00	109.00		
ZONA 6	FUTBOL No. 02 / OESTE				25.00	11.00	275.00		
ZONA 7	FUTBOL No. 02 / NORTE				20.00	11.00	220.00		
					1.00	8.00	8.00		
ZONA 8	FUTBOL No. 01 / ESTE				27.00	11.00	297.00		
ZONA 9	FUTBOL No. 01 / NORTE				42.00	11.00	462.00		
ZONA 10	FUTBOL No. 01 / OESTE				27.00	11.00	297.00		
ZONA 11	FUTBOL No. 01 / SUR				40.00	11.00	440.00		
					1.00	6.00	6.00		
ZONA 12	ESTADIO DE BEISBOL / ESTE				16.00	11.00	176.00		
ZONA 13	ESTADIO DE BEISBOL / SUR				42.00	11.00	462.00		
ZONA 14	JAULA BATEO 1RA BASE				20.00	11.00	220.00		
ZONA 15	ZONA BIOSALUSABLES				9.00	11.00	99.00		
ZONA 16	PISTA PATINAJE / COLEGIO				17.00	11.00	187.00		
					1.00	5.00	5.00		

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	4,985.00
Acumulado anterior	1105.00
Acumulado a presente acta	4985.00
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	3,880.00
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 062

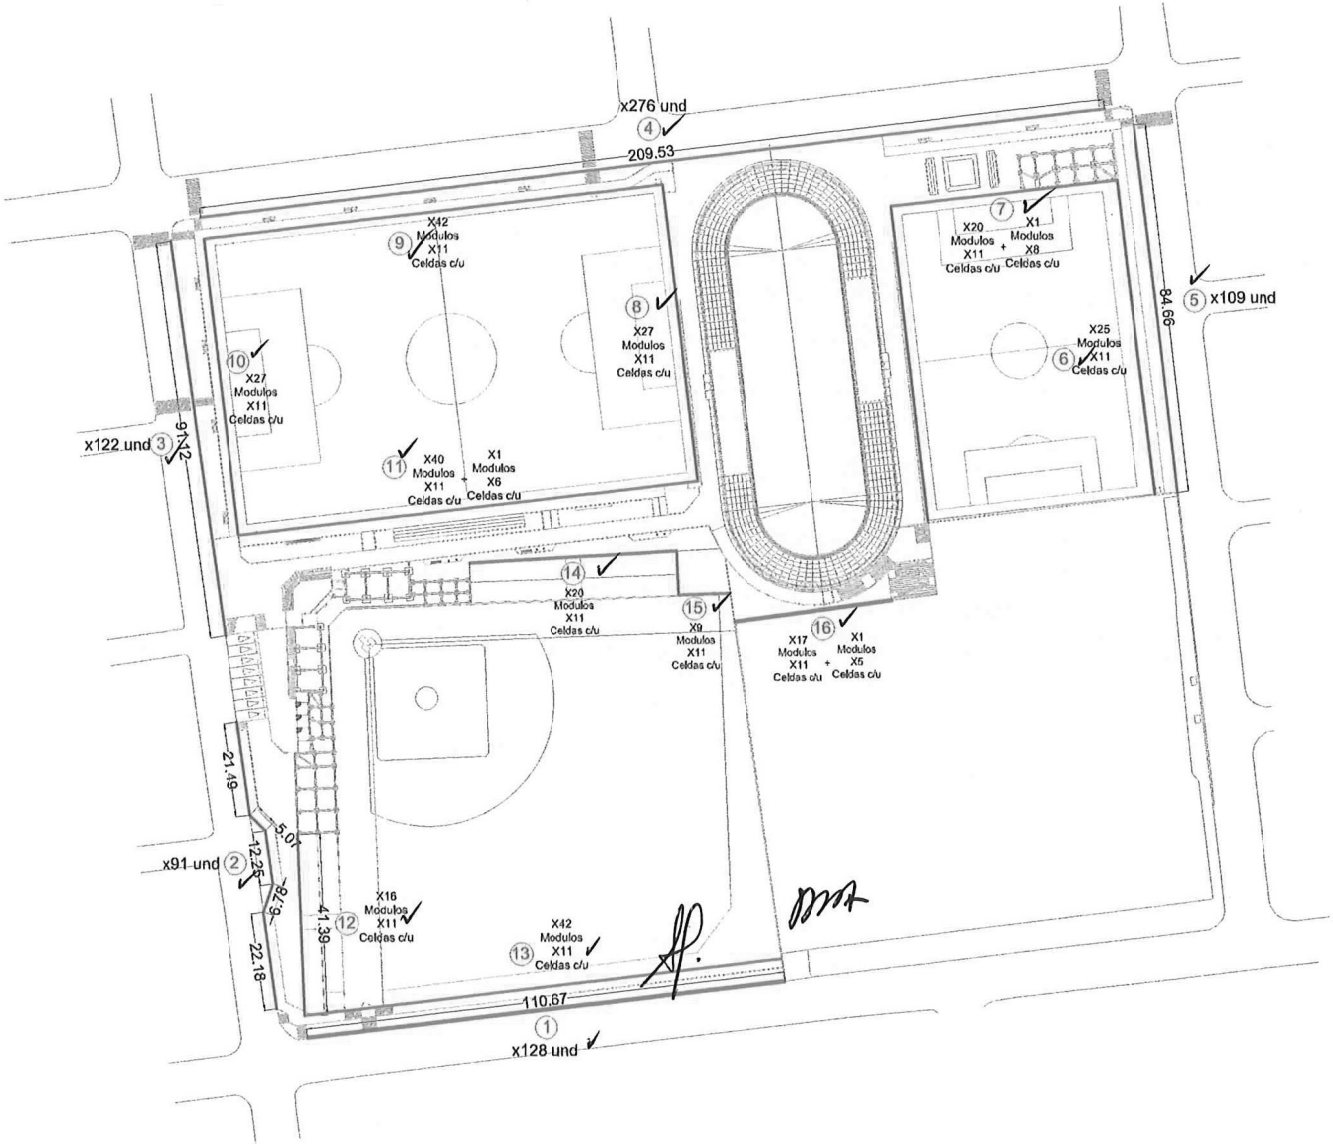

NP - 71. PUNTO DE ANCLAJE EPOXICO DIAM < 5/8"

Acumulado Presente acta

CPDP 063


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 97	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA DE CUBIERTA RING DE BOXEO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

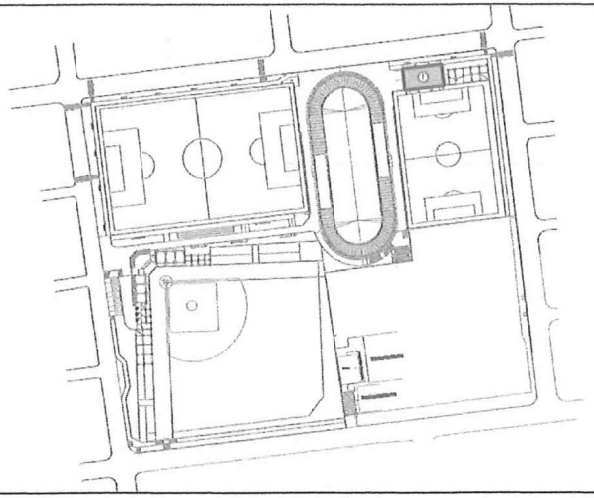

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES GLB	M2	M3
ZONA 1	RING DE BOXEO					1.00 ✓	1.00 ✓		

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	1.00 ✓
Acumulado anterior	0.00 ✓
Acumulado a presente acta	1.00 ✓
Obra por ejecutar	0.00 ✓

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	1.00 ✓ OK
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 064

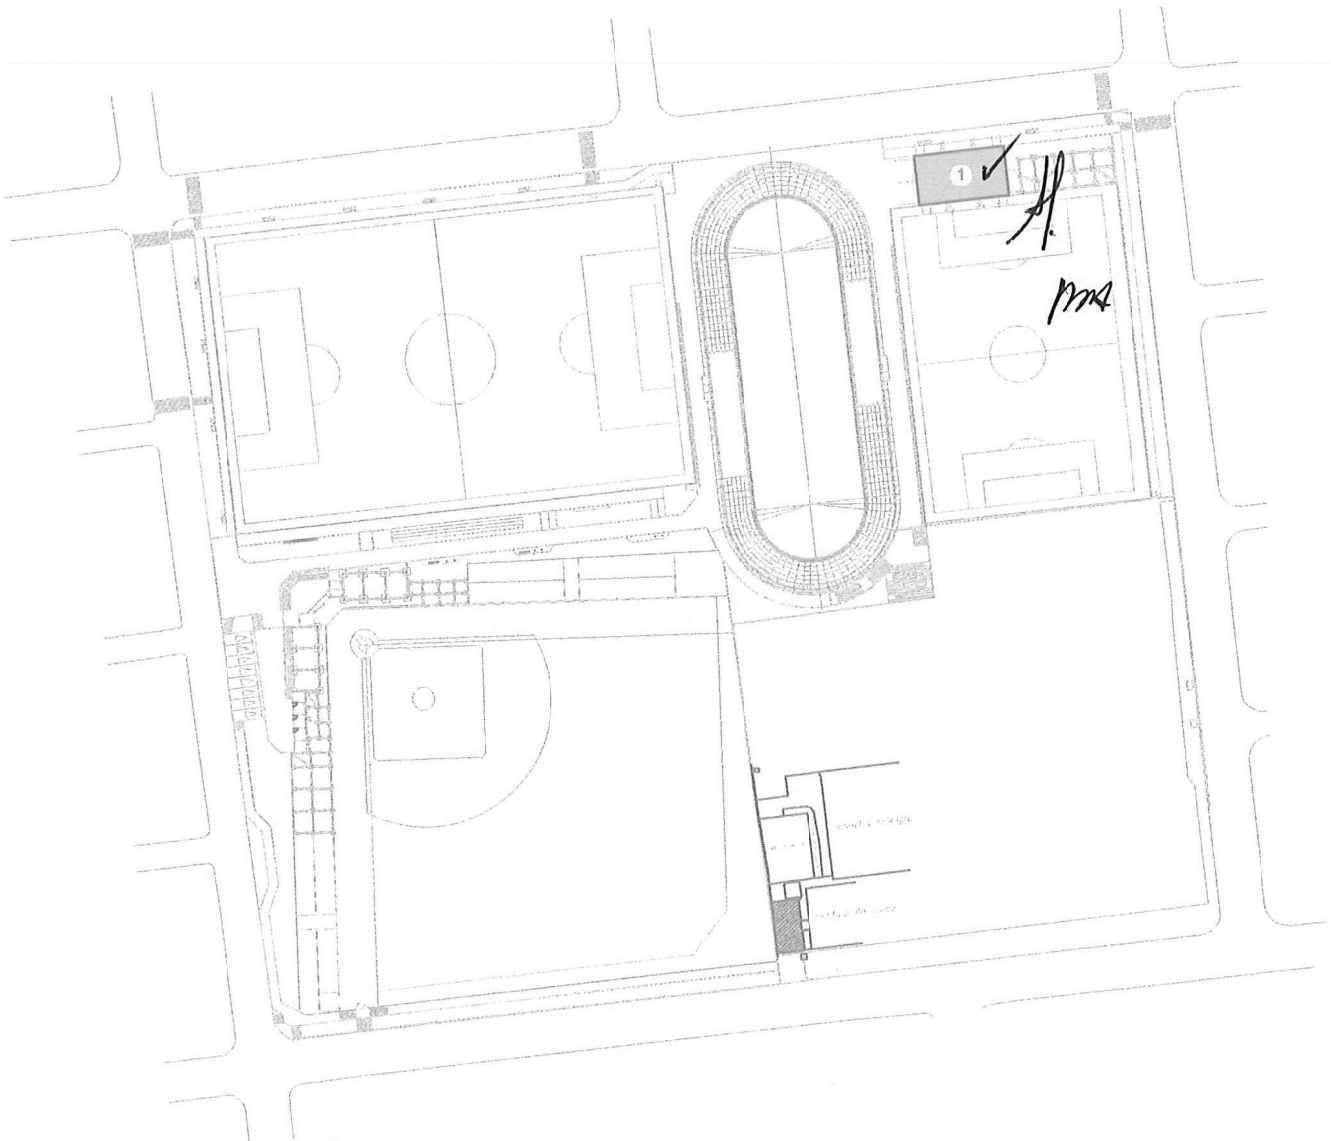

NP- 97. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA DE CUBIERTA RING DE BOXEO

Acumulado Presente acta

CPDP 065

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

76202121216VLL

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 21/07/2005

CARLOS JULIO
ECHEVERRY LOPEZ
C.C. 94476241
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE DEL CONSEJO

ALTHUS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	**INFORME DE ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES**	**VERSIÓN. 1**
		Consecutivo: 001

Fecha: 19-03-2026

Empresa:	ALTHUS S.A.S	***Conjunto:***	Inspección estructural
Proyecto:		***Componente:***	Estructura parque de la magdalena
		Planos:	N/A
Material Base:	Acero al carbono A36	***Zona Ensayada:***	Juntas de soldadur de las placa base
Procesos de Soldadura:	Smaw	***Porcentaje del Ensayo:***	100 %
Muestreo:	SI: x NO:	***Numero de Piezas:***	12
METODO DE LIMPIEZA PRELIMINAR:	LIMPIEZA MECANICA SP-3 CON GRATA		

KIT DE PRUEBA UTILIZADO

DESCRIPCIO	CLASE	MARCA	REFERENCIA
PENETRANTE	SOLVENTE	MAGNAFLUX	SKL-SP2
REVELADOR	SOLVENTE	MAGNAFLUX	SKD-S2
LIMPIADOR	SOLVENTE	MAGNAFLUX	SKC-S

METODO DE APLICACIÓN DEL PENETRANTE	Removible con solvente	**Tiempo de penetración minutos:**	15 min
		Temperatura del ensayo:	38°
		Método de limpieza del exceso	PAÑOS
Tiempo de secado del limpiador		10	***Limpieza final***
Tiempo de secado del Revelador		2 min	Removedor


Junta No.	***Defecto***	***Descripción***	***Resultados***	***Observaciones***
J1	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J2	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J3	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J4	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J5	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J6	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J7	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J8	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J9	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J10	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J11	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
J12	Ninguno	JUNTA EN FILETE	ACEPTADA	Soldadura en perfecto estado
	----------	----------	----------	----------
	----------	----------	----------	----------


PROCEDIMIENTO:	***SI***	***Prueba ejecutada según codigo:***	ASME sección V articulo VI
OBSERVACION GENERAL:	***Soldaduras en perfecto estado***		

ALTHUS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	INFORME DE ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES	VERSIÓN. 1


ESTRUCTURA PARQUE LA MAGDALENA	*Consecutivo: 001* *Fecha: 19-03-2026*



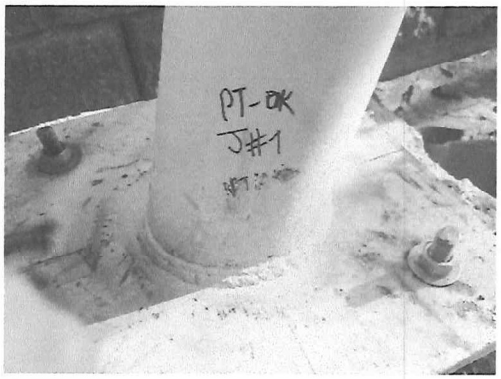

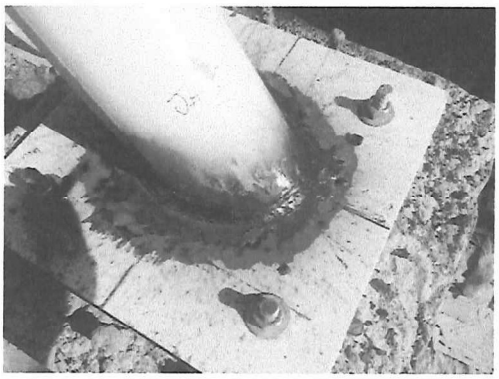



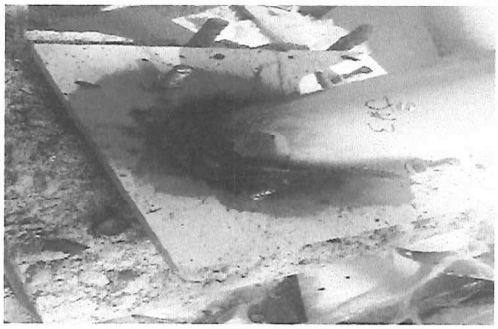




	INSPECTOR	*EMPRESA*	*CLIENTE*
Realizó / Revisó:	Juan José Vallejo Maza		
Nivel y numero de certificado:	Nivel: II Certificado numero: PT-JVM-22-2726 INSPECOL SERVICE		
Cargo:	INSPECTOR END		
Firma:	C.C. 1042026437		

ALTHUS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	INFORME DE ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES	VERSIÓN. 1


ESTRUCTURA PARQUE LA MAGDALENA	*Consecutivo: 001* *Fecha: 19-03-2026*

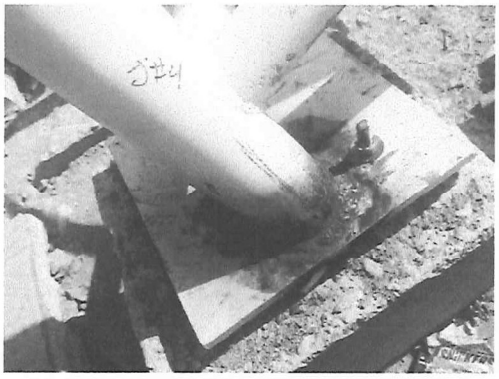








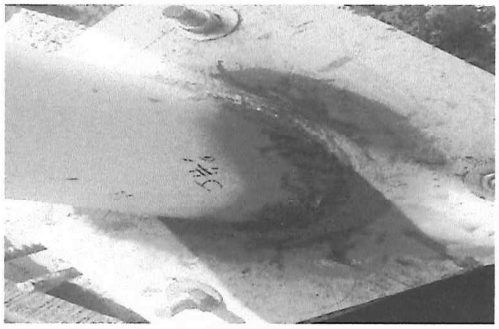




	INSPECTOR	*EMPRESA*	*CLIENTE*
Realizó / Revisó:	Juan José Vallejo Maza		
Nivel y numero de certificado:	Nivel: II Certificado numero: PT-JVM-22-2726 INSPECOL SERVICE		
Cargo:	INSPECTOR END		
Firma:	C.C. 1047026437		

ALTHUS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	INFORME DE ENSAYO DE LIQUIDOS PENETRANTES	VERSIÓN. 1

ESTRUCTURA PARQUE LA MAGDALENA	*Consecutivo: 001* *Fecha: 19-03-2026*

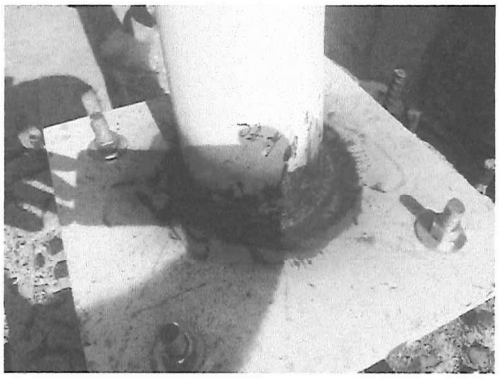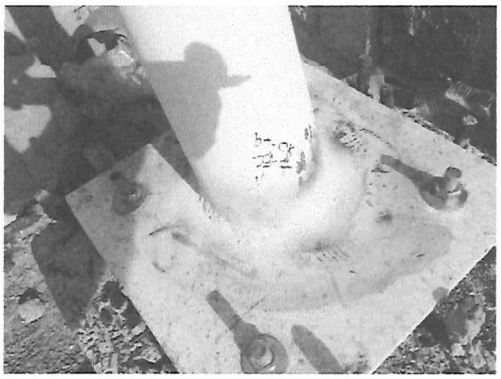



	INSPECTOR	*EMPRESA*	*CLIENTE*
Realizó / Revisó:	Juan José Vallejo Maza		
Nivel y numero de certificado:	Nivel: II Certificado numero: PT-JVM-22-2726 INSPECOL SERVICE		
Cargo:	INSPECTOR END		
Firma:	C.C. 1047026437		

No. CERTIFICADO:
PT-JVM-22-2726

ISC

>COR COMPAÑIA CERTIFICADA

Este certificado constata que:

JUAN JOSE VALLEJO MAZA

C.C. 1.043.026.737

Asistió al curso con intensidad de 16 horas y cumplió con los requisitos de calificación de acuerdo a la práctica de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS SNT-TC-1A:2020 / CA-P-01 confeccionada de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-1A Ed. 2.020 de la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos (ASNT) en el método de:

LIQUIDOS PENETRANTES NIVEL II

EXPERIENCIA TOTAL EN EL MÉTODO CALIFICADO	Mayor a 800 HORAS	
EXPERIENCIA TOTAL EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	Mayor a 3000 HORAS	
RESULTADO PARCIAL EXAMEN GENERAL DEL MÉTODO	30/40	75%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN ESPECIFICO DEL MÉTODO	16/20	80%
RESULTADO PARCIAL EXAMEN PRÁCTICO DEL MÉTODO	8.5/10	85%
RESULTADO PROMEDIO EXAMEN FINAL DE CALIFICACIÓN		**81.3%**

EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL Y CONTRASTE DE COLOR **APROBADO**

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19-12-2022 **FECHA DE CADUCIDAD CERTIFICACIÓN: 31-12-2027**

ASNT

EMITIDO POR NIVEL III ASNT:
Issued by ASNT NDT LEVEL III CN

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
ASNT NDT LEVEL III 212174

GILBERTO QUINTERO MANTILLA
212174

ISC

FIRMADO POR GERENTE:

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS

CINDY PAOLA GARCÍA DÍAZ

INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS certifica que la calificación se realizó de acuerdo a la práctica escrita de INSPECOL SERVICES AND CONSULTING SAS para calificación y certificación de personal No. CA-P-01, confeccionada de acuerdo a SNT-TC-1A Ed. 2.020. Esta calificación puede ser usada por el portador como evidencia que los exámenes han sido satisfactorios. la presente calificación puede ser homologada por empleadores, cumpliendo los requerimientos de su práctica escrita. El solicitante demuestra evidencias de trabajo NDT.

Consultar validez de certificado en www.INSPECOLSERVICES.COM/Consultas


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 108	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO BAHIA DE BUSES Y RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.20 METROS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

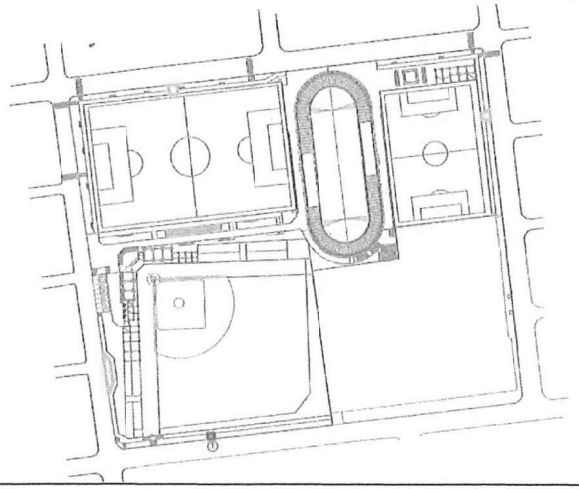

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1	BEISBOL / CRA 6B	3.00	3.50			1.00		10.50	


Cantidad contractual según Modificativa No. 10	110.42
Acumulado anterior	80.49
Acumulado a presente acta	90.99
Obra por ejecular	19.43

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	10.50
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADYS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 072

MEMORIA DE CANTIDADES
ACTA N° 11

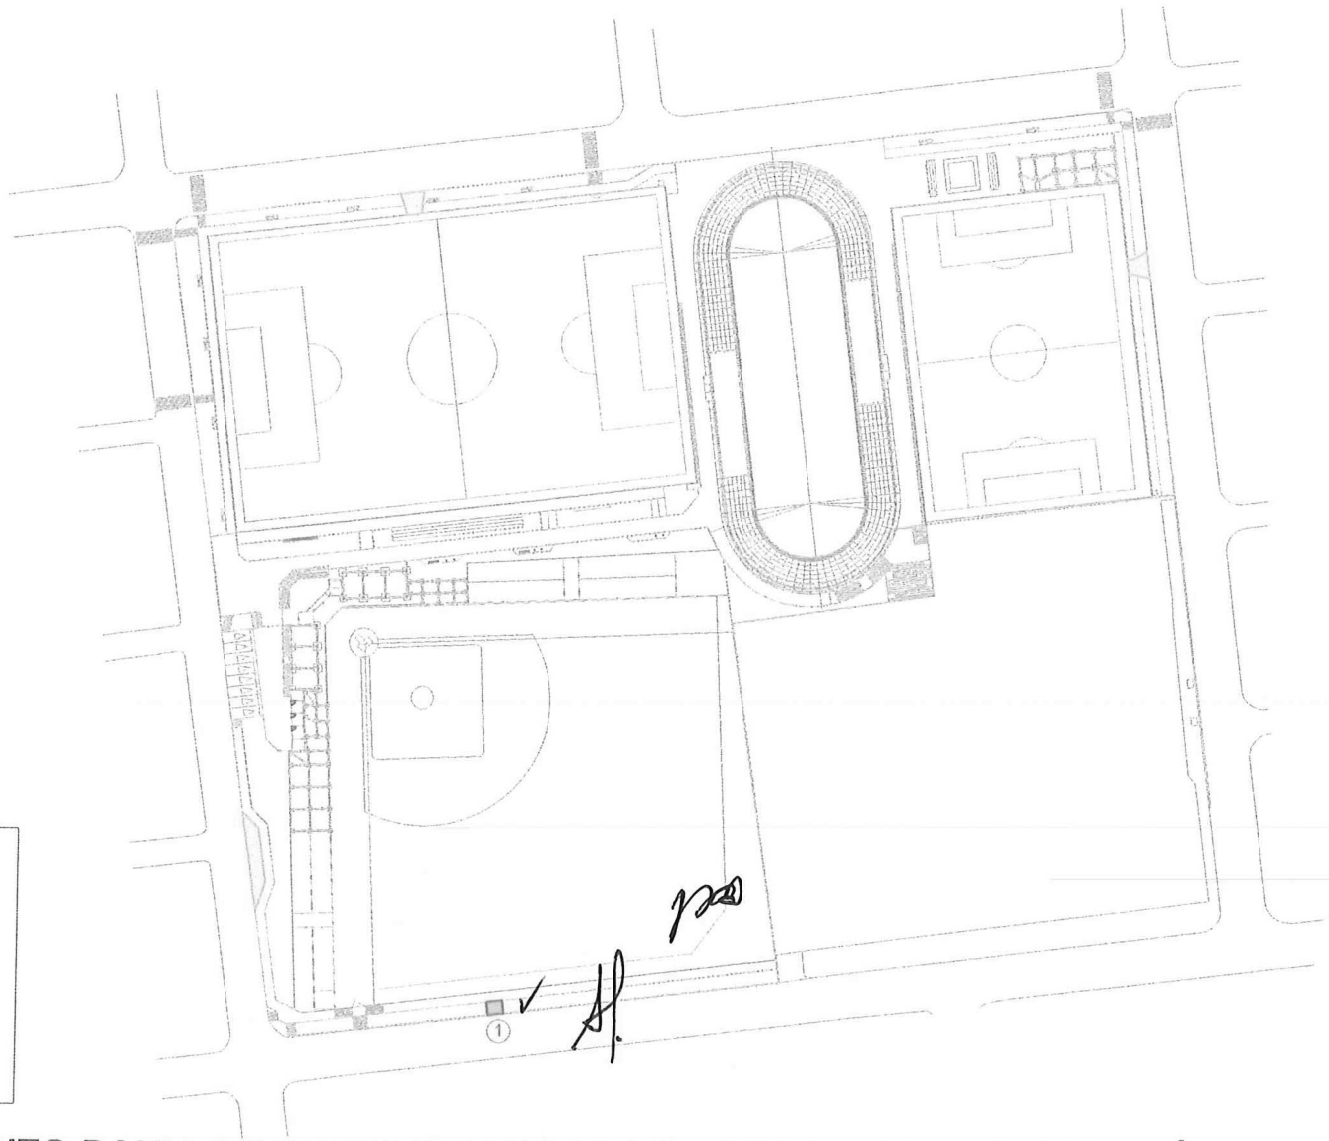

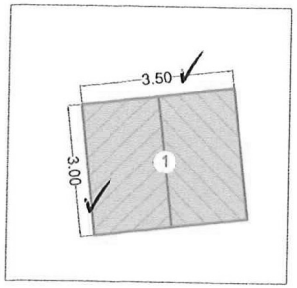

NP- 108. PAVIMENTO BAHIA DE BUSES Y RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.20 METROS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.

Acumulado Presente acta

CPDP-073


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP - 111	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA CAMPO DE JUEGO ESTADIO DE BEISBOL POSTERIOR A LA ENTREGA


UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

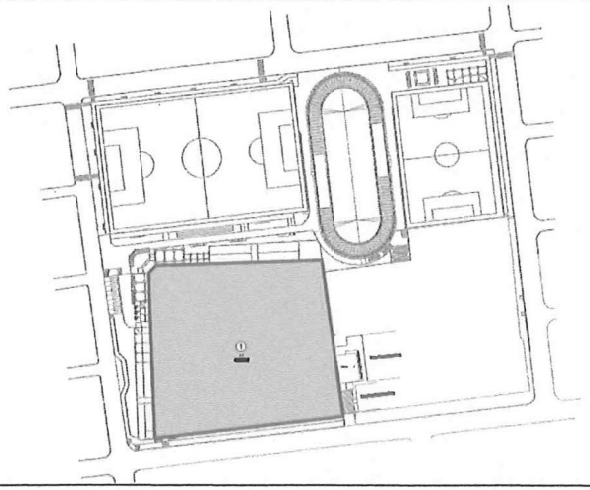

REGISTRO FOTOGRÁFICO



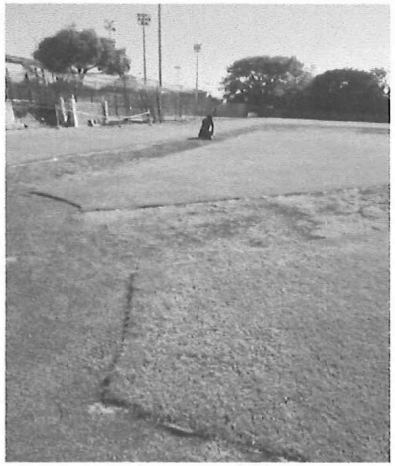


LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES MES	M2	M3
ZONA 1 - ESTADIO DE BEISBOL	MANTENIMIENTO ENERO					1.00 ✓	1.00 ✓		
	MANTENIMIENTO FEBRERO					1.00 ✓	1.00 ✓		
	MANTENIMIENTO MARZO					1.00 ✓	1.00 ✓		

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	6.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	3.00
Obra por ejecutar	3.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	3.00
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO.	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 074

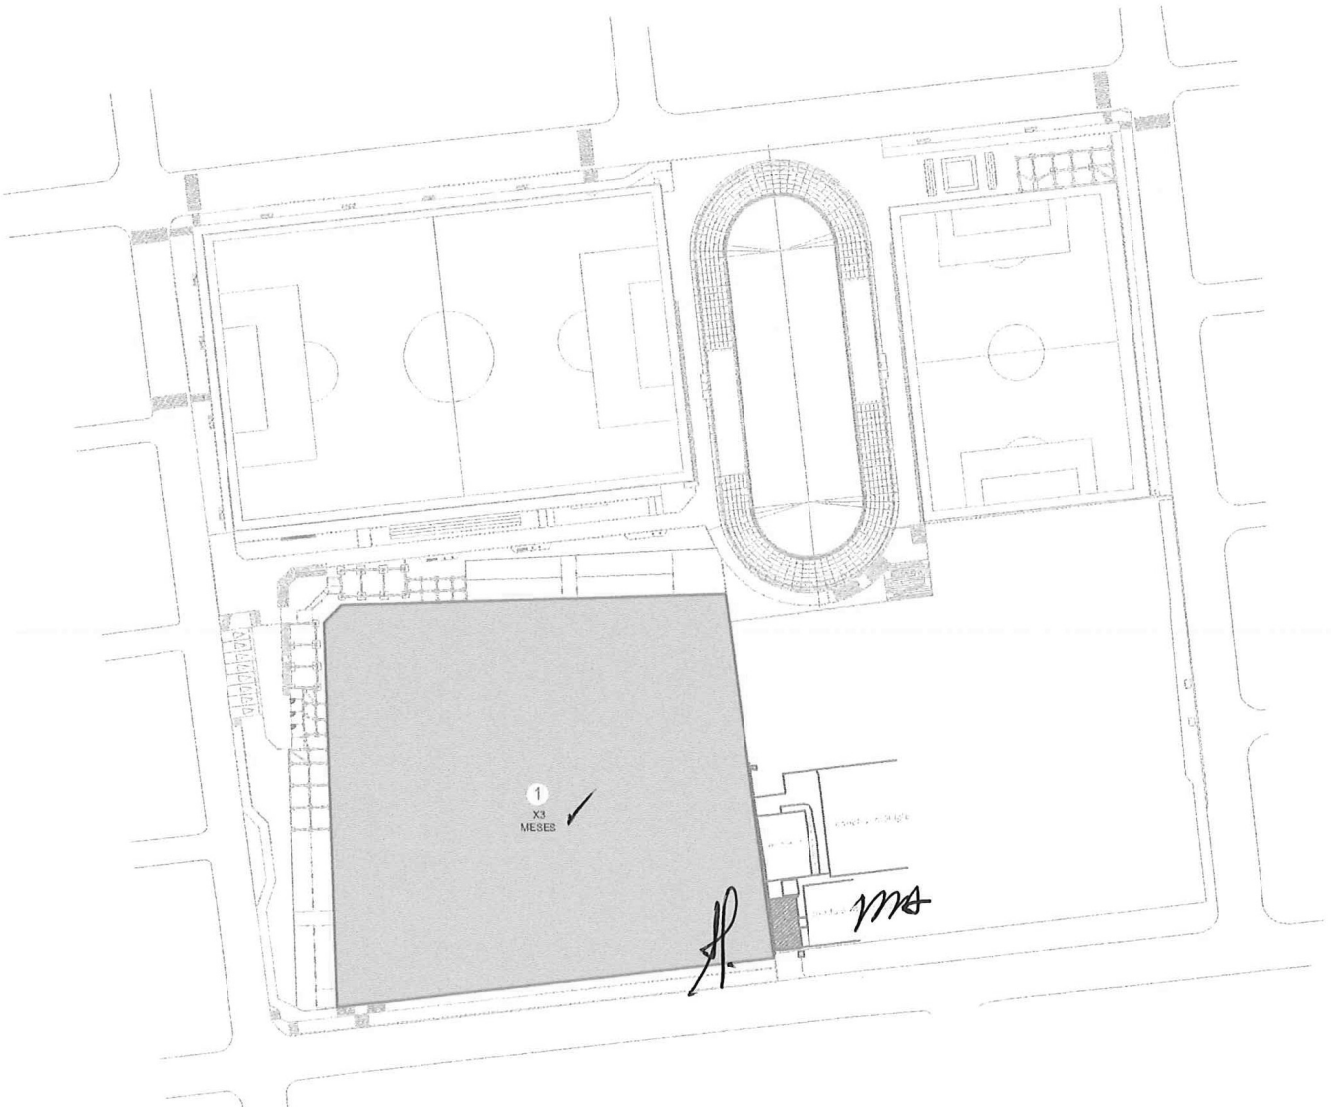

NP- 111. MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA CAMPO DE JUEGO ESTADIO DE BEISBOL POSTERIOR A LA ENTREGA

Acumulado Presente acta

CPDP 075


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 117	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS EN BLOQUE ABUJARDADO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

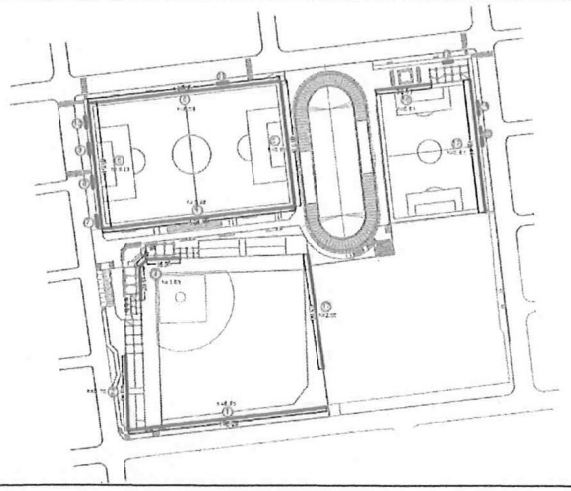

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1	ESTADIO / CRA 6B	106.26		0.75		1.00		79.70	
ZONA 2	ESTADIO / CALLE 38B	10.48		0.70		1.00		7.34	
ZONA 3	ACCESO ESTADIO DE BEISBOL	18.67		1.03		1.00		19.23	
		5.49		1.03		1.00		5.65	
		16.95		1.03		1.00		17.46	
ZONA 4	CANCHA DE FUTBOL NO. 01	104.99		0.48		1.00		50.40	
ZONA 5		68.50		0.81		1.00		55.49	
ZONA 6		103.25		0.53		1.00		54.72	
ZONA 7		68.50		0.23		1.00		15.76	
ZONA 8	CALLE 38B / FUTBOL NO. 01	6.00		0.54		4.00		12.96	
ZONA 9		0.35		0.54		4.00		0.76	
ZONA 10		6.00		0.54		4.00		12.96	
ZONA 11		0.35		0.54		4.00		0.76	
ZONA 12	CRA 7C / FUTBOL NO. 01	6.00		0.54		2.00		6.48	
		0.50		0.54		2.00		0.54	
ZONA 13	FUTBOL NO. 02 / RING BOXEO	30.57		0.81		2.00		49.52	
ZONA 14	FUTBOL NO. 02 / CALLE 36B	72.49		0.71		2.00		102.94	
ZONA 15	BEISBOL / COLEGIO	63.00		2.00		2.00		252.00	

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	1,511.79
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	744.67
Obra por ejecular	767.12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	744.67
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 076

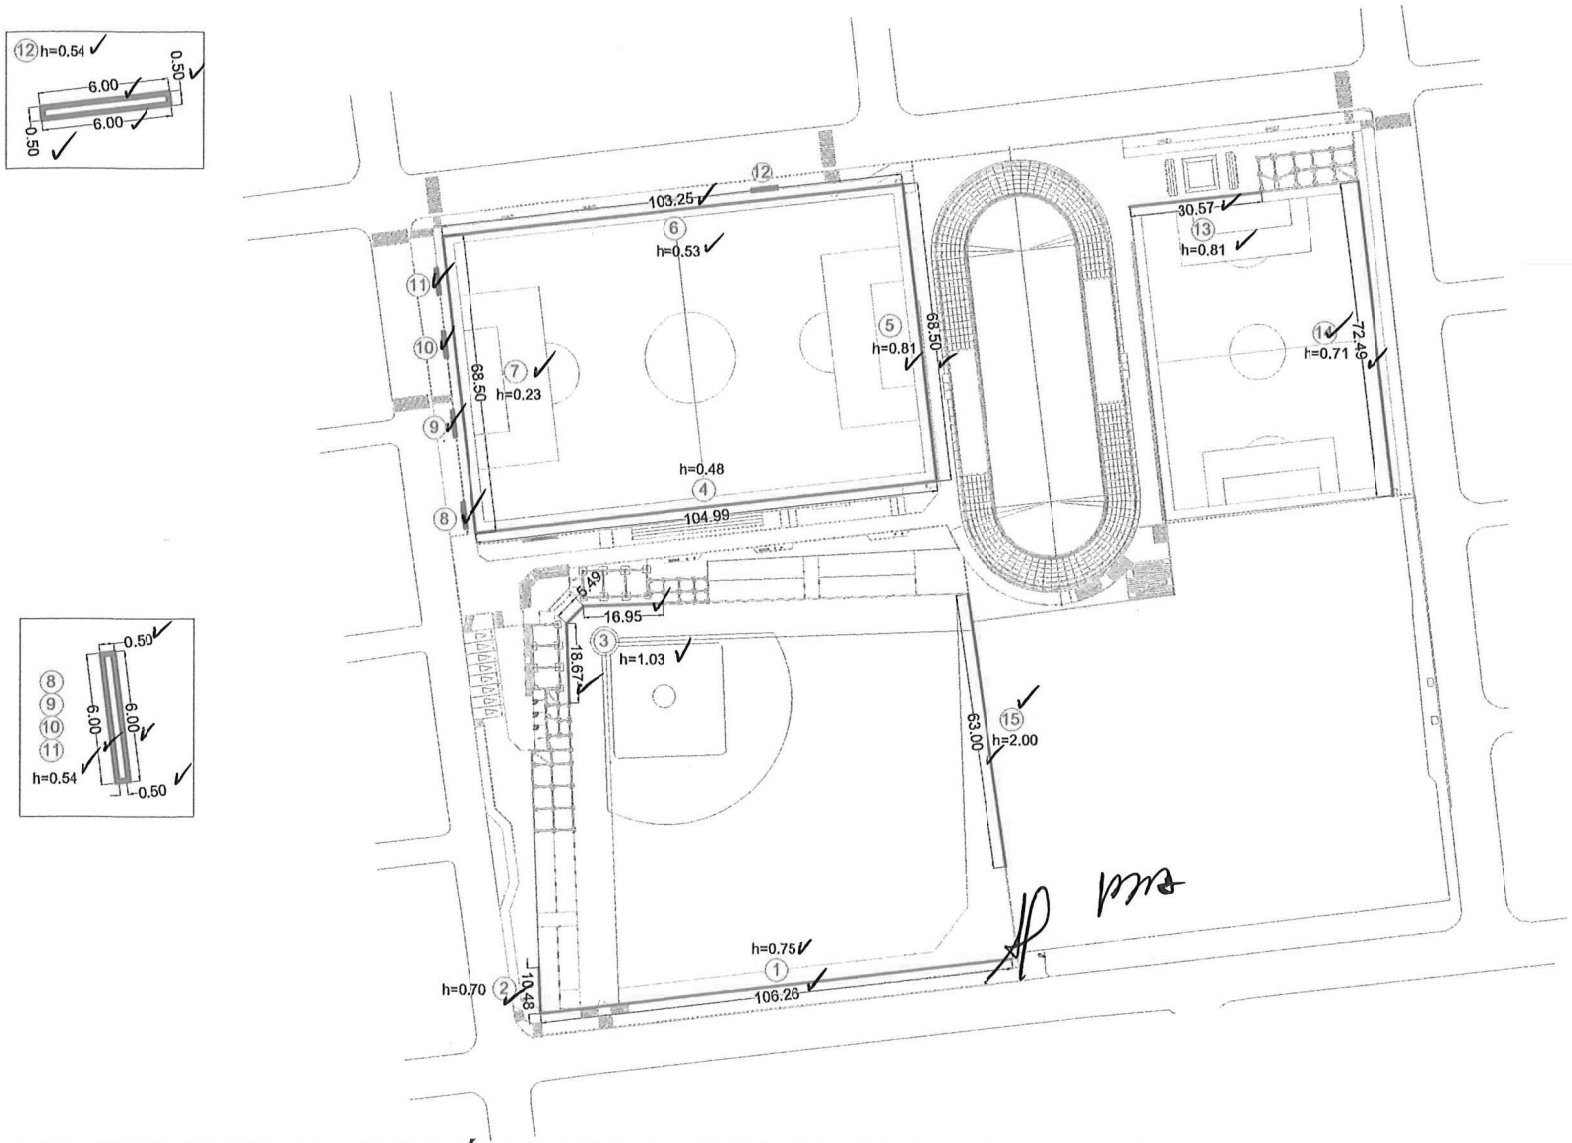

NP- 117. IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS EN BLOQUE ABUJARDADO

Acumulado Presente acta

CPDP 077


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP - 125	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

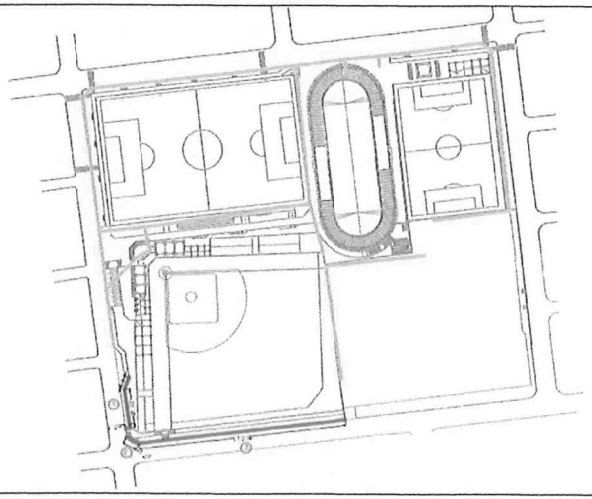

REGISTRO FOTOGRÁFICO






LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1	CALLE 38B / ESTADIO	6.83 ✓		2.00 ✓		1.00 ✓		13.66 ✓	
		20.45 ✓		2.00 ✓		1.00 ✓		40.90 ✓	
		2.29 ✓		2.00 ✓		1.00 ✓		4.58 ✓	
ZONA 2	ESQUINA CALLE 38B / CRA 6B	7.27 ✓		2.00 ✓		1.00 ✓		14.54 ✓	
ZONA 3	CARRERA 6B 7 ESTADIO	110.98 ✓		2.00 ✓		1.00 ✓		221.96 ✓	

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	1,161.92
Acumulado anterior	866.28
Acumulado a presente acta	1161.92
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	295.64 ✓
ING. SAMUEL PATRON	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNALDIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 078

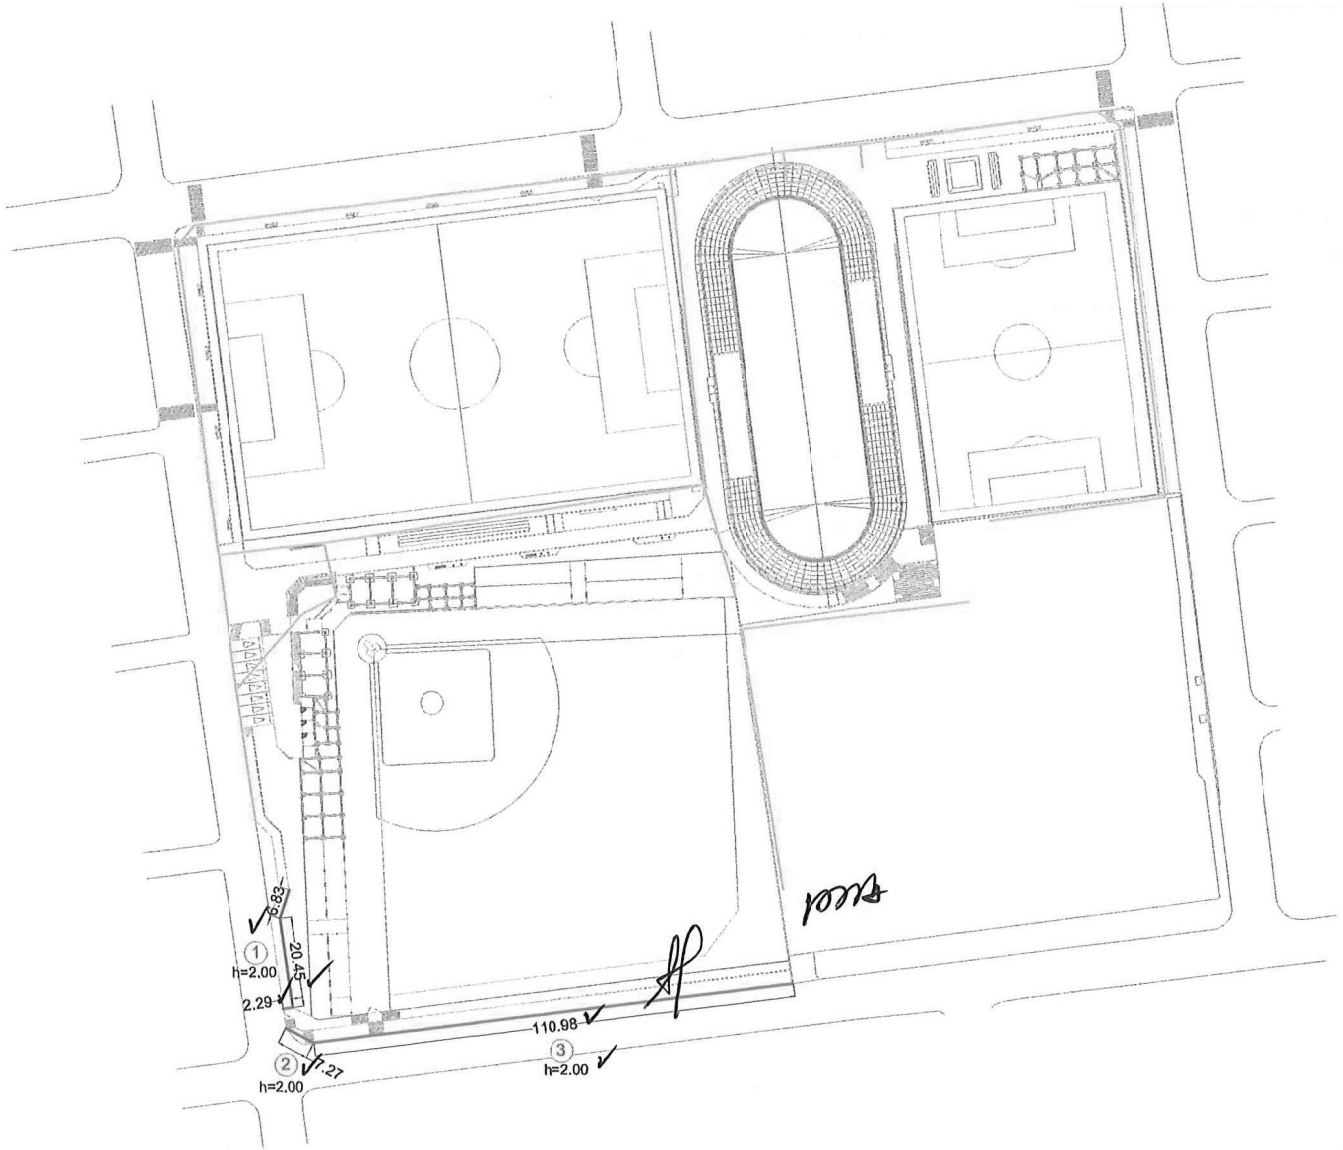

NP- 125. DESMONTE DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC

Acumulado Presente acta

CPDP 079


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP - 139	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO


UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

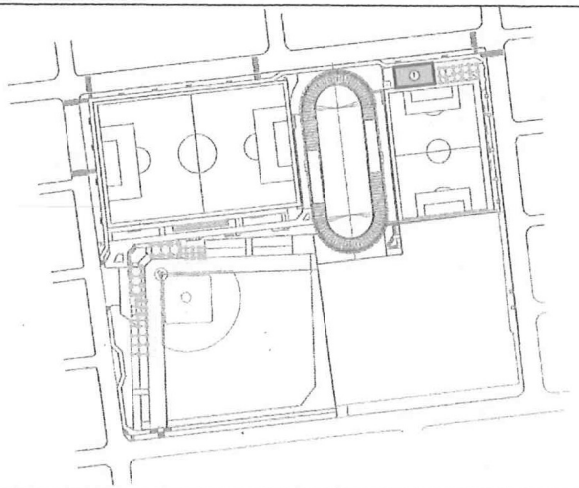

REGISTRO FOTOGRÁFICO








LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - RING DE BOXEO	(Z1) - ZAPATA TIPO 1	1.20 ✓	1.20 ✓	0.35 ✓		10.00 ✓			5.04 ✓
	(Z2) - ZAPATA TIPO 2	1.80 ✓	1.80 ✓	0.35 ✓		4.00 ✓			4.54 ✓

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	9.58 ✓
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	9.58 ✓
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	9.58
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 080

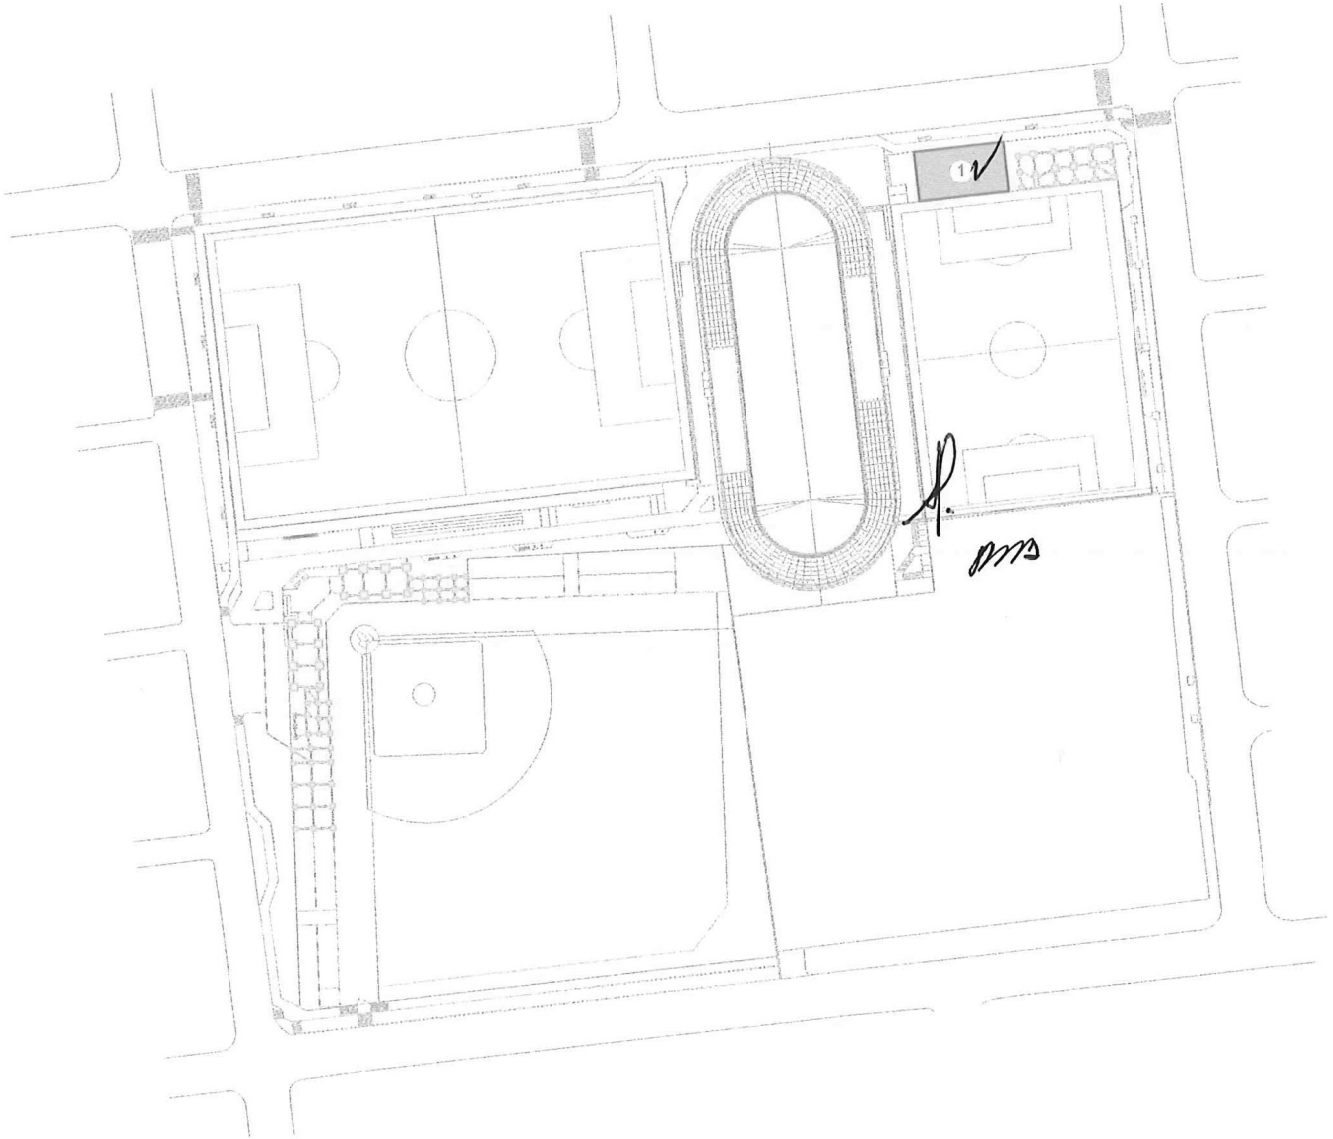


NP-139. ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI

Acumulado Presente acta

CPDP 081

1

h=0.35

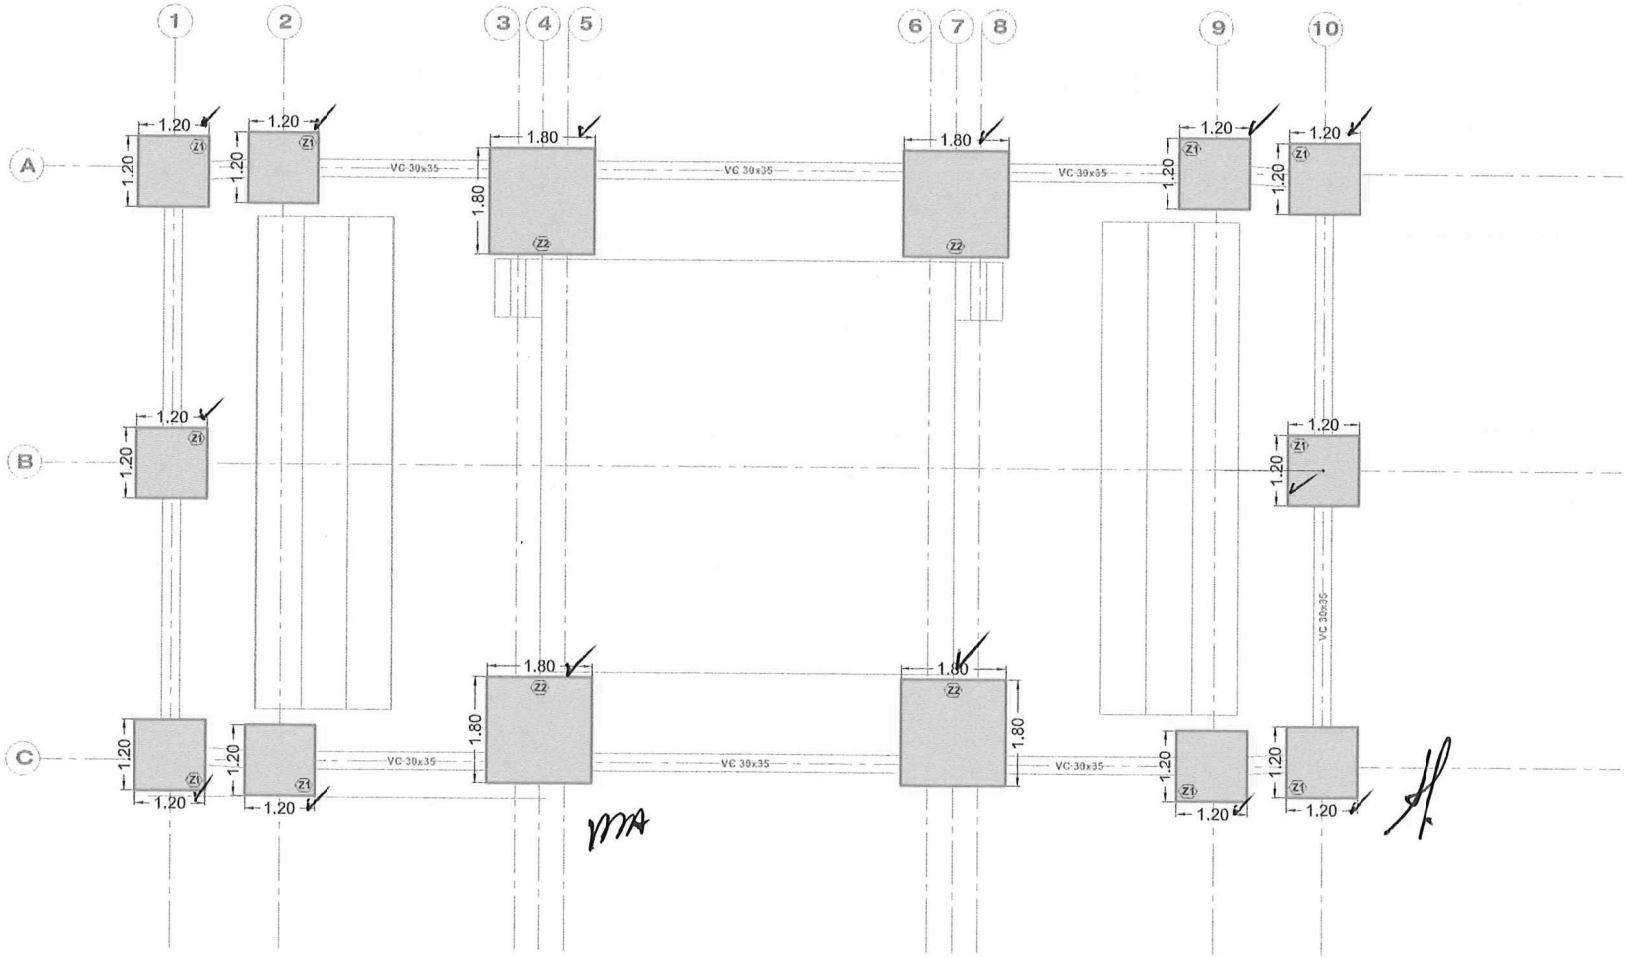

NP-139. ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI

Acumulado Presente acta

CPDP 082


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 140	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

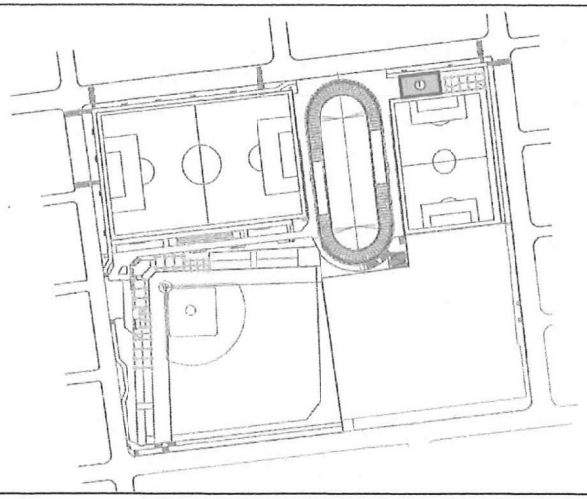

REGISTRO FOTOGRÁFICO




LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - RING DE BOXEO	PEDESTAL P1	0.55	0.55	1.55		10.00			4.69
	PEDESTAL P2	0.40	0.40	1.55		12.00			2.98

Cantidad contractual según Modificativa No. 10	7.67
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	7.67
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	7.67
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 083

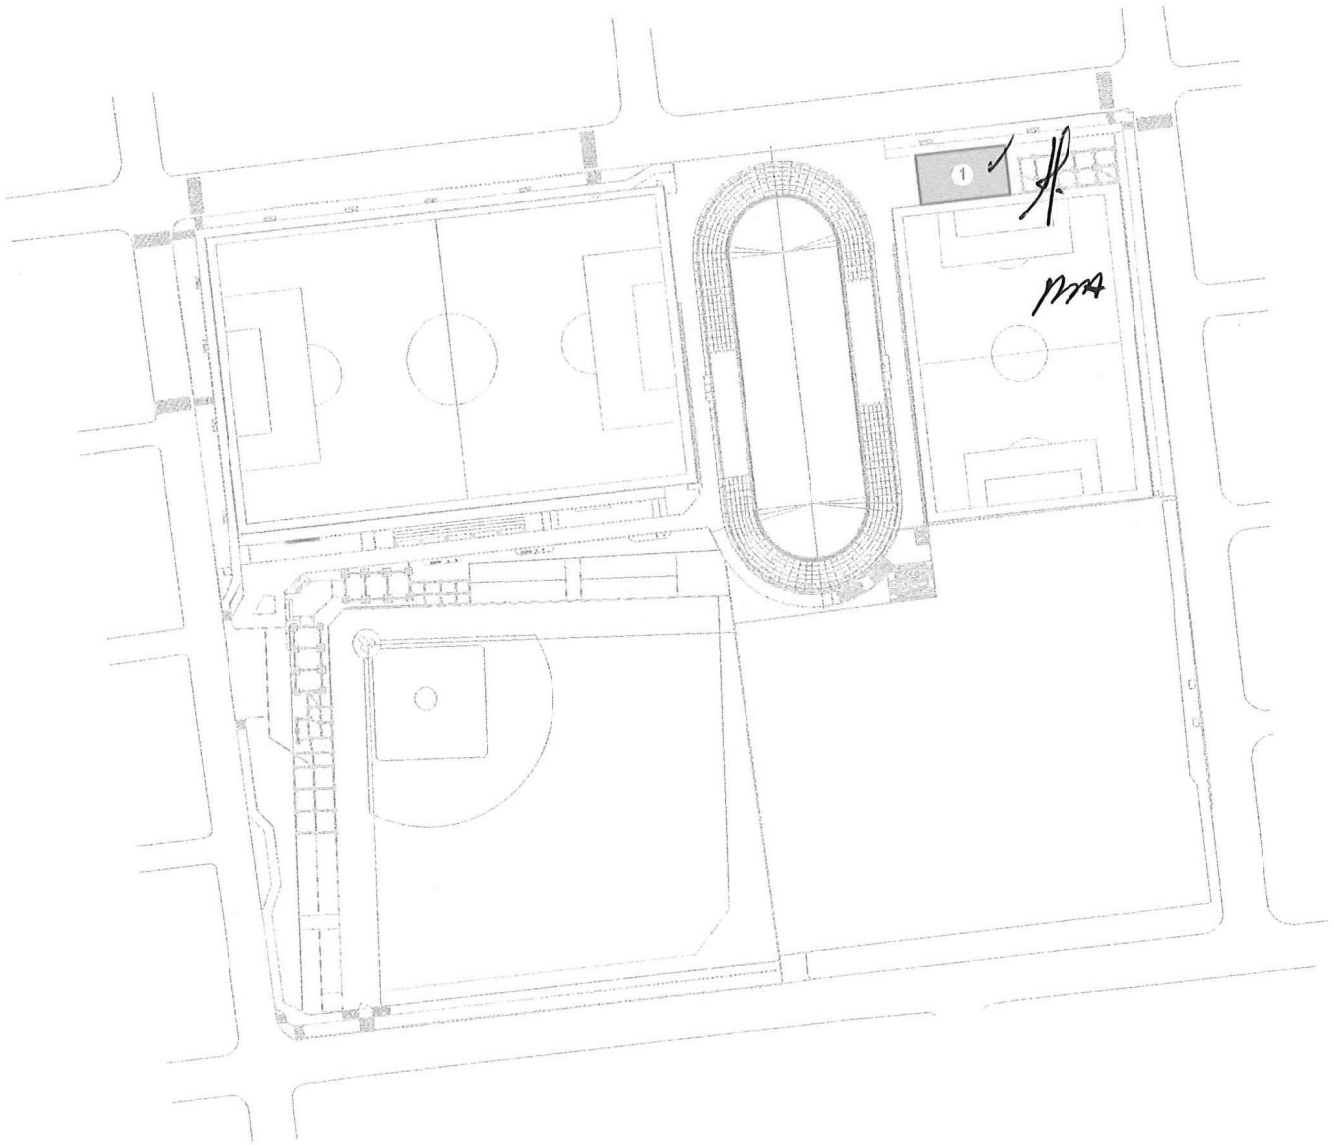


NP-140. PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Acumulado Presente acta

CPDP 084

1

h=1.55

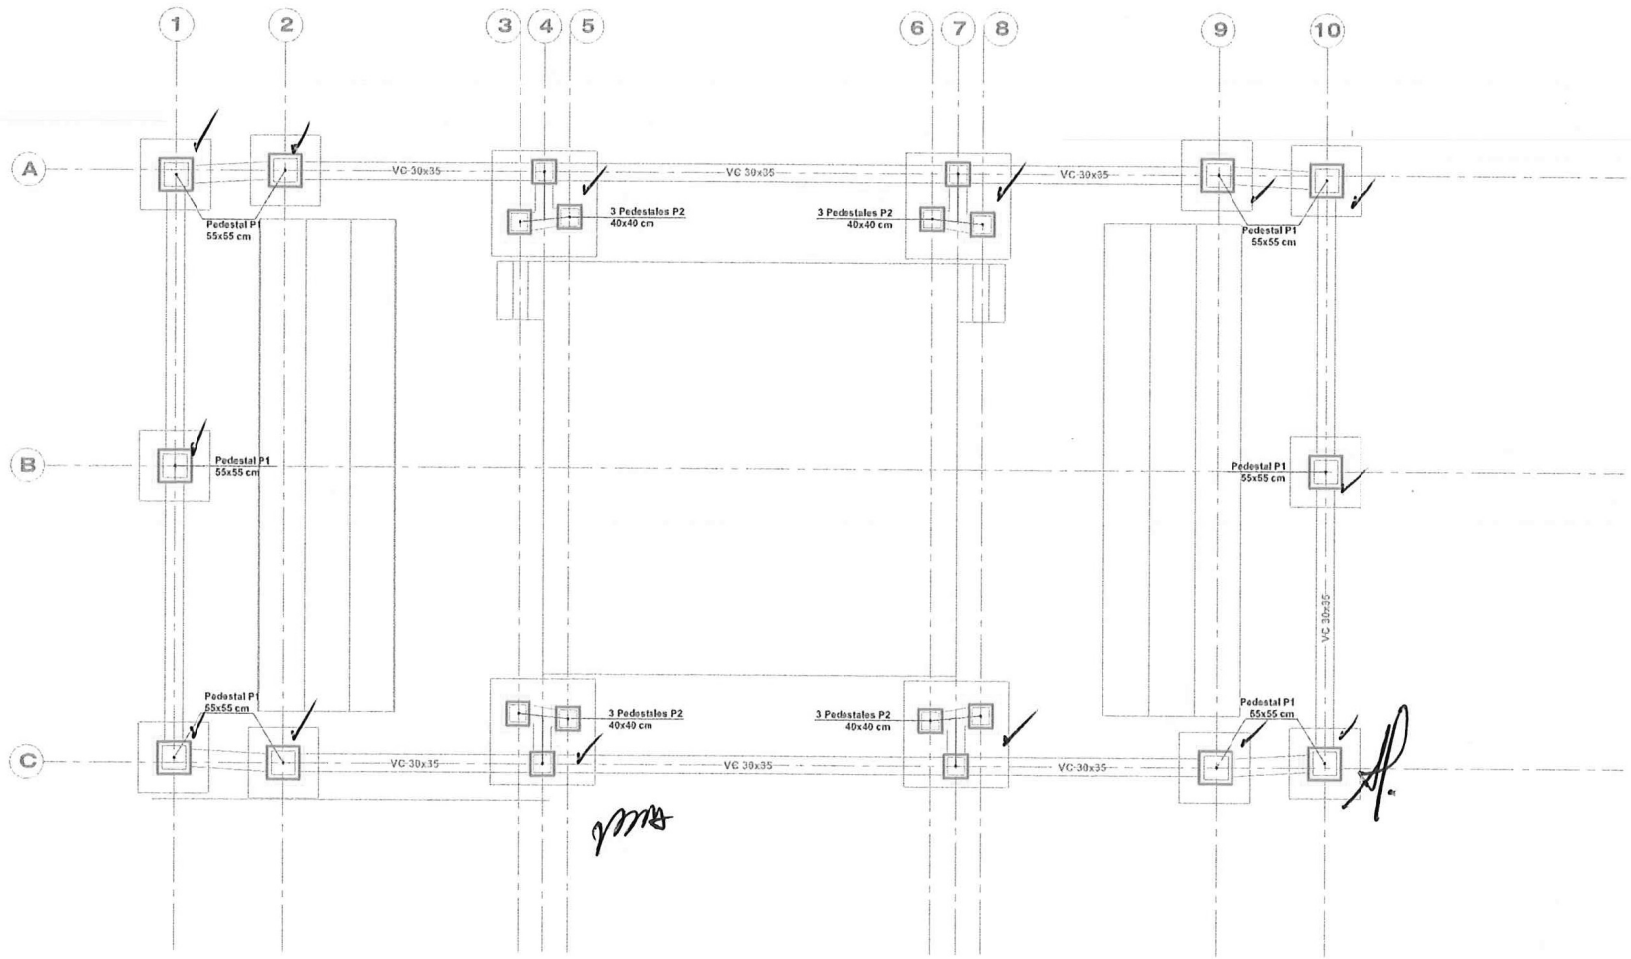

NP-140. PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Acumulado Presente acta

CPDP 085


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°11


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 2	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
PERIODO:	27 DICIEMBRE 2025 AL 24 DE MARZO 2026		
CAPITULO: NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP - 141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 3/4", DIMENSIONES VARIABLES (0.30 - 0.35) X (0.35 - 0.40), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

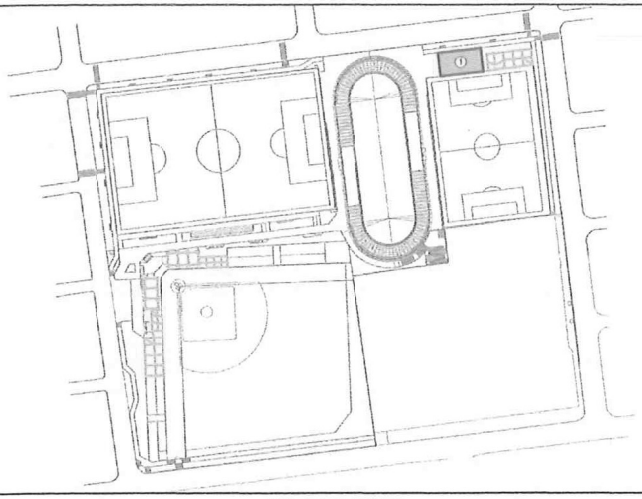

REGISTRO FOTOGRÁFICO

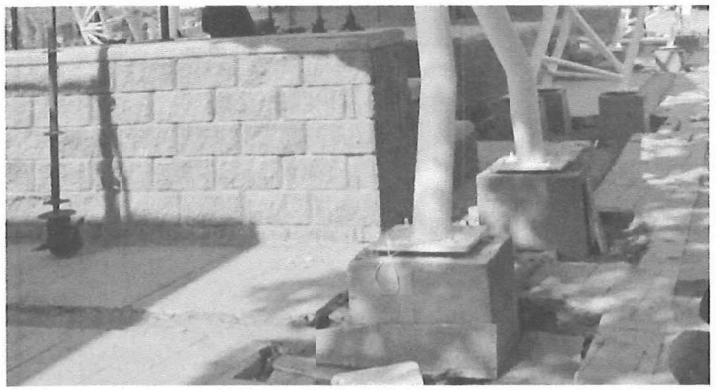


LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
ZONA 1 - RING DE BOXEO	EJE A (1 - 2)	1.32				1.00	1.32		
	EJE A (2 - 4)	3.96				1.00	3.96		
	EJE A (4 - 7)	6.66				1.00	6.66		
	EJE A (7 - 9)	3.96				1.00	3.96		
	EJE A (9 - 10)	1.32				1.00	1.32		
	EJE C (1 - 2)	1.32				1.00	1.32		
	EJE C (2 - 4)	3.96				1.00	3.96		
	EJE C (4 - 7)	6.66				1.00	6.66		
	EJE C (7 - 9)	3.96				1.00	3.96		
	EJE C (9 - 10)	1.32				1.00	1.32		
	EJE 1 (A - B)	4.41				1.00	4.41		
	EJE 1 (B - C)	4.41				1.00	4.41		
	EJE 10 (A - B)	4.41				1.00	4.41		
	EJE 10 (B - C)	4.41				1.00	4.41		
	MODULO A - VIGAS EN T	0.47				4.00	1.88		
		0.46				4.00	1.84		


Cantidad contractual según Modificativa No. 10	55.80
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	55.80
Obra por ejecutar	0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	55.80
ING. SAMUEL PATRÓN	ING. RAFAEL GONZALEZ	ARQ. SORNADIS CASTRO	ING. DIEGO RADA	OBSERVACIONES:	

CPDP 086

1

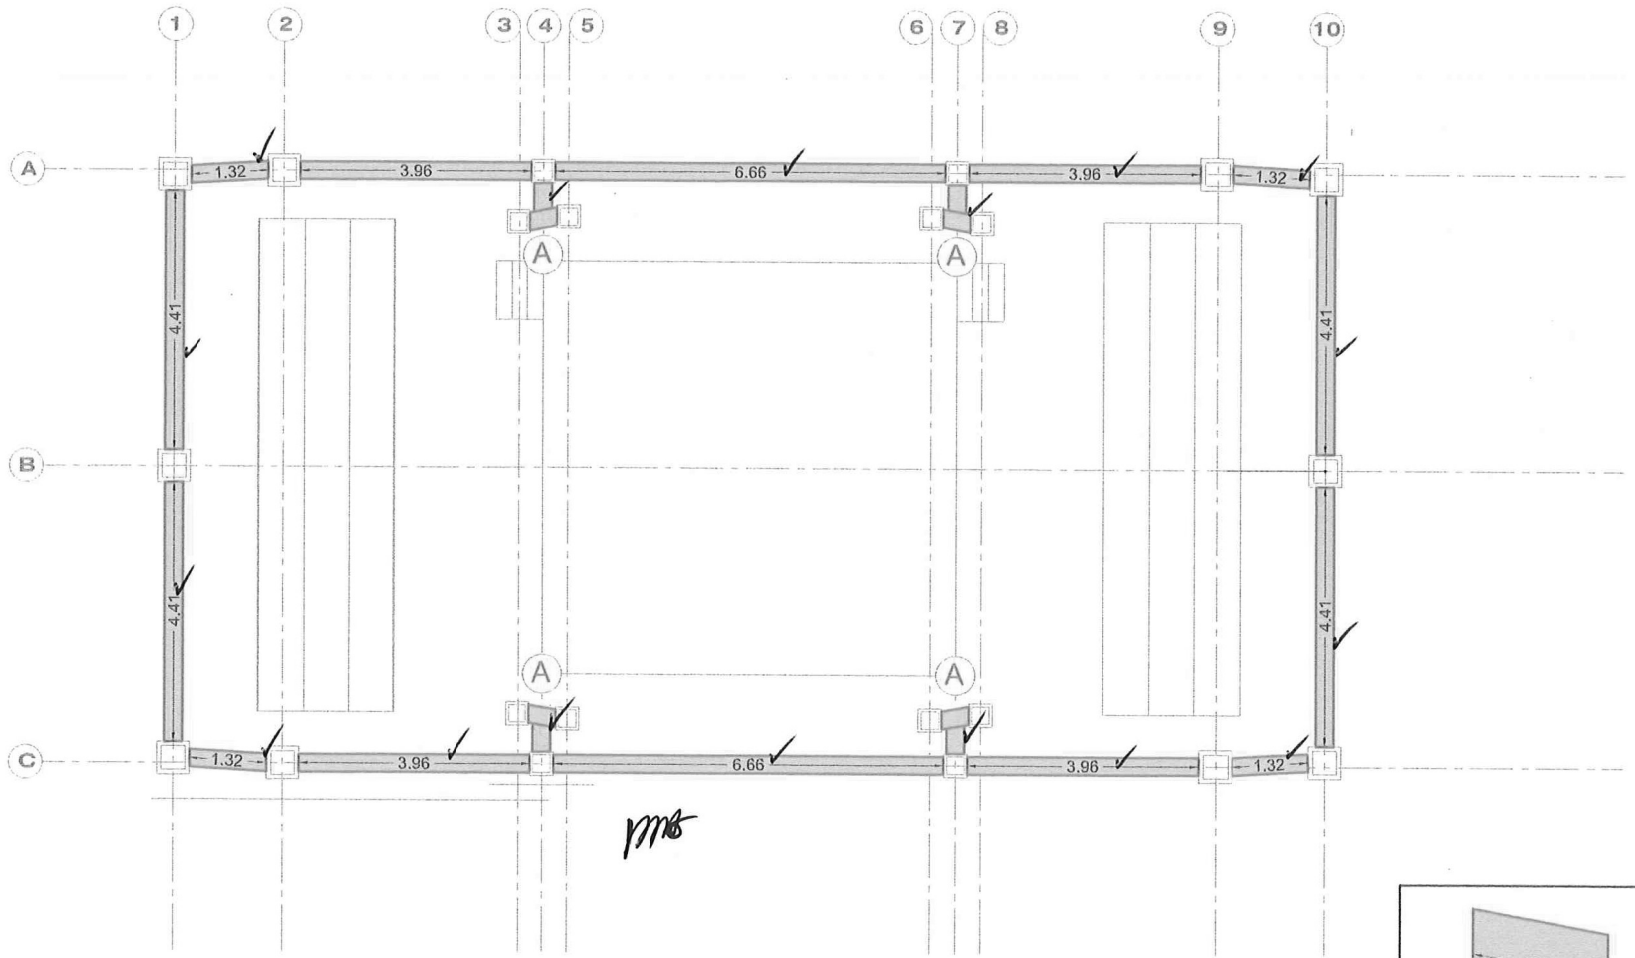


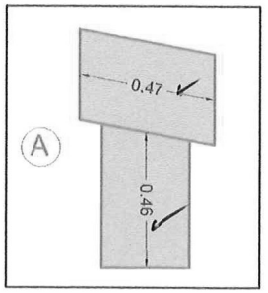

NP-141. VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 3/4", DIMENSIONES VARIABLES (0.30 - 0.35) X (0.35 - 0.40), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Acumulado Presente acta

CPDP 087

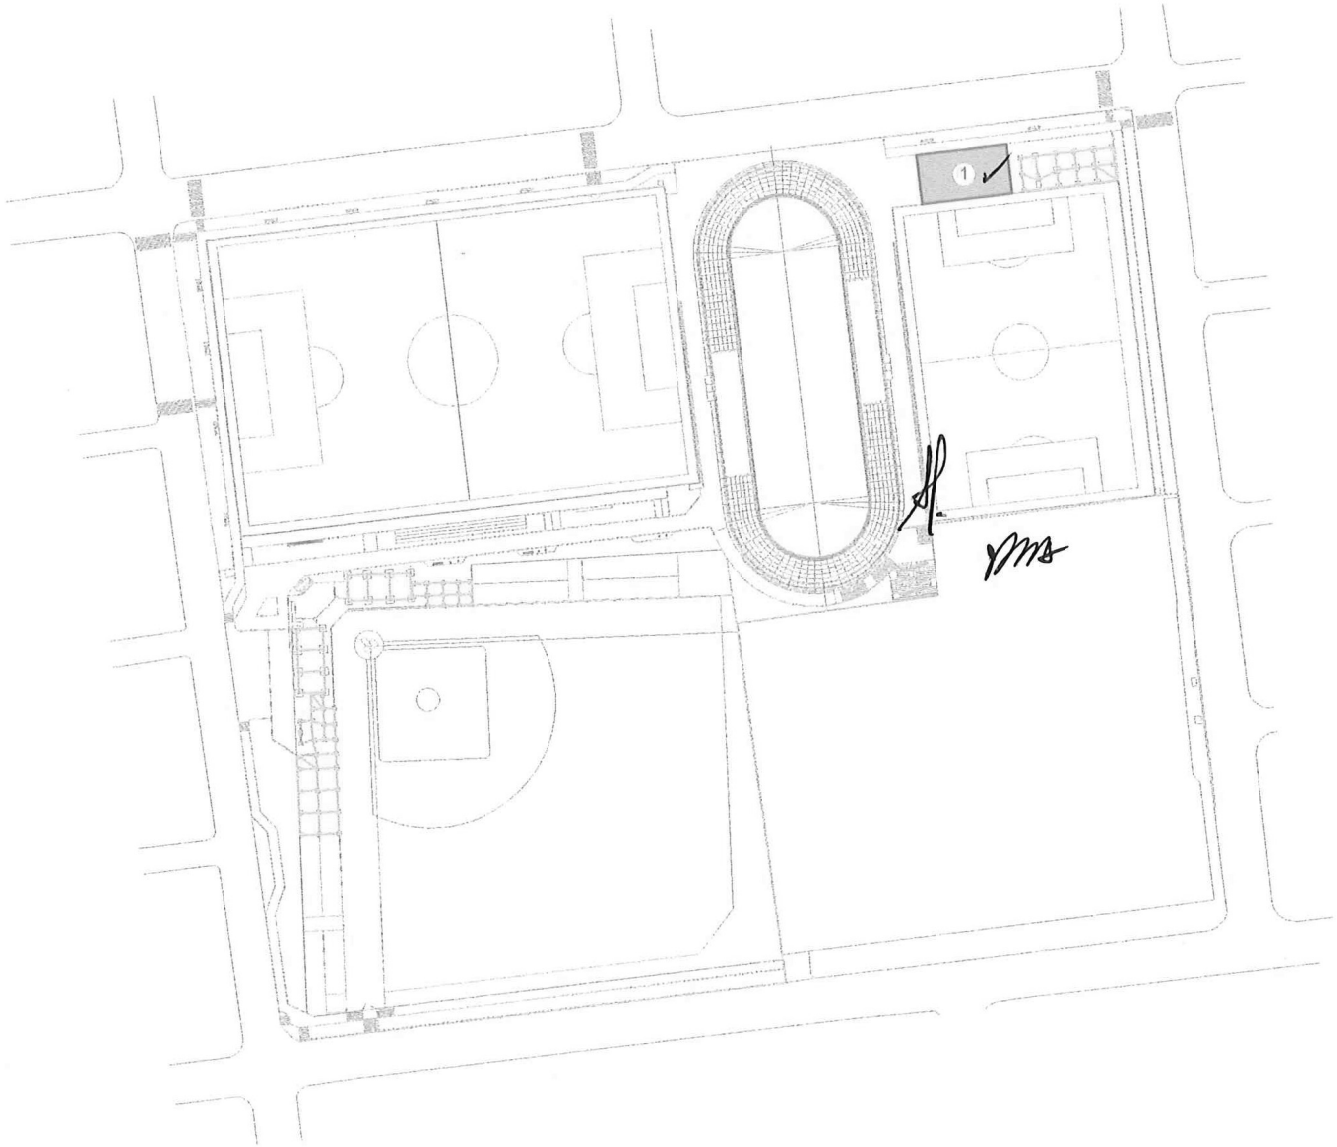

NP-141. VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 3/4", DIMENSIONES VARIABLES (0.30 - 0.35) X (0.35 - 0.40), NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Acumulado Presente acta

CPDP 088

INGEVALT S&P S.A.S Ingeniería y Laboratorio	DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA I.N.V. E – 161 – 07	200-04.33-F-21 REVISIÓN 0

PROCEDENCIA: Polideportivo la magdalena **MUESTRA No:** 1
MATERIAL: Material seleccionado
LOCALIZACIÓN: Ring de boxeo
CLIENTE: Consorcio parques DP 2024 **FECHA DE ENSAYO:** 06/03/2026

LOCALIZACIÓN					
HORA					
ABSCISA					
COTA					
CALZADA					
CARRIL					
MARGEN					
CAPA No.					
ENSAYO No.	**1**	**2**	**3**		
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	6900	6822	6808		
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	3600	3502	3500		
PESO ARENA USADA (g)	3300	3320	3308		
CONSTANTE DEL CONO (g)	1538	1538	1538		
PESO ARENA EN EL HUECO (g)	1762	1782	1770		
DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1,418	1,418	1,418		
VOLUMEN DEL HUECO (cm3)	1243	1257	1248		
VOLUMEN MATERIAL RETENIDO 3/4" (g/cm^3)					
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO PASA 3/4"(g)	2434	2487	2432		
HUMEDAD (%)	7,0%	7,4%	7,2%		
VOLUMEN MATERIAL PASA 3/4" (g/cm^3)	1242,6	1256,7	1248,2		
DENSIDAD HUMEDA (g/cm^3)	1,959	1,979	1,948		
DENSIDAD SECA (Di) (g/cm3)	1,831	1,843	1,817		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO (De) (g/m3)	1,910				
COMPACTACION DEL TERRENO (%)	95,8	96,5	95,2		

OBSERVACIONES:

UBALDO VARGAS GERONIMO
COORDINADOR DE LABORATORIO

INGEVALT S&P S.A.S
Ingeniería y Laboratorio

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA I.N.V.E - 418-13

CODIGO	NTC 2871
REVISIÓN	
FECHA	

PROYECTO : POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA
ORDENADOR : CONSORCIO PARQUES DP 2024
CONSTRUCCIÓN : VARIOS
DESCRIPCIÓN: CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIZACIÓN : BARRIO LA MAGDALENA - BARRANQUILLA / ATLANTICO
ABSCISA : PR :
APIQUE : REGISTRO :
ESTUDIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA DE LA MAQUINA (KGF)	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA OBTENDA (PSI)	% RESISTENCIA OBTENIDA	% RESISTENCIA PROMEDIO	OBSERVACIONES
1	ZAPATAS	21-feb-26	28-feb-26	7	176,72	15,0	30,0	278,90	28439,4	3000	2299	76,6	78,1	
2	ZAPATAS	21-feb-26	28-feb-26	7	176,72	15,0	30,0	289,70	29540,7	3000	2388	79,6		
3	ZAPATAS	21-feb-26	21-mar-26	28	176,72	15,0	30,0	428,70	43714,5	3000	3534	117,8	118,3	
4	ZAPATAS	21-feb-26	21-mar-26	28	176,72	15,0	30,0	432,40	44091,8	3000	3564	118,8		
1	PEDESTALES Y VIGAS	4-mar-26	11-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	402,20	41012,3	3000	3315	110,5	111,1	
2	PEDESTALES Y VIGAS	4-mar-26	11-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	406,40	41440,6	3000	3350	111,7		

UBALDO VARGAS GERONIMO
COORDINADOR DE LABORATORIO

CPDP 090

INGEVALT S&P S.A.S
Ingeniería y Laboratorio

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA I.N.V.E - 418-13

CODIGO	NTC 2871
REVISIÓN	
FECHA	

PROYECTO : POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA
ORDENADOR : CONSORCIO PARQUES DP 2024
CONSTRUCCIÓN : VARIOS
DESCRIPCIÓN: CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIZACIÓN : BARRIO LA MAGDALENA - BARRANQUILLA / ATLANTICO
ABSCISA : PR :
APIQUE : REGISTRO :
ESTUDIO RESISTENCIA A LA COMPRESION

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA DE LA MAQUINA (KG/F)	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA (PSI)	% RESISTENCIA OBTENIDA	% RESISTENCIA PROMEDIO	OBSERVACIONES
9	SOLADO	13-mar-26	20-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	212,60	21678,8	2000	1752	87,6	88,7	
10	SOLADO	13-mar-26	20-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	218,00	22229,5	2000	1797	89,8		
13	PLACA Y VIGA	19-mar-26	26-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	321,00	32732,4	3000	2646	88,2	87,6	
14	PLACA Y VIGA	19-mar-26	19-mar-26	7	176,72	15,0	30,0	316,50	32273,5	3000	2309	87,0		
21	PLACA	26-mar-26	01-abr-26	7	176,72	15,0	30,0	312,20	31835,0	3000	2573	85,8	85,3	
22	PLACA	26-mar-26	01-abr-26	7	176,72	15,0	30,0	308,50	31457,7	3000	2543	84,8		

UBALDO VARGAS GERONIMO
COORDINADOR DE LABORATORIO

CPDP 091

Teléfono: (605)373 1655 - (605)373 1847
www.maraseo.co

maraseo S.A.S. E.S.P.
NIT: 802.009.517 - 6

PLM - 12836

RECEPCIÓN DE RCD - PUNTO LIMPIO

RESOLUCIÓN C.R.A. No. 0416 de 2022

Ciudad: Puesto Colombia Fecha: 06/03/2026

GENERADOR: Roberto Donado

OBRA: La Magdalena

TIPO DE RCD	CANTIDAD
EXCAVACION:	
PETREOS:	14 M³ Escombros
NO PETREOS:	
TOTAL TONELADAS:	

Saldo 849

VEHICULO: SMG 849 RECIBI: Alvaro Ramos

CPDP 092

Powered by CamScanner

Teléfono: (605)373 1655 - (605)373 1847
www.maraseo.co

maraseo S.A.S. E.S.P.

NIT: 802.009.517 - 6

PLM - 14553

RECEPCIÓN DE RCD - PUNTO LIMPIO

RESOLUCIÓN C.R.A. No. 0416 de 2022

Ciudad: Puerto Colombia Fecha: 07/03/2026

GENERADOR: Roberto Donado

OBRA: La Magdalena

TIPO DE RCD	CANTIDAD
W6A-161	EXCAVACION:
	PETREOS: 14 M³ (SCO.)
	NO PETREOS:
	TOTAL TONELADAS: 10.54

VEHICULO: W6A 161 RECIBI: Josue Orellano

CPDP 093

Powered by CamScanner

MXK 200 Isaac Pizarro. 6

Teléfono: (605)373 1655 - (605)373 1847
www.maraseo.co

maraseo S.A.S. E.S.P.
NIT: 802.009.517 - 6

PLM - 14583

RECEPCIÓN DE RCD - PUNTO LIMPIO

RESOLUCIÓN C.R.A. No. 0416 de 2022

Ciudad: Puerto Colombia Fecha: 10/03/2026

GENERADOR: Roberto Donado

OBRA: La Magdalena

TIPO DE RCD	CANTIDAD
EXCAVACION:	
PETREOS:	14 4/3 escombros 14.36
NO PETREOS:	
TOTAL TONELADAS:	

MXK-200


VEHICULO: MXK 700 RECIBI: Isaac Pizarro

Magdalena

Lleno

CPDP-094

Powered by CamScanner



Teléfono: (605)373 1655 - (605)373 1847
www.maraseo.co

maraseo S.A.S. E.S.P.
NIT: 802.009.517 - 6

PLM - 14596

RECEPCIÓN DE RCD - PUNTO LIMPIO

RESOLUCIÓN C.R.A. No. 0416 de 2022

Ciudad: Puerto Colombia Fecha: 28/03/2026

GENERADOR: Roberto Donado

OBRA: La Magnolia

TIPO DE RCD	CANTIDAD
	EXCAVACION: 14 y 9:57
WPT-377	PETREOS:
	NO PETREOS:
	TOTAL TONELADAS:

VEHICULO WPT 377 RECIBI:

CPDP 095

Powered by CamScanner
