Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME DE SUPERVISION**	CODIGO:	FSI-800-004
		VERSION	01
		FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO

ACUERDO DE APROBACIÓN N°	1470 de 2025
FECHA DEL ACUERDO:	9 de abril de 2025
NOMBRE PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS. CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLU Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS. DEPARTAMENTO DE SUCRE.
SECTOR:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FASE:	FACTIBILIDAD – FASE III
VALOR:	$ 2.401.226.400,00
TIPO DE RECURSO:	SGR - Asignación para la inversión regional 60%
VALOR APROBADO:	$ 2.401.226.400,00

1.2. VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

FUENTES APROBADAS	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL SGR	VALOR APROBADO

1.3. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
1470	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS. CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLU Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS. DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 2.401.226.400,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 2.401.226.400,00

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

1.4. TRÁMITES SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD:

TIPO DE AJUSTE	ACUERDO / RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES

2. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO NÚMERO:	CM-006-2025
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DEEL MAMON, LAS PENAS, CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DECOROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLU Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO BERA
VALOR DEL CONTRATO:	$144.744.600
VALOR ADICIONAL:	
VALOR ACTUALIZADO:	$144.744.600
% DEL ANTICIPO:	
VALOR DEL ANTICIPO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BERA
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciohai@gmail.com

2.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA:	
SUSPENSIÓN:	
TIEMPO:	
REINICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE JUNIO DE 2026

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

3. CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	1211
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSE LUIS ALTAMIRANDA ARREGOCES

4. AVANCE DEL PROYECTO


4.1. AVANCE GENERAL:

PERIODOS	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Periodo 1	9.01 %	9.01%	6.22 %	6.22 %
Periodo 2	6.21 %	15.22 %	6.37 %	12.59 %
Periodo 3				
Periodo 4				

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

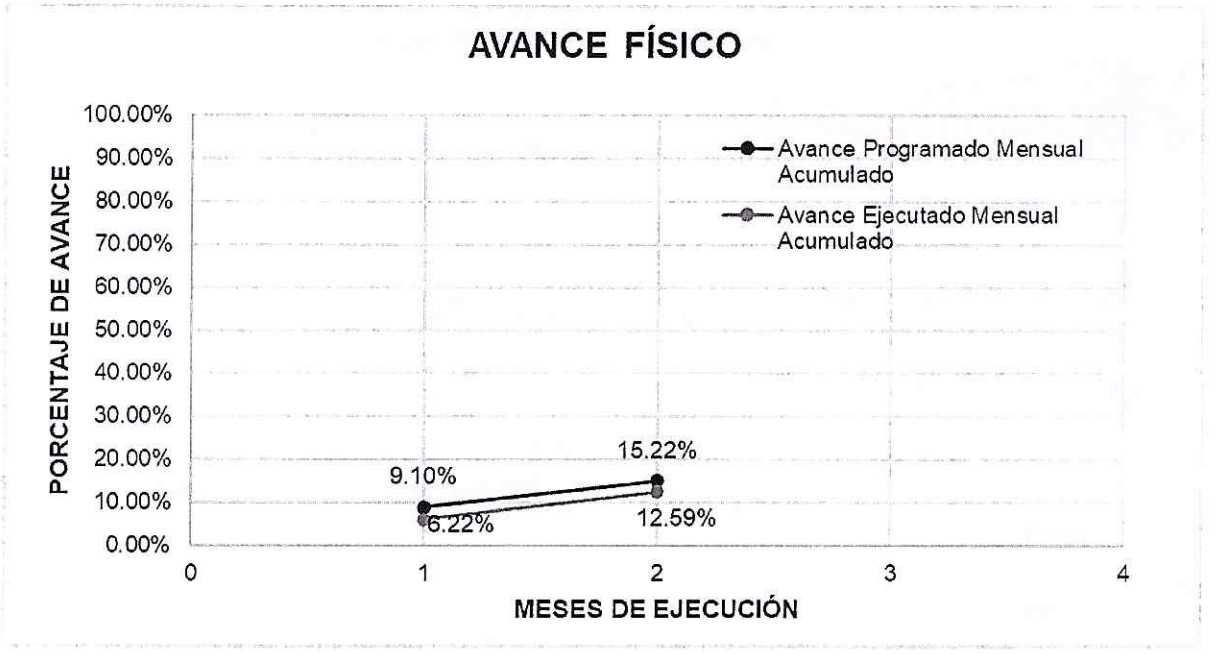

Avance físico programado es de 15.22% y avance físico ejecutado es de 12.59%, el proyecto presenta un avance porcentual de 2.63% menor al programado mensual.

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

4.2. CONTRATO DE CONSULTORIA:

CONTRATO DE OBRA N° CM-004-2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS, CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DE CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($2.212.852.200)
VALOR DE ADICIÓN:	
VALOR ACTUALIZADO:	
% DEL ANTICIPO:	CUARENTA POR CIENTO (40%)
VALOR DEL ANTICIPO:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($885.140.880)
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECRON
CORREO ELECTRÓNICO:	Consorcioecron@gmail.com
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de diciembre de 2025
PRÓRROGA:	
SUSPENSIÓN:	
REINICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14 de junio de 2026
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	15.22 %
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	12.59 %
AVANCE FINANCIERO:	$ 278,517,772.57
OBSERVACIONES:	

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

AVANCE FISICO

PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	9.10%	$ 137.774.479.72	9.10%	$ 137.774.479.72	6.22%	$ 137.774.479.72	6.22%	137.774.479.72
Periodo 2	6.21%	$ 251.235.815.95	15.22%	$ 389.010.295.67	6.37%	$ 140.743.292.86	12.59%	$ 278.517.772.57
Periodo 3								

5. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 AVANCE INTERVENTORÍA

5.1.1 CONTROL DE COSTOS

AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	F.M	VALOR TOTAL
ingeniero Civil especialista gerencia y dirección de proyectos	Director de Interventoría	1	50%	6	$ 7.000.000	1,86	$ 39.060.000
Ingeniero especialista sanitaria y/o Hidráulica	Ingeniero especialista sanitaria y/o hidráulica	1	50%	6	$ 6.000.000	1,86	$ 33.480.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Secretaria	1	100%	6	$ 1.600.000	1,92	$ 18.432.000
							$ 90.972.000

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	CANTIDAD	%	MESES	VALOR	VALOR TOTAL
Alquiler de Oficina, servicios y comunicaciones	1	100	6	$ 2.000.000	$ 12.000.00
Edición de informes	1	100	6	$ 1.395.000	$ 8.370.000
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 20.370.000
				TOTAL COSTOS	$ 111.342.000
				IVA (19%)	$ 21.154.980
				IMPUESTOS (ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 11%)	$ 12.247.620
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 144.744.600

Avance físico programado ____41,67%___% y avance fisico ejecutado ___41,67%___%


5.1.2 AVANCE FISICO

PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	8,33%	$ 12.062.050	8,33%	$ 12.062.050	8,33%	$ 12.062.050	8,33%	$ 12.062.050
Periodo 2	16,66%	$ 24.124.100	25%	$ 36.186.150	16,66%	$ 24.124.100	25%	$ 36.186.150
Periodo 3	16,66%	$ 24.124.100	41,67%	$ 60.310.250	16,66%	$ 24.124.100	41,67%	$ 60.310.250

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

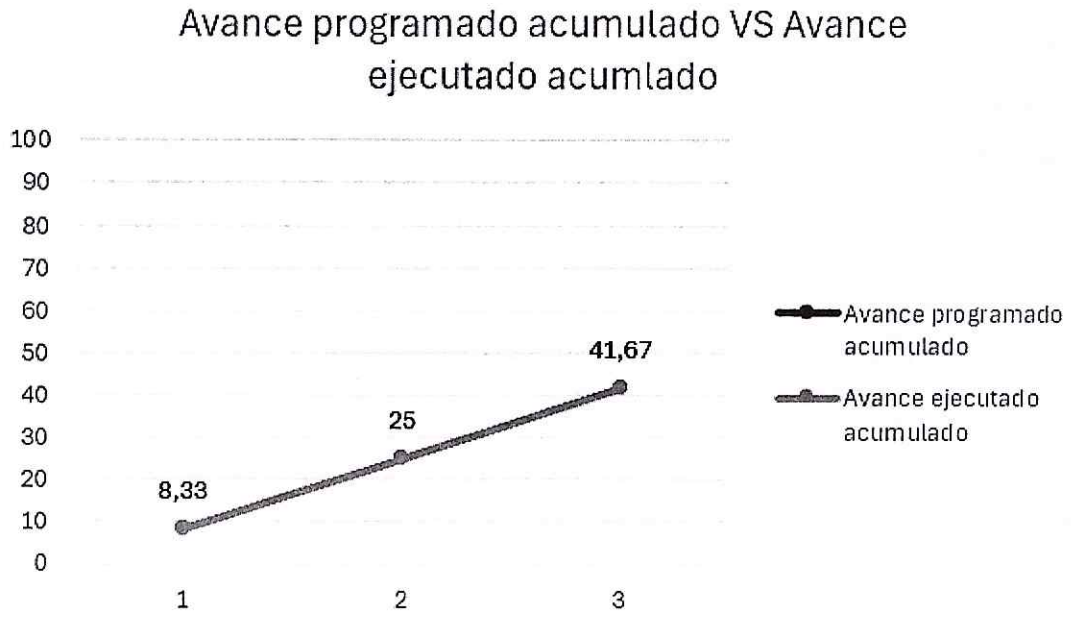

5.1.3 GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Director de interventoría	Acompañamiento en la planificación, coordinación y supervisión integral de la ejecución del proyecto.
Especialista en sanitaria y/o Hidráulica	Acompañamiento en el diseño, revisión y supervisión de los sistemas de acueducto y alcantarillado del proyecto en cuestión.
Secretaria	Acompañamiento en las labores administrativas.

5.1.4 CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista presentó planilla de pago N°: 9501518055, correspondiente al mes de marzo, la cual, se encuentra en el informe de mensual de interventoría suministrado a la secretaria de infraestructura.

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

5.2 INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

5.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

5.2.2 GARANTÍAS: POLIZAS ACTUALIZADS CON ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	96-44-101201048
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	16/12/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S. A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/12/2025	15/12/2026	$14.474.460
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	15/12/2025	14/06/2029	$7.237.230
CALIDAD DE SERVICIO	14/06/2026	14/06/2031	$14.474.460

Teléfono: (+57) 320 3509703
Linea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

6. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

6.1 PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA:

ACTA No.	FECHA	%EJECUCIÓN	VALOR EN REVISION	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO	25/03/2026	40%	$ 531.084.528	$ 531.084.528
TOTALES				$ 531.084.528

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 15/12/2025 AL 25/03/2026

6.2 PAGOS REALIZADOS INTERVENTORIA

ACTA No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR EN REVISION	VALOR ACUMULADO
1	28/02/2026	41.67%	$60.310.250	$60.310.250
TOTALES				$60.310.250

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 15/12/2026 AL 28/02/2026

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

7. GESTIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISION

7.1 ACTVIDADES REALIZADAS

	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES	CANTIDAD ASISTENTES	EVIDENCIA	RESPONSABLE SOCIAL SID
1	ACTA DE COMITE	COROZAL	16 de DICIEMBRE de 2025	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	6	ACTA DE COMITE	INTERVENTORIA
2	SOCIALIZACION COMUNITARIA	COROZAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	9	ACTA DE COMITE	CONSULTORIA
3	SOCIALIZACION COMUNITARIA	TOLU	22 DE DICIEMBRE DE 2025	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	9	ACTA DE COMITE	CONSULTORIA
4	SOCIALIZACION COMUNITARIA	OVEJAS	26 DE DICIEMBREDE 2025	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	9	ACTA DE COMITE	CONSULTORIA
2	ACTA DE COMITE	TOLU	30 DE DICIEMBRE DE 2025	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	6	ACTA DE COMITE	INTERVENTORIA
3	ACTA DE COMITE	OVEJAS	13 DE ENERO DE 2026	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	6	ACTA DE COMITE	INTERVENTORIA
4	ACTA DE COMITE	COROZAL	27 DE ENERO DE 2026	INTERVENTORIA CONSULTORIA GOBERNACION	6	ACTA DE COMITE	INTERVENTORIA

7.2 PETICIONES DE LA COMUNIDAD

TIPO DE PETICIÓN	CANAL DE RECEPCIÓN PETICIONES	No. RECIBIDAS		No. ABIERTAS		No. CERRADAS		OBSERVACIONES
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Denuncia								
Petición								
Queja								
Reclamo								

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO				
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177				
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS			
		OTROS(Especifique)							

Solicitud información								
Sugerencia								
TOTAL								

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA, identificación de personal y costos directos ejecutados por la interventoría.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	VISITAS TECNICAS		
			
	OBSERVACIONES: SOCIALIZACION DE PROYECTO CON LAS COMUNIDADES		

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME DE SUPERVISION**	CODIGO:	FSI-800-004
		VERSION	01
		FECHA:	01/01/2024


INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	
			
	OBSERVACIONES: REALIZACION DE ENCUESTAS Y ANALISIS DE INFORMACION SECUNDARIOA		
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4	VISITAS TECNICAS	EJECUTADO	

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

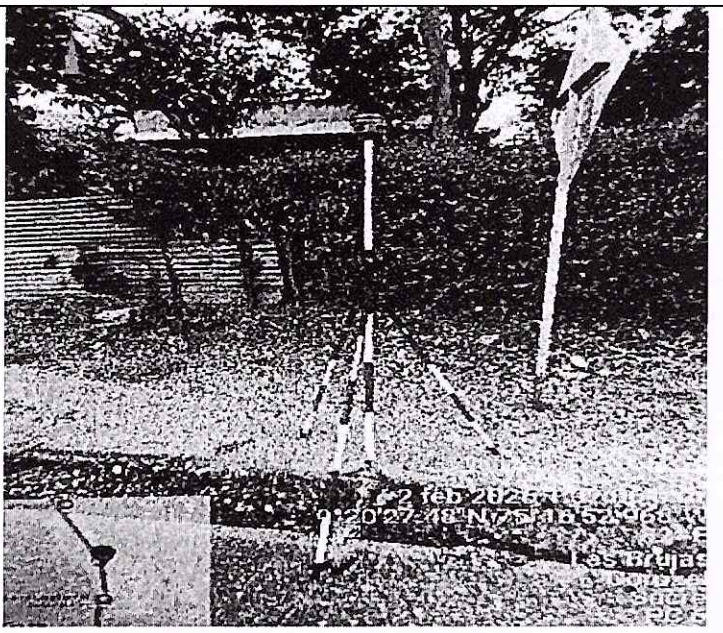
			
	OBSERVACIONES: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS		
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
5	VISITAS TECNICAS		

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME DE SUPERVISION**	CODIGO:	FSI-800-004
		VERSION	01
		FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

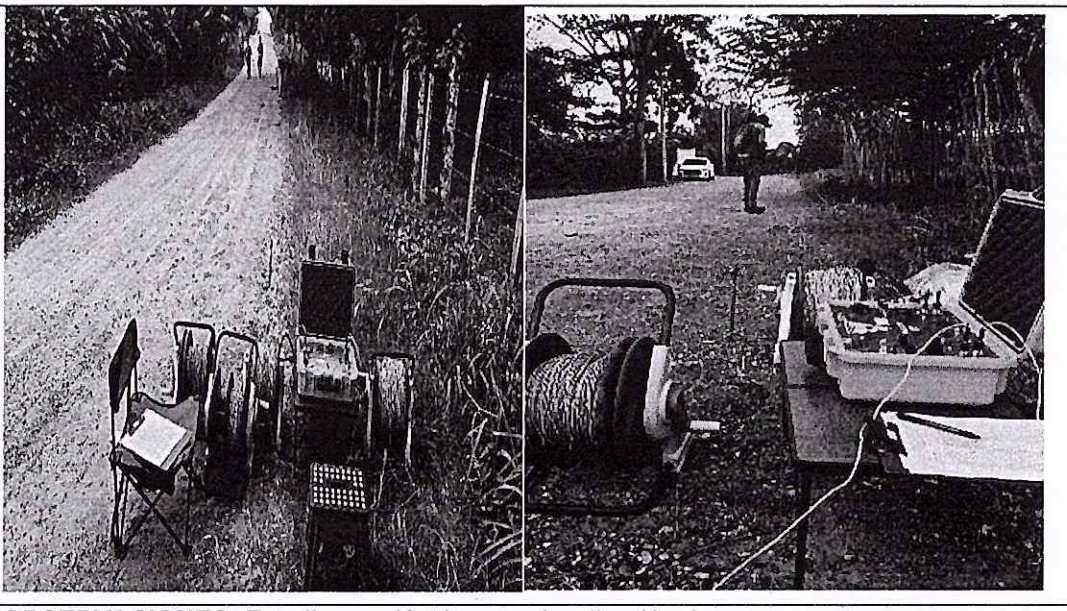			
	OBSERVACIONES: Estudio geoeléctrico para localización de aguas.		
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
6	VISITAS TECNICAS		

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					



Observaciones: Sondeos para analisis de las caracteristicas del suelo

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026		PERIODO		
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2023002700177		
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

9. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría del proyecto representado en la firma CONSTRUCCIONES BERA reportado a la Secretaría de Infraestructura, las actividades de la consultoría ejecutadas del contrato CM-004-2025 en el acta parcial No. 1 radicada el día 6 de abril de 2026 en la Secretaría de Infraestructura, por un valor ejecutado del 40% equivalente a $755.774.136,00, se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales.

Las actividades registradas en el acta parcial No. 1, establecen la entrega de los siguientes productos:

Diagnóstico y recolección de información.
- Socialización inicial del proyecto con comunidad, actores institucionales y conformación de veedurías ciudadanas.
- Encuestas poblacionales.
- Diagnostico poblacional.
- Diagnóstico situacional del sistema existente de acueducto, incluye catastro de redes.
Topografía
Investigación de suelos
Estudio Geotécnico
Alternativas
- Evaluación de la oferta.
- Evaluación de la demanda.
- Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable.
Diseño geométrico
Análisis de interferencias

El acta parcial No. 1 presentada por el consultor fue avalada por la interventoría y establece un avance acumulado de ejecución de 40%.

Se registra en el acta parcial No. 1 la amortización del anticipo del 40% en un valor de $354.056.532, por lo cual el valor a pagar del acta es $531.084.528,00

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A

INFORME No.	1	FECHA	09/04/2026	PERIODO			
CONTRATO N°	CM-004-2025	CODIGO BPIN PROYECTO		2023002700177			
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

Además, el Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados y presenta certificado de cumplimiento de requisitos para el pago del acta

Una vez revisada el acta parcial No.1, de acuerdo con los documentos técnicos avalados por la interventoría se da concepto favorable, dejando claro que el contenido de los productos elaborados, registrados en dicha acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y el recibo de los mismos por la interventoría.

Así mismo el contratista de interventoría radicó el Acta parcial de interventoría No. 1 en la Secretaría de Infraestructura el día 5 de marzo de 2026, correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, por un valor ejecutado de $60.0310.250 equivalente al 41,67%. El valor a pagar es de $60.0310.250, ya que este contrato no tuvo anticipo

Las pólizas de los contratos de consultoría CM-004-2025 y de interventoría CM-006-2025, se encuentran vigentes y actualizadas a la fecha.

El contratista de interventoría presentó y subsanó los informes mensuales de interventoría de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, además presentó las planillas de seguridad social de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 del personal que labora ejerciendo las funciones de interventoría.

Una vez revisada el acta parcial de interventoría No. 1, se da concepto favorable.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los 9 días del mes abril de 2026.

Firma

JOSE LUIS ALTAMIRANDA ARREGOCÉS
Ing. Apoyo a la supervisión
Secretaría de infraestructura

Firma

Vo. Bo. JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de infraestructura
Gobernación de Sucre

Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1
www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

SUCRE_C64583387-02461152172433-1071541-001949118-A
