YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

FECHA OFICIO RECIBIDA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
05/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-15-2025	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN Y FICHAS SOCIALES	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS	YOU ARE SERVICES S.A.S.
05/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-GEOT_03-2025	ENTREGA MEMORANDO TÉCNICO FINAL	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS	YOU ARE SERVICES S.A.S.
06/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-12A-2025	ENTREGA DE INFORME PATOLOGIA HOTEL EL FARO	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS	YOU ARE SERVICES S.A.S.
09/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-17-2025	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS	YOU ARE SERVICES S.A.S.
11/12/2025	ATCSAS_OF02-ESTRUC_03-2025	ENTREGA DE DISEÑOS SUPER ESTRUCTURA	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS	YOU ARE SERVICES S.A.S.
16/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-19-2025	DISEÑO DE VALLA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
26/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-20-2025	RESPUESTA A OFICIO YAS-CG-2025-027	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
27/12/2025	ATCSAS_OF02-YAS-21-2025	RESPUESTA A OFICIO YAS-CG-2025-033	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
02/01/2026	ATCSAS_OF02-YAS-22-2026	RESPUESTA A OFICIO YAS-CG-2025-034	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
05/01/2026	ATCSAS_OF02-YAS-23-2026	NOTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE CASETAS 4 Y 5 SAN ANDRESITO	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO DOCTOR JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ Oficina de Gestión del Riesgo
07-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-24-2026	ULTIMO AVISO RETIRO DE REDES	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
09-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-25-2026	ENTREGA INFORME MENSUAL N°1 Y ACTA PARCIAL N°1 DE OBRA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO

FECHA OFICIO RECIBIDA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09-01-2026	ATCSAS_OF02-SRIA MOVILIDAD-25-2026	SOLICITUD DE DOS (2) UNIDADES DE TRANSITO	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	Ing. Luis Fernando Ramirez Garzón, SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
14-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-27-2026 FECHA	SOLICITUD REPROGRAMACION COMITÉ DEL DIA DE MAÑANA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
16-12-2025	ATCSAS_OF02-YAS-19-2025	DISEÑO DE VALLA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, describimos las actividades realizadas por YOU ARE SERVICES SAS para el control técnico, legal, administrativo y financiero al Contrato de Obra No. 3777 de 2025, mediante el Contrato de Interventoría No. 3781 DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 al 14 de enero de 2026:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
COMITÉS TÉCNICOS PERIÓDICOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO.	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





OBSERVACIONES: Se realizaron comités técnico y mesas de trabajo con las partes interesadas, contratista de obra, supervisor e interventoría con el fin de informar a la entidad el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero del Contrato de obra, en especial al avance y programación de las obras en ejecución.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





OBSERVACIONES: Periódicamente la interventoría realiza el seguimiento en obra de la implementación de las acciones preventivas y correctivas descritas en el Plan de seguridad y salud en el trabajo del ATRICA SAS, minimizando riesgo de accidentes laborales que puedan afectar la integridad física y la salud de los trabajadores.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DEL ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





OBSERVACIONES: Se realizó la supervisión y control del cumplimiento de la Resolución 002307 de 2014 del Ministerio de Transporte. La Interventoría verificó que los vehículos de transporte de material (volquetas) contaran con el sistema de carpado debidamente tensionado, garantizando la cobertura total de la carga para evitar la dispersión de partículas de material de arrastre o pétreos, mitigando riesgos de seguridad vial y contaminación atmosférica en el corredor de influencia


ACTIVIDAD	CANTIDAD	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DEL ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





OBSERVACIONES: En el marco del seguimiento al componente biótico y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, se procedió a la identificación y delimitación de las áreas de bosque Ripario (franja de protección de fuentes hídricas) colindantes con el proyecto. Esta actividad permitió asegurar el estricto cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, garantizando que las actividades de construcción no generaran afectaciones directas ni vertimientos sobre las zonas de ronda hidráulica, preservando la conectividad ecosistémica y la estabilidad de taludes ribereños.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DEL ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1

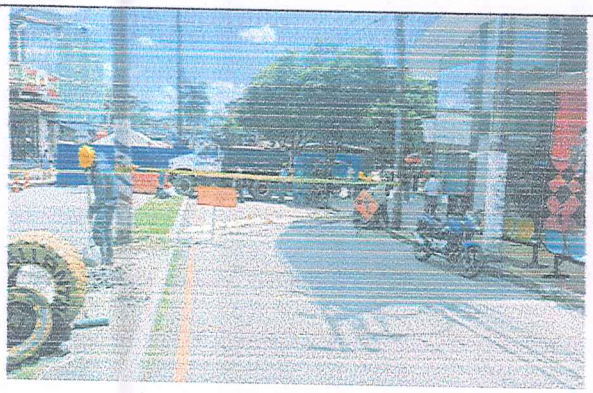



OBSERVACIONES: Se realiza el control y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, acorde a las normas vigentes que apliquen en la ejecución de la Orden de Compra y/o Servicio No. 12 de 2025. De igual manera la interventoría realiza el seguimiento de los recursos presupuestados para implementar el plan de manejo de tránsito y mensualmente anexo al informe de obra se informa a la entidad contratante las actividades realizadas durante el mes.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
LABORATORIO - INTERVENTORAS (INCLUYE EQUIPO COMPLETO Y ENTREGA DE INFORMES DE ENSAYOS Y RESULTADOS)	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





OBSERVACIONES: Se realizó la supervisión y control de calidad durante la fase de fundición de elementos de concreto, mediante la elaboración de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo con la norma **NTC 550**. La Interventoría verificó el cumplimiento de los siguientes protocolos técnicos:

- **Muestreo:** Toma de muestra representativa de la mezcla central de la unidad de transporte, previo control de asentamiento (Slump) bajo la **NTC 396**.
- **Elaboración:** Llenado de moldes en tres capas iguales, aplicando la compactación por varillado (25 inserciones por capa) para eliminar vacíos y aire atrapado.
- **Protección Inicial:** Almacenamiento de los cilindros en un ambiente controlado para evitar la pérdida de humedad y fluctuaciones térmicas durante las primeras 24 horas.
- **Identificación:** Marcación inequívoca de cada espécimen incluyendo fecha, nombre de elemento y resistencia esperada, garantizando la cadena de custodia hacia el laboratorio de interventoría.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 1





- **OBSERVACIONES:** Se ejecutó el monitoreo topográfico para la auscultación del puente colapsado. Se realizaron lecturas diarias de asentamientos verticales y desplazamientos horizontales utilizando una estación total de precisión milimétrica y niveles de precisión. Esta
