CONTRATO No. 4600106222 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 23/12/2025 al 20/04/2026

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20/04/2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL
CONTRATISTA:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
NIT:	900.092.385-9
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA (Apoderado)
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79059931
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y CENTROS DE DATOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE ML ($1.187.042.609) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE ML ($1.187.042.609) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: CINCO (6) MESES

FECHA DE INICIO: 12/11/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600106222 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo evaluado el contratista realizó la instalación y configuración de 17 dispositivos de red Fortinet y 62 Módulos Transceiver para las conexiones de fibra óptica entre los switches core y los switches de acceso ubicados en los pisos 1, 2, 3 y 4 del Concejo Distrital:

Ítem	Modelo	Descripción	Serial
1	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24061669
2	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24061983
3	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	5148FFTF24062041
4	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	5148FFTF24062163
5	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24062168
6	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	5148FFTF24062305
7	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	5148FFTF24062370
8	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24062846

9	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24058732
10	FS-148F-FPOE	Switche Fortinet 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S148FFTF24058738
	SUBTOTAL		**10**
11	FS-124F-FPOE	Switche Fortinet 24 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S124FFTF25002023
12	FS-124F-FPOE	Switche Fortinet 24 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S124FFTF25002187
13	FS-124F-FPOE	Switche Fortinet 24 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S124FFTF25002216
14	FS-124F-FPOE	Switche Fortinet 24 puertos Gigabit Ethernet con PoE	S124FFTF25002221
	SUBTOTAL		**4**
15	FS-1024E	Switche Core Fortinet - Puertos: 24 x 1GE/10GE SFP/SF	FS1E24TF25003055
16	FS-1024E	Switche Core Fortinet - Puertos: 24 x 1GE/10GE SFP/SF	FS1E24TF25003119
	SUBTOTAL		**2**
17	FG-200F	Firewall Fortigate	FG200FT922953447
	SUBTOTAL		**1**
	TOTAL		17
Ítem	**Parte / Modelo**	**Descripción**	**Serial**
18	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BZW4
19	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BG8D
20	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BFX2
21	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BEUT
22	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5AXLD
23	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHEG
24	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BH5Y
25	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHA5
26	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHA3
27	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BEDU
28	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHA6
29	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHAD

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71768604

30	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BETP
31	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHAE
32	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHAB
33	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHB9
34	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BFV1
35	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BFUM
36	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BETN
37	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHB4
38	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BHAL
39	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE3E6Y2
40	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE3E6WM
41	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE3E6YB
42	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE3E6WD
43	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE4DMZU
44	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5AXNX
45	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BGP8
46	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFME
47	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFLX
48	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BEQ9
49	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFTV
50	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFTT

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71768604

51	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMKF
52	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMK0
53	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFM9
54	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMK3
55	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFMJ
56	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMKJ
57	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFTQ
58	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFMF
59	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFM6
60	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7C02J
61	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMJZ
62	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFMC
63	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7AMK1
64	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFM0
65	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFM8
66	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFTW
67	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BFLZ
68	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BZGY
69	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BXY1
70	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE2CQ6T
71	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BZ8S

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

72	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE7BZ94
73	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE4CQDN
74	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE2AX6R
75	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NDSALMl
76	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NDSA22X
77	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BC6H
78	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NE5BETW
79	FN-TRAN-SFP+SR	Módulo Transceiver FN-TRAN-SFP+SR (GBIC)	NDBDWM8
	TOTAL		**62**

Todos los dispositivos fueron ubicados en las instalaciones del Concejo Distrital en los racks de datos de los pisos 1, 2 ,3 y 4, a excepción del ítem 17, el cual fue instalado en el Data Center del CAD, para desplegar una solución de firewall con redundancia.

El contratista, también realizó la instalación y certificación de 449 puntos de datos en la categoría de cableado estructurado 6A, distribuidos así:

PISO	CANTIDAD
1	46
2	296
3	71
4	36
TOTAL	**449**

Adicionalmente, el contratista realizó la interconexión de los switches, con fibra óptica redundante entre el piso 2 y los pisos 1, 3, 4 y el Data Center del CAD. Las fibras ópticas fueron certificadas.

La instalación del cableado estructurado incluyó el montaje 3 racks, así:


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PISO	TIPO DE RACK	MARCA	SERIAL O NUMERO DE PARTE
1	Rack de pared de 11UR	TYU	R11U60
2	Rack abierto 210 cm 45UR + 2 organizadores verticales de 1.80 cm	TYU	PT0108006
4	Rack de pared de 11UR	QUEST	GC20511

Este entregable corresponde al 20% del valor total del contrato.

El contratista entregó la documentación con el inventario de los switches con sus respectivas ubicaciones en los racks, configuraciones de los puertos en cada Switche x rack x piso, las VLANs, los segmentos de red, las ubicaciones de los puntos de acceso inalámbrico x switche x rack x piso.


También entregó un informe donde se detalla el diseño lógico de la red de datos implementada, incluyendo la topología, el inventario de los puntos datos con la descripción de los elementos utilizados para su instalación y consolidación, la cantidad y distribución de los enlaces de fibra óptica y los racks instalados por piso en el Concejo Distrital. Finalmente, describe las recomendaciones de mantenimiento y crecimiento de la red:

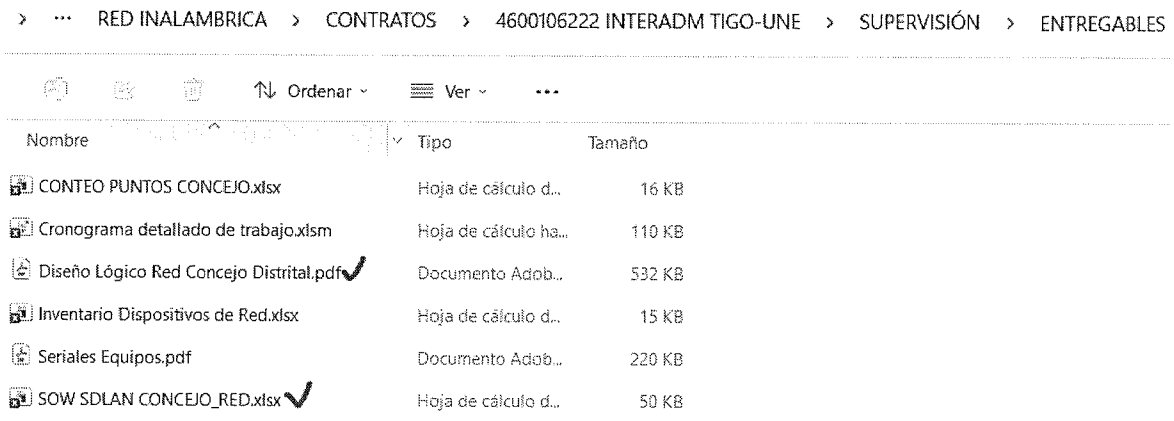

Este entregable corresponde al 10% del valor total del contrato.

- Durante el periodo evaluado, el contratista y el contratante han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro de las cuales se puede

mencionar la entrega del certificado del pago de parafiscales de los últimos 6 meses y los comprobantes de pago:



- La ejecución física del contrato durante el periodo evaluado es del 91.76 %.

- El cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  Con la realización de este contrato, se busca actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica del Concejo Distrital, con la cual se pretende mejorar el desempeño y la seguridad perimetral de la red datos, la gestión y administración de los dispositivos activos de la red, garantizar la continuidad de los servicios institucionales y la interoperabilidad con la arquitectura tecnológica del Centro Administrativo Distrital – CAD.

  El contrato se encuentra en marco del Plan de Plan de Desarrollo 2024 - 2027, "Medellín Te Quiere", Pilar 1. BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO, Componente 1.3. Desarrollo económico, productividad y competitividad, Programa 1.3.10. Medellín Distrito Inteligente.

  En el siguiente cuadro se discrimina la información relevante del contrato con respecto al plan de desarrollo:

Dependencia	CodBPIN	Pilar	Componente	Programa	Nombre del proyecto	Indicadores
Secretaría de Innovación Digital	202500000001245	1.Bienestar social y económico	1.3. Desarrollo económico, productividad y competitividad	1.3.10. Medellín distrito inteligente	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del Distrito Medellín	1.Portal único al ciudadano implementado 2.Servicios al ciudadano digitalizados

- Reporte Retenciones del Contrato:

A la fecha se han realizado las siguientes retenciones al contratista, según la factura FE BSPU3077856, correspondiente al pago anticipado para la compra de equipos Fortinet e insumos para la instalación del cableado estructurado:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro Innovación: 1%	$ 4.987.574
Estampilla Justicia Familiar: 2%	$ 9.975.148
Total general	**$ 14.962.722**

FE BSPU3078272, correspondiente al pago por la entrega del cronograma de actividades del contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro Innovación: 1%	$ 997.514
Estampilla Justicia Familiar: 2%	$ 1.995.030
Total general	**$ 2.992.544**

FE BSPU3080267, correspondiente al pago por la entrega del diseño de red física y lógica contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro Innovación: 1%	$ 997.514
Estampilla Justicia Familiar: 2%	$ 1.995.030
Total general	**$ 2.992.544**

FE BSPU3080268, correspondiente al pago por el montaje y funcionamiento de los equipos de red:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro Innovación: 1%	$ 1.995.030
Estampilla Justicia Familiar: 2%	$ 3.990.059
Total general	**$ 5.985.089**

Total Retenciones Acumuladas	**$ 26.932.899**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71768604

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Reporte del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/11/2025	Desde 01/05/2025 - Hasta 31/10/2025	Karina Paola Mosquera Salcedo Revisor Fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A., T.P 222967-T Miembro de KPMG S.A.S
17/12/2025	Desde 01/06/2025 - Hasta 30/11/2025	
27/03/2026	Desde 01/09/2025 - Hasta 28/02/2026	

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

Solicitud de marcación a la Unidad de Bienes Muebles del Distrito:

Medellín, 21 de enero de 2026

Doctor Robeiro Bedoya Ocampo

Lider Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaria de Suministros y Servicios
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Concejo Distrital de Medellín con las siguientes caracteristicas:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Switche Fortinet FS-148F-FPOE	10	7 años
Switche Fortinet FS-124F-FPOE	4	7 años
Switche Fortinet FS-1024E	2	7 años
Firewall Fortigate FG-200F	1	7 años

Responsable (s)	Arcadio Uribe Mejía
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	70563599
Teléfono	3006517617
Numero de contrato	4600106222 de 2025
Ubicación (dirección) del bien mueble	CAD - Bodega TI – Oficina 610
Secretaria	Innovación Digital

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica).
- Otros documentos que sean necesarios

Atentamente,

Firma
Luis Alberto Angel Botero
Supervisor del contrato.
Dependencia: Equipos Telecomunicaciones – Subsecretaria de Servicios de Tecnologías de la Información
Correo electrónico: luis.angelb@medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165, Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

Soporte de la marcación de bienes por parte de la unidad de bienes muebles:

Día: 30 **Mes**: ENERO **Año**: 2026

Ciudad: MEDELLIN **Secretaria**: CONCEJO DE MEDELLÌN

Contrato Nro: 4600106222 DE 2025

Nombre de la Institución: CONCEJO DE MEDELLIN

Nombre del Técnico Administrativo: ASTRID AGUIRRE

Nombre del Servidor: ARCADIO URIBE MEJIA

Hora de inicio: _____ **Hora de terminación**: _____

Observaciones generales: (Enunciar novedades como faltantes, sobrantes u otros).

SE REALIZA LA MARCACIÒN, SIN NOVEDADES

Nombres y Apellidos Técnico Administrativo: ASTRID AGUIRRE

Firma Técnico Administrativo:

Nombres y Apellidos Servidor: ARCADIO URIBE MEJIA

Firma Servidor:

Página 1 de 1

71768604

Cód. FO-ADMI-014		
Versión. 7	Formato FO-ADMI Formato Único para Alta de Bienes Muebles	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

DEPENDENCIA: CONCEJO DE MEDELLIN

CONTRATO: 4600106222 DE 2025 FECHA: 30 DE ENERO DE 2026

ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR	Nro. FACTURA	FOLIO
1	200697068	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
2	200697069	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
3	200697070	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
4	200697071	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
5	200697072	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
6	200697073	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
7	200697074	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
8	200697075	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
9	200697076	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
10	200697077	SWITCHE FORTINET FS-148F-FPOE	1	$ 7.897.383		
11	200697078	SWITCHE FORTINET FS-124F-FPOE	1	$ 5.048.627		
12	200697079	SWITCHE FORTINET FS-124F-FPOE	1	$ 5.048.627		
13	200697080	SWITCHE FORTINET FS-124F-FPOE	1	$ 5.048.627		
14	200697081	SWITCHE FORTINET FS-124F-FPOE	1	$ 5.048.627		
15	200697082	SWITCHE FORTINET FS-1024E	1	$ 49.337.277		
16	200697083	SWITCHE FORTINET FS-1024E	1	$ 49.337.277		
17	200697084	FIREWALL FORTIGATE FG-200F	1	$ 47.921.238		

TECNICO VERIFICADOR BIENES MUEBLES: ASTRID AGUIRRE FIRMA:

RESPONSABLE : ARCADIO URIBE MEJIA FIRMA Y CC: 70513799

Dato Maestro		Valor ($)	
Dato Maestro		Valor ($)	

- En el periodo evaluado se realizaron las siguientes modificaciones del contrato, así:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Ampliación No. 01: Por el término de tres (3) meses a partir del primero (1) de enero de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026, ambas fechas inclusive.

  De conformidad con el Acta del Comité Interno que aprueba la modificación: Acta del CIP de la Secretaría de Innovación Digital N°046 del 03 de diciembre de 2025.

- Ampliación No. 02: Por el término de tres (1) mes a partir del primero (1) de abril de 2026 hasta el treinta (30) de abril de 2026, ambas fechas inclusive.

  De conformidad con el Acta del Comité Interno que aprueba la modificación: Acta del CIP de la Secretaría de Innovación Digital N°013 del 20 de marzo de 2026.

- En el periodo evaluado no se han materializado los riesgos descritos en los pliegos de condiciones del contrato.

- Durante el periodo evaluado el contrato no ha sido auditado por los entes de control.

- Evaluación al contratista:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600106222
Objeto del Contrato Contrato interadministrativo para la prestación de servicios integrales en la infraestructura de redes y
Numero Evaluación 3
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	3,00	2,40
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	3,50	28,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	3,00	6,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	17,20	19,07
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	9,40	9,80
TÉCNICO	50	34,00	44,67

% Calificacion Total	80,60

% Total Calificacion acumulado	93,54

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110A30224 - 110090125	75200000	2320202008	240335	4000122804	50103045	4800016092

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido) IVA Incluido
4800016092	FE BSPU3077856	14.11.2025	5000779436	$ 593.521.303
	FE BSPU3078272	09.12.2025	5000784520 - 5000784521	$ 118.704.261
	FE BSPU3080267	17.04.2026	5000794576	$ 118.704.260
	FE BSPU3080268	17.04.2026	5000794601	$ 237.408.522

Nota: se corrigen las fechas de las 2 primeras facturas.

Código del Contrato	Número de la Orden de Pago	Fecha del Pago	Total Bruto del Pago	Deducciones y Retenciones del Pago
4600106222	5100461118	24.11.2025	$ 593.521.303	$ 14.962.722
	5100465206 5100465207	18.12.2025	$ 118.704.261	$ 2.992.544
	5100471632	20.04.2026	$ 118.704.260	$ 2.992.544
	5100471604	20.04.2026	$ 237.408.522	$ 5.985.089

- Detalle Recibo y aceptación de Facturas en SAP:

XML	Factura	Act. contrato	Gestionar	AcuseRecibo	ReciboBien	Reclamar	Aceptar	Log eventos Dian	EstadoEvento	Estado	Contrato	Responsable	TIPO	Secretaria
					✓				ACEP-EXPRESA	FINALIZADO	4600106222	Luz Stella Martinez Giraldo	FACTURA	237
					✓				ACEP-EXPRESA	TESORERIA	4600106222	KELLY JOHANA TOBON LOAIZA	FACTURA	237
					✓				ACEP-EXPRESA	TESORERIA	4600106222	KELLY JOHANA TOBON LOAIZA	FACTURA	237
					✓				ACEP-EXPRESA	FINALIZADO	4600106222	Luz Stella Martinez Giraldo	FACTURA	237

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Numero	Fecha Exp..	N.I.F.1	Us Contratista	Correo Contratista	Valor con IVA
BSPU3078272	05.12.2025	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACION..	beatriz.lopez.agudelo@une.com.co	118.704.261,00
BSPU3080267	16.04.2026	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACION..	beatriz.lopez.agudelo@une.com.co	118.704.260,00
BSPU3080268	16.04.2026	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACION..	beatriz.lopez.agudelo@une.com.co	237.408.521,00
BSPU3077856	14.11.2025	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACION..	beatriz.lopez.agudelo@une.com.co	593.521.304,00

Nº Acuse Recibo	Log Estados	Log datos mod	Log Mail	Anexos	LogEventos	Estado.Cont	Estado.Teso
9000040073-9000040084						OO■	OO■
9000008599						OO■	OO■
9000008651						OO■	OO■
9000034678						OO■	OO■

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600106222	4800016092	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital	1.187.042.609	712.225.564	474.817.045

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 1.187.042.609 IVA incluido
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 1.187.042.609 IVA incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 712.225.564 IVA incluido
Pago autorizado del mes de Abril	$ 356.112.782 IVA incluido
Porcentaje de ejecución financiera	90 %

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

- Pólizas actualizadas al Acta de Inicio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	CUM 65-44-101244425	Devolución del pago anticipado	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 593.523.304,50
		Cumplimiento	07/11/2025	30/06/2026	10/11/2025	$ 237.409.321,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 59.352.330,45
		Calidad	07/11/2025	30/06/2026	10/11/2025	$ 237.409.321,80

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	RCE_65_40_ 101084759_0	Predios labores y operaciones	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 284.700.000
		Contratistas y subcontratistas	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000
		Vehículos propios y no propios	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000
		Responsabilidad civil patronal	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000
		Responsabilidad Civil cruzada	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000
		Daño emergente y lucro cesante	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000
		Perjuicios extra patrimoniales	07/11/2025	31/12/2025	10/11/2025	$ 85.410.000

- Pólizas Actualizadas a la modificación No.1 del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	CUM 65-44-101244425 Anexo 2	Devolución del pago anticipado	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 593.523.304,50
		Cumplimiento	07/11/2025	30/09/2026	22/12/2025	$ 237.409.321,80
		Pago de Salarios y Prestaciones	07/11/2025	31/03/2029	22/12/2025	$ 59.352.330,45

		Sociales, otros				
		Calidad	07/11/2025	30/09/2029	22/12/2025	$ 237.409.321,80

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	RCE 65_40_10108 4759 Anexo 1	Predios labores y operaciones	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 284.700.000
		Contratistas y subcontratistas	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000
		Vehículos propios y no propios	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000
		Responsabilidad civil patronal	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000
		Responsabilidad Civil cruzada	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000
		Daño emergente y lucro cesante	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000
		Perjuicios extra patrimoniales	07/11/2025	31/03/2026	22/12/2025	$ 85.410.000

- Pólizas Actualizadas a la modificación No.2 del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	CUM 65-44-101244425 Anexo 3	Devolución del pago anticipado	07/11/2025	30/04/2026	22/12/2025	$ 593.523.304,50
		Cumplimiento	07/11/2025	31/10/2026	22/12/2025	$ 237.409.321,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	07/11/2025	30/04/2026	22/12/2025	$ 59.352.330,45
		Calidad	07/11/2025	31/10/2026	22/12/2025	$ 237.409.321,80

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71768604

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	RCE 65_40_10108 4759 Anexo 3	Predios labores y operaciones	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 350.181.000
		Contratistas y subcontratistas	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300
		Vehículos propios y no propios	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300
		Responsabilidad civil patronal	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300
		Responsabilidad Civil cruzada	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300
		Daño emergente y lucro cesante	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300
		Perjuicios extra patrimoniales	07/11/2025	30/04/2026	16/04/2026	$ 105.054.300

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor, autoriza 2 pagos del periodo reportado por un valor total de $ 356.112.782 IVA incluido, correspondientes al 30 % del valor del contrato.

Atentamente,

Luis Alberto Angel Botero
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia
