DATOS GENERALES				
FECHA	DD: 16	MM: 02	AA: 2026	**LUGAR:** Virtual
HORA DE INICIO: 08:30 am				**HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:00 am
OBJETIVO: Mesa Técnica No. 01 del proyecto cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.”.				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01310 DE 2025 **Contratista: MUNICIPIO DE ONZAGA, NIT 890.208.148-5** **Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0**				
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ORDEN DE LA REUNIÓN
1. Inicio del comité técnico
2. Verificación del estado actual del proceso
3. Definición de ajustes y compromisos.
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realiza Mesa Técnica con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio de Onzaga. Durante la sesión se trataron los siguientes puntos:

Estado Actual Del Proceso

Durante la sesión se informó que el proyecto continúa en etapa precontractual.




El municipio indicó que el día 7 de noviembre de 2025 inició del convenio; sin embargo, a la fecha no se ha publicado el proceso en la plataforma SECOP de los derivados, situación que ha generado retraso frente al cronograma inicialmente planteado.

El municipio precisó que los retrasos obedecieron a la incorporación de los recursos en el presupuesto municipal, trámite que solo fue culminado recientemente. Superada esta situación, se dio continuidad a la gestión jurídica correspondiente y actualmente se adelantan las actuaciones necesarias, con el fin de proceder a la publicación de los derivados (contrato de obra e interventoría).

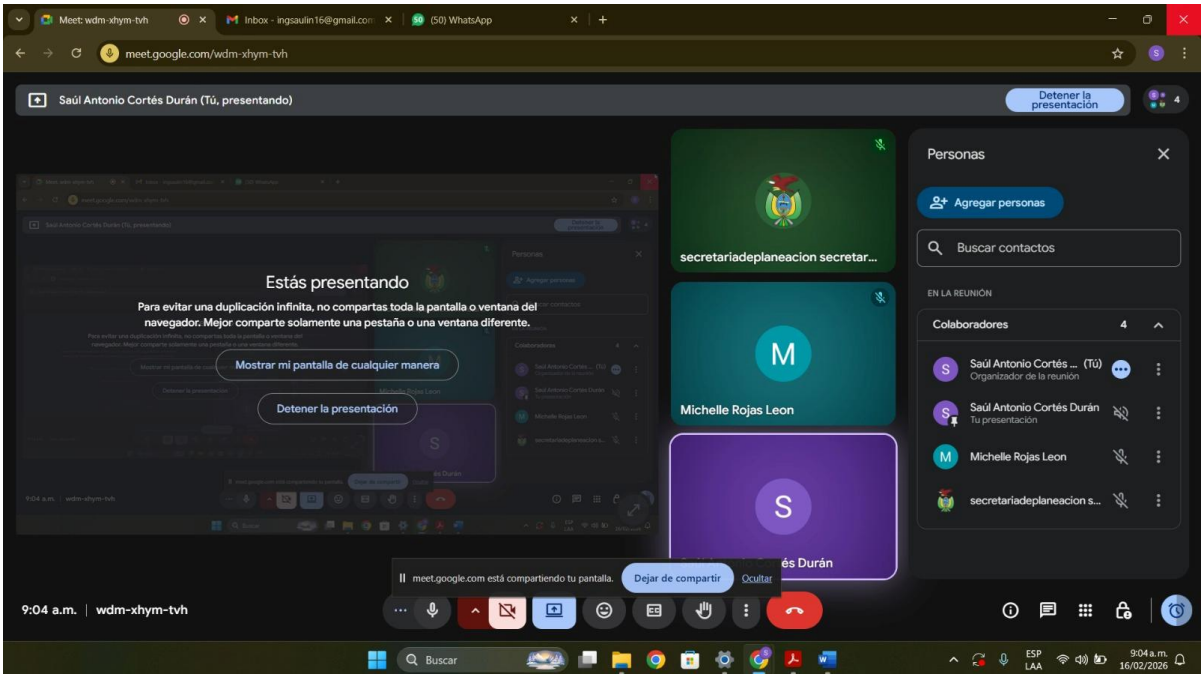
La CAS indicó que, conforme al cronograma inicial, el proyecto se encuentra en el mes cuatro (4); no obstante, aún no ha culminado la etapa precontractual, generándose un desfase frente a la programación establecida.
La CAS manifestó que es necesario allegar la respectiva justificación técnica y administrativa del retraso, toda vez que el cronograma vigente no refleja el estado real del proceso.
Igualmente, se indicó que debe ajustarse el tiempo del cronograma y definir si se requiere adicionar plazo al convenio y para lo cual la CAS deberá analizar su viabilidad.

Propuesta Y Ajustes
Durante la reunión se dejó constancia de que, a la fecha, el proceso de selección no ha sido publicado en la plataforma SECOP, motivo por el cual no ha culminado la etapa precontractual y no ha sido posible dar inicio a la ejecución contractual como se indica en el cronograma aprobado por la CAS.
El Municipio manifestó que el día 16 de febrero de 2026 remitirá oficio a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, dando respuesta a los oficios previamente enviados por la entidad, así como exponiendo la situación actual del proceso.
Asimismo, se indicó que, conforme al cronograma aprobado, actualmente se contabilizan más de tres (3) meses dentro del plazo total del convenio; sin embargo, al no haberse superado la etapa precontractual, se presenta un desfase frente a la programación establecida.
Por lo anterior, el Municipio deberá presentar un cronograma ajustado, junto con la justificación técnica y administrativa del retraso, a fin de evaluar la procedencia de una eventual prórroga, toda vez que la CAS considere viable y garantizar la adecuada ejecución del proyecto.
Compromisos Y Acuerdos
Durante la mesa técnica se acordó que el Municipio de Onzaga deberá presentar formalmente el cronograma ajustado junto con la respectiva justificación técnica y administrativa del retraso, con el fin de evaluar la viabilidad de la prórroga y continuar con el proceso contractual.
Se reiteró la obligación de dar cumplimiento integral a lo establecido en el clausulado contractual, particularmente en lo relacionado con la presentación de informes mensuales de ejecución desde la etapa inicial del convenio
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada, dejando constancia de que la presente acta es suscrita por quienes en ella intervinieron.

COMPROMISOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
Presentar nuevo cronograma ajustado con justificación técnica del retraso.	Municipio de Onzaga	17 de febrero de 2026
Culminar el proceso precontractual y publicar el proceso en SECOP.	Municipio de Onzaga	16 de marzo de 2026
Dar cumplimiento permanente a la obligación de presentar informes conforme al clausulado contractual y a las solicitudes de la corporación.	Municipio de Onzaga	Clausulado y cuando se requiera
Evaluar viabilidad de prórroga del convenio, previa revisión del informe presentado.	Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS	Una vez recibido el informe

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE DEL ASISTENTE	**CARGO**	**FIRMA**
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ	Subdirectora SPL - CAS	
SAUL ANTONIO CORTÉS DURAN	Apoyo a la supervisión – cas	
ANGIE MICHELLE ROJAS LEÓN	Apoyo a la supervisión – cas	
YESSICA GOMEZ LOPEZ	Secretaria de planeación e infraestructura	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CRONOGRMA DE ACTIVIDADES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01310-2025 cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA COSNTRUCCION DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO".

ETAPA	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
PRECONTRACTUAL	Acta de inicio del convenio						
	Contratos derivados (Obra e Interventoría)						
CONTRACTUAL	Ejecución de actividades propias de obra e interventoría						
TERMINACION	Terminación de derivados y del convenio						

Cordialmente,

Yessica Gomez López
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Onzaga – Santander
