DATOS GENERALES				
FECHA	DD: 15	MM: 04	AA: 2026	**LUGAR:** Virtual
HORA DE INICIO: 2:30 pm				**HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:50 pm

OBJETIVO: Mesa Técnica No. 03 del proyecto cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.".

Contrato de Obra Pública No. 01310-2025

Contratista: MUNICIPIO DE ONZAGA, NIT 890.208.148-5

Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ORDEN DE LA REUNIÓN

1. Inicio del comité técnico
2. Estado actual del convenio.
3. Revisión del cronograma.
4. Revisión del estado de los contratos derivados.
5. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realiza Mesa Técnica con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio de Onzaga. Durante la sesión se trataron los siguientes puntos:

Estado actual del convenio

Se revisó el estado del convenio, evidenciándose que el proceso de contratación derivado aún no ha iniciado formalmente. Durante la revisión en la plataforma SECOP II, se identificó que no se ha realizado la carga de la póliza actualizada del convenio teniendo en cuenta la Prórroga No. 1.

Así mismo, se verificó el cronograma actualizado con la Prórroga N°1 del convenio, evidenciándose que la etapa correspondiente a la contratación de los contratos derivados (obra e interventoría) ya debería estar culminada. No obstante, a la fecha no se ha surtido el

proceso de adjudicación de los mismos, lo cual evidencia un desfase frente a la programación establecida.

Revisión del cronograma

Durante la reunión, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS indicó la necesidad de realizar un ajuste al cronograma del proyecto, con el fin de que este sea coherente con el estado actual de ejecución y los tiempos del proceso.



En este sentido, el municipio manifestó que el cronograma será ajustado y estructurado de manera semanal, con el propósito de facilitar el seguimiento de las actividades.

Revisión del estado de los contratos derivados


El municipio informó que actualmente se encuentra en proceso de evaluación de las propuestas presentadas, indicando que la adjudicación de los contratos derivados se tiene prevista para la semana siguiente. En este sentido, se reiteró la importancia de adelantar oportunamente este proceso, teniendo en cuenta su impacto directo en el cumplimiento del cronograma del convenio.


Compromisos
El municipio se comprometió a realizar la carga de la póliza en la plataforma SECOP II, así como a remitir un oficio dirigido a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, en el cual se incluya el cronograma actualizado del proyecto, ajustado a las condiciones actuales de ejecución y garantizando el cumplimiento dentro de los tiempos contractuales.

COMPROMISOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE**
Cargar en SECOP II la póliza correspondiente.	Municipio de Onzaga	15 de abril de 2026
Remitir oficio con el cronograma actualizado del proyecto.	Municipio de Onzaga	16 de abril de 2026
Realizar seguimiento al avance del proceso de contratación derivado y a la ejecución del convenio.	Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS	Permanente

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE DEL ASISTENTE	**CARGO**	**FIRMA**
Edna Rocio Castellanos Martínez	Subdirectora SPL - CAS	
Saul Antonio Cortés Duran	Apoyo a la supervisión – cas	
Angie Michelle Rojas León	Apoyo a la supervisión – cas	
Yessica Gómez López	Secretaria de planeación e infraestructura	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

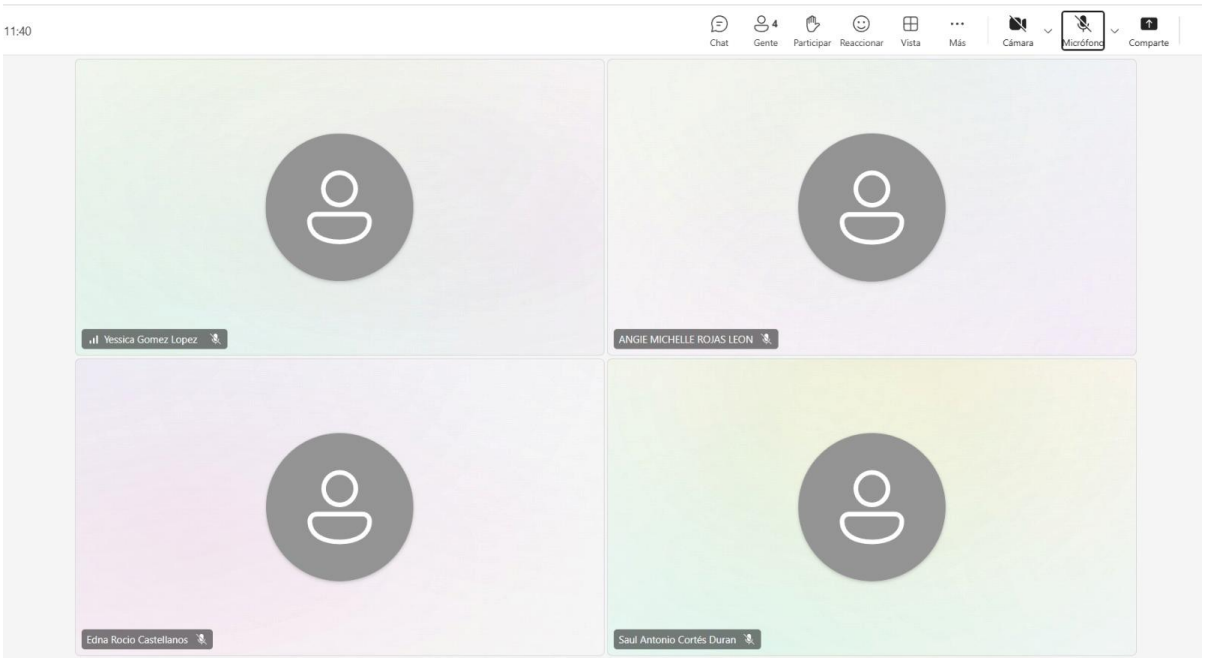

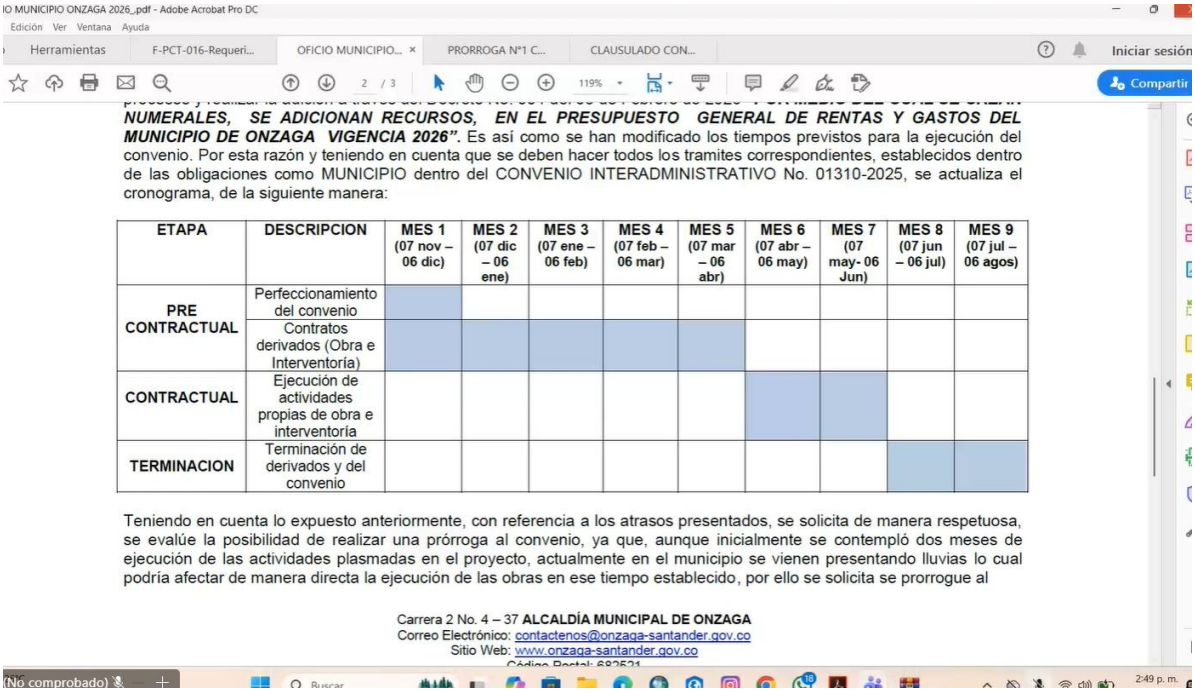

NUMERALES, SE ADICIONAN RECURSOS, EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ONZAGA VIGENCIA 2026". Es así como se han modificado los tiempos previstos para la ejecución del convenio. Por esta razón y teniendo en cuenta que se deben hacer todos los tramites correspondientes, establecidos dentro de las obligaciones como MUNICIPIO dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01310-2025, se actualiza el cronograma, de la siguiente manera:

ETAPA	DESCRIPCION	MES 1 (07 nov – 06 dic)	MES 2 (07 dic – 06 ene)	MES 3 (07 ene – 06 feb)	MES 4 (07 feb – 06 mar)	MES 5 (07 mar – 06 abr)	MES 6 (07 abr – 06 may)	MES 7 (07 may- 06 Jun)	MES 8 (07 jun – 06 jul)	MES 9 (07 jul – 06 agos)
PRE CONTRACTUAL	Perfeccionamiento del convenio									
	Contratos derivados (Obra e Interventoría)									
CONTRACTUAL	Ejecución de actividades propias de obra e interventoría									
TERMINACION	Terminación de derivados y del convenio									

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, con referencia a los atrasos presentados, se solicita de manera respetuosa, se evalúe la posibilidad de realizar una prórroga al convenio, ya que, aunque inicialmente se contempló dos meses de ejecución de las actividades plasmadas en el proyecto, actualmente en el municipio se vienen presentando lluvias lo cual podría afectar de manera directa la ejecución de las obras en ese tiempo establecido, por ello se solicita se prorrogue al
