

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025

Informe Semanal No.	2	De:	17	Marzo	2025	A:	23	Marzo	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra	FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025
Valor	$3.723.759.112,00
Adición	$0,00
Valor total	$3.723.759.112,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de Iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	jueves, 16 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395,00	
Días Transcurridos	6,00	1,52%
Días Faltantes Terminación	389,00	98,48%

Interventor:	CONSORCIO NEUTA

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025
Valor	$398.949.600,00
Adición	$0,00
Valor total	$398.949.600,00
Plazo total	Trece (13) Meses

Fecha de Iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación Inicial	sábado, 4 de abril de 2026	
Plazo Total (En días)	395	
Días Transcurridos	18,00	4,56%
Días Faltantes Terminación	377,00	95,44%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Informes semanales de obra: El presente documento contiene el segundo infome semanal remitido a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, dando alcance al acapité No.2 de la clausula novena - **Obligaciones específicas** - del contrato de Interventoría

ejecución del contrato. **2.** Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación. **3.** Realizar actividades de

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la sigueinte correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiuación:

6. Entrega Informe Semanal No.1 - Supervisión
7. Entrega SST - Supervisión
8. Entrega Acta Inicio y Documento Confidencialidad - Supervisión
9. Reiteración Solicitud Documentación Inicial - Contratista

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la sigueinte correspondencia oficial.

3. Respuesta a Solicitud Documentación Inicial - Supervisión



CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	2	De:	17	Marzo	2025	A:	23	Marzo	2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

COMITES DE OBRA

Durante la presente semana no se realizó comité, no obstante, se tiene programado para la siguiente semana una reunión deseguimiento y control con el contraista de obra con el fin de verificar los avances en los docuemntos entregables para la semana No.1 de la etapa de gestión integral

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido, por parte de la interventoría se han venido adelantando la revisión documental cargada por la entidad en la plataforma Secop II con el fin de estudiar el proyecto y tener un panorama claro del proceso contractual.

Se ha enviado a la Corporación el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para su revisión y tramite pertiente.

La interventoría le ha reiterado al contratista de obra la necesidad de que se alleguen los documentos iniciales solicitados en los que se incluye la programación propuesta, con el fin ultimo de realizar de manera adecuada el seguimiento y control a las actividades a ejecutar por parte del contratista de obra y de este modo mantener informada a la entidad sobre el desarrollo del contrato.


El viernes 21 de marzo de 2025 se allegó a la interventoría la información inicial solicitada a la Corporación, la semana siguiente se hará la revisión y analisis de la misma y se realizará la entrega formal al contratista de obra con el fin de que continue avanzando en la formulación de la linea base del proyecto basada en la información secundaria y lo estipulado en el anexo técnico del proceso.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Toda vez que pese a las reiteraciones de la interventoría, el contratista de obra no ha allegado la programación, la interventoría ha tasado las actividades de la fase gestión integral con el fin de presentar el retraso en las actividades, teniendo en cuenta que el contrato de obra cuenta con acta de inicio desde el 17 de marzo de 2025.

AVANCE FINANCIERO :		
	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 0,00	0,00%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	0,57%
EJECUTADO	0,00%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	0,57%

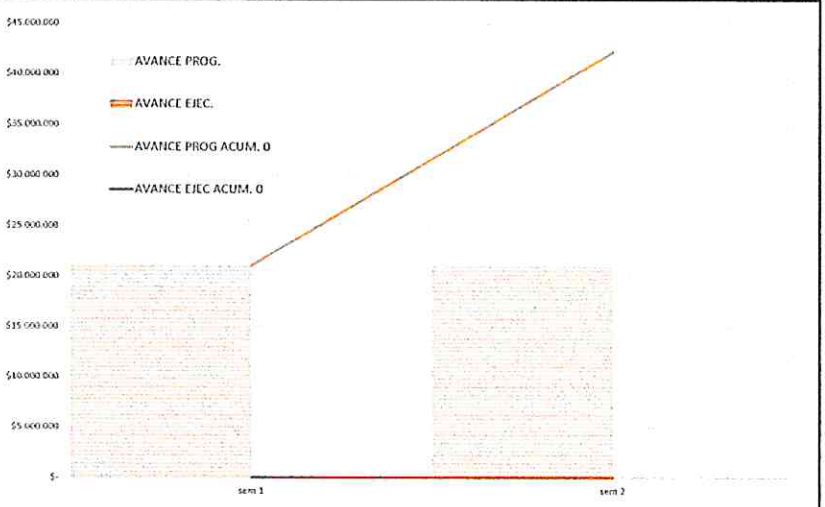



CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección de Recursos Naturales

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA


INFORME SEMANAL DE OBRA Nº 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CAR-CM-0974-2025							
Informe Semanal No.	2	De:	17	Marzo	2025	A:	23	Marzo	2025


OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN DÍAS

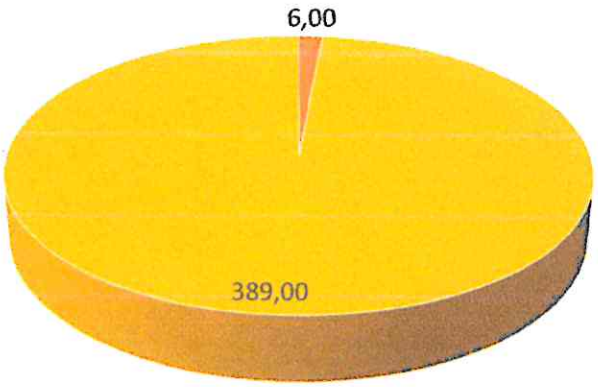

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

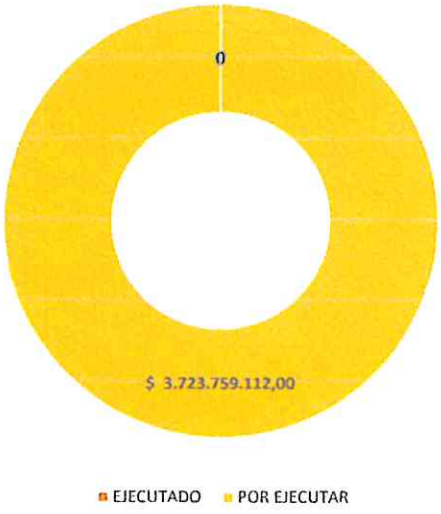

ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR
