CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión: Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja ___ De __3__**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Meet**	**Acta No.**	**7**
	7	**5**	**2025**	**Hora**	**8:30am**	**Convocada por**	**Interventoría**

TEMAS A TRATAR
Lectura y Verificación Comprmisos
Seguimiento a la Programación
Revisión entregables mes 1
Socialización Respuesta CAR ante Intervención DCASC
Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LOS TEMAS
1. Lectura y Verificación Compromisos Acta Anterior

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Entrega soportes de Socializacion Jueves 8 mayo 2025	**Contratista de Obra el 02 de mayo 2025**
Presentación powerpoint para vertificar con CAR	**Contratista de Obra el 07 de mayo 2025**

Por parte de la interventoria se inicia el comité con la lectuira de compromisos, el compromiso 1 de la entrega
del soporte de invitación a la socialización se ha cumplido en las fechas establecidas.
Comnpriomiso 2. Se envia por parte del contratista de obra la presentación por correo electronico y
adicionalmente se socilaiza con la interventoría sobre la memtodologia y las estrategias para abordar a la
comunidad.
Por oparte del contratista de obra Luis Fernando Gomez informa sobre la relavancia de la socialización
del dia de mañana jueves 08 de mayo, se presenta la preocupación sobre la asistencia y participación, no obstante,
se informa sobre la logistica realizada por el contratista de obra para las jornadas de socialización.
Se hace la presentación de las diapositivas con una explicación sucinta sobre el contenido de la misma
objetivo por objetivo, se presenta el cronograma de trabajo
Menú tecnico: Siembra, Aislamiento alambre de puas, perchas, mantenimeentos, establecimiento de
refugios de anfibios, reptiles y mamiferos, todo con el enfoque de que se trabajara con mano de obra local
Sistema Silvopastoril, se presenta el diseño
Se presenta que es y que no es el proyecto, con base en ello se tienen 4 ejes tematicos
Formación en gestion del riesgo, divulgación y comunicacion, plan pedagogico experiencia, alcaldia
Se pretende que para cada eje temático se cuente con una persona/un delegado o veeduria que sirva de puente
como miembros de la comisión y con base en ello se puedan establecer comunicaciones y espejos dentro del
contexto del desarrollo en Chocontá
La logistica se preparo asi: A cada actor institucional se le hizo una carta de inivitacion y adicionalmente se hizo
un acercamiento a cada una de ellas, se tiene video beam y computador, lista de asistencia y refrigerio
Con respcto a los actores sociales (socialización del la tarde) se hablará en términos mas accequibles
a la comunidad, se hará mas concreto, ¿qué se va a hcer?, ¿qué es y qué no es el proyecto?
Con los actores socuiales se solicitara una agenda, para visitar fuentes de abastecimiento de agua, grado de
afectación de la bocatoma.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja ___ De __3__**

DESARROLLO DE LOS TEMAS
Se quiere conformar 4 grupos de trabajo donde esten los presidentes de la JAC y los funcionarios del
acueducto
Se tiene una matriz para cada una de las veredas donde a traves de las JAC y el acueducto se plantee
tentativamente cual podria ser el beneficiario y apartir de ello hacer la visita y presentarle el proyecto
y que se comprometa de manera voluntraria a participar en el proyecto.
Se iria equipo de obra interventoría a las visitas a los predios preseleccionados.
Se tiene la expectativa de que en dos semanas se tenga una participación voluntaria de propietarios.
Con respecto a la progracion de visitas a predios se pregunta por parte del contratista si se puede hacer de
una vez o hay que esperar un aval de la interventoría o hacer un cronograma
Por parte de la interventoría, Fredy Martinez apoyo técnico de la interventoría hace la recomendación de
presentar un cronograma de visitas tentativo, con la claridad de que al tratarse de la dimanica de la comunidad,
las visitas se pueden cambiar de día u hora, y en todo caso, a través de la constante comunicaión y articulación
entre obra e intereventoría validar o cancelar o aplazar las jornadas de visita.
2. Seguimiento al Cronograma
Por parte de la interventoría, Fredy Martinez apoyo técnico de la interventoría se hace el seguimiento a la
programación en cada uno de las actividades relacionadas para la presente semana, así:
Documento de diagnóstico biótico (componentes de flora y fauna). - Revisión información secundaria
Se ha revisado informacion secundaria se tiene la base cartografica, pero se espera la cartografia de la CAR
Recorridos de campo y toma de información: Se ha iniciado con recorrdos de campo, se tiene planteado una
comision mas amplia para optimizar tiempos y a final de mayo hacer el diseñ del taller participativo
Preparación de información para la valla informativa: Se ha preparado la informacion, se cuenta con un asesor en
medios de comunicación y ya está preparando el deiño, se tiene la imagen corporativa, al mimo tiempo se está
hablando con un posible beneficiario para facilitar la instalación de la valla, tambien se ha conseguido una empresa
en Chocontá para la impresión de la Valla una vez sea aprobada por la CAR.
Definición de área a registrar para registro fílmico (una hora) por medio de uso de dron, donde se registre el estado
físico y ambiental actual de la zona de intervención: Ya se ha difinido el area, se debe pasar el area a la cartogrtafia
oficial de la CAR si se definen el jueves 08 de mayo de 2025 los beneficiarios, con los vuelos en dron se pueden
generar las ortofotos y con base en ello presentar los diseños que harán parte del acuerdo socio ambiental.
Realizar el diagnóstico in situ de las áreas afectadas por erosión, a partir de estudios y zonificación existente, para
identificar y priorizar las áreas susceptibles de recuperación y conservación de suelos en cuanto a Priorización de
las áreas y las salidas graficas que soportan las implementaciones: Ya se tiene la inforacion cartogtrafica de medios
publicos, sin embargo está pendiente informacion carrtogafica de la CAR para trabajar sobre información base
Preparar presentación, metodología, tipo de jornada, convocatoria: La actividad se realizará el día jueves 08 de
mayo de 2025, el resultado está cargado en el drive
Realizan convocatoria y la logística (Sitio, transporte, refrigerios) y los recursos para su realización: La actividad se
realizará el día jueves 08 de mayo de 2025, el resultado está cargado en el drive
Preparar metodología temática para Documento analítico de revisión y análisis de los eventos históricos y demás
aspectos definidos en las especificaciones técnicas (incluida la cartografía) del plan de formación para la
adaptación al cambio climático y gestión del riesgo: Se cuenta con informacion clara, dependiendo de mañana se
ajustará o mantendrá la metodolgia

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Comité de Seguimiento al Contrato de Obra No. 0975-2025**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja ___ De __3__**


DESARROLLO DE LOS TEMAS

Obtención de información para Entrega de cartilla digital textos, diagramación, ilustraciones y edición: Se tiene contacto con el asesor del contratista de obra, se está preparando un boceto, se solcitará una reuion con CAR y oficina de comunicaiciones de la CAR e interventoría antes de entregar el diseño definitivo

Adicionamente, se informa por parte de la interventoría, que como parte del seguimiento que se ha venido realizando por la interventoría, se han venido desarrollando informes semanales en los cuales, para el ultimo informe semanal, con fecha de corte del 28 de abril de 2025 al 04 de mayo de 2025 se tiene un flujo programado de 1,12% y se ha ejecutado un 2,22%, presentando un avance significativo del 1,10% tal como se evidencia en la siguiente grafica.

AVANCE FINANCIERO :		
	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 82.812.195,53	2,22%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.640.946.916,47	97,78%
PAGADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 3.723.759.112,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :	
PROGRAMADO	1,12%
EJECUTADO	2,22%
AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	1,10%

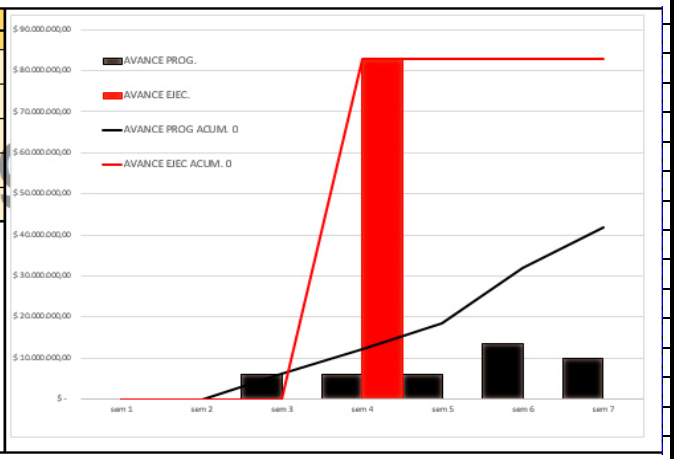

3. Revisión de entregables mes 1

Se informa por parte del contratista de obra Luis Eduardo Gomez, que una vez recibidas las observaciones tanto de la interventoría como de la CAR en lo referente a los planes de trabajo, se atenderán las observaciones y se tiene previsto entregarlas a más tardar al viernes de la proxima semana. 16 de mayo de 2025, plazo maximo.

4. Socialización Respuesta CAR ante Intervención DCASC

Se presenta por parte de la interventoría, la información recibida el día de hoy 7 de mayo de 2025 en lo referente a la consulta previamente elevada a la CAR por parte de la interventoría y el compromiso de los profesionales de la CAR que asistieron a las visitas de campo llevadas a cabo el día 25 de abril de 2025, en donde la presidenta de la JAC de las veredas retiros informaba que la información que se le estaba socializando ese día ya lo habian hecho por parte de la CAR, que se habia solicitado documentación a los potenciales beneficiarios pero que presuntamente no se siguio con el proceso toda vez que no volvieron los funcionarios de la CAR

En este contexto, se hace la presentación de la respuesta de la CAR en donde se informa que se inicio un proyecto desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano que tiene actividades similares a las del presente contrato de obra, se informo adicionalmente que se cuenta con un listado de beneficiarios y se informa que en el mismo comunicado se manifiesta que el grupo presentado sea aceptado por el proyecto de la DCASC, se le informará a la DRN para que se considere como parte del proyecto del contrato de obra 0975-2025.

Por parte de interventoría se le remitira la información al contratista de obra para que la conozca y la analice y tenga una herramienta adicional para la jornada de socialización del día de mañana 08 de mayo de 2025 haciendo hincapie en que dicha información se debe manejar con mesura y en caso de que se generen las preguntas, informar que este proyecto si se está llevando a cabo y en un mes aproximadamente, se dará respuesta a los beneficiarios.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega planes de trabajo corregidos	**Contratista de Obra el 16 de mayo 2025 Max**

Siendo las ___9:50am____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes del listado anexo
