INFORME DE ENTREGA

Fecha: 26 noviembre de 2020	Contacto: Carlos Jaime
Cliente: INSTITUTO DE METROLOGIA	Teléfono: 317 5265859
Dirección: AV CRA 50 # 26 55 INT2	Ciudad: BOGOTA D.C.

Observaciones:

INFORMACION DEL SITIO

NOMBRE SITIO:	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
CONTACTO:	ING. CARLOS JAIME
DIRECCIÓN:	AV CRA 50 # 26 55 INT 2
COORDENADAS:	
ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SITIO:	PREVIA COORDINACIÓN CON EL CLIENTE
HORARIO DE TRABAJO:	Lunes a viernes DE 8:00 AM A 5:00 PM

OBJETO DEL CONTRATO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MEJORAS PERTINENTES A LA RED ELECTRICA DE **TALLER DE MANOFACTURA, LABORATORIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, TALLER DE SOLDADURA Y LABORATORIO DE CA Y CC** DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

ALCANCE DEL CONTRATO

- Soporte técnico en Mano de obra para la de adecuación eléctrica de los sitios mencionados en el punto anterior

OBJETIVO DEL INFORME

Informe entrega final del proyecto

DESARROLLO DEL TEMA

- Reconocimiento del sitio de trabajo recepción de materiales y herramientas
- Instalación de acometida laboratorio Temperatura y humedad
- Remplazo de tablero en taller de manufactura
- Instalación de ducteria en taller de manufactura
- Instalación de circuitos taller manufactura
- Instalación de circuitos regulados en taller de manufactura
- Instalación de circuitos trifásicos en taller de manufactura
- Pruebas y marquillado en taller de manufactura
- Instalación de circuitos en taller de soldadura
- Pruebas y marquillado en taller de soldadura
- Instalación de tomas en laboratorio de CA y CC
- Instalación de breaker y gabinete para laboratorio de temperatura y humedad


CONCLUSIONES

- El proyecto se ejecuto en el tiempo estipulado y siguiendo todas las directrices del cliente, a la fecha quedan pendiente la conexión de circuito regulado a la espera de ventana de mantenimiento de tablero regulado.

REGISTRO FOTOGRAFICO





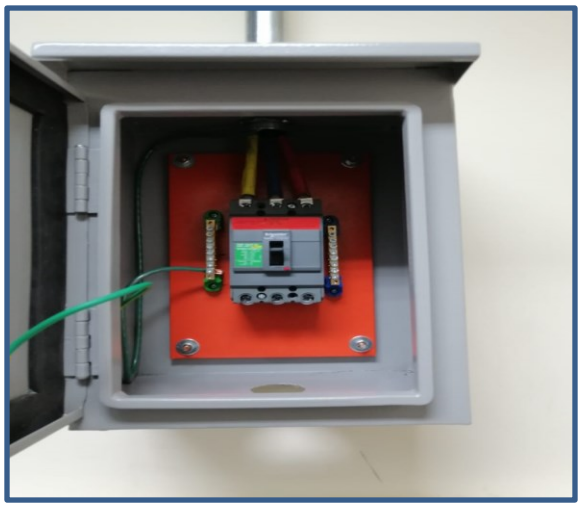












TM C. 66.16.12



ISOTECH

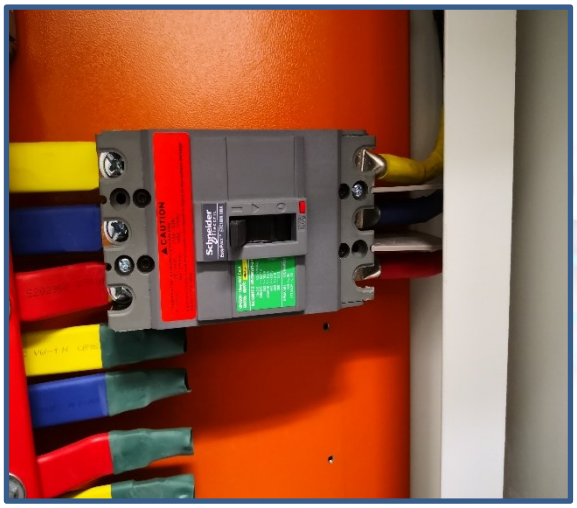




CAUTION
Schneider

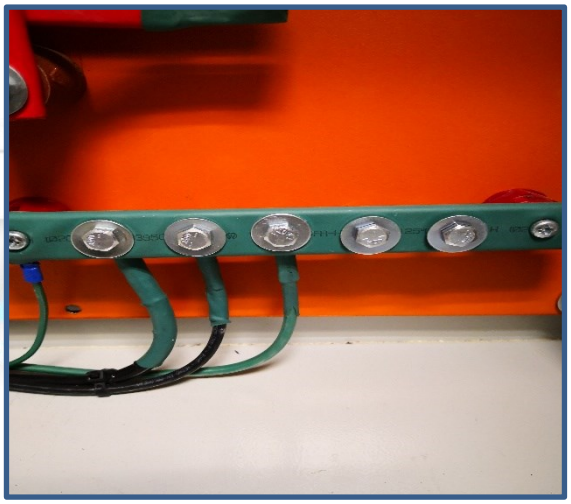



RIESGO ELECTRICO

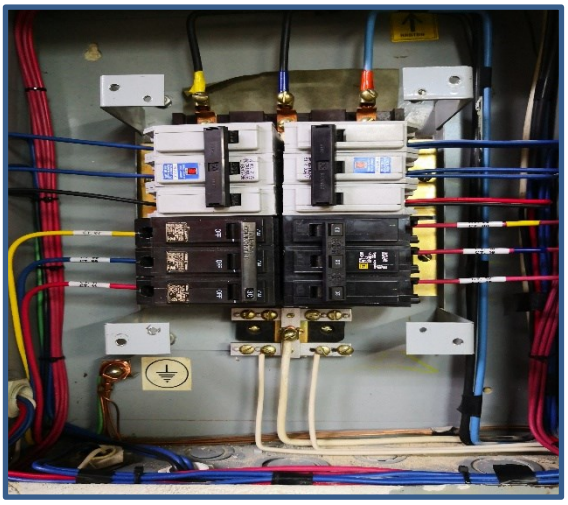

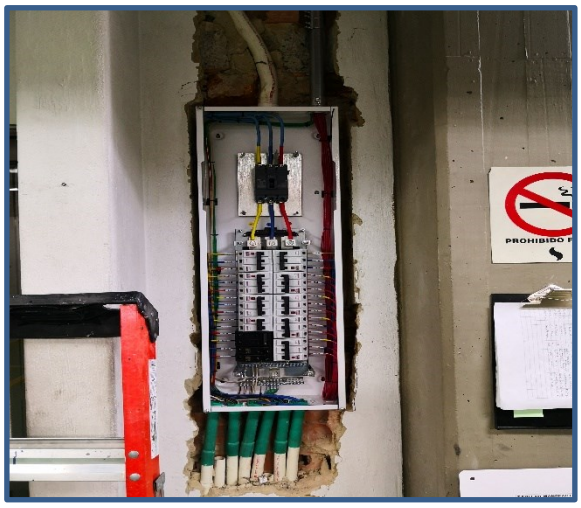

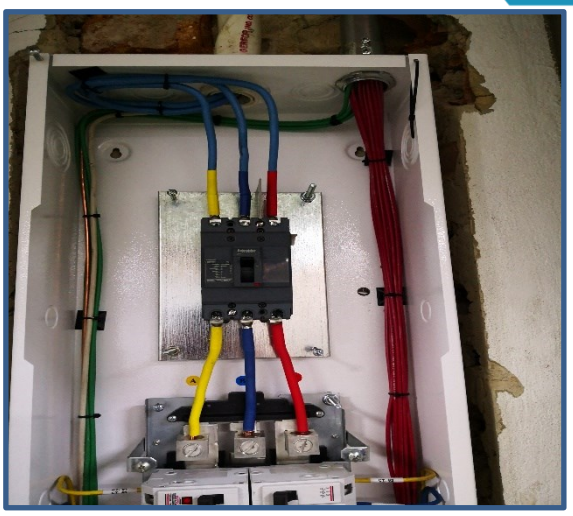

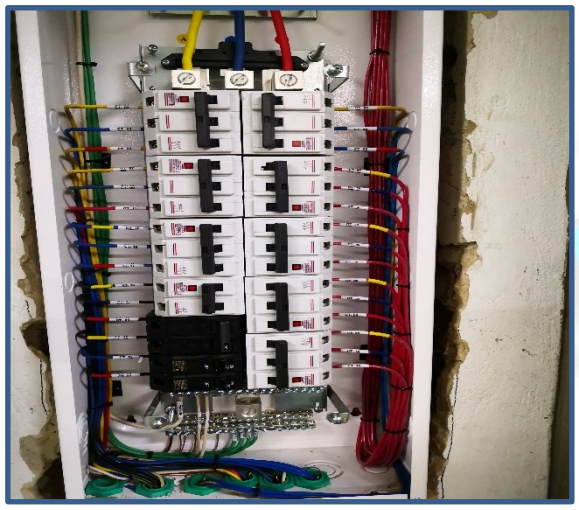






REGULADO
120 V
REGULADO
120 V









REGULADO



T. REG
CT0. 28
REGULADO



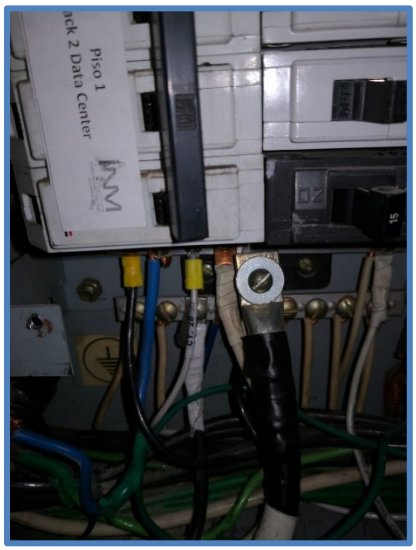


Piso 1
ack 2 Data Center

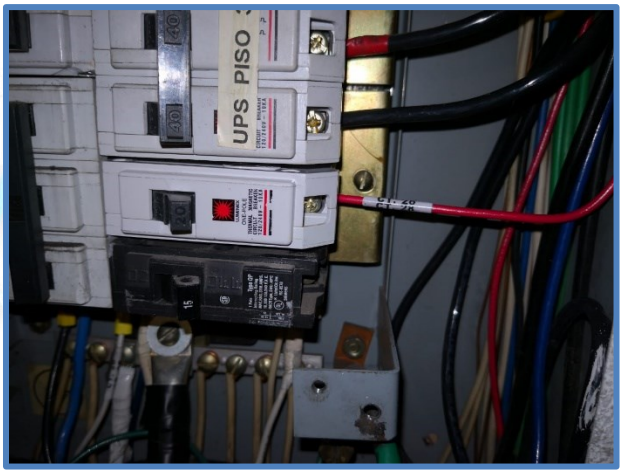


UPS PISO
