BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025
BARRIO	SANTA FE
UPZ:	PORVENIR

CIV	7000234
DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-031	CÓD. IDU:	3473	ACTIVIDAD:	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UNID.	UN

MEMORIA DESCRIPTIVA

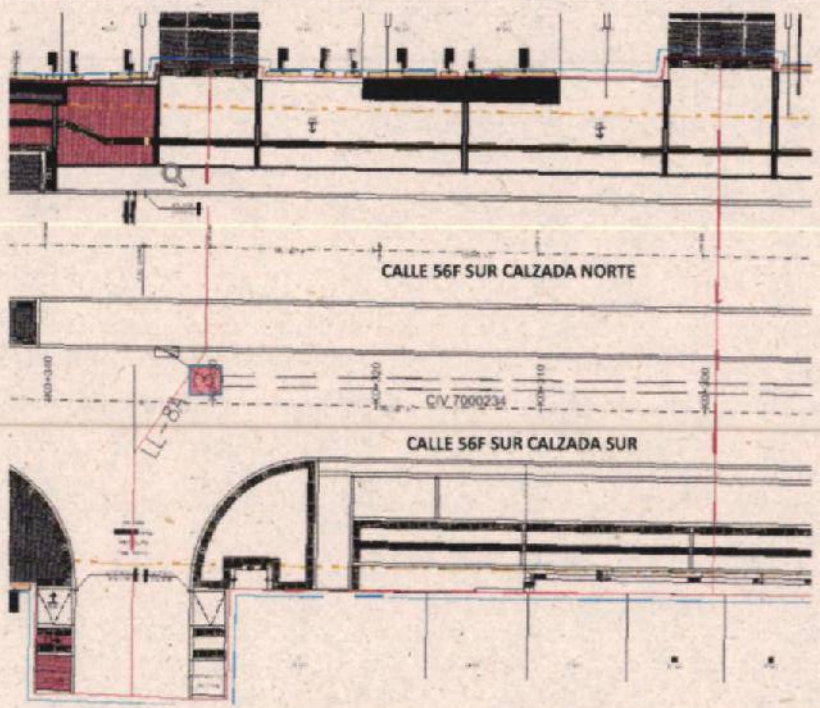

PLACA POZOS

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

282

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO


CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	1	DE	2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	SUB-CAPÍTULO:	ÍTEM:	CÓD. IDU:	ACTIVIDAD:	UNID.
NO PREVISTOS	NO PREVISTOS	NP-034	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML

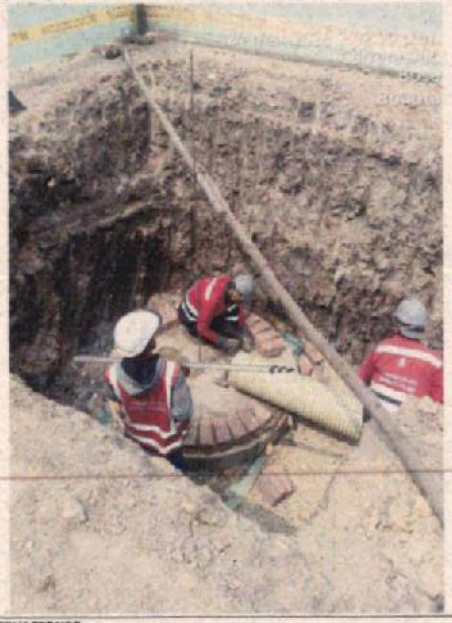



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO/H (M)	ÁREA (M2)	CANT.	MEDIDA TOTAL
RED PLUVIAL						
COLINDRO DE POZO LL-8 A			1.4		1,00	1,40
					Subtotal	1,40
					Vienen	0,00
					TOTAL	**1,40**

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

Mario Bonilla C.

NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992


MEMORIAS DE CALCULO

							HOJA	2	DE 2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO: 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-034	CÓD. IDU:	3471	ACTIVIDAD:	UNID.	
								CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	

MEMORIA DESCRIPTIVA

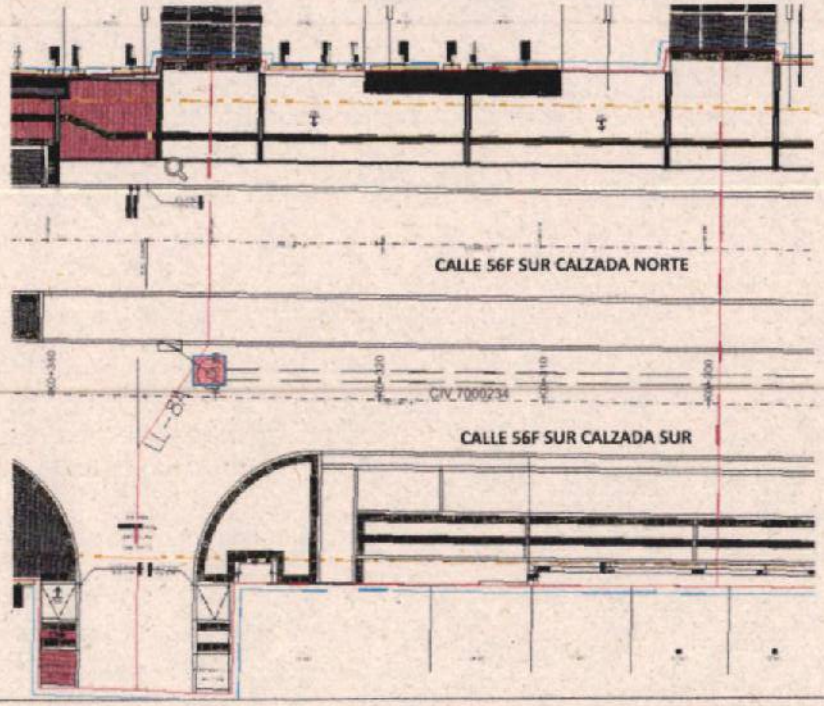

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025
BARRIO	SANTA FE
UPZ:	PORVENIR

CIV	7000234
DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-069	CÓD. IDU:	6161	ACTIVIDAD:	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	UNID.	ML

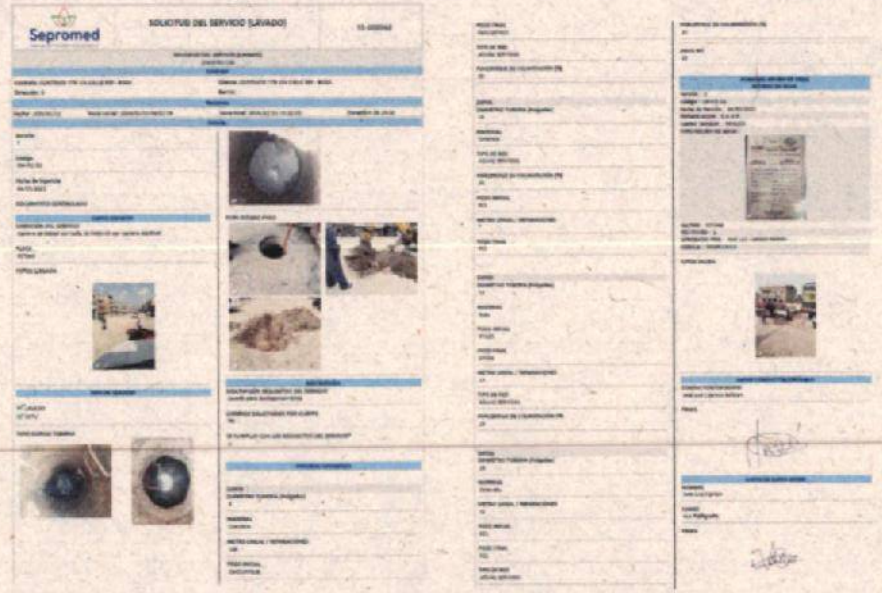

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO/H (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
RED SANITARIA						
INSPECCION POZO 1 - POZO 2(VER PLANILLA N.68 SEPROMED) CRUCE CARRERA 98C	10,3					10,30
INSPECCION CMP9782S - CMP9824(VER PLANILLA N.68 SEPROMED) CRUCE CARRERA 98C	12,8					12,80
INSPECCION POZO 1 - POZO 2(VER PLANILLA N.68 SEPROMED) CRUCE CARRERA 98C	6,5					6,50

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO


							HOJA	2	DE 2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO: 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-069	CÓD. IDU:	6161	ACTIVIDAD:	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	UNID.	ML

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSPECCION REDES CCTV

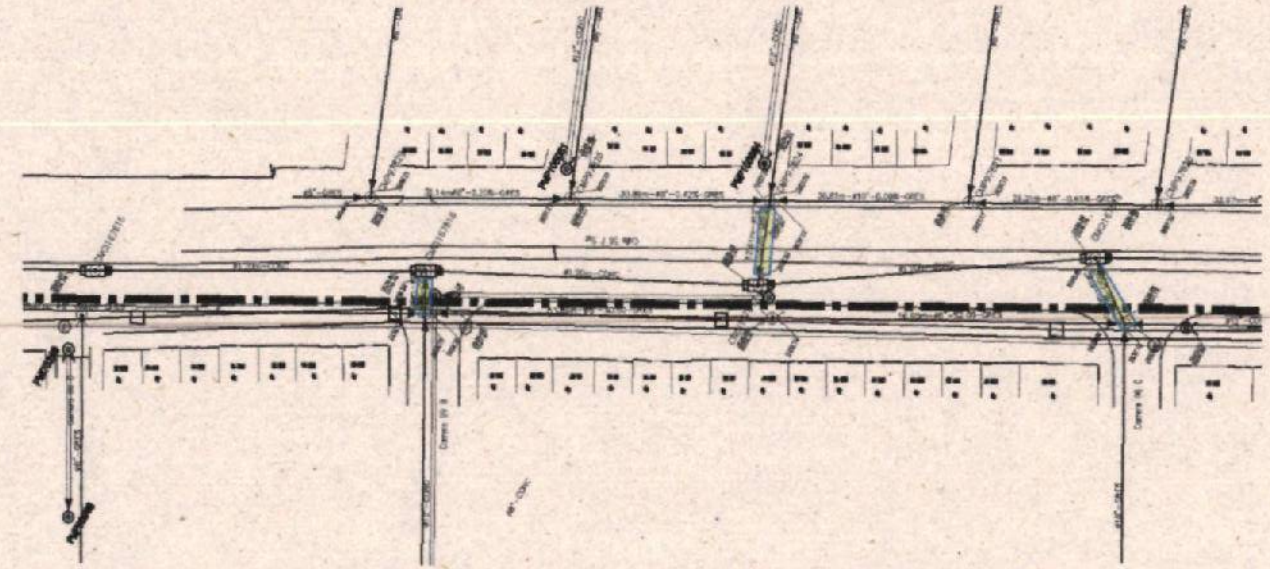

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

222

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONSORCIO VPJ 2025 NIT. 901977992

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-071	CÓD. IDU:	7892	ACTIVIDAD:	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).	UNID.	HR



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES HR	ANCHO (M)	ALTO/H (M)	ÁREA (M2)	CANT.	MEDIDA TOTAL
RED SANITARIA						
LAVADO REDES C MCI16616-CMCI167615(VER PLANILLA N.68 SEPROMED)	6,33					6,33

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO


						HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-071	CÓD. IDU:	7892	ACTIVIDAD:	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).	UNID.	HR

MEMORIA DESCRIPTIVA

LAVADO REDES

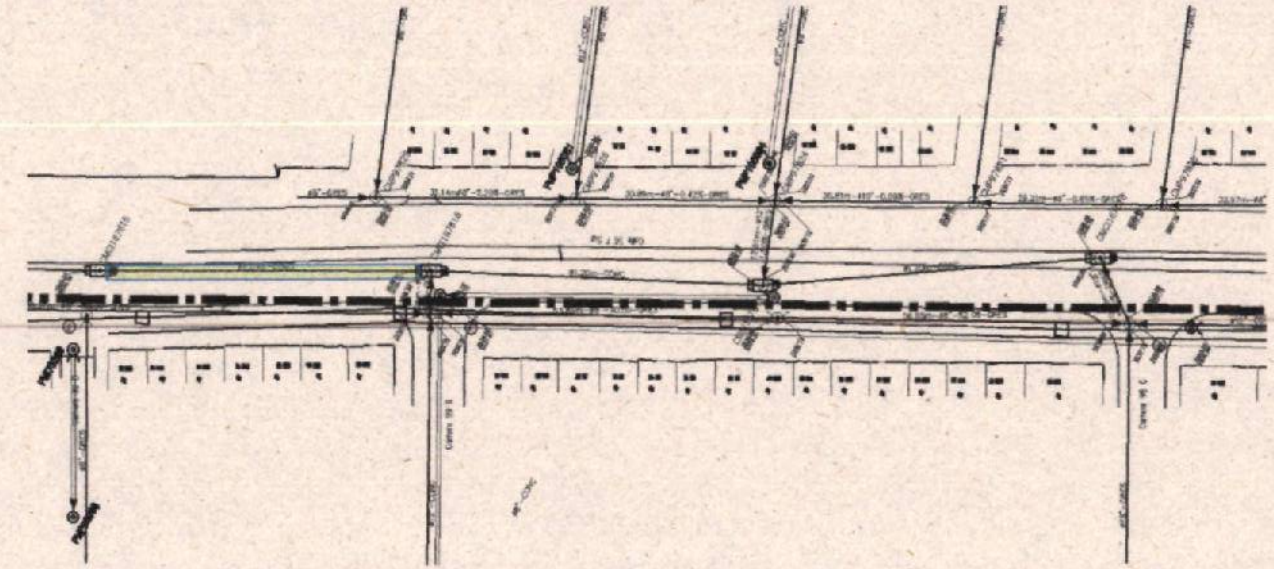

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

062

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTÁR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992


MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-072	CÓD. IDU:	6098	ACTIVIDAD:	AGUA	UNID.	LT

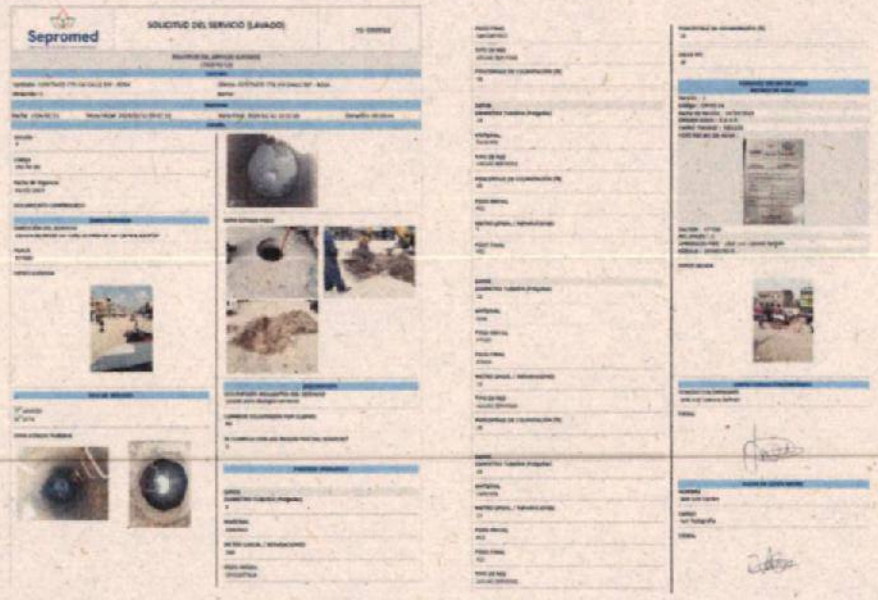

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LT	ANCHO (M)	ALTO/H (M)	ÁREA (M2)	CANT.	MEDIDA TOTAL
RED SANITARIA						
LAVADO REDES C MCI16616-CMCI167615(VER PLANILLA N.68 SEPROMED)	18000					18000,00

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT. 901977992

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-072	CÓD. IDU:	6098	ACTIVIDAD:	AGUA	UNID.	LT

MEMORIA DESCRIPTIVA

LAVADO REDES

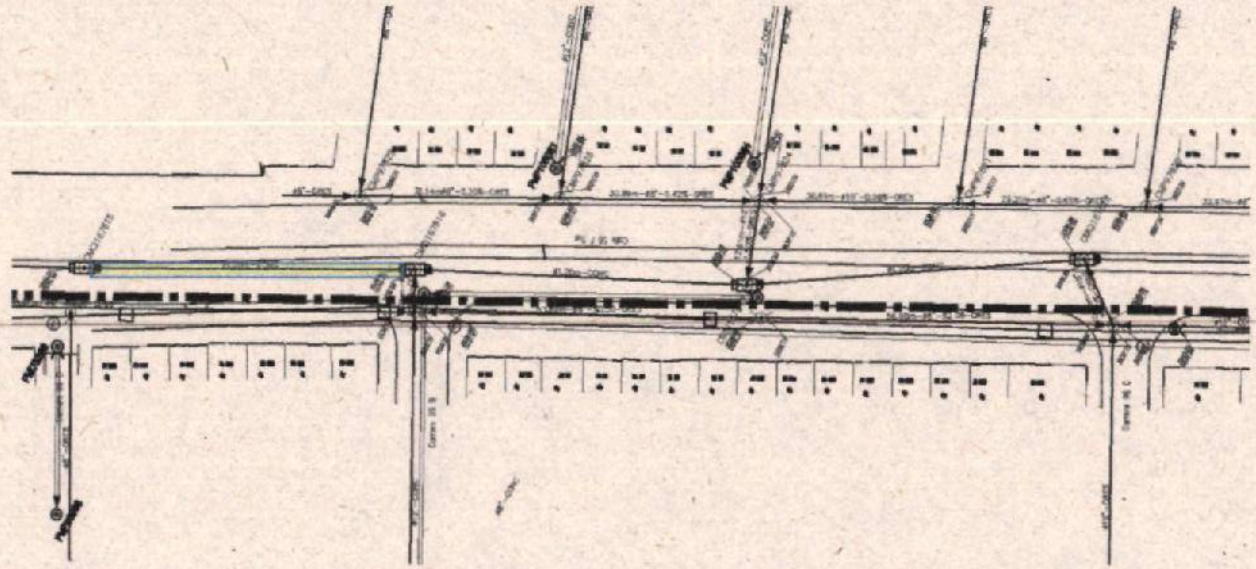

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

262

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
CONSORCIO VPJ 2025		NIT: 901977992


MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-081	CÓD. IDU:	5752	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. DE PARADERO EXISTENTE. INCLUYE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4" PARA ANCLAJE. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21 KM.	UNID.	UN

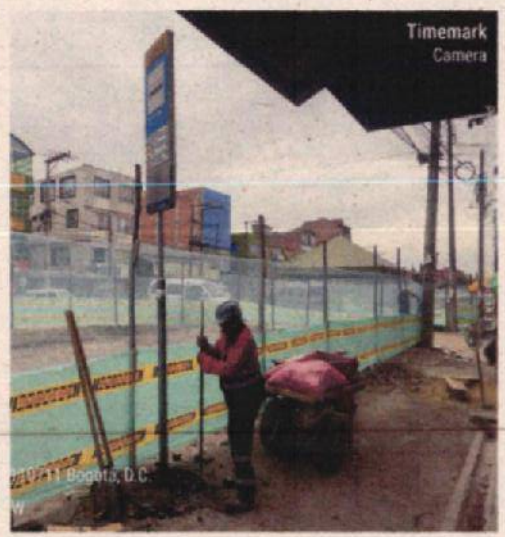

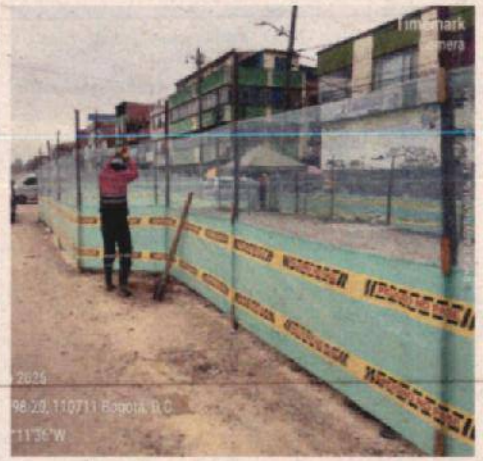

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO/H (M)	ÁREA (M2)	CANT.	MEDIDA TOTAL
PMT						
TRASLADO PARADERO SITP K0+300					1,00	1,00

BOGOTÁ	CONTRATO:	776-2025 CTO-OBRA (132644)
	OBJETO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
		CONSORCIO VPJ 2025 NIT: 901977992

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	31	MM	3	AA	2026	CORTE N.	3	PERIODO	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	INEXIA S.A.S		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VPJ 2025		
BARRIO	SANTA FE	CIV	7000234
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	CALLE 56F SUR ENTRE CARRERAS 98ABIS Y 98C

CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	SUB-CAPÍTULO:	NO PREVISTOS	ÍTEM:	NP-081	CÓD. IDU:	5752	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. DE PARADERO EXISTENTE. INCLUYE CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO 3/4" PARA ANCLAJE. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A 21 KM.	UNID.	UN

MEMORIA DESCRIPTIVA

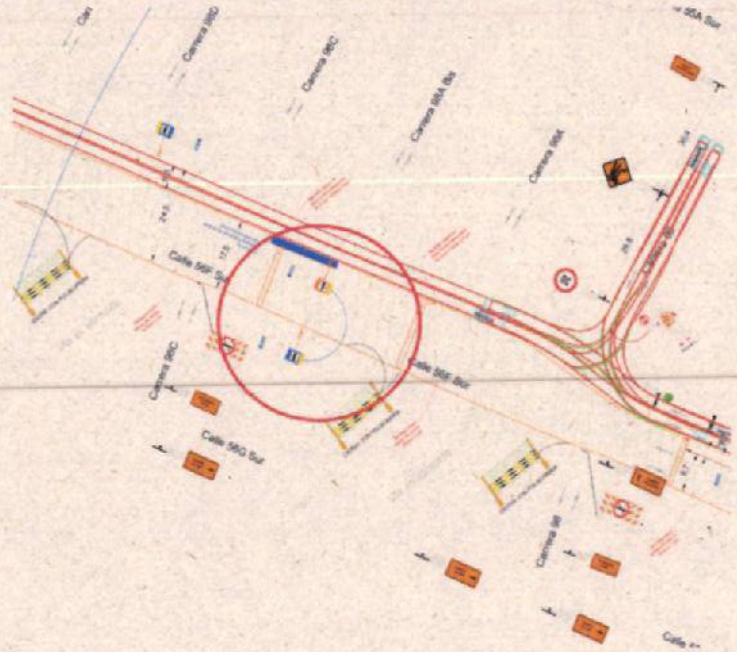

TRASLADO DE PARADERO SITP

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: MARIO ROLANDO BONILLA CORREA CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOPORTES DE MEMORIAS (INFORME DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE REDES)

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000072

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/13)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/13	Hora inicial: 2026/02/13 09:35:01	Hora Final: 2026/02/13 12:24:59	Duración: 02:49:58

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Calle56F#96A-03

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

- [x] LAVADO
- [x] CCTV

FOTO ESTADO TUBERIA







FOTO ESTADO POZO



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado para destaponamiento

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
10

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
90

POZO INICIAL
CMP165240

POZO FINAL
CMP165239

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
50

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
10

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
80

POZO INICIAL
CMP165240

POZO FINAL
CMP165241

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
50

AGUA M3
18

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : EXTERNO
CARRO TANQUE :
PLACA : XIC831
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518


FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA



DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
No se encuentra

CARGO
No

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6368544, -74.1921569

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

clickidea

776

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000070

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/12)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/12 | **Hora inicial:** 2026/02/12 09:15:19 | **Hora Final:** 2026/02/12 15:31:16 | **Duración:** 06:15:57

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 95 B# 56F -03 sur Calle 56F sur #97B

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

- [x] LAVADO
- [x] CCTV

FOTO ESTADO TUBERIA









FOTO ESTADO POZO







DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado para cctv

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
10

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
90

POZO INICIAL
CMP165236

POZO FINAL
CMP165240

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
70

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
16

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
10

POZO INICIAL
CMP165240

POZO FINAL
CMP 147671

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
10

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
80

POZO INICIAL
CMP165240

POZO FINAL
CMP165241

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
60

AGUA M3
30

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : E.A.A.B
CARRO TANQUE : NBG225
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 2
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518

FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
Jose Luis Ciprian

CARGO
Aux Topografía

FIRMA

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6362189, -74.1918412

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

clickidea

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000068

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/11)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/11 **Hora inicial:** 2026/02/11 09:02:19 **Hora Final:** 2026/02/11 15:22:03 **Duración:** 06:19:44

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025


DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 99 B#56F sur Calle 56 F#99-05 sur Carrera 98c#56F

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

- [x] LAVADO
- [x] CCTV

FOTO ESTADO TUBERIA







FOTO ESTADO POZO







DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado para destaponamiento

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
8

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
100

POZO INICIAL
CMCI167616

POZO FINAL
CMCI167615

TIPO DE RED
AGUAS SERVIDAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
50

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
14

MATERIAL
Concreto

TIPO DE RED
AGUAS SERVIDAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

POZO INICIAL
PZ1

METRO LINEAL / REPARACIONES
7

POZO FINAL
PZ2

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
12

MATERIAL
Gres

POZO INICIAL
97825

POZO FINAL
97824

METRO LINEAL / REPARACIONES
13

TIPO DE RED
AGUAS SERVIDAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
16

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
11

POZO INICIAL
PZ1

POZO FINAL
PZ2


TIPO DE RED
AGUAS SERVIDAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

AGUA M3
18

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : E.A.A.B
CARRO TANQUE : NBG225
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518


FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA




DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
Jose Luis Ciprian

CARGO
Aux Topografía

FIRMA



UBICACIÓN



Ver Ubicación

4.6382248, -74.1929394

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

clickidea

300

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000059

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/10)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/10 **Hora inicial:** 2026/02/10 09:49:51 **Hora Final:** 2026/02/10 15:12:13 **Duración:** 05:22:22

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 98 #56F

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

- [x] LAVADO
- [x] CCTV

FOTO ESTADO TUBERIA







FOTO ESTADO POZO





DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado para destaponamiento Lavado de tubería para cctv

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
12

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
37

POZO INICIAL
PMP110133

POZO FINAL
PMP110147

TIPO DE RED
AGUAS LLUVIAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
0

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
24

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
9

POZO INICIAL
CMP97815

POZO FINAL
CMP97816

TIPO DE RED
COMBINADO

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

DATOS
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
24

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
11

POZO INICIAL
PZ 2

POZO FINAL
PZ 1

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
20

TIPO DE RED
COMBINADO

AGUA M3
30

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : EXTERNO
PLACA : VPN367
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518

FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
Jose Luis Ciprian

CARGO
Aux Topografía

FIRMA

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6381347, -74.1925474

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

clickidea

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000055

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/09)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/09 **Hora inicial:** 2026/02/09 12:03:45 **Hora Final:** 2026/02/09 16:21:47 **Duración:** 04:18:02

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 98 #57F

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

☑ LAVADO

FOTO ESTADO TUBERIA











FOTO ESTADO POZO



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado de tubería para destaponamiento Se sacan 12 lonas de material Queda a un 40 %

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
0.12

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
37

POZO INICIAL
PMP110133

POZO FINAL
PMP110147

TIPO DE RED
AGUAS LLUVIAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
50

AGUA M3
18

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : E.A.A.B
CARRO TANQUE : SWB400
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518

FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA



DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
No se encuentra nadie

CARGO
No

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6380985, -74.1928538

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000051

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/06)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: 0
Barrio:

Resumen

Fecha: 2026/02/06 **Hora inicial:** 2026/02/06 13:50:06 **Hora Final:** 2026/02/06 16:58:29 **Duración:** 03:08:23

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 98#56F

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

☑ LAVADO

FOTO ESTADO TUBERIA





FOTO ESTADO POZO



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado para destaponamiento Se sacan 20 lonas de material Pozo 100 % lleno de material

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
12

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
37

POZO INICIAL
PMP110103

POZO FINAL
PMP110147

TIPO DE RED
AGUAS LLUVIAS


PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
100

AGUA M3
18

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24

Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : E.A.A.B
CARRO TANQUE : NBG225
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518

FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA



DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
No

CARGO
Se encuentra

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6379868, -74.1927495

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

clickidea

Sepromed
Servicios de Protección Medioambiental

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

SS-000048

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)
(2026/02/05)

Contrato

Contrato: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Cliente: CONTRATO 776 VÍA CALLE 56F - BOSA
Dirección: - **Barrio:**

Resumen

Fecha: 2026/02/05 **Hora inicial:** 2026/02/05 09:53:48 **Hora Final:** 2026/02/05 15:47:54 **Duración:** 05:54:06

Detalle.

Versión
7

Código
CM-FO-03

Fecha de Vigencia
04/03/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

DATOS SERVICIO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Carrera 98 #56 F

PLACA
FST068

FOTOS LLEGADA



TIPO DE SERVICIO

☑ LAVADO

FOTO ESTADO TUBERIA









FOTO ESTADO POZO





DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN REQUISITOS DEL SERVICIO
Lavado Se sacan 14 lonas de material Tubería de 12 al 100 %. Colmatada quedando a un 30 %

CAMBIOS SOLICITADOS POR CLIENTE
No

SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO?
SI

PROCESO OPERATIVO

DATOS

DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)
12

MATERIAL
Concreto

METRO LINEAL / REPARACIONES
37

POZO INICIAL
PMP110146

POZO FINAL
PMP105093

TIPO DE RED
AGUAS LLUVIAS

PORCENTAJE DE COLMATACIÓN (%)
100

AGUA M3
18

FORMATO RECIBO DE AGUA
RECIBOS DE AGUA

Versión : 2
Código : OP-FO-24
Fecha de Versión : 04/03/2025
ORIGEN AGUA : E.A.A.B
CARRO TANQUE : NBG225
FOTO RECIBO DE AGUA :



VACTOR : FST068
NO. VIAJES : 1
APROBADO POR : José Luis Lizarazo Beltrán
CEDULA : 1030613518

FOTOS SALIDA



DATOS CONDUCTOR/OPERARIO

CONDUCTOR/OPERARIO
José Luis Lizarazo Beltrán

FIRMA



DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE
No se encuentra

CARGO
No

UBICACIÓN

Ver Ubicación
4.6381393, -74.192872

SOLICITUD DEL SERVICIO (LAVADO)

Completado

Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

Bogotá D.C, Febrero 23 de 2026

SEPROM-029-26

Señores
CONSORCIO VPJ 2025
consorciovpj2025@gmail.com
Bogotá D.C.

Respetados señores
Con la presente hacemos entrega del informe de inspección relacionado a continuación.

RESUMEN INSPECCIONES REALIZADAS

Fecha de la inspección	Tipo de sistema	Número de Video	Tramo	Dirección	Longitud Inspeccionada (m)	Diámetro (pul)	Material del tramo (C, M, G)
10/02/2026	**Sanitario**	1.1	1.1 CLT84659 - CIV7000246 CMP97816 - CMP97815	Calle 56F Sur X Carrera 98A	**7,0**	**18"**	Concreto
11/02/2026	**Sanitario**	1.2	1.2 NO CLT - CIV7000261 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 98	**10,9**	**24"**	Concreto
11/02/2026	**Sanitario**	1.3	1.3 NO CLT - CIV7000177 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 99B	**6,5**	**14"**	Concreto
11/02/2026	**Sanitario**	1.4	1.4 CLT84609 - CIV7000189 CMP97825 - CMP9824	Calle 56F Sur X Carrera 99	**12,8**	**12"**	Gres
11/02/2026	**Sanitario**	1.5	1.5 NO CLT - CIV7000217 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 98C	**10,3**	**16"**	Concreto
12/02/2026	**Sanitario**	1.6	1.6 NO CLT - CIV7000314 CMP165240 - CMP147671	Calle 56F Sur X Carrera 96A	**10,0**	**16"**	Concreto
				TOTAL	**57,5**		

Atentamente,

GERMAN LONDOÑO HENAO
Director Operativo

Sepromed

Servicios de Protección Medio Ambiental

VIDEO E INFORME DE INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

CONSORCIO VPJ 2025

1.1 CLT84659 - CIV7000246 CMP97816 - CMP97815	1.4 CLT84609 - CIV7000189 CMP97825 - CMP9824
1.2 NO CLT - CIV7000261 POZO 1 - POZO 2	1.5 NO CLT - CIV7000217 POZO 1 - POZO 2
1.3 NO CLT - CIV7000177 POZO 1 - POZO 2	1.6 NO CLT - CIV7000314 CMP165240 - CMP147671

SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL

FEBRERO 10 - 13 DE 2026

SEPROM-029-26

DVD-1




Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

DIRECCIÓN: Calle 56F Sur X Carrera 98, Carrera 98A - Carrera 98C

TIPO DE RED: RED SANITARIO

CONSORCIO VPJ 2025

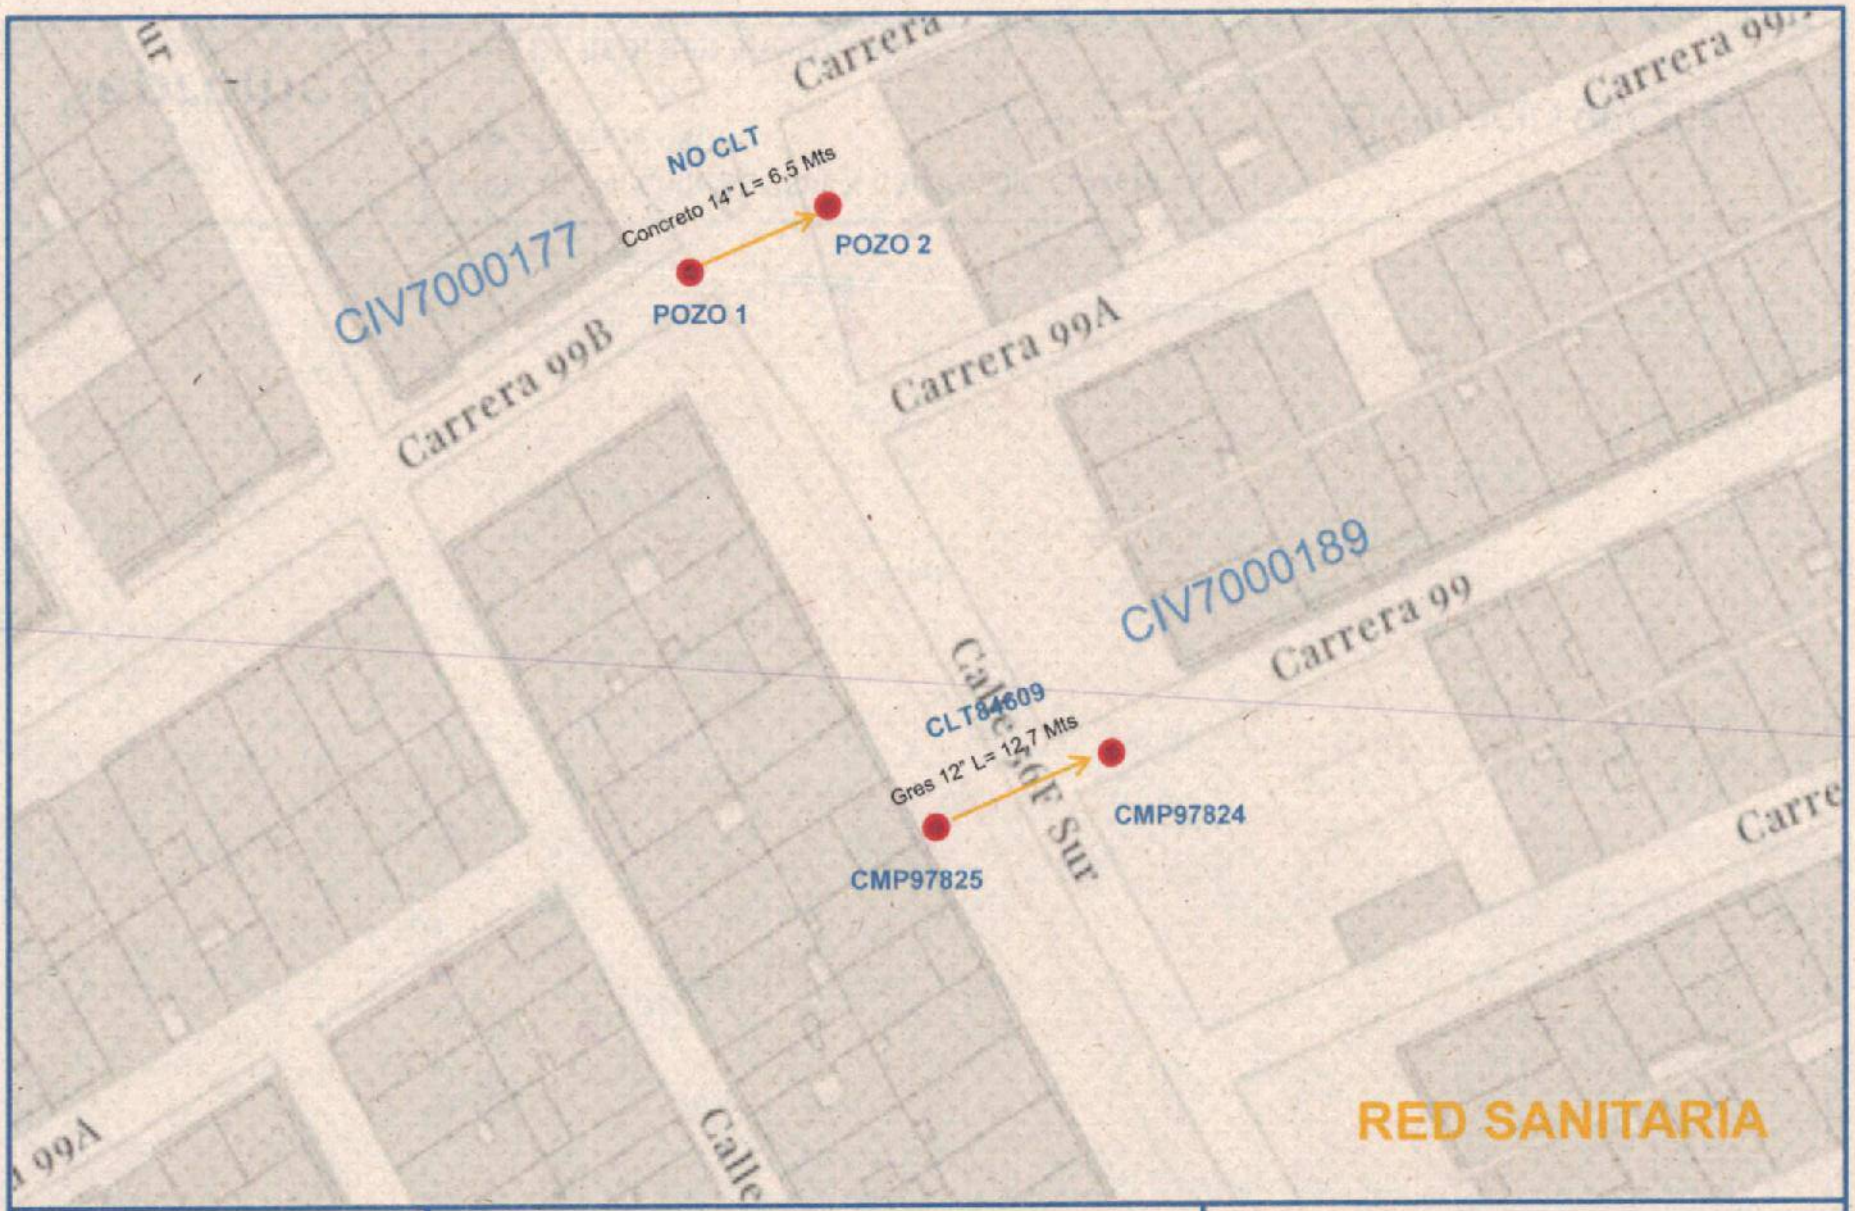


Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

DIRECCIÓN: Calle 56F Sur X Carrera 99, Carrera 99B

TIPO DE RED: RED SANITARIO

CONSORCIO VPJ 2025

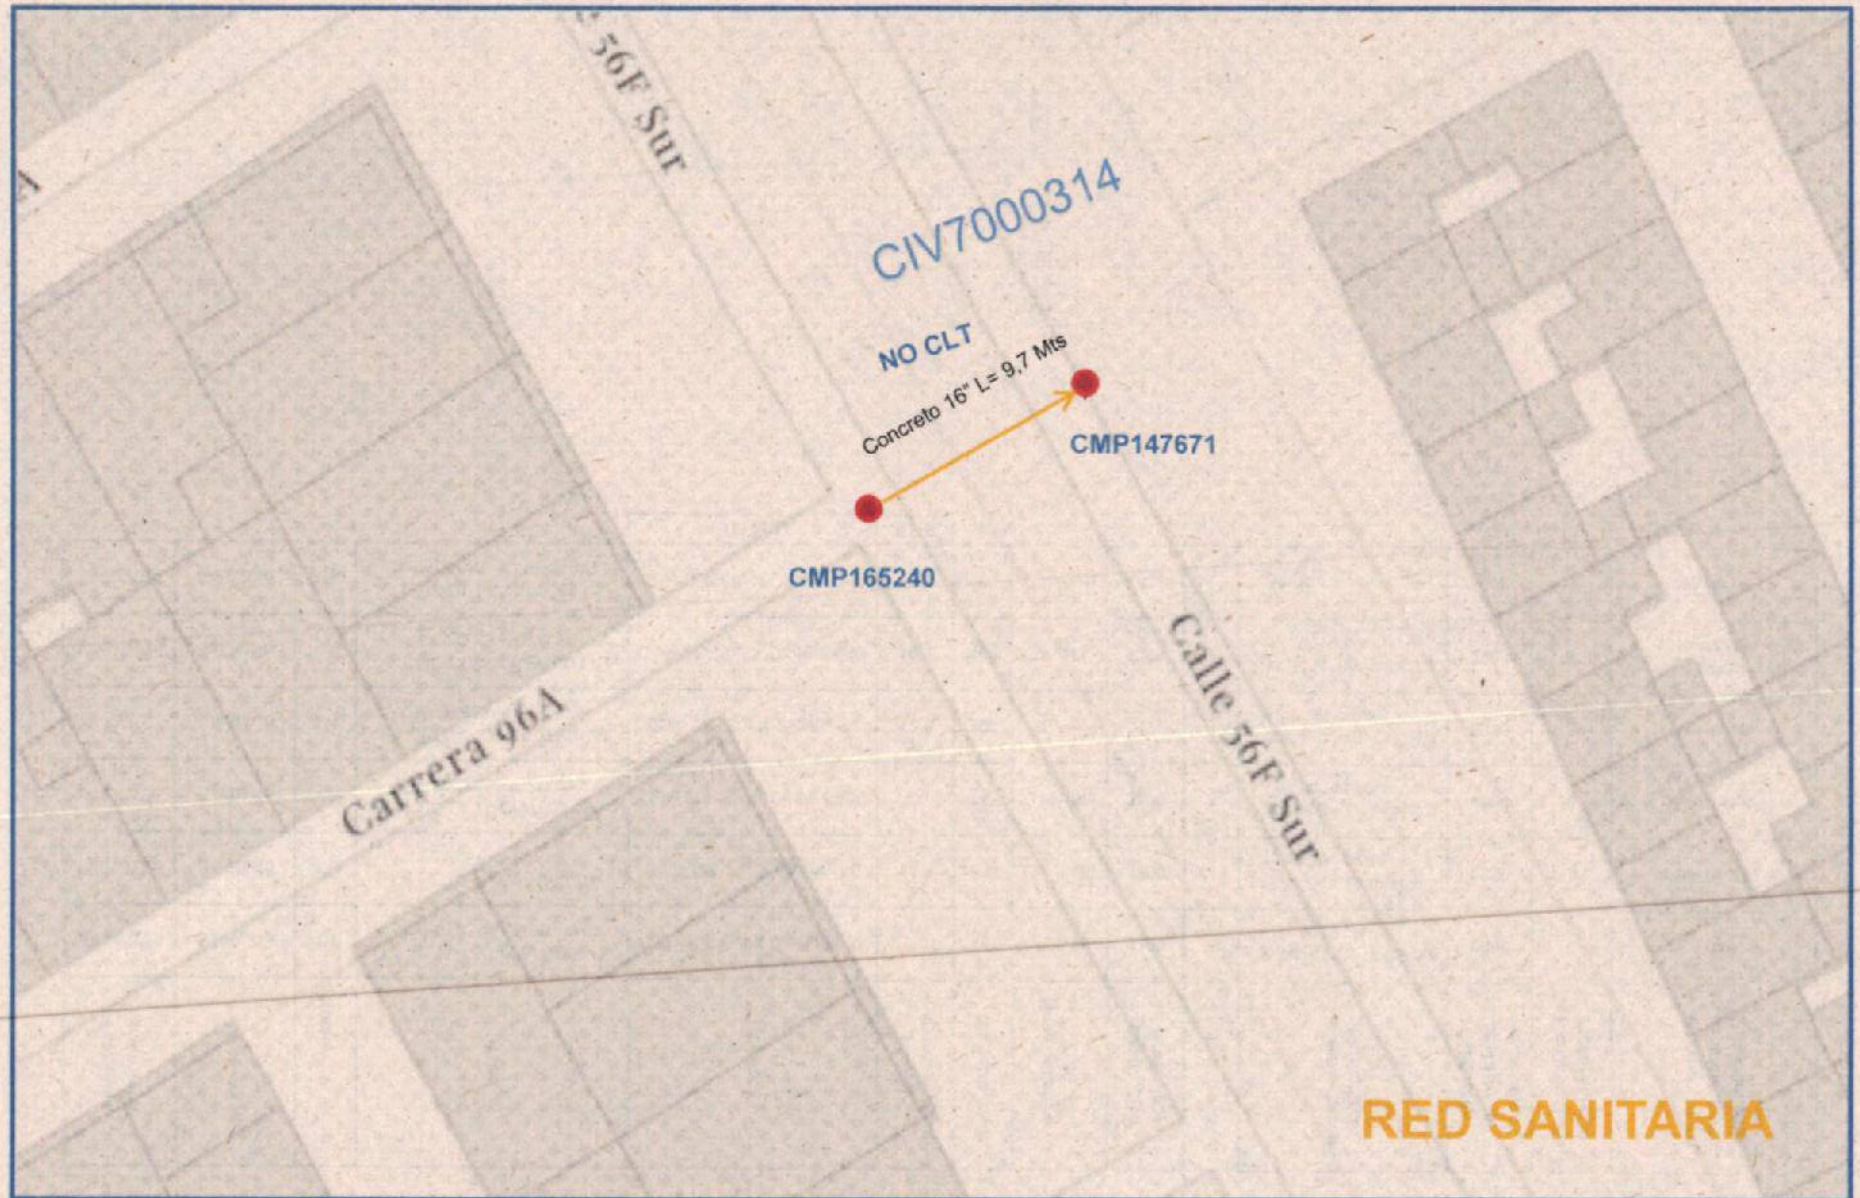

Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

DIRECCIÓN: Calle 56F Sur X Carrera 96A

TIPO DE RED: RED SANITARIO

CONSORCIO VPJ 2025

304

Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

RESUMEN DE INSPECCIONES REALIZADAS

Fecha de la Inspección	Tipo de sistema	Número de Video	Tramo	Dirección	Longitud Inspeccionada (m)	Diámetro (pul)	Material del tramo (C, M, G)	Calificación estructural	Grado Estructural	Recomendación Estructural	Calificación operacional / Mantenimiento	Grado Operacional / Mantenimiento	Recomendación Operacional / Mantenimiento
10/02/2026	Sanitario	1.1	1.1 CLT84659 - CIV7000246 CMP97816 - CMP97815	Calle 56F Sur X Carrera 98A	7,0	18"	Concreto	3300	3	Atención programable a corto plazo	0000	0	Sin daños
11/02/2026	Sanitario	1.2	1.2 NO CLT - CIV7000261 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 98	10,9	24"	Concreto	3600	3	Atención programable a corto plazo	0000	0	Sin daños
11/02/2026	Sanitario	1.3	1.3 NO CLT - CIV7000177 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 99B	6,5	14"	Concreto	3300	3	Atención programable a corto plazo	0000	0	Sin daños
11/02/2026	Sanitario	1.4	1.4 CLT84609 - CIV7000189 CMP97825 - CMP9824	Calle 56F Sur X Carrera 99	12,8	12"	Gres	3121	3	Atención programable a corto plazo	0000	0	Sin daños
11/02/2026	Sanitario	1.5	1.5 NO CLT - CIV7000217 POZO 1 - POZO 2	Calle 56F Sur X Carrera 98C	10,3	16"	Concreto	2500	2	Atención programable a largo plazo	2400	2	Atención programable a largo plazo
12/02/2026	Sanitario	1.6	1.6 NO CLT - CIV7000314 CMP165240 - CMP147671	Calle 56F Sur X Carrera 96A	10,0	16"	Concreto	4138	4	Atención Inmediata	0000	0	Sin daños
				TOTAL	57,5								

Carrera 31 A # 6 - 91 Teléfonos 7516982 Cel: 311 2874882
gerencia@sepromed.co - Bogotá D.C. Colombia

Sepromed
Servicios de Protección Medio Ambiental

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INSPECCIÓN

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mediante la norma NS-058 versión 4.1 adopto la metodología PACP para la investigación y calificación de tuberías de alcantarillado.

La evaluación de tuberías PACP desarrollada por NASSCO provee un mecanismo para crear, de manera confiable una descripción de las tuberías e incluye varios métodos para clasificar la condición de la tubería, en la que incluye una calificación numérica total de defectos más severos del tramo inspeccionado. Este valor numérico es una herramienta de permite identificar rápidamente que secciones de la tubería tiene defectos graves (Conocida como la clasificación rápida de PACP), además provee la habilidad de resumir el número y la severidad de los defectos encontrados y es una excelente manera de determinar que segmentos de tubería requieren mayor atención, ejemplo: si un tubo no tiene defectos de un grado mayor a 1 o 2 entonces probablemente no requiera mayor atención.

La clasificación es calculada de manera separada para defectos estructurales y defectos de operación y mantenimiento, representados con las siguientes siglas: - QSR: Defectos estructurales - QMR: Defectos de operación y mantenimiento.

La clasificación rápida es un método que se basa en cuatro (4) caracteres:

Descripción de las posiciones

5 3 2 7 5 A 2 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 1 2 3 4

1 = Corresponde al grado de mayor severidad
2 = Corresponde al número total de ocurrencias del grado de mayor severidad.
3 = Corresponde al segundo valor de mayor severidad del tramo evaluado
4 = Corresponde al número total de ocurrencias del segundo valor de mayor severidad

Si en número de ocurrencias excede 9, se utiliza caracteres del alfabeto de la siguiente manera:

10 a 14 =A; 15 a 19 =B; 20 a 24 = C; etc. y se codifica de la misma manera descrita anteriormente.

Los grados de severidad de las observaciones, se evalúan de la siguiente manera

(5) Muy significativos
(4) Significativos
(3) Moderado
(2) Menores
(1) poco significativos

Cabe resaltar que el tramo sin defecto alguno tiene una calificación rápida de PACP de 0000, si un tramo solo tiene defectos de un grado en particular, los primeros dos caracteres son la cantidad y el grado del defecto y los últimos dos caracteres son 00 (denotando que no existen otros grados).

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 19/02/2026 - 1.1 CLT84659 -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
19/02/2026	ARIES	Seco	1.1 CLT84659 - CIV7000246	1
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			MIGUEL LUNA	SEPROM-029-26

Ciudad	BOGOTÁ DC	Punto de acceso aguas arriba lateral	CMP97815		0
Calle	CALLE 56F SUR X CARRERA 98A		NOD	Longitud Total [m]	8,00
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	CMP97816	Longitud Inspeccionada	7,00
			NOD	Año Construcción	

Profiles	Circular 450mm	Objetivo	Evaluación de Rutina
		Método de inspección	
Uso	Sanitario/Agua Residual/Agua Negra	Dirección	Aguas Arriba
		Limpieza Previa	Limpieza a fondo
Material	Tuberia de Concreto (no-reforzado)	Información Adicional	CONSORCIO VPJ 2025



1:68	Distance	LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inspección a contra flujo desde CMP97816	00:00:00	1, 2	
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:02:27	3	
	2.00	S01 SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar	00:03:25	4	3
	6.20	F01 SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado	00:04:36	5	3
	7.00	AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspección a contra flujo en CMP97815	00:05:05	6	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
3300	0000	3300	9,0	0,0	9,0	3,0	0,0	3,0

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 19/02/2026 - 1.1 CLT84659 - CIV7000246


Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	19/02/2026	1.1 CLT84659 -	1



1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a contra flujo desde CMP97816




2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a contra flujo desde CMP97816

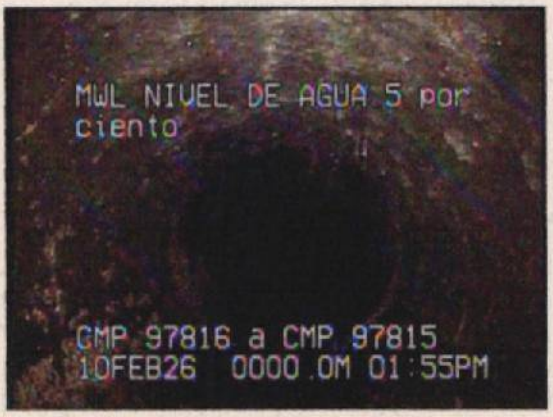


3, 00:02:27, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%



4, 00:03:25, 2.00m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar

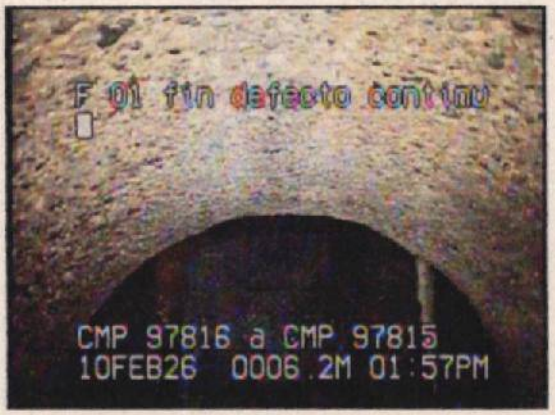

5, 00:04:36, 6.20m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado

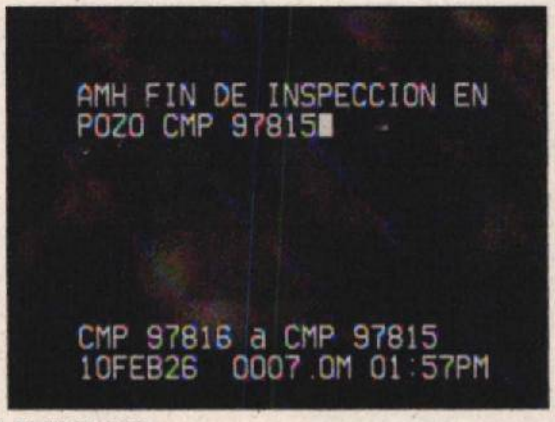

6, 00:05:05, 7.00m
Pozo de Acceso / Fin de inspección a contra flujo en CMP97815

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 19/02/2026 - 1.2 NO CLT -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
19/02/2026	**ARIES**	**Seco**	**1.2 NO CLT - CIV7000261**	**2**
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			**MIGUEL LUNA**	**SEPROM-029-26**

Ciudad	**BOGOTÁ DC**	Punto de acceso aguas arriba lateral	**POZO 1**		**0**
Calle	**CALLE 56F SUR X CARRERA 98**		**NOD**	Longitud Total [m]	**11,00**
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	**POZO 2**	Longitud Inspeccionada	**10,90**
			NOD	Año Construcción	

Profiles	**Circular 600mm**	Objetivo	**Evaluación de Rutina**
		Método de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Aguas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza a fondo**
Material	**Tuberia de Concreto (no-reforzado)**	Información Adicional	**CONSORCIO VPJ 2025**

1:94	Distance	LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
POZO 1						
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inspeccion a flujo desde POZO 1	00:00:00	1, 2	
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:01:29	3	
	1.40	JAM	Junta Angular Mediana	00:02:03	4	3
	1.40 S01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar	00:02:26	5	3
	8.20 F01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado	00:03:32	6	3
	10.90	AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspeccion a fluno en POZO 2	00:04:33	7	
POZO 2						

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
3600	0000	3600	18,0	0,0	18,0	3,0	0,0	3,0

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 19/02/2026 - 1.2 NO CLT - CIV7000261


Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	**CALLE 56F SUR X**	**19/02/2026**	**1.2 NO CLT - CIV7000261**	**2**




1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspeccion a flujo desde POZO 1



2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspeccion a flujo desde POZO 1

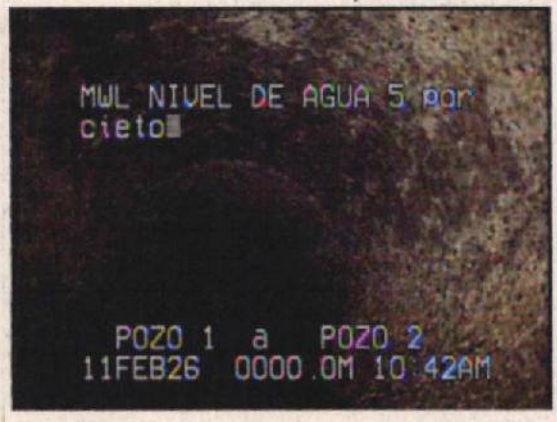

3, 00:01:29, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%

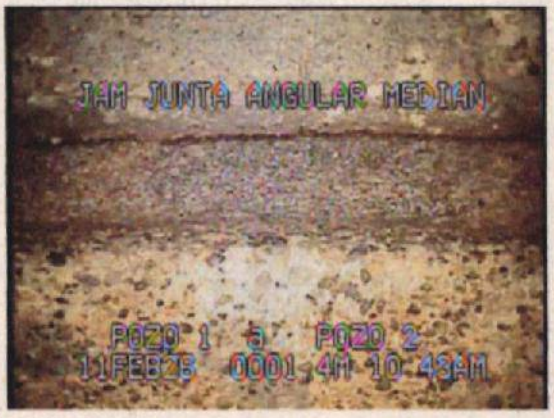

4, 00:02:03, 1.40m
Junta Angular Mediana



5, 00:02:26, 1.40m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar




6, 00:03:32, 8.20m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 19/02/2026 - 1.2 NO CLT - CIV7000261

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	**CALLE 56F SUR X**	**19/02/2026**	**1.2 NO CLT - CIV7000261**	**2**

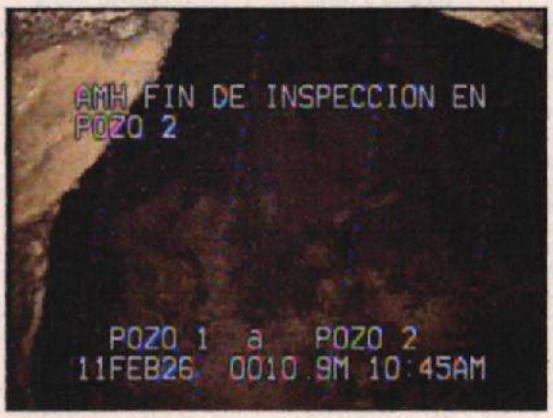

7, 00:04:33, 10.90m
Pozo de Acceso / Fin de inspeccion a fluno en POZO 2

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 19/02/2026 - 1.3 NO CLT -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
19/02/2026	**ARIES**	**Seco**	**1.3 NO CLT - CIV7000177**	**3**
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			**MIGUEL LUNA**	**SEPROM-029-26**

Ciudad	**BOGOTÁ DC**	Punto de acceso aguas arriba lateral	**POZO 1**		**0**
Calle	**CALLE 56F SUR X CARRERA 99B**		**NOD**	Longitud Total [m]	**6,50**
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	**POZO 2**	Longitud Inspeccionada	**6,50**
			NOD	Año Construcción	

Profiles	**Circular 350mm**	Objetivo	**Evaluación de Rutina**
		Método de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Aguas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza a fondo**
Material	**Tuberia de Concreto (no-reforzado)**	Información Adicional	**CONSORCIO VPJ 2025**



1:56	Distance		LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
	0.00		AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde POZO 1	00:00:00	1, 2	
	0.00		MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:02:14	3	
	2.50		JAM	Junta Angular Mediana	00:02:43	4	3
	2.50	S01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar	00:03:14	5	3
	5.00		MGO	Observación General / Camara de caida	00:04:04	6	
	5.70	F01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado	00:04:16	7	3
	6.50		AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en POZO 2	00:04:45	8	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
3300	0000	3300	9,0	0,0	9,0	3,0	0,0	3,0

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 19/02/2026 - 1.3 NO CLT - CIV7000177


Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	19/02/2026	1.3 NO CLT - CIV7000177	3



1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde POZO 1



2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde POZO 1

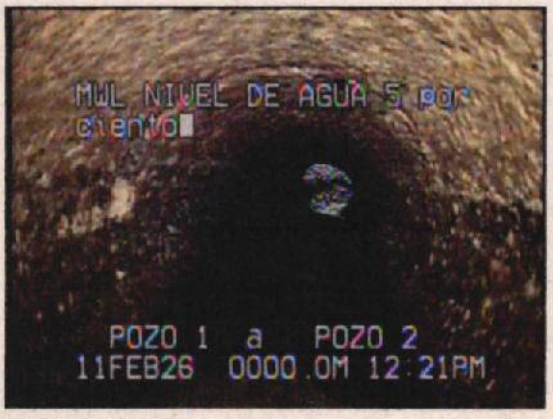

3, 00:02:14, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%



4, 00:02:43, 2.50m
Junta Angular Mediana



5, 00:03:14, 2.50m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar



6, 00:04:04, 5.00m
Observación General / Camara de caida


SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 19/02/2026 - 1.3 NO CLT - CIV7000177

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	19/02/2026	1.3 NO CLT - CIV7000177	3



7, 00:04:16, 5.70m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado

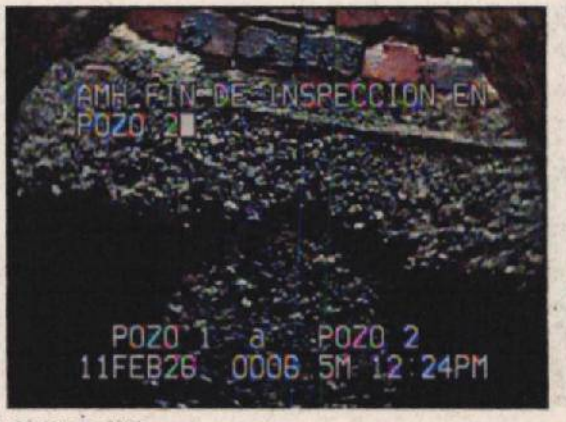

8, 00:04:45, 6.50m
Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en POZO 2

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 20/02/2026 - 1.4 CLT84609 -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
20/02/2026	**ARIES**	**Seco**	**1.4 CLT84609 - CIV7000189**	**4**
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			**MIGUEL LUNA**	**SEPROM-029-26**

Ciudad	**BOGOTÁ DC**	Punto de acceso aguas arriba/lateral	**CMP97825**		**0**
Calle	**CALLE 56F SUR X CARRERA 99**		**NOD**	Longitud Total [m]	**12,80**
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	**CMP97824**	Longitud Inspeccionada	**12,80**
			NOD	Año Construcción	

Profiles	**Circular 300mm**	Objetivo	**Evaluación de Rutina**
		Método de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Aguas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza a fondo**
Material	**Tubo de Arcilla Vitrificada**	Información Adicional	**CONSORCIO VPJ 2025**



1:109	Distance	LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desd CMP97825	00:00:00	1, 2	
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:01:38	3	
	4.60	JAM	Junta Angular Mediana	00:03:42	4	3
	9.50	FC	Fractura Circular de 4 en punto a 6 en punto	00:05:21	5	2
	12.80	AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en CMP97824	00:06:14	6	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
3121	0000	3121	5,0	0,0	5,0	2,5	0,0	2,5

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 20/02/2026 - 1.4 CLT84609 - CIV7000189

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	20/02/2026	1.4 CLT84609 -	4



1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desd CMP97825




2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desd CMP97825



3, 00:01:38, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%



4, 00:03:42, 4.60m
Junta Angular Mediana

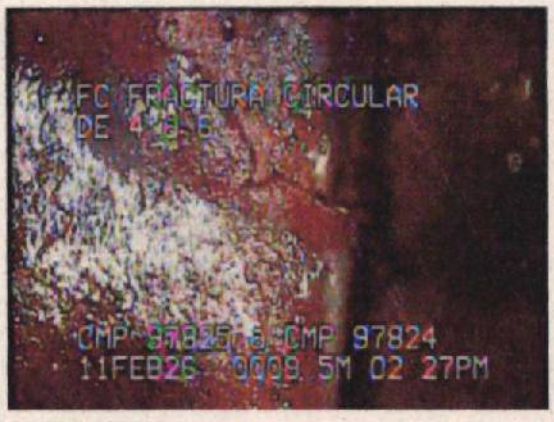

5, 00:05:21, 9.50m
Fractura Circular de 4 en punto a 6 en punto



6, 00:06:14, 12.80m
Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en CMP97824

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 20/02/2026 - 1.5 NO CLT -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
20/02/2026	**ARIES**	**Seco**	**1.5 NO CLT - CIV7000217**	**5**
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			**MIGUEL LUNA**	**SEPROM-029-26**

Ciudad	**BOGOTÁ DC**	Punto de acceso aguas arriba lateral	**POZO 1**		**0**
Calle	**CALLE 56F SUR X CARRERA 98C**		**NOD**	Longitud Total [m]	**10,30**
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	**POZO 2**	Longitud Inspeccionada	**10,30**
			NOD	Año Construcción	

Profiles	**Circular 400mm**	Objetivo	**Evaluación de Rutina**
		Método de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Aguas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza a fondo**
Material	**Tuberia de Concreto (no-reforzado)**	Información Adicional	**CONSORCIO VPJ 2025**



1:88	Distance	LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inpsección a flujo desde POZO 1	00:00:00	1, 2	
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:01:30	3	
	1.00	S01 SAV	Superficie Agregado Visible de 12 en punto a 12 en punto,, Arrancar	00:02:04	4	2
	1.70	S02 DAGS	Depósitos Adheridos Grasa, 5% del área de corte trans. de 3 en punto a 9 en punto, Arrancar	00:02:39	5	2
	8.40	MGO	Observación General / Camara de caida	00:03:39	6	
	8.40	F01 SAV	Superficie Agregado Visible de 12 en punto a 12 en punto,, Acabado	00:04:01	7	2
	8.40	F02 DAGS	Depósitos Adheridos Grasa, 5% del área de corte trans. de 3 en punto a 9 en punto, Acabado	00:04:12	8	2
	10.30	AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en POZO 2	00:04:37	9	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
2500	2400	2900	10,0	8,0	18,0	2,0	2,0	2,0


SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 20/02/2026 - 1.5 NO CLT - CIV7000217

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	20/02/2026	1.5 NO CLT - CIV7000217	5



1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inpsección a flujo desde POZO 1

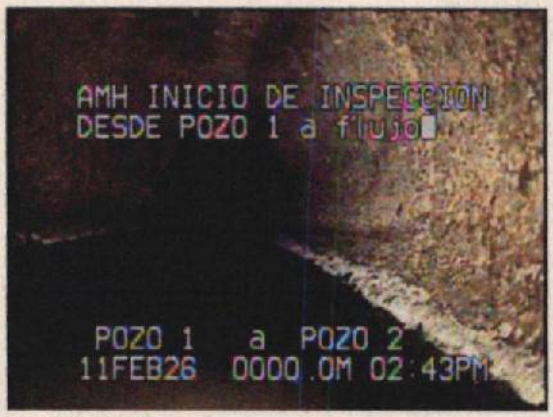

2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inpsección a flujo desde POZO 1



3, 00:01:30, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%



4, 00:02:04, 1.00m
Superficie Agregado Visible de 12 en punto a 12 en punto,, Arrancar



5, 00:02:39, 1.70m
Depósitos Adheridos Grasa, 5% del área de corte trans. de 3 en punto a 9 en punto, Arrancar



6, 00:03:39, 8.40m
Observación General / Camara de caida

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 20/02/2026 - 1.5 NO CLT - CIV7000217

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	20/02/2026	1.5 NO CLT - CIV7000217	5



7, 00:04:01, 8.40m
Superficie Agregado Visible de 12 en punto a 12 en punto,, Acabado



8, 00:04:12, 8.40m
Depósitos Adheridos Grasa, 5% del área de corte trans. de 3 en punto a 9 en punto, Acabado



9, 00:04:37, 10.30m
Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en POZO 2

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Resumen de la Inspección de Colectores - 20/02/2026 - 1.6 NO CLT -

Fecha	Cámara	Estado del Tiempo	No. Referencia Acometida	No.
20/02/2026	**ARIES**	**Seco**	**1.6 NO CLT - CIV7000314**	**6**
Project			Inspeccionado Por	
SEPROM-029-26			**MIGUEL LUNA**	**SEPROM-029-26**

Ciudad	**BOGOTÁ DC**	Punto de acceso aguas arriba lateral	**CMP165240**		**0**
Calle	**CALLE 56F SUR X CARRERA 96A**		**NOD**	Longitud Total [m]	**10,00**
Código de Ubicación		Punto de acceso lateral aguas abajo	**CMP147671**	Longitud Inspeccionada	**10,00**
			NOD	Año Construcción	

Profiles	**Circular 400mm**	Objetivo	**Evaluación de Rutina**
		Método de inspección	
Uso	**Sanitario/Agua Residual/Agua Negra**	Dirección	**Águas Abajo**
		Limpieza Previa	**Limpieza a fondo**
Material	**Tuberia de Concreto (no-reforzado)**	Información Adicional	**CONSORCIO VPJ 2025**



1:85	Distance	LACP Code	Observation	Counter	Photo	Rate
	0.00	AMH	Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde CMP165240	00:00:00	1, 2	
	0.00	MWL	Nivel del Agua, nivel de agua 5%	00:02:32	3	
	0.00	FL	Fractura Longitudinal en 3 en punto	00:03:02	4	3
	0.00 S01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar	00:03:28	5	3
	2.50	JAM	Junta Angular Mediana	00:04:11	6	3
	3.90	JAL	Junta Angular Grande	00:04:43	7	4
	8.40 F01	SAP	Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado	00:05:19	8	3
	10.00	AMH	Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en CMP147671	00:05:45	9	

QSR	QMR	QOR	SPR	MPR	OPR	SPRI	MPRI	OPRI
4138	0000	4138	28,0	0,0	28,0	3,1	0,0	3,1

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 20/02/2026 - 1.6 NO CLT - CIV7000314

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	CALLE 56F SUR X	20/02/2026	1.6 NO CLT - CIV7000314	6



1, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde CMP165240




2, 00:00:00, 0.00m
Pozo de Acceso / Inicio de inspección a flujo desde CMP165240



3, 00:02:32, 0.00m
Nivel del Agua, nivel de agua 5%



4, 00:03:02, 0.00m
Fractura Longitudinal en 3 en punto

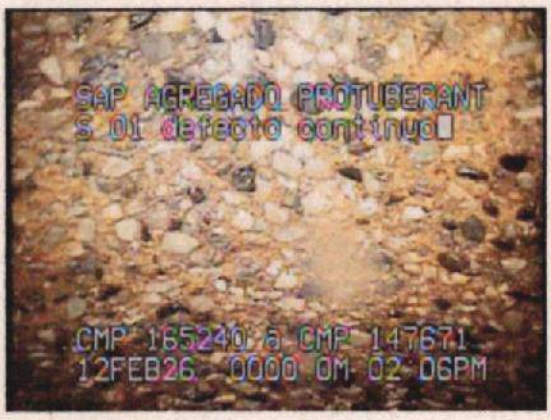

5, 00:03:28, 0.00m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Arrancar



6, 00:04:11, 2.50m
Junta Angular Mediana

SEPROMED S.A.S
Carrera 31A No 6-91, Bogota
Tel. 601 7516982
informes@sepromed.co

Fotos de la sección - 20/02/2026 - 1.6 NO CLT - CIV7000314

Ciudad	Calle	Fecha	No. Referencia Acometida	Section No.
BOGOTÁ DC	**CALLE 56F SUR X**	**20/02/2026**	**1.6 NO CLT - CIV7000314**	**6**



7, 00:04:43, 3.90m
Junta Angular Grande



8, 00:05:19, 8.40m
Superficie Agregado Protuberante de 12 en punto a 12 en punto, Acabado



9, 00:05:45, 10.00m
Pozo de Acceso / Fin de inspección a flujo en CMP147671
